

Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Voortgangsrapport en covernota

Meetmoment december 2021



MONITORING
RELANCEPLAN
VLAAMSE
VEERKRACHT

Voortgangsrapport en covernota
Meetmoment december 2021



Inhoud

1. Inleiding.....	8
2. Aanloop naar het relanceplan.....	8
3. 180 relanceprojecten in 7 speerpunten	9
4. Aanpak monitoring Vlaams Relanceplan	24
4.1. Governance	24
4.2. Communicatie.....	25
4.2.1. Open en transparante communicatie over monitoring.....	25
4.2.2. Publiekscampagne augustus – september 2021.....	25
4.2.3. Relanceprojecten in de kijker sinds oktober 2021	26
4.2.4. Geplande communicatie-initiatieven in 2022	26
5. Terugblik aandachtspunten meting 2 van september 2021 en aanpak meting 3.....	26
6. Kerncijfers over de relanceprojecten op meetmoment 31 december 2021.....	28
6.1. Globale voortgang.....	28
6.2. Mijlpalen.....	29
6.2.1. Mijlpalen voor VV001-VV180.....	29
6.2.2. Mijlpalen per speerpunt.....	31
6.3. Vastleggingen en vereffeningen	36
6.3.1. Vastleggingen en vereffeningen voor VV001-VV158.....	36
6.3.2. Vastleggingen per speerpunt voor VV001-VV158.....	37
7. Detailcijfers over de relanceprojecten	40
Cluster 1 Renovatie gebouwenpatrimonium	40
Cluster 2 Fietsinfrastructuur	42
Cluster 3 Digitale versnelling leerplichtonderwijs.....	42
Cluster 4 Opleidings- en loopbaanoffensief.....	43
Cluster 5 Versterking Onderzoek en Ontwikkeling.....	43
Cluster 6 Blue Deal	44
Cluster 7 Investeringen in verkeersveilige wegen.....	45
Cluster 8 Modal shift naar water.....	46
Cluster 9 Welzijnsinfrastructuur	46
Cluster 10 Waterstofonderzoek	47
Cluster 11 Vergroening weginfrastructuur.....	47
Cluster 12 Iedereen lokaal digitaal	48
Cluster 13 Digitalisering Vlaamse overheid	49
Cluster 14 Culturele infrastructuur	50
Cluster 15 Investeringen onroerend erfgoed	52
Cluster 16 Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening.....	52
Cluster 17 Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)	53
Cluster 18 Brexit.....	53

Cluster 19 Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur	54
Cluster 20 Voorsprongfonds Hoger Onderwijs	54
Cluster 21 Digitalisering zorgbeleid	54
Cluster 22 Investeren in personen met een handicap	55
Cluster 23 Sportinfrastructuur	56
Cluster 24 Uitbouwen circulaire economie	56
Cluster 25 Investerings groene warmte	56
Cluster 26 Digibanken.....	57
Cluster 27 Digitale vaardigheden	57
Cluster 28 Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector	57
Cluster 29 Versterken mentaal welzijn	58
Cluster 30 Armoedebestrijding en wijkverbetering	59
Cluster 31 Investerings audiovisuele sector	60
Cluster 32 Jeugdinfrastructuur.....	61
Cluster 33 Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	61
Cluster 34 Spending reviews.....	61
Cluster 35 Regulier gefinancierde relanceprojecten.....	62
8. Feedback uit het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV).....	64
9. Leeswijzer bij het globale rapport	64
10. Voortgangsrapport: gedetailleerd overzicht van alle projecten.....	66
01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)	66
VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE	66
VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE	71
VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE	75
VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)	79
VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)	82
VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE	85
VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET	89
VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL	92
VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN	95
VV010 - SOCIALE WONINGBOUW	98
VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID	102
VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE	106
02. Fietsinfrastructuur	109
VV013 - DE INRICHTING VAN EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN	109
VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN	113
03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs	116
VV015 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS (DIGISPRONG)	116

04. Opleidings- en loopbaanoffensief.....	120
VV016 - ACTIVERING-VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80 PROCENT VESOC.....	120
VV017 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN.....	124
VV018 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT.....	129
VV019 - VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN.....	135
05. Versterking O&O	140
VV020 - BIO-ECONOMIE.....	140
VV021 - ONDERZOEKINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S), SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS).....	145
VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN.....	149
VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O.....	152
06. Blue deal.....	158
VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE.....	158
VV025 - BLUE DEAL - ONDERZOEK.....	162
VV026 - BLUE DEAL - MOW.....	167
VV027 - BLUE DEAL - ECONOMIE.....	171
VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN.....	174
VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN.....	178
VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER.....	182
VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR IN DE BEBOUWDE OMGEVING.....	185
VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN.....	189
VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING.....	195
VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN.....	198
VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN.....	203
VV036 - NATTE NATUUR.....	207
07. Investerings in verkeersveilige wegen.....	212
VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT.....	212
VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN.....	215
VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES.....	219
VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT.....	223
08. Modal shift naar water	226
VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN).....	226
VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN.....	229
VV043 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOGING WATERTRANSPORTCAPACITEIT).....	232
VV044 - ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE.....	235
09. Welzijnsinfrastructuur	238
VV045 - INZETTEN OP KWALITEIT EN GOOD GOVERNANCE VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID.....	238
VV046 - OPTREKKEN STRATEGISCHE FORFAITS ZIEKENHUIZEN.....	242
10. Waterstofonderzoek.....	245

VV047 - WATERSTOFONDERZOEK.....	245
11. Vergroening weginfrastructuur	250
VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP).....	250
VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR.....	253
12. Iedereen lokaal digitaal.....	258
VV050 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING	258
VV051 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS.....	262
VV052 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES.....	266
VV053 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING	268
VV054 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET	270
VV055 - SMART CITIES.....	272
13. Digitalisering Vlaamse overheid	275
VV056 - ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING – ONBOARDING RAAMOVEREENKOMSTEN.....	275
VV057 - ONDERSTEUNING DIGITALE TRANSFORMATIE.....	277
VV058 - VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING	285
VV059 - DIGITALISERING ASSET MANAGEMENT AQUAFIN	290
VV060 - VERSNELLING EN VERDERE UITBOUW VAN MIJN BURGERPROFIEL	294
VV061 - DATANUTSBEDRIJF	298
VV062 - DIGITALISERING DBRC - TOEGANG TOT DE VLAAMSE BESTUURSRECHTSPRAAK	301
VV063 - HET OMGEVINGSLOKET – DIGITALISERING INZAGE-LOKET EN OMGEVINGSCHECK.....	304
VV064 - FIT – DATAGEDREVEN ORGANISATIE EN DIGITALISERING DIENSTVERLENING	307
VV065 - CYBERSECURITY EN UITROL SIEM.....	312
VV066 - HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK.....	315
VV067 - MODERNISERING CLOUD- EN NETWERKINFRASTRUCTUUR.....	317
VV068 - KALEIDOS – DIGITALISERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE VLAAMSE REGERING	319
VV069 - DATA INTEGRATIEDIENSTEN VOOR SLIMME MOBILITEIT	323
VV070 - MATIS, HET VLAAMSE MATERIALENINFORMATIESYSTEEM.....	327
VV071 - POOLSTOKALIAS.....	333
VV072 - DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN.....	335
VV073 - VLAAMSE SENSOR DATA SPACE	339
VV074 - VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM	343
VV075 - VLM - MAP6 EN DATAWAREHOUSE.....	349
VV076 - ZELFBEHEERDE IDENTITEIT	353
14. Culturele infrastructuur	357
VV077 - BELFORT AALST	357
VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE	359
VV079 - DESINGEL ANTWERPEN	361
VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK.....	364
VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR.....	366
VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN.....	369

VV083 - INVENTARIS CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR	371
VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE.....	374
VV085 - KURSAAL OOSTENDE.....	378
VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK.....	381
VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)	383
VV088 - MOOOV TURNHOUT.....	386
VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE.....	388
VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS	391
VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT	394
VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS.....	397
VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT.....	399
VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT	401
VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST	404
VV096 - SCHOUWBURG BOOM.....	407
VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES.....	409
VV098 - VERSNELLING OPERA GENT	412
15. Investerings onroerend erfgoed.....	414
VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED	414
16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening	420
VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN	420
VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN	423
VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN.....	427
VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING	430
VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING)	433
VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP	436
17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn).....	440
VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN	440
18. Brexit	444
VV107 - INITIATIEVEN VANUIT VLAM VOOR DE PROMOTIE EN AFZET VAN PRODUCTEN, O. A. ALS GEVOLG VAN BREXIT.....	444
VV108 - SUBSIDIES AAN BEDRIJVEN (FINANCIËLE STEUN VOOR BEDRIJVEN, KOSTENVERLAGING VOOR DEELNAME AAN BEURZEN, ONDERSTEUNING VOOR BREXIT) + INZET VAN CONSULTANTS OM VLAANDEREN IN HET BUITENLAND TE PROMOTEN	447
VV109 - VLAIO BREXIT ACTIEPLAN.....	451
19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur	457
VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV).....	457
VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN.....	459
20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs	462
VV112 - VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS.....	462
21. Digitalisering zorgbeleid	467
VV113 - BLENDED-CARE JEUGDHULP - BANDBREEDTE	467

VV114 - DIGITALE HULPVERLENING - KWALITEITSBEVORDERING.....	474
VV115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN.....	476
VV116 - ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER - GEÏNTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN.....	481
VV117 - ENKELBANDEN EN STRAFUITVOERING.....	484
VV118 - GROEIPAKKET - VERDERZETTEN DIGITALISERING.....	488
VV119 - ONTWIKKELEN RECHTENVERKENNER 2.0 MET EEN MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOOL IN STERKE SAMENWERKING MET DE LOKALE BESTUREN.....	493
VV120 - VERBETEREN VAN DE SOCIALE KAART.....	495
22. Investeren in personen met een handicap.....	498
VV121 - VOORUITSCHUIF UITBREIDINGSBELEID - FASE 1.....	498
23. Sportinfrastructuur.....	500
VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR.....	500
24. Uitbouwen circulaire economie.....	503
VV123 - CIRCULAIR BOUWEN.....	503
VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE.....	506
VV125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB.....	509
25. Investeren in groene warmte.....	513
VV126 - CALL GROENE WARMTE.....	513
26. Digibanken.....	516
VV127 - DIGIBANKEN.....	516
27. Digitale vaardigheden.....	521
VV128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN.....	521
28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector.....	528
VV129 - CULTUUR - BETERE INFORMATIEDOORSTROMING EN KOPPELING DATABANKEN.....	528
VV130 - CULTUUR - DIGITALISERING VAN COLLECTIES.....	532
VV131 - CULTUUR - INTEGRATIETRAJECT ERFGOEDDATABANKEN.....	537
VV132 - DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - INVESTERING.....	541
VV133 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VLAAMSE MEDIASECTOR.....	545
VV134 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR.....	550
VV135 - INVESTEREN IN MEDIAWIJSHEID VAN DE VLAMING.....	553
29. Versterken mentaal welzijn.....	556
VV136 - VERNIEUWENDE PROJECTEN HUIZEN VAN HET KIND.....	556
VV137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN.....	560
VV138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN.....	562
VV139 - OVERKOPHUIZEN.....	565
VV140 - SAMENWERKINGSVERBANDEN "ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN".....	568
VV141 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - CRISISOPVANG EN CRISISBEGELEIDING IN RESIDENTIËLE JEUGDZORG.....	571
VV142 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES.....	574
VV143 - ZORGZAME BUURTEN - ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT.....	576

VV144 - ZORGZAME BUURTEN - VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN	580
30. Armoedebestrijding en wijkverbetering	584
VV145 - BUITENSCHOOLSE OPVANG ONDERSTEUNEN	584
VV146 - COMPENSATIEBESLUIT KO - EXTRA TUSSENKOMST IKT (INKOMENSTARIEF)	587
VV147 - DOORGAANDE LIJN KINDEROPVANG – ONDERWIJS	590
VV148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN	594
VV149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK	597
VV150 - WIJKVERBETERING	600
VV151 - WIJKVERBETERINGSCONTRACTEN - INTEGRALE KETENAANPAK WELZIJN-JUSTITIE-LOKALE BESTUREN	603
VV152 - PROJECTOPROEP KWETSBARE KINDEREN	606
31. Investerings audiovisuele sector	609
VV153 - GARANTIEFONDS VOOR DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR	609
VV154 - IMPULS AAN VAF FILMFONDS	612
VV155 - IMPULS AAN VAF MEDIAFONDS EN GAMEFONDS	615
32. Jeugdinfrastructuur	618
VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR	618
33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	624
VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL	624
34. Spending reviews	629
VV158 - SPENDING REVIEWS	629
35. Extra relanceprojecten	633
VV159 - SNELLERE VERGUNNINGS- EN BEROEPSPROCEDURES	633
VV160 - ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING	636
VV161 - DECENTRALISATIEOEFENING NAAR LOKALE BESTUREN	639
VV162 - INVESTEREN IN VLAAMSE KENNISOVERHEID	641
VV163 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - PAKKET VAN 500 MILJOEN EURO VOOR ZEER GOEDKOPE ACHTERGESTELDE LENINGEN AAN ENERZIJD'S START-UPS & SCALE-UPS EN ANDERZIJD'S KMO'S	645
VV164 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - EXTRA CAPACITEIT VOOR GIGARANT (3 MILJARD EURO) EN VOOR PMV-Z-WAARBORGEN (400 MILJOEN EURO) - HEFBOOM VOOR MAXIMALE BANCAIRE FINANCIERING	648
VV165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS-PUBLIEK EN REST PRIVAAT)	651
VV166 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - UITBREIDING VAN DE WIN-WIN-LENING EN VRIENDENAANDEEL	654
VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOW 2	657
VV168 - VERSNELDE UITROL DIGITALE METERS	660
VV169 - VERSNELDE UITROL GLASVEZELNETWERK EN 5G	663
VV170 - FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAAG VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE	666
VV171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD	668

VV172 - INVESTERINGEN IN VLAGGENSCHIPRELANCEPROJECTEN VAN DE VLAAMSE HAVENS INZAKE CO ² CAPTATIE & HERGEBRUIK.....	671
VV173 - AD HOC INVESTERINGSMIDDELEN ALS COFINANCIERING VOOR EUROPESE STEUN.....	674
VV174 - NOODKOOPLINGEN.....	676
VV175 - UITBREIDINGSBUDGET VOOR WELZIJN EN ZORG.....	679
VV176 - ZIJNSTROOM VANUIT DE PRIVÉSECTOR NAAR HET ONDERWIJS AANTREKKELIJK MAKEN.....	683
VV177 - IMPLEMENTATIE VAN DE VLAAMSE JOBBONUS.....	686
VV178 - EXTRA ZUURSTOF VOOR INDIVIDUEEL CREATIEF TALENT - MEESTERSCHAP.....	690
VV179 - INSPANNINGEN OM INVESTERINGEN AAN TE TREKKEN VERHOGEN.....	695
VV180 - WACHTLIJSTEN GEHANDICAPTENZORG.....	698

1. Inleiding

COVID-19 heeft de wereld en ook Vlaanderen hard getroffen. Daarom investeert de Vlaamse Regering de komende jaren 4,3 miljard euro extra om het economische en maatschappelijke weefsel te herstellen. Het Vlaamse Relanceplan '[Vlaamse Veerkracht](#)' is het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet. Het rust op zeven speerpunten:

- De coronacrisis beheren en Brexit;
- Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken;
- Investeren in mensen en talenten;
- Investeren in infrastructuur;
- Economie en samenleving verduurzamen;
- Vlaanderen digitaal transformeren;
- De overheid efficiënter maken.

en is doorvertaald in 35 clusters en 180 relanceprojecten. Naast de 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen investeert de Vlaamse Regering ook in andere herstelmaatregelen zoals in zorg (bv. uitbreidingsbudget), werk (bv. jobbonus) en onderwijs (scholenbouw).

Om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te verzachten, heeft de Europese Unie een herstelfonds opgericht, NextGenerationEU. Daarin zit een pakket steun en leningen voor lidstaten, de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV). Voor België is er een maximum van 5,9 miljard euro steun voorzien. Daarvan heeft Vlaanderen recht op een maximum van 2,255 miljard euro voor het Vlaamse relanceplan. 55 van de projecten van het Plan Vlaamse Veerkracht worden met deze middelen gefinancierd. Wat niet Europees gefinancierd wordt, zal de Vlaamse overheid zelf financieren.

Deze covernota geeft de aanloop naar het relanceplan weer met de werkzaamheden van het maatschappelijk en het economische relancecomité. Daarna worden de doelstellingen van het relanceplan per speerpunt besproken. Vervolgens wordt de aanpak en de governance van deze monitoring meegegeven.

In deze covernota blikken we kort terug op de resultaten van de nulmeting in april en de tweede meting in september van 2021. De hoofdbrok van deze covernota gaat over de **status van de 180 relanceprojecten op het derde meetmoment van december 2021**. We eindigen de covernota met een leeswijzer bij het globaal monitoringsrapport.

2. Aanloop naar het relanceplan

Op 30 april 2020 besliste de Vlaamse Regering om een "Economisch Relancecomité" op te richten dat maatregelen moest uitwerken voor een snel en krachtig economisch herstel. De Vlaamse Regering was ook bezorgd over de impact van de coronacrisis en van de bijhorende overheidsmaatregelen op het maatschappelijk leven. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 16 mei 2020 om, naast een comité voor de economische relance, ook een "Maatschappelijk Relancecomité" op te richten.

Het Economisch Relancecomité bestaat uit 11 leden: 6 onafhankelijke experts, die elk een prominente rol spelen in hun vakgebied, en 5 afgevaardigden van de Vlaamse ministers. De 6

onafhankelijke experts zijn: Koenraad Debackere (voorzitter), Wouter De Geest, Geert Noels, Stijn Baert, Marion Debruyne en Ans De Vos.

Het Maatschappelijk Relancecomité bestaat uit 18 leden: 9 onafhankelijke experts, die evenzeer vooraanstaande deskundigen zijn in hun werkdomein, en 9 afgevaardigden van de Vlaamse ministers. De 9 onafhankelijke experts zijn: Lieven Annemans (voorzitter), Ive Marx, Liesbet Stevens, Pieter Ballon, Inge Vervotte, Wouter Duyck, Elke Hermans, Sabine Bourgeois en Alexandra Smarandescu.

Elk van beide relancecomités bundelde zijn aanbevelingen in een [rapport](#) dat werd voorgesteld op 14 juli 2020. De Vlaamse Regering ging met deze rapporten aan de slag en eind september 2020 werd het Relanceplan '[Vlaamse Veerkracht](#)' voorgesteld. In de [Septemerverklaring van 2020](#) ging de minister-president uitvoerig in op de inhoud van dit plan.

3. 180 relanceprojecten in 7 speerpunten


Het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' bevat verschillende maatregelen die verschillende doelen dienen:

- Het plan bevat maatregelen die de **acute crisissen** tijdens de covid-golven helpt te bestrijden.
- Daarnaast bevat het plan een resem **herstelmaatregelen** die de maatschappij en economie moeten helpen om terug op adem te komen en te blijven.
- Voorts heeft de Vlaamse Regering ervoor gekozen om van deze verschrikkelijke crisis een opportuniteit te maken, door **substantiële publieke investeringen** te doen in zorg en welzijn, mensen en talenten, en infrastructuur, maar ook in de transitie naar een duurzame en digitale economie en samenleving.
- Tot slot maakt de Vlaamse Regering van de gelegenheid gebruik om de **Vlaamse overheid te herdenken**, met het oog op een grotere effectiviteit en efficiëntie.

Het relanceplan omvat **zeven speerpunten** die deze doelstellingen respectievelijk reflecteren:

- De coronacrisis beheren en Brexit;
- Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken;
- Investeren in mensen en talenten;
- Investeren in infrastructuur;
- Economie en samenleving verduurzamen;
- Vlaanderen digitaal transformeren;
- De overheid efficiënter maken.

De Vlaamse Regering investeert **4.3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen** in deze 7 speerpunten, naast de investeringen via reguliere middelen.

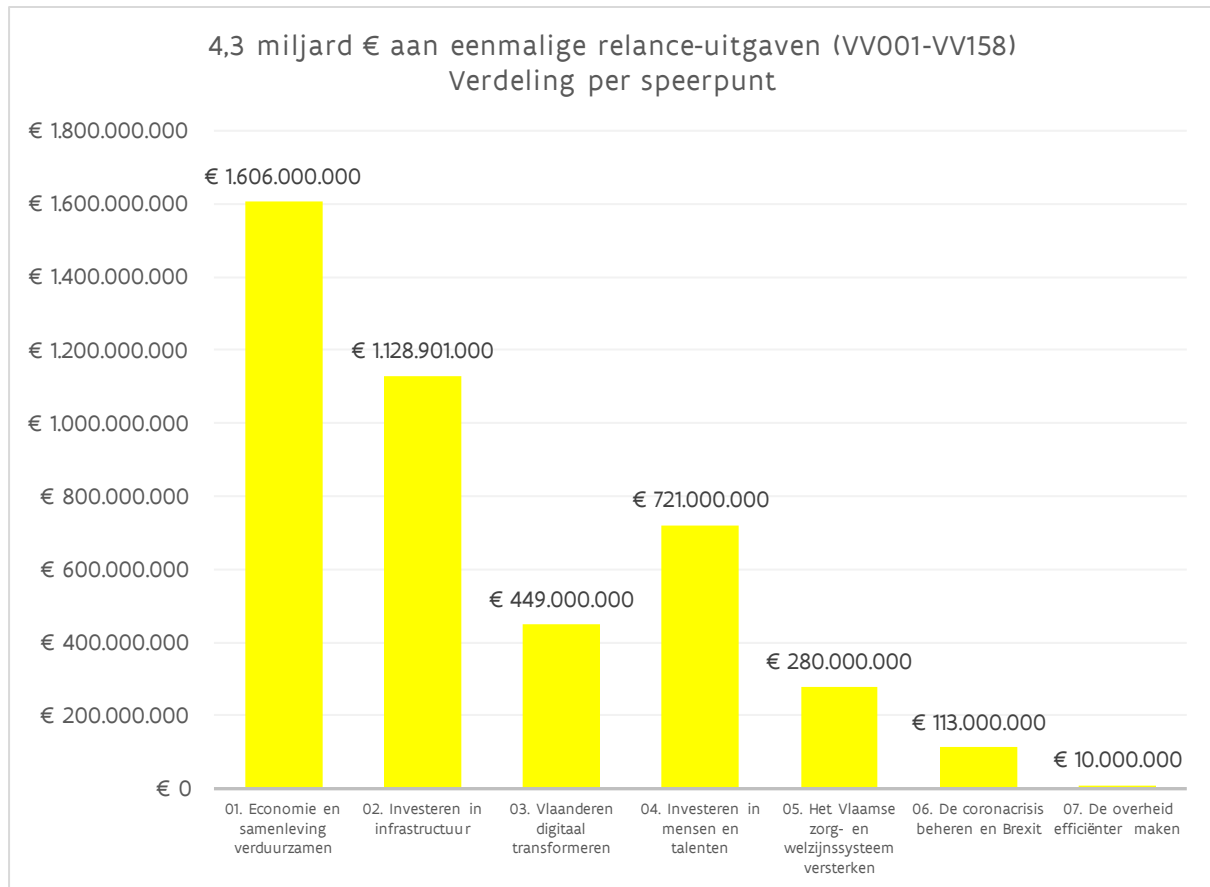

De voortgang van de uitvoering van het relanceplan wordt drie keer per jaar opgevolgd via **mijlpalen, output-, outcome- en impactindicatoren**.

Daarnaast houden we de vinger continu aan de pols aan de hand van een **relancedashboard** met kwaliteitsvolle en frequent bijgewerkte data. Zo zijn er systematisch cijfers beschikbaar over onder meer de groei van de Vlaamse economie en de tewerkstelling in Vlaanderen, maar ook over het welzijn van de Vlamingen.

De volgorde van de speerpunten hieronder is niet zomaar gekozen. Eerst kijken we naar crisisbestrijding, daarna naar herstelmaatregelen, gevolgd door investeringen in Vlaams regulier beleid maar ook in transitie, om tot slot stil te staan bij hervormingen binnen de Vlaamse overheid.

DE CORONACRISIS EN BREXIT BEHEREN

Een wereldwijde pandemie en een drastische shift in de handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk zet ons economisch weefsel onder druk. De Vlaamse Regering doet dan ook zeer grote inspanningen om de **Vlaamse economie en bedrijven te ondersteunen** door hun **financiële slagkracht** maximaal intact te houden. Daarnaast neemt de Vlaamse Regering maatregelen die de **impact van de Brexit** moeten verzachten maar ook maatregelen die de economische mogelijkheden met het VK maximaal kansen geven.

Coronacrisis bestrijden

In het relanceplan Vlaamse Veerkracht zijn er veel maatregelen opgenomen om de economie en de bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden. Om zelfstandigen en kmo's in Vlaanderen meer financiële ademruimte te geven, voorziet **PMV** een achtergestelde **lening** op 3 jaar van minimum 25.000 euro en maximum 2,8 miljoen euro (eventueel verhoogd tot 4,3 miljoen euro als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).

Voor financieringsbehoeften van meer dan 1,5 miljoen euro voorziet Gigarant (waarborgregeling boven 1,5 miljoen euro) een aangepaste COVID-19 waarborg, die meer flexibiliteit biedt. De **waarborgcapaciteit** van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro. De bestaande waarborgregeling bij PMV/z (waarborgregeling tot 1,5 miljoen euro) werd tijdelijk uitgebreid met de waarborg coronacrisis.

Een **Welvaartsfonds** werd opgericht dat belegt in kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen bij Vlaamse ondernemingen. Er wordt bij PMV een kapitaalsverhoging van 240 miljoen euro voorzien om dit fonds op te starten. Het is de bedoeling om hiermee een fonds ter waarde van 500 miljoen euro op te zetten, waarvan 260 miljoen euro door private partners.

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een **Winwinlening** verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, werd deze lening versoepeld.

Met het **Vriendenaandeel** moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), gevestigd in het Vlaams Gewest. De particuliere investeerder (vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot 300.000 euro extra kapitaal ophalen.

Voor de **Vlaamse Audiovisuele Sector** voorziet de Vlaamse Regering bijkomende financiële steun. Zo zorgt ze voor een garantiefonds van 10 miljoen euro, beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds, om onvoorziene productiekosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen te dekken. De Vlaamse Regering voorziet verder ook een financiële impuls van 10 miljoen euro aan het VAF Filmfonds met de bedoeling om kwaliteitsvolle Vlaamse films en de vertoning ervan te stimuleren. Eenzelfde investering van 10 miljoen euro doet ze in het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds om de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse televisiereksen en games te stimuleren.

Brexit verzachten

Flanders Investment and Trade (FIT) zet in op verschillende sporen om de gevolgen van Brexit te reduceren, met een investering van 30 miljoen euro. FIT voorziet subsidies in de vorm van bijzondere **exportsteun** en **starterspakketten internationalisering**. Het agentschap zorgt daarnaast voor een kostenverlaging voor deelname aan acties van FIT. Voorts zet het in op **lead generation programma's** in de buitenlandse posten. Dit zijn doelgerichte acties waarbij bedrijven individueel

benaderd worden via webinars, Tech Innovation Series en sociale mediacampagnes. Daarnaast heeft FIT een bijzondere tool gelanceerd om de Vlaamse troeven extra in de verf te zetten: de **Virtual Tech Tour (VTT)**. FIT werkt voorts ook actief aan **beeldvorming en sensibilisering** in verband met Brexit vanuit het kantoor in Londen en wordt daarbij ondersteund door een lokaal marketingbureau. Met **gespecialiseerde consultants in 15 toplanden** promoot FIT Vlaanderen bij investeerders als innovatieve kennisregio. In het voorjaar van 2022 staat een (uitgestelde) prinselijke **missie** naar het VK op de agenda.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) werkt in 2021 en 2022 een relancebeleid uit voor de door de Brexit zwaar getroffen sectoren van de **agrovoeding en sierteelt**, met een financiële injectie van 3 miljoen euro. VLAM geeft bedrijfssubsidies aan Vlaamse bedrijven actief in deze sector voor innovatieve projecten om de export richting het VK en wereldwijd te ondersteunen. Verder wordt er een mini-incubator gelanceerd op maat van kleinere en startende exporteurs van Vlaamse agrovoeding en sierteelt. Er worden imagocampagnes opgezet om deze sector te promoten in het VK en onze marktpositie daarbuiten te versterken.

Het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO) investeert 50 miljoen euro in Brexitgerelateerde maatregelen. VLAIO voorziet **post-Brexit Veerkrachtsubsidies**, gericht op bedrijven die omwille van Brexit hun strategische businessplannen duurzaam moeten omvormen en vervolgens die transformatie implementeren. Er wordt geïnvesteerd in **opleidingen** die ondernemers in staat stellen om de uitdagingen van Brexit te counteren. De **helpdesk Brexit** wordt ook versterkt. VLAIO investeert in de '**ontwrichte zones**' in Vlaanderen. In een ontwrichte zone is er een tijdelijke vermindering van de loonkost voor bijkomende duurzame tewerkstelling. VLAIO gaat met partners in gesprek om samen te werken rond **informatieverschaffing, individuele begeleiding, collectieve begeleiding, lerende netwerken** op het vlak van bedrijfsvoering voor Brexitgerelateerde import/exportthema's. Tot slot wordt het bestaande budget van **Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun** versterkt om nieuwe investeerders aan te trekken, gerelateerd aan Brexit.

VERSTERKING VAN HET VLAAMS ZORG- EN WELZIJNSSYSTEEM

De Vlaamse economie kende een stevige terugval, maar ook onze samenleving ging en gaat nog steeds door een zware crisis. COVID-19 plaatst een enorme druk op onze **ziekenhuizen**, onze **woonzorgcentra**, onze **zorgvoorzieningen** in de sector van **personen met een handicap**, onze **kinderopvang en jeugdhulp**, en onze **scholen**. Zowel fysiek als mentaal was en is dit een heel moeilijke periode voor veel Vlamingen. De vierde golf, na de massale en succesvolle vaccinatiecampagne, is voor velen dan ook erg moeilijk om te dragen. De Vlaamse Regering spendeert daarom extra middelen voor het zorgpersoneel, voor het fysiek en mentaal welzijn van de Vlaming, en voor armoedebestrijding en wijkverbetering.

Zorgmedewerkers en -infrastructuur

We investeren 138,25 miljoen euro extra in de zorg en in de levenskwaliteit van zorgbehoevende ouderen in de woonzorg. We geven daarmee uitvoering aan de VIA6-maatregelen, en zorgen voor **bijkomende tewerkstelling in de woonzorgcentra**.

10 miljoen euro extra wordt voorzien voor de vernieuwing van het **gebouwpatrimonium in de ziekenhuissector**. Deze nieuwe of vernieuwde infrastructuur moet de patiënt nog meer zorgkwaliteit bieden.

We maken **versneld** werk, in twee fases, van het **wegwerken van de wachtlijsten voor een persoonsvolgend budget bij personen met een handicap** door een injectie van 185 miljoen euro, goed voor 1700 extra persoonsvolgende budgetten.

De Vlaamse Regering voorziet naast het **VIA-budget van 577 miljoen euro ook 562,5 miljoen extra uitbreidingsbudget voor Welzijn** en zet deze versneld in. In totaal wordt zo in het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' **1,1 miljard euro voorzien voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector**. Deze middelen worden ingezet voor: betere verloning van het zorgpersoneel en aantrekkelijker maken van het beroep (o.m. via positieve beeldvorming, werken op zij-instroom, extra omscholing tot verpleegkundigen), verlichting van de werkdruk en extra uitbreiding van het zorgaanbod.

Via dit uitbreidingsbeleid wordt bijkomend geïnvesteerd in personen met een handicap, de ouderenzorg (meer personeel en betaalbaarheid), jeugdhulp, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, gezondheidsbeleid en preventie.

Mentaal welzijn

We waken over het **mentaal welzijn** van de Vlamingen en investeren hier 44,55 miljoen euro bijkomende relancemiddelen in.

We doen dat door gerichte investeringen in vernieuwende projecten binnen 24 Huizen van het Kind. We investeren in onze jongeren door de opening van 16 extra **OverKop huizen**. Dit zijn toegankelijke ontmoetingsplekken waar de doelstellingen van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidsbevordering gecombineerd worden waargemaakt vanuit een sterke participatieve insteek.

We investeren in de **bestrijding van intrafamiliaal geweld** door crisisopvang en crisisbegeleiding in de residentiële jeugdzorg, maar ook door bewustmakingscampagnes om (potentiële) plegers van intrafamiliaal geweld toe te leiden naar hulpverlening.

We ondersteunen **mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren** door investeringen in de werking van lotgenotengroepen, versterkte inzet van herstelacademies, en de tijdelijke versterking van de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen.

We zetten in op **sensibiliseringscampagnes rond mentaal welzijn**, ondersteunen werkgevers in het gezondheidsbeleid in het kader van telewerk en versterken diverse hulplijnen.

We investeren in de gezinnen met **'één gezin, één plan'**. Dit zijn samenwerkingsverbanden die laagdrempelige, snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulpverlening bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen met pedagogische ondersteuningsnaden. Een eerstelijnspsychologische functie is in deze samenwerkingsverbanden voorzien zodat een geïntegreerd antwoord geboden kan worden.

We voorzien in minstens 100 **zorgzame buurtprojecten** waarvan minstens 95 in het Nederlandse taalgebied en minstens 5 in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. We willen dat deze projecten inspirerend zijn voor andere buurten. We investeren verder in **zorgzame buurten** door te investeren in de rol van apothekers als aanspreekpunt voor welzijnsvragen, gericht op identificatie van psychosociale noden en doorverwijzing naar gepaste hulp.

Armoedebestrijding en wijkverbetering

We **bestrijden armoede en werken aan wijkverbetering** met een extra injectie van 32,2 miljoen euro.

We versnellen de **investeringen in buitenschoolse opvang** door lokale besturen.

Naar aanleiding van de coronacrisis werden heel wat gezinnen geconfronteerd met een inkomensdaling. Om voor die gezinnen de financiële drempel voor **kinderopvang** te verlagen, werd een bijkomend **specifiek COVID-tarief** voorzien. Dit moest extra financiële ondersteuning mogelijk maken voor 14.600 gezinnen. Deze maatregel liep tot eind 2021.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 bieden we ruimte aan 12 pioniers die zich willen inzetten op een **doorgaande lijn van kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kleuteropvang**. Daarbij bekijken we hoe verbinding kan worden gemaakt met de thuisomgeving en de buurt. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de taalontwikkeling en de verwerving van de Nederlandse taal.

Vlaanderen investeert in **voedselbedeling voor mensen in armoede**. Vlaanderen subsidieert al op projectmatige basis enkele van de bestaande distributieplatformen. Gelet op het bewezen nut van dergelijke platformen, wordt werk gemaakt van een structurele verankering ervan.

We realiseren de uitrol van het **Geïntegreerd Breed Onthaal** in Vlaanderen, bestaande uit OCMW's, het centrum algemeen welzijnswerk actief in het werkingsgebied en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Het project draagt bij aan de drempelverlaging van de Vlaamse hulp- en dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen en de bestrijding van onderbescherming bij kwetsbare doelgroepen door proactieve rechtendetectie en -realisatie.

We zetten in op **wijkverbetering** d.m.v. wijkverbeteringscontracten waarbij de Vlaamse overheid en het lokale bestuur (met lokale partners) de gemeenschappelijke uitdaging aangaan om problematieken in kwetsbare wijken aan te pakken. Daarnaast investeren we ook in buurtgerichte projecten op het kruispunt van lokale besturen – welzijn – justitie om te voorkomen dat jongeren verglijden of hervallen in een criminele levensstijl en om onveiligheid en onveiligheidsgevoelens in de buurt te verminderen.

We hebben bijzondere aandacht voor **kwetsbare kinderen en jongeren**. We voorzien innovatieve projecten die kinderen en jongeren in kwetsbare situaties versterken via gevarieerde, zinvolle en creatieve vrijetijdsbeleving. We werken outreachend vanuit (boven)lokale netwerken van organisaties en lokale besturen.

INVESTEREN IN MENSEN EN TALENTEN

Actieve handen en hoofden zijn de basis voor onze Vlaamse welvaart, vandaag en morgen. Onze arbeidsmarkt kende een stevige dreun, maar is er intussen al bovenop. De Vlaamse Regering wil verder investeren in **opleiding en begeleiding**, om zo veel mogelijk Vlamingen naar **werkbaar werk** te leiden en een **werkzaamheidsgraad van 80%** te bereiken. Daartoe maakt ze werken ook meer lonend via de **jobbonus**.

Digitale versnelling in onderwijs

De coronacrisis wordt aangegrepen voor het doorvoeren van een **duurzame digitale versnelling in het leerplichtonderwijs**. Deze 'digisprong' verloopt via meerdere sporen: investeringen in ICT-infrastructuur en –toestellen voor leerlingen en leerkrachten, ondersteuning voor scholen en leerkrachten, en de aanmaak van kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal. Hiervoor wordt 375 miljoen euro aan relancemiddelen vrijgemaakt.

Ook het hoger onderwijs wordt ondersteund om zich klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Met het **Voorsprongfonds Hoger Onderwijs** worden instellingen aangezet om te zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod, dat **toekomstbestendig, wendbaar, duurzaam en digitaal is**, met een **groeidend aantal mogelijkheden om levenslang te leren**. Hiervoor wordt 60 miljoen euro aan relancemiddelen ingezet.

Loopbaan- en opleidingsoffensief

De focus op levenslang leren beperkt zich niet tot het hoger onderwijs. Er wordt een groot **opleidingsoffensief** ontplooid, in samenwerking met en vanuit een breed partnerschap aan

onderwijs- en opleidingsverstrekkers gaande van centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie, hogescholen, universiteiten, VDAB, VLAIO, private opleidingsverstrekkers en ondernemingen, ... De rol van het **volwassenenonderwijs** in het levenslang leren wordt bovendien versterkt en in de kijker gezet.

Er wordt sterk ingezet op een werkzaamheidsgraad van 80%, ook bij mensen die kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt. Er zijn maatregelen voorzien om **mensen te begeleiden en/of om te scholen die hun job verloren of die momenteel inactief zijn**. Die maatregelen richten zich niet enkel naar werknemers, maar ook naar werkgevers. Bedrijven krijgen bv. steun om in te zetten op innovatie en werkbaarheid.

Doelstelling is dat **alle werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen en zelfstandige ondernemers meer wendbaar en inzetbaar** zijn in een snel evoluerende maatschappij met bijhorende arbeidsmarktbehoeften. Er komen initiatieven om competenties op peil te houden en om nieuwe competenties te verwerven. De competenties van werknemers worden zichtbaar gemaakt en zij kunnen zich her- of bijscholen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen. Transitie over sectoren en ondernemingen heen worden gefaciliteerd. In dat kader wordt ook werk gemaakt van een actieplan 'zij-instroom in de zorg'.

En uiteraard is er ook aandacht voor jongeren, voor wie de loopbaan nog een start moet nemen. Er worden relancemiddelen vrijgemaakt om te **vermijden dat jongeren ongekwalificeerd of met een achterstand aan hun professionele traject moeten beginnen**. Er wordt ingezet op het wegwerken van de leerachterstand die jongeren opliepen tijdens de coronaperiode, op het versterken van professionele onderwijsactoren om met uitdagende omstandigheden om te gaan, en op het verhogen van het welbevinden in de schoolomgeving. Voor jongeren die alsnog zonder middelbaar diploma uitstromen, wordt er outreachend en aanklappend gewerkt vanuit de centra voor basiseducatie en voor volwassenenonderwijs.

Voor dit **opleidings- en loopbaanoffensief** wordt 286 miljoen euro aan relancemiddelen vrijgemaakt.

Werken lonend maken

Er wordt ingezet op **activering** door werken meer lonend te maken, ook voor werknemers met een laag loon. Dit gebeurt via de **jobbonus** die oploopt tot 600 euro per jaar voor wie voltijds werkt aan een minimumloon. Daarnaast worden werknemers met een laag inkomen gestimuleerd om de **overstap te maken naar ondernemer in hoofdberoep**. Dit gebeurt via de **jobbonus +**. Hiervoor wordt binnen de reguliere Vlaamse middelen een budget van 197 miljoen euro vrijgemaakt.

Zij-instroom onderwijs en individueel meesterschap

Daarnaast zet de Vlaamse Regering dit speerpunt extra kracht bij vanuit haar reguliere middelen. Er wordt 4 miljoen euro voorzien voor het aantrekkelijker maken van **zij-instroom vanuit de privésector naar het onderwijs**. Dat moet helpen om het lerarentekort weg te werken.

Via beurzen en projectsubsidies geeft de Vlaamse overheid **extra zuurstof aan individueel creatief talent en meesterschap** binnen de domeinen kunsten, circus, en vakmanschap in erfgoed.

INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR

We ondersteunen de Vlaamse economie door versneld te investeren in onze infrastructuur. We maken van deze crisis gebruik om fors in te zetten op **veiliger en groener verkeer**: van meer fietspaden, over verkeersveilige wegen tot een 'modal shift' naar duurzame mobiliteit en transport. We zorgen voor **kwaliteitsvolle ontmoetingsplekken** voor vrijetijdsbeleving, zelfontplooiing en gemeenschapsvorming via investeringen in allerlei domeinen: van cultuur en onroerend erfgoed, over sport tot toerisme. Ten slotte versnellen we de inzet op **schoolinfrastructuur**. Deze investeringen zorgen voor werkgelegenheid, voor een hogere welvaart en levenskwaliteit van de Vlaming en voor een belangrijke stap in de richting van een duurzame samenleving.

Fietsinfrastructuur

Via een investering van 400 miljoen euro wordt ingezet op een **groter en veiliger fietsnetwerk** op zowel gewest- als gemeentewegen. Dit zal tegen eind 2026 leiden tot bijna 140 km nieuwe fietspaden (en -bruggen, -tunnels- en oversteekplaatsen) en meer dan 1300 km aan geoptimaliseerde fietsinfrastructuur. We investeren in **verkeersveilige wegen door 'kunstwerken' in slechte staat (bv. bruggen en viaducten) en gevaarlijke punten** aan te pakken, schoolroutes veiliger te maken en versneld werk te maken van verkeerslichtenbeïnvloeding voor een betere, veiligere en maximaal conflictvrije doorstroming voor de actieve weggebruiker. We investeren in deze cluster maatregelen 200 miljoen euro. Deze projecten dragen bij tot de modal shift naar duurzame modi en de verkeersveiligheid met als belangrijke indicator een vermindering van het aantal (dodelijke) verkeersongevallen.

Goederenvervoer over water

Net zoals voor het personenvervoer werken we aan een modal shift voor het **goederenvervoer**. Een belangrijke doelstelling op dit vlak is de verschuiving van het goederenvervoer van de weg naar de alternatieve vervoersmodi zoals de water- of spoorweg. In het relanceplan Vlaamse Veerkracht is 164 miljoen euro vrijgemaakt om de **modal shift van de weg naar de binnenvaart te stimuleren**. Het betreft hier investeringen in het verbeteren van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal door het verhogen van bruggen, het verhogen van de bevaarbaarheid en waterveiligheid van de Dender, het uitrusten van watergebonden bedrijventerreinen met kaaimuren, en in het realiseren van de vereiste onteigeningen voor het project 'Nieuwe Sluis Zeebrugge'.

Culturele infrastructuur

Via een investering van 99 miljoen euro in **culturele infrastructuur** krijgt het culturele leven in Vlaanderen een boost: bestaande werkingen kunnen worden uitgebreid door de beschikbaarheid van state-of-the-art infrastructuur. Het betreft een investering in **22 projecten**, gespreid over alle Vlaamse provincies, met onder meer een nieuwe museumsite voor Musea Brugge. Het betreft hier zowel renovaties, nieuwbouw als projecten die de combinatie van beide omvatten. Duurzaamheid en toegankelijkheid vormen een rode draad.

Onroerend erfgoed

We investeren versneld in ons **Vlaams onroerend erfgoed**. Uit de wachtlijst voor erfgoed- en restauratiepremies worden zo'n **70 projecten geselecteerd die bijdragen aan ruimtelijke of regionale ontwikkeling** (wegens sociale of culturele meerwaarde, of wegens een meerwaarde op het vlak van omgevingsontwikkeling), aan een groene transitie (wegens focus op duurzaam hergebruik van erfgoedsites of wegens verbetering van energieprestaties) of aan de ondersteuning van kmo's (wegens impact op tewerkstelling of wegens steun voor restauratie handelspand in beschermd gebouw). Voorts komen er gerichte oproepen m.b.t. economische herinvulling van

erfgoed, her- en nevenbestemming van kerken, erfgoed en wonen, erfgoed en toerisme. Hier wordt in totaal 100 miljoen euro aan relancemiddelen voor vrijgemaakt.

Toerisme

De **toeristische sector** is hard getroffen door de COVID 19-crisis. Via een investering van 70 miljoen euro aan relancemiddelen wordt ingezet op het economisch herstel. Hierbij is er onder andere oog voor het MICE-toerisme (Meetings, Incentives, Conventions en Exhibitions/Events). Bestaande trends in die sector zijn door de pandemie in een stroomversnelling gekomen, bv. de aandacht voor hybride events en belevingstoerisme. Er komt een focus op de capaciteits- en kwaliteitsverhoging van bestaande MICE-infrastructuren en op nieuwbouw waar nodig. Waar mogelijk wordt er ook een culturele nevenbestemming nagestreefd.

Bovenlokale sportinfrastructuur

In het kader van het sportbeleid wordt er al enkele jaren ingezet op de bouw en/of renovatie van **bovenlokale sportinfrastructuur**. Die inspanningen worden versterkt door een extra injectie van 55 miljoen euro aan relancemiddelen. De positieve effecten van sport en bewegen in tijden van een pandemie zetten de nood extra kracht bij.

Jeugdinfrastructuur

Ook **jeugdinfrastructuur** krijgt, dankzij 30 miljoen euro aan relancemiddelen, een stevige investeringsimpuls. Zo worden onder meer de renovatie van de Hoge Rielen en Destelheide versneld, en komt er een investeringsinjectie in basisinfrastructuur en in infrastructuurverbeteringen vanuit de sector. Hierbij ligt de klemtoon op kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en het inrichten van binnen- en buitenruimtes voor kinderen en jongeren. Daarnaast worden bijkomende middelen voorzien voor het toekennen van sectorale investeringssubsidies voor maatregelen die bovenlokale jeugdinfrastructuur energiezuiniger en toegankelijker maken. Om de energiezuinigheid te verhogen kunnen 100 jeugdorganisaties gratis een energiescan aanvragen. Ten slotte wordt de tentenstock van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd sterk verhoogd.

Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

De Vlaamse Regering investeert 10 miljoen euro relancemiddelen in **gemeenschapsinfrastructuur in Brussel**, met bijzondere aandacht voor digitaliseringsprojecten m.b.t. de dienstverlening.

Tot slot doet de Vlaamse Regering deze regeerperiode voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe investeringen in schoolinfrastructuur via reguliere middelen. De inhaalbeweging van de vorige regeerperiode wordt zo exponentieel doorgezet met een extra investeringsimpuls van 500 miljoen euro. Deze investeringsgolf biedt perspectief voor **ruim 1.000 nieuwe of gerenoveerde scholen**.

VERDUURZAMING VAN ECONOMIE EN SAMENLEVING

We nemen de coronacrisis vast als een opportuniteit om versneld te investeren in een duurzame toekomst voor Vlaanderen. We zetten daarmee volop in op de transitie naar een **groenere economie en samenleving**, door een grootschalige renovatie van onze gebouwen, O&O-investeringen, de Blue Deal, en investeringen in duurzame ruimtelijke ordening en groene mobiliteit. Deze grote publieke investeringen zijn goed voor het klimaat, maar ook goed voor onze economie en werkgelegenheid, en dus ook goed voor onze Vlaamse welvaart en toekomst.

Renovatie gebouwen

We doen dat dat door **private en publieke gebouwen te renoveren** en dus energiezuiniger, en tegelijk ook **asbestveilig** te maken. 422 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken. Deze projecten zijn niet alleen goed voor het klimaat maar zijn ook goed voor de gezondheid van de Vlamingen.

Noodkoopfonds

We voorzien bijkomende reguliere middelen voor het **noodkoopfonds** dat er op gericht is om via projecten van OCMW's renteloze leningen te verstrekken aan noodkopers voor de renovatie van hun woning. Noodkopers zijn eigenaars van kwalitatief en energetisch slecht scorende woningen, die door een gebrek aan financiële middelen hieraan niet kunnen remediëren.

Verduurzaming ruimtelijke ordening

We verbeteren en **verduurzamen de ruimtelijke ordening** door een versnelde sanering van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, door verouderde bedrijventerreinen te transformeren in moderne en duurzame terreinen van de 21ste eeuw, en leegstaande of onderbenutte handelsonderdelen/bedrijfsonderdelen te transformeren in actieve panden. Hiervoor wordt 50 miljoen euro vrijgemaakt. We voorzien 20 miljoen euro voor ruimtelijke, sociale en economische investeringsprojecten in wijken of stadsdelen van onze gemeenten en steden en 25 miljoen euro voor 6 ecologische ontsnipperingsprojecten van bestaande gewestelijke transportinfrastructuur. We pakken de PFOS-vervuiling aan met een investering van 23 miljoen euro.

Blue Deal

De waterbeschikbaarheid per capita in Vlaanderen is één van de laagste in de OESO. De klimaatverandering en meer specifiek de droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten. Daarom investeren we 343 miljoen extra in **Blue Deal**-projecten die de strijd aanbinden tegen deze droogte en de gevolgen ervan. Zo zetten we onder meer in op meer natte natuur, duurzaam watergebruik, droogteresistente gewassen en waterinfrastructuur.

Onderzoek en ontwikkeling

We investeren 160 miljoen euro in de versterking van de **onderzoeksinfrastructuur** bij de Vlaamse strategische onderzoekscentra, speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs en investeren in innoverende bedrijven in Vlaanderen. We voorzien daarnaast 100 miljoen euro in de versterking van **onderzoek en ontwikkeling in Vlaamse bedrijven**.

We willen ook mee zijn met de versnelling die plaatsvindt rond **waterstoftechnologie** en trekken daarvoor 125 miljoen euro uit. Waterstof is een belangrijke component in de transitie naar een klimaatneutrale energie. We sluiten daarvoor aan bij het Europese initiatief over Important Projects of Common European Interest (IPCEI). De focus ligt op innovatieve projecten met een doorbraakkarakter.

We investeren 50 miljoen euro in **groene warmte en restwarmtebenutting**. Hiermee wordt warmte benut die anders verloren zou gaan en verhoogt het aandeel warmteproductie uit hernieuwbare energiebronnen.

We investeren 20 miljoen euro extra in **bio-economie**, die hernieuwbare biologische grondstoffen produceert en verwerkt tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en bio-energie.

We investeren in **circulaire economie**. We investeren in projecten rond circulair bouwen en de circulaire maakindustrie met een bijkomende investering van 25 miljoen euro. We investeren daarnaast ook in recycling-installaties en -eenheden met een injectie van 30 miljoen euro. We

beogen daarmee afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) om te zetten in grondstoffen.

We voorzien een beschikbaar kapitaal van 75 miljoen euro voor investeringen in innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) **platformtechnologie**.

We trekken 70 miljoen euro uit voor een investering in de onderzoekscleanroom van IMEC, en in het imec_xpand fonds om te investeren in een aantal kapitaalintensieve start ups die werken rond **nanotechnologie en digitale technologie**.

We investeren in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake **CO2-captatie & hergebruik** met reguliere middelen.

Door deze O&O-investeringen creëren we belangrijke hefboomeffecten, blijven we in de buurt van de **innovatiekoplopers**, en stutten we de bron van onze welvaart in Vlaanderen.

Groene mobiliteit

We vergroenen onze weginfrastructuur en investeren 90 miljoen euro in innovatieve **LED-verlichting** langs onze gewestwegen. Deze verlichting is niet alleen energiezuinig maar vergt ook minder onderhoud. Door deze aanpassing van bestaande infrastructuur kan bovendien de zichtbaarheid op de weg verbeterd worden, wat leidt tot een betere verkeersveiligheid en het aanpakken van files.

Nu het wagenpark aan de vooravond staat van een transitie naar volledig elektrisch rijden, wordt er versneld werk gemaakt van een ambitieuze uitrol van **laadinfrastructuur** in Vlaanderen met een investeringsinjectie van 30 miljoen euro. Dit draagt bij tot een drastische verhoging van de laadcapaciteit (CPE) in Vlaanderen.

We maken daarnaast een gefaseerde overgang naar een **groene en duurzame busvloot** van De Lijn met een investering van 93 miljoen euro. 280 hybride bussen worden omgebouwd naar e-hybride bussen en 44 e-hybride bussen werden reeds aangekocht. Zo zorgen we voor een vergroening van ons transport en dragen we bij tot de modal shift naar een duurzaam openbaar vervoer.

VLAANDEREN DIGITAAL TRANSFORMEREN

Wij gebruiken de huidige crisis als een opportuniteit om versneld te investeren in een **digitale transformatie** van Vlaanderen, zowel binnen de lokale besturen, binnen de Vlaamse overheid, in de zorgsector, als in de media- en cultuursector. We investeren ook verder in de digitale omkadering, vaardigheden en de 'digitale identiteit' van de Vlamingen.

Deze grote publieke investeringen zijn goed voor de efficiëntie en effectiviteit van ons beleid, voor onze economie en werkgelegenheid, en dus ook goed voor onze Vlaamse welvaart en toekomst.

Lokaal digitaal beleid

We voorzien **120 miljoen euro voor de digitalisering van ons lokaal beleid**.

We **digitaliseren inburgeringstrajecten**, zodat mensen sneller en op zelfstandige basis de vaardigheden en kennis kunnen verwerven om het inburgeringstraject te doorlopen. Zo kunnen ze ook sneller actief worden op de arbeidsmarkt, op eigen benen staan en bijdragen aan de welvaart van onze samenleving.

We investeren in het **versneld digitaliseren van de processen en dienstverlening van lokale besturen**. Op die manier kunnen bedrijven en burgers sneller hun administratieve verplichtingen

afwerken, zonder in een fysieke rij te staan. Bovendien moet dit de administratieve rompslomp eenvoudiger en de afhandeling sneller en efficiënter maken.

We zetten in op de ontwikkeling van een **instrumentarium en vormen** om de lokale besturen, en bij uitbreiding de Vlaamse overheid, te ondersteunen bij hun **e-inclusiebeleid**. We financieren lokale besturen voor de uitbouw van hun **lokaal e-inclusiebeleid**. We ondersteunen hen bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening en bij het toegang verlenen tot computers en internet voor kwetsbare doelgroepen. Daarbij gaat ook aandacht naar wetenschappelijke ondersteuning.

Tot slot zetten we stevig in op lokale digitale innovatie. Daarom moedigen we onze steden en gemeenten aan om **Smart City-toepassingen** te testen en op te schalen. Dit draagt bij tot de betrokkenheid van de inwoners en de kwaliteit van de informatie en de dienstverlening aan bedrijven en burgers. Maar daarmee stimuleren en demonstreren we ook onze technologie- en ICT-bedrijven en bieden we kansen voor internationale doorbraken.

Digitalisering Vlaamse overheid

We investeren **115,9 miljoen euro in de digitalisering van de Vlaamse overheid**.

Met die middelen realiseren we een **vernieuwd aanbod ICT-diensten**, dat zowel afgestemd is op de noden van de Vlaamse overheid als dat het maximaal inspeelt op het marktaanbod. We bouwen een ondersteuningsstructuur uit voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. We **versterken verschillende digitale bouwstenen** met name: het MAGDA-gegevensdelingsplatform, de module 'eFormulieren', het CRM-systeem, het digitaal tekenplatform, de MAGDA-documentendienst en de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus. We realiseren generieke diensten voor het voeden en ontsluiten van het subsidieregister.

We voorzien gerichte investeringen in **plaats- en tijdsafhankelijke dienstverlening**, ter ondersteuning van de Vlaamse overheid en lokale besturen in hun digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening naar de burgers, ondernemers en verenigingen.

We investeren in een **gemoderniseerde ICT netwerk- en cloudinfrastructuur** die maximaal is geconsolideerd zodat een efficiënte, innovatieve en geïntegreerd ICT-basisinfrastructuur is gerealiseerd.

Binnen de Vlaamse overheid wordt een **datanutsbedrijf** opgericht als betrouwbare / centrale / neutrale verkeerswisselaar van data.

We versterken de investeringen binnen de Vlaamse overheid inzake **cybersecurity** om te beschikken over een veilig en privacybestendig aanbod van digitale diensten, rekening houdend met de evoluerende bedreigingen en technologische vernieuwingen.

We **digitaliseren het besluitvormingsproces** van de Vlaamse Regering. Hierdoor zal de administratieve ondersteuning en communicatie nog efficiënter verlopen.

We versnellen de uitbouw van **mijn burgerprofiel**. Op dit digitaal loket vindt men op termijn een compleet, officieel en betrouwbaar overzicht van alle dienstverlening van de overheid: premies, vergunningen, belastingen, zorgaanbod, ... ; een overzicht van hun gegevens bij de overheid: woningen, diploma's, attesten, vergunningen, ... ; het aanvragen en beheer van dienstverlening, het opvolgen van lopende dossiers en het ontvangen van berichten of documenten, ...

We investeren in de **regie op eigen gegevens**. Dit omvat het opzetten van een door de burger beheerde datakluis, in de veelbelovende Solid-technologie, met als doel het beheren en delen van

persoonlijke gegevens die kunnen hergebruikt worden in diverse overheidstoepassingen, bv. rekeningnummers, en het delen van overheidsgegevens met derde partijen, bv. het officieel adres of een diploma.

We digitaliseren het **asset management van Aquafin**, zodat optimale onderhouds- en investeringsbeslissingen mogelijk worden om de infrastructuur in goede toestand te houden en waterkwaliteit verzekerd blijft. Dankzij het digitaliseringsproject wordt versneld bijgedragen aan het verzekeren van de waterkwaliteit en het betaalbaar houden van de waterfactuur.

We digitaliseren de **dienst van de bestuursrechtcolleges**. Het doel van het digitaliseringsproject is (de procedures in het kader van) de Vlaamse bestuursrechtspraak de komende jaren verder, extern te digitaliseren, na een eerste, interne digitaliseringsbeweging, met het oog op een efficiëntere werking.

We **digitaliseren het omgevingsloket verder** met de digitalisering van het inzage-loket en de omgevingscheck. Dankzij de twee vernieuwde toepassingen zullen de burgers en bedrijven in de eerste plaats online en 24/7 inzage hebben in de vergunningsaanvragen die in openbaar onderzoek zijn of waarvoor de beroepstermijn van toepassing is, zonder zich nog naar het gemeentehuis te moeten begeven. Tegelijkertijd zal men beter inzicht krijgen over de mogelijke impact van omgevingselementen op de geplande projecten.

Ook bij Flanders Investment & Trade investeren we verder in meer **gedigitaliseerde, dynamische, interactieve en doeltreffende dienstverlening** op maat van de klant.

We investeren verder in **Mobility as a Service** met als doel mobiliteitsdata interoperabel en geïntegreerd te ontsluiten, beter vindbaar en vlotter herbruikbaar te maken zodat deze als hefboom fungeert om duurzame vervoersystemen op te zetten, te faciliteren en te realiseren.

We bouwen een **Vlaams Materialeninformatieysteem** uit waarbij afvalstoffen en materialen kunnen gevolgd worden tussen bedrijven, wat moet leiden tot een effectievere en efficiëntere handhaving op afvalstoffenbewegingen.

We investeren in een **sensor data platform** met als doel sensordata interoperabel, kostenefficiënt en schaalbaar te ontsluiten, beter vindbaar en vlotter herbruikbaar te maken zodat deze als hefboom fungeert om een duurzame groei van de Vlaamse data-economie mogelijk te maken.

We investeren ook in een **vastgoedinformatieplatform**. Met deze investering beogen we de ontwikkeling en uitrol en het beheer en de exploitatie van het vastgoedinformatieplatform waarbij een nieuwe informatiesnelweg in het domein van vastgoedinformatie wordt aangelegd. We beogen verder ook het doelgericht verbeteren van de kwaliteit van de aan het vastgoedinformatieplatform gerelateerde gegevensbronnen.

Voor het **mestactieplan 6 voorzien we een nieuw datawarehouse**. We gaan zoveel mogelijk voor digitale communicaties met de betrokkenen.

Digitalisering van de zorg

Tijdens de covid-19-crisis hebben de digitale kanalen versneld ingang gevonden in zorg en welzijn. We **digitaliseren ons Vlaams zorgbeleid** verder met een bijkomende injectie van 59 miljoen euro.

We willen **blended werken in de jeugdhulp in Vlaanderen duurzaam en veilig** ingang laten vinden en de jongeren en hun gezin transparantie bieden over eigen gegevens. We zetten in op kwaliteitsbewaking van de onlinehulpverlening, door ondersteuning voor opleidingen en vorming of ondersteuning voor nieuwkomers op het terrein aan te bieden.

We **digitaliseren de zorgsectoren die overkwamen n.a.v. de zesde staatshervorming**. Het gaat om de revalidatieziekenhuizen, de revalidatieconventies, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen.

We investeren in een **digitaal zorg- en ondersteuningsplan en een elektronisch patiëntendossier** voor de eerste lijn. Door hierbij ook samen te werken met andere betrokken actoren, vergroten we het vertrouwen in en het draagvlak voor dit elektronisch patiëntendossier bij de bevolking.

De coronapandemie heeft een significante impact gehad op de **uitvoering van de werkstraf en het aanbod aan beschikbare werkplaatsen**. In sommige regio's vraagt deze bijzondere situatie dan ook bijkomende maatregelen, zoals bijkomende omkadering en bijkomende werkvloerprojecten. Verder wordt er ook ingezet op het bouwen van het **bestuurlijk sanctieregister**.

Door verder in te zetten op een **verregaande digitalisering van de berekening, gegevensdeling en uitbetaling van het Groeipakket** werken we aan een efficiënte overheid en creëren we via automatische rechtentoekenning een solide basis voor de verschillende beleidsdoelstellingen die we met het Groeipakket realiseren.

De rechtenverkenner is toe aan een grondige update tot **rechtenverkenner 2.0**. De rechtenverkenner wordt gebruikt door voornamelijk hulpverleners van OCMW, CAW, lokale besturen, ... om op basis van het profiel van een hulpvrager te bekijken voor welke rechten deze persoon in aanmerking komt. De nodige aanpassingen moeten leiden tot verbeterde resultaten in rechtentoekenning en eenvoudigere aanpassingen bij veranderende regelgeving.

De **sociale kaart** is voor de hulp- en dienstverleners, zorgpersoneel, OCMW-medewerkers of de burger zelf een instrument om in de eigen buurt de nodige hulpverleners en instellingen te kunnen terugvinden. Toch blijkt de toepassing vatbaar voor verbetering door onder meer de koppeling te maken met bijkomende authentieke datasets en een optimalisatie van de zoekfunctie.

Digitalisering media en cultuur

We voorzien 46,1 miljoen euro voor de **digitalisering van de Vlaamse media- en cultuursector**.

Met deze middelen **digitaliseren we culturele collecties en integreren we de erfgoeddatabanken**.

We investeren verder in een **Digitaal Verenigingsloket** naar analogie met Mijn Burgerprofiel en het e-Loket voor Ondernemers. Dit unieke loket moet verenigingen (vzw's en feitelijke verenigingen) beter ondersteunen bij hun interacties met overheden en andere dienstverleners op alle niveaus, via een betere digitalisering van (overheids)diensten.

Er wordt geïnvesteerd in de **ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector** met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken.

Via twee projecten wordt er bijkomend geïnvesteerd in het versterken van **mediawijsheid** bij de burger. De ontwikkeling en coördinatie van beide projecten gebeurt door Mediawijs - het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid.

Digibanken

We voorzien 50 miljoen euro voor de **oprichting van digibanken**. Met de oprichting wil de Vlaamse Regering het risico op digitale uitsluiting verkleinen via drie inhoudelijke doelstellingen: via gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (vb. uitleendienst), via het versterken van digitale vaardigheden door opleiding en kennisdeling, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal), en via een verbeterde

digitale toegang tot essentiële diensten door begeleiding (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, enz.) via zogenaamde fysieke knooppunten.

Digitale vaardigheden

We investeren 54 miljoen euro in de **ontwikkeling van digitale talenten**. Vlaanderen treedt hier naar voor als pionier en zal in dit kader onder meer een gepersonaliseerd loopbaanplatform en leer- en loopbaanrekening lanceren om mensen helpen werk te vinden, (online) opleiding te volgen, zich te herscholen en de werkzaamheidsgraad verder te verhogen. Ook ondernemingen en hun werknemers ondersteunen we in de digitale transformatie.

Digitale infrastructuur

In samenwerking met intercommunales en private bedrijven investeren we ook in een versnelde uitrol van **digitale meters** (ongeveer 2 miljard euro investering door Fluvius gespreid over 10 jaar, waarvan 80% tegen 2025).

De Vlaamse Regering streeft naar **één open netwerk voor 5G**. We onderzoeken hiervoor het concept van een tower company. Dit houdt in dat diverse aanbieders hun infrastructuur aanbrenge op een gezamenlijke basisinfrastructuur. Op deze manier streven we in samenwerking met de mobiele operatoren in een versnelde uitrol van een glasvezelnetwerk en 5G. Voorwaarde is evenwel een snelle spectrumveiling op federaal niveau, zodat de betrokken operatoren zekerheid hebben over de frequenties waarover ze beschikken.

DE OVERHEID EFFICIËNTER MAKEN

De Vlaamse overheid maakt van deze crisis gebruik om zichzelf te herdenken en te **hervormen**. Zo maakt ze werk van snellere vergunnings- en beroepsprocedures, administratieve vereenvoudiging, een Vlaamse kennisoverheid, decentralisatie van Vlaamse bevoegdheden naar de lokale besturen en uitgaventoetsingen. Deze projecten dragen bij tot een efficiënte en effectieve overheid.

Snellere vergunningen en beroepen

De Vlaamse Regering maakt werk van **snellere vergunnings- en beroepsprocedures** en zet in op vijf werven: snelle en correcte rechtsbescherming met snellere beroepsprocedures en het wegwerken van de achterstand, optimaliseren van de omgevingsvergunning, introductie van het omgevingsbesluit waardoor maatregelen en instrumenten op maat van het proces geactiveerd worden, hervormen van de milieueffectenrapportage tot een slank en efficiënt instrument dat de besluitvorming beter en krachtiger maakt en onze leefomgeving voldoende beschermt, en tot slot een digitale werf met de uitbreiding van het omgevingsloket met een publiek loket zodat ook publieke raadplegingen en openbare onderzoeken maximaal digitaal kunnen verlopen.

Administratieve vereenvoudiging

De Vlaamse Regering zet in op **administratieve vereenvoudiging**. Ze wil regeldruk en administratieve lasten reduceren om belangrijke kostenbesparingen én een grotere tevredenheid bij burgers, ondernemingen en overheidspersoneel te realiseren. In de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid worden vereenvoudigingsprojecten gerealiseerd waar regelgeving en de bijhorende administratieve procedures de efficiënte werking van de overheid of de vlotte interacties van burgers en bedrijven met die overheid in de weg staan. We werken daarbij enerzijds 'remediërend' door screening van de bestaande regelgeving en 'citizen journeys' voor concrete levensgebeurtenissen, en anderzijds werken we 'preventief' en nemen we maatregelen om efficiënte toekomstige regelgeving te verzekeren.

Vlaamse kennisoverheid

De Vlaamse Regering investeert verder in een **Vlaamse kennisoverheid**. In het kader van een snelle en flexibele informatieverschaffing naar statistiekgebruikers zetten we in op de data-capaciteit van de Vlaamse Statistische Autoriteit met aandacht voor de verschillende types van databronnen: survey-data, administratieve data en organische (big) data. Dit om veranderingen in de maatschappij en de economie sneller te kunnen duiden. De capaciteit van het VSA Statistisch Datawarehouse wordt uitgebreid om statistische informatie-invoer en verwerking te versnellen en op een overzichtelijke manier weer te geven via innovatieve visualisaties en dashboards met de belangrijkste statistische indicatoren. We breiden eveneens onze survey-capaciteit uit door internet-gebaseerde bevestigingen van de Vlaamse bevolking om de enquêtedruk te verminderen. Er wordt hiertoe ook extra geïnvesteerd in een online probability panel survey in samenwerking met Vlaamse universiteiten via de VLIR. Tot slot investeren we ook in het optimaliseren van de bestaande capaciteit m.b.t. strategische inzichten en analyses binnen de Vlaamse overheid. Naast het beter benutten van de open data, richten we ons ook op analyses van internationale indicatoren.

Decentralisatie van Vlaamse overheid naar lokale besturen

In een commissie **decentralisatie** overlegt de Vlaamse Regering samen met de lokale besturen op welke terreinen, bovenop de in dit regeerakkoord gemaakte afspraken, en door aanpassing van welke regelgeving en binnen welke termijn, zij de autonomie voor de lokale besturen verhoogt door, o.a. de afschaffing van Vlaamse sturing; minder of soepelere normering of de aanpassing van administratieve praktijken.

Spending reviews

Spending reviews lichten de overheidsuitgaven intens door. Daarbij worden de opportuniteit, efficiëntie en effectiviteit van de uitgaven geëvalueerd. Tegelijk komt er een lijst van de hervormingen of besparingen die mogelijk zijn door bijvoorbeeld efficiënter, effectiever en digitaal te werken. Bedoeling is om te komen tot een structurele verankering van beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen in het beleids- en begrotingsproces.

4. Aanpak monitoring Vlaams Relanceplan

De Vlaamse Regering legde in een [Mededeling aan de VR van 5 februari 2021](#) vast hoe de monitoring van het Vlaams Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' de komende jaren zal verlopen.

De voortgang van het Vlaams Relanceplan wordt vanaf 2021 drie keer per jaar gemeten (maart - april, augustus - september, november - december) waarbij wordt voorzien in een monitoringsrapport via een mededeling aan de VR.

4.1. Governance

Drie keer per jaar wordt de uitvoering van de projecten uit het volledig uitgewerkte relanceplan Vlaamse Veerkracht opgevolgd door een Directiecomité. Dit Directiecomité bestaat uit een kabinetsadviseur per minister en de 11 leden van het Voorzitterscollege (de 10 voorzitters van de managementcomités van de Vlaamse overheid en de voorzitter van het Voorzitterscollege). Het Directiecomité bereidt de Taskforce voor en waakt over een optimale uitvoering van het

relanceplan en een correcte monitoring daarvan. Voorafgaand aan elke Taskforce wordt het monitoringsrapport besproken in het maatschappelijk en het economisch relancecomité en in het klimaatexpertenpanel.

De Taskforce Vlaamse Veerkracht bestaat uit de ministers van de Vlaamse Regering, de voorzitters van de twee relancecomités, de voorzitter en ondervoorzitter van de SERV, de voorzitter van het klimaatexpertenpanel en een vertegenwoordiging vanuit het Voorzitterscollege, met de voorzitter en de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting als vaste leden. In functie van de agenda kan de minister-president oordelen over de opportuniteit van eventuele extra uitnodigingen aan andere leidend ambtenaren.

De Taskforce fungeert als overleg- en supervisieorgaan en waakt over de uitvoering van het relanceplan. De Taskforce komt drie keer per jaar samen, evalueert de monitoring en de bereikte resultaten en stuurt bij waar nodig.

De administratie staat in voor de concrete uitvoering. Het Voorzitterscollege zorgt op ambtelijk niveau voor voldoende afstemming tussen de betrokken entiteiten en voor de nodige informatiedeling.

Deze oefening wordt ambtelijk getrokken door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het Departement Financiën & Begroting die samen de krachten bundelen in een gemengde projectgroep, met vertegenwoordiging van de betrokken beleidsdomeinen.

4.2. Communicatie

4.2.1. Open en transparante communicatie over monitoring

De Vlaamse Regering wil actief inzetten op beleidscommunicatie over de doelstellingen en de uitrol van dit plan:

- De Vlaamse Regering hanteert een [apart label 'Vlaamse Veerkracht'](#) voor beslissingen die hieraan gelinkt zijn. Zo is het voor elke belanghebbende heel eenvoudig om bepaalde beslissingen terug te vinden.
- De Vlaamse Regering voorziet de nodige persmomenten m.b.t. de voortgang van de uitvoering van het plan.
- De Vlaamse Regering voorziet drie keer per jaar een Mededeling aan de Vlaamse Regering, met het volledige rapport, dat publiek beschikbaar is op de website van de Vlaamse regeringsbeslissingen en de [website Vlaamse Veerkracht](#).

4.2.2. Publiekscampagne augustus – september 2021

De Vlaamse Regering werkte een [communicatiecampagne](#) uit ter begeleiding van de uitvoering van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' die liep van 13 augustus tot 13 september 2021. De campagne hanteerde de slogan 'Meer dan ooit'. Want meer dan ooit staan we in Vlaanderen voor een uitdaging. Deze campagne had als voornaamste doelstelling de Vlamingen vertrouwen te geven in het plan en in de toekomst.

Om duidelijk te maken waarin de Vlaamse Regering juist zal investeren, werden deze investeringen in de kijker gezet met behulp van grafische elementen, namelijk gele accolades. Die visuele eyecatchers zoomden bijna letterlijk in op de elementen waar de Vlaamse overheid de komende jaren meer dan ooit de focus op zal leggen.

De accolades kwamen terug op een hele reeks advertenties, social posts en banners. Ook in het straatbeeld kwam men de campagne tegen op affiches, muurstickers en zelfs in het echt. Zo kon men op de dijk van Oostende en in de luchthaven van Zaventem door enkele metershoge accolades wandelen.



4.2.3. Relanceprojecten in de kijker sinds oktober 2021

De communicatie naar het grote publiek m.b.t. het Vlaams Relanceplan stopt niet met de communicatiecampagne van augustus en september 2021. Sinds oktober 2021 worden specifieke relanceprojecten in de kijker geplaatst via online video's en webberichten, die actief worden verspreid via sociale media. Op deze manier wordt het voor de burger nog duidelijker wat het relanceplan concreet betekent voor elk individu en voor onze samenleving.

4.2.4. Geplande communicatie-initiatieven in 2022

De Vlaamse Regering plant medio 2022 een nieuwe publiekscampagne. Terwijl de eerste campagne in de zomer van 2021 het bestaan en de ambitie van het relancebeleid onder de aandacht bracht, zal de volgende publiekscampagne focussen op concrete realisaties.

De Vlaamse Regering communiceert in 2022 ook op internationaal vlak over haar herstelbeleid.

5. Terugblik aandachtspunten meting 2 van september 2021 en aanpak meting 3

Verschillende aandachtspunten kwamen naar voor tijdens de bespreking van het tweede monitoringsrapport in de Task Force Vlaamse Veerkracht in september van 2021:

- De vraag naar het publiek ontsluiten van alle beschikbare data in de monitoringsoefening van Vlaamse Veerkracht. Op deze manier kunnen alle stakeholders zelf aan de slag met de data van de voor hen relevante speerpunten, clusters en projecten.

- De vraag naar grotere betrokkenheid van de relancecomités, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners tussen de metingen i.p.v. enkel drie keer per jaar tijdens de vergaderingen van de Task Force.
- De vraag om het draft rapport vroeger te bezorgen aan de relancecomités, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners, om te komen tot een nog betere voorbereiding van de Task Force.
- Het belang van een kwaliteitsvolle rapportering over de Europees gefinancierde RRF-projecten naar de stakeholders, maar uiteraard ook naar de EU met het oog op een vlotte en volledige uitbetaling.
- De vraag naar een blijvende investering in de kwaliteitsverbetering m.b.t. de 180 projectfiches, en de output- en outcome-indicatoren en mijlpalen, door doorgedreven ondersteuning vanuit de coördinerende entiteit DKBUZA.
- De vraag naar een blijvende investering in de kwaliteitsverbetering van de impactindicatoren op het niveau van de clusters en speerpunten.
- De vraag naar een blijvende investering in de dashboardindicatoren die het maatschappelijk en economisch herstel monitoren en die publiek ontsloten zijn.
- De vraag naar een narratief m.b.t. het relanceplan Vlaamse Veerkracht, meer bepaald een verdere explicitering van de samenhang tussen projecten, tussen clusters, tussen speerpunten, met aandacht voor het grotere systemische verhaal en de globale doelstellingen, dat ook de link legt met de transitie van verduurzaming en digitalisering.
- De vraag naar meer effectieve communicatie rond het relanceplan Vlaamse Veerkracht, de verwezenlijkingen en de impact, toegespitst op de verschillende doelgroepen.

Deze aandachtspunten werden meegenomen in de aanloop naar meting 3 van december 2021:

- Alle data m.b.t. meting 3 zullen worden ontsloten als open data op het opendataportaal van de Vlaamse overheid.
- Er werd een intensief traject tussen meting 2 en meting 3 doorlopen waarin een kwaliteitscheck werd gedaan op alle fiches en verbetervoorstellen werden gedaan naar de projectverantwoordelijken. Er werd gewerkt met voorbeeldfiches van best practices.
- Er werd opnieuw vroeg begonnen met de opstart van meting 3 (november 2021) om de voortgang extra te stimuleren, zowel naar besluitvorming toe, als naar projectuitvoering. Opnieuw werd voorzien in uitgebreide informatiesessies voor de projectverantwoordelijken, met het oog op een verdere kwaliteitsverbetering.
- De samenhang tussen de speerpunten, clusters en projecten werd extra verduidelijkt door in deze covernota een 'VV-narratief' toe te voegen. Dit narratief geeft beknopt weer wat de globale doelstellingen zijn van het plan, zowel inzake crisisbestrijding, herstel, heropleving, alsook inzake transitie.
- De relancecomités, het klimaatexpertenpanel, de sociale partners kregen de kans om tussen meting 2 en meting 3 opmerkingen te formuleren op de gehanteerde impactindicatoren en het narratief van Vlaamse Veerkracht. Het rapport wordt bij meting 3 ook tijdig aan de leden bezorgd in de aanloop naar de Task Force.
- De 55 RRF-projecten die Europese financiering kennen, worden van heel nabij opgevolgd, samen met de verantwoordelijke beleidsdomeinen. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van informatie voor deze Europese rapportering. Er is voorzien in de nodige interfederale afstemming om deze rapportering tijdig en kwaliteitsvol richting de EU te krijgen.
- Het dashboard Vlaamse Veerkracht werd verder aangevuld en is publiek ontsloten op de [website Vlaamse Veerkracht](#). Dit dashboard bevat kwaliteitsvolle data die een frequente update kennen, waardoor het economische en maatschappelijk herstel op macroniveau

kan worden opgevolgd. Het gaat dan bijvoorbeeld over de economische groei, tijdelijke werkloosheid, mentaal welzijn,

- Er werd verder geïnvesteerd in publiekscommunicatie over de verwezenlijkingen van Vlaamse Veerkracht, ook via sociale media. Deze inspanningen zetten we ook in 2022 verder.


6. Kerncijfers over de relanceprojecten op meetmoment 31 december 2021

6.1. Globale voortgang

Hieronder kan men de projectstatus van de 180 relanceprojecten op meetmoment 31 december 2021 vinden.

- 171 van de 180 relanceprojecten (95%) zijn opgestart:
 - 17 projecten of 9,44% hebben de status 'opgestart' maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
 - 153 projecten of 85% hebben de status 'opgestart na agendering VR', en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.
 - 1 project krijgt de status 'gerealiseerd'. Het gaat over VV146 'Compensatiebesluit KO (Kinderopvang) – extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)'.
- Voor 7 van de 180 relanceprojecten (3,89%) is bijzondere aandacht nodig (oranje). Dit betreft de digitaliseringsprojecten VV056, VV057, VV058, de investeringsprojecten in cultuurhuizen VV078 en VV087, het project VV120 'Verbeteren van de Sociale Kaart' en het project VV168 'Versnelde uitrol digitale meters'. Deze projecten worden in deel 7 toegelicht.
- Geen enkel relanceproject krijgt de projectstatus 'rood', waarbij bijkomende actie noodzakelijk is.
- 2 relanceprojecten (1,11%) zijn nog niet gestart (grijs). Het gaat over:
 - VV137 Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen;
 - VV142 Versterking aanpak intrafamiliaal geweld – bewustmakingscampagnes.

Deze worden verder in deel 7 toegelicht.

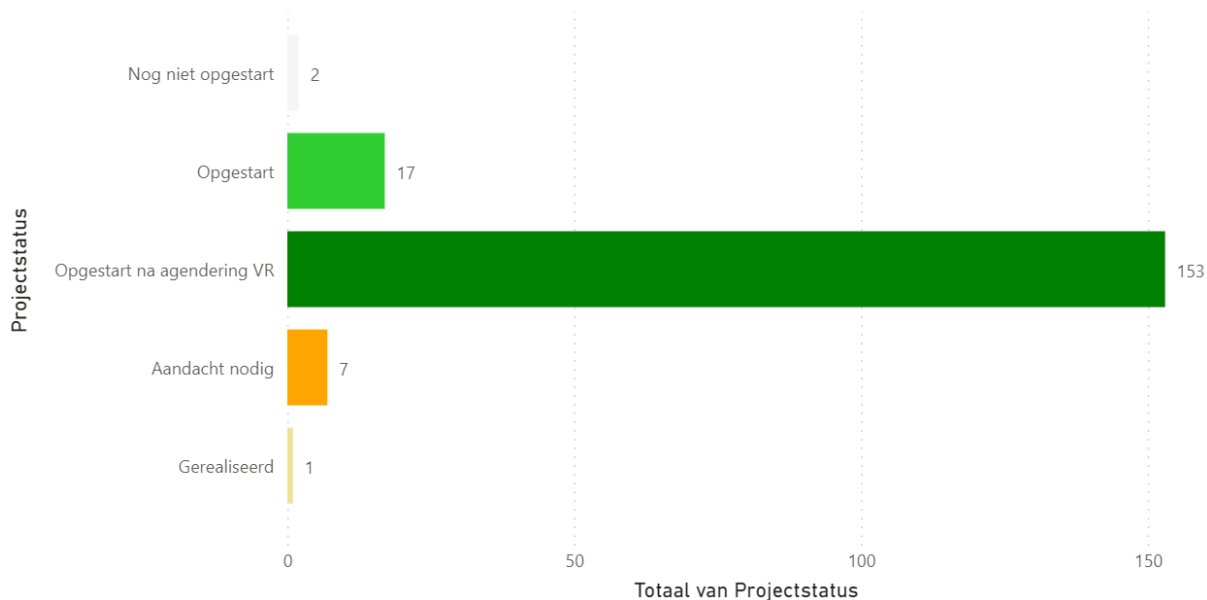

In vergelijking met de meting in april en september 2021 is duidelijk vooruitgang geboekt. Nog slechts 2 projecten moeten formeel van start gaan. Kanttekening is wel dat het aantal projecten waarvoor aandacht nodig is toeneemt, nl. van 1 naar 7 projecten.

Voortgang



6.2. Mijlpalen


6.2.1. Mijlpalen voor VV001-VV180

Naast de algemene statusvoortgang van de 180 projecten, worden voor elk van deze projecten ook de onderliggende mijlpalen opgevolgd. Deze zijn voor meting 3 verder verfijnd t.a.v. meting 1 en 2.

Een mijlpaal blijft op 'nog niet gestart' staan, zolang er binnen het project geen relevante activiteit is met betrekking tot deze mijlpaal. Pas wanneer de uitvoering van deze mijlpaal effectief gestart is, wordt bepaald of deze mijlpaal al dan niet 'op schema' is.

Bij de meting in december 2021 werden bijkomende mijlpalen opgenomen. Het aantal mijlpalen steeg daarbij van 1006 naar 1257 mijlpalen. Deze bijkomende detaillering zal de voortgangsrapportering in de toekomst nog transparanter en fijnmaziger maken. Het valt te verwachten dat, naarmate de projecten nog verder in uitvoering zijn, nog mijlpalen toegevoegd zullen worden.


In een eerste grafiek wordt een overzicht gegeven van alle vastgelegde mijlpalen in 2020, 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Op deze manier wordt achteruit gekeken maar ook al een beetje vooruit naar het volgende meetmoment. We zien bij deze meting van december een verdubbeling van het aantal gerealiseerde mijlpalen; 333 tegenover 162 in september 2021. Eind december 2021 zijn er 152 mijlpalen op schema die worden verwacht te worden behaald in het eerste kwartaal van 2022. Tot slot zijn er 52 vertraagde mijlpalen, 33 nog op te starten mijlpalen en 1 bij te sturen mijlpaal. De bij te sturen mijlpaal bevindt zich in project VV113 'Blended-care jeugdhulp – Bandbreedte'.

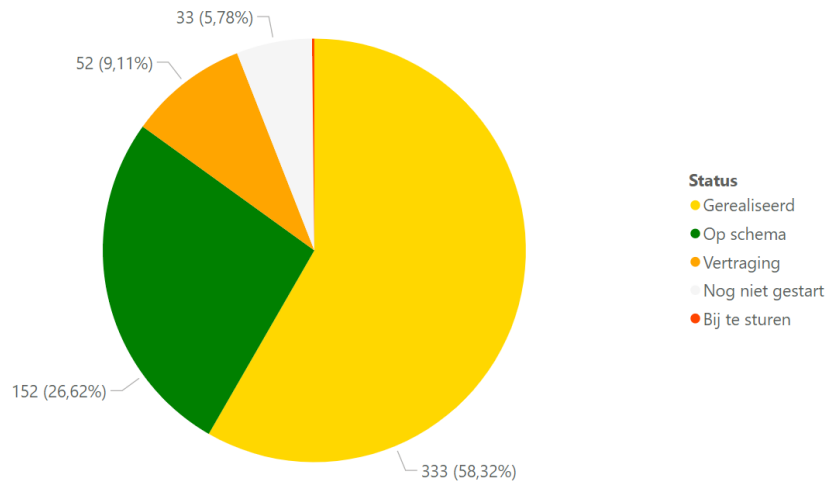

Status mijlpalen 2020 – 2021 – Q1 van 2022

Een tweede grafiek toont de status van alle mijlpalen van de 180 relanceprojecten tot de datum van de laatste mijlpaal die werd opgenomen in het vierde kwartaal van 2030.

Het aantal gestarte mijlpalen dat op schema is daalde tussen september 2021 en december 2021 van 479 (47,61%) naar 465 (36,99%), maar het aantal gerealiseerde mijlpalen steeg van 165 (16,4%) naar 347 (27,61%). Dat zijn er 14 meer dan in de vorige grafiek doordat deze mijlpalen na Q1 2022 staan gepland maar al vroegtijdig werden gerealiseerd. Voor 61 mijlpalen (4,85%) wordt een vertraging vastgesteld, dat waren er bij de vorige meting 28 (2,78%).

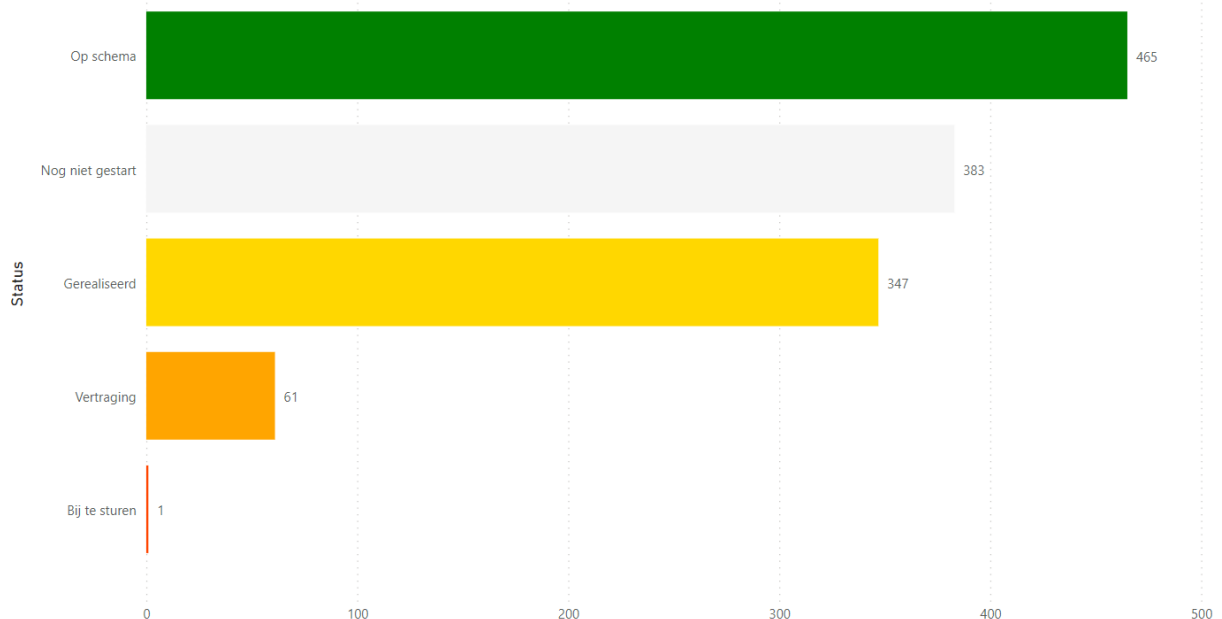


Status totaal aantal mijlpalen 2020 t.e.m. laatste mijlpaal in 2030

Bij deze derde meting zijn 811 van de 874, of 92,9% van de gestarte mijlpalen op schema of reeds gerealiseerd, ten opzichte van 95,4% bij de vorige meting.

6.2.2. Mijlpalen per speerpunt


Onderstaande figuur geeft het globale overzicht van alle mijlpalen (van 2020 t.e.m. 2030) over de 7 speerpunten, met telkens de verhouding (%) van elke status binnen de mijlpalen die voor dat speerpunt opgemaakt zijn. Hieruit kan men aflezen dat quasi alle speerpunten globaal gezien op eenzelfde niveau zitten qua aangevatte mijlpalen (70-80% gerealiseerd, vertraagd of op schema). Enkel speerpunten 02 en 06 wijken hiervan af. Speerpunt 06 ('De coronacrisis beheren en Brexit') kent reeds relatief veel gerealiseerde mijlpalen en mijlpalen op schema. Dit heeft deels met de crisisbestrijdende en dus dringendere aard van deze projecten te maken. Bij speerpunt 02 ('Investeren in infrastructuur') liggen nog relatief veel mijlpalen in de toekomst. Dit is grotendeels te wijten aan de lange doorlooptijd van infrastructuurinvesteringen. Speerpunt 05 ('Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken') kent het grootste aandeel gerealiseerde mijlpalen. Speerpunt 03 ('Vlaanderen digitaal transformeren') heeft het grootste aandeel mijlpalen in vertraging.

Hieronder worden alle mijlpalen per speerpunt opgenomen, en per speerpunt wordt aangeduid welke outputindicatoren al ver gevorderd zijn in hun realisatie. Hiervoor is hoofdzakelijk het criterium gehanteerd dat de realisatiegraad 50% of meer moet bedragen.

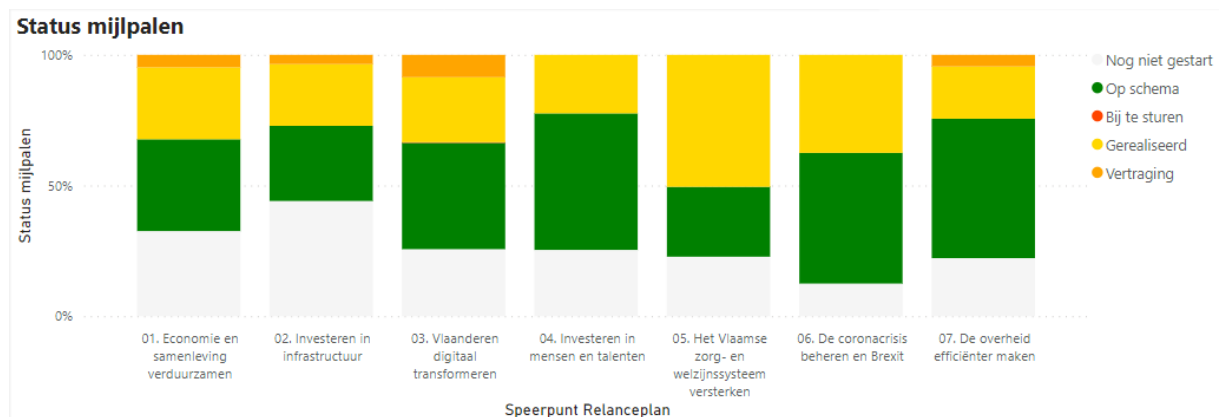

Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (48 projecten)

De mijlpalen binnen dit speerpunt hebben volgende status:

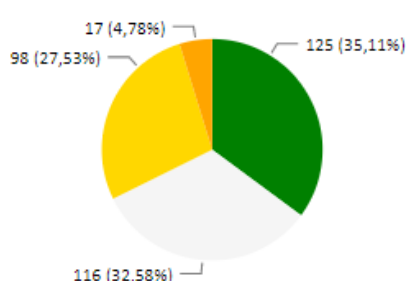

- Op schema
- Nog niet gestart
- Gerealiseerd
- Vertraging

- 98 mijlpalen zijn gerealiseerd;
- 125 mijlpalen hebben status 'op schema';
- 17 mijlpalen hebben status 'vertraging' (waarvan 9 normaliter vielen in Q4 2021);
- 116 mijlpalen hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen).

De 17 mijlpalen in vertraging hebben betrekking op 14 projecten (VV001, VV002, VV003, VV005 (2), VV008, VV011 (2), VV020 (2), VV022, VV026, VV029, VV030, VV031, VV033, VV034). Geen van de

vertragingen wijst op een ernstig probleem. Van een aantal vertragingen wordt sowieso verwacht dat zij in Q1 van 2022 zullen worden weggewerkt.

Volgende projecten onder speerpunt 1 zijn reeds ver gevorderd met bepaalde acties:

- VV007 'Financiering flankerend beleid transitie oude elektrische verwarming en toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet' – De thuisbatterij kan het zelfverbruik en de flexibiliteit verhogen en aldus de investering in zonnepanelen rendabeler maken. Daarom is voorzien in een hogere premie voor thuisbatterijen. De premie is een succes: het aantal toegekende premies sinds Q2-2021 is 10.588 (streefwaarde 7.740).
- VV022 'Versterking O&O bedrijven' – Na de Coronacrisis zal innovatie nog meer dan voorheen bepalend zijn voor de concurrentiekracht van onze bedrijven en de economische groei. Daarom wil men het O&O-instrumentarium verbreden naar kleine bedrijven. Intussen zijn de eerste 108 projecten geselecteerd (streefwaarde 100) en is ca. 30 miljoen euro aan middelen vastgelegd.
- VV024 'Groenblauwe infrastructuur – open ruimte' – Het project groenblauwe infrastructuur – open ruimte wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied. In functie van vernatting werd o.a. 95 ha grond aangekocht (63% van streefwaarde 150 ha grond in 2026).
- VV101 'Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen' – Om te kunnen beschikken over voldoende kwalitatieve ruimte om te ondernemen, is een inhaalbeweging voor de vernieuwing van bedrijventerreinen voorzien. Intussen zijn 3 dossiers goedgekeurd voor een bedrag van 4,761 miljoen euro (60% van streefwaarde 5 dossiers).
- VV106 'Vergroening openbaar vervoer De Lijn' – De Lijn plaatste voor de overgang naar een groene en duurzame busvloot de voorziene eerste vier grote bestellingen:
 - ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen;
 - 44 gelede e-hybride bussen;
 - 60 e-bussen;
 - laadinfrastructuur voor de e-bussen en e-hybride bussen.

Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (39 projecten)

De mijlpalen binnen dit speerpunt hebben volgende status:



De 9 mijlpalen in vertraging hebben betrekking op 5 projecten (VV037, VV042, VV078, VV087, V156). Twee projecten (VV078 Cultuurhuis Blankenberge en VV087 Materniteit De Bijloke – de Creatiecluster Gent) vergen extra aandacht. Van de mijlpalen in het kader van de andere projecten wordt verwacht dat de vertraging in Q1 van 2022 zal zijn weggewerkt.

Volgende projecten onder speerpunt 2 zijn reeds ver gevorderd met bepaalde acties:


- VV156 'Jeugdinfrastructuur' – In het project Jeugdinfrastructuur worden naast de investeringen in de bouw, inrichting, energiezuinigheid en toegankelijkheid van jeugdsites

ook middelen voorzien voor de Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK). Met het oog op de aankoop van senior- en patrouilletenten voor de uitbreiding van de stock in de ULDK zijn er 386 besteld (>100% van de doelstelling).

- VV157 'Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel' – In 2021 en 2022 wordt er geïnvesteerd in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt. In het kader van de digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur zijn de projecten Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel opgeleverd (100%).

Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (46 projecten)

De mijlpalen binnen dit speerpunt hebben volgende status:

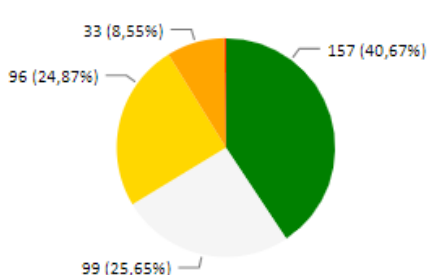

- Op schema
- Nog niet gestart
- Gerealiseerd
- Vertraging
- Bij te sturen
- 96 mijlpalen zijn gerealiseerd;
- 157 mijlpalen hebben status 'op schema';
- 33 mijlpalen hebben status 'vertraging' (waarvan 23 Q4 2021);
- 1 mijlpaal heeft status 'bij te sturen';
- 99 mijlpalen hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen).

De 33 mijlpalen in vertraging hebben betrekking op 14 projecten (VV050, VV056, VV057, VV058, VV065, VV071, VV075, VV113, VV118, VV120, VV130, VV131, VV168, VV169). De mijlpaal 'bij te sturen' heeft betrekking op VV113. Het ziet ernaar uit dat quasi alle vertragingen in de loop van 2022 worden weggewerkt. Een uitrol van 80% digitale meters bij 'kleinverbruiksmeterinrichtingen' tegen eind 2024 (VV168) blijft weliswaar een uitdaging, maar een communicatiecampagne in 2022 moet bijdragen tot het creëren van het nodige maatschappelijke draagvlak.


In dit speerpunt is de beperkte beschikbaarheid van IT-profielen op de arbeidsmarkt een meermaals aangehaalde oorzaak voor vertragingen.

Volgende projecten onder speerpunt 3 zijn reeds ver gevorderd met bepaalde acties:

- VV070 'MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem' – OVAM ontwikkelt een nieuwe tool (MATIS) voor gegevensinzameling, -validatie en -ontsluiting, zodat ze het afval kan volgen doorheen de diverse voorbehandelingen tot het effectief gerecycleerd wordt. Van de softwaremodule gegevensinzameling huishoudelijk afval is een eerste versie in productie. Van de softwaremodule gegevensverwerking van afval is de eerste versie in gebruik.
- VV168 'Versnelde uitrol digitale meters' – Als onderdeel van de versnelde uitrol van de digitale meters werd 74% van de kleinverbruikers met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of gas omgebouwd naar een digitale meter.

Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (9 projecten)

De mijlpalen binnen dit speerpunt hebben volgende status:




- 15 mijlpalen zijn gerealiseerd;
- 35 mijlpalen hebben status 'op schema';
- 17 mijlpalen hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen).

Volgende projecten onder speerpunt 4 zijn reeds ver gevorderd met bepaalde acties:

- VV018 'Opleidingsoffensief arbeidsmarkt' – Om zowel werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen als ondernemingen en zelfstandige ondernemers meer wendbaar en beter inzetbaar te maken, zet dit project versneld in op de omslag naar levenslang leren.
 - De actie rond duurzaam telewerken werd gerealiseerd: De goedgekeurde projecten (31 ondernemingen) gingen van start. 18.000 werknemers verdeeld over 237 opleidingen worden bereikt.
 - Ook de eenmalige verruiming en verhoging van de stagebonus is gerealiseerd: er werden 3.076 aanvragen goedgekeurd en een bedrag van 3,076 miljoen euro werd uitbetaald.
 - Het aandeel tijdelijk werklozen dat ingaat op het opleidingsaanbod van de VDAB steeg met 5% (streefwaarde + 3,4%)
 - VDAB tracht ook zo veel mogelijk tijdelijk werklozen te overtuigen (bereik van 98,6%) om de periode van tijdelijke werkloosheid te benutten voor een vorm van competentieversterking.

Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (22 projecten)

De mijlpalen binnen dit speerpunt hebben volgende status:

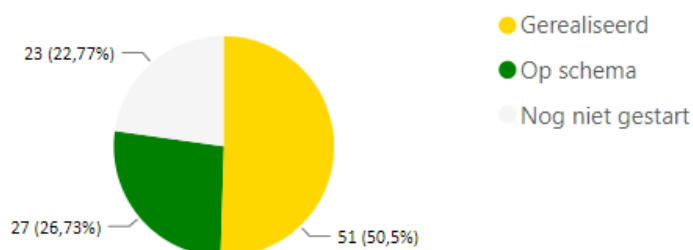

- 51 mijlpalen zijn gerealiseerd;
- 27 mijlpalen hebben als status 'op schema';
- 23 mijlpalen hebben als status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen).


Volgende projecten onder speerpunt 5 zijn reeds ver gevorderd met bepaalde acties:

- VV045 'Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid' – Om de gestegen zorgzwaarte en werkdruk in de ouderenzorg op te vangen en de kwaliteit van zorg te versterken werd in het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA6) afgesproken om maximaal in te zetten op bijkomende tewerkstelling. Er zijn m.b.t. 2.660,4 bijkomende VTE aanwervingsdata doorgegeven via het e-loket van AZG (streefwaarde VIA6 akkoord 2.264)
- VV046 'Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen' – Het strategisch forfait voor ziekenhuizen wordt opgetrokken. In juli en november 2021 besliste de Vlaamse Regering daarom al over dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen, resp. voor 16.789.154,90 euro (100%) en 4.280.729,38 euro (100%). Het strategisch forfait voor ziekenhuizen is gelinkt aan een infrastructuurinvestering die past binnen een zorgstrategisch kader voor Vlaanderen.

- VV121 'Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1' – Meerderjarige personen met een handicap in prioriteitengroep 1 kunnen vanaf 2021 versneld een persoonsvolgend budget ontvangen waarmee ze hun zorgbehoefte kunnen invullen. Op 1 december 2021 kregen reeds 2.250 personen van de voorziene 2.700 (84%) zo'n persoonsvolgend budget.
- VV141 'Versterking aanpak intra-familiaal geweld - crisisopvang en crisisbegeleiding in residentiële jeugdzorg' – Dit project zet in op de aanpak van crisissituaties in gezinnen door jeugdhulp, als reactie op verontrustende opvoedingssituaties die naar aanleiding van corona nog toenamen. Intussen werden 302 jongeren begeleid met de projectmiddelen (77% van streefwaarde 400).
- VV145 'Buitenschoolse opvang ondersteunen' – Het groeipad van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) wordt vervroegd, zodat lokale besturen met een hoog percentage kwetsbare gezinnen, hoog aantal schoolgaande kinderen en op heden weinig subsidies voor buitenschoolse opvang, vervroegd aan de slag kunnen met de decretale doelstellingen. Alle lokale besturen die in aanmerking kwamen voor de subsidie, dienden een ontvankelijke aanvraag in. Deze 43 lokale besturen (100%) ontvangen sinds 01/09/2021 de BOA-subsidie.
- VV152 'Projectoproep kwetsbare kinderen' – Dit relanceproject financiert innovatieve projecten die de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties duurzaam versterken. De projectoproep biedt hefboomen aan lokale en bovenlokale netwerken om hun werking inhoudelijk te verdiepen, te innoveren of hun werking geografisch of functioneel te verbreden en/of uit te bouwen. Alle 29 voorziene projecten zijn intussen opgestart (100%).

Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (11 projecten)

De mijlpalen binnen dit speerpunt hebben volgende status:

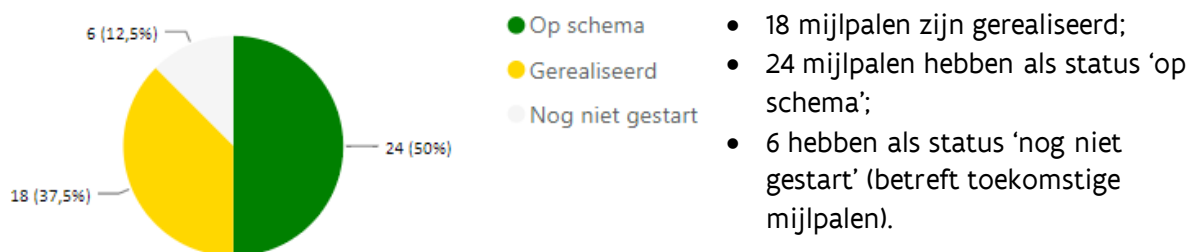

Volgende projecten onder speerpunt 6 zijn reeds ver gevorderd met bepaalde acties:

- VV154 'Impuls aan VAF Filmfonds' – Van de 70 filmproducties en -organisaties die tegen eind 2022 door het VAF zouden worden ondersteund met bijkomende relancemiddelen, kregen er eind 2021 al 47 hun middelen (67%).
- VV155 'Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds' – Daarnaast kregen ook al 11 van de 20 voorziene audiovisuele producties (televisiereeksen en games) ondersteuning met bijkomende relancemiddelen (55%).
- VV163 'PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Pakket van 500 miljoen euro voor zeer goedkope achtergestelde leningen aan enerzijds start-ups & scale-ups en anderzijds KMO's' – Om bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis extra ademruimte te geven, voorzag PMV op haar reguliere middelen een pakket van 500 miljoen euro voor zeer goedkope achtergestelde leningen aan enerzijds start-ups en scale-ups en anderzijds KMO's. Aan die twee doelgroepen zijn intussen resp. 79% en 78% van de leningen uitbetaald.

- VV166 'PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Uitbreiding van de win-win-lening en vriendenaandeel' – Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, werd de winwinlening versoepeld. Het gaat ook hier om een uitbreiding van de reguliere werking en middelen van PMV. Sinds de uitbreiding van de winwinlening in Q4 2020 tot Q4 2021 werden 9.690 winwinleningen geregistreerd (streefwaarde was 6000) voor een bedrag van 183,6 miljoen euro (streefwaarde was 150 miljoen).

Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (5 projecten)

De mijlpalen binnen dit speerpunt hebben volgende status:



De twee mijlpalen met vertraging hebben beide betrekking op VV162 ('Investeren in Vlaamse kennisoverheid'), een project met 22 mijlpalen. De vertraging m.b.t. de 2 betreffende mijlpalen wordt in 2022 weggewerkt.

Volgende projecten onder speerpunt 7 zijn reeds ver gevorderd met bepaalde acties:

- VV158 'Spending reviews' – De Vlaamse Brede Heroverweging heeft als doel de kwaliteit van de openbare financiën te verbeteren. De eindresultaten van deze doorlichting zijn beschikbaar en vonden reeds hun weg in de begroting 2022. Op basis van de resultaten heeft de Vlaamse Regering op 19 november 2021 nu ook per beleidsdomein de specifieke uitgaventoetsingen (spending reviews) opgestart.
- VV160 'Administratieve vereenvoudiging' – De eerste fase van het project Administratieve Vereenvoudiging is afgerond en resulteerde onder meer in de oplijsting van vereenvoudigingsprojecten op voorstel van de Vlaamse administratie. De eerste vereenvoudigingsagenda werd voorgelegd aan de Vlaamse Regering op 10 december 2021.

6.3. Vastleggingen en vereffeningen

6.3.1. Vastleggingen en vereffeningen voor VV001-VV158


De vastleggingen en vereffeningen zijn een goede indicator voor de voortgang van een project. Projecten VV001-VV158 worden gefinancierd door de voorziene 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen. Projecten VV159-180 worden gefinancierd met bijkomende reguliere middelen. Vastleggingen en vereffeningen worden voor deze laatstgenoemde projecten niet apart opgevolgd en kan men opvolgen via de jaarlijkse Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT). De cijfers hieronder slaan dus enkel op de vastleggingen en vereffeningen van de projecten VV001-VV158 en de voorziene 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen.

1,524 miljard euro of 35,41% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was vastgelegd op meetmoment 31 december 2021. Dat is het dubbele van het bedrag in september 2021 (750 miljoen euro).

219 miljoen euro of 5,08 % van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was eind december 2021 vereffend. Dat is 142 miljoen euro meer dan in september 2021.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend



6.3.2. Vastleggingen per speerpunt voor VV001-VV158

Gezien de aanzienlijke toename van de vastleggingen in december 2021 in vergelijking met de meetmomenten in april en september van 2021, loont het de moeite om de opdeling te maken van vastleggingen per speerpunt. Men kan vaststellen dat eind december 2021 voor 3 speerpunten (1, 2 en 4) al 37% of meer van de voorziene middelen vastgelegd is. Speerpunten 3, 5, 6 en 7 hebben substantieel lagere vastleggingen op meetmoment december 2021 in vergelijking met deze 3 speerpunten.


Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (43 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 1 bedragen 610,838 miljoen euro of 38,03% van de voorziene relancemiddelen (1,6 miljard euro) binnen dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 1 bedragen 93,328 miljoen euro of 5,81% van de voorziene relancemiddelen binnen dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (38 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 2 bedragen 457,056 miljoen euro of 40,49 % van de voorziene relancemiddelen (1,129 miljard euro) binnen dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 2 bedragen 45,071 miljoen euro of 3,99 % van de voorziene relancemiddelen binnen dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (44 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 3 bedragen 95,744 miljoen euro of 21,42% van de voorziene relancemiddelen (447 miljoen euro) binnen dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 3 bedragen 39,100 miljoen euro of 8,75% van de voorziene relancemiddelen binnen dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (6 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 4 bedragen 289,291 miljoen euro of 40,12% van de voorziene relancemiddelen (721 miljoen euro) binnen dit speerpunt.

De vastleggingen voor speerpunt 4 bedragen 18,040 miljoen euro of 2,5% van de voorziene relancemiddelen binnen dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (20 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 5 bedragen 51,130 miljoen euro of 18,26 % van de voorziene relancemiddelen (280 miljoen euro) binnen dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 5 bedragen 17,781 miljoen euro of 6,35 % van de voorziene relancemiddelen binnen dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (6 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 6 bedragen 18,144 miljoen euro of 16,06% van de voorziene relancemiddelen (113 miljoen euro) binnen dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 6 bedragen 4,576 miljoen euro of 4,05% van de voorziene relancemiddelen binnen dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (1 project)

De vastleggingen voor speerpunt 7 bedragen 1,703 miljoen euro of 17,03% van de voorziene relancemiddelen (10 miljoen euro) binnen dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 7 bedragen 0,992 miljoen euro of 9,92% van de voorziene relancemiddelen binnen dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend



7. Detailcijfers over de relanceprojecten

Voor de detailcijfers over de relanceprojecten volgen we de indeling van de [Mededeling aan de VR van 5 februari 2021](#) en werken we aan de hand van 35 clusters. De eerste 34 clusters worden gefinancierd door de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen. Cluster 35 wordt gefinancierd met reguliere middelen.

Voor elk project wordt hieronder een projectstatuskleur gegeven (meetmoment december 2021) en een status van de mijlpalen. De **algemene projectstatus** wordt met volgende kleuren weergegeven:

- Donkergroen : Dit project is opgestart en werd al minstens 1 keer deels of volledig geagendeerd op de Vlaamse Regering.
- Lichtgroen: Dit project is opgestart maar werd nog niet geagendeerd op de Vlaamse Regering.
- Oranje: Voor dit project is bijzondere aandacht nodig voor één of enkele deelaspecten.
- Rood: Voor dit project is bijkomende actie noodzakelijk.
- Geel: Dit project is gerealiseerd.
- Grijs: Dit project is nog niet gestart.

De **status** van de **mijlpalen** worden per cluster in een grote grafiek (tenzij de cluster één project omvat), en per project in een mini-grafiek weergegeven. Voor beiden geldt volgende kleurencode:


- Donkergroen: Mijlpaal waarvoor de acties opgestart en op schema zijn.
- Oranje: Mijlpaal die vertraging oploopt.
- Rood: Mijlpaal die moet worden bijgestuurd.
- Blauw: Mijlpaal die stopgezet werd.
- Geel: Mijlpaal die werd gerealiseerd.
- Grijs: De uitvoering van de mijlpaal is nog niet gestart, maar dit is conform het afgesproken tijdsplan. Een mijlpaal blijft op 'nog niet gestart' staan, zolang er binnen het project geen relevante activiteit is met betrekking tot deze mijlpaal. Pas wanneer de uitvoering van deze mijlpaal effectief gestart is, wordt bepaald of deze mijlpaal al dan niet 'op schema' is.

Daarnaast wordt voor elk project aangegeven wat de begrote middelen zijn, maar ook wat de vastleggingen en vereffeningen zijn op 31 december 2021 (met een vergelijking met meetmoment 2).

Cluster 1 Renovatie gebouwenpatrimonium

Alle projecten in deze cluster hebben de projectstatus 'opgestart na goedkeuring op de Vlaamse Regering' en zijn in uitvoering (tabel kolom 3).

Van de 62 mijlpalen in deze cluster, zijn er 8 met vertraging (taartdiagram). Deze bevinden zich binnen het project VV001, VV002, VV003, VV005, VV008 en VV011 (tabel kolom 4). Deze mijlpalen krijgen een oranje kleur.

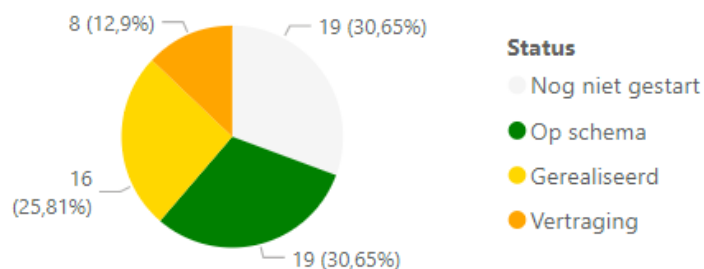


De vastleggingen in deze cluster zijn gestegen van 5.010.669 € naar 215.134.000 €. De vereffeningen in deze cluster zijn gestegen van 5.010.669 € naar 17.448.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV001	Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie	●	●	30 mio €	9/21	/	/
					12/21	344.000 €	344.000 €
VV002	Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie	●	●	12 mio €	9/21	/	/
					12/21	74.000 €	74.000 €
VV003	Asbestpremie daken residentieel met isolatie	●	●	42 mio €	9/21	/	/
					12/21	721.000 €	721.000 €
VV004	Circulaire economie - asbest (lokale besturen)	●	●	27,6 mio €	9/21	/	/
					12/21	10.083.000 €	180.000 €
VV005	Circulaire economie - asbest (sectorprotocollen)	●	●	12,4 mio €	9/21	/	/
					12/21	672.000 €	/
VV006	Financiering energieluik woningrenovatiepremie	●	●	180 mio €	9/21	/	/
					12/21	180.000.000 €	/
VV007	Financiering flankerend beleid transitie oude elektrische verwarming en toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet	●	●	20,05 mio €	9/21	1.165.669 €	1.165.669 €
					12/21	8.470.000 €	8.470.000 €
VV008	EPC-labelpremie residentieel	●	●	25,35 mio €	9/21	/	/
					12/21	190.000 €	190.000 €
VV009	Renovaties sociale woningen versnellen	●	●	30 mio €	9/21	/	/
					12/21	9.165.000 €	2.054.000 €
VV010	Sociale woningbouw	●	●	5 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV011	VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid	●	●	20 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV012	Verlenging en uitbreiding sloop- en heropbouwpremie	●	●	17,6 mio €	9/21	3.845.000 €	3.845.000 €
					12/21	5.415.000 €	5.415.000 €
Totaal				422 mio €	9/21	5.010.669 €	5.010.669 €
					12/21	215.134.000 €	17.448.000 €

Cluster 2 Fietsinfrastructuur

De 2 projecten in deze cluster zijn opgestart en werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

De mijlpalen in deze cluster zijn op schema of gerealiseerd (zie taartdiagram en tabel kolom 4).

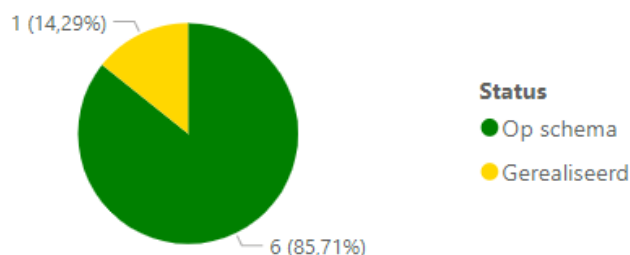

Het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet is toegenomen van respectievelijk 42.124.000 € en 505.205 € tot 96.782.000 € en 7.586.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV013	De inrichting van een groter en veiliger fietsnetwerk (incl. fietstoegang economische poorten en jaagpaden) maakt de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel en helpt zo het gebruik van personenwagens te reduceren	●	●	250 mio €	9/21	42.124.000 €	505.205 €
					12/21	96.129.000 €	7.586.000 €
VV014	Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen	●	●	150 mio €	9/21	/	/
					12/21	653.000 €	/
Totaal				400 mio €	9/21	42.124.000 €	505.205 €
					12/21	96.782.000 €	7.586.000 €

Cluster 3 Digitale versnelling leerplichtonderwijs

Het project digitale versnelling leerplichtonderwijs is opgestart en werd al geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

De mijlpalen in deze cluster zijn op schema of gerealiseerd (tabel kolom 4).


De vastleggingen voor dit project bedroegen in september 231.524.414 € en het vereffeningskrediet 283.296 €, en zijn bij deze meting toegenomen tot respectievelijk 237.287.000 € en 1.968.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV015	Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong)	●	●	375 mio €	9/21	231.524.414 €	283.296 €
					12/21	237.287.000 €	1.968.000 €

Cluster 4 Opleidings- en loopbaanoffensief

De 4 projecten in deze cluster zijn opgestart en werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

In deze cluster zijn 7 mijlpalen gerealiseerd en 22 mijlpalen gestart en op schema. Voor drie mijlpalen moeten de acties nog opgestart worden (zie taartdiagram en tabel kolom 4).

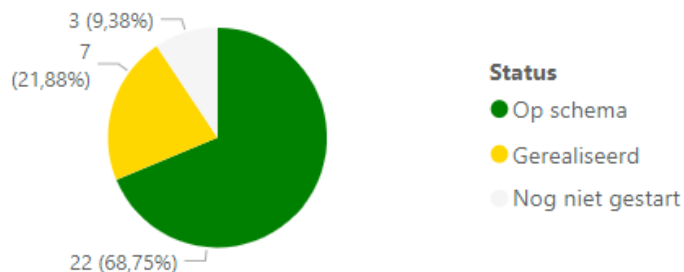


De vastleggingen voor deze projecten stegen van 4.027.677 € naar 51.980.000 €, en het vereffeningskrediet van 877.875 € naar 16.051.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV016	Activering-verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC	●	●	14 mio €	9/21	129.700 €	77.250 €
					12/21	12.372.000 €	372.000 €
VV017	Extra aandacht meest kwetsbaren	●	●	90 mio €	9/21	3.897.977 €	800.625 €
					12/21	16.952.000 €	1.861.000 €
VV018	Opleidingsoffensief arbeidsmarkt	●	●	122 mio €	9/21	/	/
					12/21	14.554.000 €	12.434.000 €
VV019	Versterken Levenslang Blijven Leren	●	●	60 mio €	9/21	/	/
					12/21	8.102.000 €	1.384.000 €
Totaal				286 mio €	9/21	4.027.677 €	877.875 €
					12/21	51.980.000 €	16.051.000 €

Cluster 5 Versterking Onderzoek en Ontwikkeling

De 4 projecten in deze cluster zijn intussen allen geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3); projecten VV021 en VV023 zijn aan de geagendeerde projecten toegevoegd.

Binnen deze cluster hebben 3 mijlpalen vertraging opgelopen. Ze situeren zich binnen de projecten VV020 'Bio-economie' en VV022 'Versterking O&O bedrijven'. De meeste mijlpalen zijn op schema of reeds gerealiseerd (zie taartdiagram en tabel kolom 4).

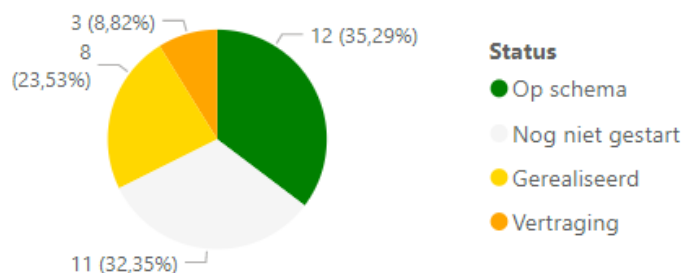


De vastleggingen in deze cluster stegen van 23.258.577 € naar 76.399.000 €. De vereffeningen stegen van 7.727.433 € naar 22.988.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV020	Bio-economie	●	●	20 mio €	9/21	1.277.000 €	340.000 €
					12/21	1.327.000 €	390.000 €
VV021	Onderzoeksinfrastructuur (bij Strategische Onderzoekscenari's (SOC's), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstituten en hoger onderwijs)	●	●	101,13 mio €	9/21	1.276.579 €	/
					12/21	42.990.000 €	11.347.000 €
VV022	Versterking O&O bedrijven	●	●	100 mio €	9/21	20.704.998 €	7.387.433 €
					12/21	29.982.000 €	11.251.000 €
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	●	●	58,86 mio €	9/21	/	/
					12/21	2.100.000 €	/
Totaal				280 mio €	9/21	23.258.577 €	7.727.433 €
					12/21	76.399.000 €	22.988.000 €

Cluster 6 Blue Deal

Alle projecten in deze cluster zijn geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

Een kwart van de mijlpalen in deze cluster zijn gerealiseerd (taartdiagram). Enkele mijlpalen in deze cluster liepen vertraging op, binnen projecten VV026, VV029, VV030, VV031, VV033 en VV034 (tabel kolom 4).

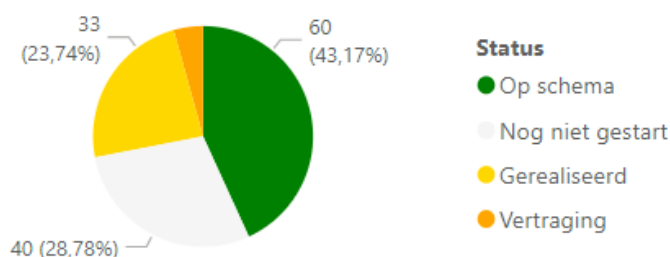

De vastleggingen in deze cluster stegen van 38.788.837 € naar 81.780.000 €. De vereffeningen stegen van 3.814.562 € naar 27.683.000 € (tabel kolom 5-8).


Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	●	●	40 mio €	9/21	6.411.000 €	/
					12/21	7.969.000 €	6.222.000 €
VV025	Blue Deal – onderzoek	●	●	6 mio €	9/21	1.472.742 €	96.000 €
					12/21	1.473.000 €	96.000 €
VV026	Blue Deal – MOW	●	●	35 mio €	9/21	15.063.000 €	/
					12/21	25.660.000 €	273.000 €
VV027	Blue Deal – Economie	●	●	10 mio €	9/21	1.416.104 €	/
					12/21	1.623.000 €	/
VV028	Droogteresistente teelten	●	●	8 mio €	9/21	/	/
					12/21	3.999.000 €	400.000 €
VV029	Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	●	●	10 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV030	Hergebruik van restwater	●	●	10 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/

VV031	Groenblauwe infrastructuur - bebouwde omgeving			20 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV032	Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen			45 mio €	9/21	233.524 €	/
					12/21	8.606.000 €	5.619.000 €
VV033	Sensibilisering, opleiding en advisering			6 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV034	Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen			23 mio €	9/21	/	/
					12/21	2.462.000 €	657.000 €
VV035	Groenblauwe infrastructuur - waterlopen			30 mio €	9/21	8.757.300 €	/
					12/21	9.201.000 €	218.000 €
VV036	Natte natuur			100 mio €	9/21	5.435.167 €	3.718.562 €
					12/21	20.787.000 €	14.198.000 €
Totaal				343 mio €	9/21	38.788.837 €	3.814.562 €
					12/21	81.780.000 €	27.683.000 €

Cluster 7 Investerings in verkeersveilige wegen

Binnen de cluster 'Investerings in verkeersveilige wegen' zijn de 4 projecten opgestart en al geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

Binnen deze cluster zijn de meeste mijlpalen op schema. Twee mijlpalen liepen vertraging op binnen project VV037 'Assetmanagement - aanpakken cat. 4-kunstbouwwerken in slechte staat' (taartdiagram en tabel kolom 4).

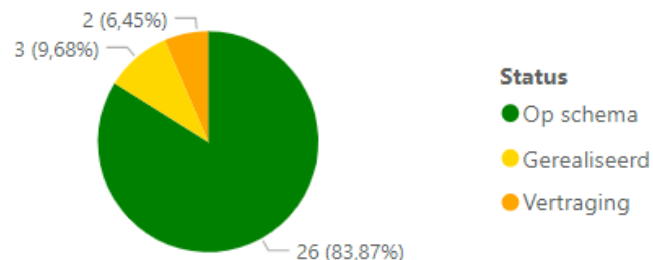

De vastleggingen in deze cluster stegen van 59.649.237 € naar 116.534.000 €, de vereffeningen stegen van 21.684.792 € naar 27.476.000 € (tabel kolom 5-8).


Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV037	Assetmanagement - aanpakken cat. 4-kunstbouwwerken in slechte staat			100 mio €	9/21	48.488.000 €	19.805.875 €
					12/21	52.837.000 €	23.921.000 €
VV038	Aanpak gevaarlijke punten			50 mio €	9/21	3.447.910 €	24.721 €
					12/21	35.386.000 €	396.000 €
VV039	Versnelling investeringen in veilige schoolroutes			30 mio €	9/21	2.461.386 €	1.853.119 €
					12/21	14.752.000 €	3.125.000 €
VV040	Versnelling verkeerslichtenbeïnvloeding voor een betere en veiligere doorstroming voor de fietser en dynamisch verkeersmanagement			20 mio €	9/21	5.251.941 €	1.077 €
					12/21	13.559.000 €	34.000 €

Totaal	200 mio €	9/21	59.649.237 €	21.684.792 €
		12/21	116.534.000 €	27.476.000 €

Cluster 8 Modal shift naar water

Binnen de cluster 'Modal shift naar water' zijn de 4 projecten opgestart en geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen, tabel kolom 3).

Uitgezonderd één mijlpaal, zijn alle mijlpalen binnen deze cluster op schema (taartdiagram en tabel kolom 4).

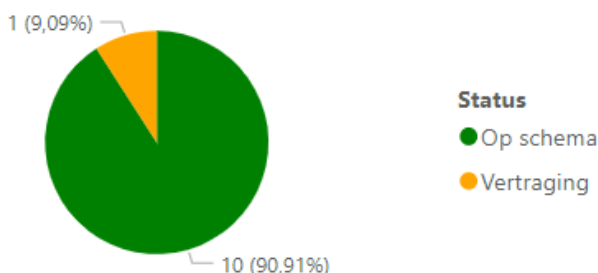


Het vastgelegde budget binnen deze cluster steeg van 12.139.000 € naar 91.083.000 € en het vereffende budget binnen deze cluster bedraagt eind december 2021 4.676.000 €. (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV041	Modal shift naar water - Albertkanaal (versneld verhogen van bruggen)	●	●	96 mio €	9/21	9.221.000 €	/
					12/21	87.643.000 €	4.497.000 €
VV042	Modal shift naar water - extra kaaimuren	●	●	20 mio €	9/21	2.918.000 €	/
					12/21	3.049.000 €	179.000 €
VV043	Modal shift naar water - opstart Dender (verhoging watertransportcapaciteit)	●	●	21 mio €	9/21	/	/
					12/21	391.000 €	/
VV044	Onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge	●	●	27 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
Totaal				164 mio €	9/21	12.139.000 €	/
					12/21	91.083.000 €	4.676.000 €

Cluster 9 Welzijnsinfrastructuur

Binnen de cluster welzijnsinfrastructuur waren de projecten bij de vorige meting nog niet gestart. De beide projecten zijn nu wel opgestart en geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

Alle mijlpalen binnen deze cluster zijn op schema of reeds gerealiseerd (taartdiagram en tabel kolom 4).

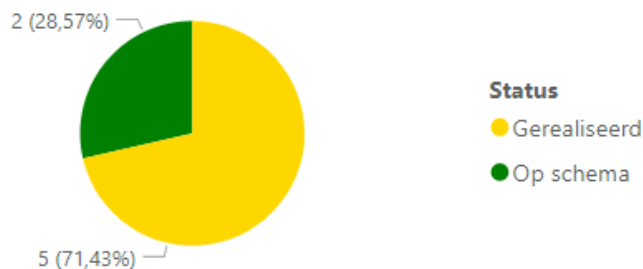

De vastleggingen en vereffeningen binnen deze cluster bedragen eind december 9.211.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV045	Inzetten op kwaliteit en goed governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid			138,25 mio €	9/21	50,5 mio € *	/
					12/21	9.211.000 €	9.211.000 €
VV046	Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen			10 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
Totaal				148,25 mio €	9/21	50.500.000 €	/
					12/21	9.211.000 €	9.211.000 €

* Dit betrof een prognose.

Cluster 10 Waterstofonderzoek

Het project waterstofonderzoek is opgestart, maar heeft nog geen formele agendering langs de Vlaamse Regering doorlopen (tabel kolom 3).

Twee mijlpalen in dit project zijn reeds gerealiseerd (tabel kolom 4).


Er zijn nog geen middelen vastgelegd (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV047	Waterstofonderzoek			125 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/

Cluster 11 Vergroening weginfrastructuur

De 2 projecten onder de cluster vergroening weginfrastructuur zijn opgestart en werden al op de Vlaamse Regering geagendeerd (tabel kolom 3).

Alle mijlpalen binnen deze cluster zijn op schema of reeds gerealiseerd (taartdiagram en tabel kolom 4).




De vastleggingen op beide projecten samen stegen van 84.820.535 € naar 98.975.000 €. De vereffeningen stegen van 56.988 € tot 116.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV048	Investing LED-verlichting gewestwegen (VEKP)			90 mio €	9/21	84.498.000 €	/
					12/21	84.498.000 €	/
VV049	Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur			30 mio €	9/21	322.344 €	56.988 €
					12/21	14.477.000 €	116.000 €
Totaal				120 mio €	9/21	84.820.535 €	56.988 €
					12/21	98.975.000 €	116.000 €

Cluster 12 Iedereen lokaal digitaal

Alle projecten onder de cluster 'iedereen lokaal digitaal' zijn opgestart en kenden intussen een agendering op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

Bijna de helft van de mijlpalen in dit project (45%) is reeds gerealiseerd (taartdiagram). Twee mijlpalen in project VV050 liepen vertraging op (tabel kolom 4).

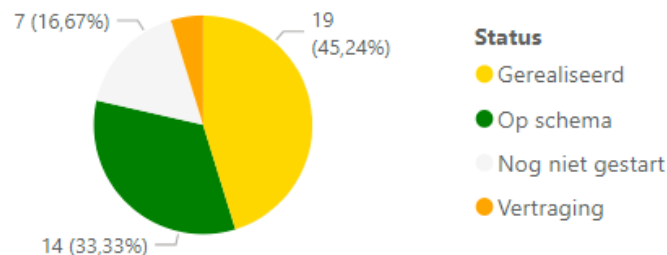


De vastleggingen in deze cluster stegen van 2.606.267 € naar 5.142.000 €. De vereffeningen binnen deze cluster stegen van 348.811 € naar 1.064.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV050	Digitalisering integratie & inburgering			15 mio €	9/21	/	/
					12/21	1.894.000 €	293.000 €
VV051	Gemeente zonder gemeentehuis			35 mio €	9/21	687.267 €	348.811 €
					12/21	817.000 €	580.000 €
VV052	Iedereen digitaal – digibuddies			2,71 mio €	9/21	1.919.000 €	/
					12/21	1.908.000 €	191.000 €
VV053	Iedereen digitaal - opleiding & vorming			19,7 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV054	Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet			27,59 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV055	Smart Cities			20 mio €	9/21	/	/
					12/21	523.000 €	/
Totaal				120 mio €	9/21	2.606.267 €	348.811 €
					12/21	5.142.000 €	1.064.000 €

Cluster 13 Digitalisering Vlaamse overheid

Alle projecten onder de cluster digitalisering Vlaamse overheid zijn opgestart. De meeste opgestarte projecten werden al op de Vlaamse Regering geagendeerd, behalve 1 project, wat nog niet geagendeerd werd. Drie projecten krijgen status 'aandacht nodig' (tabel kolom 3).

In deze cluster zijn 68% van de mijlpalen op schema of gerealiseerd (taartdiagram, tabel kolom 4). Een deel van de mijlpalen liep vertraging op door de prioritering op COVID-activiteiten en de beperkte beschikbaarheid van IT-profielen op de arbeidsmarkt.

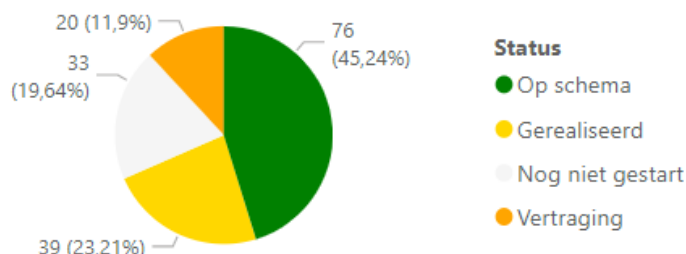

De vastleggingen in deze cluster stegen van 31.288.879 € naar 47.808.000 €, de vereffeningen stegen van 8.930.583 € naar 21.427.000 € (tabel kolom 5-8).


Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV056	Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamovereenkomsten	●	●	15 mio €	9/21	13.376.720 €	1.502.633 €
					12/21	13.993.000 €	2.504.000 €
VV057	Ondersteuning Digitale transformatie Vlaamse entiteiten en lokale besturen	●	●	5 mio €	9/21	3.259.224 €	1.221.324 €
					12/21	5.000.000 €	2.015.000 €
VV058	Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening	●	●	3 mio €	9/21	759.336 €	193.255 €
					12/21	1.639.000 €	918.000 €
VV059	Digitalisering asset management Aquafin	●	●	9 mio €	9/21	/	/
					12/21	4.500.000 €	4.500.000 €
VV060	Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel	●	●	10 mio €	9/21	3.861.199 €	2.291.615 €
					12/21	6.000.000 €	2.982.000 €
VV061	Datanutsbedrijf	●	●	23 mio €	9/21	2.442.177 €	1.609.596 €
					12/21	2.974.000 €	2.445.000 €
VV062	Digitalisering DBRC - toegang tot de Vlaamse bestuursrechtspraak	●	●	1,6 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV063	Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck	●	●	1 mio €	9/21	942.962 €	110.026 €
					12/21	999.000 €	429.000 €
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	●	●	1 mio €	9/21	/	/
					12/21	266.000 €	3.000 €
VV065	Cybersecurity en uitrol SIEM	●	●	2,5 mio €	9/21	539.047 €	254.129 €
					12/21	639.000 €	511.000 €
VV066	Hybride digitale werkplek	●	●	1 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV067	Modernisering cloud- en netwerkinfrastructuur	●	●	3,5 mio €	9/21	1.221.564 €	174.585 €
					12/21	1.505.000 €	1.052.000 €

VV068	Kaleidos – Digitalisering besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering			2,4 mio €	9/21	519.585 €	49.906 €
					12/21	1.760.000 €	268.000 €
VV069	Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit			5 mio €	9/21	487.009 €	316.108 €
					12/21	767.000 €	619.000 €
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem			1,95 mio €	9/21	/	/
					12/21	750.000 €	/
VV071	Poolstokalias			2 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV072	Doelgericht digitaal transformeren			5 mio €	9/21	483.389 €	27.596 €
					12/21	827.000 €	221.000 €
VV073	Sensor Data Platform			8,5 mio €	9/21	516.390 €	234.445 €
					12/21	905.000 €	475.000 €
VV074	Vastgoed informatieplatform			9 mio €	9/21	1.205.473 €	704.454 €
					12/21	2.534.000 €	1.361.000 €
VV075	VLM - MAP6 en datawarehouse			2,45 mio €	9/21	680.388 €	/
					12/21	750.000 €	354.000 €
VV076	Regie op eigen gegevens en zelf beheerde identiteit			4 mio €	9/21	994.416 €	240.911 €
					12/21	2.000.000 €	770.000 €
Totaal				115,9 mio €	9/21	31.288.879 €	8.930.583 €
					12/21	47.808.000 €	21.427.000 €

Cluster 14 Culturele infrastructuur





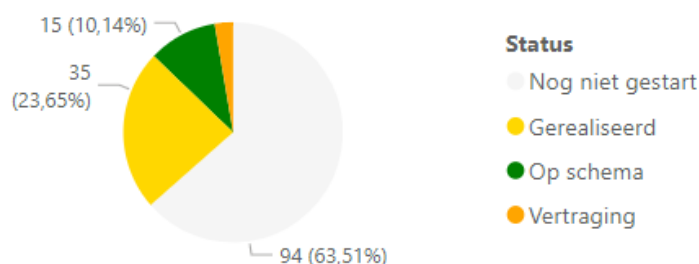



































Van de 22 culturele infrastructuurprojecten die zijn opgestart zijn intussen 16 projecten geagendeerd op de Vlaamse Regering, 6 projecten moeten nog geagendeerd worden op de Vlaamse Regering waarvan twee projecten die bijzondere aandacht nodig hebben (tabel kolom 3).

De meeste van de voor deze cluster gestelde mijlpalen zijn nog niet gestart (taartdiagram). Voor VV078 en VV087 wordt enige vertraging op de mijlpalen gerapporteerd (tabel kolom 4).



De vastleggingen en vereffeningen binnen deze cluster stegen respectievelijk van 51.157 € tot 68.912.000 € en van 2.984 € tot 2.854.000 € (tabel kolom 5-8).



Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV077	Belfort Aalst			1,093 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV078	Cultuurhuis Blankenberge			3 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/

VV079	deSingel Antwerpen			1,65 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV080	Groeningeabdij Kortrijk			7,5 mio €	9/21	/	/
					12/21	7.500.000 €	463.000 €
VV081	Grote Culturele Infrastructuur			7 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV082	Hotel Dumont Antwerpen			0,75 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV083	Inventaris infrastructuur			0,6 mio €	9/21	51.157 €	2.984 €
					12/21	51.000 €	12.000 €
VV084	Kunst in opdracht in de publieke ruimte			3 mio €	9/21	/	/
					12/21	951.000 €	287.000 €
VV085	Kursaal Oostende			9 mio €	9/21	/	/
					12/21	9.000.000 €	59.000 €
VV086	Masterplan Schouwburg Kortrijk			7,8 mio €	9/21	/	/
					12/21	7.800.000 €	191.000 €
VV087	Materniteit de Bijloke - de Creatiecluster (Gent)			4,98 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV088	MOOOV Turnhout			1,3 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV089	Musea Brugge nieuwe Museumsite			27,253 mio €	9/21	/	/
					12/21	27.253.000 €	389.000 €
VV090	Museumsite De Zwijgershoek Sint-Niklaas			0,9 mio €	9/21	/	/
					12/21	900.000 €	300.000 €
VV091	Nieuwbouw de Kopergietery Gent			2,125 mio €	9/21	/	/
					12/21	2.125.000 €	402.000 €
VV092	Nieuwe bibliotheek Sint-Niklaas			0,3 mio €	9/21	/	/
					12/21	300.000 €	120.000 €
VV093	Nieuwe huisvesting en depotruimte voor het Vlaams Architectuur Instituut			5,8 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV094	Kunstenwerkplaats 'KC Groenplein' Hasselt			5,1 mio €	9/21	/	/
					12/21	5.100.000 €	/
VV095	Parterre CC De Werf Aalst			0,45 mio €	9/21	/	/
					12/21	450.000 €	36.000 €
VV096	Schouwburg Boom			0,3 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV097	Sectorale investeringssubsidies			5 mio €	9/21	/	/
					12/21	2.482.000 €	90.000 €
VV098	Versnelling Opera Gent			5 mio €	9/21	/	/
					12/21	5.000.000 €	505.000 €
Totaal				99,01 mio €	9/21	51.157 €	2.984 €
					12/21	68.912.000 €	2.854.000 €

Cluster 15 Investerings onroerend erfgoed

Het project VV099 is opgestart met agendering op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3). De meeste acties met het oog op de mijlpalen voor dit project zijn opgestart en op schema of gerealiseerd (tabel kolom 4).


Er zijn intussen voor 44.539.000 € aan middelen vastgelegd en 515.000 € werd vereffend (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV099	Investerings in de ontwikkeling en promotie van onroerend erfgoed			100 mio €	9/21	30.884.889 €	/
					12/21	44.539.000 €	515.000 €







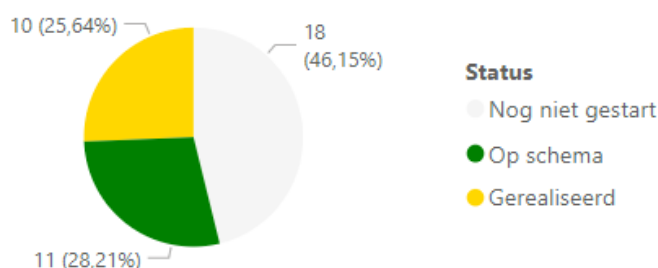




Cluster 16 Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening

Alle projecten in deze cluster zijn opgestart en geagendeerd op de Vlaamse Regering. Ook project VV101 'Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen' werd intussen geagendeerd (kolom 3).

Ongeveer de helft van de mijlpalen in deze cluster is opgestart en op schema of gerealiseerd (taartdiagram en tabel kolom 4).



De vastleggingen in deze cluster stegen van 28.572.642 € naar 54.108.000 €, de vereffeningen stegen van 11.257.615 € naar 23.213.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV100	Achterstand bij subsidies tegen leegstand verminderen			15 mio €	9/21	5.572.642 €	257.615 €
					12/21	7.493.000 €	2.178.000 €
VV101	Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen			10 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV102	Investeren in kernversterking via projectoproepen			25 mio €	9/21	/	/
					12/21	3.615.000 €	435.000 €
VV103	Lantis - PFOS-vervuiling		*	23 mio €	9/21	23.000.000 €	11.000.000 €
					12/21	23.000.000 €	20.600.000 €
VV104	Veerkrachtige steden na Corona (extra oproep Stadsvernieuwing)			20 mio €	9/21	/	/
					12/21	20.000.000 €	/
VV105	Ontsnippen van Vlaams landschap			25 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
Totaal				118 mio €	9/21	28.572.642 €	11.257.615 €
					12/21	54.108.000 €	23.213.000 €

* Voor dit project zijn nog geen mijlpalen gedefinieerd.

Cluster 17 Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)

Het project VV106 Vergroening openbaar vervoer is opgestart en kende al een agendering op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

De mijlpalen die vooropgesteld waren zijn gerealiseerd (tabel kolom 4).


De vastleggingen op dit project stegen van 41,742 miljoen € naar 69.144.000 €. Er werd 1.474.000 € vereffend (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV106	Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)			93 mio €	9/21	41.742.000 €	/
					12/21	69.144.000 €	1.474.000 €

Cluster 18 Brexit

De 3 Brexit-projecten zijn opgestart en werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

De meeste acties in functie van de mijlpalen binnen deze cluster zijn opgestart en op schema. Zes mijlpalen zijn reeds gerealiseerd (taartdiagram en tabel kolom 4).

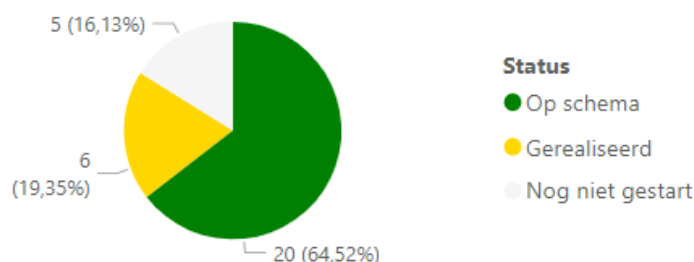


De vastleggingen in deze cluster stegen van 6.577.016 € naar 9.943.000 €, de vereffeningen stegen van 3.219.944 € naar 4.375.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV107	Initiatieven vanuit VLAM voor de promotie en afzet van producten, o. a. als gevolg van Brexit			3 mio €	9/21	3.000.000 €	1.500.000 €
					12/21	3.000.000 €	1.500.000 €
VV108	Subsidies aan bedrijven (financiële steun voor bedrijven, kostenverlaging voor deelname aan beurzen, ondersteuning voor Brexit) + inzet van consultants om Vlaanderen in het buitenland te promoten			30 mio €	9/21	1.514.072 €	1.416.524 €
					12/21	2.138.000 €	1.936.000 €
VV109	VLAIO Brexit actieplan			50 mio €	9/21	2.062.944 €	303.420 €
					12/21	4.805.000 €	939.000 €
Totaal				83 mio €	9/21	6.577.016 €	3.219.944 €
					12/21	9.943.000 €	4.375.000 €

Cluster 19 Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur

De twee projecten van cluster 19 zijn opgestart maar de dossiers moeten nog geagendeerd worden op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

De helft van de mijlpalen in deze cluster is gerealiseerd (taartdiagram en tabel kolom 4).

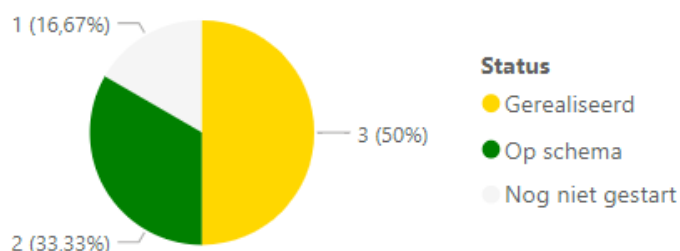

Er is nog geen budget vastgelegd (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV110	Congres (5 MEUR BBV)	●	●	20 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV111	Hefboomrelanceprojecten	●	●	50 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
Totaal				70 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/

Cluster 20 Voorsprongfonds Hoger Onderwijs

Het project Voorsprongfonds Hoger Onderwijs is opgestart en kende al een agendering op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

De helft van de mijlpalen zijn op schema of zijn reeds gerealiseerd (tabel kolom 4).

Voor dit project werd al 24.000 euro vastgelegd, en 21.000 euro vereffend (tabel kolom 5-8).


Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV112	Voorsprongfonds Hoger Onderwijs	●	●	60 mio €	9/21	/	/
					12/21	24.000 €	21.000 €

Cluster 21 Digitalisering zorgbeleid

Alle projecten onder de cluster 'digitalisering zorgbeleid' zijn intussen opgestart en 5 van de 8 projecten zijn al op de agenda van de Vlaamse Regering geplaatst (tabel kolom 3).

1 project, VV120, krijgt de status 'aandacht nodig'; men geeft aan dat de timing van het project als geheel verschuift wegens vertraging bij een externe opdrachtnemer (tabel kolom 3).

Ongeveer 60% van de mijlpalen in deze cluster is opgestart en op schema of reeds gerealiseerd. Zeven mijlpalen lopen vertraging op (binnen VV113, VV118 en VV120), en voor één mijlpaal wordt aangegeven dat de timing bij te sturen is (binnen project VV113).

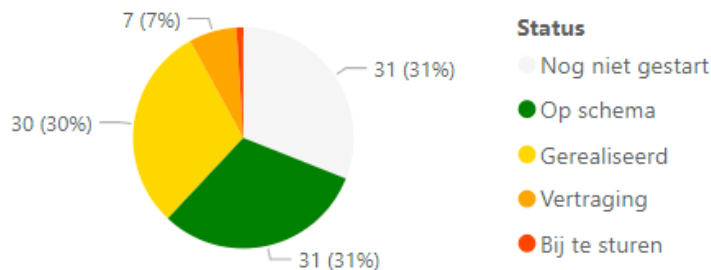

De vastleggingen en vereffeningen binnen deze cluster stegen respectievelijk van 8.679.346 € en 3.111.760 € tot 19.103.000 € en 11.614.000 euro (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV113	Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte	●	●	5 mio €	9/21	83.812 €	36.590 €
					12/21	570.000 €	60.000 €
VV114	Digitale hulpverlening – kwaliteitsbevordering	●	*	0,5 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV115	Digitalisering RIZIV-sectoren	●	●	11 mio €	9/21	2.725.000 €	231.170 €
					12/21	7.775.000 €	5.658.000 €
VV116	Elektronisch patiëntendossier - Geïntegreerd zorg- en ondersteuningsplan	●	●	30 mio €	9/21	120.534 €	/
					12/21	1.009.000 €	453.000 €
VV117	Enkelbanden en strafuitvoering	●	*	4 mio €	9/21	/	/
					12/21	4.000.000 €	134.000 €
VV118	Groeipakket - verderzetten digitalisering	●	●	7 mio €	9/21	5.749.000 €	2.844.000 €
					12/21	5.749.000 €	5.309.000 €
VV119	Ontwikkelen rechtenverkenner 2.0 met een meer gebruiksvriendelijke tool in sterke samenwerking met de lokale besturen	●	●	1 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV120	Verbeteren van de sociale kaart	●	●	0,5 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
Totaal				59 mio €	9/21	8.678.346 €	3.111.760 €
					12/21	19.103.000 €	11.614.000 €

*Voor dit project zijn nog geen mijlpalen gedefinieerd.

Cluster 22 Investeren in personen met een handicap

Project VV121 Vooruitschuif uitbreidingsbeleid – fase 1 is opgestart en werd al geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

De mijlpalen binnen dit project zijn op schema tabel (kolom 4).

Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV121	Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1	●	●	55 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/

Cluster 23 Sportinfrastructuur

Het project m.b.t. het versterken van de bovenlokale sportinfrastructuur is opgestart en werd al op de Vlaamse Regering geagendeerd (tabel kolom 3).

Drie van de vijf mijlpalen binnen dit project zijn reeds gerealiseerd (tabel kolom 4).


Er werd voor 22,781 miljoen euro vastgelegd, en voor 212.000 euro vereffend (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV122	Versterken oproepen bovenlokale sportinfrastructuur			55 mio €	9/21	/	/
					12/21	22.781.000 €	212.000 €

Cluster 24 Uitbouwen circulaire economie

Alle projecten onder cluster 24 werden opgestart en op de Vlaamse Regering geagendeerd (tabel kolom 3).

Ongeveer de helft van de mijlpalen is binnen deze cluster reeds gerealiseerd. Ongeveer 1/3^{de} is opgestart en zit op schema (taartdiagram en tabel kolom 4).

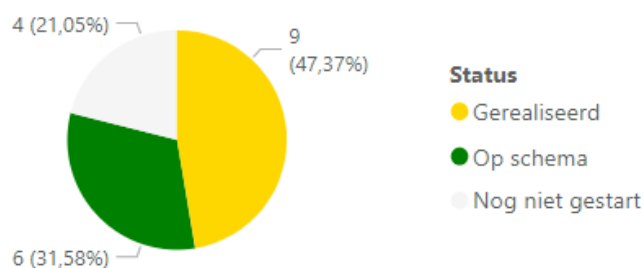

De vastleggingen stijgen van 1.582.584 € naar 3.853.000 €. De vereffeningen bedragen 393.000 €.



Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV123	Circulair bouwen			10 mio €	9/21	1.582.584 €	/
					12/21	2.255.000 €	347.000 €
VV124	Circulaire economie			15 mio €	9/21	/	/
					12/21	1.598.000 €	46.000 €
VV125	Circulaire economie – Recyclagehub			30 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
Totaal				55 mio €	9/21	1.582.584 €	/
					12/21	3.853.000 €	393.000 €

Cluster 25 Investerings groene warmte

Het project m.b.t. groene warmte is opgestart en werd geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

De mijlpalen voor dit project zijn voor 2/3^{de} op schema of gerealiseerd. 1/3^{de} van de mijlpalen moet nog opgestart worden (tabel kolom 4).

De vastleggingen op dit project stijgen van 11.431.928 € naar 11.445.000 €€ (tabel kolom 5-8). De vereffeningen bedragen 13.000 €.



Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV126	Call groene warmte			50 mio €	9/21	11.431.928 €	/
					12/21	11.445.000 €	13.000 €

Cluster 26 Digibanken

Het project digibanken is opgestart met agendering op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

Alle mijlpalen binnen dit project zijn gerealiseerd of op opgestart en op schema (tabel kolom 4).

De vastleggingen op dit project bedragen 86.000 €. De vereffeningen bedragen 60.000 €.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV127	Digibanken			50 mio €	9/21	86.000 €	/
					12/21	86.000 €	60.000 €

Cluster 27 Digitale vaardigheden

Het project m.b.t. digitale vaardigheden is opgestart en werd intussen op de Vlaamse Regering geagendeerd (tabel kolom 3).

Alle mijlpalen zijn op schema (tabel kolom 4).


De vastleggingen op dit project stijgen van 1.908.489 € naar 13.666.000 € (tabel kolom 5-8). De vereffeningen bedragen 3.044.000 €.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV128	Digitale vaardigheden			54 mio €	9/21	1.908.489 €	/
					12/21	13.666.000 €	3.044.000 €

Cluster 28 Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector

De 7 projecten binnen de cluster 'digitalisering Vlaamse media- en cultuursector' zijn intussen opgestart en op de agenda van de Vlaamse Regering gekomen (tabel kolom 3).

Binnen deze cluster moeten de meeste mijlpalen nog opgestart worden. Ongeveer 40% van de mijlpalen zit op schema of is reeds gerealiseerd (taartdiagram). Twee mijlpalen, binnen de projecten VV130 en VV131 liepen vertraging op (tabel kolom 4).



De vastleggingen in deze cluster stegen van 2.085.833 € naar 9.939.000 €, de vereffeningen stegen van 597.970 € naar 1.891.000 € (tabel kolom 5-8).


Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV129	Cultuur - Betere informatiedoorstroming en koppeling databanken	●	●	0,25 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV130	Cultuur - digitalisering van collecties	●	●	5 mio €	9/21	244.576 €	60.000 €
					12/21	3.484.000 €	587.000 €
VV131	Cultuur - integratietraject erfgoed databanken	●	●	2 mio €	9/21	/	/
					12/21	2.245.000 €	286.000 €
VV132	Digitaal verenigingsloket - investering	●	●	2,85 mio €	9/21	735.319 €	266.405 €
					12/21	983.000 €	515.000 €
VV133	Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector	●	●	27 mio €	9/21	105.938 €	36.747 €
					12/21	2.227.000 €	268.000 €
VV134	Digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector	●	●	8 mio €	9/21	/	/
					12/21		
VV135	Investeren in mediawijsheid van de Vlaming	●	●	1 mio €	9/21	1.000.000 €	234.818 €
					12/21	1.000.000 €	235.000 €
Totaal				46,1 mio €	9/21	2.085.833 €	597.970 €
					12/21	9.939.000 €	1.891.000 €

Voor VV133 en VV134 is een interne budgettaire verschuiving gebeurd tussen meting 1 (april 2021) en meting 3 (december 2021).

Cluster 29 Versterken mentaal welzijn

7 van de 9 projecten ter versterking van het mentaal welzijn zijn opgestart en langs de Vlaamse Regering gepasseerd. 2 van de 9 projecten moeten nog worden opgestart (tabel kolom 3).

Ongeveer de helft van de mijlpalen binnen deze cluster zijn gerealiseerd. Voor 30% zijn de acties opgestart en op schema (taartdiagram en tabel kolom 4).

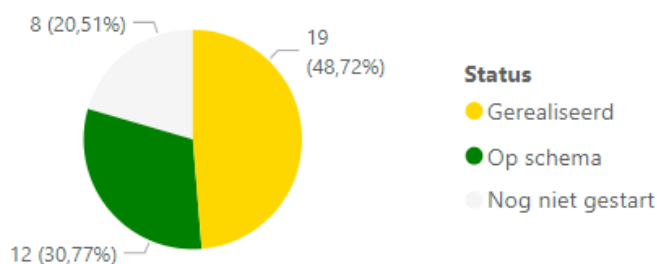


De vastleggingen in deze cluster stegen van 15.503.403 € naar 15.943.000 €, de vereffeningen stegen van 5.130.314 € naar 4.515.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV136	Vernieuwende projecten Huizen van het Kind			3 mio €	9/21	3.000.000 €	800.000 €
					12/21	3.000.000 €	567.000 €
VV137	Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen			3,5 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV138	Opvolging actieplan mentaal welzijn			6,5 mio €	9/21	4.168.585 €	1.595.863 €
					12/21	4.486.000 €	1.576.000 €
VV139	OverKophuizen			4,8 mio €	9/21	4.800.000 €	1.280.000 €
					12/21	4.800.000 €	865.000 €
VV140	Samenwerkingsverbanden "één gezin, één plan"			3,2 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV141	Versterking aanpak intra-familiaal geweld - crisisopvang en crisisbegeleiding in residentiële jeugdzorg			3 mio €	9/21	2.417.973 €	1.232.902 €
					12/21	2.418.000 €	1.233.000 €
VV142	Versterking aanpak intra-familiaal geweld - bewustmakingscampagnes			0,3 mio €	9/21	/	/
					12/21	/	/
VV143	Zorgzame buurten - Rol van apothekers als aanspreekpunt welzijnsvragen in de buurt			0,25 mio €	9/21	120.000 €	100.000 €
					12/21	120.000 €	100.000 €
VV144	Zorgzame buurten - Versterken van buurtgerichte lokale initiatieven			20 mio €	9/21	996.845 €	121.549 €
					12/21	1.119.000 €	174.000 €
Totaal				44,55 mio €	9/21	15.503.403 €	5.130.314 €
					12/21	15.943.000 €	4.515.000 €

Cluster 30 Armoedebestrijding en wijkverbetering

Alle 8 opgestarte projecten ter bestrijding van armoede en m.b.t. wijkverbetering in deze cluster zijn intussen geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Voor één project, VV146 'Compensatiebesluit KO - extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)' wordt aangegeven dat het project afgerond is (tabel kolom 3).

Ongeveer 70% van de mijlpalen zijn gerealiseerd of op schema (taartdiagram en tabel kolom 4).

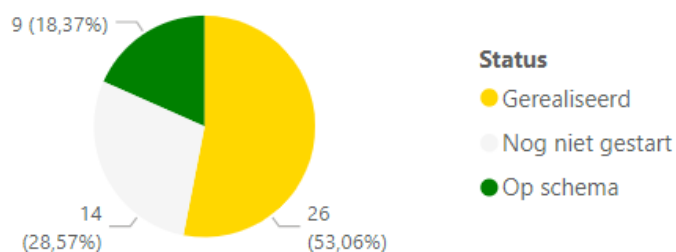


De vastleggingen en vereffeningen stegen van respectievelijk 164.160 € en 124.160 € naar 25.976.000 € en 4.055.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV145	Buitenschoolse opvang ondersteunen	●	●	11,4 mio €	9/21	/	/
					12/21	11.400.000 €	2.100.000 €
VV146	Compensatiebesluit KO - extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)	●	●	0,975 mio €	9/21	114.160 €	114.160 €
					12/21	975.000 €	975.000 €
VV147	Doorgaande lijn kinderopvang – onderwijs	●	●	1,8 mio €	9/21	/	/
					12/21	5.000 €	5.000 €
VV148	Lokale armoede initiatieven ondersteunen	●	●	2,4 mio €	9/21	/	/
					12/21	2.400.000 €	15.000 €
VV149	Ondersteuning buurtwerk	●	●	7,5 mio €	9/21	50.000 €	10.000 €
					12/21	3.871.000 €	424.000 €
VV150	Wijkverbetering	●	●	4 mio €	9/21	/	/
					12/21	3.200.000 €	/
VV151	Wijkverbeteringscontracten - integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen	●	●	1,125 mio €	9/21	/	/
					12/21	1.125.000 €	69.000 €
VV152	Projectoproep kwetsbare kinderen	●	●	3 mio €	9/21	/	/
					12/21	3.000.000 €	467.000 €
Totaal				32,2 mio €	9/21	164.160 €	124.160 €
					12/21	25.976.000 €	4.055.000 €

Cluster 31 Investerings audiovisuele sector

Alle projecten m.b.t. de investering in de audiovisuele sector zijn opgestart en kenden al een agendering op de VR (tabel kolom 3).

Alle mijlpalen binnen deze cluster zijn opgestart. Ongeveer 2/3^{de} van de mijlpalen is gerealiseerd (tabel kolom 4).



De vastleggingen op de projecten VV154 en VV155 stijgen van 7.700.000 € tot 8.201.283 € en de vereffeningen bedragen 201.283 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV153	Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector	●	●	10 mio €	9/21	/	/
					12/21	201.283 €	201.283 €
VV154	Impuls aan VAF Filmfonds	●	●	10 mio €	9/21	4.000.000 €	/
					12/21	4.000.000 €	/
VV155	Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds	●	●	10 mio €	9/21	3.700.000 €	/
					12/21	4.000.000 €	/



	Totaal	30 mio €	9/21	7.700.000 €	/
			12/21	8.201.283 €	201.283 €

Cluster 32 Jeugdinfrastructuur

Het project jeugdinfrastructuur is opgestart en kende intussen ook een agendering op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

Bijna de helft van de mijlpalen binnen dit project zijn gerealiseerd of op schema. Voor twee mijlpalen wordt aangegeven dat de mijlpalen vertraging oplopen (tabel kolom 4).

De vastleggingen stijgen van 379.601 € tot 11.470.000 €. De vereffeningen bedragen 59.000 € (tabel kolom 5-8).



Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV156	Jeugdinfrastructuur			30 mio €	9/21	379.601 €	/
					12/21	11.470.000 €	59.000 €

Cluster 33 Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

Het project gemeenschapsinfrastructuur in Brussel is opgestart en kende intussen ook een agendering op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

2/3^{de} van de mijlpalen in dit project zijn gerealiseerd of op schema (tabel kolom 4).

Er is intussen 4.995.000 € vastgelegd. De vereffeningen bedragen eind december 1.639.000 € (tabel kolom 5-8).



Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV157	Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel			10 mio €	9/21	3.821 €	/
					12/21	4.955.000 €	1.639.000 €

Cluster 34 Spending reviews

Het project spending reviews is opgestart en werd al geagendeerd op de Vlaamse Regering (tabel kolom 3).

De helft van de mijlpalen van dit project is gerealiseerd; de andere helft zit op schema (tabel kolom 4).

De vastleggingen stegen van 1.294.184 € naar 1.703.000 €, en de vereffeningen stegen van 230.750 € naar 992.000 € (tabel kolom 5-8).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)	Datum	VAK	VEK
VV158	Spending reviews			10 mio €	9/21	1.294.184 €	230.750 €
					12/21	1.703.000 €	992.000 €

Cluster 35 Regulier gefinancierde relanceprojecten

Naast de 158 projecten binnen de eerder toegelichte 34 clusters, die gefinancierd worden door de 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen, spendeert de Vlaamse Regering ook herstellmiddelen via bestaande en extra reguliere financiering. Zo worden heel wat PMV-instrumenten (4,215 miljard euro) ingezet om de economie en de ondernemingen te ondersteunen:

- Extra capaciteit Gigarant (voor leningen, kapitaalsparticipaties, waarborgen voor ondernemingen): 3 miljard euro
- Extra goedkope achtergestelde leningen bij PMV (voor start-ups, scale-ups en KMO's): 500 miljoen euro
- Extra waarborgen via PMV/Z: 400 miljoen euro
- Welvaartsfonds PMV: 240 miljoen euro
- Flanders Future Tech Fund: 75 miljoen euro


Daarnaast investeert de Vlaamse Regering ook nog in onder meer:

- Scholenbouw via publiek-private samenwerking: 3,078 miljard euro, nieuwe investeringsbeslissingen deze regeerperiode
- Welzijn en Zorg: 1,1395 miljard euro extra jaarlijks recurrent budget in 2021-2025:
 - Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6): 577 miljoen euro
 - Extra middelen voor het uitbreidingsbeleid welzijn: 562,5 miljoen euro







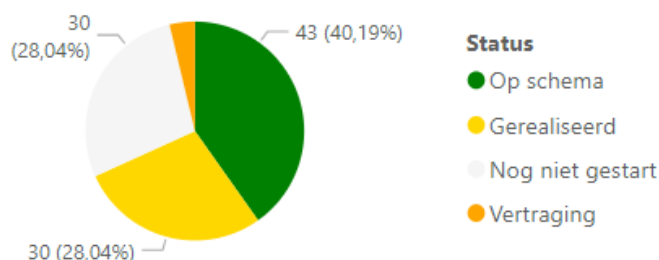































21 projecten krijgen de status 'opgestart'. 14 projecten werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering, voor 7 projecten moet dit nog gebeuren (tabel kolom 3).




Voor 1 project is bijzondere aandacht nodig (tabel kolom 3). Bij VV168 'Versnelde uitrol digitale meters' is de nood aan bijkomende aandacht te linken aan de eerdere uitspraak van het Grondwettelijk Hof. De acceptatiegraad van een digitale meter van de netgebruikers is sterk gedaald en leidt tot een vertraging in de uitrol, maar een communicatiecampagne in 2022 moet bijdragen tot het creëren van het nodige maatschappelijke draagvlak.

Circa 70% van de mijlpalen in deze cluster zitten op schema of zijn reeds gerealiseerd. Voor 4 mijlpalen (binnen projecten VV162, VV168 en VV169) wordt aangegeven dat ze vertraging oplopen (taartdiagram en tabel kolom 4).



Vastleggingen en vereffeningen worden in deze cluster niet apart opgevolgd en kan men opvolgen via de jaarlijkse Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT) (tabel kolom 5).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Project-status	Status mijlpalen	Beleidsruimte (begroot)
VV159	Snellere vergunnings- en beroepsprocedures			Reguliere middelen
VV160	Administratieve vereenvoudiging			0,25 mio € (uit middelen VV158)
VV161	Decentralisatieoefening naar lokale besturen			Reguliere middelen
VV162	Investeren in Vlaamse kennisoverheid			1 mio €
VV163	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Pakket van 500 miljoen euro voor zeer goedkope achtergestelde leningen aan enerzijds start-ups & scale-ups en anderzijds KMO's			500 mio €
VV164	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Extra capaciteit voor Gigarant (3 miljard euro) en voor PMV-Z-Waarborgen (400 miljoen euro) - hefboom voor maximale bancaire financiering		*	3,4 mia €
VV165	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Welvaartsfonds (beheerd door PMV) van 500 miljoen euro (waarvan 240 miljoen euro Vlaams-publiek en rest privaat)			240 mio €
VV166	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Uitbreiding van de win-win-lening en vriendenaandeel			Reguliere middelen
VV167	Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2.0			3,078 mia € tijdens deze regeerperiode
VV168	Versnelde uitrol digitale meters			2 mia € investering door Fluvius gespreid over 10 jaar, waarvan 80% tegen 2025
VV169	Versnelde uitrol glasvezelnetwerk en 5G			Reguliere middelen
VV170	Flanders Future Tech Fund aanwenden voor innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) platformtechnologie		*	75 mio €
VV171	Vlaanderen chiplab van de wereld			70 mio €
VV172	Investeringsmiddelen in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO ² captatie & hergebruik			Reguliere middelen
VV173	Ad hoc investeringsmiddelen als cofinanciering voor Europese steun			Reguliere middelen
VV174	Noodkoopleningen			40 mio €
VV175	Uitbreidingsbudget voor welzijn en zorg			1,1395 mia € (VIA 6-budget van 577 mio €, ook 562,5 mio. € extra middelen voor uitbreidingsbeleid)
VV176	Zijinstroom vanuit de privésector naar onderwijs aantrekkelijk maken			4 mio €
VV177	Implementatie van de Vlaamse jobbonus			197 mio €
VV178	Extra zuurstof voor individueel creatief talent – meesterschap			Reguliere middelen

VV179	Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen		*	Reguliere middelen
VV180	Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 2 Wachlijsten gehandicaptenzorg			130 mio €

* Voor dit project zijn nog geen mijlpalen gedefinieerd.

8. Feedback uit het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV)

De feedback van het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV) op de derde voortgangsrapportering wordt op 28 januari 2022 besproken in de Taskforce.

9. Leeswijzer bij het globale rapport

Als bijlage kan men de rapportering van december 2021 voor alle 180 projecten volgens cluster terugvinden.

In het rapport kan men de betrokkenen bij het project terugvinden, onder meer:

- Bevoegde minister
- Trekkende entiteit Vlaamse overheid
- Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project
- Betrokken entiteiten Vlaamse overheid
- Andere belanghebbenden

De projectsituering geeft weer tot welk speerpunt en welke cluster het project behoort:

- Speerpunten relanceplan: 1 van de 7 speerpunten van het relanceplan zoals aangekondigd in de septemberverklaring van 2020
- Cluster relanceplan: 1 van de 35 clusters van het relanceplan zoals meegedeeld op de VR op 5 februari 2021

De projectomschrijving:

- Beschrijft de inhoud van het project. Voor grote projecten met verschillende subprojecten kan dit uitgebreider zijn. Hierin worden de doelstellingen van het project weergegeven.

Input, output, outcome en impact:

- Beschrijft de input, de output de outcome en de impact gelinkt aan het project.

Algemene beschrijving van de projectvoortgang:

- Geeft weer wat de algemene status is van het globale project aan de hand van een beschrijving en een kleurencode:

- Donkergroen: Dit project is opgestart en werd al minstens 1 keer deels of volledig geagendeerd op de Vlaamse Regering
- Lichtgroen: Dit project is opgestart maar werd nog niet geagendeerd op de Vlaamse Regering
- Oranje: Voor dit project is bijzondere aandacht nodig voor één of enkele deelaspecten
- Rood: Voor dit project is bijkomende actie noodzakelijk
- Geel: Dit project is gerealiseerd
- Grijs: Dit project is nog niet opgestart

Gedetailleerde projectvoortgang aan de hand van mijlpalen:

- Beschrijft de voortgang van de verschillende beoogde mijlpalen aan de hand van een beschrijving en een kleurencode. De volgende statussen zijn mogelijk.
 - Donkergroen: Deze mijlpaal is op schema. De uitvoering loopt, en volgt het afgesproken tijdsplan.
 - Oranje: De uitvoering loopt, maar er is sprake van een vertraging op het afgesproken tijdsplan.
 - Rood: Deze mijlpaal moet worden bijgestuurd.
 - Geel: Deze mijlpaal is gerealiseerd.
 - Grijs: De uitvoering van de mijlpaal is nog niet gestart, maar dit is conform het afgesproken tijdsplan. Een mijlpaal blijft op 'nog niet gestart' staan, zolang er binnen het project geen relevante activiteit is met betrekking tot deze mijlpaal. Pas wanneer de uitvoering van deze mijlpaal effectief gestart is, wordt bepaald of deze mijlpaal al dan niet 'op schema' is.
 - Blauw: Deze mijlpaal werd stopgezet, in de zin van definitief stopgezet en dus niet uitgesteld.

Projectfinanciering:

- Geeft de beleidsruimte, de vastgelegde kredieten en de vereffende kredieten weer.
- De oorsprong van de middelen (Vlaams of Europees, relancebudgetten of reguliere middelen) wordt per project weergegeven.
- 55 van de 180 projecten van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' zijn opgenomen in de Vlaamse bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht via een [Mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021](#).

Agendering Vlaamse Regering

- Geeft weer of een project al geagendeerd is op de Vlaamse Regering t.e.m. 31 december 2021 met een link naar deze documenten.

Koppeling met andere projecten

- Geeft het verband weer met andere projecten, buiten de eigen cluster.

10. Voortgangsrapport: gedetailleerd overzicht van alle projecten

01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)

VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.• Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.• Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. <p>Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vervuiling van bodem, lucht en water• Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen• Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie• Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken. <p>Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken en muren van niet-residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudend (onder)dak of asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse (relance)middelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen.

Voor niet-residentiële gebouwen wordt op basis van cijfers van OVAM en VEKA verondersteld dat 25% van de 270.000 gebouwen met risicobouwjaar beschikken over een asbesthoudende gebouwschil (gevel en/of dakbedekking) en 3% over een asbesthoudend onderdak. Dit betekent dat tegen 2034 jaarlijks zo'n 5.400 niet-residentiële gebouwen asbestvrij moet worden gemaakt. Uitgaande van de gemiddelde dak- en buitenmuuroppervlaktes van woningen, woongebouwen en niet-woongebouwen, een forfaitaire premie van 8 euro boven de premie voor dak- of muurisolatie en een bereik van 75% van de jaarlijks asbestvrij te maken gebouwen door deze premie, is voor de jaarlijkse geschatte aangepakte niet-residentiële gebouwen een budget nodig 15 miljoen euro voor de meerkost (dit is de bijkomende forfaitaire premie van 8 euro per m²) van de dak- en/of buitenmuurisolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering.

Er is een aanzienlijk aandeel van niet-verwarmde of zeer beperkt verwarmde gebouwen die ook asbest bevatten in de dakbedekking of het onderdak. Het gaat hoofdzakelijk over niet-residentiële gebouwen zoals bijvoorbeeld magazijnen, (landbouw)loodsen, openbare gebouwen, ... Deze doelgroep wordt momenteel niet bereikt met de verhoogde isolatiepremies na asbestverwijdering gezien zij geen nood hebben aan dezelfde energieprestatie-eisen als residentiële gebouwen en doorgedreven isoleren net contraproductief kan werken in sommige gevallen (bv. stallen met dieren). Deze dakoppervlaktes zijn echter wel geschikt voor het plaatsen van een fotovoltaïsche installatie. Op die manier kunnen wij een bijkomend potentieel voor hernieuwbare energie ontsluiten, hetgeen niet alleen goed is voor het bereiken van onze klimaatdoelstelling, maar ook bijdraagt aan de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van de energiefactuur. Met de voorgestelde premie wordt gemikt op een versnelling van asbestverwijdering bij grote, niet-complexe daken van onverwarmde niet-residentiële gebouwen.

Het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken is decretaal via het Materialendecreet verboden. Voor asbestdaken waarop de plaatsing van zonnepanelen beoogd wordt, is het dan ook noodzakelijk het volledig dak van asbestmaterialen te ontdoen.

PROJECTOMSCHRIJVING

Het uitbreidingsvoorstel bestaat erin om niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen in aanmerking te laten komen voor een premie van 12 euro per vierkante meter verwijderde asbestbedekking en/of onderdak, op voorwaarde dat 'gelijktijdig' een fotovoltaïsche installatie op het dak wordt geplaatst. De plaatsing van de fotovoltaïsche installatie komt afhankelijk van de capaciteit van de installaties eveneens in aanmerking voor de bestaande ondersteuningssystemen voor fotovoltaïsche installatie (de investeringspremie PV, de call groene stroom, de projectspecifieke ondersteuning met groenestroomcertificaten). Om in aanmerking te komen voor deze premie moet de oppervlakte van de fotovoltaïsche zonnepanelen in verhouding tot de totale oppervlakte van het gesaneerde dak minstens 10 procent bedragen.

Er worden geen reguliere middelen ingezet voor de meerkost van de premie voor isolatie voor wat betreft de verhoging van de isolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering noch voor de premie voor asbestverwijdering in combinatie met PV. De relancemiddelen volstaan hiervoor.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	30.000.000 EUR
Output	7000 uitbetaalde premies voor dak- en/of buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering en voor asbestverwijdering in combinatie met de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie in niet-residentiële gebouwen
Outcome	7000 niet-residentiële gebouwen met dak- en/of buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering of asbestverwijdering in combinatie met de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie
Beoogde impact	Broeikasgasemissies - Finaal energieverbruik in GWh

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Premies kunnen worden aangevraagd bij Fluvius vanaf 1 januari 2021. In juli 2021 was na evaluatie een beperkte wijziging aan belemmerende voorwaarden betreffende uitvoerder, opgenomen in een ministerieel besluit noodzakelijk.</p> <p>Er wordt een aanvullende premie voorzien voor de gelijktijdige investering in de verwijdering van de volledige asbesthoudende dakbedekking of het volledige asbesthoudend onderdak en de plaatsing van een nieuwe fotovoltaïsche installatie op het gesaneerde dak.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie - regelgeving		2020 Q4	Gerealiseerd	
1283 uitbetaalde premies in 2021		2022 Q1	Vertraging	
Aanvullende premie asbestverwijdering in combinatie met PV - regelgeving		2022 Q1	Op schema	
2217 uitbetaalde premies in 2022		2023 Q1	Nog niet gestart	
2217 uitbetaalde premies in 2023		2024 Q1	Nog niet gestart	
1283 uitbetaalde premies in 2024		2025 Q1	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
7000 uitbetaalde premies	7000	2025 Q1	222	3,2 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	344.000 EUR
Uitvoering VEK	344.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 30.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV002 - Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie](#)

[VV003 - Asbestpremie daken residentieel met isolatie](#)

VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034. • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034. • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. <p>Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vervuiling van bodem, lucht en water • Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen • Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie • Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken. <p>Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling.</p> <p>Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende muren van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudende gevel en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie. Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies. De meerkost voor het asbestgedeelte van de premie wordt voor premies 2021 en 2022 volledig vergoed vanuit de relancemiddelen.

Op basis van cijfers van OVAM en VEKA wordt het aantal woningen of woongebouwen met asbesthoudende dakbedekking en/of een asbesthoudend onderdak en/of -gevels ingeschat op 328.000. Daarnaast hebben 511.000 woningen en woongebouwen een asbesthoudend onderdak. Er is een zekere overlap in de aanwezigheid van asbest in meerdere gebouwdelen van eenzelfde gebouw. Het asbestplan streeft naar het asbestveilig maken van Vlaanderen tegen 2034. Dat wil zeggen dat jaarlijkse ruim 40.000 woningen en 1.500 woongebouwen asbestvrij gemaakt moet worden gedurende 14 jaar, en dit op het vlak van asbest aanwezig in dakbedekking en/of onderdak en/of gevelbekleding.

Uitgaande van de gemiddelde buitenmuuroppervlaktes van woningen en woongebouwen, een forfaitaire premie van 8 euro boven de premie voor dak- of muurisolatie en een bereik van 75% van de jaarlijks asbestvrij te maken gebouwen door deze premie, is voor de jaarlijkse geschatte aangepakte residentiële gebouwen een budget nodig 6 miljoen euro voor de meerkost (dit is de bijkomende forfaitaire premie van 8 euro per m²) van de buitenmuurisolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering.

Er worden geen reguliere middelen ingezet voor de financiering van deze meerkost bovenop de isolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering. Het voorziene relancebudget volstaat hiervoor.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	12.000.000 EUR
Output	9000 uitbetaalde premies voor buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen
Outcome	9000 residentiële gebouwen met buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering
Beoogde impact	Broeikasgasemissies - Finaal energieverbruik in GWh

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	Premies kunnen worden aangevraagd bij Fluvius vanaf 1 januari 2021. In juli 2021 was na evaluatie een beperkte wijziging aan belemmerende voorwaarden betreffende uitvoerder, opgenomen in een ministerieel besluit, noodzakelijk.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Asbestpremie buitenmuren residentieel - regelgeving		2020 Q4	Gerealiseerd	
750 uitbetaalde premies in 2021		2022 Q1	Vertraging	
3375 uitbetaalde premies in 2022		2023 Q1	Nog niet gestart	
3375 uitbetaalde premies in 2023		2024 Q1	Nog niet gestart	
1500 uitbetaalde premies in 2024		2025 Q1	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
9000 uitbetaalde premies voor buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen	9000	2025 Q1	47	0,5 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	12.000.000 EUR
Uitvoering VAK	74.000 EUR
Uitvoering VEK	74.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 12.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:

- Vervuiling van bodem, lucht en water
- Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen
- Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie
- Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken.

Gezien de langetermijn doestelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling. Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen. De voorgestelde subsidie is gericht op het bereiken van ongeveer 75% van het jaarlijkse potentieel van de voorraad asbestgebouwen per jaar.

Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur vanaf 2021 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkost die

PROJECTOMSCHRIJVING

investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies. De meerkost voor het asbestgedeelte van de premie wordt voor premies 2021 en 2022 vergoed vanuit de relancemiddelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	42.000.000 EUR
Output	40000 uitbetaalde premies voor dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen
Outcome	40000 residentiële gebouwen met dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering
Beoogde impact	Broeikasgasemissies - Finaal energieverbruik in GWh

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Premies kunnen worden aangevraagd bij Fluvius vanaf 1 januari 2021. In juli 2021 was na evaluatie een beperkte wijziging aan belemmerende voorwaarden betreffende uitvoerder, opgenomen in een ministerieel besluit, noodzakelijk.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Asbestpremie daken residentieel - regelgeving	2020 Q4	Gerealiseerd
3810 uitbetaalde premies in 2021	2022 Q1	Vertraging

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
13333 uitbetaalde premies in 2022		2023 Q1	Nog niet gestart	
13333 uitbetaalde premies in 2023		2024 Q1	Nog niet gestart	
9524 uitbetaalde premies in 2024		2025 Q1	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
40000 uitbetaalde premies voor dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen	40000	2025 Q1	560	1,4 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	42.000.000 EUR
Uitvoering VAK	721.000 EUR
Uitvoering VEK	721.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 42.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV001 - Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie](#)

[VV002 - Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie](#)

VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Belanghebbenden	Vereniging van steden en gemeenten, Interafval

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Het actieplan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen (lokale besturen, zorgvoorzieningen, ...), landbouw, jeugd (scholen, ...).

Voor de doelgroep lokale besturen en residentiële gebouwen werd een subsidie-instrument voorzien voor de organisatie en coördinatie van lokale asbestafbouwprojecten volgens vastgelegde projectformules.

Doelgroep: particulieren, jeugdverenigingen, lokale besturen

Ondersteuning:

- subsidies voor de lokale projectcoördinatie;
- subsidies voor de cofinanciering van asbestinzameling en verwijdering;
- ontzorging voor aanbesteding door particulier zelf

Gesubsidieerde projectformules:

- o organisatie van ophaling van asbestcement afval aan huis
- o specifieke Calls naar lokale jeugdinfrastructuur om asbest gericht te inventariseren en te verwijderen.
- o gegroepeerde verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding via raamcontracten

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	27.600.000 EUR
Output	Aantal asbestverwijderingen uitgevoerd per doelgroep (particulieren/lokale jeugdinfrastructuur/lokale besturen) Aantal ingezamelde tonnages asbestcement
Outcome	De realisatie van een asbestveilig Vlaanderen 2040 meet zich af aan het aantal asbestveilige gebouwen met risicobouwjaar tot 2001. De impact van dit project beoogt het toewerken naar een maximaal aantal asbestveilige locaties in Vlaanderen. Dit door de relancebudgetten via asbestprojecten bij lokale besturen in te zetten voor een maximaal aantal verwijderlocaties bij burgers, lokale jeugdinfrastructuur en lokale besturen. Zo wordt op deze locaties toegewerkt naar een asbestveilige leefomgeving.
Beoogde impact	Aantal asbestverwijderingen in gebouwen uitgevoerd - Aandeel van de bevolking in (zeer) goede gezondheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Ministeriële besluiten voor de te subsidiëren asbestprojecten werden opgemaakt en aan het kabinet overgemaakt voor ondertekening door de minister.
Noodzakelijke politieke actie	Ondertekening van de Ministeriële besluiten.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Opstart operationalisering	2021 Q3	Gerealiseerd

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.600.000 EUR
Uitvoering VAK	10.083.000 EUR
Uitvoering VEK	180.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.600.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Circulaire economie -Asbest lokale besturen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Belanghebbenden	Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Het plan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen, landbouw, jeugd (scholen, ...).

Voor de sectoren zorgvoorzieningen, scholen, landbouw en sociale huisvesting wordt onder de vorm van een sectorprotocol een ondersteuningskader met ontzorging, cofinanciering en subsidiëring aangeboden. Het sectorprotocol wordt vormelijk ondertekend door de OVAM, de voorgedij minister(s) en de sectorvertegenwoordiging. Het beheer en de operationalisering van de sectorprotocollen gebeurt binnen de werking van de OVAM.

De Relancemiddelen zijn een sterke aanvulling op de reguliere jaarlijkse 3000 keuro. Ze maken het mogelijk om naast het bestaande sectorprotocol voor scholen nieuwe te initiëren voor de doelgroepen zorg, landbouw en sociale huisvesting

Sectorprotocol scholen

Doelgroep: Vlaamse onderwijsinstellingen

Ondersteuning:

- contracten op afroep voor gratis asbestinventaris;
- contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering

PROJECTOMSCHRIJVING

– subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: GO!, AGION

Sectorprotocol landbouw

Doelgroep: Vlaamse landbouwondernemingen

Ondersteuning:

- gratis inzameling van asbestcementafval bij de vervanging van asbestdaken

Partners: Boerenbond, ABS, VAC

Sectorprotocol sociale huisvesting

Doelgroep: Vlaamse sociale woningen

Ondersteuning:

– subsidie per gerealiseerde asbestveilige woning;

– aangepaste procedure extrapolatie van asbestinventarissen voor kostenbesparing

Partners: VMSW, VVH

Sectorprotocol zorgvoorzieningen

Doelgroep: Vlaamse zorgvoorzieningen

Ondersteuning:

– contracten op afroep voor gratis asbestinventaris en asbestexpertise;

– subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: VIPA, VEB, zorgkoepels

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	12.400.000 EUR
Output	Aantal asbestinventarisaties en asbestverwijderingen uitgevoerd.
Outcome	Meer gebouwen geïnventariseerd en asbestveilig gemaakt.
Beoogde impact	Aantal nieuw gebouwde of volledige vernieuwde m ² ziekenhuisinfrastructuur - Investerings in schoolinfrastructuur - Aandeel van de bevolking in (zeer) goede gezondheid - Aantal asbestverwijderingen in gebouwen uitgevoerd - Aantal asbestinventarisaties in gebouwen uitgevoerd

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het sectorprotocol scholen en het sectorprotocol landbouw zijn operationeel. De sectorprotocollen sociale huisvesting en zorgvoorzieningen worden ondertekend en geoperationaliseerd in 2022 na goedkeuring van de nota VR herverdeling (timing januari 2022).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	goedkeuring nota VR herverdeling Relancemiddelen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Ondertekening protocollen sociale huisvesting en landbouw	2021 Q4	Vertraging
Operationalisering protocol zorgvoorzieningen	2021 Q4	Vertraging
Operationalisering en/of opschaling protocol scholen, sociale huisvesting en landbouw	2021 Q4	Op schema
Ondertekening protocol zorgvoorzieningen	2022 Q1	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	12.400.000 EUR
Uitvoering VAK	672.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 12.400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Circulaire economie – asbest sectorprotocollen - scholen
Vervolgprotocol asbestafbouwbeleid scholen (incl. internaten en clb's) van het gesubsidieerd onderwijs. Bijlage
Vervolgprotocol asbestafbouwbeleid van het Go! Gemeenschapsonderwijs. Bijlage

VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - Wonen- Vlaanderen
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Uit onderzoek blijkt dat 57% van de woningen herstellingen, renovaties of een totaalrenovatie nodig hebben om te voldoen aan de minimale woningkwaliteitseisen. Om de energiedoelstellingen van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie 2050 te behalen, moeten in 96,5 % van de Vlaamse woningen werkzaamheden uitgevoerd worden. Als we zowel woningkwaliteit als energie in rekening brengen, zijn er bijna in alle Vlaamse woningen nog werken nodig. Beide doelstellingen op vlak van woningkwaliteit en energiestaat, kunnen in de meeste gevallen niet los van elkaar worden gezien.</p> <p>Bovendien toont onderzoek aan dat problemen inzake woningkwaliteit en slechte energiestaat zich concentreren in bepaalde segmenten van de woningmarkt en bij bepaalde doelgroepen, nl de meest kwetsbare doelgroep van alleenstaanden, eenoudergezinnen, huishoudens met een beperkt inkomen, en dat precies hier de renovatieactiviteit het laagst is.</p> <p>Om de renovatiegraad op te krikken bestaan er sinds jaren premies gericht op energie-efficiëntie en het stimuleren van investeringen in hernieuwbare energie installaties enerzijds (energiebeleid) en doelgroepgerichte premies voor de verbetering van de woningkwaliteit anderzijds (woonbeleid). Ter bevordering van de klantvriendelijkheid en de transparantie alsook om de renovatiegraad te verhogen, is een vereenvoudiging van het premiële landschap noodzakelijk, met uniforme en versterkte doelgroepgerichte maatregelen en premies. Door zoveel mogelijk premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning in één loket te bundelen, wordt aan deze nood tegemoet gekomen.</p> <p>Hierbij werd vertrokken van volgende uitgangspunten: (i) het behouden van de aandacht voor woningkwaliteit en (ii) het verhogen van de aantrekkelijkheid van de premies.</p> <p>De mate van ondersteuning hangt af van financiële draagkracht van de investeerder.</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

Steun voor energetische investeringen voor iedereen, steun voor investeringen in woningkwaliteit voor lagere inkomens waarbij het steunpercentage afhankelijk is van het inkomen. Dit impliceert voor energiepremies afstappen van de verhoogde premies voor de doelgroep 'beschermde afnemer' (= federaal bepaalde rechthebbenden op sociale maximumprijzen energie).

De klantgerichtheid wordt bevorderd door een vlotte dossierbehandeling, het voorzien van slechts één indienings- en betaaladres en het vereenvoudigen van de procedures. Maximale aandacht gaat naar de begeleiding en ontzorging van kwetsbare doelgroepen.

Vereenvoudiging en vergaande afstemming van de in aanmerking komende investeringen en de toekenningsvoorwaarden die worden gehanteerd in de huidige stelsels.

De relancemiddelen worden ingezet voor de financiering van een deel van de energiegerelateerde onderdelen van deze nieuwe, geïntegreerde premie. De premies die niet vergoed kunnen worden vanuit de relancemiddelen, worden vergoed vanuit de nettarieven, tenzij hiervoor expliciet bijkomende middelen voorzien zouden zijn vanuit de Vlaamse uitgavenbegroting of het Energiefonds, zoals bepaald in het Energiebesluit van 19 november 2010.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	180.000.000 EUR
Output	220.000 premie-aanvragen voor energiegerelateerde investeringen over periode 2022-2024.
Outcome	Energiebesparing en hoger aandeel hernieuwbare energie bij minstens 202.000 woningen.
Beoogde impact	Aandeel hernieuwbare energie in totaal energiegebruik - Broeikasgasemissies - Finaal energieverbruik in GWh

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het decreet voor de oprichting van het unieke loket voor de aanvraag en behandeling van premie-aanvragen werd een eerste keer principieel goedgekeurd in februari 2021 en na parlementaire behandeling bekrachtigd door de VR op 19 november 2021</p> <p>Het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering werd een tweede keer principieel goedgekeurd op 3 december 2021. Doelstelling is definitieve goedkeuring in Q1 2022.</p> <p>De ontwikkeling van het loket is lopende. Hiervoor werd een projectleider aangesteld en een samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Wonen Vlaanderen, VEKA en Fluvius ondertekend.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Fase 1 regelgevend traject: Definitieve goedkeuring decreet oprichting uniek loket door Vlaamse regering. Eerste principiële goedkeuring besluit Vlaamse regering. Definitieve goedkeuring besluit vergoedingen elektriciteitsdistributienetbeheerders	2021 Q3	Gerealiseerd		
Fase 2 regelgevend traject. Bekrachtiging Vlaamse Regering decreet oprichting uniek loket. Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering besluit oprichting uniek loket en wijziging van het Energiebesluit en het Besluit Vlaamse Codex Wonen.	2022 Q1	Op schema		
Go live uniek loket frontoffice en backoffice met basisfunctionaliteiten	2022 Q3	Op schema		
Uitbreiding functionaliteiten uniek loket voor premieaanvragen	2023 Q2	Op schema		
Definitieve goedkeuring van de nieuwe regelgeving voor een hervorming van de energie- en woningrenovatiepremies (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Op schema		
Toekenning van 60.000 energiepremies voor investeringen uitgevoerd in 2022, resulterend in minstens 54.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)	2023 Q2	Nog niet gestart		
Toekenning van 80.000 energiepremies voor investeringen uitgevoerd in 2023, resulterend in 72.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)	2024 Q2	Nog niet gestart		
Toekenning van 80.000 premies voor energetische investeringen uitgevoerd in 2024, resulterend in 72.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)	2025 Q2	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
220.000 premie-aanvragen voor energiegerelateerde investeringen over periode 2022-2024.	220000	2025 Q1		
Aantal unieke woningen gerenoveerd	202 000	2025 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	180.000.000 EUR
Uitvoering VAK	180.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 180.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>1ste principiële goedkeuring decreetswijziging op 5 februari 2021 - decreet</p> <p>1ste principiële goedkeuring decreetswijziging op 5 februari 2021 - nota</p> <p>1ste principiële goedkeuring decreetwijziging op 5 februari 2021 - memorie</p> <p>Bisnota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van vergoedingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter financiering van openbare dienstverplichting en ter bevordering van het rationeel energiegebruik</p> <p>Schematisch overzicht geïntegreerde premie. Bijlage</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Ongeveer 101.000 prosumenten verliezen in 2021 hun (virtuele) terugdraaiende teller gezien ze al over een digitale meter beschikken. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 heeft een onmiddellijke of uitgestelde impact op alle prosumenten die sinds 2006 een PV-installatie plaatsten. Naast een retroactieve investeringspremie voor de getroffen prosumenten, wordt een flankerend beleid voorgesteld om de impact op deze prosumenten te beperken. Omdat het aangewezen is dat eigenaars van decentrale productie-installaties hun onmiddellijk elektriciteitsverbruik verhogen of hun productie tijdelijk opslaan, wordt een toegenomen interesse verwacht bij dergelijke prosumenten om een thuisbatterij te plaatsen. De batterij kan immers het zelfverbruik en de flexibiliteit verhogen en aldus de investering in PV rendabeler maken. Daarom wordt voorzien in een hogere premie voor thuisbatterijen. Hiervoor wordt 19 780 000 euro relancemiddelen begroot.</p> <p>Het wegvallen van het principe van de virtuele terugdraaiende teller en het feit dat op termijn het uitsluitend nachttarief verdwijnt zijn evoluties die het in het bijzonder voor eigenaars van een warmtepomp en/of elektrische boilers en eigenaars met een accumulatieverwarming belangrijk maken om het gebruik van de apparaten zoveel mogelijk te sturen naar de juiste momenten van de dag. Door die toestellen automatisch aan te sturen, kan de factuur verlaagd worden. Het komt er op aan om enerzijds het energieverbruik te spreiden en momenten van hoge marktprijzen te vermijden en anderzijds het energieverbruik te verschuiven naar momenten waarop ze zelf produceren of de marktprijs laag is. Ter ondersteuning van die aanpassing wordt een nieuwe REG-premie ingevoerd om accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen automatisch aan te sturen. Hiervoor wordt 270 000 euro relancemiddelen begroot.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	20.050.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	Toekenning van minstens 8460 premies voor thuisbatterijen en/of sturing elektrische warmte
Outcome	Een flexibeler elektriciteitsverbruik: een verschuiving van de vraag naar elektriciteit wanneer de prijzen laag zijn en (hernieuwbare) energie overvloedig ter beschikking is, een hoger zelfverbruik van eigen geproduceerde elektriciteit bij prosumenten. Dit alles leidt tot minder congestie op het net en de mogelijkheid om meer hernieuwbare energie aan te sluiten.
Beoogde impact	Aandeel hernieuwbare energie in totaal energiegebruik - Finaal energieverbruik in GWh

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Op 9 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit definitief goed wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt. In dat wijzigingsbesluit zijn ook de verhoogde batterijpremie en de premie voor sturing van elektrische warmte geregeld.</p> <p>De batterijpremie kan aangevraagd worden bij VEKA via https://www.energiesparen.be/thuisbatterij. Het VEKA heeft tevens een simulator voorzien waarin ééniieder zijn terugverdientijd en premie kan berekenen. De premie kent een groot succes.</p> <p>De premie sturing elektrische warmte kan aangevraagd worden bij Fluvius via https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/sturing-elektrische-warmte. In aanmerking komende sturingsapparaten worden opgelijst op www.maakjemeterslim.be. Op 1 april 2022 zal het jaarrapport over 2021 ten laatste gevalideerd zijn. Op dat moment kan over premie-aantallen worden gerapporteerd.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Regelgeving voor premie thuisbatterij en sturing elektrische warmte definitief goedgekeurd (Vlaamse mijlpaal)	2021 Q3	Gerealiseerd
Regelgeving voor premie thuisbatterij en sturing elektrische warmte definitief goedgekeurd (EU mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd
Toekenning van 8.460 premies aan huishoudens voor thuisbatterijen en apparaten voor slimme sturing in Vlaanderen vanaf Q2 2021	2023 Q2	Op schema

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal verhoogde premies thuisbatterij toegekend sinds Q2-2021	7740	2023 Q2	10.588	100 %
Aantal premies sturing elektrische warmte aangevraagd	720	2023 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.050.000 EUR
Uitvoering VAK	8.470.000 EUR
Uitvoering VEK	8.470.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.050.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Definitieve goedkeuring op 09/07/2021 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Volgens de langetermijn renovatiedoelstelling moeten alle bestaande woongebouwen uiterlijk in 2050 een vergelijkbaar energieprestatieniveau halen als nieuwbouwwoningen met vergunningsaanvraag in 2015. Deze langetermijndoelstelling betekent dat tegen 2050 het gemiddelde EPC-kengetal van het volledige woningenpark wordt verlaagd met 75%. Op de gehanteerde EPC-schalen met energielabels (A tot F), komt dit overeen met het label A (EPC-kengetal 100).

Op basis van data uit de EPC-databank wordt vastgesteld dat op dit moment ongeveer 3,5% van het bestaande woningenpark van bijna 3 miljoen woningen (huizen en appartementen) voldoet aan het streefdoel, terwijl 29% een F-label heeft. Er moeten dus nog 2,9 miljoen woningen evolueren naar de doelstelling 2050 (96,5% van het woningenbestand). Dat betekent dat, als de inspanningen uniform worden gespreid, de komende dertig jaar per jaar gemiddeld 3% van het woningenbestand of ruim 95.000 wooneenheden moeten evolueren naar de doelstelling 2050. Gebeurt de renovatie, zoals doorgaans het geval is, in fases, ligt de noodzakelijke renovatiegraad nog hoger.

Om dit te verwezenlijken legt de langetermijnrenovatiestrategie 2050 een sterk accent op grondige renovaties op natuurlijke opportuniteitsmomenten, zoals bijvoorbeeld bij transactiemomenten (verkoop, vererving), start van een nieuwe verhuring en sloop van de slechtste woningen gevolgd door vernieuwbouw. Maar ook buiten deze sleutelmomenten blijft het verhogen van de renovatiegraad en het stimuleren van diepgaande energetische renovaties een permanente noodzaak. Prioriteit gaat naar de slechtst presterende woningen.

Daarom werd vanaf 1 januari 2021 een EPC-labelpremie ingevoerd voor die investeerders in een woning of appartement met een zeer slecht EPC-label, die de woning renoveren tot minstens label C (appartement tot minstens label B). Het premiebedrag varieert in functie van het behaalde label na renovatie en kan in stappen worden verkregen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	25.350.000 EUR
Output	8400 aangevraagde premies over periode 2021-2022
Outcome	Energiebesparing van EPC-label E/F/D naar EPC-label C/B/A in 8400 woningen
Beoogde impact	Broeikasgasemissies - Finaal energieverbruik in GWh

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Maatregel ingegaan vanaf 2021. Relancemiddelen voorzien voor renovaties in 2021 en 2022 (dus start-EPC's opgemaakt in die 2021 en 2022). Op basis van een slecht EPC-voor en een goed EPC-na binnen de 5 jaar na start EPC, kan een premie worden aangevraagd bij de netbeheerder. Wie start met renoveren in 2021, heeft dus tijd t.e.m. 2026 om dat nieuwe EPC te laten opmaken en daarna nog 1 jaar tijd om de premie-aanvraag in te dienen. Bijgevolg kent dit project een trage opstart, wat echter niet representatief is voor het uiteindelijk succes en het uiteindelijk aantal grondig gerenoveerde woningen. Momenteel zijn 102 premies effectief uitbetaald (stand van zaken t.e.m. oktober 2021) en ca. 2000 start-EPC's ingediend (stand van zaken t.e.m. november 2021). Dit is waarschijnlijk nog een onderschatting van het effectief aantal opgestarte werken in 2021, gezien men ook kan wachten tot na de uitvoering van de werken om het start-EPC en nieuwe EPC in te dienen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Goedkeuring door Vlaamse Regering van de energielabelpremie (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd		
1600 gerenoveerde woningen met EPC-labelpremie	2022 Q1	Vertraging		
8400 woningen gerenoveerd met EPC-labelpremie (RRF-mijlpaal)	2023 Q2	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
8400 uitbetaalde premies over periode 2021-2022	8400	2023 Q2	102	1,2 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.350.000 EUR
Uitvoering VAK	190.000 EUR
Uitvoering VEK	190.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 25.350.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds die beroep kunnen doen op deze subsidies voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Het voordeel dat hiermee wordt gecreëerd door een lagere energiefactuur komt ten goede van de sociale huurders.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Met het oog op het behalen van de ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050, moet er volop worden ingezet op de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Zo werd door de Vlaamse Regering immers beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Naast grote inspanningen op de private woonmarkt, wordt ook van de sociale huisvestingssector een inhaalbeweging verwacht op dat vlak .</p> <p>Het doel van dit project is om aan de hand van de toekenning van VKF-premies aan sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaamse Woningfonds de energetische renovatie van sociale huurwoningen te stimuleren en te versnellen. Naast de opname van een gesubsidieerde lening bij de renovatie van sociale huurwoningen kunnen initiatiefnemers dan ook gebruik maken van deze subsidie wat voor hen voordeliger is. Op die manier worden initiatiefnemers gestimuleerd om projecten op te starten wat enerzijds een positieve impact zal hebben bij het heropstarten van de bouwsector na de coronamaatregelen en anderzijds zal resulteren in sociale woningen met een laag energieverbruik en bijgevolg een beperkte CO2-impact.</p> <p>Rekening houdend met het gegeven dat er geen subsidie toegekend kan worden voor de plaatsing van een gascondensatie ketel, gaan we uit van een gemiddelde subsidie van 6.734 euro per woning. Met een budget van 30 miljoen euro, afkomstig van het relanceplan 'Vlaamse Veerkacht', zullen op die manier ongeveer 4.455 woningen een energetische renovatie kunnen ondergaan.</p> <p>De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal instaan voor het beheer en de toekenning van deze subsidie aan de initiatiefnemers, zoals ze dat tot nu toe ook al heeft gedaan voor de middelen die vanuit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking werden gesteld voor de</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

energetische renovatie van sociale huurwoningen. Er kan dus verder gewerkt worden op een bestaande regeling die al is ingeschreven in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.48 tot en met artikel 5.55). Daarbij kan een initiatiefnemer afhankelijk van de energetische investeringen die worden gedaan in de sociale huurwoning zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een zonneboiler, condensatietel, warmtepomp, zoldervloerisolatie, de na-isolatie van de bestaande spouwmuur,... een subsidie aanvragen bij de VMSW.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	30.000.000 EUR
Output	Aan een gemiddelde subsidie van 6.743 euro per woning, zal met een budget van 30 miljoen euro op die manier ongeveer 4.455 woningen een energetische renovatie kunnen ondergaan.
Outcome	Versnelde energetische renovatie van sociale huurwoningen met een daling van het energieverbruik als gevolg, wat op zijn beurt zal resulteren in een daling van de CO ₂ -uitstoot.
Beoogde impact	Aandeel hernieuwbare energie in totaal energiegebruik - Evolutie gemiddeld E-peil woongebouwen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project is momenteel in uitvoering. De VMSW heeft al een subsidie toegekend voor de energetische renovatie van 1.501 sociale huurwoningen. Begin 2022 zal een tweede herverdeling van de middelen worden aangevraagd zodat het volledige budget in 2022 kan besteed worden.
Noodzakelijke politieke actie	/

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Opmaak nota aan de Vlaamse regering met oog op herverdeling middelen.	2021 Q2	Gerealiseerd
Opmaak toelagebesluit waarbij het eerste deel van de middelen vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking worden gesteld die instaat voor het beheer en de toekenning van de subsidie.	2021 Q3	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Tweede herverdeling waarbij de resterende middelen (15 mio euro in VAK en VEK) worden ter beschikking gesteld van het agentschap Wonen-Vlaanderen	2022 Q1	Op schema		
Opmaak toelagebesluit waarbij het tweede deel van de middelen vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking worden gesteld die instaat voor het beheer en de toekenning van de subsidie.	2022 Q2	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal sociale huurwoningen waarvoor een subsidie voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen werd toegekend	4455	2022 Q4	1.501	33,69 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.165.000 EUR
Uitvoering VEK	2.054.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 30.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Renovaties sociale woningen versnellen

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV010 - SOCIALE WONINGBOUW

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting - Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen dankzij de verhoogde leningsmachtiging meer leningen opnemen bij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), zodat er sneller bijkomende sociale woningen gebouwd en gerenoveerd kunnen worden. De uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium richt zich bij uitstek tot de meest kwetsbare groepen op de woningmarkt.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

De vraag naar sociale huurwoningen in Vlaanderen is groter dan het aanbod. De huidige pandemie zorgt bovendien voor bijkomende uitdagingen op de woningmarkt, voornamelijk in het onderste segment van de huurmarkt.

Daarnaast staan we voor ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050. Zo werd door de Vlaamse regering beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Om het patrimonium binnen de sociale huisvestingssector op dit niveau te brengen, moeten nog grote investeringen gebeuren.

De doelstelling van dit project is om de sociale woningbouw en de renovatie van sociale woningen te versnellen door éénmalig in het begrotingsjaar 2021 de FS3-machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te verhogen met 250 miljoen euro. Hierdoor kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen goedkope leningen aangaan bij VMSW om hun bouw- en renovatieprojecten te financieren. De VMSW staat in voor het toekennen van deze leningen aan de initiatiefnemers volgens een regeling die is opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.38 tot en met 5.44).

Voor de financiering van deze maatregelen zal de VMSW renteloze leningen opnemen bij het Vlaamse Gewest die zich op haar beurt zal financieren op de kapitaalmarkt. Het budget van 5

PROJECTOMSCHRIJVING

miljoen euro betreft een compensatie van de rentelasten waarmee Financiën & Begroting zal worden geconfronteerd gedurende een periode van 4 jaar (gerekend aan 0,5% rente).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	5.000.000 EUR
Output	Uitgaande van een gemiddelde bouwkost kunnen dankzij de verhoogde FS3-machtiging van 250 miljoen euro ongeveer 1.300 sociale huurwoningen gebouwd worden. Een deel van het budget kan ook naar renovatie gaan. Aangezien de omvang en de complexiteit van renovaties sterk kan variëren, is het niet direct mogelijk om daar op voorhand een exact aantal woningen op te kleven.
Outcome	Eenzijds zal dit leiden tot de bouw van bijkomende sociale huurwoningen wat een positief effect zal hebben op de kandidaat-huurders die momenteel op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Anderzijds zal dit ook voor een versnelling zorgen in de energetische renovatie van sociale huurwoningen met een daling van het energieverbruik als gevolg, wat op zijn beurt zal resulteren in een daling van de CO2-uitstoot.
Beoogde impact	Aandeel bevolking onder de armoededrempel - Evolutie gemiddeld E-peil woongebouwen - Broeikasgasemissies

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Na de goedkeuring van dit project op de Vlaamse regering van 25 juni 2021 werd er voorlopig nog geen gebruik gemaakt van dit budget voor de nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen. Dit zal wel het geval zijn in de loop van 2022 waar verwacht wordt dat het volledige budget zal worden opgebruikt.
Noodzakelijke politieke actie	/

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Opmaak nota aan de Vlaamse Regering met oog op herverdeling van de middelen	2021 Q2	Gerealiseerd
Herverdeling 1,25 mio euro in 2021	2022 Q3	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2021		2021 Q4	Op schema	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2022		2022 Q3	Op schema	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2022		2022 Q4	Op schema	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2023		2023 Q3	Op schema	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2023		2023 Q4	Op schema	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2024		2024 Q3	Op schema	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2024		2024 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal 'sociale huurwoningen – nieuwbouw' die werden toegewezen op het jaarbudget	1300	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 5.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Sociale Woningbouw](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energiebedrijf
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Elke Vlaamse entiteit die onderworpen is aan de wetgeving overheidsopdrachten kan gebruik maken van het VEB als aankoopcentrale en/of als opdrachtcentrale. Vanuit haar opdracht concentreert het VEB zich prioritair op overheden in Vlaanderen en in het bijzonder deze die gevat worden door de wetgeving overheidsopdrachten. Met andere woorden: de Vlaamse overheid zelf en entiteiten die werkingsmiddelen, subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse overheid. De entiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit dit relanceplan zijn evenwel beperkt tot deze waarbij de Vlaamse Overheid ook de toezichhoudende entiteit is (institutionele sector 1312), en de aan de wetgeving overheidsopdrachten onderworpen onderwijs- en zorginstellingen in het Vlaams Gewest.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Verbeteren van energieprestatie Vlaamse Overheid door ondersteuning investeringen</p> <p>Voor de overheidsgebouwen wordt vanuit de voorbeeldrol van de overheid 2045 gesteld voor een CO₂-neutrale gebouwenvoorraad. De uitdaging is om tegen 2045 geen emissies meer uit gas of stookolie te genereren in gebouwen en technische infrastructuur.</p> <p>De Vlaamse overheid wil haar verantwoordelijkheid opnemen in het behalen van de doelstellingen met behulp van het interne Klimaatplan van de Vlaamse overheid. Elke entiteit moet jaarlijks haar primair energieverbruik met 2,5% verminderen en hiertoe een meerjarenplan opnemen in hun ondernemingsplan (VR 2020 2905 0517/1BIS). Om deze klimaatdoelstellingen te halen, moeten onder andere investeringen gebeuren in een goed onderbouwde vastgoedstrategie en daaraan gekoppeld duurzaam meerjarenonderhoudsplan met implementatie van energiebesparende maatregelen.</p> <p>De projecten die worden weerhouden voor het toekennen van steun, moeten zorgen voor een</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

versnelling van de klimaatinspanningen en moeten helpen om de economie te laten opveren. We opteren hierbij voor projecten die direct of indirect bijdragen tot het verduurzamen van het vastgoed van de Vlaamse overheid.

- Projecten die inzicht geven in de energie- en koolstofbesparingsmogelijkheden
Daarnaast worden ook maatregelen ondersteund die slechts indirect tot een energie- of koolstofbesparing leiden, maar wel essentieel zijn om tot een koolstofneutraal patrimonium te komen doordat ze leiden tot een kwantitatief en kwalitatief inzicht in besparingsmogelijkheden en verbruik.

- Energiescans of -audits

- Projecten die leiden tot een directe energie- en koolstofbesparing
Dit zijn meestal projecten waarbij technische aanpassingen en/of gebouwschilmaatregelen worden geïmplementeerd (niet-limitatieve lijst):

- Relighting

- Verwarmen en koelen (HVAC), met bijzondere aandacht voor uitfasering van stookolie-installaties

- Isolatiemaatregelen (muur, dak, vloer)

- Schrijnwerk en beglazing

- Energieprestatiecontracten, zowel bij de facilitatie als bij de uitvoering

- Hernieuwbare energie (opwekking en opslag)

Er zal een procentuele steun toegekend worden op de weerhouden projecten, zodat de subsidie-efficiëntie gewaarborgd wordt. Het percentage steun dat zal worden toegekend, wordt bepaald overeenkomstig de (potentiële) impact van het project of maatregel, zijnde de energie- en CO₂-besparing.

Er wordt geopteerd om met een vast steunpercentage te werken per type project of maatregel.

Energiescans of -audits: 20% - 25% (Vlaamse overheid)

EPC-facilitatie en uitvoering: 20% - 25% (Vlaamse overheid)

Groene Warmte: 30% - 37,5% (Vlaamse overheid)

Technische installaties: 30% - 37,5% (Vlaamse overheid)

Gebouwschil 40% - 50% (Vlaamse overheid)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	20.000.000 EUR
Output	Kwantitatieve einddoelstelling: 261.428 m ² gerenoveerd vloeroppervlak
Outcome	Een beter inzicht in de energie- en koolstofbesparingsmaatregelen en een verbetering van de energieprestaties van de Vlaamse Overheid
Beoogde impact	Finaal energieverbruik in GWh - Aandeel hernieuwbare energie in totaal energiegebruik

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het project werd doorgestart na agendering VR.</p> <p>De responsgraad van de doelgroep is groot en er lopen momenteel een groot aantal Relance-projectaanvragen.</p> <p>De doorlooptijd van projectaanvraag tot goedgekeurd project neemt om alle stappen te doorlopen enige tijd in beslag. Gezien de doorstart van het project in de zomer, is het normaal dat we momenteel nog niet de resultaten hiervan zien.</p> <p>Momenteel zijn er 10 projecten doorgestart (overeenkomstig met 8% van de beoogde renovatiedoelstelling), herverdeling Relanceprovisie geagendeerd voor 10/12/2021.</p> <p>Er zijn daarnaast 73 potentiële Relanceprojecten die zich in de offertefase bevinden en waarvan in Q1 2022 het resultaat tot doorstart verwacht wordt. We kunnen dus een vertraging vaststellen, maar verwachten een grote stijging van de realisatiegraad in Q1 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Validatie operationeel kader voor toewijzing projecten	2021 Q1	Op schema		
Selectie van weerhouden projecten 2021 (46.764 m ² in deze periode)	2021 Q3	Vertraging		
Selectie van weerhouden projecten 2021 (70.146 m ² in deze periode, 116.910m ² cumulatief)	2021 Q4	Vertraging		
Selectie van weerhouden projecten 2022 (57.807 m ² in deze periode, 174.717 m ² cumulatief)	2022 Q2	Nog niet gestart		
Selectie van weerhouden projecten 2022 (86.711 m ² in deze periode, 261.428 m ² cumulatief)	2022 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Verbeteren van energieprestatie Vlaamse Overheid door selectie van projecten voor de renovatie van 261.428 m ² vloeroppervlak	261.428 m ²	2022 Q4	20.090	8 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Relance budget 11 – VEB energie-efficiëntie Vlaamse overheid

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Woningeigenaars, sectoren en bedrijven actief in de bouwsector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Sloop en heropbouw is een belangrijke beleidsmaatregel om het verouderd patrimonium, dat vaak minder geschikt is voor een grondige energetische renovatie, versneld te laten slopen en te herbouwen, via een stimulerend beleid. Op die manier komt bebouwde ruimte versneld terug vrij, waarbij deze ruimte opnieuw wordt ingevuld met woongebouwen die aan de actuele energieprestatie-eisen voldoen.</p> <p>De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd ingevoerd vanaf 1 oktober 2018 en liep af op 31/12/2020. Deze premie van 7500 euro was bestemd voor de gebieden waar de 6% btw bij sloop- en heropbouw niet van toepassing was (= buiten de centrumsteden). Vanaf 1 januari 2021 werd de federale maatregel inzake 6% btw gedeeltelijk uitgebreid naar het volledige grondgebied, weliswaar beperkt tot de enige/eigen woning met een bewoonbare oppervlakte tot 200 m² en dit voor een periode van 2 jaar.</p> <p>De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd verlengd voor bouwaanvragen in 2021 en 2022, en is aanvullend bij de federale 6% btw bij sloop en heropbouw voor dezelfde periode. Deze Vlaamse sloop- en heropbouwpremie is enkel bestemd voor wie niet kan genieten van de uitbreiding van de federale maatregel.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	17.600.000 EUR
Output	1760 uitbetaalde sloop- en herbouwpremies
Outcome	Minstens 1760 bijna-energie neutrale nieuwbouwwoningen ter vervanging van energie-inefficiënte woningen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Broeikasgasemissies - Finaal energieverbruik in GWh

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De verlenging van de sloop- en herbouwpremie werd goedgekeurd Q4-2020. De verhoogde premie kan aangevraagd worden voor omgevingsvergunningen aangevraagd tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Aanvraagprocedure sloop- en heropbouw operationeel	2021 Q1	Gerealiseerd
300 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2021 Q2	Gerealiseerd
600 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2021 Q4	Gerealiseerd
Regelgevende aanpassingen: verlenging en verhoging Vlaamse sloop- en heropbouwpremie in 2021 en 2022 (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd
900 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2022 Q2	Nog niet gestart
1200 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2022 Q4	Nog niet gestart
1400 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2023 Q2	Nog niet gestart
1600 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2023 Q4	Nog niet gestart
1760 sloop- en herbouwpremies uitbetaald (RRF mijlpaal)	2024 Q4	Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
1760 uitbetaalde sloop- en herbouwpremies	1760	2024 Q4	696	40 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	17.600.000 EUR
Uitvoering VAK	5.415.000 EUR
Uitvoering VEK	5.415.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 17.600.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

02. Fietsinfrastructuur

VV013 - DE INRICHTING VAN EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - De Werkvennootschap - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Lantis - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Weggebruikers, Vlaamse havens, lokale besturen en hun inwoners, bedrijven, Vlaamse havens

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Door voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden te voorzien worden zoveel mogelijk mensen gestimuleerd om de fiets te gebruiken, en ondersteunen we een fietsreflex zowel voor recreatieve als functionele verplaatsingen. Zo kunnen we van Vlaanderen een echte fietsregio maken, de modal shift realiseren en bij gevolg het aandeel duurzame transportmodi laten toenemen.</p> <p>De investeringen die in het licht van deze doelstelling gedaan worden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de nieuwe aanleg en het heraanleggen en het herstel van vrijliggende fietspaden, - het herinrichten van kruispunten, - het vervolledigen van fietssnelwegen, - de aanleg en het herstel van jaagpaden, - de verlichting van fietspaden en fietsoversteken, - het realiseren en herstellen van fietsbruggen - het aanleggen van fietstunnels en - tunnels <p>Alle voorbereidende onderdelen zoals studie, ontwerp en onteigeningen voor deze fietsprojecten worden hier ook op aangerekend.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	250.000.000 EUR
Output	Aanleg van 67km nieuw fietspad, Verbetering van 405km fietspad tegen 2026.
Outcome	Aantrekkelijk maken van de fiets als vervoersmiddel, daling gebruik van personenwagens.
Beoogde impact	Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Aantal dodelijke verkeersslachtoffers - Aantal verkeersongevallen - Aandeel auto in modale verdeling verplaatsingen - Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De diverse agentschappen zijn actief bezig met de uitvoering of voorbereiding van fietsinvesteringen. Deze investeringen bestaan uit de aanleg van nieuwe fietspaden, het herstel en verbeteren van bestaande fietspaden (bv. jaagpaden), het aanleggen van fietsersbruggen en-tunnels alsook de nodige investeringen in fietsenstallingen.</p> <p>Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft zo reeds 10,37km fietspad verbeterd. Op dit meetmoment zijn werken in uitvoering voor 0,6km nieuw fietspad en 37.95km te verbeteren fietspad. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor nog 0,87km nieuw fietspad en 248.87km te verbeteren fietspad.</p> <p>De Vlaamse Waterweg nv heeft 2,1km fietspad verbeterd en is bezig met de uitvoering van de verbeteringen aan 36,09km fietspad. Ook de werken voor de bouw van een fietsbrug (Wielsbeke-Waregem) zijn in uitvoering. De werken aan een fietsbrug (Gent t.h.v. Eiland), 20,56km te verbeteren en 5,2km nieuw fietspad worden op dit moment ingepland. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor nog 3,16km te verbeteren en 13,42km nieuw fietspad, alsook de renovatie en bouw van diverse fietsersbruggen.</p> <p>De Werkvennootschap plant de verbeteringen aan 9km fietspad. Deze werken starten weldra op.</p> <p>Lantis voorziet vanaf Q1 2022 de opstart van meerdere projecten voor 6,42km verbeterd en 9,62km nieuw fietspad. Daarnaast zijn er ook nog 3 projecten voor het installeren van fietsenstallingen aan de Park & Rides.</p> <p>Gecumuleerd betekent dit voor de geambieerde fietspadkilometers dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de werken voor 86,51km verbeterd fietspad uitgevoerd of lopende zijn; • de werken voor 0,6km nieuw fietspad lopende zijn; • de werken voor 5,2km nieuw en 29,56km te verbeteren fietspad worden ingepland;

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<ul style="list-style-type: none"> er nog voor 23,91km nieuw en 258,45km te verbeteren fietspad in voorbereiding is. <p>Deze investeringen in 2021 en 2022 dragen zo sterk bij tot de beoogde ambities tegen 2026.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Fietsprojecten Lantis		2024 Q4	Op schema	
Fietsprojecten De Werkvennootschap		2024 Q4	Op schema	
Fietsprojecten De Vlaamse Waterweg		2024 Q4	Op schema	
Fietsprojecten Agentschap Wegen en Verkeer		2024 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal kilometer nieuw fietspad	67	2026 Q2		
aantal kilometer verbeterd fietspad	405	2026 Q2	12,47	3,08 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000.000 EUR
Uitvoering VAK	96.129.000 EUR
Uitvoering VEK	7.586.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> Europees Herstelfonds: 219.230.000 EUR Brexit-fonds: 0 EUR React EU: 0 EUR Vlaamse relancemiddelen: 30.770.000 EUR Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV039 - Versnelling investeringen in veilige schoolroutes](#)

VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers - Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	De Vlaamse gemeenten, inwoners, weggebruikers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

We voorzien een enveloppe van 150 miljoen euro voor cofinanciering via trekkingsrechten per gemeente (op basis van het aantal inwoners). Elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor investeringen in fietsinfrastructuur versterken we met 1 euro. Zo wordt er in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten gerealiseerd. De subsidie kan gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook voor heraanleg of herinrichting van bestaande infrastructuur of het duurzaam en structureel onderhoud ervan. Ook de studie en ontwerp (wanneer resulterend in een effectief uitgevoerd project en niet gebeuren door eigen personeel), de aanleg van kunstwerken (bruggen, tunnels, etc.), en onteigeningen die een onderdeel vormen van de fietsinfrastructuur komen in aanmerking.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	150.000.000 EUR
Output	Gerenoveerde fietspaden en nieuwe fietspaden (aan gemeentewegen)
Outcome	Stijging van het aantal afgelegde fietskilometers
Beoogde impact	Filezwaarte op de Vlaamse snelwegen - Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Aandeel auto in modale verdeling verplaatsingen - Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er zijn reeds 41 projecten aangemeld.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Opmaak regelgeving		2021 Q1	Gerealiseerd	
Lokale dossiers aangemeld voor nieuwe en vernieuwde fietsinfrastructuur		2022 Q4	Op schema	
Subsidies uitbetaald voor nieuwe fietspaden en vernieuwde fietsinfrastructuur		2025 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
gerenoveerde fietspaden aan gemeentewegen	946,1	2025 Q4		
nieuwe fietsinfrastructuur aan gemeentewegen	71,7	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	150.000.000 EUR
Uitvoering VAK	653.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 126.230.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 23.770.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur](#)

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur. Bijlage](#)

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur. Nota](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs

VV015 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS (DIGISPRONG)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Leerlingen, personeelsleden en onderwijsinstellingen van het leerplichtonderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Vlaanderen wil de coronacrisis aangrijpen voor een duurzame digitale versnelling in het onderwijs. Dit doen we door te investeren in de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren en in ICT-toestellen voor gedeeld gebruik in elke kleuterklas en klas van het eerste tot en met vierde leerjaar in het lager onderwijs. Daarnaast voorzien we middelen voor het ter beschikking stellen van een eigen ICT-toestel voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs en de leerlingen van het secundair onderwijs.</p> <p>Er wordt ook voorzien in de nodige omkadering voor scholen, onder meer met een sterker statuut voor de ICT-coördinator van de school, de uitbouw van digitale dienstverlening aan scholen en een kennis- en adviescentrum ten dienste van het werkveld. Er komen aangepaste ICT-opleidingen voor leerkrachten en ook in de lerarenopleidingen zal er meer ingezet worden op digitale competenties. Ook de leerkrachten voorzien we van ICT-materiaal.</p> <p>Digisprong bevat ook verschillende acties om te voorzien in kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal en om creativiteit te stimuleren. De uitbouw van KlasCement als uniek platform voor educatief "open" lesmateriaal en de doorontwikkeling van het Archief voor Onderwijs ter verrijking van de leermiddelen met audiovisueel materiaal. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal in TSO en BSO. Tenslotte zetten we ook in op cybersecurity.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	375.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	IT-infrastructuur in scholen die up to date is, beschikbaarheid van vormingsaanbod rond digitalisering, beter statuut voor ICT-coördinatoren, beschikbaarheid van een kennis- en adviescentrum digisprong.
Outcome	Digitale versnelling in het onderwijs realiseren
Beoogde impact	Aandeel bevolking dat over digitale basisvaardigheden beschikt - Investerings in schoolinfrastructuur - ICT integreren in het onderwijs

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Met betrekking tot speerpunt 1 zijn er momenteel geen evoluties. Een deel van de voorziene middelen voor ICT-infrastructuur werd reeds voor september uitbetaald.</p> <p>Met betrekking tot speerpunt 2 werd op 3/09/2021 een Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot ICT-coördinatie definitief goedgekeurd. In het basisonderwijs bestond het ambt van ICT-coördinator al binnen de categorie van het beleids- en ondersteunend personeel. Dat ambt is qua puntenwaarde en salarisschaal gelijk getrokken met de nieuwe ambten op de andere niveaus. Sinds 1 september 2021 is het ambt van ICT-coördinator ook ingevoerd in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Het gaat om een wervingsambt binnen de categorie van het ondersteunend personeel. De middelen voor de uren ICT-coördinatie worden vanaf dit schooljaar (2021-2022) structureel verhoogd met 22 miljoen euro op jaarbasis.</p> <p>Het Kenniscentrum Digisprong zit in opstartfase. De inkanteling van KlasCement is aangevat, een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd en een ploeg van personeelsleden is van start gegaan. In oktober vond de eerste adviserende stuurgroep plaats. In het voorjaar 2022 wordt werk gemaakt van een eigen website en communicatie.</p> <p>Het Kenniscentrum biedt reeds ondersteuning aan scholen in de vorm van concrete tips en stappenplannen m.b.t. bijvoorbeeld afstandslernen en digitale evaluaties op afstand. Specifieke projecten worden door het Kenniscentrum Digisprong opgevolgd (bv. een Europees project over team based ICT-Coördinatie of de ontwikkeling van een single sign on infrastructuur). Het Kenniscentrum is betrokken bij diverse beleidsvoorbereidende processen en bij de uitrol van diverse relancedossiers.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Speerpunt 1 Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur : monitoring van de middelen toegekend aan de instellingen	2024 Q1	Op schema
Speerpunt 2: Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT schoolbeleid, monitoring van de ICT-coördinatoren	2022 Q3	Op schema
Speerpunt 3: ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen, monitoring van ICT-coördinatoren en rapportering over werking van het Kenniscentrum (zie speerpunt4)	2022 Q3	Op schema
Speerpunt 4: Een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld, een dienstencatalogus is beschikbaar	2022 Q2	Op schema
Speerpunt 4: Opstart van een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld	2021 Q4	Gerealiseerd
Speerpunt 4 Een kennis- en adviescentrum Digisprong ten dienste van het onderwijs: rapportering over de werking	2024 Q2	Op schema
Voor alle speerpunten: Resultaten van het MICTIVO-onderzoek zijn beschikbaar	2024 Q1	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	375.000.000 EUR
Uitvoering VAK	237.287.000 EUR
Uitvoering VEK	1.968.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 318.160.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 56.840.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit aan de Vlaamse Regering van 11 december 2020 en Visienota Digisprong Van Achterstand naar Voorsprong ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde en nota aan de Vlaamse Regering](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 30 april 2021 en besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding verpleegkunde](#)

[Advies Raad van State bij dit besluit](#)

[Plan Vlaamse Veerkracht: Kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld en aangepaste digitale leermiddelen. 25/06/2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie en protocollen van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 24/06/2021 en Bijlage](#)

[BVR van 3/09/2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie](#)

[BVR van 3/09/2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie. Nota](#)

[BVR van 3/09/2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie. Advies Raad van State](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

04. Opleidings- en loopbaanoffensief

VV016 - ACTIVERING-VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80 PROCENT VESOC

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Raad van Bestuur VDAB, werkgevers, sectorfondsen, onderwijspartners (CVO's, Hoger Onderwijs), zorgsector, taalcoachingspartners, ATC, SERV

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We versterken de veerkracht van werknemers, ondernemingen en zelfstandige ondernemers en streven naar maximale en duurzame tewerkstelling. Vermits de arbeidsmarkt vandaag verschillende jobkansen biedt, is het van belang om snel te schakelen, om bestaande vacatures maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden.</p> <p>Dit vereist een VDAB die samen met partners klaarstaat om de nieuwe instroom van werkzoekenden het hoofd te bieden. Wie zijn werk verliest als gevolg van corona zal begeleid worden naar een nieuwe job, maar evenzeer blijft VDAB inzetten op activering van o.a. anders-actieven en inburgeraars. Het vereist ook ondernemingen die klaar staan om al deze mensen te ontvangen door breder te rekruteren, in te zetten op vorming en opleiding, op werkplekleren en op een inclusief ondernemingsklimaat.</p> <p>Mensen duurzaam aan het werk houden betekent ook meer dan ooit aandacht besteden aan de gevolgen van corona en de digitale transformatie op de werkvloer. Daarom zetten we in op werkbaar werk (en telewerken) in ondernemingen en organisaties. We versterken ondernemingen en organisaties, ook in de sociale economie, om de transitie te maken met aandacht voor werkbaarheid, wendbaarheid, welzijn en het menselijk potentieel in de organisatie. Via de oproep strategische transformatie en innovatie zullen ondernemingen in de sociale economie worden ondersteund in het conceptualiseren, ontwikkelen en uitrollen van strategische bedrijfstransformaties om optimaal en flexibel te kunnen reageren op markttendensen en samen te werken met de reguliere economie.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Tenslotte dragen we zorg voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: niet-beroepsactieven, personen met een migratieachtergrond, personen met een arbeidshandicap of gezondheidsproblemen, mensen met een psychosociale problematiek, ... We versterken hun loopbanen en werken drempels weg die zij op weg naar (betaald) werk ervaren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	14.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Sociaal ondernemerschap: oproep innovatiesteun • Sociaal ondernemerschap: oproep opleidingen werknemers • Actieplan zij-instroom in de zorg • Uitbreiding transitiepremie voor werkzoekenden en wijziging van de premie voor ondernemers die de premie aanvragen
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)
Beoogde impact	Werkzaamheidsgraad

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het actieplan zij-instroom in de zorg werd goedgekeurd op de RvB van VDAB van 9 juni en wordt sindsdien gefaseerd uitgerold. Najaar '21 werd een communicatiecampagne uitgerold om de opleidingen in de zorg in de kijker te stellen. Ook voor onderwijs ging een communicatiecampagne door. Daarnaast werd het aantal erkende (geïntegreerde) zorgopleidingen uitgebreid. Voorbeelden zijn de opleidingen rond begeleider in de kinderopvang met ruim 850 starters in '21. Voor dit beroep werd ook een EVC geoperationaliseerd.</p> <p>De uitbreiding van de transitiepremie is in uitvoering. Van 1 april 2021 tot en met 22 november 2021 werd de aanvraag voor de transitiepremie goedgekeurd voor 137 -45 jarige ondernemers. Voor de ondernemers met een leeftijd van 45 jaar of ouder trad deze wijziging wat betreft het bedrag van de premie in vanaf 1 juni 2021. Sinds april werden er nog 139 aanvragen van 45 plussers goedgekeurd binnen de oorspronkelijke regeling en werden er 52 aanvragen voor 45 plussers goedgekeurd binnen de gewijzigde regeling.</p> <p>De oproep 'Strategische investerings-en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge COVID-19' werd op 3 november 2021 afgesloten voor projectaanvragen. De inhoudelijke beoordelings- en beslissingsprocedure is zo goed als afgerond. De realisatie van de 66 goed te keuren projecten is voorzien vanaf januari 2022.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De gesloten oproep 'Opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19' werd op 17 november 2021 afgesloten voor projectaanvragen. De inhoudelijke beoordelings- en beslissingsprocedure is zo goed als afgerond. De opstart van het driejarige opleidings- en vormingsprogramma is voorzien vanaf januari 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALLEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Sociaal ondernemerschap: opleidingen werknemers en innovatie-oproep	2021 Q4	Op schema		
Uitbreiding transitiepremie naar doelgroepen	2022 Q1	Op schema		
(Zij-)instroom in de zorgsector en het onderwijs	2022 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal ondernemingen dat in een van de volgende categorieën steun genoten heeft in het kader van de maatregel: i) kmo's die met een competentiecheck zijn bereikt; ii) ondernemingen in de sociale economie die ondersteuning in hun innovatieve strategische transformatie ondersteuning hebben gekregen via de "open innovatieoproep strategische investeringssteun" en het "toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie"; iii) ondernemingen die een transitiepad aanvatten via de transitieproefopstellingen of transitiepunten (RRF)	600	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	14.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	12.372.000 EUR
Uitvoering VEK	372.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 12.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen - nota</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen - advies</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings-en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge COVID-19 – definitieve goedkeuring</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings-en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge COVID-19 - nota</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19 – definitieve goedkeuring</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19- nota</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
<p>VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong)</p> <p>VV017 - Extra aandacht meest kwetsbaren</p> <p>VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren</p>

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Leerlingen en scholieren in het leerplichtonderwijs, studenten in het Hoger onderwijs, personeel in het onderwijs (leerplicht en HO), lerarenopleidingen, Centra Voor Leerlingenbegeleiding.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De visienota "van kwetsbaar naar weerbaar" – deel 1 "beter leren, beter voelen" Plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs" vormt het vierde luik van de onderwijsplannen in het kader van "Vlaamse veerkracht". Samen met de acties in de Digisprong, de Edusprong én het Voorsprongfonds wordt ervoor gezorgd dat de kwetsbare leerlingen mee deze sprong voorwaarts maken.</p> <p>Dit plan maakt het volledige Vlaamse onderwijs in twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) toekomstbestendig voor alle leerlingen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren. Om dit te realiseren wordt onder meer ingezet op het terugdringen van de leerachterstand die ten gevolge van de crisis bij de meest kwetsbare leerlingen nog opgelopen is. Daarnaast zetten we in op de mentale gezondheid en het welbevinden van alle lerenden, want de voorbije periode bracht de nodige angst en onzekerheid met zich mee omdat voor velen hun veilige haven wegviel. Deze sprong voorwaarts is enkel mogelijk als de leraren, lerarenopleiders en schoolleiders ook ondersteund en versterkt worden.</p> <p>We weten immers dat sterke leraren en schoolleiders het verschil maken voor weerbare leerlingen.</p> <p>Concreet vertalen we dit naar drie speerpunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Van achterstand naar voorsprong: aanpakken leerachterstand. 2. Bevorderen van het mentaal welzijn van leerlingen, scholieren en studenten 3. Versterking van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders <p>De mijlpalen verwijzen naar acties die gelinkt zijn aan de drie speerpunten.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	90.000.000 EUR
Output	<p>Speerpunt 1: aanpakken leerachterstand door onder meer het organiseren van zomerscholen voor ongeveer 11.000 leerlingen en scholieren en het zorgen voor een ICT-versterking in het buitengewoon onderwijs (OV1 en OV2), het DBSO (arbeidsmarktgerichte finaliteit) en de Leertijd die kwetsbare leerlingen ten goede komt.</p> <p>Speerpunt 2: een integrale aanpak voorzien voor de verbetering van het mentaal welbevinden van alle leerlingen via een investering in de CLB en het zorgen voor een digitaal platform voor een vlotte toegang tot de CLB, het oprichten van een digitale tool voor welbevinden van scholieren (te gebruiken door de scholen), het duurzaam verbeteren van studentenwelzijn door het uitrollen van een breed project in het Hoger Onderwijs</p> <p>Speerpunt 3: specifieke focus op het versterken van lerarenopleidingen via pilootprojecten en het professionaliseren van schoolleiders via specifieke trajecten</p>
Outcome	Deze visienota wordt uitgerold met het oog op het versterken en veerkrachtiger maken van verschillende componenten uit het onderwijsveld (scholen, CLB, ICT-infrastructuur, mentale weerbaarheid,...) en van diverse doelgroepen (studenten, lerarenopleiders, leraren, schoolteams, leerlingen,...)
Beoogde impact	Opleidingsdeelname van de bevolking (25-64 jaar)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De acties die vallen onder de globale visienota 'van kwetsbaar naar wendbaar' (VV017) worden geclusterd in drie speerpunten. Onder speerpunt 1 (terugdringen van de leerachterstand) kunnen de voorbije zomerscholen geplaatst worden.</p> <p>De evaluatie van deze zomerscholen is inmiddels afgerond. Er hebben 7720 leerlingen effectief deelgenomen aan zo'n 190 zomerscholen. De subsidies zijn begin december uitbetaald aan alle onderwijsinstellingen en lokale besturen die zomerscholen hebben georganiseerd.</p> <p>Wat betreft mentale gezondheid en welbevinden van alle lerenden (speerpunt 2) zijn er stappen gezet in het project voor de doelgroep studenten. In de nota aan de Vlaamse Regering van 4 december 2020 (VR 2020 0412 DOC 1380/1) werden de drie fasen van het beleid rond mentaal welzijn voor studenten in 2021 toegelicht. De eerste fase startte in juni 2020 en bestond uit een Vlaanderenbrede bevraging naar het mentaal welzijn van studenten, samen met de Vlaamse Vereniging van Studenten. Dit VVS-project is afgerond en het eindrapport werd officieel voorgesteld op 12 oktober 2021. In een tweede fase wilde men de uitwerking van een Vlaanderenbreed beleid opstarten rond het mentaal welzijn van studenten. Het Steunpunt Inclusief Hoger onderwijs (SIHO) heeft dit opgenomen. Hiervan werd een uitgebreid tussentijds rapport met beleidsaanbevelingen bezorgd aan de minister voor onderwijs. Midden december wordt het centraal platform studentenwelzijn ("MoodSpace")</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	officieel Vlaanderenbreed gelanceerd (na een avant-première eind november).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Concretisering onder speerpunt 3 (bevorderen mentaal welzijn van leerlingen, scholieren en studenten) Addendum SIHO in verband met studentenwelzijn	2021 Q4	Op schema	
Tussentijds rapport professionaliseringsprojecten.			
Concretisering onder speerpunt 2 (versterken van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders) = Professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs, in het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'	2022 Q2	Op schema	
Eindrapport professionaliseringsprojecten.			
Concretisering onder speerpunt 2 (versterken van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders) = Professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs, in het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'	2023 Q3	Op schema	
concretisering onder speerpunt 2= Uitvoering van 12 pilootprojecten ter versterking van de lerarenopleidingen, in nauwe relatie met actoren die instaan voor het verdere professionele continuüm van de leraar voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023	2023 Q3	Op schema	
Concretisering speerpunt 2= Toekennen van extra ICT-middelen (2021) voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (SYNTRA)	2024 Q1	Op schema	
Concretisering speerpunt 2= Versterking van de CLB's ter ondersteuning van scholen en leerlingen	2023 Q3	Op schema	
Concretisering speerpunt 2= Ter beschikking stellen van een digitale tool die het mogelijk moet maken dat schoolbesturen efficiënt kunnen rapporteren over de aanwending van gekleurde middelen	2023 Q4	Nog niet gestart	
Concretisering onder speerpunt 1 (wegwerken leerachterstand) Administratieve en financiële afhandeling van de Vlaamse zomerscholen	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL			TIMING	STATUS
die in de zomer van 2021 werden georganiseerd door lokale besturen en scholen om de leerachterstand weg te werken en een goede start van het schooljaar te bewerkstellingen.				
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal leerlingen die aan gerealiseerde zomerscholen deelnemen	11.000	2021 Q4	7.720	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Uitvoering VAK	16.952.000 EUR
Uitvoering VEK	1.861.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 90.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 4 december 2020 - goedkeuring addendum (tbv 801 KEUR) aan het convenant met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ivm mentaal welzijn studenten
Mededeling aan de Vlaamse Regering 15 januari 2021. Projectoproep voor de subsidiëring van projecten ter verbetering van schoolleiderschap
Mededeling aan de Vlaamse Regering 29 januari 2021. Pilotprojecten lerarenopleiding en Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Visienota Van kwetsbaar naar weerbaar –deel 1 beter leren, beter voelen: plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het relanceplan Vlaamse veerkracht en bijlage BIS
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor de vorming van

AGENDERING VLAAMSE REGERING

zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging en [bijhorend besluit](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september voor toekenning extra ICT-middelen en verhoging aantal uur kinderverzorging](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

VV018 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Vlaams Partnerschap Duaal Leren, SERV, VLOR, Klankbordgroep sectoren, RvB VDAB, UNIZO/VOKA, transitiepunten, Federgon, Werkplekarchitecten, begeleidingspartners, sectorfondsen, private NT2 opleidingspartners, AGII, sociale partners

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING

Om zowel werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen als ondernemingen en zelfstandig ondernemers meer wendbaar en beter inzetbaar te maken, zetten we versneld in op de omslag naar levenslang leren. We zien de coronacrisis als een opportuniteit voor meer structurele heroriëntering en om een doorbraak te realiseren in het leren tijdens de loopbaan.

We nemen initiatieven om competenties op peil te houden en om nieuwe competenties te verwerven. We zorgen er voor dat vrijgekomen (arbeids-)tijd benut wordt om (online) opleidingen te volgen en om zich te (her)oriënteren. We faciliteren transitie over sectoren en ondernemingen heen. We maken de competenties van werknemers zichtbaar en zorgen ervoor dat ze zich kunnen her- of bijscholen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen.

We streven daarbij ook naar een arbeidsmarkt waarin vlottere werk naar werk transitie en meer arbeidsmobiliteit binnen een onderneming, tussen ondernemingen en tussen sectoren mogelijk worden.

We doen dit alles vanuit een lange termijnvisie op levenslang leren en binnen een breed partnerschap met onderwijs- en opleidingsverstrekkers gaande van CVO's, CBE's, hogescholen, universiteiten, VDAB, Syntra's, sectoren tot private opleidingsverstrekkers en ondernemingen, ...

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	122.000.000 EUR
-------	-----------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	Arbeidsmarktgerichte digitale cursussen met een focus op technische en/of soft skills. <ul style="list-style-type: none"> • Het contacteren door VDAB van alle personen die sinds 1 januari 2021 tijdelijk werkloos zijn, met een aanbod voor opleiding, stage, vrijwilligerswerk. • Uitwerken competentiecheck, open innovatieoproep strategische investeringssteun, toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie, uitwerken van transitiepaden en transitiepunten.
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)
Beoogde impact	Werkzaamheidsgraad

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> • De actie rond duurzaam telewerken werd gerealiseerd: De goedgekeurde projecten (31 ondernemingen) gingen van start op 01/09. 18.000 werknemers verdeeld over 237 opleidingen worden bereikt. • Ook de eenmalige verruiming en verhoging van de stagebonus is gerealiseerd: er werden 3.076 aanvragen goedgekeurd en een bedrag van 3,076 miljoen euro uitbetaald (dd 9/12/2021). • Het project rond de competentiechecks, -coaching, en -versterking voor werkenden is in voorbereiding. <ul style="list-style-type: none"> ○ Voor de oproep naar ondernemingen is gekozen om via een overheidsopdracht te werken. ESF is de opdracht momenteel volop aan het voorbereiden, waarbij de input uit de consultatieronde met intermediaire ledenorganisaties meegenomen wordt. De verkenningsronde heeft tijdens de periode juli-augustus open gestaan en 26 organisaties hebben hun interesse hierrond kenbaar gemaakt om hierrond te werken. Lancering is voorzien in Q2 2022. ○ Voor de brede oproep transitiepunten is een conceptnota in opmaak. Deze wordt gefinaliseerd eens de resultaten van de tussentijdse evaluatie (januari 2022) van Careerflow bekend zijn. ○ Ook een competentiecheck naar werkenden wordt verkend en geconcretiseerd. Het concept zal in 2022 verder vormgegeven worden. • De uitrol van de versterkte begeleidingscapaciteit VDAB is opgestart sinds begin 2021. Zo zijn de tenders BWRW (voor werknemers met recente werkervaring) en het voucherproject (waarbij de werkzoekende zelf de begeleidingspartner kiest) sinds maart effectief gestart. De nieuwe tender IB+ (voor personen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werkzoekenden) is opgestart op

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

01/12/2021. Deze tender maakt deel uit van een 3-tal tenders die via REACT-financiering in de markt zullen worden gezet (IB+, GLOW en SIF 4)

- Het tijdelijk gezamenlijk besluitrecht VOV is in voege vanaf 1 september. 4.447 werknemers maken er gebruik van. We mikten bij aanvang op 7.500, we zitten dus aan 59%.
- Binnen het kader van de versterking van het werkplekieren zijn verschillende acties in voorbereiding of uitvoering om werkplekieren beter in de markt te zetten bij burgers, werkgevers en partnerorganisaties (wegwerken van financiële drempels, pro-actief en outreachend werken, jobcoaching). Bovendien onderzoeken we nieuwe formules zoals place & train/nazorg, waarbij de ondersteuning voor kwetsbare kandidaat-werknemers meer verschoven wordt naar de eerste maanden na aanwerving. De juridische onderbouw hiervoor krijgt momenteel zijn uitwerking, met het oog op implementatie in 2022 - 2023.
- De VR keurde op 9 juli de nota goed met twee acties die VDAB neemt binnen het kader Alle hens aan dek - Vlaamse Veerkracht, namelijk het voorzien van een ruim en toegankelijk opleidingsaanbod door VDAB in samenwerking met partners, en het inzetten op competentieversterking voor tijdelijk werklozen (en kwetsbare ondernemers).
 - Het online opleidingsaanbod van VDAB blijft nog steeds aan populariteit inwinnen. Van januari tot en met oktober noteerde VDAB al 233.217 inschrijvingen voor online opleidingen. Dat komt neer op een stijging van 38% tov. dezelfde periode vorig jaar.
 - VDAB tracht ook zo veel mogelijk tijdelijk werklozen te overtuigen (bereik van 98,6%) om de periode van tijdelijke werkloosheid te benutten voor een vorm van competentieversterking. Tussen de start van de coronacrisis (maart 2020) en oktober 2021 werden 5% van de tijdelijk werklozen bereikt met een vorm van competentieversterking. Voor de intensief tijdelijk werklozen (minstens 10 dagen tijdelijk werkloos in de laatste 3 maanden) bedroeg dit aandeel 8,3%.
- VDAB werkte een talenplan uit met als doel om anderstaligen vlotter te doen uitstromen naar duurzaam werk. Het talenplan wordt gefaseerd uitgerold en resulteerde onder meer in de ontwikkeling van een aantal webapplicaties voor anderstaligen en een vernieuwde methodiek voor kwaliteitsopvolging en samenwerking met partners op vlak van NT2 dienstverlening. Hierdoor wordt de dienstverlening van VDAB op vlak van taalondersteuning uitgebreid i.s.m. partners, onder meer wat betreft IBO met taalondersteuning, Nederlands op de werkvloer, geïntegreerde opleidingstrajecten etc.

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Naar duurzaam telewerken - digitale vaardigheden		2021 Q2	Gerealiseerd	
Enmalige verruiming en verhoging van de stagebonus		2021 Q3	Gerealiseerd	
Versterking werkplekieren		2021 Q4	Op schema	
Versterking begeleidingscapaciteit		2021 Q4	Op schema	
Talenplan		2021 Q4	Op schema	
Tijdelijk gezamenlijk besluitrecht VOV		2022 Q3	Op schema	
Gericht en breed opleidingsaanbod voor tijdelijk werklozen		2022 Q4	Op schema	
Ruim en toegankelijk opleidingsaanbod		2022 Q4	Op schema	
Inzetten op competentiechecks, -coaching, -versterking (en transitiepunten)		2024 Q4	Op schema	
Steun voor opleidingsverlof en onlineopleidingsaanbod in Vlaanderen (RRF)		2022 Q4	Op schema	
Ondersteuning van tijdelijk werklozen in Vlaanderen (RRF)		2022 Q4	Op schema	
Steun aan ondernemingen in Vlaanderen via competentiechecks, transitiepunten en oproepen tot het indienen van projecten (RRF)		2024 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aandeel tijdelijk werklozen dat ingaat op opleidingsaanbod VDAB	Stijging tov. maart 2020 tem. februari 2021 (3,4%)	2021 Q4	5	100 %
Aantal uitbetaalde aanvullende stagebonussen	6000	2021 Q4	3.076	51 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal personen dat sinds 2021 gebruik gemaakt heeft van hun recht op opleidingsverlof of hebben zich ingeschreven voor een onlineopleidingsaanbod, inclusief arbeidsmarktgerichte digitale cursussen met een focus op technische en/of soft skills. (RRF)	307.500	2022 Q4	237.664	77,3 %
Aantal nieuw opgestarte trajecten in de nieuwe begeleidingstender IB+	3930	2022 Q4		
Alle personen die sinds 1 januari 2021 tijdelijk werkloos zijn, worden door VDAB gecontacteerd met een aanbod (opleiding, stage, vrijwilligerswerk). (RRF)	100%	2022 Q4	98,6	98,6 %
Het aantal ondernemingen dat in een van de volgende categorieën steun heeft genoten in het kader van de maatregel: i) kmo's die met een competentiecheck zijn bereikt; ii) ondernemingen in de sociale economie die ondersteuning in hun innovatieve strategische transformatie ondersteuning hebben gekregen via de "open innovatieoproep strategische investeringssteun" en het "toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie"; iii) ondernemingen die een transitiepad aanvatten via de transitieproefopstellingen of transitiepunten. (RRF)	600	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	122.000.000 EUR
Uitvoering VAK	14.554.000 EUR
Uitvoering VEK	12.434.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 63.100.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 57.000.000 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 1.900.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering - tijdelijk experiment gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams opleidingsverlof - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering - tijdelijk experiment gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams opleidingsverlof - BVR](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020 -2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020-2021](#)

[Nota VR 09/07 : Alle Hens aan Dek - Acties VDAB binnen de prioriteit 'opleiding- en loopbaanoffensief.](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

VV019 - VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen - Departement Onderwijs en Vorming
Belanghebbenden	Cursisten, personeelsleden en onderwijsinstellingen van het volwassenenonderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het Vlaams volwassenenonderwijs is een belangrijke partner voor een samenleving die opstaat uit de crisis. De centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie zijn een sterke schakel binnen een breder veld van vorming, opleiding, werk en sociale ontplooiing. Voor de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs wordt 2021 “Het Jaar van de Opleiding”. Er wordt een groot offensief gelanceerd op vlak van opleiding, zowel voor werkzoekenden, als voor tijdelijk werklozen, als voor inactieven, als voor mensen die een job hebben maar zich wensen (of genoodzaakt zien) te heroriënteren. De ambitie van dit plan om mensen zo snel mogelijk in staat te stellen om toekomstige jobkansen te grijpen, past volledig binnen de ambities van het project Versterken Levenslang Blijven Leren dat zich echter ook tot andere doelgroepen dan de werkenden en werkzoekenden richt.</p> <p>Het project Versterken Levenslang Blijven Leren wil het volwassenenonderwijs een boost geven om meer dan ooit de speler te worden die de sociale mobiliteit van mensen faciliteert, via omscholing, bijscholing en kwalificering. We mikken daarom op een grotere naamsbekendheid, een toeleiding bij het grote publiek en een sterke verankering in de regionale context. Een vernieuwing en optimalisatie van het studieaanbod en de daaraan gekoppelde leermethodes moeten het volwassenenonderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte focus en een 21ste eeuwse karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en duurzame verankering staan hierin voorop. Een versterking van de noodzakelijke digitale infrastructuur en methodiek moeten bijdragen tot het maximaal realiseren van de beoogde doelstellingen.</p> <p>Om deze ambitie waar te maken richten we ons op vier inhoudelijke speerpunten waaraan 13 actielijnen worden gekoppeld. De vier speerpunten zijn (1) het volwassenenonderwijs vervult een belangrijke rol in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren, (2) het versterken van arbeidsmarktkansen via om- en bijscholen, (3) de versterking van digitale competenties en (4) het gericht inzetten op kwalificatie.</p> <p>Het volwassenenonderwijs wil een belangrijke rol vervullen in het stimuleren van elke Vlaming om</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

levenslang te blijven leren. Om deze ambitie waar te maken ontwikkelen we een opleidingskompas en voorzien we in een wervende Vlaanderenbrede en gefaseerde promotiecampagne. Aanvullend wordt een lokale doeltreffende informatieverstrekking met aandacht voor kansengroepen in samenwerking met lokale partners en bestaande initiatieven opgezet.

Dit project heeft de ambitie om het aanbod in het volwassenenonderwijs te versterken op het vlak van duurzame arbeidsmarktgerichte kwalificatiemogelijkheden. Het volwassenenonderwijs zal actiever kunnen inspelen op lokale arbeidsmarktbehoeften door het versneld ontwikkelen van toekomstgerichte curricula en infrastructuur, een doorgedreven EVC-beleid, het verruimen van flexibele opleidingsmogelijkheden zoals een vakantieaanbod en het inzetten op geïntegreerde trajecten. Daarnaast worden verschillende vormen van hybride leren ontwikkeld in functie van een flexibel en gedifferentieerd aanbod.

Met het speerpunt 'Versterking van digitale competenties' richt dit project zich niet enkel tot een maatgericht aanbod voor het versterken van de algemene digitale geletterdheid maar is er ook expliciet aandacht voor opleidingen voor mensen die plaats- en tijdsafhankelijk werken en het gericht ontwikkelen van hun digitale vaardigheden.

Het behalen van een diploma secundair onderwijs of een duurzame beroepskwalificatie biedt jongeren ook een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Binnen dit project zetten we daarom in op het terugdringen van de ongekwalficeerde uitstroom via een outreachende aanpak in samenwerking met partnerorganisaties (o.a.VDAB, Actiris, ...), een aanklampende cursistenbegeleiding tijdens het traject en een doorgedreven samenwerking met de examencommissie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	60.000.000 EUR
Output	Minstens 20 centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) hebben een project uitgevoerd in het kader van Edusprong
Outcome	De visienota Edusprong wordt geoperationaliseerd met het oog op het stimuleren van levenslang leren, het versterken van arbeidsmarktkansen via om- en bijscholen, het versterken van de digitale competenties van Vlamingen en het gericht inzetten op kwalificatie.
Beoogde impact	Opleidingsdeelname van de bevolking (25-64 jaar) - Aandeel vroegtijdige schoolverlaters - Aandeel bevolking dat over digitale basisvaardigheden beschikt

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	In het kader van het relanceplan Edusprong werd een eerste projectoproep gelanceerd die 10 miljoen verdeelde onder de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs. In de mededeling aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 werd het kader uitgewerkt voor de projectoproep waarbij de centra de kans kregen een projectplan in te dienen voor een vooraf bepaald

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>trekkingsrecht. Alle 46 cbe en cvo dienden een projectplan in. Een jury beoordeelde de projectplannen volgens de vastgelegde criteria in twee fases. Op 26 november 2021 werd het subsidiebesluit met de toekenning van de projectmiddelen goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze projecten zijn binnen de centra ondertussen opgestart.</p> <p>Naast de verdeling van middelen aan de cbe en cvo via projectoproepen, worden ook een aantal Edusprong-acties centraal gecoördineerd (bvb. opleidingskompas, communicatiecampagne). De vooropgestelde werkwijze en doelstellingen daarvan worden momenteel verder uitgewerkt en over een eerste stand van zaken daarvan werd reeds gecommuniceerd naar de centra. Bij de verdere uitwerking daarvan zullen de centra betrokken worden via een klankbordgroep.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
De Vlaamse Regering keurt de visienota Edusprong. Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht"	2021 Q1	Gerealiseerd
De Vlaamse Regering kent middelen toe aan de cvo en cbe ter uitvoering van een regioscan.	2021 Q3	Gerealiseerd
Lancering van een eerste projectoproep voor de toekenning van projectmiddelen aan de cvo en cbe	2021 Q3	Gerealiseerd
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan cvo en cbe goed in het kader van de eerste projectoproep.	2021 Q4	Gerealiseerd
Lancering van een tweede projectoproep voor de toekenning van projectmiddelen aan de cvo en cbe	2022 Q1	Op schema
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan de cvo en cbe goed in het kader van de tweede projectoproep	2022 Q2	Nog niet gestart
Opstart van een promotiecampagne voor het volwassenenonderwijs	2022 Q3	Op schema
Lancering website 'opleidingskompas' met een overzicht van het actuele aanbod in het volwassenenonderwijs	2023 Q4	Nog niet gestart
Inhoudelijke en financiële rapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de eerste en tweede projectoproep	2023 Q4	Op schema

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal centra die een aanvraag ingediend hebben en van wie de aanvraag goedgekeurd werd in het kader van Edusprong.	46	2021 Q4	46	100 %
Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een project hebben uitgevoerd in het kader van Edusprong	20	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	8.102.000 EUR
Uitvoering VEK	1.384.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 60.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van maximaal 7.389.175,84 euro aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 augustus 2023 in het kader van de eerste projectoproep Edusprong (BVR goedgekeurd door de Vlaamse regering op 26/11/2021)</p> <p>Oproep voor projectsubsidies in het kader van het relanceplan Edusprong (project VV 19 – Versterken levenslang blijven leren) (Mededeling en bijlage op VR 16/07/2021)</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels om aanvullende punten en werkingsmiddelen in het volwassenenonderwijs toe te kennen om een regioscan en de regionale afstemming van het opleidingsaanbod op te zetten ter uitvoering van het relanceplan Edusprong</p> <p>Beslissing van de Vlaamse Regering. Visienota "Edusprong. Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht" - nota</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing van de Vlaamse Regering. Visienota "Edusprong, Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht" - bijlage](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels om aanvullende punten en werkingsmiddelen in het volwassenenonderwijs toe te kennen om een regioscan en de regionale afstemming van het opleidingsaanbod op te zetten ter uitvoering van het relanceplan Edusprong-nota](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

05. Versterking O&O

VV020 - BIO-ECONOMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Landbouw en Visserij
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De bio-economie omvat zowel de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen als het gebruik van die hulpbronnen en reststromen. Deze worden verwerkt tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en energie.</p> <p>Vlaanderen heeft een sterke traditie in biogebaseerde activiteiten. Gezien de afwezigheid van grote voorraden natuurlijke hulpbronnen, heeft Vlaanderen expertise opgebouwd in het slim omgaan met grondstoffen voor een circulaire bio-economie.</p> <p>De strategie en het beleidsplan Bio-economie hebben tot doel het netwerk van innovatieactoren op dit gebied te versterken en nieuwe initiatieven voor het duurzaam gebruik van biogebaseerde oplossingen te stimuleren. Deze acties pakken de huidige uitdagingen van de bio-economie in Vlaanderen aan door:</p> <ul style="list-style-type: none">- meer samenwerking op te bouwen tussen actoren in verschillende economische sectoren;- innovatie te stimuleren in samenwerking met partners uit de landbouw;- ondersteuning te bieden aan start-ups en KMO's bij de snelle opschaling en industrialisatie van hun oplossingen;- de onderzoeksgemeenschap op dit gebied te stroomlijnen en versterken;- de bestuurlijke capaciteit te versterken om de Vlaamse bio-economie op te volgen en te ondersteunen. <p>Het eerst impulsprogramma bio-economie werd op 18 december 2020 door de Vlaamse Regering</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

goedgekeurd. Hiermee gaat een investering gepaard van 10 miljoen EUR, waarvan 3 miljoen EUR voor wetenschappelijk onderzoek en 7 miljoen EUR voor O&I-projecten in samenwerking met bedrijven.

Een tweede impulsprogramma van 10 miljoen EUR zal in 2021 worden voorgesteld.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	20.000.000 EUR
Output	<p>FWO-oproep: minimum 6 tweejarige projecten goedgekeurd tegen eind 2021. Tegen eind 2022 worden nog eens 6 bijkomende projecten goedgekeurd.</p> <p>O&I-projecten met bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actie clusterprojecten: tegen eind 2021 worden een 3-tal (grotere) clusterprojecten bio-economie verwacht. - Actie pilootinfrastructuur: tegen eind 2021 worden een 60-tal 'pilottrajecten bio-gebaseerde toepassingen' verwacht.
Outcome	<p>FWO-oproep: Met de thematische oproep bio-economie wil men excellent vernieuwend strategisch basisonderzoek binnen het thema bio-economie financieren zodat technologische ontwikkelingen met hoog potentieel voor economische of maatschappelijke valorisatie, de grootste kans van slagen krijgen.</p> <p>O&I-projecten met bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actie clusterprojecten: versterking van waardenketens inzake bio-economie passend binnen de (triplehelix) roadmaps van de speerpuntclusters. - Actie pilootinfrastructuur: opschaling van labo-onderzoek inzake bio-economie naar marktrijpe toepassingen.
Beoogde impact	O&O-bestedingen door bedrijven - ECONOMIE EN SAMENLEVING VERDUURZAMEN

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p><u>FWO-oproep</u>: Er werden 17 projecten ingediend. Alle ontvankelijke aanvragen werden besproken op 7 december tijdens een online panelzitting, gevolgd door een ranking en voorstel tot steun. Op 9 december zal de RvB een beslissing nemen via schriftelijke procedure. Publicatie zal plaatsvinden op 16 december op website FWO.</p> <p><u>O&I-projecten met bedrijven</u>:</p> <p>Actie clusterprojecten: Op 17/6/2021 werd een eerste clusterproject bio-economie goedgekeurd: BIOPOL4MOTIVE, dat getrokken wordt door speerpuntcluster Catalisti (VAK: 1.277 KEUR). Dit is een ICON-project. Er werden</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>nog geen bijkomende projecten goedgekeurd. Het betreft hier grotere projecten waardoor meer tijd nodig is om deze op te starten.</p> <p>Actie pilootinfrastructuur: Op 2 juli werden alle modaliteiten en documenten gepubliceerd, een infosessie vond plaats op 26/8 met een 100-tal ingeschrevenen. De lancering van de elektronische indieningstool vond plaats op 13/9/2021. De pilootprojecten komen trager op gang dan verwacht. Een verklaring is deels dat bepaalde pilootinfrastructuren (zoals BBEU PP) momenteel weinig vrije capaciteit blijken te hebben voor nieuwe projecten. De aanvragers bekijken samen met de pilootinfrastructuren hoe de projecten vanaf volgend jaar ingepland kunnen worden.</p> <p>Onderzoeksagenda: Hiervoor werd een studie-opdracht toegewezen aan Technopolis Nederland.</p> <p>Na evaluatie van de eerste oproepen voor onderzoeksprojecten, clusterprojecten en projecten pilootinfrastructuur zal een beslissing genomen worden over de invulling en planning van het tweede impulsprogramma.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Start opbouw van onderzoeksagenda voor de Vlaamse Bio-economie		2021 Q3	Gerealiseerd	
Tweede impulsprogramma bio-economie		2021 Q4	Vertraging	
Toekenning van de steunmiddelen voor O&I-projecten met bedrijven		2021 Q4	Vertraging	
Lancering FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten		2021 Q4	Gerealiseerd	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal goedgekeurde 'pilottrajecten bio-gebaseerde toepassingen'	60	2021 Q4		
FWO-oproep 1: aantal goedgekeurde tweejarige projecten eerste oproep	6	2021 Q4		
Aantal goedgekeurde clusterprojecten bio-economie	3	2021 Q4	1	33 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
FWO-oproep 2: aantal goedgekeurde tweejarige projecten tweede oproep	6	2022 Q4		
FWO-oproep 1: aantal voltooide projecten eerste oproep	6	2023 Q4		
FWO-oproep 2: aantal voltooide projecten tweede oproep	6	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.327.000 EUR
Uitvoering VEK	390.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 12 december 2020. Vlaams beleidsplan bio-economie
Nota aan de Vlaamse Regering van 30 april 2021. Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Nota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Advies van het FWO volgend op de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV021 - ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S),
SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Excellente wetenschap en innovatie zijn dé voorwaarden om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De versterking van deze onderzoeks- en innovatie (O&I)-basis kan niet zonder de uitbouw van grootschalige, state-of-the-art (internationale) O&I-infrastructuren. Bovendien zijn deze infrastructuren nodig om de innovatiekloof te kunnen overbruggen en de transfer van kennis en technologie te versnellen naar het industriële en kmo-weefsel. Om onze kennisbasis te versterken, zullen we daarom bijkomend investeren in O&I- en technologische infrastructuur met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg.</p> <p>Een investeringsagenda werd samengesteld op basis van een bevraging van het veld. Er worden 14 subprojecten gefinancierd, waarvan 7 binnen de pijler 'Duurzaamheid' (39,20 mio €), 3 binnen de pijler 'Digitaal' (36,02 mio €) en 4 binnen de pijler 'Gezondheid' (25,91 mio €) voor een gezamenlijk budget van 101,14 mio €.</p> <p>Het gaat om de hiernavolgende subprojecten (projectuitvoerder(s) / toegekende middelen Vlaamse Veerkracht).</p> <p>Pijler Duurzaamheid: (VV021/01) Bio Base NextGen Fermentation Platform: acht drukfermentoren met geavanceerde sensoren (Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) / 1,38 mio €); (VV021/02) Bio Base Demo: demonstratiefermentor op 50 m³ (BBEPP / 10,61 mio €); (VV021/03) Microbiële fermentatiestromen als eiwitbron in voedings- en voedertoepassingen van Vlaamse bedrijven (BBEPP en Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) / 3 mio €); (VV021/04) BioCon pilot plant: biomassa-conversieplatform (KU Leuven / 8,20 mio €); (VV021/05) Samen bouwen aan een klimaatneutraal Vlaanderen: onderzoeks- en demonstratie-</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

infrastructuur (KU Leuven / 7,96 mio €);
 (VV021/06) Biotope incubator (Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) / 6,50 mio €);
 (VV021/07) Green Hydrogen Lab (UHasselt / 1,56 mio €);

Pijler Digitaal:

(VV021/08) Acceleratorprogramma met 6 end-to-end digitale pilootproductielijnen voor digitale transformatie van High-Mix-Low-Volume (HMLV) productie (Flanders Make / 11 mio €);
 (VV021/09) Uitbreiding Fotonica pilootlijn infrastructuur (VUB Brussels Photonics Team (B-PHOT) / 5,02 mio €);
 (VV021/10) Miniaturisatie in geavanceerde halfgeleidertechnologieën: opzet van een Hoge Numerieke Apertuur (NA) Extreme Ultra Violet (EUV)-golflengte Lab (Imec / 20 mio €);

Pijler Gezondheid:

(VV021/11) CESPE Innovatie Accelerator voor (bio)farmaceutische productie (UGent / 9 mio €);
 (VV021/12) Ecosysteem voor pandemiebestrijding: Vaccinopolis (4 mio €) + Flipped TTO (1,3 mio €) (UAntwerpen / 5,3 mio €);
 (VV021/13) Europese translationele motor voor AAV-gentherapie (KU Leuven / 9,17 mio €);
 (VV021/14) Remote Clinical Monitoring Center (RCMC) (UHasselt / 2,44 mio €).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	101.135.000 EUR
Output	De verwachte output per subproject (14 in totaal) werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').
Outcome	De verwachte outcome per subproject (14 in totaal) werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').
Beoogde impact	O&O-bestedingen door bedrijven - O&O uitgaven - voor wetenschap en innovatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Met de uitvoerders van de 14 sub projecten werden overeenkomsten onderhandeld, zoals opgenomen in de beslissing van de VR. Op 1 na zijn alle overeenkomsten (bijna) getekend, waarna de projecten effectief van start zijn gegaan/kunnen gaan. 9 projecten zijn intussen effectief gestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Bevraging van het veld.		2021 Q3	Gerealiseerd	
Alle projecten werden goedgekeurd.		2021 Q3	Gerealiseerd	
Alle overeenkomsten werden opgemaakt.		2022 Q1	Op schema	
Alle overeenkomsten werden ondertekend door alle partijen.		2022 Q1	Op schema	
Alle projecten zijn gestart.		2022 Q4	Op schema	
Voortgangsrapportage over werkjaar 2022.		2023 Q1	Nog niet gestart	
Voortgangsrapportage over werkjaar 2023.		2024 Q1	Nog niet gestart	
Voortgangsrapportage over werkjaar 2024.		2025 Q1	Nog niet gestart	
Voortgangsrapportage over werkjaar 2025.		2026 Q1	Nog niet gestart	
Gunning van overheidsopdrachten voor O&O en infrastructuurprojecten		2022 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde projecten van investeringsagenda onderzoeksinfrastructuur	14	2021 Q4	14	100 %
Alle projecten van investeringsagenda onderzoeksinfrastructuur zijn gestart	14	2022 Q4	9	65 %
Voltooiing van de gegunde O&O- en infrastructuurprojecten	14	2026 Q2		
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	101.135.000 EUR			
Uitvoering VAK	42.990.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	11.347.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 101.135.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>De 14 projecten werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 juli 2021.</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Vlaamse Veerkracht: investeringsimpuls in O&O&I-infrastructuur (VR 2021 0907 VV DOC.0099/1BIS)</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV023 - Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O

VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Ondernemingen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Innovatie staat centraal in de aanpak van het herstel in Vlaanderen. In de eerste plaats omdat innovatie nodig is om onze bedrijven competitief en productief te houden, zodat jobs in Vlaanderen behouden en gecreëerd kunnen worden.

Vlaamse bedrijven staan in de voorhoede van innovatie in Europa. Investerings ten belope van 2,16% van het bbp onderstrepen de R&D-intensiteit van de bedrijven en dragen sterk bij tot het feit dat we in Vlaanderen met 2,92% in 2018 dicht bij de 3% O&O-doelstelling zitten. We stellen bovendien vast dat bedrijven in deze crisis blijven inzetten op innovatie en willen hen daarin ondersteunen. Daarom trekken wij 100 miljoen euro extra uit voor subsidies aan O&O-projecten van bedrijven. Deze subsidies zullen worden toegekend onder de voorwaarden van de huidige instrumenten die gericht zijn op O&O-steun aan bedrijven.

Het innovatiebeleid slaagt er steeds beter in om ook kleine(re) bedrijven te bereiken. Toch blijft de spreiding van O&O over meer sectoren en bedrijfstypes een uitdaging voor onze regio. Na de Corona-crisis zal innovatie nog meer dan voorheen bepalend zijn voor de concurrentiekracht van onze bedrijven en de economische groei. Deze investeringen gaan daarom gepaard met een doorlichting van het VLAIO innovatie-instrumentarium. We willen immers meer innoverende ondernemingen en meer innovatie in bedrijven stimuleren. De uitdaging bestaat erin om het aantal innoverende bedrijven in Vlaanderen op te trekken en het instrumentarium dat Vlaanderen inzet om ondernemingen aan te zetten tot innovatie laagdrempeliger te maken, aan te passen aan de mogelijkheden van kmo's en sterker in te zetten op economische valorisatie van de resultaten van innovatie. Bij het opmaken van het Vlaams regeerakkoord werd deze uitdaging verwoord als het verbreden van het O&O-instrumentarium naar kleine bedrijven.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	100.000.000 EUR
-------	-----------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	Aantal goedgekeurde projecten
Outcome	Meer O&O-investeringen ondernemingen
Beoogde impact	O&O-bestedingen door bedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Eerste 108 projecten werden geselecteerd, ca. 30 mln aan middelen vastgelegd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Selectie COOCK projecten Zorg en Circulaire Economie, Clusterprojecten Zorg	2022 Q4	Vertraging		
Doorlichting VLAIO-instrumentarium	2021 Q4	Gerealiseerd		
Selectie van O&O-projecten via reguliere aanpak	2022 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vastleggingen Relance Middelen O&O	30.000.000,00	2021 Q4	29.981.830	100 %
Gezondheid en zorg - COOCK Gezondheid en zorg - TETRA Gezondheid en zorg - Clusterprojecten (vastleggingen euro)	8.000.000	2022 Q4	1.921.000	25 %
Aantal O&O-projecten	100	2022 Q4	108	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	29.982.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK

11.251.000 EUR

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 100.000.000 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 1812 DOC.1463 - Bijkomende middelen voor VLAIO O&O-projecten 2020 - nota](#)

[Impulsprogramma - Innovatie in gezondheid en zorg. Nota VR 18/06/2021](#)

[Impulsprogramma - Innovatie in gezondheid en zorg. Kadernota VR 18/06/2021](#)

[Impulsprogramma - Innovatie in gezondheid en zorg. Bijlage. Doelgroepbevraging](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Innovatie is meestal een proces van vele jaren, startend met fundamenteel onderzoek over strategisch basisonderzoek naar meer toegepast onderzoek. Om de innovaties van de toekomst te kunnen voeden, hebben we daarom versterking nodig van onze kennisbasis. Bijkomend zullen we investeren in onderzoeksprojecten met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg.</p> <p>Binnen dit Vlaamse Veerkracht project worden de hiernavolgende subprojecten gefinancierd (projectuitvoerder(s) / toegekende middelen Vlaamse Veerkracht).</p> <p>(I - VV023) Oproepen infrastructuur hogescholen (meerdere / 6 mio €): dit subproject omvat het investeren in onderzoeksinfrastructuren bij de Vlaamse hogescholen. Hiervoor zal een bedrag van ongeveer 2 x 3 mio € worden verdeeld in 2 oproepen (2021 en 2022). De oproep voor 2021 werd op 23 april 2021 goedgekeurd door de Vlaamse Regering; werd opengesteld tussen 23 augustus 2021 en 15 september 2021. 17 projecten werden op 7/12/21 goedgekeurd voor financiering.</p> <p>(II - VV023/02) Projecten via VLIR (IOF) (meerdere / 17,96 mio €): in het kader van dit subproject werd een investeringsagenda samengesteld op basis van een bevraging van het veld. Enerzijds wordt binnen dit subproject voorzien in de versterking van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) ten belope van 14 mio €, waarbij via de VLIR 7 O&O&I-infrastructuurprojecten werden uitgewerkt. Daarnaast worden 2 O&O&I-infrastructuurprojecten van enerzijds het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en anderzijds een consortium imec/VITO ondersteund. Er worden in het kader van dit subproject dus 9 'sub-subprojecten' gefinancierd, waarvan 3 binnen de pijler 'Duurzaamheid' (6,76 mio €), 1 binnen de pijler 'Digitaal' (0,56 mio €) en 5 binnen de pijler 'Gezondheid' (10,65 mio €) voor een gezamenlijk budget van 17,96 mio €. Het gaat meer bepaald om de volgende sub-subprojecten:</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

Pijler Duurzaamheid:

(VV023/01) Innovatief ecosysteem voor circulair gebruik en opwaardering van CO₂, stikstof en andere componenten in de lucht ter verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving

(UAntwerpen / 1,86 mio €)

(VV023/02) Valorisatie van agro-industriële biomassa & biomassa residuen in een duurzame circulaire bio-economie (KU Leuven / 1,90 mio €)

(VV023/03) Imec-VITO: membranen (imec en VITO / 3 mio €)

Pijler Digitaal:

(VV023/04) Een schaalbare en flexibele infrastructuur voor de transformatie naar digitaal-fysieke werkomgevingen (UHasselt / 0,56 mio €)

Pijler Gezondheid:

(VV023/05) MabMine: een geïntegreerd platform voor de identificatie, isolatie en karakterisatie van humane monoklonale antilichamen (KU Leuven / 1,90 mio €)

(VV023/06) PRISMO: PRecisiegeneeskunde door geïntegreerde Spatiale Multi-Omics (KU Leuven / 1,89 mio €)

(VV023/07) HighTru Lab: geautomatiseerd, geïntegreerd en modulair High Throughput platform voor reactie-optimalisatie en continue flow productie van geneesmiddelen in Vlaanderen (UGent / 4,40 mio €)

(VV023/08) MICROLAB: centre of excellence voor microfabricage van microfluidics in glas (VUB / 1,46 mio €)

(VV023/09) Supporting ITM's Scientific Infrastructure to Innovate for the Global Good (ITG / 1 mio €)

(III - VV023) (investerings)Projecten (meerdere / 26 mio) bij Strategische Onderzoekscentra, speerpuntclusters en Vlaamse onderzoeksinstituten obv een bijkomende bevraging van het veld. Het gaat meer bepaald om de volgende sub-subprojecten:

(VV023/10) SOLID: SOLIDlab Vlaanderen (ID-lab imec / 5 mio €) - zal op de VR van 17/12/21 voorgelegd worden ter goedkeuring

(VV023/11) TEFHW4AI: Testing & Experimentation Facility Hardware for Edge AI Vlaanderen (imec / 20 mio €) - zal op de VR van 17/12/21 voorgelegd worden ter goedkeuring

(VV023/12) We Are (VITO / 1 mio €) - zal op de VR van begin 2022 voorgelegd worden ter goedkeuring

De inzet van de resterende middelen a rato van 9 mio € moet nog worden bepaald.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	58.865.000 EUR
Output	<p>I - VV023: de verwachte output werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>II - VV023: de verwachte output per sub-subproject werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>III - VV023: de verwachte output per sub-subproject zal opgenomen worden in de nota's die aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	Zie ook info onder projectbeschrijving.
Outcome	<p>I - VV023: de verwachte outcome werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>II - VV023: de verwachte output per sub-subproject werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>III - VV023: de verwachte output per sub-subproject zal opgenomen worden in de nota's aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>Zie ook info onder projectbeschrijving.</p>
Beoogde impact	O&O-bestedingen door bedrijven - O&O uitgaven - voor wetenschap en innovatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>I - VV023: de eerste call werd afgerond; 17 projecten werden goedgekeurd. Deze zullen uiterlijk midden 2022 opstarten.</p> <p>II - VV023: de 9 projecten werden goedgekeurd; 8 overeenkomsten intussen volledig ondertekend; projecten zullen nu asap opstarten.</p> <p>III - VV023: 3 projecten zullen eind 2021 of begin 2022 aan de VR ter goedkeuring worden voorgelegd; daarna starten onderhandelingen mbt overeenkomst; na ondertekening door alle partijen kunnen de projecten starten.</p>
Noodzakelijke politieke actie	<ul style="list-style-type: none"> Ondertekenen door minister van de overeenkomsten, zodra deze beschikbaar zijn. 3 dossiers ikv III-VV023 voorleggen aan de VR

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
(I - VV023) Oproep 1 hogescholen gelanceerd.	2021 Q3	Gerealiseerd
(I - VV023) Projecten oproep 1 hogescholen zijn opgestart.	2022 Q2	Nog niet gestart
(I - VV023) Projecten oproep 1 hogescholen zijn afgerond.	2025 Q2	Nog niet gestart

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
(I - VV023) Oproep 2 hogescholen gelanceerd.		2022 Q3	Nog niet gestart	
(I - VV023) Projecten oproep 2 hogescholen zijn opgestart.		2023 Q2	Nog niet gestart	
(I - VV023) Projecten oproep 2 hogescholen zijn afgerond.		2026 Q2	Nog niet gestart	
(II - VV023) Bevraging van het veld.		2021 Q3	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle projecten zijn goedgekeurd.		2021 Q3	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle overeenkomsten werden opgemaakt.		2022 Q1	Op schema	
(II - VV023) Alle overeenkomsten werden ondertekend door alle partijen.		2022 Q1	Op schema	
(II - VV023) Alle projecten zijn gestart.		2022 Q4	Op schema	
(II - VV023) Alle projecten zijn afgerond.		2026 Q2	Nog niet gestart	
(III - VV023) - Bevraging van het veld is afgerond		2022 Q4	Op schema	
(III - VV023) - alle projecten zijn goedgekeurd		2022 Q4	Op schema	
(III - VV023) - alle projecten zijn opgestart		2022 Q4	Op schema	
(III - VV023) - alle projecten zijn afgerond		2026 Q2	Nog niet gestart	
(VV023) - Gunning van overheidsopdrachten voor O&O en infrastructuurprojecten		2022 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
(I - VV023) Alle projecten zijn gestart	20	2022 Q4		
(II - VV023) Alle projecten zijn gestart	9	2022 Q4	3	30 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
(I - VV023) - Aantal goedgekeurde projecten	20	2022 Q4	17	80 %
(II - VV023) - Aantal goedgekeurde projecten	9	2022 Q4	9	100 %
(III - VV023) - alle projecten zijn gestart	5	2022 Q4		
(III - VV023) - Aantal goedgekeurde projecten	5	2022 Q4		
(VV023) - Voltooiing van de gegunde O&O- en infrastructuurprojecten	34	2026 Q2		
(II - VV023) Alle projecten zijn voltooid	9	2026 Q2		
(I - VV023) Alle projecten zijn voltooid	20	2026 Q2		
(III - VV023) - Alle projecten zijn voltooid	5	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	58.865.000 EUR
Uitvoering VAK	2.100.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 58.865.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>I - VV023: de oproep 2021 voor 3 miljoen euro werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 23 april 2021.</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021: investeringen in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen in het kader van het Relanceplan (VR 2021 2304 VV DOC.0033/1BIS)</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Ministerieel Besluit tot toekenning van steun voor onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap](#)

[Bijlage 1. Handleiding oproep onderzoeksinfrastructuur hogescholen](#)

[Bijlage 2. Aanvraag onderzoeksinfrastructuur](#)

II - VV023: de 9 projecten werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 juli 2021.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Vlaamse Veerkracht: versterking onderzoeksveld en versnelling O&O: onderdeel O&O&I-infrastructuren voor universiteiten en kennisinstellingen \(VR 2021 0907 VV DOC.0100/1BIS\)](#)

III - VV023: 3 projecten zullen eind 2021 of begin 2022 voorgelegd worden aan de VR.

<https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/solid-ecosysteem>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV021 - Onderzoeksinfrastructuur \(bij Strategische Onderzoekscentra \(SOC's\), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs\)](#)

06. Blue deal

VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Landmaatschappij - Departement Omgeving - Agentschap Natuur en Bos - Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	programmteam Water-Land-Schap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het project groen-blauwe infrastructuur - open ruimte wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied. Het bestaat uit drie projectonderdelen.</p> <p>Het project zet versterkt in op waterconservering in de open ruimte om grondwatervoorraden aan te vullen en verdroging van natuur- en landbouwgebieden tegen te gaan. Het is daarbij noodzakelijk dat we beter gebruik maken van de perioden met neerslagoverschot om perioden met neerslagtekorten te overbruggen. Dat kan enkel als we zowel infiltratie als retentie in de bovenstroomse gebieden versterken. Dit heeft ook als gevolg dat bij hevige neerslag water minder snel afvloeit en overstromingsschade in afwaartse gebieden wordt vermeden. Maatregelen om water langer tegen te houden en te laten infiltreren in de open ruimte zijn onder meer erosie maatregelen, aanleggen van bufferbekkens, het voorzien van peilgestuurde drainages, bovenwaterlopen terug meer laten meanderen, waterpeilen in de valleigebieden terug verhogen door minder water te onttrekken en minder te draineren in polders en wateringen, afwateringskanalen in natuurgebieden zoveel mogelijk dempen.</p> <p>De realisatie van dergelijke maatregelen is vaak niet eenvoudig gelet op de sterke versnippering van de ruimte in Vlaanderen waarbij natuur-, bos- en landbouwgebieden naast elkaar voorkomen en landgebruik niet altijd in overeenstemming is met de noden van het watersysteem. Daarom is een nauwe samenwerking met de beheerders van de open ruimte essentieel. Het project richt zich dan ook op (1) het mobiliseren van lokale gebiedscoalities voor het nemen van droogtmaatregelen in hun gebied (Water-Land-Schap 2.0) en (2) op het nemen van extra droogtmaatregelen binnen de geïntegreerde gebiedsgerichte projecten waarbij al een structurele samenwerking tussen gebiedspartners is opgezet. Ook toegang tot grond is een cruciale factor om</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

deze maatregelen mogelijk te maken. Daarom voorziet het project ook (3) de oprichting van een grondenbank Blue Deal die inzet op grondmobiliteit en rechtstreekse aankopen om het landgebruik meer in overeenstemming te brengen met de noden van het watersysteem. Tot slot stelt het (4) afsluiten en uitvoeren van lokale gebiedsdeals de lokale coalities in staat om ook de meer complexe maatregelen voor de versterking van het watersysteem te kunnen uitvoeren.

De extra droogtemaatregelen zijn specifieke relance-deelprojecten binnen ruimere inrichtingsprojecten. Deze deelprojecten zijn volledig gefinancierd door relancemiddelen. Een aantal extra droogtemaatregelen betreft subsidies aan lokale actoren. Dan worden de relancemiddelen steeds aangevuld door reguliere middelen van deze lokale actoren. Het subsidiepercentage wordt vastgelegd in de specifieke oproepen en overeenkomsten. Water-Land-Schap betreft in hoofdzaak subsidies aan lokale actoren. Ook hier worden de relancemiddelen steeds aangevuld door reguliere middelen van deze lokale actoren. Het subsidiepercentage is vastgelegd in de oproep Water-Land-Schap. De verwervingen in het kader van de grondenbank Blue Deal zijn deels gefinancierd door relancemiddelen (10 mio euro) en deels gefinancierd door Vlaamse middelen (10 mio euro). Het systeem van de gebiedsdeals met inbegrip van de concrete financieringsmodaliteiten wordt momenteel nog uitgewerkt.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	40.000.000 EUR
Output	8 systeeminnovaties gerealiseerd, 16 gebiedsprogramma's opgemaakt ism coalities, 15 extra droogtemaatregelen gerealiseerd, 10 lokale gebiedsdeals gerealiseerd, 150 ha aangekochte grond ifv vernatting
Outcome	verhoogd inzicht in de werking van maatregelen, bevorderde data- en kennisuitwisseling, vergroten van de waterreserve, verhoogde waterretentie in de bodem, vernatten van gebieden, verbeterde waterkwaliteit, bijkomende groen-blauwe verbindingen
Beoogde impact	Grondwaterstand - Kritische debieten op onbevaarbare waterlopen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De oproep van Water-Land-Schap leverde 8 systeeminnovaties en 16 gebiedscoalities op. De systeeminnovaties kunnen in 2022 van start gaan met uitvoering. De gebiedscoalities zullen in 2022 hun gebiedsprogramma opmaken.</p> <p>De eerste extra droogtemaatregelen in de inrichtingsprojecten zijn vastgelegd en gaan in 2022 in uitvoering.</p> <p>De grondenbank Blue Deal heeft de helft van de toegekende middelen kunnen vastleggen en besteden in concrete aankoopdossiers.</p> <p>Voor de lokale gebiedsdeals zijn de eerste denkoefeningen gebeurd, deze zullen in 2022 leiden tot een oproep en selectie van de gebiedsdeals.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
W-L-S: lanceren oproep	2021 Q2	Gerealiseerd
W-L-S: indienen voorstellen systeeminnovaties en gebiedsprogramma's	2021 Q3	Gerealiseerd
W-L-S: selectie op basis van de ingediende voorstellen	2021 Q4	Gerealiseerd
W-L-S: start inhoudelijke studie	2021 Q4	Gerealiseerd
W-L-S: start begeleidingstraject en procesbegeleiding gebiedsprogramma's	2022 Q1	Op schema
W-L-S: start uitvoering systeeminnovaties	2022 Q1	Nog niet gestart
W-L-S: goedkeuring gebiedsprogramma's door de Vlaamse Regering	2022 Q4	Nog niet gestart
W-L-S: start uitvoering gebiedsprogramma's	2023 Q1	Nog niet gestart
W-L-S: systeeminnovaties uitgevoerd	2024 Q1	Nog niet gestart
W-L-S: gebiedsprogramma's uitgevoerd	2026 Q3	Nog niet gestart
INR: goedkeuring droogtemaatregelen	2021 Q1	Gerealiseerd
INR: droogtemaatregelen 2021 zijn vastgelegd	2021 Q4	Gerealiseerd
INR: droogtemaatregelen 2022 zijn vastgelegd	2022 Q4	Op schema
INR: droogtemaatregelen zijn uitgevoerd	2026 Q3	Op schema
Grondenbank: goedkeuring grondenbank Blue Deal	2021 Q1	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Grondenbank: oprichten rapporteringsoverleg met VLM, VMM, Agentschap Natuur en Bos en Departement Omgeving		2021 Q1	Gerealiseerd	
Grondenbank : vastleggen middelen grondenbank Blue Deal schijf 1		2021 Q4	Gerealiseerd	
Grondenbank: aankoop gronden tbv vernatting deel 1		2021 Q4	Gerealiseerd	
Grondenbank: vastlegging middelen grondenbank Blue Deal schijf 2		2022 Q4	Nog niet gestart	
Grondenbank: aankoop gronden tbv vernatting deel 2		2022 Q4	Nog niet gestart	
Grondenbank: aankoop gronden tbv vernatting deel 3		2023 Q4	Nog niet gestart	
Grondenbank: aankoop gronden tbv vernatting deel 4		2024 Q4	Nog niet gestart	
Grondenbank: aankoop gronden tbv vernatting deel 5		2025 Q4	Nog niet gestart	
Grondenbank: grondenbank Blue Deal is uitgevoerd		2026 Q3	Op schema	
gebiedsdeals - selectie lokale gebiedsdeals		2022 Q4	Op schema	
gebiedsdeals zijn uitgevoerd		2026 Q3	Nog niet gestart	
start of Blue Deal projects		2023 Q1	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal systeeminnovaties in uitvoering	8	2022 Q1		
aantal opgemaakte gebiedsprogramma's	16	2022 Q4		
aantal geselecteerde gebiedsdeals	10	2022 Q4		
aantal gebiedsprogramma's in uitvoering	16	2023 Q1		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal gebiedsdeals in uitvoering	10	2023 Q1		
aantal extra droogtemaatregelen in uitvoering	15	2023 Q1	8	50 %
aantal uitgevoerde systeeminnovaties W-L-S	8	2024 Q1		
aantal aangekochte ha grond ifv vernatting	150	2026 Q3	95	63 %
aantal gerealiseerde extra droogtemaatregelen inrichtingsprojecten	15	2026 Q3		
aantal gerealiseerde gebiedsprogramma's	16	2026 Q3		
aantal gerealiseerde gebiedsdeals	10	2026 Q3		
completion of Blue Deal projects	(deel VV024)	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	40.000.000 EUR
Uitvoering VAK	7.969.000 EUR
Uitvoering VEK	6.222.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 39.600.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021

VV025 - BLUE DEAL - ONDERZOEK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Landbouw en Visserij - Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	primaire sector, agro-industriële sector, kennisinstellingen, praktijkcentra landbouw

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De waterbeschikbaarheid per capita in Vlaanderen is één van de laagste in de OESO. De klimaatverandering en meer specifiek de droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten. De grondwaterreserves slinken zienderogen en droogteperiodes leiden tot uitputting van regenwaterreserves en grote schommelingen in watergebruik met nefaste gevolgen voor natuur en landbouw. De landbouwsector komt in de problemen voor wat betreft het garanderen van voldoende voedselproductie voor de industriële voedingssector. Het inkomen van de landbouwers staat onder druk en is onzeker.</p> <p>Naast investeringen is innovatie belangrijk om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Bedoeling is op vrij korte termijn innovaties te initiëren die een antwoord bieden aan deze uitdagingen en kostenefficiënt kunnen toegepast worden op bredere schaal. Mogelijke onderzoekspistes zijn circulair watergebruik met aandacht voor de waterkwaliteit (voedselveiligheid, milieuaspecten zoals zoutinrusie), onderzoek naar droogteresistente en nieuwe klimaatrobuuste (eiwit)teelten en teelttechnieken of beheersmaatregelen die een duurzaam antwoord kunnen bieden op de klimaatverandering (zoals peilgestuurde drainage of het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem zodat de bodem het water langer kan vasthouden). Indirect zal ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid gegarandeerd worden en zal de toeleveringssector van de resultaten van dit impulsprogramma kunnen genieten. Specifiek voor de nieuwe droogteresistente en/of eiwitteelten voor Vlaanderen moet er aandacht besteed worden aan zowel teelttechniek, afzetmogelijkheden en verwerkingstechnieken. Om deze doelstellingen te realiseren wordt gebruik gemaakt van een bestaand onderzoeksprogramma, met name de landbouwtrajecten. De steuntoekenning in het kader van LA-trajecten betreft niet-staatssteun en is voorbehouden voor Organisaties voor Onderzoek en Kennisverspreiding voor de uitvoering van niet-economische activiteiten zoals onafhankelijke onderzoeksactiviteiten en/of kennisverspreiding.</p> <p>Dit onderzoeksprogramma is vraaggedreven en beoogt reeds tijdens de duur van het project veranderingen teweeg te brengen bij een ruime doelgroep. De projecten worden aan 90%</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

gesteund, met 10% inbreng van leden van de begeleidingscommissie, wat het vraaggedreven karakter moet garanderen. Regelmatig worden, naast landbouworganisaties en individuele landbouwers, ook industriële sectororganisatie en toeleveranciers of afnemers van landbouwproducten in de gebruikerscommissies aangetroffen. De finaliteit van het programma is primair economisch met aandacht voor maatschappelijke aspecten. De call 2020 omvat verschillende projecten die reeds aan de gestelde doelstellingen voldoen. Gezien de budgettaire ruimte die voorhanden is, is het slaagpercentage van het programma laag (ca. 27% voor de call 2020) en kwaliteitsvolle projecten kunnen niet altijd gesteund worden. Extra middelen voor dit programma kunnen leiden tot een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde.

Het programma Landbouwtrajecten werd in de loop van 2020 hervormd voor wat betreft de evaluatiecriteria, onder meer om tegemoet te komen aan de vraag uit het beleid om sterker in te zetten op maatschappelijke uitdagingen inzake innovatieve, milieu- en klimaatvriendelijke economische productie. Voor de call 2020-2021 werd een nieuw criterium 'maatschappelijke meerwaarde' toegevoegd dat met name de milieu- en sociale aspecten van duurzame landbouw omvat. Milieuaspecten zijn bijvoorbeeld efficiënt water(her)gebruik, circulaire economie, minder gebruik van pesticiden en meststoffen, klimaatmitigatie door minder broeikasgassen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Sociale aspecten zijn bijvoorbeeld arbeidsveiligheid, gezondheid van landbouwer en consument, inkomenszekerheid, (dieren)welzijn, werkbaar werk en landschapsbeleving. De bedoeling is om projecten die in aanzienlijke mate geïnspireerd zijn door aspecten van duurzame landbouw, en een hoog ambitieniveau hebben op dat vlak, een zekere (beleids)prioriteit te kunnen geven.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	6.000.000 EUR
Output	Minstens 6 onderzoeksprojecten gericht op duurzaam watergebruik in de landbouwsector.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen • Duurzamer watergebruik via alternatieve bronnen • Bijkomende waterbesparende technologieën en technieken • Verhoogd aandeel droogteresistente teelten • Bevorderde data- en kennisuitwisseling"
Beoogde impact	Grondwaterstand - Aandeel waterverbruik klassieke bronnen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De call landbouwtrajecten 2021-2022 met inbegrip van de blue deal call, is thans in evaluatie. De 3 reeds gesteunde "blue deal" landbouwtrajecten uit de vorige call zitten in de opstartfase.
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie nodig.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
labeling en evaluatie van landbouwtrajecten call 2020-2021 die binnen de blue deal passen		2021 Q1	Gerealiseerd	
Beslissing over de blue deal projecten onderzoek call 2020-2021 landbouwtrajecten		2021 Q2	Gerealiseerd	
Lancering tweede call "bleu deal landbouwtrajecten"		2021 Q3	Gerealiseerd	
Start eerste landbouwtrajecten/blue deal projecten		2021 Q4	Gerealiseerd	
Beslissing over blue deal projecten call 2021-2022		2022 Q2	Op schema	
Alle blue deal onderzoeksprojecten voor de versterking van de biodiversiteit en/of mitigatie van de gevolgen van de klimaatverandering zijn gestart.		2023 Q2	Op schema	
Voltooiing van blue deal projecten onderzoek		2026 Q2	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gesteunde landbouwtrajecten onder de "blue deal"	6	2022 Q4	3	50 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.473.000 EUR
Uitvoering VEK	96.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 6.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven en steun voor onderzoek in de landbouwsector](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV026 - BLUE DEAL - MOW

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Industrie en landbouw gevestigd langs de waterlopen, drinkwatermaatschappijen, binnenvaartondernemers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Voor de voeding van de hoofdassen in het Vlaamse binnenwaterennet bestaat een afhankelijkheid van stroomopwaarts gelegen waterwegen in beheer van andere landen en regio's. Het water dat voor de exploitatie van dit waterwegennet beschikbaar is dient dan ook zo optimaal mogelijk benut te worden.

Binnen de "Blue Deal" wordt door de Vlaamse waterwegbeheerder een selectie van projecten opgenomen in volgende domeinen:

1. Voorzien van pompinstallaties op waterwegen die onderhevig zijn aan waterschaarste met als doel de watervoorziening voor scheepvaart, industrie, drinkwaterbedrijven, landbouw maximaal te vrijwaren ook bij periodes van langdurige droogte;
2. Renovatie van sluisdeuren en -mechanismen waardoor lekverliezen worden gereduceerd.

Uitvoering van het project:

1. Oppompen van schutwater bij sluizen naar het opwaarts pand – pompinstallaties

Het voorzien van vaste pompinstallaties op een aantal vaarassen:

Het netwerk van Albertkanaal en de Kempense kanalen worden uitsluitend gevoed met water dat afkomstig is uit de Maas, waarvan een deel in gemeenschappelijk beheer met Nederland. Dit maakt dat slechts een deel van het Maaswater ter voeding van deze kanalen kan worden aangewend.

Op elk van de 6 sluizencomplexen van het Albertkanaal werd gebouwd/zal worden gebouwd een pompinstallatie waardoor schutverliezen beperkt worden door terugpompen van water van het afwaartse naar het opwaartse kanaalpand... wat resulteert in beperking van waterafname uit de Maas. Deze installaties werden reeds ontworpen. Daarbij is het ontwerp zo opgevat zodat ze, bij voldoende waterbeschikbaarheid, ook in omgekeerde richting als waterkrachtcentrale kunnen werken.

Het Kanaal naar Charleroi wordt gevoed vanuit Wallonië. De afgelopen zomers werden we telkens

PROJECTOMSCHRIJVING

geconfronteerd met een ontoereikende toevoer, waardoor in eerste instantie moest overgegaan worden tot gegroepeerd schutten, en in tweede instantie tot het instellen van een diepgangbeperking.

Door de bouw van pompinstallaties op de 4 sluizen van het kanaal kan deze problematiek vermeden worden en kan de scheepvaart ook in periodes met zeer lage waterbeschikbaarheid blijven doorgaan.

Voor de eerstvolgende zomers wordt in afwachting van de bouw van de vaste installaties voorzien in de huur van mobiele pompen.

In de Durmevallei is de bouw van 2 pompstations voorzien in de verdere realisatie van de Sigmagebieden Groot Broek en Klein Broek. Ze voorzien om het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten naar de Durme gecontroleerd af te voeren, alsook om de waterstand in het Sigmagebied Groot Broek te reguleren.

De bouw van deze 2 pompstations biedt zowel een remediëring tegen de wateroverlast in de winterperiode in de Durmevallei (bij hoogtij en piekwaterstanden), als een remediëring tegen verdroging in de zomerperiode (sponswerking en verhoging grondwaterstanden in Groot Broek).

2. Dichting sluisdeuren zodat geen lekverliezen optreden – renovatie sluisdeuren

Uit patrimoniuminspecties blijken de lekverliezen ter hoogte van een reeks sluisdeuren niet verwaarloosbaar. Door een overwogen combinatie van renovatie/vervanging van deuren en modernisering van de bewegingsmechaniek zullen deze lekverliezen tot een minimum beperkt worden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	35.000.000 EUR
Output	6 bijkomende pompinstallaties en waterkrachtcentrales, 4 sluiscomplexen met structurele herstellingswerken ter vermindering van lekverliezen.
Outcome	Verminderd verlies van water, Verbeterde waterallocatieopties, vergroten van de waterreserve, Verhoogde productie duurzame energie, Verbeterde afstemming waterallocatie
Beoogde impact	Diepgangbeperking op bevaarbare waterlopen - Evolutie tonkilometers binnenvaart - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De 8 projectonderdelen verlopen volgens de vooropgestelde planning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De werken op terrein startten voor 4 projecten (Huurcontract mobiele pompen, Pompinstallaties Durme, Pompinstallatie op sluiscomplexen Albertkanaal en de vervanging van de sluisdeuren te Boezinge). - Voor 2 projecten werd de aanbestedingsprocedure doorlopen, de werken op het terrein starten in 2022: sluis Ooigem en Pompinstallaties op het Kanaal

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Brussel-Charleroi. - 2 projecten bevinden zich in studiefase: pompinstallatie Albertkanaal in Wijnegem en de vervanging van de Sluisdeuren Briegden-Neerharen. Voor dit laatste project werd de aanbesteding verschoven van 2021 naar 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Vervangen sluisdeuren Boezinge Dorp		2021 Q4	Op schema	
Structurele herstelling sluis Ooigem		2022 Q4	Op schema	
Raamovereenkomst huur mobiele pompen in afwachting van ingebruikname effectieve pompen		2022 Q4	Op schema	
Pompinstallaties Kanaal Brussel-Charleroi		2022 Q4	Op schema	
Pompinstallaties Durme t.h.v. Groot Broek		2023 Q4	Op schema	
Pompcapaciteit Albertkanaal: Hasselt, Diepenbeek en Genk: Bouwen van pompinstallaties en waterkrachtcentrales ter hoogte van de sluiscomplexen		2023 Q4	Op schema	
Pompcapaciteit Albertkanaal / Pompcapaciteit Albertkanaal: Wijnegem		2023 Q4	Op schema	
Vervangen sluisdeuren sluisen Briegden en Neerharen		2025 Q4	Vertraging	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Voltooiing van Blue Deal-project: herstelling van sluisdeuren	4	2026 Q2		
Voltooiing van Blue Deal-project: bouw van pompinstallaties	4	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Uitvoering VAK	25.660.000 EUR
Uitvoering VEK	273.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 33.900.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.100.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering - bijlage</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Ondernemingen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Uit recente kaarten die gemaakt werden op basis van satellietbeeldenonderzoek blijkt dat België één van de Europese landen is die het zwaarst getroffen worden door de extreme droogte. Ons grondwater staat een pak lager dan normaal en daarmee doen we het slechter dan bvb. Spanje en Zuid-Italië. Bijna de helft van onze oppervlakte staat in het diepste rood.

Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering die droogte en waterschaarste aanpakken:

- op een structurele manier;
- met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten;
- met betrokkenheid van de industrie als deel van de oplossing;
- met een duidelijke oproep naar de lokale besturen om ook inspanningen te doen.

Doelstelling van dit project is ondernemingen aan te zetten tot investeringen in innovatieve waterbesparende technologieën precies om zich te wapenen tegen waterschaarste en zich minder waterafhankelijk te maken. Dat doen we door bijkomend 10 miljoen euro te voorzien op de twee ecologiesteunmaatregelen, met name Ecologiepremie Plus (EP Plus) en Strategische Ecologiesteun (STRES), van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, specifiek voor waterbesparende projecten, en door een oproep te lanceren voor waterbesparende projecten die niet subsidieerbaar zijn onder EP Plus of STRES.

De EP Plus is een laagdrempelig steuninstrument om innovatieve maar gestandaardiseerde (breed uitrolbare) ecologische technologieën te ondersteunen. Via een applicatie kan een onderneming een steunaanvraag indienen voor een technologie die op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL), de lijst met steunbare technologieën, staat. Deze lijst evolueert en is vraaggestuurd, maw. technologieën komen op de lijst doordat een leverancier of een investerende onderneming een aanvraag doet om een nieuwe technologie op de lijst te laten zetten. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) beoordeelt vervolgens het ecologisch voordeel, de meerkost en het steunpercentage op basis van de kosteneffectiviteit.

Los van de technologieën met betrekking tot waterbesparing die vandaag al op de lijst staan, bevraagt het Agentschap Innoveren & Ondernemen proactief de markt in de zoektocht naar

PROJECTOMSCHRIJVING

nieuwe technologieën om op de lijst te zetten. Bovendien wordt bekeken of de EP Plus aangepast moet worden zodat, naast de innovatieve technologieën die nu al gesteund kunnen worden, ook minder of niet-innovatieve maar desalniettemin klimaat efficiënte technologieën betoelaagd kunnen worden. Op die manier zouden we nog meer investeringen in relevante technologieën kunnen stimuleren en een versnelling hoger kunnen schakelen in het tegengaan van droogte en waterschaarste.

STRES anderzijds is een steuninstrument voor bedrijfsspecifieke, innovatieve investeringen die, omwille van hun bedrijfsspecifieke karakter, niet standaardiseerbaar of breed uitrolbaar zijn. Ook deze steunmaatregel staat open voor waterbesparende dossiers.

De oproep zal openstaan voor kmo's die waterbesparende projecten zullen realiseren die omwille van hun niet-innovatieve karakter niet passen onder EP Plus of STRES. De oproep wordt op die manier een brede en laagdrempelige aanvulling op de reguliere ecologiesteun.

Met deze hervormingen van de ecologiesteun, gericht op het sterker stimuleren van (kleinere) ondernemingen tot investeringen in waterbesparende technologieën, en een proactieve benadering van bedrijven via clusterorganisaties en andere overheidsinstellingen die werken rond de waterproblematiek bij bedrijven, willen we meer (waterintensieve) bedrijven aanzetten tot waterbesparende investeringen. Op die manier hopen we een structurele bijdrage te kunnen aan de strijd tegen droogte en waterschaarste.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 15 goedgekeurde dossiers voor waterbesparende projecten
Outcome	Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen Duurzamer watergebruik via alternatieve bronnen Verhoogd gebruik van proceswater Nieuwe waterbesparende technieken en technologieën Verhoogde bewustwording duurzaam watergebruik
Beoogde impact	Aandeel waterverbruik klassieke bronnen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle onderdelen van dit project (via drie steunkanalen; EP Plus, STRES en oproep waterbesparingsprojecten) zijn opgestart. Intussen is de eerste oproep waterbesparingsprojecten afgelopen en momenteel worden de ingediende projecten beoordeeld. Op basis van die input kan dan ook gekeken worden welke modaliteiten een volgende oproep best kan bevatten.
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie nodig

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Openzetten EP Plus en STRES voor waterbesparingsdossiers		2021 Q3	Gerealiseerd	
Openzetten eerste oproep waterbesparingsdossiers		2021 Q4	Gerealiseerd	
Openzetten volgende call(s) waterbesparingsdossiers		2022 Q3	Nog niet gestart	
Tien miljoen euro steunbudget gealloceerd aan kwalitatieve projecten		2022 Q4	Op schema	
Start van projecten voor versterking van biodiversiteit en/of mitigatie van gevolgen van klimaatverandering		2023 Q2	Op schema	
Voltooiing van Blue Deal-projecten		2026 Q2	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde dossiers voor waterbesparende projecten	15	2022 Q4	6	40 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.623.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 10.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven en steun voor onderzoek in de landbouwsector

VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Inzetten op onderzoek en innovatie productie, afzet en verwerking van droogteresistente teelten. Ketenpaanpak voorzien, gaat om nieuwe teelten zoals plantaardige eiwitten.

a) Project : "slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw". De plantaardige praktijkcentra in Vlaanderen zullen zich verenigen om een project uit te voeren gericht op enerzijds een innovatie-gedreven waterefficiëntie in land- en tuinbouw en anderzijds op een aanpassing van de teeltkeuze en/of teeltplan van de landbouwers.

b) Oproep droogteresistente teelten – eiwitten

De projectoproep 'Realisatie Eiwitstrategie' helpt concrete initiatieven i.k.v. de zes doelstellingen van de eiwitstrategie uit te voeren en de huidige knelpunten, zoals afzetontwikkeling, weg te werken. Bij deze initiatieven staat samenwerking tussen diverse partners in de eiwitketen voorop, waardoor duurzame eiwitketens opgezet en uitgebouwd worden. De projecten moeten bijdragen tot de verduurzaming en verbreding van het eiwitaanbod in Vlaanderen.

c) project 'FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer'. Dit project heeft als doel de Vlaamse landbouw weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering door te focussen op adaptatie van gewassen aan droogte en verzilting.

Binnen het project wordt geïnvesteerd in bijkomende gespecialiseerde infrastructuur die moet toelaten om de knowhow in Vlaanderen te versterken rond plantenveredeling met focus op droogtetolerantie en zoutstresstolerantie van bestaande of innovatieve gewassen en cultivars enerzijds en het modelleren van de impact van droogte op gewasopbrengsten anderzijds.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	8.000.000 EUR
-------	---------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	a) 12 deelnemende partners aan het samenwerkingsverband Praktijkcentra Plant in kader van het project "slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw" b) 16 projecten die een minimumscore op de beoordelingscriteria behalen en worden geselecteerd c) 1 project FutureAdapt van EV ILVO
Outcome	- Verminderd gebruik van kwetsbare bronnen - Verhoogd aandeel droogteresistente teelten - Bevorderde data- en kennisuitwisseling - Verhogen bevoorradingszekerheid voedingsnijverheid - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven
Beoogde impact	Aandeel waterverbruik klassieke bronnen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	b) Oproep droogteresistente teelten – eiwitten : oproep lopende. Projecten kunnen worden ingediend tot 15 december 2021
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Goedkeuring door VR van project 'slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'	2021 Q2	Gerealiseerd
uitvoering project 'slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'	2023 Q4	Op schema
oproep voor projecten 'realisatie eiwitstrategie'	2021 Q4	Gerealiseerd
selectie projecten 'realisatie eiwitstrategie'	2022 Q1	Nog niet gestart
Uitvoering geselecteerde projecten	2025 Q4	Nog niet gestart
Goedkeuring door VR van project 'FutureAdapt' van Eigen Vermogen ILVO	2021 Q2	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL			TIMING	STATUS
uitvoering project 'FutureAdapt'			2024 Q4	Nog niet gestart
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
a)- deelnemers aan het samenwerkingsverband 'Praktijkcentra Plant' in kader van het project 'Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'	12	2023 Q4		
c)- project 'FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer'	1	2024 Q4		
b)- aantal projecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt geselecteerd	16	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.999.000 EUR
Uitvoering VEK	400.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 8.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021: subsidie praktijkcentra plant (DOC VR2021 1607 VV DOC.0113/1bis)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021: FutureAdapt (DOC VR2021 1607 VV
DOC.0131/1bis)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Bestedingskader middelen Projectoproep
Realisatie Eiwitstrategie](#)

VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>a) pré-ecoregelingen</p> <p>Er wordt aan landbouwers de kans geboden om een of meerdere nieuwe verbintenissen aan te gaan voor een termijn van 1 jaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - de inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel van minimum 30 are - ecologisch beheer van grasland op een landbouwperceel van minimum 30 are - de inzaai van milieu-, klimaat-, en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel van minimum 30 are - toepassing van precisielandbouw per perceelniveau - het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via het teeltplan <p>b) groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven</p> <ul style="list-style-type: none"> - productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven - niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven 	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	10.000.000 EUR
Output	<p>a) pré-ecoregelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - oppervlakte met verbintenis 'inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel' - oppervlakte met verbintenis 'ecologisch beheer van bestaand grasland op een landbouwperceel' - oppervlakte met verbintenis 'inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel' - oppervlakte percelen met toepassing van precisielandbouw per perceelniveau - oppervlakte met verbintenis 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via teeltplan'

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

	b) groene investeringen - Aantal productieve investeringen in land- en tuinbouwbedrijven - Aantal niet-productieve investeringen in land- en tuinbouwbedrijven
Outcome	- Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Verhoogde waterretentie in de bodem - Verhoogde koolstofopslag in de bodem - Verhoogde infiltratie - Stimulans alternatieve verdienmodellen in de landbouw - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven
Beoogde impact	Grondwaterstand - Aandeel waterverbruik klassieke bronnen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	a) pré-ecoregelingen: definitieve goedkeuring op de Vlaamse Regering van 10 september 2021 van het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
pré-ecoregelingen: opmaak regelgeving	2021 Q4	Gerealiseerd
pré-ecoregelingen: aangaan verbintenissen	2022 Q2	Nog niet gestart
pré-ecoregelingen: uitvoering verbintenissen	2023 Q2	Nog niet gestart
productieve en niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	2022 Q4	Nog niet gestart
aanwerving personeel	2021 Q4	Vertraging

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
oppervlakte met een verbintenis 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via teeltplan' (ha)	50.000	2022 Q4		
oppervlakte met een verbintenis 'inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel' (ha)	3.380	2022 Q4		
oppervlakte met een verbintenis 'inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel' (ha)	3.000	2022 Q4		
oppervlakte met een verbintenis 'ecologisch beheer van bestaand grasland op een landbouwperceel' (ha)	3.940	2022 Q4		
oppervlakte percelen met toepassing van precisielandbouw per perceelniveau (ha)	25.500	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

De projectoproep “Hergebruik Restwater” wil het hergebruik van restwater in de land- en tuinbouwsector stimuleren. Met deze projectoproep wordt ingespeeld op de uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende waterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. De projecten moeten bijdragen tot het verhoogd aanwenden van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik.

Samenwerkingsverbanden tussen landbouwers met een watervraag enerzijds en aanbieders van restwater anderzijds kan leiden tot een win-win situatie. De landbouwsector verhoogt zo de bevoorradingszekerheid voor water, terwijl hergebruik van restwater ook zorgt voor een afname van de druk op kwetsbare waterbronnen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	10.000.000 EUR
Output	- 9 projecten die een minimumscore op de beoordelingscriteria behalen en worden geselecteerd
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Verduurzamen watergebruik via alternatieve bronnen - Vergroten van de waterreserve - Verhogen bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven - Bevorderde data- en kennisuitwisseling
Beoogde impact	Aandeel waterverbruik klassieke bronnen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Oproep tot indiening van projecten is lopende. Indieningstermijn loopt tot 15 december 2021.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
oproep voor projecten		2021 Q4	Gerealiseerd	
selectie projecten		2022 Q1	Nog niet gestart	
uitvoering geselecteerde projecten		2025 Q4	Nog niet gestart	
overkoepelende studiedag en brede kennisdeling		2025 Q4	Nog niet gestart	
aanwerving personeel		2021 Q4	Vertraging	
uitbesteding behandeling dossiers na 2022		2022 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal projecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt gesubsidieerd	9	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Bestedingskader middelen Projectoproep Hergebruik Restwater](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR IN DE BEBOUWDE OMGEVING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit relanceproject wil de Vlaamse overheid groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving versneld stimuleren en ondersteunen binnen het Vlaams adaptatiebeleid. Het vanuit het departement Omgeving eerder geïnitieerde programma 'Vlaanderen breekt uit' zal gebruikt worden om de acties en maatregelen van dit project op te zetten.

Met een oproep worden de 15 meest ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen geselecteerd die voorbeeldstellend willen zijn voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie van de Vlaamse regering. De bedoeling is om ter beschikking te staan voor vragen van deze steden en gemeentes en om samen met hen op zoek te gaan naar de projecten met de grootste meerwaarde voor de doelstellingen uit de Blue Deal.

De geselecteerde steden en gemeentes zullen in kader van de oproep enerzijds minstens 3 quick-win projecten realiseren binnen de drie jaar. Met de quick-wins realiseren de gemeentes een significante toename van groen en blauw binnen de bebouwde omgeving. Daarnaast zal de gemeente een concreet uitvoeringsdossier moeten opstellen voor een transformatieproject dat een structurele ruimtelijke transformatie realiseert voor groenblauwe dooradering, klimaatadaptatie, waterretentie en -infiltratie en een grotere meerwaarde biedt voor de lokale leefomgevingskwaliteit. Belangrijk bij al deze projecten is het hefboomeffect dat ze hebben voor de ruimere omgeving.

Door het engagement van lokale besturen voor verankering van een onthardingsvisie in de lokale beleidsplanning en door het opnemen van een ambassadeursrol voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie, wordt een structurele aanpak van deze beleidsvoornemens in de toekomst gegarandeerd. Ze betrekken hierbij doelgroepen en stakeholders met als doel een breed draagvlak te creëren in de regio voor groenblauw en klimaatadaptatie.

Om een onthardings- en vergroeningsgolf op gang te brengen, worden bovendien verenigingen en

PROJECTOMSCHRIJVING

intercommunales ondersteund in de realisatie van projecten die zorgen voor ontharding en vergroening en zo onder meer droogte tegengaan. Hiervoor wordt een tweede oproep uitgewerkt. Zo ontstaat een grotere coalitie van actoren die actief de bebouwde omgeving klimaatadaptief willen inrichten.

Deze oproep richt zich op kleine en middelgrote projecten rond ontharding en vergroening met aandacht voor de droogteproblematiek van de bodem o.a. via een betere waterinfiltratie in de bebouwde omgeving. Er wordt ingezet op zowel private als publieke delen van terreinen. Opdat de projecten een grote voorbeeldfunctie zouden hebben, wordt er gekozen voor terreinen met een grote zichtbaarheid voor verschillende doelgroepen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	20.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> • 45 quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 2,5 jaar. • 15 uitvoeringsdossiers (inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor ruimtelijke transformatieprojecten gericht op groenblauwe dooradering zijn uitgewerkt en klaar voor uitvoering • minstens 45 kleine en middelgrote projecten zijn gerealiseerd • 1 Vlaams-brede campagne gelanceerd rond groenblauwe dooradering en ontharding
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Verminderde afvoer van hemelwater • Verhoogde infiltratie • Verhoogde grondwatervoorraad • Temperatuurregulatie • Meer groen en biodiversiteit • Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit • Draagvlakcreatie voor groenblauw en klimaatadaptatie
Beoogde impact	Grondwaterstand

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Voortgang sinds september 2021:</p> <p>De jurering van de projectoproep 'Vlaanderen breekt uit: 15 meest ambitieuze steden en gemeenten' binnen dit relanceproject is afgelopen. In januari 2022 wordt de selectie voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De projecten starten met uitvoering in maart 2022.</p> <p>Het reglement voor een tweede oproep richting verenigingen en intercommunales 'groenblauwe parels' werd in december 2021 afgewerkt. De</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>lancering voor deze oproep is voorzien voor voorjaar 2022.</p> <p>Als voorbereiding op de campagne wordt de doelgroep(en) bepaald en de manier waarop we deze kunnen bereiken.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Groenblauwe infrastructuur: lancering oproep 2021 naar lokale besturen	2021 Q2	Op schema		
Selectie van 15 steden en gemeenten op basis van de ingediende voorstellen	2021 Q4	Vertraging		
Start begeleidingstraject, inhoudelijke studie en procesbegeleiding gebiedsprogramma's	2022 Q1	Nog niet gestart		
Lancering oproep naar verenigingen en intercommunales	2022 Q2	Op schema		
Realisatie van 45 quick-win projecten	2024 Q3	Nog niet gestart		
Realisatie van minstens 45 kleine en middelgrote projecten rond ontharding en vergroening in de bebouwde omgeving	2024 Q3	Nog niet gestart		
15 masterplannen, financiële plannen, en overeenkomsten met partners voor transformatieprojecten zijn uitgewerkt	2024 Q3	Nog niet gestart		
15 uitvoeringsdossiers voor complexe transformatieprojecten opgestart en in realisatie	2026 Q3	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vlaams-brede campagne gelanceerd rond groenblauwe dooradering en ontharding	1	2023 Q4		
Aantal quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 2,5 jaar	45	2024 Q3		
Aantal uitgewerkte uitvoeringsdossiers (inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor	15	2026 Q3		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
ruimtelijke transformatieprojecten gericht op groenblauwe dooradering				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	bedrijven, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, rioolbeheerders, drinkwatermaatschappijen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.</p> <p>Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het inzetten op een meer duurzaam watergebruik onder meer door het aanspreken van alternatieve waterbronnen, een slimme sturing in waternetwerken en buffers.</p> <p>Dit project bestaat uit onderstaande onderdelen. Het project wordt integraal gerealiseerd met relancemiddelen.</p> <p>1. Proeftuinen Droogte</p> <p>Via de proeftuinen droogte worden bedrijven die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderden, gesubsidieerd bij de concrete uitvoering van hun project. De selectie van de meest innovatieve en effectieve gebeurt na een algemene oproep. Om complementair te zijn aan bestaande ondersteuningsmogelijkheden voor bedrijven en landbouwbedrijven wordt deze subsidie benut voor samenwerkingsverbanden van minstens 3 bedrijven.</p> <p>Zowel in 2019 als 2020 kregen bedrijven reeds de kans om voorstellen in te dienen en werden resp. voor 4 miljoen en 3,2 miljoen subsidies toegekend.</p> <p>Via dit nieuwe initiatief zullen ook in 2021 en 2022 soortgelijke oproepen worden gelanceerd en zullen projecten worden gesubsidieerd. Het voorziene subsidiebudget bedraagt 4 miljoen per jaar.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

2. Call circulair water: grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van bestaande buffers en optimale benutting van effluent

Via dit initiatief worden in de praktijk projecten ondersteund die:

- zorgen dat hemelwaterbuffers door een slimme sturing optimaler kunnen worden ingezet
- grootschalige collectieve buffers realiseren om zo een oplossing te bieden aan bestaande of potentiële watertekorten of suboptimaal watergebruik
- Effluent op een duurzame manier inzetten om te voldoen aan een lokale watervraag, dus zonder de ecologie van de ontvangende waterloop te hypothekeren of aanleiding te geven tot intensief transport over de weg van water.

Een aantal interessante piloten worden geselecteerd en op het terrein geïmplementeerd.

Voor dit initiatief wordt over de periode 2021-2022 een subsidiebudget van 16 miljoen euro uitgetrokken.

3. Automatisatie meetnetten oppervlaktewater en grondwater

Via dit initiatief worden de nodige investeringen uitgevoerd om de bestaande meetnetten performanter te maken door het fijnmaziger te maken en de stap te zetten naar digitale monitoring en dataverwerking om in periodes van droogte het nemen van goed onderbouwde (beleids)beslissingen op lokale of regionale schaal te faciliteren. De data-ontsluiting is hierbij ook voorzien.

Het voorgestelde Blue Deal project draagt bij aan het effectiever en efficiënter beheer van de zoetwaterreserves zowel voor grond- als oppervlaktewater bij droogte en waterschaarste, het gericht monitoren van het oppervlaktewater in functie van o.a. waterproductiecentra, het opvolgen van verzilting, het in kaart brengen van milieu-incidenten en het onderbouwen van het waterbeleid.

Het initiatief omvat volgende concrete onderdelen:

- De automatisatie van het kwaliteitsmeetnet oppervlaktewater door de inzet van onder meer multiparametersondes en geautomatiseerde monsternametoestellen; De aankoop van de hardware gebeurt in 2022, het bijbehorende beheer wordt ingezet over een periode van drie jaar vanaf 2022.
- De automatisatie van grondwaterpeilmetingen en de uitbreiding van het grondwatermeetnet: De installatie van de automatische peilmeetsondes wordt gespreid over 2021-2023. De uitbreiding van het meetnet is voorzien voor 2022.
- De uitbreiding van het laagwatermeetnet waterlopen: Hiervoor worden in 2022 de nodige investeringen voorzien.

4. Slimme datasystemen VMM

We investeren in slimme datasystemen voor water waarin we informatie over het watersysteem en de waterketen samenbrengen en toegankelijk maken voor specifieke eindgebruikers: lokale besturen, waterbeheerders, kennisinstellingen, sectorale stakeholders, De watersysteemdata en -informatie worden gebiedsgericht aangeboden via meerdere ingangen, voorstellingswijzen en communicatiekanalen zoals loketten en tools, interactieve indicatoren, dataportalen, Alle data worden aangeboden als 'open data' zodat externe partijen er bijkomende services rond kunnen ontwikkelen. De slimme datasystemen worden gerealiseerd door de bestaande portalen met watergerelateerde data zoals Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), Waterinfo en het Klimaatportaal verder uit te bouwen en met elkaar te koppelen of te integreren. Daarnaast zullen

PROJECTOMSCHRIJVING

een aantal nieuwe modules opgezet worden rond waterkwaliteit, waterbeleving en drinkwater. De technische uitwerking van de modules zal uit efficiëntie-overwegingen zo veel mogelijk gekoppeld en geïntegreerd verlopen. Op die manier groeien we toe naar één slim waterplatform.

5. Slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin

Met dit project wordt het hoofdnetwerk van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen omgevormd tot een slim net. De infrastructuur wordt uitgebreid met een "digitale laag" die in staat is een nieuwe functie te vervullen in het kader van de klimaatverandering en meer bepaald de strijd tegen droogte.

Via het project worden concrete initiatieven genomen omtrent het digitaal meten en regelen van de bovenlokale hemel- en afvalwaterinfrastructuur. We maken werk van het optimaal verzamelen, delen en combineren van data tot kennis, inzichten en slimme sturingen. Het project ambiëert de digitalisering van de infrastructuur om via real-time monitoring en simulaties naar predictieve modellering en slimmere sturingen een efficiënt en ecologisch antwoord te bieden op klimaatuitdagingen maar ook tegelijk op energie management reducties, vuilvrachtreductie en veiligheidspreventie van alle betrokkenen die op de infrastructuur toegang nodig hebben.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	45.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - 15 projecten gerealiseerd in het kader van de proeftuinen Droogte - 8 projecten gerealiseerd in het kader van de call circulair water - 14 bijkomende automatische meetpunten oppervlaktewaterkwantiteit beschikbaar - 200 automatische meetpunten grondwater incl dataontsluiting beschikbaar - 180 automatische meetpunten voor oppervlaktekwaliteit gerealiseerd - 2 nieuwe en 2 geoptimaliseerde modules binnen het nieuwe dataportaal water gerealiseerd - nieuwe automatiseringsarchitectuur en het smart data platform bij Aquafin beschikbaar
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering infrastructuur • Verbeterde werking watersysteem via slimme sturing • Bevorderde data- en kennisuitwisseling • Verduurzaamd watergebruik via alternatieve bronnen • Verhoogd gebruik van proceswater • Snellere detectie van calamiteiten • Verbeterde onderbouwing waterbeleid
Beoogde impact	Aandeel waterverbruik klassieke bronnen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>Voor de Proeftuinen Droogte werden inmiddels 6 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 2.545.701 euro. Deze projecten zullen de komende jaren uitgevoerd kunnen worden. Volgend jaar wordt een nieuwe oproep gelanceerd.</p> <p>Voor de call circulair watergebruik zijn de reglementen in voorbereiding en worden ze voorgelegd aan het kabinet en de minister.</p> <p>Het bestek voor de automatisatie van de laagwatermeetnetten is gepubliceerd. Het bestek voor de automatisatie van het grondwatermeetnet en oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnet zijn in voorbereiding.</p> <p>De uitwerking van de slimme datasystemen VMM is opgestart. De eerste opdrachten zijn gegund en in uitvoering. Vervolgstappen worden voorbereid.</p> <p>De opdracht voor de uitwerking van de slimme hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur wordt normaliter nog voor het eind van 2021 door minister Demir gegeven. Een eerste herverdeling voor een bedrag van 5,5 miljoen euro uit de relanceprovisie is aangevraagd voor de herverdeling van 10/12/2021.</p>
Noodzakelijke politieke actie	In 2022 zullen een aantal subsidiedossiers in het kader van de oproep "Proeftuinen Droogte 3.0" en de call circulair water ter goedkeuring worden voorgelegd aan minister Zuhair Demir en aan de Vlaamse Regering.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Proeftuinen Droogte: lancering oproep 2021	2021 Q2	Gerealiseerd
Opgezet Aquafin dataplatform in the cloud	2021 Q4	Op schema
Herverdeling middelen uit relanceprovisie + opdracht uitvoering aan Aquafin voor het deelproject slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin	2021 Q4	Gerealiseerd
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd
Call circulair water: lancering oproep	2022 Q1	Op schema
Guidelines en catalogustool beschikbaar tbh de data governance bij Aquafin	2022 Q2	Op schema

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Proeftuinen Droogte lancering oproep 2022	2022 Q2	Op schema
Een cloud gebaseerd IoT-dataplatform in gebruik bij Aquafin	2022 Q4	Op schema
Selectie projecten circulair water	2022 Q4	Nog niet gestart
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2022	2022 Q4	Nog niet gestart
Uitbreiding volautomatisch meetnet oppervlaktewaterkwantiteit met minstens 20 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2023 Q2	Op schema
Uitbreiding van het grondwatermeetnet met minstens 10 bijkomende meetplaatsen	2023 Q3	Op schema
Grootschalige connectie van IoT devices met het Aquafin IoT-platform	2023 Q4	Op schema
De realisatie van minstens 2 nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal en minstens 2 bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	2023 Q4	Op schema
de automatisatie architectuur voor een toekomstgerichte sturing is klaar om verder te worden uitgerold op de waterzuiveringsinfrastructuur van Aquafin	2024 Q4	Op schema
Gartner maturiteitsniveau 3 bereikt voor de data governance bij Aquafin	2024 Q4	Op schema
Een smart data platform en nieuwe automatiseringsarchitectuur is beschikbaar om intelligente sturing van de Aquafin-infrastructuur toe te laten	2025 Q4	Op schema
Automatische metingen grondwater in minstens 200 putten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2025 Q4	Op schema
Automatische metingen oppervlaktewaterkwaliteit voor minstens 180 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2025 Q4	Op schema
Volledige uitvoering projecten call circulair water	2026 Q3	Nog niet gestart
Volledige uitvoering projecten Proeftuinen Droogte door geselecteerde samenwerkingsverbanden	2026 Q3	Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
bijkomende automatische meetpunten oppervlaktewaterkwantiteit	14	2023 Q2		
Aantal bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	2	2023 Q4		
Aantal nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal water	2	2023 Q4		
Aantal bijkomende automatische meetpunten voor oppervlaktekwaliteit	180	2025 Q4		
Aantal nieuwe automatische meetpunten grondwater incl dataontsluiting beschikbaar	200	2025 Q4		
Aantal projecten gerealiseerd in het kader van de Proeftuinen Droogte	15	2026 Q3		
Aantal projecten gerealiseerd in het kader van de call circulair water	8	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	45.000.000 EUR
Uitvoering VAK	8.606.000 EUR
Uitvoering VEK	5.619.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 43.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving

VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Sensibilisering, opleiding en advisering van land- en tuinbouwers, onder meer door in te zetten op digitalisering (online tools, bedrijfsdata verzamelen en analyseren, ...)</p> <p>a) projectoproepen samenwerking Om de gevolgen van de Covid-19-pandemie op de land- en tuinbouwsector te milderen worden projectoproepen rond samenwerking m.b.t. ondernemerschap, digitalisering en kennisdeling gelanceerd. De samenwerkingsprojecten beogen oplossingen voor water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënter beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook kunnen zij gericht zijn op een digitale transformatie met het oog op het verhogen van veerkracht en ondernemerschap van bedrijven.</p> <p>b) bodempaspoort Met het bodempaspoort zal een digitaal en gebruiksvriendelijk instrument ontwikkeld worden en aangeboden worden aan de landbouwer, waarbij bodemdata uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier en op perceelsniveau worden samengebracht. Op die manier wordt de landbouwer gestimuleerd om een data-gedreven, gericht en meer duurzaam bodembeheer uit te voeren.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	6.000.000 EUR
Output	<p>a) projectoproepen samenwerking - 15 samenwerkingsprojecten</p> <p>b) bodempaspoort - 1 digitaal instrument</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Toegenomen waterreserve - Digitalisering leer- en adviestrajecten - Positie van de landbouwer in de voedselketen versterkt - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven
Beoogde impact	Aandeel waterverbruik klassieke bronnen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>a) Projectoproep samenwerking: oproep lopende. Projecten konden ingediend worden tot 15 december 2021.</p> <p>b) Bodempaspoort: project opgestart na goedkeuring door VR op 10/09/2021</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
projectoproep samenwerking 2021		2021 Q4	Gerealiseerd	
selectie projecten i.k.v. oproep 2021 samenwerking		2022 Q1	Nog niet gestart	
uitvoering projecten oproep samenwerking		2025 Q4	Nog niet gestart	
projectoproep samenwerking 2022		2022 Q4	Nog niet gestart	
bodempaspoort		2022 Q4	Op schema	
aanwerving personeel		2021 Q3	Vertraging	
uitbesteding behandeling dossiers na 2022		2022 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bodempaspoort: digitaal instrument	1	2022 Q4		
Oproep samenwerking: aantal samenwerkingsprojecten dat een minimumscore op de	15	2023 Q1		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
beoordelingscriteria behaalt en wordt gesubsidieerd				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Sensibilisering, opleiding en advisering Nota aan de Vlaamse Regering van 10 september 2021 (VR 2021 1009 VV DOC.0139/1BIS). Bodempaspoort

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Vlaamse Milieumaatschappij - De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Lokale besturen, waterbeheerders, terreinbeherende verenigingen, landbouwers, private eigenaars, ...

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering onder andere inzetten op natuurgebaseerde oplossingen om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving toekomstgericht te herstellen. Met die aanpak beoogt ze integrale oplossingen uit te werken die de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit verhogen, die helpen om de impact van klimaatverandering op te vangen en te milderen, en die bijdragen tot o.a. aanvulling van de grondwatertafel, biodiversiteitsherstel en een verhoogde koolstofopslag. In het kader van de relance-investeringen werden vier gebieden in Vlaanderen geselecteerd als 'vlaggenschip' projecten om deze integrale, natuur-gebaseerde aanpak versneld te ontwikkelen en te realiseren.

Tijdens de periode 2021–2024 wordt in die vier projectgebieden versneld en op grote schaal ingezet op concrete terreinrealisaties. Het betreft het kustduinencomplex (West-Vlaanderen), Rivierherstel Leie (West- en Oost-Vlaanderen), Vallei van de Kleine Nete (Antwerpen) en het brongebied van de Zwarte Beek (Limburg). Gezamenlijk bestrijken die vier projecten een breed spectrum van specifieke wateruitdagingen, waarvoor natuurgebaseerde oplossingen ontwikkeld en gerealiseerd zullen worden. Deze projecten zullen telkens ingebed worden in een brede gebiedswerking met alle betrokken actoren. Voor Rivierherstel Leie en de vallei van de Kleine Nete bestaat er reeds zo'n (langlopende) gebiedswerking. Aan de kust wordt de uitdaging opgenomen als nieuw spoor binnen de gebiedswerking van T.OP Kustzone. Voor de Zwarte beek wordt er een gepaste governance opgezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	23.000.000 EUR
Output	Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m ² gesloopte bebouwing, afgegraven terreinen en weggenomen verharding

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	<p>Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m² verworven woon-, woonuitbreidings- en recreatiegebied i.f.v. realisatie rivier- en valleierstelproject</p> <p>Kleine Nete: (deelproject 2): Aantal m² verworven project- en/of ruilgronden in functie van realisatie natte natuurdoelen SBZ-H</p> <p>Zwarte Beek: Aantal ha verworven ten bate natte natuur</p> <p>Duinencomplex: Aantal gerealiseerde projecten ifv versterking watersysteem kustduinen</p> <p>Leie: Aantal ha ingerichte natte natuur</p>
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Opmaak en uitvoering meerjarenprogramma voor gebiedsgerichte projecten rond waterberging, - buffering en infiltratie. Herstel van habitatrichtlijngebieden met structurele verdrogingsproblemen. • Kustduinen: realisatie doelstellingen ambitienota voor de versterking van watersysteem van de kustduinen. • Vernatten van gebieden • Verhoogde infiltratie • Verhoogde waterretentie in de bodem • Verhoogde koolstofopslag in de bodem • Verbeterde hydromorfologie • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Verminderde verzilting • Bijkomende groenblauwe verbindingen
Beoogde impact	Grondwaterstand - Kritische debieten op onbevaarbare waterlopen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Vlaggenschip 'Kleine Nete': De drie deelprojecten zitten op schema. Om een aantal noodzakelijke terreinaankopen te kunnen realiseren in deelproject 3 is een beslissing van de Vlaamse Regering nodig m.b.t. inzet instrument 'vergoedingen bij lokale grondenbanken' uit decreet landinrichting.</p> <p>Kustduinen: in oktober 2021 werd een eerste oproep gelanceerd voor investeringsprojecten. De finale goedkeuring van de geselecteerde projecten door Vlaamse Regering is voorzien voor begin 2022.</p> <p>Rivierherstel Leie: Op 24 september 2021 nam de Vlaamse Regering een reeks essentiële beslissingen waarmee het project (opnieuw) vaart kan maken: de perimeter werd uitgebreid met 5 extra deelgebieden, er wordt voorzien in extra flankerend beleid, Op 1 december 2021 startten de gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen als intendant om extra draagvlak te creëren in de regio. Aankoop van 8 ha binnen de deelgebieden van Rivierherstel Leie. Andere onderhandelingen zijn lopende.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Kleine Nete: Selecteren deelprojecten voor financiering binnen Vlaggenschip Kleine Nete	2021 Q2	Gerealiseerd
Goedkeuring rapportering en werkplan gebiedswerking Kleine Nete	2020 Q4	Gerealiseerd
Kustduinen: Opmaak ambitienota voor waterfuncties in de kustduinen met relevante stakeholders	2021 Q2	Gerealiseerd
Kleine Nete: Deelproject 1. Uitwerken bestek en selecteren op te nemen locaties en werken	2021 Q3	Op schema
Kleine Nete: Deelproject 2. Opmaak schattingsverslagen te verwerven gronden	2021 Q3	Op schema
Kleine Nete: Deelproject 3. Voorbereiden ontwerpbeslissing Vlaamse Regering inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2021 Q3	Op schema
Kleine Nete: Deelproject 2. Onderhandelingen met eigenaars i.f.v. opmaak overeenkomst over prijs te verwerven gronden	2021 Q4	Op schema
Kleine Nete: Deelproject 1. Publiceren bestek	2021 Q4	Op schema
Kleine Nete: Deelproject 3. Beslissing Vlaamse Regering inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2021 Q4	Vertraging
Kustduinen: Lanceren projectoproep voor realisatie ambities + selectie projecten ism expertengroep	2021 Q4	Gerealiseerd
Kustduinen: Beslissing Vlaamse Regering over eerste projectoproep + lanceren tweede projectoproep	2022 Q1	Op schema
Zwarte Beek: Verwerving 150 ha ten bate van natte natuur in het brongebied Zwarte Beek	2022 Q4	Op schema
Kustduinen: Goedkeuring Vlaamse Regering projecten tweede oproep	2024 Q3	Op schema
Rivierherstel Leie: Realisatie 100 ha natte natuur rivierherstel Leie	2024 Q4	Op schema
Rivierherstel Leie: Opmaak inrichtingsplannen en uitvoeringsplannen voor 4 deelgebieden rivierherstel Leie	2024 Q4	Nog niet gestart
Rivierherstel Leie: Opmaak LER voor vijf bijkomende deelgebieden	2024 Q4	Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m ² gesloopte bebouwing, afgegraven terreinen en weggenomen verharding	50.000 m ² (5 ha)	2022 Q4		
Zwarte Beek: Aantal ha verworven ten bate natte natuur	150	2022 Q4		
Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m ² verworven woon-, woonuitbreidings- en recreatiegebied i.f.v. realisatie rivier- en valleierstelproject	70.000 m ² (7 ha)	2022 Q4		
Duinencomplex: Aantal gerealiseerde projecten ifv versterking watersysteem kustduinen	15	2024 Q4		
Rivierherstel Leie: Aantal ha ingerichte natte natuur	100	2024 Q4		
Kleine Nete: (deelproject 2): Aantal m ² verworven project- en/of ruilgronden in functie van realisatie natte natuurdoelen SBZ-H	1.000.000 m ² (100 ha)	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.462.000 EUR
Uitvoering VEK	657.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 19.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020. Tussentijdse beslissing gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020. Voortgangsrapportage gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier. Bijlage](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Grondeigenaars, terreinbeherende organisaties, gemeenten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.</p> <p>Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het vasthouden van water en het voorzien van meer ruimte voor water door het aanleggen van groenblauwe netwerken, het voorzien van buffers, het hermeanderen van waterlopen, het herstellen van winterbeddingen etc. om zo de waterbeschikbaarheid te verhogen.</p> <p>Het totaalproject bestaat uit een reeks investeringsprojecten waarmee de VMM als beheerder van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie inzet op het creëren van groenblauwe netwerken en het aanpassen van de beschikbare infrastructuur (wachtbekkens, stuwen) zodat zij kunnen worden ingezet om ook in tijden van droogte tot een optimaal waterlopenbeheer te komen voor mens en natuur.</p> <p>De investeringsprojecten zijn zeer divers maar alle deelprojecten bezitten steeds een vernattingscomponent of beogen de realisatie van een groenblauwe verbinding. Zo kan door hermeandering meer water gebufferd worden, bieden openleggingsprojecten de mogelijkheid om groenblauwe netwerken te creëren, ..</p> <p>Via vernieuwing van de kunstwerken worden wachtbekkens, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden zo optimaal mogelijk benut voor infiltratie, met slimme sturing voor berging en lediging.</p> <p>De doelstelling voor dit project is het uitvoeren van een set van projecten voor het volledig voorziene budget van 30 miljoen euro. Dit budget is integraal afkomstig van relancemiddelen. Een lijst van concrete projecten die hiervoor in aanmerking komen is beschikbaar.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	30.000.000 EUR
Output	Realiseren van 20 projecten om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Vernatten van gebieden • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Verbeterde werking watersysteem via slimme sturing • Digitalisering van de infrastructuur • Verbeterde hydromorfologie • Realiseren van groenblauwe verbindingen
Beoogde impact	Grondwaterstand - Kritische debieten op onbevaarbare waterlopen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het aantal vastgelegde en opgestarte projecten is ongewijzigd. Door het slechte weer en het vele werk bij de aannemers starten de resterende vastgelegde werven pas in het voorjaar van 2022 op. Ondertussen zijn wel verschillende bijkomende dossiers aanbesteed waarvoor begin 2022 een budgetverdeling zal worden aangevraagd en die dan in januari/februari kunnen worden vastgelegd.
Noodzakelijke politieke actie	nvt

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
30% van de budgetten vastgelegd	2021 Q4	Gerealiseerd
Uitvoering van 5 projecten gestart	2021 Q4	Gerealiseerd
Uitvoering van 10 projecten gestart	2022 Q4	Op schema
alle dossiers vastgelegd	2022 Q4	Op schema
5 projecten voltooid	2022 Q4	Op schema

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
50% van het VEK-budget benut		2023 Q4	Op schema	
Uitvoering van 15 projecten gestart		2023 Q4	Op schema	
10 projecten voltooid		2024 Q2	Op schema	
Uitvoering van 20 projecten gestart		2024 Q2	Op schema	
75% van het VEK-budget benut		2025 Q4	Op schema	
15 projecten voltooid		2025 Q4	Op schema	
Uitvoering van minstens 20 projecten groenblauwe netwerken en optimalisatie infrastructuur aan waterlopen voor een totaal bedrag van 30 miljoen euro		2026 Q2	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde projecten die waterschaarste op een structurele manier aanpakken	20	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.201.000 EUR
Uitvoering VEK	218.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 24.800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV036 - NATTE NATUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Agentschap Natuur en Bos
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaamse Milieumaatschappij - Vlaamse Landmaatschappij
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project betreft de opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor valleierherstel en herstel van natte natuur. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het herstel en de bescherming van veengebieden (laagveen, hoogveen, veenbossen) die de grootste hoeveelheid water kunnen vasthouden en ook veel koolstof opslaan.

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 legt sterkt de nadruk op het verhogen van onze weerbaarheid tegen droogte, onder meer via circulair waterbeleid en de actieve inzet van een veerkrachtige ruimte met (extra) natuur om de klimaatverandering te milderen. Bossen, moerassen, meanderende rivieren en graslanden houden immers koolstof vast en bufferen wateroverlast, droogte en hitte-effecten. Daarom kiest de Vlaamse regering ervoor gezonde ecosystemen te herstellen door het versneld realiseren van een sterk samenhangend geheel van natuur-, bos- en valleigebieden, die kwaliteitsvol ingericht worden. Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Als onderdeel van deze Blue Deal wordt ingezet op een groot investeringsprogramma om natte natuur in Vlaanderen te herstellen. De afgelopen decenniajaar verloor Vlaanderen 75 procent van zijn natte natuur. Van de 244.000 hectare natte natuur die er rond de jaren 1950 nog was, blijft nu maar 68.000 hectare over, waarbij de kwaliteit van deze natuur wisselvallig van aard is. Via het investeringsprogramma in wetlands en valleigebieden zal deze natte natuur hersteld en versterkt worden.

Wetlands zijn nuttige gebieden in de strijd tegen overstromingen en droogte. Ze zorgen voor een grotere wateropvangcapaciteit en tragere afvoer waardoor het risico op wateroverlast verkleint. Extra natte natuur creëren is een van de beste manieren om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk meer natuurlijke buffers te hebben tegen hevige regenval. Daarnaast slaan wetlands koolstof op en zorgen ze zo voor de reductie van broeikasgassen. Wetlands zorgen tenslotte ook voor verkoeling.

PROJECTOMSCHRIJVING

Het investeringsprogramma bestaat uit het realiseren van verscheidene natuurprojecten door het Agentschap Natuur en Bos via aankopen en inrichtingswerken voor een bedrag van 70 miljoen euro. Daarnaast wordt er voor derden een oproep gelanceerd voor specifieke aankoop- en investeringssubsidies in het kader van natte natuur voor een bedrag van 30 miljoen euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	100.000.000 EUR
Output	Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Vernatten van gebieden • Verhoogde bescherming van waardevolle bodems • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Realiseren van groenblauwe verbindingen • Verbeterde hydromorfologie • Meer biodiversiteit • Verhoogde koolstofopslag in de bodem • Vertraagder afvoer van water
Beoogde impact	Grondwaterstand

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het project omvat:</p> <p>1. Het verwerven of inrichtingen van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos op eigen terreinen of kaderend binnen een bestaande samenwerking. Op basis van aantal criteria zullen projecten uitgevoerd worden rond herstel en inrichting van (gedegradeerde) wetlands. De projecten worden geselecteerd op basis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bijdrage aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen; - Opname in stroomgebiedbeheerplan ; - Waterconservering – bijdrage van project aan vasthouden, vertraging afvoer water ; - Bevorderen van infiltratie – wanneer expliciet het bevorderen van infiltratie wordt beoogd; - Verbetering van de waterkwaliteit; - Ecohydrologisch herstel – actieve grondwaterpeilverhoging; - Structuurherstel grachten en waterlopen; <p>Op basis van deze aanpak worden lopende projecten versneld gerealiseerd (bvb. gebiedsgericht projecten in valleien zoals Kleine Nete, IJzervallei, Zennevallei, ...) of wordt de achterstand in uitvoering ingehaald (bvb. Sigmaplan, Demervallei, ...) of waar mogelijk worden opportuniteiten benut met het oog op snelle</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>realisatie.</p> <p>De verschillende in te richten natuurgebieden doorlopen allen dezelfde fasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waar nodig worden gronden verworven of in een aantal gevallen geruimd i.s.m. met de Vlaamse Landmaatschappij; - Diverse studies of al of niet wettelijk verplichte plannen worden opgemaakt om de ecohydrologische toestand en de in te richten werken te bepalen en disproportionele gevolgen voor de omgeving te voorkomen; - De noodzakelijke werken voor effectieve realisatie van natte natuur op terrein, worden aanbesteed. <p>De uitvoering is lopende waarbij de aanbestedingen voor inrichtingswerken stelselmatig worden opgestart. Verder hangt de realisatie mbt verwerving sterk af van de opportuniteiten die zich voordoen op het terrein.</p> <p>2. Subsidiëren van derden voor de creatie van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos voor inrichtingswerken en grondverwervingen.</p> <p>Naast de realisatie van projecten in eigen beheer worden ook derden aangemoedigd om bij te dragen aan bijkomende natte natuur in Vlaanderen. Er worden aankoopsubsidies verleend voor de verwerving van gronden van die projecten die voldoen aan het natuurbeheerplan type 4, zijnde de meest ambitieuze typologie met de hoogste ecologische waarden in Vlaanderen. Naast deze aankoopsubsidies worden ook voor inrichtingswerken subsidies verleend aan derden via een oproep die in januari 2021 is gelanceerd en waarvan de projecten zijn ingediend. De selectie zal eind 2021 worden goedgekeurd. Deze oproep wordt opnieuw in januari 2022 gelanceerd. Het te bepalen subsidiabel bedrag wordt gebenchmarkt aan normkosten voor gelijkaardige inrichtingswerken.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2021	2021 Q1	Gerealiseerd
Goedkeuring VR wijziging subsidiebesluit inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur (Blue deal)	2021 Q3	Gerealiseerd
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2021	2021 Q4	Op schema
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2022	2022 Q1	Nog niet gestart

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2022		2022 Q3	Nog niet gestart	
Alle noodzakelijke verwervingen van gronden zijn gerealiseerd		2022 Q3	Op schema	
Toekenning aankoopsubsidies aan derden voor gronden ter realisatie van projecten natte natuur		2022 Q4	Op schema	
Uitbesteding van de noodzakelijke studies ter voorbereiding van de inrichtingswerken en uitbesteding van de inrichtingswerken		2022 Q4	Op schema	
Uitvoering inrichtingswerken		2024 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal - projecten in regie van ANB		2026 Q2	250	
Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal - projecten derden		2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	20.787.000 EUR
Uitvoering VEK	14.198.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 94.400.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 18 december 2020 - Projectsubsidies voor lokale hefboomprojecten 'Natte Natuur' in kader van gebiedsontwikkeling

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur](#)

[Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur](#)

[Advies Minaraad over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur](#)

VR 23 april 2021 Plan Vlaamse Veerkracht: projectlijnen die invulling geven aan relanceprojecten Omgeving in het kader van de Blue Deal

[VR 2021 3004 VV DOC.0041-1 Geïntegreerd natuurbeheer - notaBIS](#)

[VR 2021 3004 VV DOC.0041-2 Geïntegreerd natuurbeheer - BVRBIS](#)

VR 16 juli 2021 wijziging subsidiebesluit inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur (Blue deal)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-1 Geïntegreerd Natuurbeheer - nota](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-5 Geïntegreerd Natuurbeheer - advies](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-2 Geïntegreerd Natuurbeheer - BVRBIS](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-6 Geïntegreerd Natuurbeheer - advies](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

07. Investerings in verkeersveilige wegen

VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer - De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Lokale besturen; Farys; bedrijven; weggebruikers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Met de aanpak van deze kunstbouwwerken is het doel om de kunstwerken in slechte staat te herstellen/te vervangen en zo de mobiliteit/verkeersveiligheid van personen en goederenvervoer te garanderen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	100.000.000 EUR
Output	Herstelde of vervangen kunstwerken.
Outcome	Verlengen levensduur van het patrimonium kunstwerken.
Beoogde impact	Voertuigverliesuren - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) - Aantal verkeersongevallen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	- De sanering van het viaduct in Gentbrugge (fase 2) wordt afgerond. De renovatie van het viaduct Boorseme start in januari 2022.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<ul style="list-style-type: none"> - De renovatie van de Wijngaardbrug (Geraardsbergen) en de herbouw van de Meulestedebrug (Gent) zijn in uitvoering. - Voor 3 projecten is de aanbestedingsprocedure doorlopen en starten de werken in het 1e kwartaal van 2022 (Herstel van de Nieuwe Kalebrug, de Tolhuisstuwbrug en de Verapazbrug in Gent. - Er is een kleine vertraging te melden in de afronding van de aanbestedingsprocedure van 4 projecten, maar de vooropgestelde planning van deze projecten komt niet in gedrang. - 8 projecten bevinden zich momenteel in studiefase, ook dit is volgens planning.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Herbouw Meulestedebrug Gent	2021 Q4	Op schema	
Herbouw Tolpoortbrug te Deinze	2021 Q4	Op schema	
Sanering viaduct van Gentbrugge (fase 2)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Renovatie Tuchthuisbrug te Vilvoorde	2021 Q4	Op schema	
Renovatie viaduct van Boorseme	2022 Q2	Op schema	
Herbouw Spanjeveerbrug Mendonk	2022 Q4	Op schema	
Renovatie Tolhuisstuwbrug Gent	2022 Q4	Op schema	
Herbouw Waasmunsterbrug (incl. jaagpad & fietstunnel)	2022 Q4	Vertraging	
Herbouw Krommewalbrug te Gent	2022 Q4	Op schema	
Opwaardering kanaal Roeselare-Leie: Lysbrug	2022 Q4	Op schema	
Vervangen opleggingen Drongenbrug W4 over de Ringvaart te Gent	2022 Q4	Vertraging	
Herbouw Leiebrug te Kortrijk	2022 Q4	Op schema	
Renovatie voetgangersbrug over sluis 11 te Kortrijk	2022 Q4	Op schema	
Renovatie Wijngaardbrug te Geraardsbergen	2022 Q4	Op schema	
Bouw Verapazbrug te Gent & herbouw kaaimuur	2022 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16) te Gent	2022 Q4	Op schema
Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai te Gent	2023 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	52.837.000 EUR
Uitvoering VEK	23.921.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 100.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	(zwakke) weggebruikers, politiediensten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investeren in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen zet de Vlaamse Overheid maximaal in op de verkeersveilige (her)inrichting van haar fietspaden, wegen en kruispunten. Sinds 2018 wordt er daarom ingezet op de dynamische lijst van gevaarlijke punten. Bij de berekening van gevaarlijke punten wordt telkens de laatste drie jaar aan beschikbare ongevalldata gebruikt, waarbij een gewicht wordt gegeven aan elke lichtgewonde (1), zwaargewonde (3) en dodelijke gewonde (5) weggebruiker. Bovendien wordt sinds 2019 een extra gewicht gegeven aan elke zwakke weggebruiker (factor 1,7).

Om gevaarlijke punten snel aan te pakken wordt waar mogelijk overgegaan tot het uitvoeren van kleine ingrepen, quick wins. Dit zijn ingrepen die op korte termijn en met beperkte middelen, de verkeersveiligheid ter plaatse kunnen verbeteren. Om zicht te krijgen op de best passende maatregel wordt eerst een grondig onderzoek uitgevoerd, dat voor een deel van de punten door een extern studie bureau wordt uitgevoerd.

Het wegwerken van gevaarlijke punten kan bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van de lichtenregeling, het verbeteren van de markering, het verbeteren van de zichtbaarheid, het plaatsen van handhaving, enz. Op een deel van de punten volstaan deze kleinere ingrepen om de verkeersveiligheidsproblemen weg te werken. Op een ander deel betreft dit een tussentijdse oplossing en zijn meer uitgebreide maatregelen nodig. Deze uitgebreide maatregelen omvatten de herinrichting van (een deel van) het kruispunt.

In de aanpak van de gevaarlijke punten wordt prioritair ingezet op punten in de buurt van een school, lichtengeregelde punten en overige punten waar zwakke weggebruikers betrokken waren.

MIA staat voor Mobiliteit Innovatief aanpakken. Met MIA wil men komaf maken met ingewikkelde procedures en lange doorlooptijden die de aanpak en uitvoering van infrastructurele werken of quick wins verhinderen of vertragen. Daarnaast beoogt MIA een vlotte samenwerking met vervoerregio's, provincies, gemeenten, burgers, wetenschappers en deskundigen.

PROJECTOMSCHRIJVING

Op de Vlaamse regering van 3 september 2021 werd het ontwerp van bekrachtigingsdecreet van MIA -in infrastructuurwerken definitief goedgekeurd. Met dit ontwerp van bekrachtigingsdecreet wordt het BVR tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur definitief geregeld. Op die manier wil men zorgen voor snellere uitvoering van tal van verkeersveiligheidsmaatregelen en ingrepen in onze weginfrastructuur. MIA is een andere bestuursproces met nadruk op een proactieve aanpak, eenvoudige procedures en inspraak.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	50.000.000 EUR
Output	Het aantal gevaarlijke punten waar een ingreep werd uitgevoerd.
Outcome	Het verhogen van de verkeersveiligheid door het gevaar te verminderen voor de (zwakke) weggebruiker.
Beoogde impact	Aantal dodelijke verkeersslachtoffers - Aantal verkeersongevallen - Aandeel auto in modale verdeling verplaatsingen - Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO ₂ -equivalent) - Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De verschillende deelprojecten lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de aanleg van een wisselaar met de A19 aan de R8 Kortrijk West werd het dossier gegund en wordt de start van de werken voorbereid. - Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA): Het proefproject wegen Oost en West-Vlaanderen werd gegund en is gestart. Het proefproject wegen Limburg werd ook gegund. - Er loopt een studiefase voor het aanpakken van de overige gevaarlijke punten die geselecteerd werden voor Relance-investeringen. <p>De voorziene ingrepen betreffen onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het conflictvrij maken van kruispunten, - infrastructuuringrepen aan kruispunten, - het aanleggen van middeneilanden, - het aanpassen van de lichtenregeling, - het aanpassen van signalisatie, - het voorzien van circulatiemaatregelen, - ...

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	14 ingrepen zijn reeds uitgevoerd. 2 werken zijn op dit moment in uitvoering en voor 4 ingrepen werd de uitvoering ingepland of gebeurt dit op korte termijn. De overige ingrepen worden binnenkort aanbesteed.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Gevaarlijke punten uit dynamische lijst		2024 Q4	Op schema	
Proefproject wegen Oost-West Vlaanderen (MIA)		2024 Q4	Op schema	
Proefproject wegen Limburg (MIA)		2024 Q4	Op schema	
Aanpak gevaarlijke punten		2024 Q4	Op schema	
R8 Kortrijk West: aanleg wisselaar met de A19		2024 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal weggewerkte gevaarlijke punten	+80	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	35.386.000 EUR
Uitvoering VEK	396.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 50.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[BVR van 28 mei 2021 tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	Lokale besturen, inwoners, weggebruikers, scholen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Een veilige route van huis naar school is essentieel voor schoolgaande kinderen. Wanneer ouders de route niet veilig vinden, kiezen ze vaker voor de auto om hun kinderen naar school te brengen. Via investeringen langs gewestwegen en subsidies voor veilige schoolroutes kunnen ingrepen langs lokale wegen plaatsvinden om de schoolroutes veiliger te maken. Momenteel wordt de helft van het voorziene budget indicatief voorzien voor investeringen langs gewestwegen, de andere helft wordt indicatief via subsidies toegekend aan lokale besturen, voor investeringen op gemeentewegen. Kinderen zijn de ideale fietsambassadeurs om de modal en mental shift naar meer duurzame verplaatsingen mee te realiseren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	30.000.000 EUR
Output	Aanpassingen aan infrastructuur op schoolroutes
Outcome	Veiligere en vlottere schoolroutes voor fietsers/voetgangers, een stijging in het aantal actieve verplaatsingen naar school met de fiets/te voet.
Beoogde impact	Aantal dodelijke verkeersslachtoffers - Aantal verkeersongevallen - Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Voor de subsidies Veilige Schoolroutes op gemeentewegen werden de stukken door de Vlaamse Regering goedgekeurd waardoor een subsidiecall voor lokale besturen loopt tot in 2022. Tot op heden dienden 40 gemeenten een aanvraag in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor het aanpassen of inrichten van 67 schoolroutes. 37 aanvragen werden goedgekeurd (3 waren onontvankelijk) voor meer dan 200 ingrepen. De meest aangevraagde werkzaamheden zijn werken aan het voetpad, de afbakening van een fietsstraat, het zetten van verkeersborden (zone 30), de aanleg van een fietssuggestiestrook, oversteekplaats, aan- of vrijliggend fietspad. Voor 32 van deze aanvragen zijn de werken reeds gestart.</p> <p>Voor de uitvoering van ingrepen langs gewestwegen in functie van het veiliger maken van de schoolroutes werden door het Agentschap Wegen en Verkeer 875 knelpunten langs schoolroutes geïnventariseerd op basis van aanmeldingen door 194 gemeenten. De uitvoering van ingrepen op diverse locaties is reeds gestart op basis van bestaande raamcontracten. Op de VR van 26 november 2021 werd het dossier geagendeerd voor de gunning van een specifiek raamcontract voor de aanpak van deze knelpunten.</p> <p>De vaakst voorkomende gevraagde aanpassingen betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aanpassingen aan oversteekvoorzieningen, • markeringswerken, • kleine infrastructuurwerken, • aanpassingen aan lichtregelingen, • vernieuwing van fietspaden, • ... <p>De selectie van de knelpunten die weerhouden worden op basis van de relance-investeringen loopt nog. Vervolgens zullen de werken ingepland en uitgevoerd worden.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Opmaak Regelgeving - Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen	2021 Q1	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Bevraging steden en gemeenten over knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen		2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekennen Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen aan lokale besturen		2022 Q4	Op schema	
Investeren in het veiliger maken van knelpunten langs gewestwegen op basis van de geïnventariseerde knelpunten van Vlaamse steden en gemeenten.		2024 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde subsidieaanvragen lokale besturen		2022 Q4	37	
Aantal ingrepen op knelpunten op gewestwegen		2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	14.752.000 EUR
Uitvoering VEK	3.125.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 30.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage
BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - nota](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - advies Raad van State](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Via de versnelling van verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch verkeersmanagement is het doel een betere en veiligere doorstroom te bewerkstelligen. Door de verkeerslichtenbeïnvloeding kan de fietsveiligheid verbeterd worden en wordt het gebruik van de fiets voor zowel functioneel als recreatief gebruik gestimuleerd. Zo draagt dit initiatief bij tot de modal shift en verhoogt het aandeel van duurzame transportmodi in Vlaanderen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	20.000.000 EUR
Output	Realisatie van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's)
Outcome	Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie
Beoogde impact	Aantal verkeersongevallen - Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Voertuigverliesuren - Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De diverse initiatieven lopen volgens planning. - Voor het dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve) intelligente transport systemen (Mobilidata) zijn 2 werken uitgevoerd, 10 in uitvoering en worden 11 ingrepen voorbereid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>- In het kader van het actieplan verkeerslichten zijn 6 werken uitgevoerd, 9 in uitvoering en worden 68 ingrepen ingepland.</p> <p>- Ten behoeve van een vlottere doorstroom van het openbaar vervoer werden 2 ingrepen aan verkeerslichten met beïnvloeding uitgevoerd. 6 werken zijn in uitvoering. Dit draagt bij tot een verminderd risico voor 8 gevaarlijke punten. 7 gevaarlijke punten worden via deze ingrepen geheel en 1 gedeeltelijk conflictvrij gemaakt.</p> <p>- Het dynamisch verkeersmanagement (verkeerslichtencoördinatie / langs autosnelwegen) is op schema.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Dynamisch verkeersmanagement langs autosnelwegen - Structureel onderhoud	2022 Q2	Op schema		
Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie (verkeerslichtencoördinatie Antwerpen)	2022 Q4	Op schema		
Dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve) Intelligente Transport Systemen	2023 Q4	Op schema		
Actieplan Verkeerslichten	2023 Q4	Op schema		
Plaatsen van verkeerslichten met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer en/of aanpassen van bestaande installaties met het oog op verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's)	150	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	13.559.000 EUR
Uitvoering VEK	34.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

08. Modal shift naar water

VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om de steile opgang van het containervervoer blijvend te stimuleren wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal. Zo wordt bijgedragen aan de modal shift en wordt maximaal ingespeeld op het verschuiven van het goederenvervoer over de weg naar vervoer over water.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	96.000.000 EUR
Output	Verhogen en/of aanpassen van 7 bruggen ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal.
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water.
Beoogde impact	Evolutie tonkilometers binnenvaart - Filezwaarte op de Vlaamse snelwegen - Verzadigingsgraad Vlaamse snelwegen - Diepgangbeperking op bevaarbare waterlopen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO ₂ -equivalent)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De verschillende projectonderdelen verlopen volgens planning.</p> <p>- De werken aan de Theunisbrug, Hoogmolenbrug en de spoorbrug in Genk zijn in uitvoering.</p> <p>- In het najaar van 2021 werden de aanbestedingen van de overige 5 projecten afgerond. Het betreft de spoorbrug van Herentals, wegbrug Turnhoutsebaan in Wijnegem, de verhoging van de brug 'Kempische poort' in Hasselt, de heraanleg omgeving rond de Hoogmolenbrug. De werken op het terrein starten voor deze projecten in het 1e of 2e kwartaal van 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Herbouw spoorbrug Genk (BR12)	2021 Q4	Op schema		
Vernieuwen oevers tussen Hoogmolenbrug en brug van den Azijn	2022 Q4	Op schema		
Herbouw Hoogmolenbrug te Schoten (BR54)	2022 Q4	Op schema		
Verhogen wegbrug Kempische poort (N74) Hasselt (BR17)	2023 Q4	Op schema		
LO - afvoeren grondoverschotten kanaalverbreding Theunisbrug	2023 Q4	Op schema		
Herbouw spoorbrug Herentals (BR44)	2024 Q4	Op schema		
Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) & Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) – fietsbrug	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Verhogen en/of aanpassen van 7 bruggen ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal	7	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	96.000.000 EUR
Uitvoering VAK	87.643.000 EUR
Uitvoering VEK	4.497.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 96.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Bedrijven, binnenvaartondernemers, verladers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De focus van het investeringsbeleid voor goederenvervoer ligt op het realiseren van een modal shift van de weg naar de binnenvaart. Ondernemingen en logistieke spelers moeten er nog meer van overtuigd worden dat de binnenvaart een volwaardige, complementaire transportmodus is.

Een van de doelstellingen hierin voor de modal shift goederenvervoer is het realiseren van een verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers in het goederenvervoer van de weg naar de alternatieve vervoersmodi waterweg of spoorwegnet.

Watergebonden bedrijventerreinen worden daarom verder uitgerust met, waar mogelijk gemeenschappelijke, kaaimuren. De PPS-formule voor de bouw van kaaimuren wordt blijvend gehanteerd om nieuwe klanten toegang te verlenen tot de waterweg, maar ook om bestaande klanten op het water te houden en hun watergebonden trafieken te kunnen vergroten. Het relanceplan maakt een versnelde realisatie van kaaimuurprojecten mogelijk.

Dit project voorziet in de realisatie van nieuwe kaaimuurprojecten alsook in renovaties van kaaimuren op het Kanaal Roeselare-Leie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	20.000.000 EUR
Output	Realisatie van nieuwe en optimalisatie van bestaande kaaimuren.
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water.
Beoogde impact	Evolutie tonkilometers binnenvaart - Filezwaarte op de Vlaamse snelwegen - Verzendingsgraad Vlaamse snelwegen - Diepgangbeperking op bevaarbare waterlopen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO ₂ -equivalent)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De uitvoering van het kaaimuurproject Kenaka (Geel) werd afgerond in het najaar van 2021.</p> <p>De aanbestedingsprocedure voor het kaaimuurproject Rumst Recycling (Rumst) werd doorlopen.</p> <p>Er is een vertraging te melden bij de afronding van de aanbestedingsfase van 7 projecten. Voor 5 projecten zal de procedure pas in januari 2022 afgerond zijn terwijl dit voorzien was voor december 2021. De vooropgestelde uitvoeringsplanning van de projecten komt echter niet in gedrang.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Bouwen van laad- en losinstallaties	2023 Q4	Vertraging		
Herstellen verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie & Herstellen kaaimuren kanaal Roeselare-Leie	2023 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gebouwde en herstelde laad- en losinstallaties		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.049.000 EUR
Uitvoering VEK	179.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

**VV043 - MODAL SHIFT NAAR WATER - OPSTART DENDER (VERHOGING
WATERTRANSPORTCAPACITEIT)**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Dender is een bevaarbare waterweg, met als zwaartepunt voor de beroepsvaart het gedeelte tussen Aalst en de tijsluis in Dendermonde. Op heden is dit gedeelte bevaarbaar voor schepen klasse II.</p> <p>Een opwaardering naar klasse IV (1350 ton) tussen Dendermonde en de Ringbrug te Aalst zal de kans op het effectief realiseren van de aanwezige potenties vergroten en het wegverkeer richting Antwerpen en Gent ontlasten. Hiertoe zijn aanpassingswerken noodzakelijk in het pand Dendermonde – Aalst en dient een klasse IV-sluis gebouwd te worden te Denderbelle.</p> <p>De opwaardering van de Dender zal in 2 fasen worden uitgevoerd: fase 1 omvat de vernieuwing van het stuwsluiscapex in Denderbelle, fase 2 omvat de aanpassingswerken aan de waterloop. In het kader van de opwaardering van de Dender worden extra middelen (21 miljoen euro) uit relance-budgetten ingezet voor de uitvoering van fase 1 van de Opwaardering van de Dender. Naast het economisch potentieel van de Dender worden met de vernieuwing van het stuwsluiscapex in Denderbelle ook nog een aantal andere doelstellingen gerealiseerd: aanpak van het vismigratieknelpunt, aanpak van de waterbeheersing (ontdubbeling van de stuw), implementatie van de afstandsbediening.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	21.000.000 EUR
Output	Vernieuwing stuwsluiscapex (Denderbelle)
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water, verbeteren waterbeheersing, optimalisatie vismigratie

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Evolutie tonkilometers binnenvaart - Filezwaarte op de Vlaamse snelwegen - Verzadigingsgraad Vlaamse snelwegen - Diepgangbeperking op bevaarbare waterlopen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De voorbereidende studie voor het uitvoeren van de werken voor de opwaardering van de Dender (afwaarts Aalst) - fase 1 verloopt volgens planning. In een volgende fase wordt het aanbestedingsdossier voor de werken voorbereid. De uitvoering van het project is gepland in 2022 en volgende jaren.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Opwaardering Dender afwaarts Aalst op 1350 ton / Opwaardering Dender afwaarts Aalst op 1350 ton - fase 1	2024 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	21.000.000 EUR
Uitvoering VAK	391.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 21.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV044 - ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	MBZ, havengebonden bedrijven, bewoners, AWW, De Lijn, Stad Brugge

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De onteigeningen in Zeebrugge zijn noodzakelijk om te kunnen starten met het realiseren van een 'Nieuwe Zeesluis in Zeebrugge'. Een initiatief om het goederenvervoer over water maximaal te blijven versterken. Het totaalproject waarvoor deze onteigeningen dienen plaats te vinden bestaat uit drie delen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. We realiseren een nieuwe zeesluis als volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. 2. Om het lokaal verkeer en het havenverkeer van elkaar te scheiden, komt er een nieuwe verbindingsweg, de 'Nx'. 3. Het project biedt ook kansen voor de leefbaarheid in Zeebrugge. 	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	27.000.000 EUR
Output	Verwerven van een aantal bedrijfsgronden gelegen binnen de projectzone van het project Nieuwe Sluis Zeebrugge.
Outcome	Herlocaliseren bedrijven in functie van de bouw van de nieuwe sluis en tunnel.
Beoogde impact	Evolutie tonkilometers binnenvaart - Aantal verkeersongevallen - Filezwaarte op de Vlaamse snelwegen - Verzadigingsgraad Vlaamse snelwegen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent) - Voertuigverliesuren

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De diverse onteigeningen worden voorbereid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met 3 bedrijven werd een mondeling akkoord bereikt. Voor 2 van de 3 bedrijven zullen de aktes begin januari 2022 verleden worden. De derde akte zal later in Q1 2022 verleden worden omwille van een langer dan voorzien durend bodemonderzoek. - De onderhandelingen met geïmpacteerde bedrijven gaan onverminderd verder. Dit zal in de loop van 2022 in bijkomende akten resulteren.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Onteigeningen nieuwe sluis Zeebrugge		2022 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal onteigeningen		2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

09. Welzijnsinfrastructuur

VV045 - INZETTEN OP KWALITEIT EN GOOD GOVERNANCE VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	Woonzorgvoorzieningen erkend door de Vlaamse overheid, personeel in dienst van deze voorzieningen, de gebruikers en bewoners van deze voorzieningen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	09. Welzijnsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het versterken van de zorg en levenskwaliteit voor zorgbehoevende ouderen in de woonzorg. Het project zal bestaan uit verschillende deelprojecten:</p> <p>- Deelproject "VIA6": Om de gestegen zorgzwaarte en werkdruk in de ouderenzorg op te vangen en de kwaliteit van zorg te versterken werd in punt 2. van deel III van het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 afgesproken om maximaal in te zetten op bijkomende tewerkstelling. Er werd 146 miljoen euro beschikbaar gesteld om de gefinancierde personeelsnormen te versterken en/of op te trekken, wat leidt tot bijkomende personeelsinzet. Daarmee wordt ook de ongelijkheid in financiering van bewoners met eenzelfde zorgprofiel opgeheven.</p> <p>Concreet worden m.i.v. 1/7/2021 tot en met 31/12/2022 woonzorgcentra en centra voor kortverblijf bijkomend gefinancierd via specifieke voorziene delen V1 en V2 in de basistegemoetkoming voor zorg (BTZ) die men per dag en per gebruiker mag factureren aan de zorgkassen. Vanaf de BTZ geldig vanaf 1/1/2023 wordt de BTZ berekend op basis van hogere personeelsnormen in de referentieperiode (1/7/2021-30/6/2022). Dat betekent dat deze voorzieningen m.i.v. 1 juli 2021 ook hogere financieringsnormen inzake personeel moeten nastreven om ook vanaf 1 januari 2023 de maximale basistegemoetkoming voor zorg te kunnen factureren.</p> <p>Vanuit de relanceprovisie (vv045) wordt 11.053 keuro ingezet (2021) en 39.514 keuro ingezet (2022) in het totaalbudget van 146 miljoen euro. Daarmee werd een deel van de relancemiddelen</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

toegevoegd aan de reguliere middelen.

- Deelproject "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)":

In het kader van de COVID-19-crisis werd van 1/4/2021-30/9/2021 voorzien in een tijdelijke maatregel waarbij woonzorgcentra, al dan niet met bijhorende centrum voor kortverblijf, extra personeel konden inschakelen om de COVID-19-crisis aan te pakken. De voorzieningen ontvingen daarvoor een specifieke compensatie als ze de gegevens over het extra ingezet personeel meedeelde in het eLoket van Zorg en Gezondheid. 13.377 keuro van de in totaal voorziene 18.471 keuro werd ingezet vanuit de relanceprovisie. Een deel van de relancemiddelen (13.377 keuro) werd hiervoor dus toegevoegd aan andere middelen.

- Deelproject "Ventilatieplan": in administratieve opstart

- Deelproject "VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra": in administratieve opstart. Budget 1.100 keuro relancemiddelen.

- Deelproject "BelRAI-opleidingen": Conform het regeerakkoord worden de komende jaren verschillende BelRAI-instrumenten uitgerold in Vlaanderen: BelRAI Screener op 1 juni 2021, Sociaal supplement op 1 juni 2022, BelRAI Home Care op 1 juni 2023 en BelRAI Long-term-Care Facilities op 1 juni 2023. Binnen dit deelproject wordt voorzien in een subsidie om door de opleiding van personeel als BelRAI-trainer en als BelRAI-indicatiesteller binnen de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, dagverzorgingscentra en de verschillende thuiszorgdiensten het kwaliteitsvol gebruik van deze instrumenten mogelijk te maken. Er wordt voorts ook een subsidie toegekend aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek om BelRAI-experten op te leiden om de opleidingscapaciteit op het terrein te verhogen. Het deelproject draagt hierdoor bij aan de doelstelling tot correct leren gebruiken van BelRAI als inschalings- en zorgplanningsinstrument met een positief effect op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de woonzorg.

Budget relance: 10.015 keuro van de in totaal 12.108keuro voor dit deelproject werd ingezet vanuit de relanceprovisie. Een deel van de relancemiddelen (10.015 keuro) werd hiervoor toegevoegd aan andere middelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	138.250.000 EUR
Output	<p>Deelproject "VIA6": Aanwerving extra VTE personeel / verhoging inzet bestaand personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf</p> <p>Deelproject "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": Tijdelijk inschakelen extra VTE personeel ikv COVID-19-crisis in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf</p> <p>Deelproject "BelRAI-opleidingen": De opleiding van indicatiestellers en trainers binnen de betrokken ouderen- en thuiszorgvoorzieningen.</p>
Outcome	<p>Deelproject VIA6: Een verhoging van het aantal voltijds equivalenten ingezet personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf</p> <p>Deelproject "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": Een tijdelijke verhoging van het</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	<p>aantal VTE ingezet personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf i.h.k.v. de COVID-19-crisis</p> <p>Deelproject BelRAI-opleidingen: Implementatie van de instrumenten BelRAI Screener, Sociaal Supplement, Home care en LTCF volgens het voorziene tijdsplan (t.e.m. 1/6/2023)</p>
Beoogde impact	Tewerkstelling (werknemers / VTE)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> - Deelproject "VIA6": Gerealiseerd. BVR van 16/7/2021 voorziet in de input van de extra financiering aan woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf. Uit de rapportering blijken er voldoende extra VTE ingeschakeld te zullen worden - Deelproject "extra personeelsinzet": gerealiseerd - Deelproject "Ventilatieplan": in administratieve opstart - Deelproject "VIKZ" - tevredenheidsmeting woonzorgcentra: in administratieve opstart. - Deelproject "BelRAI": Subsidiebesluit door Vlaamse Regering goedgekeurd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Deelproject VIA6: Uitvoering VIA 6 maatregelen kwaliteit ouderenzorg	2021 Q3	Gerealiseerd
Deelproject extra personeelsinzet wzc (covid-19): goedkeuring besluit covid-maatregelen	2021 Q3	Gerealiseerd
Deelproject extra personeelsinzet wzc (covid-19): uitbetalen compensaties voor de inzet van extra personeel	2021 Q4	Gerealiseerd
Deelproject BelRAI-opleidingen - subsidie aan voorzieningen voor opleidingsbeleid	2021 Q4	Op schema

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bijkomende tewerkstelling per woonzorgcentrum. De geplande aantallen VTE aanwerving en uitbreiding én de aanwervingsdata van de bijkomende personeelsleden worden doorgegeven tegen eind oktober 2021 via het Vlaams e-loket (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).	2.264 (VIA6-akkoord)	2021 Q4	2.660,4	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	138.250.000 EUR
Uitvoering VAK	9.211.000 EUR
Uitvoering VEK	9.211.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 138.250.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Deelproject "VIA6": Vlaams intersectoraal akkoord (VIA6): wijziging uitvoeringsbesluit Vlaamse sociale bescherming wat VIA6-maatregelen kwaliteit ouderenzorg betreft
Deelproject "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 april 2021
Deelproject "BelRAI opleidingen": Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidie opleidingen BelRAI-instrumenten

VV046 - OPTREKKEN STRATEGISCHE FORFAITS ZIEKENHUIZEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Zorgnetlcuro en betrokken ziekenhuizen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	09. Welzijnsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Het strategisch forfait is gelinkt aan een infrastructuurinvestering die past binnen een zorgstrategisch kader voor Vlaanderen. Elke investering die raakt aan de zorgstrategische planning dient goedgekeurd te worden door de Vlaamse overheid en moet in overeenstemming zijn met de zorgstrategische planning zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. Het zorgstrategische kader zal dus in principe de basis vormen voor de toekenning van het strategisch forfait. In afwachting van de goedkeuring van de zorgstrategische plannen op regionaal niveau en de individuele zorgstrategische plannen op ziekenhuisniveau kan de Vlaamse Regering echter strategische forfaits toekennen aan dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	10.000.000 EUR
Output	Voor de ziekenhuissector worden extra strategische forfaits ingezet/uitbetaald gekoppeld aan de vernieuwing van het gebouwpatrimonium. In totaal voor 35,052 mio euro (waarvan 10 mio euro uit het Relanceplan).
Outcome	Op korte termijn kunnen de bouwwerken voor of aan de ziekenhuisinfrastructuur worden opgestart.
Beoogde impact	Aantal nieuw gebouwde of volledige vernieuwde m ² ziekenhuisinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	In respectievelijk juli en november besliste de VR reeds over dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen. In januari zal de VR terug beslissen over een aantal dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen.
Noodzakelijke politieke actie	Bespreking op de VR aangaande dringende of onafwendbare investeringen in 12 ziekenhuizen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING		STATUS	
beslissing VR	2021 Q2		Gerealiseerd	
Beslissing VR	2021 Q4		Gerealiseerd	
Beslissing VR	2022 Q1		Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	16.789.154,90	2021 Q2	16.789.154,9	100 %
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	4.280.729,38	2021 Q4	4.280.729,38	100 %
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	13.982.293,66 euro	2022 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen. Beslissing VR 16/07/2021](#)

[Beslissing van de VR op 26/11/2021 aangaande de goedkeuring van dringende of onafwendbare investeringen in 2 ziekenhuizen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

10. Waterstofonderzoek

VV047 - WATERSTOFONDERZOEK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Belanghebbenden	De portfolio richt zich op bedrijven als begunstigden van steun. Dit omvat zowel grote ondernemingen als kmo's. De portfolio beoogt evenwel een ruime impact op het ecosysteem die verder gaat dan individuele bedrijfsvalorisatie. Dit wordt expliciet opgenomen in de criteria, met een voorkeur voor projecten met impact op het ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn. Ook samenwerking met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren wordt hier in rekening genomen. De concrete invulling van impact op het ecosysteem en spill overs kan variëren, per project. Deze zullen later evenwel opgenomen worden als voorwaarden in de subsidietoekenningen zoals ook gebeurd is bij de deelname aan IPCEI-batterijen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	10. Waterstofonderzoek
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Waterstof is een belangrijke component in de transitie naar een klimaatneutrale energie. Waterstof is een energiedrager die kan gebruikt worden voor opslag van energie uit hernieuwbare bronnen maar heeft diverse toepassingen, zoals het gebruik in de industriële processen en aanwending voor transport. Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een cruciale uitdaging. In de waterstofstrategie van de EU wordt uitgegaan van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt de uitbouw van waterstofproductie, maar ook de uitbouw van een waardeketen om transport en gebruik van waterstof en transitie van de industrie in het algemeen mogelijk te maken.</p> <p>Projectdoelstellingen :</p> <p>Met het huidige project beoogt de Vlaamse regering een ondersteuning van de transitie naar een duurzame waterstofindustrie in Vlaanderen via investeringen en projectfinanciering. Met deze portfolio beoogt de Vlaamse regering de uitbouw van een waardeketen in Vlaanderen te</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

stimuleren die ingebed is in een lange termijn doelstelling van vergroening van de industrie en bijdraagt tot de transitie van de industrie waarbij ingespeeld wordt de evolutie naar een meer klimaatneutrale industrie.

Het project omvat voor een grootste deel een portfolio die ingebed is in de belangrijke projecten van algemeen Europees belang (Important Projects Common European Interest-IPCEI). Hiermee beoogt de Vlaamse regering aansluiting bij ruimere Europese waardeketens om via die weg de competitiviteit en duurzaamheid van de beoogde transitie te ondersteunen. Waar de IPCEI-portfolio zich vooral richt op de uitbouw van een industriële waardeketen naar productie, transport, stockage en toepassingen van waterstof zal er binnen het project ook aandacht geschonken worden aan import van waterstof. De eigen productie nooit zal immers nooit kunnen voldoen aan de vraag zodat import vereist zal zijn om een stabiel en betaalbaar aanbod te waarborgen om continuïteit in de toepassingen te kunnen garanderen.

Uitvoering van het project:

Het project wordt gerealiseerd door investeringen en projectfinanciering bij bedrijven waarbij aangesloten wordt bij het Europese initiatief over Important Projects of Common European Interest (IPCEI). De focus ligt op projecten met een doorbraakkarakter en duidelijke ambitie met voorrang aan projecten met een bijdrage aan een innovatieve component. Projecten moeten een duidelijke impact hebben op het Vlaamse ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn.

Buiten de IPCEI-portfolio zullen ook additionele projecten met een focus op waterstof beschouwd worden. Dit kunnen O&O&I- of investeringsprojecten zijn die geen nood hebben aan de verruimde staatsteun geboden in IPCEI of projecten m.b.t. import van waterstof.

Voor deelname aan IPCEI werd een portfolio opgebouwd op basis van expressions of interest vanuit de industrie ingediend in een open oproep op 5 juni 2020. Deze gebeurde gezamenlijk met het Brussels hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest met coördinatie door de federale overheid (FOD-economie).

De portfolio beoogt een brede waardeketen met

- (1) productie van groene waterstof uit hernieuwbare energie,
- (2) omzetting naar vloeibare brandstoffen met afgevangen CO₂ voor bewaring en gebruik als brandstof,
- (3) aanwending in industriële processen met het oog op groene transitie,
- (4) aanwending in mobiliteit (zwaar transport),
- (5) ondersteunende producten vereist voor de realisatie van waterstoftransitie,
- (6) infrastructuur voor transport en bewaring van waterstof.

Er zijn 3 types projecten. (1) Projectmatige steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). (2) Eerste industriële toepassing (first industrial deployment-FID): deze moeten steeds de ontwikkeling mogelijk maken van een nieuw product en/of de ontwikkeling van een fundamenteel nieuw productieproces. FID omvat grotendeels investeringen, maar gekoppeld aan de uitrol van de O&O&I resultaten. Zowel OPEX als CAPEX worden aanvaard. (3) Infrastructuur voor milieu en energie. Dit omvat financiering voor investeringen die niet noodzakelijk gekoppeld zijn aan O&O&I. De financiering wordt toegekend op basis van de beoogde milieuwinst. Enkel CAPEX wordt aanvaard.

De opvolging van de projecten gebeurt door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Na

PROJECTOMSCHRIJVING

notificatie zullen, aanvragen voor finale financiering behandeld worden door het agentschap, waarbij de operationele implementatie grotendeels zal gebeuren door toepassing van de gangbare werkwijze van het agentschap (evaluatie, betaling, opvolging, voorwaarden en mijlpalen...)

Om een coherente samenwerking in de IPCEI-projecten mogelijk te maken werd een evaluatiecomité opgesteld met vertegenwoordigers van de verschillende financierende autoriteiten op regionaal of federaal niveau en coördinatie daar de federale overheid (FOD-economie). Via deze groep is er een nauw overleg tussen Vlaanderen, het Waalse gewest, het Brusselse hoofdstedelijk gewest en de federale overheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	125.000.000 EUR
Output	Aantal gesteunde projecten (vastlegging Vlaamse steunbeslissingen) Aantal gerealiseerde projecten (oplevering resultaten) Betalingen uitgevoerd (90%)
Outcome	Gerealiseerde electrolysecapaciteit voor productie waterstof uit hernieuwbare energie (150 MWatt)
Beoogde impact	O&O-bestedingen door bedrijven - Broeikasgasemissies - ECONOMIE EN SAMENLEVING VERDUURZAMEN

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Door het grote aantal projecten wordt de prenotificatie bij de Commissie georganiseerd in opeenvolgende golven. Voor de eerste twee golven werd de prenotificatie gestart op 31 augustus 2021. De Vlaamse portfolio omvat 10 aanvragen, waarvan vijf deelgenomen hebben aan één van deze twee eerste golven. Voor deze aanvragen loopt de prenotificatie. Drie aanvragen hebben de vragen van de Commissie ontvangen en beantwoord, één is behandeling en één wacht op ontvangst van de vragen. Ook de volgende golven werden verder uitgewerkt. Drie simultane golven worden zo snel mogelijk gestart met vooropgestelde prenotificatie in februari 2022. Dit zijn 'infrastructuur', 'capacity' en 'mobility'. Vier van de resterende Vlaams aanvragen zijn inmiddels bevestigd voor deelname aan één van deze drie golven. Slechts één aanvraag is op dit ogenblik nog niet toegetreden tot een golf.
Noodzakelijke politieke actie	Geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Bezorgen van de Vlaamse projectvoorstellen aan de coördinator (Duitsland) voor integratie in het Europese notificatiedossier	2021 Q2	Gerealiseerd
Indienen (door coördinator Duitsland) van het dossier voor prenotificatie bij de Europese Commissie	2021 Q2	Gerealiseerd
Steunbeslissing voor O&O&I-projecten eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q1	Nog niet gestart
Indienen (door coördinator Duitsland) van het dossier voor prenotificatie bij de Europese Commissie voor de tweede groep	2022 Q1	Nog niet gestart
Start notificatie eerste groep	2022 Q1	Nog niet gestart
Ontvangst bijkomende projecten (buiten de portfolio ingediend in de expression for interest of IPCEI)	2022 Q2	Nog niet gestart
Start notificatie tweede groep	2022 Q3	Nog niet gestart
RRF mijlpaal: contract steunbeslissingen IPCEI projecten	2022 Q4	Nog niet gestart
Steunbeslissing voor projecten First Industrial Deployment voor de tweede groep	2022 Q4	Nog niet gestart
RRF mijlpaal: contract steunbeslissingen non-IPCEI projecten	2022 Q4	Nog niet gestart
Steunbeslissing voor projecten O&O&I voor de tweede groep	2022 Q4	Nog niet gestart
Steunbeslissing voor projecten klimaatacties (EET) voor de tweede groep	2022 Q4	Nog niet gestart
Steunbeslissing voor First Industrial Deployment eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q4	Nog niet gestart
Steunbeslissing voor investeringen in klimaatacties (EET) eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q4	Nog niet gestart
Steunbeslissing voor bijkomende projecten (ingediend buiten de portfolio projecten ingediend in de expression of interest voor IPCEI)	2022 Q4	Nog niet gestart
RRF mijlpaal: eindresultaat projecten (oplevering)	2026 Q2	Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal Vlaamse steunbeslissingen toegekend en vastgelegd	22	2022 Q4		
Outcome indicator: gerealiseerde electrolyse capaciteit	150 MWatt	2026 Q2		
Aantal (deel)projecten uitgevoerd	22	2026 Q2		
Projecten uitbetaald	90% budget	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	125.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 125.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

11. Vergroening weginfrastructuur

VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers, de burger

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het doel van dit project is om via innovatieve LED-verlichting te investeren in duurzame weginfrastructuur. Het is energiezuiniger en vergt minder onderhoud.</p> <p>Door een beperkte aanpassing kan bovendien de zichtbaarheid op de weg verbeterd worden, wat leidt tot meer verkeersveiligheid en het aanpakken van files.</p> <p>Het uitvoeren van de ombouw van verlichting uitgerust met lampen naar LED-verlichting zal het energieverbruik van het AWW met ten minste 35% doen dalen, met een totale koolstofbesparing van 6.800 à 9.700 ton CO₂ per jaar tot gevolg.</p> <p>Dit project draagt dus significant bij tot de doelstelling van de Vlaamse Regering om een totale reductie in energieverbruik te realiseren van 30% in 2030 t.o.v. het verbruik van 2015, zoals beschreven in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	90.000.000 EUR
Output	Omgebouwde verlichting (naar LED) op gewestwegen, daling van het geïnstalleerd verlichtingsvermogen
Outcome	Optimalisatie van het onderhoudsprogramma van de verlichting, vermindering van het energieverbruik door de overheid (bijdrage aan klimaatplannen).
Beoogde impact	Broeikasgasemissies - Efficiëntie Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De uitvoering van de verledning op de gewestwegen is gestart op 8 september 2021.</p> <p>De voorbereidende studies lopen volgens schema.</p> <p>Voor de uitvoering van de werken wordt een lichte vertraging verwacht van 4 maanden omwille van het wereldwijde chiptekort (impact op de leveranciers van verlichtingstoestellen en lokale afstandsbeveiliging).</p> <p>Ondanks een kleine vertraging komt voorlopig de beoogde uitvoeringstermijn niet in het gedrang.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Aanbestedingsprocedure opstarten	2021 Q1	Gerealiseerd		
Gunning	2021 Q3	Gerealiseerd		
Uitvoering ombouw wegverlichtingsinstallaties voor LED-lampen langs de gewestwegen	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal omgebouwde installaties		2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Uitvoering VAK	84.498.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 90.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

Nota aan de Vlaamse Regering van 4 juni 2021 - Overheidsopdracht VWT-EW-2020-024:
Ombouwen van wegverlichting uitgerust met lampen naar LED langs gewestwegen in het Vlaams Gewest

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	(Toekomstige) eigenaars van elektrische wagens

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De versnelde uitrol van laadinfrastructuur moet bijdragen tot de vergroening van het transport en de modal shift. Nu het wagenpark aan de vooravond staat van een transitie naar volledig elektrisch rijden, wordt er versneld werk gemaakt van een ambitieuze uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen. Door het aantal laadpunten op te trekken en verder te investeren in snellaadinfrastructuur langs grote verkeersassen en strategische locaties in Vlaanderen wordt het comfort en de gemoedsrust van de EV-rijders over langere afstand gegarandeerd. Zo kan er meer ingezet worden op duurzame verkeersmodi.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	30.000.000 EUR
Output	Goedkeuren van een beleidskader, realisatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens
Outcome	Stimuleren van emissievrij vervoer
Beoogde impact	Broeikasgasemissies - laadpalen: aantal charging point equivalents (CPE's) - Aandeel hernieuwbare energie in totaal energiegebruik - Aandeel auto in modale verdeling verplaatsingen - Aandeel fiets in modale verdeling verplaatsingen - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO2-equivalent)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De nodige initiatieven voor het installeren van laadpaalinfrastructuur lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De strategienota laadinfrastructuur werd in Q4 2020 gerealiseerd. Het vereiste beleidskader voor de uitrol van oplaadinfrastructuur werd opgeleverd met de parlementaire goedkeuring van het decreet in Q3 2021. Ter afronding werd een bijhorend uitvoeringsbesluit goedgekeurd op de Vlaamse Regering in december 2021. - De opmaak van potentieelkaarten voor laadinfrastructuur werd afgerond eind 2021 met de oplevering van het eindrapport. Het verzamelen van de data over laadpunten loopt volgens schema. De data wordt real-time ontsloten. De verdere onderbouwing voor de uitrol van laadpunten is in studiefase en op schema. - Om semi-publieke laadinfrastructuur op privaat domein te stimuleren, leverde een eerste projectcall 210 goedgekeurde projecten op. Deze projecten worden vanaf november 2021 gerealiseerd ten velde en zijn goed voor 9.798 van de te realiseren CPE (laadpuntequivalenten). Een tweede dergelijke projectcall wordt voorzien in 2022. - De start van de eerste concessies voor publieke laadpunten op openbaar domein is voorzien in Q2 2022. - Voor (ultra)snelladers langs de grote verkeersassen liep een eerste projectcall tot 15 september 2021 waarbij de 49 goedgekeurde projecten goed zijn voor 2195 CPE (laadpuntequivalenten). Ook hier volgt een tweede call in 2022. <p>De hierboven afgeronde projectcalls zijn samen goed voor 11.993 CPE (tussentijds doel Q2 2023 is 9000), waarvan een aanzienlijk deel ten velde zichtbaar zal worden in 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Verzamelen data laadpunten	2021 Q4	Op schema
Subsidiecall laadinfrastructuur 2021	2021 Q4	Op schema
Opmaak potentieelkaarten laadinfrastructuur	2021 Q4	Op schema
Onderbouwing uitrol laadpunten in Vlaanderen	2022 Q4	Op schema

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Subsidiecall laadinfrastructuur 2022		2022 Q4	Op schema	
Organisatie concessies publieke laadpunten		2022 Q4	Op schema	
Installatie snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2022)		2024 Q4	Op schema	
Installatie van snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2021)		2024 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Goedkeuring beleidskader voor de uitrol van oplaadinfrastructuur. Het beleidskader maakt het mogelijk: - de toekomstige oplaadpunten in kaart te brengen - de concessieopdrachten voor oplaadpunten in het publieke domein te lanceren - de uitrol van (semi-)publieke oplaadpunten op het particuliere domein te stimuleren - de doorlooptijd voor de installatie van oplaadpunten in te korten door de administratieve lasten te verminderen - het opladen in een slim elektriciteitsnet te stimuleren	Goedkeuring van het kader	2021 Q4	1	95 %
Toekenning van concessies voor oplaadinfrastructuur. Het wetgevingskader voor de uitrol van publieke oplaadinfrastructuur wordt verzekerd via door de Vlaamse regering verleende concessies. De uitrol wordt overgelaten aan particuliere exploitanten.	Schriftelijke kennisgeving van gunning van opdracht aan geslaagde kandidaten	2022 Q2	1	25 %
Oplaadinfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten	9000	2023 Q2		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
(uitgedrukt in charging point equivalenten (CPE))				
Oplaainfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalenten (CPE))	22.000	2025 Q2		
Oplaainfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalenten (CPE))	30.000	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	14.477.000 EUR
Uitvoering VEK	116.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 29.460.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 540.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Bijlage
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen - nota

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissie vervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor desubsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissie vervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Advies Raad van State over het een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot vaststelling van de regels voor de subsidiering van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissie vervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Projectoproep uitrol ultrasnelladers \(≥150kW\) op parkings langs autosnel-en gewestwegen](#)

[Oproep tot kandidaatstelling voor uitrol ultrasnelladers \(≥150 kW\) op parkings langs autosnel-en gewestwegen. Bijlage](#)

[Kandidaatstellingsformulier. Bijlage](#)

Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Visie 'Clean power for transport' 2030

CPT-Visie 2030. Op weg naar zero-emissie vervoer. Bijlage

Bekrachtiging door de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Decreet over zero-emissie voertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen.

[Plan Vlaamse Veerkracht: toekenning financiële tegemoetkoming aan geselecteerde kandidaten van de projectoproep 'uitrol ultrasnelladers op parkings langs autosnel- en gewestwegen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

12. Iedereen lokaal digitaal

VV050 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Agentschap Integratie en Inburgering, IN-Gent vzw, Atlas vzw, Huis van het Nederlands Brussel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De inburgeringstrajecten digitaliseren, zodat mensen sneller en meer op zelfstandige basis de vaardigheden en kennis kunnen verwerven om het inburgeringstraject te doorlopen. Zo kunnen ze ook sneller actief worden op de arbeidsmarkt, op eigen benen staan en bijdragen aan de welvaart van onze samenleving.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	15.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - aantal vernieuwende acties m.b.t. digitalisering binnen de uitvoering van het inburgeringsbeleid - aantal inburgeraars in het hybride of digitaal traject
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - klantenwerking te verbeteren: nieuwkomers, inburgeraars, anderstaligen, lokale besturen, andere (overheids)organisaties en iedereen in de samenleving wordt er beter van als de agentschappen en het huis op een meer afgestemde en digitale manier (samen)werken - een sector-overschrijdende vereenvoudiging te realiseren - vereenvoudiging van klantprocessen en datadeling om zo efficiëntiewinst te bereiken - creatie van ruimte voor het personeel bv. op het vlak van dienstverlening die maatwerk vraagt - verhogen digitale vaardigheden

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Contact met overheid via internet - Toegankelijkheid Vlaamse overheid (imago) - Aandeel bevolking dat over digitale basisvaardigheden beschikt - Efficiëntie Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het projectteam is opgestart in september 2021. Er is nog een openstaande vacature voor een projectleider digitalisering die nog niet ingevuld raakte.</p> <p>De eerste vooronderzoeken zijn binnen de verschillende werven afgerond. Verdere verfijning van projectplannen wordt opgestart.</p> <p>Voor bepaalde werven wordt het gunningsproces i.f.v. een technische leverancier opgestart.</p> <p>Op basis van deze gegevens wordt een tweede dossier opgemaakt voor herverdeling relancemiddelen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Op basis van een uitgewerkt plan van het Agentschap Integratie en Inburgering eerste aanvraag aan middelen herverdelen naar het Agentschap.	2021 Q2	Gerealiseerd
Werven opgestart	2021 Q4	Op schema
Werk 1: KBI - vooronderzoek (business case o.l.v. Digitaal Vlaanderen)	2021 Q4	Gerealiseerd
Werk 1: KBI - bestek en gunning	2022 Q2	Op schema
Werk 2: CRM - Business case technisch platform	2021 Q3	Gerealiseerd
Werk 2: CRM - bestek en gunning	2022 Q2	Op schema
Werk 2: platform netwerk- en participatietraject - projectplan	2022 Q1	Op schema

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Werf 3: fase 1 betaalmodule		2022 Q1	Op schema	
Werf 3: vernieuwing vreemdelingenrecht.be - vooronderzoek		2021 Q4	Op schema	
Werf 3: vernieuwing vreemdelingenrecht.be - bestek en gunning		2022 Q1	Op schema	
Werf 4: Leerplatform - vooronderzoek		2021 Q3	Gerealiseerd	
Werf 4: Leerplatform - gunning		2021 Q4	Op schema	
Werf 3: Leerplatform - implementatie		2022 Q3	Op schema	
Werf 5: Nederlandse taalverwerving - projectplan		2022 Q1	Op schema	
Werf 6: digitale wendbaarheid - vooronderzoek		2021 Q4	Vertraging	
Projectteam voltallig		2021 Q4	Vertraging	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Er is een tool om verplichte inburgeraars die niet werken of niet studeren te matchen in een netwerk- of participatietraject		2022 Q4		
Er is een leerplatform waar de leerkrachten maatschappelijke oriëntatie op kunnen werken	100%	2022 Q4		
Er is een online betaalmodule via dewelke digitaal vaardige inburgeraars en anderstaligen kunnen betalen		2022 Q4		
Er is een vernieuwde website vreemdelingenrecht.be		2023 Q1		
Er is een klantenportaal waar digitaal vaardige inburgeraars informatie kunnen raadplegen		2023 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
er is een screeningstool om de digitale vaardigheden van inburgeraars en anderstaligen te meten		2023 Q4		
Er is een tool om inburgeraars digitaal te werven		2024 Q4		
Er is een nieuw klantvolgsysteem voor inburgeraars		2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.894.000 EUR
Uitvoering VEK	293.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 15.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Ministerraad - Plan Vlaamse Veerkracht van 17 september 2021</p> <p>Plan Vlaamse Veerkracht: Digitalisering integratie en inburgering</p> <p>17 september 2021 op voorstel van viceminister-president Bart Somers</p> <p>Het programma 'Digitalisering Integratie en Inburgering' geeft uitvoering aan de ambities uit het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 rond de hertekening van inburgering en het aanpassen van het integratiebeleid. Digitalisering is daarbij niet weg te denken. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de contouren van de digitaliseringsprojecten en aan de herverdeling van zo'n 1,9 miljoen euro naar het Agentschap Integratie en Inburgering voor het programmateam en de vooronderzoeken om de projectplannen te verfijnen. De middelen zullen ingezet worden voor de toekomstvisie Kruispuntbank Inburgering, voor Community building en digital marketing, voor het klantenportaal en -dienstverlening, het online leren en testen, Nederlandse taalverwerving en het versterken van digitale vaardigheden van inburgeraars en medewerkers.</p>

VV051 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Lokale besturen, VVSG, V-ICT-OR, Exello.net

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het doel van dit project is het versneld digitaliseren van de processen en dienstverlening van lokale besturen. Op die manier kunnen bedrijven en burgers sneller hun administratieve verplichtingen afwerken, zonder in een fysieke rij te staan. Bovendien moet dit de administratieve rompslomp eenvoudiger maken, de afhandeling sneller en efficiënter. Een “gemeente zonder gemeentehuis” is daarbij de provocerende gedachte, tegelijk met meer telewerkende ambtenaren.</p> <p>Het project “Gemeente zonder gemeentehuis” zal op basis van een systeem met oproepen resulteren in projectsubsidies voor Lokale Besturen die hun dienstverlening meer burgergericht, transparant en efficiënt willen inrichten door middel van digitale tools. Het project creëert dus ruimte en mogelijkheden voor een transformatieve aanpak van de gemeentelijke dienstverlening en werking. Er wordt hierbij gestreefd naar hergebruik door en delen van de oplossingen tussen lokale besturen om de grootst mogelijke impact te hebben.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	35.000.000 EUR
Output	Uitgevoerde projecten van de diverse oproepen (volgt uit mijlpalen) en een verrijking van de Vlaamse Digitale Architectuur voor lokale besturen.
Outcome	Meerdere lokale besturen hebben samen of zelfstandig een stap gezet (effectieve verbetering van de dienstverlening en een leertraject doorlopen) in het burgergericht inzetten van digitalisering. Hiertoe hebben ze zelfstandig of met partners een aantal digitaliseringsprojecten succesvol doorlopen waarbij ze werkten op innovatieve dienstverlening, digitale democratie en de werkplek van de toekomst.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Contact met overheid via internet - Toegankelijkheid Vlaamse overheid (imago) - Versterken van dienstverlening lokale besturen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De eerste oproep is afgelopen. Er werden 28 voorstellen ingediend waarbij 105 lokale besturen betrokken zijn. In de komende periode worden deze beoordeeld en een subsidieaanvraag voorgelegd aan de Vlaamse regering.</p> <p>Ondertussen werden ook de 2de en 3de oproep gestart.</p> <p>Oproep vier werd op 22/12/21 gelanceerd.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Visienota Gemeente zonder gemeentehuis goedgekeurd.	2021 Q2	Gerealiseerd
Goedkeuring nota Gemeente zonder gemeentehuis op Vlaamse Regering	2021 Q3	Gerealiseerd
Eerste oproepronde gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd
Oproep 2 gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd
Oproep 3 gestart	2021 Q4	Gerealiseerd
subsidieadvies oproep 1 voorgelegd aan de bevoegde minister	2022 Q1	Gerealiseerd
Oproep 4 gestart	2021 Q4	Gerealiseerd
Oproep 5 gestart	2022 Q1	Nog niet gestart

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Oproep 6 gestart		2022 Q1	Nog niet gestart	
Oproep 7 gestart		2022 Q2	Nog niet gestart	
Subsidieadvies laatste oproep voorgelegd aan de bevoegde minister		2022 Q4	Nog niet gestart	
Eindrapport met retrospectieve over de gerealiseerde projecten en de mate waarin die bijdroegen tot de realisatie van de opgestelde visie.		2026 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal dossiers bij oproep 1	20	2021 Q4	28	100 %
Het aantal gemeenten dat betrokken is of samenwerkt bij de digitalisering van lokale dienstverlening (via GZG)	Eén derde van de gemeenten	2022 Q4		
Aantal digitale bouwstenen van Vlaanderen voor lokale besturen dat door het project wordt opgezet of verbeterd.	10	2025 Q4		
Aantal diensten(processen) dat deels of volledig gedigitaliseerd is door via GzG	25 % van de diensten (zie dienstenkaart)	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Uitvoering VAK	817.000 EUR
Uitvoering VEK	580.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 28.926.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.074.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 26 februari 2021: Gemeente zonder gemeentehuis: oprichting van een programmateam](#)

[Mededeling VR 26 februari 2021: Gemeente zonder gemeentehuis: oprichting van een programmateam. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Programma Gemeente zonder Gemeentehuis](#)

[Lokaal digitaal. Visietekst Bijlage. 9 juli 2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV052 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Overheidspersoneel
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

We zetten in op de ontwikkeling van een instrumentarium om de lokale besturen, en bij uitbreiding de Vlaamse overheid, te ondersteunen bij hun e-inclusiebeleid. We zetten daarbij in op relanceprojecten zoals digibuddies waarbij gemotiveerde vrijwilligers andere Vlamingen helpen om mee te geraken in de digitale wereld. We zetten experts in die lokale besturen ondersteunen bij het uitrollen van het actieplan "Iedereen Digitaal". We ontwikkelen audiovisuele en andere instrumenten die iedereen helpen om digitaal sterker te worden. We versterken lerende netwerken en bieden de lokale besturen de nodige instrumenten aan om digitale vaardigheden van werknemers te kunnen screenen. Bij uitbreiding voorzien we dergelijk instrumentarium (screening van digitale vaardigheden) ook voor de Vlaamse overheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	2.710.000 EUR
Output	Aantal lokale besturen die ondersteund worden bij hun e-inclusiebeleid.
Outcome	Lokale besturen voeren een lokaal e-inclusiebeleid.
Beoogde impact	Aandeel bevolking dat over digitale basisvaardigheden beschikt

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Ondersteuning van lokale besturen door Imec en VVSG is lopende.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Actieplan 'Iedereen Digitaal'		2021 Q1	Gerealiseerd	
Ondersteuning lokale besturen van start		2021 Q3	Gerealiseerd	
Ondersteuning lokale besturen voltooid		2024 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen die ondersteund worden.	300	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.710.000 EUR
Uitvoering VAK	1.908.000 EUR
Uitvoering VEK	191.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.710.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan 'Iedereen Digitaal' werd op 16 juli 2021 door de VR goedgekeurd.

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV053 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Agentschap Overheidspersoneel
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Iedereen moet digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarom voorzien we in 19,7 miljoen euro die gemeenten kunnen gebruiken om vormingen en opleidingen op maat van digitaal kwetsbare doelgroepen uit te werken met lokale partners.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	19.700.000 EUR
Output	Aantal lokale besturen die financieel ondersteund worden bij het voeren van een lokaal e-inclusiebeleid
Outcome	Lokale besturen hebben een lokaal e-inclusiebeleid
Beoogde impact	Aandeel bevolking dat over digitale basisvaardigheden beschikt

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Actieplan Iedereen Digitaal		2021 Q1	Gerealiseerd	
Oproep gelanceerd		2021 Q3	Gerealiseerd	
Oproep afgesloten en beoordeling voltooid		2021 Q4	Gerealiseerd	
Oproepen gestart		2022 Q1	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal projecten van lokale besturen rond lokaal e-inclusiebeleid opgestart.	25	2022 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	19.700.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 19.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Het actieplan 'Iedereen digitaal' werd op 16 juli 2021 door de VR goedgekeurd

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV054 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Alle Vlamingen verdienen toegang tot internet. Daarom investeren we 27.590.000 euro zodat lokale besturen kwetsbare mensen en mensen die leven in armoede toegang kunnen verlenen tot computers en internet. We maken hierbij onder andere gebruik van de reeds bestaande ondersteuning van de UiTPAS. Daarbij gaat ook aandacht naar wetenschappelijke ondersteuning van het e-inclusiebeleid. Ook willen we lokale besturen ondersteunen bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	27.590.000 EUR
Output	Aantal personen die toegang hebben tot internet.
Outcome	Meer kwetsbare personen hebben toegang tot internet via de lokale besturen. Het e-inclusiebeleid wordt wetenschappelijk ondersteund en lokale besturen worden ondersteund bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening
Beoogde impact	Aandeel burgers die nooit internet gebruiken - Versterken van dienstverlening lokale besturen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Uitwerking van de aanpak is lopende en wordt in Q1 2022 in detail opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Actieplan 'Iedereen Digitaal'	2021 Q1	Gerealiseerd
Uitgewerkte aanpak	2022 Q1	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.590.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.590.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: toewijzing middelen 'Iedereen Digitaal' 16/07/2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV055 - SMART CITIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen in de top-5 regio's van het Regionaal Innovatiescorebord. Digitale innovatie zal de sleutel zijn om dit doel te bereiken. Tegelijk worden steden geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen, gaande van economie tot milieu en van mobiliteit tot sociale cohesie. Daarom moedigen we onze steden en gemeenten aan om Smart City-toepassingen te testen en op te schalen. Dit draagt bij tot de kwaliteit van de informatie en de dienstverlening aan bedrijven en burgers, zoals de voorlopers illustreren. Maar daarmee stimuleren en demonstreren we ook onze technologie- en ICT-bedrijven en bieden we kansen voor internationale doorbraken.

We lanceren twee oproepen met focus op zes thema's: Slimme mobiliteit, Slim milieu, Slimme mensen, Slim leven, Slim bestuur en Slimme economie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	20.000.000 EUR
Output	Realisatie en implementatie van nieuwe toepassingen voor Smart Cities bij lokale besturen
Outcome	Vlaanderen op de kaart zetten als Slimme Regio
Beoogde impact	Versterken van dienstverlening lokale besturen - Versterken innovatiecapaciteit Vlaamse KMO's en bedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	De oproep City of Things 2021 werd in juni goedgekeurd door de VR. Nadien werd een co-creatietraject opgezet om de potentiële indieners en partners te inspireren en informeren. De oproep zelf werd opgedeeld in twee fasen: een 1e fase (met deadline 15/9/2021) om ideeën aan te melden en een 2e fase (met deadline 6/12/2021) om de eigenlijke subsidieaanvragen in te dienen. VLAIO ontving in de 1e fase 26 ideeën en ontving uiteindelijk 13 aanvragen die allemaal ontvankelijk waren. De jurering zal plaatsvinden op 13/1/2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Lancering oproep 2021	2021 Q2	Gerealiseerd		
Deadline indiening aanvragen	2021 Q4	Gerealiseerd		
Jurering ontvankelijke aanvragen	2022 Q1	Op schema		
Start goedgekeurde projecten	2022 Q3	Nog niet gestart		
Lancering oproep 2022	2022 Q3	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Kwalitatieve en haalbare projecten City of Things goedgekeurd binnen het beschikbare budget		2022 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	523.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering tot het openstellen van en het verlenen van steun binnen de oproep City of Things 2021](#)

[Oproep City of Things 2021. Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel. Bijlage 1](#)

[Controlerichtlijnenoproep City of Things 2021. Bijlage 2](#)

[Aanmelding ideeën. Oproep City of Things 2021. Bijlage 3](#)

[Aanvraagformulier. Oproep City of Things 2021. Bijlage 4](#)

[Actieplan. Smart Cities Vlaanderen. Het platform voor de uitbouw van de Slimme Regio Vlaanderen. Bijlage](#)

[KPI's Partnership voor een Slimme Regio. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

13. Digitalisering Vlaamse overheid

VV056 - ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING – ONBOARDING RAAMOVEREENKOMSTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid en lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Dit programma heeft als doel een vernieuwd aanbod ICT-diensten te realiseren, dat zowel afgestemd is op de noden van de Vlaamse overheid als dat het maximaal inspeelt op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan mature diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Deze dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en een geschikte menukaart vormen in lijn met hun behoeften.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	15.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	De vernieuwde raamcontracten zijn operationeel waardoor de klanten gebruik kunnen maken van het vernieuwd en innovatief aanbod van ICT-diensten ter ondersteuning van hun digitale transformatie.
Beoogde impact	DE OVERHEID EFFICIËNTER MAKEN

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Aandacht nodig

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	Het inrichten van de operationele service integratie loopt wat vertraging op. Op basis van deze vaststelling is een prioriteitstelling gebeurd mbt de operationele processen, zodat de kritieke set van operationele processen klaar zijn tegen de deadline van eind januari 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema
Versterking van de interne transitieproject voor de begeleiding van transitie naar het nieuwe model	2021 Q2	Vertraging
Inrichten van de operationele service integratie	2022 Q1	Vertraging
Transitiedienstverleningspakketten (werkplekken, cloud en datacenter, applicatiediensten)	2022 Q1	Op schema
Traject om het instappen in de vernieuwde raamovereenkomsten met betrekking tot de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening te faciliteren	2023 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	13.993.000 EUR
Uitvoering VEK	2.504.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 12.400.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV057 - ONDERSTEUNING DIGITALE TRANSFORMATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten en lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Met het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse regering de maatschappij en de economie digitaal transformeren. Eén van de drie horizontale basispijlers van deze ambitie richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Hierdoor wordt de dienstverlening, vanuit het standpunt van de burger, ondernemer of vereniging, als één geheel digitaal getransformeerd.</p> <p>Dit project omvat de acties die ondernomen worden om deze ondersteuningsstructuur uit te bouwen, verschillende achterliggende gemeenschappelijke digitale bouwstenen te versterken en de ondersteuning bij het gebruik ervan uit te breiden zodat ze efficiënt kunnen worden ingezet in de digitale transformatieprojecten van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Onrechtstreeks zorgt dit project ook voor het bevorderen van de digitale transformatie van economie en maatschappij door meer data als grondstof van de economie en maatschappij aan te bieden en gebruikers te ondersteunen in het gebruik ervan. Daarnaast worden digitale talenten ontwikkeld binnen de Vlaamse entiteiten en lokale besturen door onder andere het uitbouwen van een expertisecentrum digitale transformatie en het voorzien van gerichte ondersteuning en kennisoverdracht bij het gebruik van gemeenschappelijke digitale bouwstenen.</p> <p>Bureau Digitale Transformatie binnen het nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen</p> <p>Vooreerst wordt geïnvesteerd in het uitbouwen van een bureau digitale transformatie binnen het nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen als ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Dit bureau zal heel vraaggestuurd inspelen op specifieke noden en behoeften van deze overheidsinstanties en dit niet zozeer voor de technische aspecten van de digitale transformatie, maar vooral voor de organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en/of juridische facetten ervan. Het bureau werkt hiermee complementair aan de ondersteuning die het agentschap Digitaal Vlaanderen reeds voorziet door het aanbieden van gemeenschappelijke digitale bouwstenen en de regierol die zal opgenomen worden bij het vernieuwd raamcontract voor gemeenschappelijke ICT-dienstverlening (VV056).</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

Het vraaggestuurde karakter van het bureau digitale transformatie wordt gegarandeerd door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid nauw te betrekken bij de werking van het bureau. Jaarlijks wordt een actieplan voor het bureau digitale transformatie ter validatie voorgelegd en zal op regelmatige basis gerapporteerd worden over de voortgang ervan.

Het bureau digitale transformatie wordt georganiseerd rond drie recurrente hoofdopdrachten.

In de eerste plaats zal het bureau, op vraag, de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen ondersteunen bij hun digitale transformatieprojecten. Dit omvat taken gaande van adviesverlening, over analyse van de dienstverleningsprocessen om aan de hand van een business case de beste digitale oplossing uit te werken, tot begeleiding bij de effectieve uitvoering van de projecten.

Flankerend hieraan ondersteunt het bureau het uitwerken van een coherente interbestuurlijke digitale transformatiestrategie in lijn met het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Het uitwerken van deze strategie door middel van referentiekaders en concrete actieplannen moet aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen richting geven bij de uitvoering van hun respectieve digitale transformatieprojecten.

Op vlak van digitale publieke dienstverlening heeft Vlaanderen de ambitie tegen eind 2024 een top-5 positie in te nemen in de Europese Digital Economy and Society Index (DESI-index). Het bureau zal deze ambitie inwerken in deze coherente interbestuurlijke digitale transformatiestrategie en hiervoor een actieplan opstellen. Om de voortgang op te volgen wordt jaarlijks een regionale DESI-score gemeten, op basis van de door de Europese Commissie gehanteerde methodologie.

Ten derde wordt een expertisecentrum inzake digitale transformatie opgericht met als doel de digitale maturiteit van de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen globaal te verhogen. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de technische aspecten van digitale transformatie, maar ook aan organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en/of juridische facetten.

Gemeenschappelijke digitale bouwstenen

Dit relanceproject voorziet eveneens in gerichte investeringen in cruciale gemeenschappelijke digitale bouwstenen van het agentschap Digitaal Vlaanderen, en het versterken van de ondersteuning bij het gebruik ervan, zodat deze efficiënter door de Vlaamse entiteiten en lokale besturen kunnen worden ingezet in hun digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening aan de burgers, ondernemers en verenigingen.

Digitale bouwstenen voor een performante, datagedreven overheid

De Vlaamse overheid en de lokale besturen beschikken gezamenlijk over een schat aan data. Niet alle databronnen zijn echter even vlot toegankelijk en/of gebruikers weten niet altijd goed hoe deze data het meest efficiënt kunnen worden ingezet. Op aangeven van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen wordt daarom een ondersteuningsaanbod uitgewerkt met betrekking tot het

PROJECTOMSCHRIJVING

ontsluiten en gebruiken van de beschikbare data. Hierbij zullen zij gericht, en in functie van de eigen noden, door een zogenaamde 'vliegende ploeg' begeleid worden in het ontsluiten van de eigen databronnen en het inzetten van data van derden binnen de eigen processen. Specifiek voor het veilig en rechtmatig gebruiken van persoonsgegevens wordt de nodige juridische en IT-technische expertise ter beschikking gesteld.

Heel wat van deze persoonsgegevens worden vandaag ontsloten via het MAGDA-gegevensdelingsplatform. Om de nodige garanties met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) af te dwingen, moeten voor het gebruik van deze persoonsgegevens ook verschillende technische en juridisch-administratieve stappen doorlopen worden tijdens het aansluitingsproces. Complementair aan de acties die reeds in het programma VRD 2 in 2021 zijn voorzien, wordt verder geïnvesteerd in een gebruiksvriendelijker aansluitingsproces voor het MAGDA-gegevensdelingsplatform zodat persoonsgegevens sneller kunnen ingezet worden, steeds met respect voor de AVG.

Diverse bevestigingen hebben daarnaast aangetoond dat vandaag verschillende cruciale databronnen ontbreken in het MAGDA-aanbod. Een deel van de investeringen wordt ingezet om de ontsluiting van de meest prioritaire, ontbrekende databronnen via het MAGDA-gegevensdelingsplatform te versnellen en de raadpleging ervan via de webtoepassing MAGDA-online mogelijk te maken. De belangrijkste ontbrekende databronnen worden samen met de belanghebbenden bepaald in het tweede kwartaal 2021. De prioriteit wordt mee bepaald door de visie die in kader van het project Gemeente zonder Gemeentehuis (VV051) wordt uitgewerkt en de in voorbereiding zijnde datastrategie die deel uitmaakt van het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Digitale bouwstenen voor een state-of-the-art digitale dienstverlening aan burger, ondernemer en vereniging

Dit relanceproject versterkt eveneens vijf gemeenschappelijke digitale bouwstenen die cruciaal zijn om vanuit de Vlaamse entiteiten en lokale besturen een state-of-the-art, 'low touch', digitale dienstverlening aan de burger, ondernemer of vereniging aan te bieden, met name (1) de module 'eFormulieren', (2) een professioneel CRM-systeem, (3) het digitaal tekenplatform, (4) de MAGDA-documentendienst en (5) de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus. Een belangrijk kenmerk van een 'low touch' dienstverlening is dat met zo min mogelijk verschillende contactmomenten en loketten de dienstverlening zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt, liefst zelfs zo automatisch mogelijk. Gebruikersgerichtheid staat daarbij centraal, waarbij de dienstverlening uitgedacht is vanuit de werkelijke noden en behoeften van de gebruikers.

1. module 'eFormulieren'

Met de module 'eFormulieren' wordt aan Vlaamse entiteiten en lokale besturen de mogelijkheid geboden op een gebruiksvriendelijke digitale manier gegevens aan burgers, ondernemers of verenigingen op te vragen die (nog) niet in een authentieke bron aanwezig zijn. Deze module vormt ook een belangrijke technische component van de generieke aanvraagmodule die door Digitaal Vlaanderen in het programma VRD 2 wordt vormgegeven. Het relanceproject zorgt voor een impulsinvestering om het technisch platform gebruiksvriendelijker te maken en op te waarderen zodat betere ondersteuning van de Vlaamse entiteit of het lokaal bestuur mogelijk wordt.

2. professioneel CRM-systeem

Om een klantvriendelijke dienstverlening aan de burger, ondernemer of vereniging mogelijk te maken is het essentieel dat contacten met die burger, ondernemer of vereniging op een professionele manier opgevolgd en beheerd worden. Daartoe werd in 2020 een raamcontract uitgewerkt dat Vlaamse entiteiten en lokale besturen toegang biedt tot een professioneel CRM-systeem (“customer relation manager”). Via dit deelproject wordt dit CRM-systeem gekoppeld met het organisatiesregister en twee andere gemeenschappelijke databronnen van de Vlaamse overheid (toegangs- en gebruikersbeheer, mail en kalender). Tevens worden de nodige beveiligingsmaatregelen, in lijn met het informatieveiligheidsbeleid, geïmplementeerd. Met de oprichting van een “CRM-community” wordt een netwerk voor kennisdeling binnen de Vlaamse overheid en lokale besturen gegarandeerd.

3. Digitaal Tekenplatform

Ten derde wordt het Digitaal Tekenplatform versterkt dat het elektronisch ondertekenen van documenten binnen de Vlaamse overheid en bij lokale besturen faciliteert. Het digitaal tekenen van documenten vermindert drastisch de papierstroom en zorgt voor belangrijke tijdswinsten en een efficiënte bedrijfsvoering, zeker in tijden van maximaal plaats- en tijdsafhankelijk werken. Het project zet in op een hoger gebruiksgemak door QR-codes op een (ondertekend) document toe te voegen waardoor de geldigheid van het document ten allen tijde kan geverifieerd worden ten opzicht van het centraal opgeslagen authentieke document. Eveneens zal bij het ondertekenen een gekwalificeerde timestamp toegevoegd worden zodat het tijdstip van ondertekenen juridisch niet weerlegd kan worden.

4. MAGDA-documentendienst

Met de MAGDA-documentendienst, ten vierde, kan een Vlaamse entiteit of lokaal bestuur geautomatiseerd digitale documenten versturen naar een door de ontvanger geactiveerde e-box of e-mailadres of (aangetekend) per post indien dit niet het geval is. Binnen het programma VRD 2 wordt deze component uitgebreid met de mogelijkheid voor een ontvanger om digitaal te reageren op een digitaal ontvangen document. Onder aansturing van de gebruikersgroep worden nu bijkomende functionaliteiten op de MAGDA Documentendienst ingevoerd waaronder de mogelijkheid tot digitaal tekenen door de integratie met het Digitaal Tekenplatform en het voorzien van digitale betaalmogelijkheden. Voor Vlaamse entiteiten of lokale besturen die niet over een volwaardig dossieropvolgingsstelsel beschikken, worden de functionaliteiten van Magda Online uitgebreid om eenvoudige documenten te versturen en/of te ontvangen.

De MAGDA-documentendienst wordt in 2021 onder meer gebruikt voor het versturen van de brieven aan iedere burger met informatie over hun voorgestelde vaccinatiemomenten. Ook de belastingbrieven van VLABEL en de provincie Antwerpen zullen dit jaar via dit stelsel uitgestuurd worden. Hiervoor is het essentieel dat er over de volledige ketting van versturen tot en met ontvangen van het document de nodige garanties kunnen gegeven worden over de technische beschikbaarheid van het stelsel en de veiligheid van het verstuurd document. Op vandaag vervult BOSA, de federale dienstenintegrator, de rol als Document Provider naar de verschillende e-Boxen zoals Doccle, Mijn Burgerprofiel of MyeBox. Gezien de hoge te verwachten transactievolumes vanuit Vlaanderen is er in samenspraak met BOSA afgesproken dat het MAGDA-platform deze rol van “document provider” inricht voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen.

PROJECTOMSCHRIJVING

5. Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus

De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC), tot slot, staat sinds eind vorig jaar in voor de SDG-informatievoorziening vanuit Vlaanderen. Deze IPDC laat toe dat elke Vlaamse entiteit zelf instaat voor het beheer van informatie over de eigen producten en diensten én dat deze informatie centraal door andere entiteiten of beleidsniveaus kan worden geraadpleegd. Voorbereidingen worden getroffen om deze gemeenschappelijke digitale bouwsteen ook te laten inzetten door de lokale besturen voor het beheren van lokale producten- en dienstencatalogi (IpdC) die dan eveneens centraal ontsloten kunnen worden.

Gestandaardiseerde beschrijvingen van producten en diensten in de IPDC bieden bovendien de mogelijkheid om proactief de beoogde doelgroep van de dienstverlening te benaderen. Het informeren van iedere doelgroep op maat kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Nagegaan wordt welke aanpassingen er hiervoor op korte termijn aan de IPDC kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast wordt de IPDC gekoppeld aan de interfederale productencatalogus die door de federale overheid in kader van SDG wordt uitgewerkt. Op die manier kan via vlaanderen.be of op webportalen van Vlaamse entiteiten en lokale besturen één geconsolideerd overzicht geboden worden van de dienstverlening die voor de burger, ondernemer of vereniging beschikbaar is, onafhankelijk van het beleidsniveau dat instaat voor deze dienstverlening.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	5.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	<p>Operationele effecten op korte termijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbouw van een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie onder aansturing van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. - Uitbreiding van de ondersteuning bij het gebruik van gemeenschappelijke digitale bouwstenen. - Versterking van verschillende van die digitale bouwstenen (met name: het MAGDA-gegevensdelingsplatform, de module 'eFormulieren', het CRM-systeem, het digitaal tekenplatform, de MAGDA-documentendienst en de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus).
Beoogde impact	DESI Digital public services: open data indicator - Versterken van dienstverlening lokale besturen - Contact met overheid via internet

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Aandacht nodig
---------------	----------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>Het project heeft vertraging opgelopen door prioritering op COVID activiteiten, en daarnaast de beperkte beschikbaarheid van IT profielen op de arbeidsmarkt.</p> <p>De volgende mijlpalen zijn herpland naar uitvoering in 2022:</p> <p>Q1 2022: -VV057.03.01 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'eFormulieren'</p> <p>Q2 2022: -VV057.03 Versterkte ondersteuning en gemeenschappelijke digitale bouwstenen beschikbaar voor het leveren van een state-of-the-art dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen -VV057.03.03 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Digitaal Tekenplatform' -VV057.03.04 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'MAGDA-documentendienst' -VV057.03.05 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus'</p> <p>Q3 2022 -VV058.01.02 - Sterk vereenvoudigd aansluitingsproces voor professionele gebruikers is gerealiseerd</p> <p>Q4 2022: -VV057.02 Versterkte ondersteuning en gemeenschappelijke digitale bouwstenen beschikbaar voor een performant datagedreven beleid door Vlaamse entiteiten en lokale besturen. -VV057.02.01 - Bijkomend ondersteuningsaanbod bij het gebruiken en/of ontsluiten van data is operationeel via 'vliegende ploeg'. -VV057.02.02 - Het aansluitingsproces op het MAGDA-gegevensdelingsplatform is gebruiksvriendelijker met een kortere doorlooptijd als gevolg</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema
VV057.01 het bureau digitale transformatie is volledig operationeel en staat ter beschikking van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen.	2021 Q4	Gerealiseerd
VV057.02 Versterkte ondersteuning en gemeenschappelijke digitale bouwstenen beschikbaar voor een performant datagedreven beleid door Vlaamse entiteiten en lokale besturen.	2021 Q4	Vertraging
VV057.02.01 - Bijkomend ondersteuningsaanbod bij het gebruiken en/of ontsluiten van data is operationeel via 'vliegende ploeg'.	2021 Q4	Vertraging
VV057.02.02 - Het aansluitingsproces op het MAGDA-gegevensdelingsplatform is gebruiksvriendelijker met een kortere doorlooptijd als gevolg	2021 Q4	Vertraging
VV057.02.03 - De meest prioritaire, ontbrekende databronnen zijn ontsloten via het MAGDA-gegevensdelingsplatform en MAGDA-Online	2021 Q4	Gerealiseerd
VV057.03 Versterkte ondersteuning en gemeenschappelijke digitale bouwstenen beschikbaar voor het leveren van een state-of-the-art dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen	2021 Q4	Vertraging
VV057.03.01 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'eFormulieren'	2021 Q4	Vertraging
VV057.03.02 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'CRM-systeem'	2021 Q4	Gerealiseerd
VV057.03.03 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Digitaal Tekenplatform'	2021 Q4	Vertraging
VV057.03.04 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'MAGDA-documentendienst'	2021 Q4	Vertraging
VV057.03.05 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus'	2021 Q4	Vertraging

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	2.015.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 4.100.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 900.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV058 - VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Financiën en Begroting
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse regering de maatschappij en de economie digitaal transformeren. Eén van de drie horizontale basispijlers van deze ambitie richt zich op de digitale transformatie van de overheidsdienstverlening waarbij versneld wordt geïnvesteerd in de achterliggende systemen en processen, als cruciale bouwsteen, om de gemeenschappelijke dienstverlening te faciliteren vanuit een perspectief waarbij de ervaring van de burger, ondernemer of vereniging centraal wordt gezet.

Dit project omvat maatregelen die ondernomen worden om deze versnelde gemeenschappelijke dienstverlening aan Vlaamse entiteiten en lokale besturen te realiseren. Deze maatregelen dragen niet alleen rechtstreeks bij aan de digitale transformatie van de overheidsdienstverlening, maar zijn ook een directe katalysator voor andere projecten uit het relanceplan. Hierdoor kunnen alle Vlaamse entiteiten en lokale besturen evolueren naar datagedreven overheidsinstanties met een state-of-the-art digitale dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen.

Versnelde investering in bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform

Het MAGDA-gegevensdelingsplatform, het deelplatform van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI), zorgt voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van persoonsgegevens binnen en tussen de verschillende beleidsniveaus in Vlaanderen. Dit dienstenaanbod is vandaag een cruciale basisvoorziening waarop heel wat kritische bedrijfsprocessen van Vlaamse en lokale overheden, maar ook private partners, steunen. Bijgevolg verwachten deze doelgroepen afdoende garanties op beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van het platform en de bijhorende diensten. Bovendien moet het platform verder ingericht worden als een schaalbare architectuur die het jaar na jaar sterk stijgend gebruik structureel kan opvangen.

Een verhoogde bedrijfszekerheid draagt ook bij tot de ambitie, zoals beschreven in de Beleidsnota 2019-2024 ICT en Facilitair Management, om van dit deelplatform dé data-draaischijf te maken voor de uitwisseling van unieke gegevens binnen de Vlaamse publieke sector, waaronder de steden en gemeenten, en met de federale dienstenintegratoren, om zo de data-uitwisseling voor alle overheidsactoren te verbeteren en de transitie naar een volledig digitale overheid mogelijk te

maken.

Binnen het voorliggende project worden een aantal stappen versneld en in parallel uitgevoerd:

1. de zogenaamde asynchrone diensten, die onder andere bulkbevragingen van authentieke bronnen mogelijk maken of het aanleveren van verschilbestanden om data in systemen van de gebruiker actueel te houden, worden gemoderniseerd en overgezet naar de nieuwe architectuur. Dit zorgt niet alleen voor een lagere toekomstige operationele onderhoudskost per dienst, maar ook voor kortere doorlooptijden (en bijhorende investeringskosten) bij het ontwikkelen van nieuwe diensten voor de datagebruikers.
2. Voor professionele gebruikers die veel parallele aansluitingen opzetten, zoals dienstenleveranciers van lokale besturen, wordt het aansluitingsproces sterk vereenvoudigd en geautomatiseerd. Op die manier kan de doorlooptijd sterk ingekort worden zodat data snel in de processen van lokale besturen kunnen worden ingezet.
3. Voor kritische diensten die vandaag reeds gebruikt worden voor het uitrollen van het COVID19-vaccinatieplan werd een herstelplan (Disaster Recovery Plan) opgemaakt dat maximale beschikbaarheid van deze diensten garandeert. Dit herstelplan wordt nu verder uitgerold voor alle kritische diensten en het gegevensdelingsplatform ont dubbeld over twee, fysiek gescheiden, datacenters in Vlaanderen.
4. Bij het verwerken van persoonsgegevens op het MAGDA-gegevensdelingsplatform moeten de beveiligingsmaatregelen voortdurend mee evolueren met de laatste stand van zaken op vlak van cybersecurity. Om mogelijk gevoelige plekken te detecteren worden verschillende doorgedreven veiligheidscontroles uitgevoerd en eventueel gedetecteerde pijnpunten onmiddellijk aangepakt.

Op die manier wordt sneller tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de beoogde doelgroepen, aan de nieuwe noden die ontstaan zijn naar aanleiding van de COVID19-crisis en kan deze generieke component optimaal renderen binnen de respectieve digitale transformatieprojecten in het relanceplan.

Doorontwikkeling van het subsidieregister

De data die voor het subsidieregister (departement Financiën en Begroting) nodig zijn, worden uit diverse databronnen verzameld, onder meer uit de dossierbehandelingssystemen van de subsidieverstrekkende entiteiten (binnen het ESR-toepassingsgebied 'deelstaatoverheid S.1312'). Op het MAGDA-gegevensdelingsplatform wordt een generieke dienst voorzien voor het ontsluiten van informatie uit deze dossierbehandelingssystemen met maximale aandacht voor informatieveiligheid. Deze data zijn ook voor andere doeleinden interessant. Naast financiële gegevens voor het subsidieregister kunnen zo dossiergegevens over bijvoorbeeld vergunningen of sancties vanuit meerdere systemen samengebracht worden in één entiteitsoverschrijdend register. Om de informatie uit het subsidieregister op een geaggregeerde manier te ontsluiten naar data-analysesystemen wordt eveneens een bevragingdienst ontwikkeld die toelaat het subsidieregister op een informatieveilige manier te raadplegen.

Versneld gebruik van de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening'

Met de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening' wordt een nieuw ondersteuningsaanbod uitgewerkt dat maximaal is afgestemd op de noden van de Vlaamse overheid en optimaal inspeelt op het huidige marktaanbod. Ook nieuwe klanten moeten vlot kunnen instappen. Daarom worden voor nieuwe klanten binnen het project "achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamovereenkomsten" (VV056)

PROJECTOMSCHRIJVING

business cases uitgewerkt die nagaan welke diensten en/of systemen uit de raamovereenkomsten de grootste toegevoegde waarde opleveren voor hun digitale processen.

Vanuit het voorliggend project (VV058) zullen stimulansen worden voorzien om het instappen van nieuwe klanten in deze raamovereenkomsten te versnellen. De precieze aard van deze stimuleringsmaatregelen is afhankelijk van de uitkomst van de business cases en zullen in de tweede helft van 2022 via een bijkomende nota aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	3.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	<p>Operationele effecten op korte termijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verhogen van de bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform dat uitgroeit tot dé data-draaischijf voor de uitwisseling van unieke gegevens binnen de Vlaamse publieke sector, om zo de data-uitwisseling voor alle overheidsactoren te verbeteren en de transitie naar een volledig digitale overheid mogelijk te maken - Realisatie van generieke diensten voor het voeden en ontsluiten van het subsidieregister in beheer van het departement Financiën en Begroting. - nieuwe klanten kunnen vlot instappen in de raamcontracten 'gemeenschappelijke dienstverlening' (VV056).
Beoogde impact	Contact met overheid via internet - Versterken van dienstverlening lokale besturen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	<p>Het project heeft vertraging opgelopen door prioritering op COVID activiteiten, en daarnaast de beperkte beschikbaarheid van IT profielen op de arbeidsmarkt.</p> <p>De volgende mijlpalen zijn herpland naar uitvoering in 2022:</p> <p>Q1 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> -VV058.02 Generieke MAGDA-diensten gerealiseerd voor het voeden en ontsluiten van het subsidieregister. -VV058.02.01 - Generieke webdiensten voor het ontsluiten van data uit dossierbehandelingssystemen is beschikbaar <p>Q2 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> -VV058.02.02 - Webdienst voor het raadplegen van data in het subsidieregister is beschikbaar

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>Q3 2022</p> <p>-VV058.01.02 - Sterk vereenvoudigd aansluitingsproces voor professionele gebruikers is gerealiseerd</p> <p>Q4 2022:</p> <p>-VV058.01 Hogere garanties op vlak van bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform zijn gerealiseerd.</p> <p>-VV058.01.01 - Gemoderniseerde asynchrone bevragingdiensten zijn beschikbaar binnen de vernieuwde architectuur</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd
RRF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd
RRF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema
VV058.01 Hogere garanties op vlak van bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform zijn gerealiseerd.	2021 Q4	Vertraging
VV058.01.01 - Gemoderniseerde asynchrone bevragingdiensten zijn beschikbaar binnen de vernieuwde architectuur	2021 Q4	Vertraging
VV058.01.02 - Sterk vereenvoudigd aansluitingsproces voor professionele gebruikers is gerealiseerd	2021 Q4	Vertraging
VV058.01.03 - Uitrol van een herstelplan voor alle bedrijfskritische MAGDA-diensten is doorgevoerd	2021 Q4	Gerealiseerd
VV058.01.04 - Eventueel gedetecteerde pijnpunten op vlak van cybersecurity zijn aangepakt na het uitvoeren van doorgedreven veiligheidscontroles	2021 Q4	Gerealiseerd
VV058.02 Generieke MAGDA-diensten gerealiseerd voor het voeden en ontsluiten van het subsidieregister.	2021 Q4	Vertraging
VV058.02.01 - Generieke webdiensten voor het ontsluiten van data uit dossierbehandelingssystemen is beschikbaar	2021 Q3	Vertraging
VV058.02.02 - Webdienst voor het raadplegen van data in het subsidieregister is beschikbaar	2021 Q4	Vertraging

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
VV058.03. Goedkeuring Nota VR betreffende versneld gebruik van de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening'	2022 Q2	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.639.000 EUR
Uitvoering VEK	918.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.500.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV059 - DIGITALISERING ASSET MANAGEMENT AQUAFIN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Aquafin
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij - Departement Omgeving
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Een goede werking van de bovengemeentelijke afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen is cruciaal voor de waterkwaliteit in onze beken en rivieren. Een verdere digitalisering van het beheer is noodzakelijk om zowel financieel als functioneel de beste beslissingen te nemen op het vlak van onderhoud en investeringen. Zo houden we de infrastructuur op een efficiënte en duurzame manier in een goede toestand. De digitalisering ondersteunt hierdoor niet alleen het behoud van de verbeterde waterkwaliteit, het draagt ook bij tot het betaalbaar houden van de waterfactuur voor de burger.

Om de bovengemeentelijke afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in het Vlaamse Gewest in optimale toestand te houden zijn onderhoud en investeringen noodzakelijk. De gemiddelde leeftijd van leidingen, pompstations en afvalwaterzuiveringsinstallaties neemt bovendien toe. Om de budgetten die nodig zijn voor dit onderhoud en deze investeringen zo beperkt mogelijk te houden, richt het relanceproject zich op een versnelde digitalisering van het asset management. De data die hiermee gegenereerd worden geven inzicht in de toestand, betrouwbaarheid, kans op falen en verwachte levensduur van de infrastructuur. Dit maakt het mogelijk om slimmere, gerichtere en optimale onderhouds- en investeringsbeslissingen te nemen. Zo beperken we de kosten en kunnen we de waterfactuur de komende jaren betaalbaar te houden. Het digitaliseringsproject is daarnaast ook noodzakelijk om de verbeterde waterkwaliteit te verzekeren en te voldoen aan de Europese eisen voor de sanering van Stedelijk Afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG).

Het digitaliseringsproject bestaat uit 5 deelprojecten en loopt tot 2030 :

1. Assets – Levenscyclusbeheer & investeringsmanagement voor het maken optimale asset management investeringsbeslissingen
2. Assets - optimalisatie van onderhoud zodat het juiste onderhoud op het juiste moment wordt uitgevoerd en de effectiviteit van onderhoudswerkzaamheden verhoogt door precies op het goede moment in te grijpen, niet te vroeg maar zeker ook niet te laat. Het resultaat is een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de assets en hogere efficiëntie
3. Proces- en performantiemeting & opvolging wat onder meer zorgt voor een naadloze, kwalitatieve en toekomstgerichte data-uitwisseling met andere actoren binnen het volledige

PROJECTOMSCHRIJVING

watersysteem en zelfs daarbuiten

4. Portfolio planning bestaande infrastructuur incl. GIS-data-uitwisseling om infrastructuurkaarten beschikbaar te kunnen stellen via open data

5. BIM (Bouwwerkinformatiemodel) – Uitwerken van een digitale data flow met studiebureaus & aannemers door samen aan één gemeenschappelijk ontwerp te werken, met kwalitatieve masterdata die naadloos en digitaal doorstromen van ontwerp over As-Built tot onderhoud en beheer

Het project zal ingedeeld worden in enkele grote fasen ('agile' methodologie).

De kosten van dit project worden deels gedragen door reguliere middelen van Aquafin en deels via bijkomende financiering. Voor de projectdoelstellingen in deze legislatuur wordt de projectkost geraamd op 14,2 miljoen euro waarvan 2.3 miljoen euro met reguliere middelen van Aquafin. Via het relancebudget Vlaamse Veerkracht (VV059) wordt 9 mio EUR voorzien. Deze financiering focust zich voornamelijk op deelprojecten Asset – Levenscyclusbeheer (1), Assets – Optimalisatie Onderhoud (2) en Portfolio planning (4) en is in lijn met de Green Deal en digitale ambities van Europa. De middelen uit het relanceplan zijn hierbij essentieel om de ambities waar te maken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	9.000.000 EUR
Output	De functionaliteiten van het asset management digitaliseringsproject zijn bij Aquafin beschikbaar en worden gebruikt.
Outcome	Snelle en efficiënte beslissingen mogelijk maken met data zodoende de snelheid waarmee de investeringsbudgetten stijgen door ouder wordende zuiveringsinfrastructuur, zo beperkt mogelijk te houden en de waterkwaliteit te verzekeren.
Beoogde impact	Ecologische toestand oppervlaktewater - Toename digitale collectiedata - Efficiëntie Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Dit project werd op 19/11/2021 goedgekeurd door de Vlaamse Regering (beslissing VR 2021 1911 VV DOC.0153/1 - Digitalisering Asset Management Aquafin). De opdracht tot uitvoering wordt normaliter nog voor het eind van 2021 door minister Demir gegeven. Een eerste herverdeling voor een bedrag van 4,5 miljoen euro uit de relanceprovisie is aangevraagd voor de herverdeling van 10/12/2021.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Inhoudelijke nota voorgelegd aan de Vlaamse Regering	2021 Q4	Gerealiseerd		
RRF - Opdracht tijdig gestart : opdracht uitvoering + herverdeling middelen uit relanceprovisie	2021 Q4	Op schema		
Automatische koppeling met GIPOD van innames op openbaar domein bij geplande onderhoudswerken	2021 Q4	Op schema		
In gebruik name van nieuwe levenscyclusbeheer en onderhoudssoftware waarmee de gezondheidstoestand van de assets kan gemonitord worden; in eerste fase gebeurt dit op een deel van het totale patrimonium	2022 Q1	Op schema		
In kader van de nieuwe zelfcontrole, implementeert Aquafin een toekomstgerichte data uitwisseling voor analyseresultaten tussen de labo's die de analyses uitvoeren en Aquafin, en van Aquafin naar de VMM	2022 Q4	Op schema		
Aquafin neemt een nieuwe beheerstool in gebruik voor de opvolging en rapportering aan VMM van ecologische prestaties (EPI) van zijn operationele transport- en zuiveringsactiviteiten	2023 Q4	Op schema		
Aquafin hanteert een toekomstgerichte manier om gestructureerde data uit te wisselen met externe actoren zoals AWIS, GIPOD, Lokale besturen, ...	2023 Q4	Op schema		
Het Asset Management systeem is gekoppeld aan een digitale planningstool voor field medewerkers waardoor de dagelijkse onderhoudsactiviteiten en de vastgelegde onderhoudsstrategie optimaal op elkaar afgestemd zijn.	2023 Q4	Op schema		
Op basis van de data over de gezondheidstoestand van de assets beschikt Aquafin over een dynamisch Lange Termijn Asset Plan op een uitgebreid patrimonium waarmee de investeringsbehoeftes voor de bestaande assets in kaart gebracht worden.	2024 Q4	Op schema		
Een portfolio management systeem zorgt voor een optimalisatie van de Asset Management investeringen voor de komende 10 jaar	2024 Q4	Op schema		
RRF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar en bij Aquafin in gebruik	2025 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
De functionaliteiten van het asset management digitaliseringsproject zijn bij Aquafin beschikbaar en worden gebruikt.	100 %	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.500.000 EUR
Uitvoering VEK	4.500.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 9.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 2021 1911 VV DOC.0153/1 - Digitalisering Asset Management Aquafin

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV060 - VERSNELLING EN VERDERE UITBOUW VAN MIJN BURGERPROFIEL

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten Lokale besturen burgers ondernemers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Wat je bij een bank, Coolblue of Amazon kan, moet je bij de overheid ook kunnen. Een compleet overzicht zien van het aanbod, vlot kunnen zoeken, iets bestellen of aanvragen, je gegevens kunnen raadplegen, opvolgen waar je dossier zit. Alles in één overzicht. Eenvoudiger, duidelijker en sneller voor burgers en ondernemers.

De visie op zo'n virtueel, digitaal loket voor de overheid bevat een compleet, officieel en betrouwbaar overzicht vinden van:

- Alle dienstverlening van de overheid: premies, vergunningen, belastingen, zorgaanbod, ...
- Een overzicht van hun gegevens bij de overheid: woningen, diploma's, attesten, vergunningen, ...
- Het kunnen aanvragen en beheren van dienstverlening, het opvolgen van lopende dossiers en het ontvangen van berichten of documenten, ...

Alles kan zoveel mogelijk digitaal en via selfservice, waar en wanneer je wil.

Die visie is niet nieuw. Nieuw is dat dit voor het eerst binnen een haalbaar bereik ligt omdat er de voorbije jaren een noodzakelijke onderbouw is gemaakt, die daarvoor ontbrak. De komende 2 jaren kunnen we zo'n loket realiseren, en daarmee het labyrint van 800 loketten en sites laten vervellen tot een overzichtelijk en volledig, virtueel loket.

GEÏNTEGREERDE AANPAK

Bestaande loketten en sites worden niet herbouwd maar geïntegreerd en gelinkt tot één virtueel loket voor burgers, ondernemers en verenigingen. Door een aantal gemeenschappelijke componenten te hergebruiken en te werken aan standaardisatie van de data en informatiestromen, creëren we voor burgers, ondernemers en verenigingen de ervaring van een geïntegreerd digitaal loket, met centrale overzichten en toegangen.

Zo'n geïntegreerd loket werkt alleen als het volledig is. Concreet kan dit gebeuren door de gemeenschappelijke componenten van het loket via Informatie Vlaanderen aan te bieden. Overheidsinstanties kunnen voor hun communicatie met de burger deze componenten gebruiken. Zo kunnen instanties sneller loketfunctionaliteiten opzetten, kunnen ze ontzorgd worden en efficiëntie verhogen voor de Vlaamse overheid en lokale besturen.

PROJECTOMSCHRIJVING

Aan de voorkant is Mijn Burgerprofiel een inplugbare header die kan toegevoegd worden aan de bestaande sites en loketten. Daarmee geven we gestalte aan het “Be everywhere” principe: of een burger nu bij overheid A of B aanklopt, het is steeds de bedoeling dat hij het overzicht krijgt van “zijn zaken bij de overheid”. Mijn Burgerprofiel verhoogt de vindbaarheid van de overheidsdienstverleningen. Bovendien zorgt de multi-kanaalstrategie ervoor dat de burger dat kanaal kan kiezen dat het dichtst bij hem staat. Via Mijn Burgerprofiel wordt ook het e-loket voor ondernemers (en in de toekomst verenigingenloket bereikbaar: de globale header wordt gebruikt als aanmeldmethode voor zowel burgers als ondernemers (en in de toekomst verenigingen) als een laagdrempelige en veilige manier voor het aanmelden op de verschillende loketten en het vergemakkelijken van het wisselen van rol/hoedanigheid (een burger, een onderneming, een vereniging).

Aan de achterkant is het belangrijk dat de verschillende loketten gevuld worden met alle gegevens, documenten, berichten en dienstverlening. Daarvoor biedt Informatie Vlaanderen de nodige componenten om Vlaamse en lokale hun dienstverlening aan te sluiten op de centrale oplossingen. Via de modernste API's kunnen entiteiten hun applicatie aansluiten op de gemeenschappelijke “App Store” in Mijn Burgerprofiel en e-loket voor ondernemers.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	10.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	Een efficiënte en digitale overheid die op snelle en correcte wijze kan communiceren met haar stakeholders (burgers, ondernemers,...).
Beoogde impact	Vertrouwen in de Vlaamse overheid - Efficiëntie Vlaamse overheid (imago) - Contact met overheid via internet - Toegankelijkheid Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het 'no wrong door' principe wordt verder uitgerold. Intussen al bij 154 lokale besturen en 24 entiteiten. Nieuwe functionaliteiten worden opgeleverd: betaalinformatie bij eBox documenten, aanvraagformulieren invullen in Mijn Burgerprofiel en nieuwe types notificaties en attesten. Ook heel wat back-end aansluitingen vanuit Vlaamse en lokale besturen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL			TIMING	STATUS
50 lokale en 50 Vlaamse aansluitingen langs de proces-kant worden gerealiseerd in Mijn Burgerprofiel in de meest relevante levensgebeurtenissen tegen eind 2021 (wonen, bouwen, energie, fiscaliteit, onderwijs).			2021 Q4	Op schema
De helft van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen is aangesloten voor de front-kant van Mijn Burgerprofiel (header-integratie).			2021 Q4	Op schema
Er is een dalende doorlooptijd van aansluitingen op Mijn Burgerprofiel.			2021 Q4	Op schema
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten			2022 Q4	Op schema
Elke Vlaamse entiteit en lokaal bestuur ontsluit Mijn Burgerprofiel via de Global header (front-kant)			2022 Q4	Nog niet gestart
Alle relevante dienstverleningen van de Vlaamse en lokale overheden zijn aangesloten op Mijn Burgerprofiel (proces-kant)			2022 Q4	Nog niet gestart
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep				
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
De helft van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen is aangesloten voor de front-kant van Mijn Burgerprofiel (header-integratie).	150 lokale besturen	2021 Q4	154	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.000.000 EUR
Uitvoering VEK	2.982.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 8.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12 maart 2021 - Mijn burgerprofiel - nota](#)

[VR 12 maart 2021 - Mijn burgerprofiel - bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV061 - DATANUTSBEDRIJF

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle Vlaamse entiteiten, lokale besturen en ondernemingen die gebruik maken van de persoonlijke gegevens alsook de personen in kwestie zelf.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Oprichting van het Datanutsbedrijf Vlaanderen. Het Datanutsbedrijf Vlaanderen is een intelligente verkeerswisselaar van data die ervoor zorgt dat er een gelijk data-speelveld is voor alle publieke en private spelers binnen aangesloten ecosystemen. Het vertrouwen in de data-economie wordt geborgd door een neutrale derde partij – het datanutsbedrijf – op te richten die data-deling binnen verticale sectoren en tussen sectoren binnen bereik kan brengen zonder dat bedrijven, organisaties en overheden in dit ecosysteem de controle over de toegang tot hun data verliezen. Data is de grondstof van de nieuwe maatschappij en economie maar die ruwe grondstof moet verder bewerkt worden, aan kwaliteitsstandaarden beantwoorden en moet binnen GDPR en PSI richtlijnen vlot kunnen stromen, zoals andere nutsvoorzieningen, om maximaal van waarde te zijn in nieuwe business modellen. Een digitaal kluzensysteem, toestemmingsmechanismen en een dataverbruiksvergoeding zijn hiervan de hoekstenen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	23.000.000 EUR
Output	- Het datanutsbedrijf als betrouwbare/centrale/neutrale verkeerswisselaar van data - Implementatie van Datakluzen en diverse initiatieven daaromtrent
Outcome	- Optimaal consulteren/beheren van data, data consent > vertrouwen - Efficiënter gebruik van data over diverse partijen heen > efficiëntere werking - Diverse projecten omtrent datakluzen > specialisatie (kennis) en tewerkstelling
Beoogde impact	VLAANDEREN DIGITAAL TRANSFORMEREN - DE OVERHEID EFFICIËNTER MAKEN - Efficiëntie Vlaamse overheid (imago) - Vertrouwen in de Vlaamse overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het Datanutsbedrijf is 'in oprichting'. Na gunstig advies van Inspectie Financiën en Begroting, heeft het dossier een eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering gekregen op 26 november 2021. We voorzien de effectieve opstart van het bedrijf eind Q2 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Eerste principiële goedkeuring projectdossier op de Vlaamse Regering van 26 november 2021	2021 Q4	Gerealiseerd
Tweede principiële goedkeuring van het projectdossier door de Vlaamse Regering.	2022 Q1	Nog niet gestart
Definitieve goedkeuring van het projectdossier 'Oprichting Datanutsbedrijf' door de Vlaamse Regering.	2022 Q2	Nog niet gestart
Parlementaire bekrachtiging van het projectdossier 'Oprichting Datanutsbedrijf'.	2022 Q2	Nog niet gestart
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.974.000 EUR
Uitvoering VEK	2.445.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 19.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 29 januari 2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De beide onderdelen van het digitaliseringsproject zijn gericht op de procespartijen, dit zijn in eerste instantie burgers en ondernemingen (die betrokken zijn in onze procedures), maar eveneens op hun raadsmanen (advocaten, consultants, architecten, ...) en op overheden (bijv. de overheidsinstantie waarvan de beslissing wordt aangevochten of wiens advies niet is gevolgd, ...). Zij vormen de primaire doelgroep. De secundaire doelgroep zijn burgers en ondernemingen in het algemeen. Een digitale, transparante, rechtszekere en snelle Vlaamse bestuursrechtspraak draagt bij aan een beter ondernemings- en investeringsklimaat.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) overkoepelt en ondersteunt drie Vlaamse bestuursrechtscolleges: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het doel van het digitaliseringsproject is (de procedures in het kader van) de Vlaamse bestuursrechtspraak de komende twee jaar verder, extern te digitaliseren, na een eerste, interne digitaliseringsbeweging. Het project kent twee onderdelen: de bouw van een digitaal platform voor de dossierbehandeling en de bouw van een (interne en externe) kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie.</p> <p>Het digitaal platform moet het voor burgers, overheden, advocaten, ... mogelijk maken de volledige, juridische procedure bij de rechtscolleges digitaal te voeren: digitaal indienen en ontvangen van processtukken, onmiddellijke betaling rolrecht, toegang tot een volledig digitaal dossier, termijnberekening, zittingskalender, overzichten van lopende dossiers voor advocatenkantoren, ... Het platform zal tevens gebruik maken van of aansluiten op andere Vlaamse toepassingen zoals o.a. het Vlaams Toegangsbeheer en het Omgevingsloket.</p> <p>De kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie moet zorgen voor een betere ontsluiting van de rechtspraak, zodat procespartijen (burgers, overheden, advocaten, ...) deze makkelijker kunnen</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

consulteren en gebruiken bij de voorbereiding van hun processtukken (extern) en zodat de rechtscolleges vlotter nieuwe arresten kunnen opmaken (intern).

Beide onderdelen van het digitaliseringsproject vergen een substantiële investering.

Het eerste onderdeel van het project vergt ook een brede hervorming van de regelgeving, meer bepaald van het DBRC-decreet en -procedurebesluit. De hervorming van de regelgeving zal hand in hand gaan met de technische ontwikkeling van het digitaal platform en zal ertoe leiden dat de procedure herwerkt wordt en volledig uitgaat van een digitale procesvoering, met een eventuele, analoge (papieren) stroom als uitzonderingsregime (bijv. voor kwetsbare groepen die onvoldoende toegang hebben tot digitale middelen).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.600.000 EUR
Output	
Outcome	
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Access to Flemish Justice - ontwikkelen digitaal platform voor een volledige juridische procedure	2022 Q3	Op schema
Access to Flemish Justice - optimaliseren kennisdatabank voor betere ontsluiting rechtspraak	2024 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.600.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 1.600.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit - advies](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021. Bijlage. Strategische digitaliseringsroadmap DBRC](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle actoren betrokken bij de vergunningsprocedures, inclusief de burger en verenigingen in het kader van het inzagerecht

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Zowel in het kader van de coronamaatregelen met moeilijke toegang tot de gemeentehuizen voor inzage in omgevingsprojecten in het kader van openbaar onderzoek of de bekendmaking van een beslissing, als met het oog op een betere inspraakmogelijkheid voor de burger, dient het huidige ‘publiek loket’ van het Omgevingsloket herwerkt te worden. Dit ‘publiek loket’ was immers initieel niet bedoeld als platform voor digitale inzage in de omgevingsprojecten zelf, maar om op basis van enkele identificatiegegevens het digitaal indienen van bezwaarschriften of beroepschriften van derden te ondersteunen.</p> <p>Daarom zal een nieuwe toepassing ontwikkeld worden die de burger een nieuwe gebruikerservaring geeft en een beter inzicht in de aangevraagde omgevingsprojecten.</p> <p>Naast een betere dienstverlening in het kader van openbare onderzoeken en bekendmakingen is het tevens de bedoeling om de nodige tools aan te reiken aan instanties met inzagerecht op lopende projecten (adviesinstanties, wooninspectie, handhaving, politiediensten, ...) en inzage in het kader van openbaarheid van bestuur.</p> <p>De complexiteit van vergunningsaanvragen en de bijhorende procedure stellen bijzondere eisen aan de gebruiksvriendelijkheid en visualisatie op beperkte schermen. Daarnaast dienen specifieke oplossingen uitgewerkt te worden om auteursrechtelijk beschermde plannen te kunnen visualiseren met respect voor de intellectuele rechten.</p> <p>Het is de bedoeling om rechtstreeks inzage te verlenen in het huidige ‘burgerloket’ zonder dat data nog hoeven ‘gekopieerd’ te worden naar het ‘publiek loket’, rekening houdend met de verschillende rechten.</p> <p>Aansluitend bij de aangepaste ‘inzage-tool’ is het tevens de intentie om in het kader van een betere dienstverlening ook de ‘omgevingscheck’ te herwerken. Deze ‘omgevingscheck’ was initieel enkel bedoeld om zicht te krijgen op geldende voorschriften en</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

de mogelijke impact van adviesverlening voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. In het kader van de omgevingsvergunning is de 'omgevingscheck' echter ook een essentiële en wettelijk verplichte tool geworden voor MER-screening en de mogelijke impact van handelingen en activiteiten op de omgeving. In dat kader zal de performantie, stabiliteit, configuratie-mogelijkheden en kwaliteit van de 'omgevingscheck' verbeterd worden door een verdere integratie in het Omgevingsloket.

Dit deelproject wordt uitsluitend gefinancierd met de relancemiddelen. Het verdere onderhoud van de gerealiseerde toepassingen en eventuele bijkomende functionaliteiten worden opgenomen in de reguliere middelen van het project.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.000.000 EUR
Output	De realisatie van 2 deeltoepassingen bij het Omgevingsloket, met name het 'inzageloket' en de 'omgevingscheck 2.0'
Outcome	Dankzij de twee vernieuwde toepassingen zullen de burgers en bedrijven in de eerste plaats online en 24/7 inzage hebben in de vergunningsaanvragen die in openbaar onderzoek zijn of waarvoor de beroepstermijn van toepassing is, zonder zich nog naar het gemeentehuis te dienen begeven zoals dat vandaag het geval is. Tegelijkertijd zal men beter inzicht krijgen over mogelijke impact van omgevingselementen op de geplande projecten
Beoogde impact	Contact met overheid via internet - Toegankelijkheid Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De back-end van de Omgevingscheck 2.0 is gerealiseerd en in productie. Het inzage-loket is in ontwikkeling en op schema.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Functionele analyse inzageloket	2021 Q3	Gerealiseerd
Functionele analyse 'omgevingscheck 2.0'	2021 Q3	Gerealiseerd
herwerkte tool 'Omgevingscheck'	2021 Q4	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL			TIMING	STATUS
implementatie nieuwe toepassing 'inzage loket' in omgevingsprojecten			2022 Q3	Op schema
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Contact met overheid via internet		2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	999.000 EUR
Uitvoering VEK	429.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Het Omgevingsloket digitalisering inzage-loket en omgevingscheck

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV064 - FIT – DATAGEDREVEN ORGANISATIE EN DIGITALISERING DIENSTVERLENING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	Dit project is bedoeld voor de Vlaamse ondernemer die internationaal wil ondernemen alsook de buitenlandse ondernemer die in Vlaanderen wil investeren.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Meer dan ooit moeten wij de klanten snel en doelgericht helpen. Flanders Investment & Trade (FIT) wil een sterke klantgedreven organisatie zijn die wendbaar is voor de toekomst en robuust kan inspelen op onvoorziene bedreigingen voor Vlaamse bedrijven en de Vlaamse economie, zoals Covid-19, Brexit, en wereldwijd groeiend protectionisme.</p> <p>Beperkingen op het verkeer van mensen, goederen en diensten en inperkingsmaatregelen zorgen regelmatig voor verstoring in productie en vraag. De impact op toeleveringsketens, grondstoffen en een lager vertrouwen door disrupties zoals een pandemie of macro-economische gebeurtenissen is groot.</p> <p>Dit project moet de Vlaamse ondernemer herlanceren op het internationale terrein. FIT wil daarom versneld inzetten op digitalisering om zijn dienstverlening nog toegankelijker en meer gepersonaliseerd te maken, de impact van prospectie te verhogen, matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse zakenpartners te faciliteren enz. Het Agentschap investeert in verdere digitalisering en Artificiële Intelligentie (AI) in zowel business processen als in het faciliteren van contacten met klanten.</p> <p>DG Reform lanceerde in September 2019 een project “Blue Print for artificial intelligence adoption at Flanders Investment & Trade”, dat werd afgerond in juli 2020. Het resultaat was een AI-roadmap om de dienstverlening van FIT te versterken aan de hand van 4 pijlers: digital skills, datagedreven, optimalisatie businessprocessen en vergroten van de klanteninteractie. Dit project, VV064, werkt verder op de verworven inzichten.</p> <p>Dankzij een doorgedreven digitalisering van business processen is de dienstverlening van FIT 24/7 toegankelijk. Met een hoofdzetel in Brussel, kantoren in de vijf Vlaamse provincies en een uitgebreid wereldwijd netwerk neemt FIT in het landschap van Vlaamse overheidsinstellingen een bijzondere plaats in: ‘FIT never sleeps’. Verdere digitalisering kan de kloof tussen Vlaanderen en</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

lokale business communities wereldwijd dicht. Een virtuele wereld waar virtuele matching tussen bedrijven de norm is, verbetert bovendien de ecologische impact: minder fysieke zakenreizen, meer en kortere communicatielijnen tussen binnen- en buitenland. Transparant en snel, gevrijwaard van hinderlijke data-silo's, en maximaal gebruikmakend van uniforme, in de cloud draaiende business tools. Dat is cruciaal om de Vlaamse export en economie niet te laten ontsporen, en investeringsstromen naar Vlaanderen niet te laten stilvallen. Nu meer dan ooit moet er geïnvesteerd worden om de digitale omslag te maken en voorsprong te realiseren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.000.000 EUR
Output	<p>Aan de hand van betere data: verrijking van klantenbestand (70% van de accounts) en gebruik van digitale ondernemingsfoto om de klant gericht te bedienen;</p> <p>Aan de hand van meer data: lerende algoritmes om predictieve analyses te maken over de customer journey van een bedrijf;</p> <p>Aan de hand van geconnecteerde data: matchingplatform waarmee de Vlaamse ondernemers sneller connecteren met buitenlandse zakenpartners;</p> <p>Opzet van een digitaal marketingplatform om met de juiste klanten op het juiste moment en op de juiste manier te communiceren;</p> <p>Uitrol intern trainingplatform om de digitale vaardigheden in de organisatie te verbeteren;</p> <p>Lancering van een performant informatiesysteem over internationaal ondernemen.</p>
Outcome	Meer gedigitaliseerde, dynamische, interactieve en doeltreffende dienstverlening op maat van de klant.
Beoogde impact	Vertrouwen in de Vlaamse overheid - Efficiëntie Vlaamse overheid (imago) - Contact met overheid via internet - Toegankelijkheid Vlaamse overheid (imago) - Aandeel innoverende bedrijven in de industrie- en dienstensector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project zit op schema: de eerste technische analyses voor de online promotieplatformen zijn lopende; de use cases voor een marketing journey zijn bepaald; de interne 'FIT Business Academy' is opgezet en de eerste trainingen om digitale skills aan te scherpen staan klaar.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL			TIMING	STATUS
Doelstelling 1a: Ken de klant (Customer Intimacy) via “ACCOUNTMANAGEMENT VOOR SOURCING”. Om de (top)bedrijven te identificeren, sourcinglijsten te maken en de matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse spelers te faciliteren, verkrijgen we de accounts met meer en betere data.			2022 Q4	Op schema
Doelstelling 1b: Ken de klant (Customer Intimacy) via “PREDICTIEVE MODELLEN AI”. We maken algoritmes om signalen te capteren van potentiële investeerders en van nieuwe Vlaamse exporteurs.			2022 Q4	Op schema
Doelstelling 2: Engageer de klant via “MyFIT-PROMOTIETOOL EVENPLATFORM”. FIT wil minder fysieke en nog meer online B2B contacten tussen Vlaamse bedrijven en potentiële zakenpartners in het buitenland.			2022 Q4	Op schema
Doelstelling 3: Bereik de klant via “DIGITAL PERSONALIZED & ACCOUNT BASED MARKETING”. Om de klant op maat te bedienen en te bereiken en onze impact te maximaliseren, zetten we in op “next generation” digitale marketing, gebaseerd op customer centric data.			2022 Q4	Op schema
Doelstelling 4: Werk vlot voor de klant via “TRAINING IN DIGITAL SKILLS”. Efficiënte bediening van de klant veronderstelt een digitale transformatie zodat data ingezet worden om de dienstverlening te verbeteren (“Lead by Example”). Bedrijven moeten digitalisering integreren in hun internationale business modellen, de markt voor digitale export ligt open.			2022 Q4	Op schema
Doelstelling 5: Informeer de klant via “KENNISBEHEER”. Digitale ontsluiting voor de klant van marktkennis via cognitive search			2022 Q4	Op schema
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
DIGITALE VAARDIGHEDEN - Implementatie van een trainingtool om digitale vaardigheden te verbeteren	In gebruikname van de trainingtool	2022 Q3		60 %
ACCOUNTBEHEER - Creatie van een digitale Ondernemingsfoto van de actieve FIT-klanten	80% van de klanten hebben een digitale ondernemingsfoto	2022 Q4		20 %
ACCOUNTBEHEER - Afwerking van de gemeenschappelijke FIT-VLAIO Ondernemingsfoto	VLAIO-FIT Ondernemingsfoto in gebruik	2022 Q4		80 %
KENNISBEHEER - Ontwikkeling van een informatiesysteem om	Lancering van informatiesysteem	2022 Q4		10 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
informatie op een efficiënte wijze te verzamelen	met performante zoekrobots			
DIGITALE VAARDIGHEDEN - Ontwikkeling van een monitoringssysteem van de digitale vaardigheden (nulmeting en tussentijdse metingen) van de personeelsleden	60% van de personeelsleden maakt vooruitgang	2022 Q4		20 %
ACCOUNTBEHEER - Verrijking van accounts uit het klantenbestand met informatie nuttig om op maat te kunnen bedienen (o.a. over exportlanden)	70% van de accounts zijn verrijkt	2022 Q4		20 %
ACCOUNT BASED MARKETING - Monitoring van de ontvangst bij de klant van de marketingcampagnes	BI Dashboard om effectiviteit te monitoren	2022 Q4		
ACCOUNTBEHEER - Creatie van een digitale lijst met Vlaamse bedrijven in een bepaalde sector en in een bepaald land	Digitale zoekmodule om Vlaamse bedrijven te identificeren	2022 Q4		10 %
ACCOUNT BASED MARKETING - Naast brede campagnes maken we meer gebruik van gerichte communicatie, op maat van de klant, zodat elk bericht, via welk medium ook, zoveel mogelijk toegespitst is op diens behoeften	Meer gerichte marketingtrajecten met duidelijke kwantitatieve doelstellingen	2022 Q4		10 %
DIGITALE PLATFORMEN - Lancering van een vernieuwd MijnFIT profiel waar de klant zelf zijn promotie kan beheren	Vernieuwd MijnFIT-profiel met maximale opties is gelanceerd	2022 Q4		40 %
DIGITALE PLATFORMEN - Succesvolle in productiestelling en implementatie van het interactieve promotieplatform	65% van de actieve klanten maakt vlot gebruik van een promotieplatform	2022 Q4		25 %
LEAD ONTWIKKELING en SCORING - Creatie van dashboards waar	Creatie van Dashboard met leads en scoring	2022 Q4		5 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
opportunities ("leads") voor Vlaamse bedrijven en potentiële buitenlandse investeerders vatbaar worden weergegeven				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	266.000 EUR
Uitvoering VEK	3.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 18 juni 2021. Visie FIT–Datagedreven organisatie & Digitalisering dienstverlening

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV065 - CYBERSECURITY EN UITROL SIEM

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om te beschikken over een veilig en privacybestendig aanbod van digitale diensten, rekening houdend met de evoluerende bedreigingen en technologische vernieuwingen. We voeren daarom een aantal cruciale initiatieven en verbeteringen door op vlak van informatieveiligheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	2.500.000 EUR
Output	Zie mijlpalen.
Outcome	Robuuste goed beveiligde en gemonitorde ICT-omgeving die bestand is tegen aanvallen.
Beoogde impact	Vertrouwen in de Vlaamse overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Globaal gezien zit het project op schema. De voornaamste activiteiten voor dit project situeren zich in 2022.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema
Verdere uitbouw van informatieclassificatie-raamwerk	2022 Q4	Op schema
Opbouw standaardrapportering en centraal dashboard voor veiligheidsrisico's	2021 Q4	Vertraging
Ontwikkeling instrument voor self-assessment	2022 Q2	Op schema
Ontwikkeling proces en tooling voor conformiteitstoetsing	2022 Q2	Op schema
Communicatie -en bewustmaking campagne met betrekking tot informatieveiligheid	2021 Q4	Vertraging
Uitrol SIEM: koppeling met bedrijfsapplicaties en kritieke infrastructuurcomponenten	2022 Q4	Op schema
Uitrol SIEM: Activeren, trainen en optimalisatie van de motor voor artificiële intelligentie via log analytics	2022 Q4	Op schema
Verdere optimalisatie en inrichting van centraal log management conform vereisten i.k.v wetgeving en informatieveiligheid.	2022 Q2	Op schema
Verdere uitbouw van encryptiebouwstenen zodat de vertrouwelijkheid van gegevens gegarandeerd blijft	2022 Q4	Op schema
Verdere integratie en uitbouw van PAM zodat er steeds controle is op beheerderstoegangen voor zowel infrastructuur als toepassingen, api's	2022 Q4	Op schema
Verdere uitbouw Certificatenbeheer	2022 Q2	Op schema
Uitvoering penetratietesten en het koppelen van de veiligheidsbouwstenen aan geïdentificeerde risico's	2022 Q4	Op schema

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Self-service portaal voor klanten: self-assessment, maturiteitsscan, onboarding, opvolging en beheer van risicomaatregelen afgestemd op self-assessment en maturiteitsscan	2022 Q4	Op schema
Levenscyclusbeheer van RPA identiteiten via de veiligheidsbouwstenen.	2022 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.500.000 EUR
Uitvoering VAK	639.000 EUR
Uitvoering VEK	511.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.100.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Cybersecurity en uitrol SIEM

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV066 - HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit relanceproject voorziet in gerichte investeringen in de mogelijkheden om plaats -en tijdsonafhankelijke dienstverlening te organiseren, ter ondersteuning van de Vlaamse overheid en lokale besturen in hun digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening naar de burgers, ondernemers en verenigingen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	Na uitvoering van het project wordt het hybride werken maximaal ondersteund en wordt een performante datagedreven overheid op niveau van de werkplekken gefaciliteerd.
Beoogde impact	Personeel Vlaamse overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op schema, de realisatie van de meeste mijlpalen zijn gepland in 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema
Plaats- en tijdsafhankelijk werken - migratie centrale AD naar de cloud.	2022 Q4	Op schema
Data- gedreven werkplek : VV066.02.01 Ontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Low code en Self-service analytics'	2022 Q4	Op schema
Digitale inkomende post - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Digitale inkomende post'	2022 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Hybride digitale werkplek

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV067 - MODERNISERING CLOUD- EN NETWERKINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om te beschikken over een digitaal platform van modulaire, herbruikbare en aanpasbare infrastructuur en services, rekening houdend met de behoeften van de relanceprojecten. We voeren daarom een aantal cruciale modernisering en verbeteringen door in de digitale infrastructuur van de Vlaamse overheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	3.500.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	Gemoderniseerde ICT netwerk- en cloudinfrastructuur die maximaal is geconsolideerd zodat een efficiënte, innovatieve en geïntegreerd ICT-basisinfrastructuur is gerealiseerd.
Beoogde impact	Personeel Vlaamse overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle mijlpalen voorzien in 2021 zijn gerealiseerd. Voor de mijlpalen die in de toekomst liggen, zit het project op schema.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema
De migratie en modernisering van het legacy datacenter NMC4	2021 Q3	Gerealiseerd
De migratie van de virtual private cloud naar een hybride cloud infrastructuur	2022 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.500.000 EUR
Uitvoering VAK	1.505.000 EUR
Uitvoering VEK	1.052.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.900.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Modernisering cloud -en netwerkinfrastructuur

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV068 - KALEIDOS – DIGITALISERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE VLAAMSE REGERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Financiën en Begroting - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Direct: Kabinetten van de ministers van de Vlaamse Regering Departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid Inspectie van Financiën Vlaams Parlement Strategische adviesraden Rekenhof & Raad van State Andere overheden Indirect: Ruimere publiek (professionelen, burgers e.a.)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Kaleidos zet in op het digitaliseren van de administratieve processen bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering en de ontsluiting van de bijhorende data. Het gaat om volgende processen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agendering & opvolging van de ministerraad van de Vlaamse Regering • Publicaties in het Belgisch Staatsblad • Digitale ministerraad • Dossierflow binnen de kabinetten • Communicatie van de beslissingen van de Vlaamse Regering, inclusief toegang tot de bijhorende publieke documenten • Dossierflow tussen Vlaamse Regering en Vlaams Parlement (m.b.t. besluitvorming) • Connectie met KRAB-toepassing voor adviezen van de Inspectie van Financiën • Adviezen van de Raad van State en wetgevingstechnisch advies • Koppeling met het Digitaal Archief Vlaanderen <p>Gezien het belang van de dossierstromen en de data wordt ook geïnvesteerd in de redundantie van de applicatie.</p> <p>Het nieuwe datamodel is ontwikkeld en de migratie van de data is al grotendeels gebeurd, maar nog niet operationeel. Met de Relancemiddelen worden volgende doelstellingen gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering van de diverse work flows en documenten • Ontsluiting van data

PROJECTOMSCHRIJVING

Een belangrijk aandachtspunt, gezien de diverse gebruikersgroepen, is de performantie van de applicatie

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	2.400.000 EUR
Output	Digitaliseren van de administratieve processen bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering en de ontsluiting van de bijhorende data.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • De administratieve ondersteuning verloopt efficiënter en correcter: de papieren flow verdwijnt waardoor het proces sneller en efficiënter wordt. Werken vanop afstand wordt mogelijk. De ministerraad kan volledig digitaal verlopen wanneer nodig. De documenten worden slechts op één plaats bewaard, waardoor het risico op fouten sterk beperkt wordt. Raadpleging van regeringsdocumenten verloopt veel vlotter. De gebruiksvriendelijkheid wordt groter. • Communicatie over regeringsbeslissingen verloopt sneller en efficiënter door rechtstreekse ontsluiting via diverse overheidstoepassingen. • De transparantie van de besluitvorming verhoogt door de documenten beter toegankelijk te maken. Door te werken met een semantisch verrijkt datamodel kunnen data hergebruikt worden in andere toepassingen. Ze kunnen op die manier vlot ontsloten worden naar andere overheden, burgers e.a.
Beoogde impact	Efficiëntie Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De stuurgroep legde de prioriteiten vast met het oog op een meer gerichte inzet van de beschikbare middelen en het afwerken van modules.</p> <p>Met het in gebruik nemen van het dataportaal Themis werd een belangrijke stap gezet. De beschikbare data kunnen nu door andere toepassingen gebruikt worden. Ook de genormaliseerde dataset van alle ministers staat in productie zodat retroactieve invoer van historische data mogelijk is. De focus van het ontwikkelwerk ligt nu op de module 'publicaties'.</p> <p>De projectorganisatie werd geoptimaliseerd met o.m. de start van een nieuwe Product Owner en de organisatie van workshops waar business, ontwikkelaars en designers samen aan tafel zitten. Zo wordt de afstemming tussen de noden van de business en ontwikkeling beter verzekerd. Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan de performantie.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Het Relanceproject VV068 - Kaleidos is goedgekeurd door de Vlaamse Regering	2020 Q2	Gerealiseerd
De data uit het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering die beschikbaar zijn in Kaleidos zijn ontsloten voor hergebruik door andere applicaties (zowel binnen overheid als publiek) via het publieke dataportaal Themis	2021 Q4	Gerealiseerd
De toepassing is redundant	2021 Q4	Op schema
Het publicatieproces voor decreten, besluiten e.d. kan volledig digitaal verlopen	2022 Q1	Op schema
Historische data kunnen retro-actief ingevoerd worden	2022 Q1	Op schema
Documenten kunnen digitaal getekend worden in Kaleidos	2022 Q3	Op schema
De dossierstroom voor regelgevende dossiers tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement kan digitaal verlopen	2022 Q3	Op schema
De beslissingen van de Vlaamse Regering kunnen via Kaleidos bekend gemaakt worden	2022 Q4	Op schema
De Secretarie kan de voorbereiding en afhandeling van de dossierstroom voor de Ministerraad volledig afhandelen in Kaleidos	2022 Q4	Op schema
De Ministerraad kan online verlopen.	2023 Q1	Op schema
De kabinetten kunnen de dossierstroom voor de Ministerraden volledig digitaal verwerken in Kaleidos	2023 Q1	Op schema
Een eerste onderdeel van adviesverlening is voorzien in of gekoppeld met Kaleidos	2023 Q1	Nog niet gestart
De koppeling met het webplatform voor publieke ontsluiting van de beslissingen van de Vlaamse Regering is gerealiseerd	2023 Q3	Op schema
Er is een koppeling tussen Kaleidos en het Digitaal Archief Vlaanderen	2023 Q3	Nog niet gestart
Kaleidos is toegankelijk voor alle relevante doelgroepen (overheid)	2022 Q3	Op schema
Er is een formeel goedgekeurd project closure/completion document beschikbaar voor het relanceproject VV068	2025 Q4	Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Gebruikers van nieuwe en opgewaardeerde diensten, producten en processen		2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.400.000 EUR
Uitvoering VAK	1.760.000 EUR
Uitvoering VEK	268.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Kaleidos. Activiteiten en budget 2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV069 - DATA INTEGRATIEDIENSTEN VOOR SLIMME MOBILITEIT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse regering heeft zich op het vlak van mobiliteit ambitieuze doelstellingen gesteld waaronder een modal shift om Vlaanderen en haar steden leefbaar te houden. Hierbij wordt mobiliteit als een dienst (Mobility-as-a-service, MaaS) vooropgesteld waarbij een gebruiker via digitale kanalen, zoals de Mobiliteitscentrale, eenvoudig meerdere types mobiliteitsdiensten kan combineren tot de meest efficiënte oplossing om zich van punt A naar punt B te verplaatsen

Om deze combimobiliteit mogelijk te maken, moet iedere vervoerder en/of MaaS-aanbieder kunnen beschikken over kwalitatieve en integreerbare data over zowel het volledige aanbod, publiek én privaat, als actuele data over bijvoorbeeld de positie van deelfietsen of bussen of filevorming. Met het relanceproject 'Data integratiediensten voor slimme mobiliteit' (VV069) wordt een gestandaardiseerde oplossing voor deze data-uitwisseling tussen alle betrokken partijen mee gerealiseerd. Door deze investering te realiseren in de context van dit relanceproject, zorgt het project voor de kickstart van het data-ecosysteem en de noodzakelijke inspanningen op het vlak van interoperabiliteit en herbruikbaarheid die door de private sector als complex en niet rendabel worden geacht. Hiermee wordt de data-deling voor Mobiliteit zowel voor publieke als private actoren naar een hoger niveau getild en kunnen deze partijen zich naar de toekomst toe richten op meerwaardediensten in het mobiliteitsveld.

Het voorliggend relanceproject maakt hiervoor gebruik van de publicatiestraat en de ecosysteemwerking die het resultaat zijn van het relanceproject 'Vlaamse Sensor Data Space' (VV073). Door de mobiliteitsdatastromen te standaardiseren en via de Vlaamse Sensor Data Space ter beschikking te stellen, moeten aanbieders die in verschillende (vervoers-)regio's actief zijn hun data maar één keer delen waarna de mobiliteitsdata vlot beschikbaar en herbruikbaar worden voor alle aanbieders van oplossingen voor combimobiliteit.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	5.000.000 EUR
-------	---------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	<p>Binnen het project worden datastromen gerealiseerd ten behoeve van de Mobiliteitscentrale en Hoppin. Tegelijk wordt ingezet op adoptie van de datadiensten bij lokale besturen door hergebruik binnen de eigen toepassingen mogelijk te maken. Dit wordt concreet toegepast bij de Stad Antwerpen. Via de ecosysteemwerking wordt actief gezorgd voor het delen van de geleerde lessen met zowel andere steden en gemeenten, als mobiliteitsaanbieders.</p> <p>Daarnaast zorgt het project voor het ontsluiten van geanonimiseerde verkeersstroomgegevens. Deze datastromen dragen bij aan de beleidsmatige opvolging van de beoogde modal shift. Via de Vlaamse Sensor Data Space zijn deze datastromen bovendien ook voor andere doeleinden te gebruiken.</p> <p>Tot slot wordt de haalbaarheid nagegaan om de burger een meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden door mobiliteitsvoorkeuren te delen via een persoonlijke datakluis die aangeboden wordt door het Vlaams Datanutsbedrijf (VV061).</p>
Outcome	<p>De datastopcontacten ontzorgen de ontwikkelaars van de Mobiliteitscentrale, zodat ze minder energie moeten steken in maatwerkkoppelingen van datastromen. Daardoor is er meer ruimte vrij voor andere prioriteiten, zoals voor slimme toepassingen.</p> <p>Tegelijkertijd dalen de inspanningen van de gehele markt voor het combineren en schaalbaar bevragen Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk verhogen doordat ze ondersteund worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering en interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerkkoppelingen en de bijhorende kosten gereduceerd. Bedrijven en integratoren van mobiliteitsdata kunnen zich toelagen op het ontwikkelen van waarde creërende toepassingen in plaats van op het telkens opnieuw verzamelen en toegankelijk krijgen van data. van het data aanbod.</p> <p>De referentie implementatie met de Stad Antwerpen effent het pad voor andere steden en gemeentes die op dezelfde standaard manier gebruik willen maken van de datastopcontacten.</p> <p>Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kan dankzij de datastromen beleidsanalyses over de verkeersstromen maken. Door onder meer beroep te doen op geanonimiseerde ANPR-data reflecteren deze analyses immers voor het eerst rechtstreeks de werkelijkheid op het terrein.</p>
Beoogde impact	<p>Toename digitale collectiedata - Versterken van dienstverlening lokale besturen - Versterken innovatiecapaciteit Vlaamse KMO's en bedrijven - DESI Digital public services: open data indicator</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Nota VR goedgekeurd op 3/12.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Opstart van het team en gunning ICT-dienstenleverancier worden voorzien.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering.	2021 Q3	Gerealiseerd
De mobiliteitscentrale sluit aan op 1 datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	2022 Q2	Nog niet gestart
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd
De Case van de stad Antwerpen sluit aan op 1 datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	2023 Q4	Nog niet gestart
De geanonimiseerde verkeersstromen DIV met ANPR data zijn beschikbaar zodat er analyse op kunnen worden uitgevoerd.	2023 Q3	Nog niet gestart
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Nog niet gestart
de haalbaarheidsstudie om de burger in de toekomst een meer gepersonaliseerde mobiliteitservaring aan te bieden is beschikbaar	2023 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	767.000 EUR
Uitvoering VEK	619.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 4.200.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de VR van 3/12/2021](#)

[Nota aan de VR van 3/12/2021 - projectdossier](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV073 - Vlaamse Sensor Data Space](#)

VV070 - MATIS, HET VLAAMSE MATERIALENINFORMATIESYSTEEM

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Departement omgeving, afdeling Handhaving, Denuo (sectorfederatie), VVSG/Interafval, Afvalbeheersorganismen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De herziene kaderrichtlijn afvalstoffen wijzigde de recyclagedoelstellingen en specificeert nu in detail hoe de berekeningen ervan moeten gebeuren. De gerecycleerde hoeveelheid afval moet vanaf productiejaar 2020 (rapportering in 2022) gemeten worden bij de input in de recyclage-handeling. Dat betekent dat het meetpunt voor de recyclage nu achteraan de verwerkingsketen ligt, terwijl dat voorheen vooraan lag. Een belangrijke doelstelling van MATIS is dat de OVAM het afval kan volgen doorheen de diverse voorbehandelingen tot het effectief gerecycleerd wordt. Dit doen we bij voorkeur via digitale gegevensuitwisseling tussen de betrokken bedrijven en de OVAM zodat de administratieve lasten beperkt blijven.

Regelmatig stellen we vast dat er illegale of frauduleuze afvaltransporten plaatsvinden. De OVAM wil hier korter op de bal spelen en de afvalstoffen traceren om de toezichthoudende diensten van accurate informatie voorzien met het oog op een effectieve en efficiënte handhaving.

Daartoe ontwikkelt de OVAM een nieuwe tool (MATIS) voor gegevensinzameling, -validatie en -ontsluiting. De gegevens van de afvalinzamelaars en -verwerkers zullen via volledig digitale processen naar het OVAM-systeem vloeien, waar de gegevens op een geautomatiseerde manier gevalideerd zullen worden. De gevalideerde gegevens zullen via MATIS op het juiste aggregatieniveau ontsloten worden naar belanghebbenden en naar de OVAM-systemen voor het berekenen van de Vlaamse afvalstatistieken. De OVAM stemt hiervoor maximaal af met de betrokken belanghebbenden zodat optimale gegevensuitwisseling mogelijk is.

Een tweede spoor in het project betreft het digitaliseren van de documenten die afvaltransporten moeten begeleiden. We digitaliseren de identificatieformulieren en stemmen hiervoor af met andere transportdocumenten zodat efficiëntiewinsten geboekt worden. Omdat hier mogelijk gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden (vb locatie gegevens) ondernemen we de nodige acties om de toegang en de verwerking van deze gegevens te regelen. Op termijn worden de

PROJECTOMSCHRIJVING

identificatieformulieren gebruikt om via 'slimme weegbruggen' de effectief gewogen hoeveelheden op een digitale manier naar de OVAM te laten stromen. De koppeling tussen de gedigitaliseerde identificatieformulieren en MATIS is voorzien inna 2023. De verplichting tot digitalisering van de identificatieformulieren is opgenomen in Vlarema 8 en is reeds een eerste keer door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Zowel de gegevens van de digitale identificatieformulieren, als de gegevens in MATIS kunnen gekoppeld worden aan vergunningen en registratiegegevens, zodat onregelmatige transporten onmiddellijk zichtbaar worden. Op deze manier kunnen we ook marktschommelingen en afzetproblemen in de afval- en materialenmarkt van kort kunnen opvolgen.

De gegevens zullen niet langer ingezameld worden bij de Vlaamse bedrijven in het algemeen, maar enkel bij bedrijven die professioneel actief zijn in de afvalinzameling en -verwerking. Op deze manier ontstaan schaalvoordelen waarbij de investering in digitalisering kan lonen voor de bedrijven. Daarenboven kunnen we de administratieve lasten van de afvalrapportering voor een groot aantal Vlaamse bedrijven wegnemen.

Voor de ontwikkeling van MATIS werd reeds een deel van de benodigde middelen gevonden in een Europees Life-project (C-MARTLIFE). Vanuit het CMARTLIFE project werd 1.400.000€ projectsubsidie bekomen voor het ontwikkelen van MATIS als een tool die de Vlaamse overheid in staat zal stellen om te voldoen aan de nieuwe Europese rapportageverplichtingen. De personeelsinzet van de OVAM is binnen CMARTLIFE verrekend in de verplichte eigen inbreng. Daarnaast bedraagt de financiering vanuit de middelen van Vlaamse veerkracht 1.950.000€. De middelen die vanuit CMARTLIFE ter beschikking worden gesteld zullen vooral gebruikt ingezet worden voor de gegevensinzameling en -verwerking met het oog op Europese rapportage verplichtingen, terwijl de middelen van Vlaamse veerkracht vooral gebruikt zullen worden voor de gegevensinzameling en -verwerking met het oog op traceren van afvalstromen. Deze invalshoeken zijn wel niet strikt te scheiden en komen samen binnen het MATIS-project.

De concrete acties binnen dit project kunnen opgedeeld worden in:

- Analyse van de benodigde processen en de afstemming met belanghebbenden;
- ICT ontwikkeling van de software voor data-inzameling, -validatie en -verwerking;
- Gebruik van de data voor rapportering en ontsluiting (naar EU, bedrijven, gemeenten, intermediaire organisaties,..);
- Wetgevende initiatieven ikv digitalisering van afvalidentificatieformulieren en de verwerking van persoonsgegevens;
- Datagedreven studies naar de afvalverwerking van uitgevoerde afvalstoffen, om MATIS te verrijken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.950.000 EUR
Output	Er zal software opgeleverd worden voor inzamelaars en verwerkers van afvalstoffen: - om gegevens te rapporteren mbt de hoeveelheden ontvangen en verwerkte afvalstoffen/materialen en de hoeveelheden afgevoerde afvalstoffen/materialen met hun bestemming (rapportering vanuit digitale identificatieformulieren is daarbij een mogelijkheid);

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	<ul style="list-style-type: none"> - om de gerapporteerde gegevens te valideren (zo veel mogelijk geautomatiseerd); - om gegevens te consulteren door de rapporterende bedrijven en andere bevoegde entiteiten en gericht/geaggregeerd te ontsluiten naar bevoegde entiteiten, vb afdeling handhaving van departement Omgeving.
Outcome	<p>Er zal een systeem ontstaan waarbij afvalstoffen en materialen kunnen gevolgd worden tussen bedrijven. Via dit systeem kunnen we afvalstoffen traceren. De ontsluiting van gegevens uit MATIS naar de afdeling handhaving moet leiden tot een effectievere en efficiëntere handhaving op afvalstoffenbewegingen. Het Vlaamse materialeninformatiesysteem zal toelaten dat de Vlaamse overheid zijn nieuwe wettelijke rapportageverplichtingen met betrekking tot de effectieve recyclage van stedelijk afval kan nakomen.</p>
Beoogde impact	Aandeel materiaalrecuperatie bedrijfsafval - Contact met overheid via internet

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Omdat de nieuwe werkwijze voor de verzameling en rapportering van afvalstoffengegevens in werking treedt vanaf 2021 heeft de OVAM, samen met de belanghebbenden en rekening houdend met de resultaten van de uitgevoerde studies en na uitgebreid overleg een datamodel en data-sjabloon uitgewerkt dat gebruikt zal worden in MATIS. Dit sjabloon is ondertussen gefinaliseerd en wordt in de software geïmplementeerd. Na de eerste rapportering zal inden nodig een bijsturing gebeuren en zullen de teksten voor een Ministerieel besluit voorbereid worden.</p> <p>De analyse van de business-processen ter voorbereiding van de ontwikkeling van MATIS is high level afgerond. Module per module voeren we nu een meer gedetailleerd analyse uit met het oog op de software-ontwikkeling van de MATIS-meldapplicatie. We maken daarbij onderscheid tussen volgende modules:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gegevens inzameling Huishoudelijk afval • gegevens verwerking afvalstoffen • gegevens herverdeling Huishoudelijk afval • gegevens inzameling bedrijfsafval <p>Voor de modules 'inzameling huishoudelijk afval' en 'verwerking van afvalstoffen' is de analyse en de ontwikkeling van de software grotendeels achter de rug en staat een eerste versie van de meldapplicatie in de productie-omgeving. De rapportering over de inzameling huishoudelijk afval is lopend. Momenteel werken we samen met de stakeholders om de randvoorwaarden voor de melding van de verwerking van afvalstoffen in orde te krijgen zodat deze ook kan starten vanaf begin 2022. Het gaat dan vooral om de garantie van de</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

vertrouwelijkheid van de klantgegevens van betrokken bedrijven. In dit kader wordt gewerkt aan een goedgekeurde vertrouwelijkheidsverklaring van de OVAM en een ICT-beheersysteem dat de risico's op data-lekken minimaliseert. Voor de module over herverdeling van huishoudelijke afvalstoffen is het overleg met de stakeholders grotendeels achter de rug en kan de ontwikkeling van de software starten.

Tegen februari 2022 zal een eerste rapportering over inzameling HA (2020) afgerond zijn en zal de eerste rapportering voor verwerking van afvalstoffen (2020) bezig zijn. Deze dataset moet ons de nodige inzichten geven om juni 2022 de eerste Europese rapportering over de recyclage van stedelijk afval te doen.

De verplichting om vanaf 2023 de transportdocumenten van afvaltransporten te digitaliseren is ondertussen definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Een wijzigingstekst voor het materialendecreet die het mogelijk moet maken dat de OVAM toegang krijgt tot deze gegevens en die het verwerken van de aanwezige persoonsgegevens in MATIS regelt is in tweede lezing reeds goedgekeurd en wordt hopelijk in het voorjaar van 2022 van kracht.

DE eerste ontwerp teksten voor de wijziging van VLAREMA (BVR dat moet aangepast worden) zijn opgesteld en worden momenteel informeel afgestemd met de stakeholders.

Naast de ontwikkeling van de meldapplicatie wordt tegelijkertijd gewerkt aan de ontsluiting van de gerapporteerde gegevens. Daartoe werd de powerBI-omgeving die hiervoor gebruikt gaat worden geïntegreerd met ACM/IDM (gebruikers beheer van de Vlaamse Overheid) zodat de gegevens op een veilige manier kunnen ontsloten worden. Vanaf januari 2022 zullen de melders van gegevens over rapporten beschikken om de door hen gemelde gegevens te analyseren. Deze rapporten zullen en cours de route verder uitgebreid worden.

Noodzakelijke politieke actie

- Het project werd goedgekeurd op VR van 23 maart 2021 Het VLAREMA (BVR) met de verplichte digitalisering van identificatieformulieren voor afvalstoffen werd op VR definitief goedgekeurd op VR van 2 juli.
- Ontwerpteksten voor materialendecreet met betrekking tot verwerken van persoonsgegevens in MATIS en het regelen tot de toegang tot de gegevens van identificatieformulieren werden opgemaakt en reeds in eerste en tweede lezing goedgekeurd door de Vlaamse regering.
- Ontwerpteksten voor een besluit van de Vlaamse regering om MATIS wettelijk te verankeren zijn opgemaakt en worden informeel afgetoetst met de stakeholders.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Regelgeving betreffende verplichting digitale identificatieformulieren (2023) van kracht	2021 Q4	Gerealiseerd		
Eerste pilootrapportering van gegevens huishoudelijk afval is afgerond.	2021 Q4	Gerealiseerd		
Data-sjabloon voor data-uitwisseling met MATIS afgewerkt, gepubliceerd en verwerkt in een Ministerieel besluit	2022 Q1	Op schema		
Software voor digitale en semi-automatische gegevensoverdracht van inzameling en verwerking van stedelijke afvalstoffen is gerealiseerd en in werking	2022 Q1	Op schema		
Software voor geautomatiseerde validatie van de gegevens over inzameling en verwerking van afvalstoffen is gerealiseerd en in werking.	2022 Q4	Op schema		
Regelgeving betreffende verwerking persoonsgegevens en toegang tot de identificatieformulieren van kracht.	2023 Q1	Op schema		
3 Datagedreven onderzoeken voor het in kaart brengen van de recyclage van uitgevoerde afvalstoffen zijn uitbesteed en afgerond	2023 Q4	Nog niet gestart		
Instrument voor geautomatiseerde ontsluiting van gegevens gerealiseerd en in werking	2023 Q4	Op schema		
Koppeling MATIS aan vergunningen, registraties met oog op traceren en kwalitatieve gegevens voor Handhaving is gerealiseerd en in werking	2023 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Softwaremodule gegevens inzameling Huishoudelijk afval	eerste versie in productie	2021 Q4	1	100 %
Softwaremodule gegevens verwerking van afval	eerste versie in gebruik	2022 Q1	1	100 %
Data ontsluiting via powerBI naar melders inzameling HA	eerste versie in gebruik	2022 Q1		70 %
Softwaremodule herverdelen van afvalstoffen over gemeenten	eerste versie in gebruik	2022 Q2		30 %
Ontsluiting van gegevens naar melders van verwerkingsgegevens	eerste versie in gebruik	2022 Q2		5 %
Ontsluiting gegevens naar niet melders	Opgezet en eerste versie ingebruik	2022 Q3		15 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Validatiemodule ter ondersteuning van inhoudelijke validatie van de ingevoerde gegevens	eerste versie in productie	2022 Q3		5 %
Softwaremodule gegevens inzameling Bedrijfsafval	eerste versie in gebruik	2022 Q4		1 %
Ontsluiting van traceringsgegevens naar afdeling handhaving	eerste versie in productie	2023 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.950.000 EUR
Uitvoering VAK	750.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.950.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV071 - POOLSTOKALIAS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Lokale Besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit project wordt geïnvesteerd in een ondersteuningsstructuur met lokaal aandeelhouderschap om de digitale transformatie van de lokale besturen te versnellen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	2.000.000 EUR
Output	
Outcome	
Beoogde impact	VLAANDEREN DIGITAAL TRANSFORMEREN - DE OVERHEID EFFICIËNTER MAKEN

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Goedkeuring Vlaamse Regering gepland in Q1 2022
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Nog niet gestart

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Nog niet gestart
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2022 Q1	Vertraging

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 1.700.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV072 - DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	culturele sector, culturele participanten, markt

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.

Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken.

Het project 'doelgericht digitaal transformeren' wil de brede waaier van het culturele aanbod verbinden met geïnteresseerde cultuurparticipanten om zo de cultuurparticipatie te verhogen en een impuls te geven aan een datagedreven beleid. De focus ligt hierbij op gegevensontsluiting via standaarden. Het project stimuleert op deze manier de digitale innovatie door middel van samenwerking en verbreding. Tevens worden open innovatie en marktbetrokkenheid gestimuleerd. Verschillende organisaties kunnen namelijk in dit uitwisselingsnetwerk verenigd worden: o.a. organisaties die het culturele aanbod kenbaar maken, actoren die zich met publieksonderzoek en participatie bezighouden en de beleidsmonitoring. De culturele beleving wordt op een nieuwe manier georganiseerd waarbij vraag en aanbod worden verbonden. Uitbreiding naar andere sectoren zoals private en toeristische organisaties kan een verdere impuls zijn voor innovatie.

Standaardisering zorgt ervoor dat data kunnen stromen. Door het werken met standaarden voor de digitale gegevensontsluiting wordt de informatie voor alle partijen toegankelijk en wordt het

PROJECTOMSCHRIJVING

hergebruik van data geoptimaliseerd. Een digitale basisinfrastructuur maakt het mogelijk dat data over verschillende organisaties wordt verbonden met elkaar. Waar mogelijk worden bestaande bouwblokken versterkt en ingezet voor het volledige ecosysteem, waar nodig worden nieuwe bouwblokken toegevoegd. Monopolies zowel voor zowel culturele als marktspelers worden vermeden door het gezamenlijk beheer van de basisinfrastructuur waarop verschillende use cases door verschillende organisaties kunnen ontwikkeld worden.

Middels een verkort business case traject werden de doelstellingen, de scope en de mogelijke oplossingen samen met sector verder uitgewerkt. Dit is van cruciaal belang omdat de sector evolueert naar een open ecosysteem waar partijen samen de verantwoordelijkheid dragen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	5.000.000 EUR
Output	Gegevensuitwisselingsplatform als basisinfrastructuur waarop data over het cultureel aanbod in verbinding komt met data over de vraag naar deze data vanuit de cultuurparticipatie. Dit uitwisselingsplatform bouwt maximaal verder op reeds bestaande bouwstenen in de sector & verbindt de huidige data in gefragmenteerde bronnen via open data standaarden.
Outcome	Verhoging van de relevante cultuurpropositie naar de cultuurparticipatie Verhoging van de samenwerking op sectorniveau Verhoging van de interoperabiliteit van data binnen de sector Verlaging van de planlast voor de sectorspelers
Beoogde impact	Cultuurparticipatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het programmteam werd versterkt met bijkomende profielen voor diepere uitwerking van de functionele en technische analyse. Het OSLO standaardisatie traject met betrekking tot culturele activiteiten werd voorbereid en opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Uitwerken businesscase als voorstudie om tot een actionable projectplan te komen		2021 Q2	Gerealiseerd	
Goedkeuring door de VR		2021 Q2	Gerealiseerd	
Validatie van het projectplan door de Stuurgroep		2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstarten van een POC met focus op data aan de aanbodzijde		2022 Q2	Op schema	
Publiceren van OSLO standaarden voor culturele activiteiten		2022 Q2	Op schema	
Opstarten van een POC met focus op data aan de vraagzijde		2022 Q3	Nog niet gestart	
Opstarten van bijkomende ontwikkelingen (POC industrialisatie, ontbrekende componenten)		2023 Q1	Nog niet gestart	
Opstarten van een POC voor basis data analyse		2023 Q3	Nog niet gestart	
Goedkeuring van project closure document		2023 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Er is een efficiëntiewinst voor de aanbieder van 30 % (planlastvermindering) gerealiseerd bij het voldoen aan de rapporteringsverplichtingen		2023 Q4		
Een cultuurparticipant kan in december 2023 zijn cultureel profiel eenmalig beheren en meervoudig laten gebruiken		2023 Q4		
Het eenmalig ingeven van activiteiten en het meervoudig hergebruik is gerealiseerd voor minstens 3 doeleinden voor rapportering, publicatie en cultuurparticipatie		2023 Q4		
De bestaande bouwblokken zijn in december 2023 geïntegreerd en		2023 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
vormen samen de basisinfrastructuur voor gegevensdeling met betrekking tot culturele activiteiten				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	827.000 EUR
Uitvoering VEK	221.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 4.200.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Relance-initiatief in het kader van de digitale transformatie van de cultuursector: doelgericht digitaal transformeren</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Digitale transformatie van de cultuursector: doelgericht digitaal transformeren</p> <p>Business Case Doelgericht Digitaal Transformeren. Bijlage</p> <p>Budget. Bijlage</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV073 - VLAAMSE SENSOR DATA SPACE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij - Digitaal Vlaanderen - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Om van Vlaanderen een toonaangevende regio te maken op het vlak van smart cities en internet of things (IoT) kondigt het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' de realisatie aan van een data-platform voor sensordata. Het project "Vlaamse Sensor Data Space" (VV073) geeft hieraan invulling.

De te ontwikkelen nieuwe generieke bouwsteen biedt een antwoord op de uitdagingen die de verwachte vloedgolf aan (real time) data afkomstig van allerhande sensoren stelt, met name wat betreft het kostenefficiënt verdelen van de bijzonder grote volumes aan data, het omgaan met hoge snelheid waarmee data veranderen en de koppelbaarheid van sensordata aan de meer gangbare 'statische' data. Centraal staan de ontwikkeling van een 'publicatiestraat voor sensordata' en het definiëren van open standaarden waarmee werk wordt gemaakt van 'data-stopcontacten' voor sensordata die overheden en bedrijven toelaten om meer van deze nieuwe en innovatieve data in slimme toepassingen vlot te gebruiken aan een lagere kost en doorlooptijd.

Sensordata zullen zonder twijfel een belangrijke stimulans worden voor de Vlaamse data-economie en de lokale en Vlaamse overheid in staat stellen ambitieuze beleidsdoelstellingen zoals Blue Deal, Vlaams Energie en Klimaatplan, Modal Shift of Basisbereikbaarheid te realiseren. Om data in dit netwerk te laten stromen en iedereen toegang tot kwalitatieve data te verzekeren wordt ook ingezet op het implementeren van een ecosysteemwerking met governance-afspraken. Een beslissende factor voor het realiseren van deze strategie is de samenwerking met en de adoptie door de private sector waarvoor het Vlaams Datanutsbedrijf (VV061) een cruciale rol in het ecosysteem zal opnemen.

Tijdens het project worden, gefaseerd, minstens twee concrete toepassingen in verschillende domeinen (mobiliteit, water, ...) uitgewerkt om de publicatiestraat en de ecosysteemwerking in de praktijk te brengen. Een eerste toepassing in het domein mobiliteit wordt gerealiseerd in samenwerking met het relanceproject VV069 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit'. Een tweede toepassing in het domein water zal worden uitgewerkt in samenwerking met het

PROJECTOMSCHRIJVING

relanceproject VV032 'Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen'.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	8.500.000 EUR
Output	<p>Het project voorziet de ontwikkeling van open standaarden en specificaties om te vermijden dat data opgesloten blijft in geïsoleerde systemen (silo's) en dus niet kan stromen. Deze standaarden moeten over verschillende organisaties en systemen werken.</p> <p>Het project realiseert een "publicatiestraat" om sensordata schaalbaar en kostenefficiënt te kunnen publiceren en delen. De open architectuur van de Vlaamse Sensor Data Space bestaat uit herbruikbare bouwstenen die inplugbaar zijn in diverse platformen.</p> <p>De Vlaamse Sensor Data Space Governance. (werkwijze, processen en regels om de interoperabiliteit te laten werken).</p> <p>Een ecosysteemwerking om de productierealisatie, adoptie en integratie iteratief te vergroten. De ecosysteemwerking spint zich uit over de verschillende actoren: de overheden, private sector en onderzoeksinstellingen.</p>
Outcome	<p>Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk verhogen doordat ze ontzorgd worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering en interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerkkoppelingen en de bijhorende kosten gereduceerd. Bedrijven en integratoren van sensordata kunnen zich toeleggen op het ontwikkelen van waarde creërende toepassingen in plaats van op het telkens opnieuw verzamelen en toegankelijk krijgen van data.</p> <p>Het project zorgt voor een evenwaardige toegang tot data voor de actoren in het ecosysteem. Vendor lock-in van publieke instellingen wordt verholpen en de data-economie kan verder opengesteld worden voor andere spelers, wat een extra boost voor bedrijven en innovatie in Vlaanderen zal zijn. Dit komt de dienstverlening naar de burger ten goede.</p> <p>Het project realiseert een oplossing die kostenefficiënt en schaalbaar werkt.</p> <p>Het kostenefficiënt ter beschikking stellen en uitwisselen van data, zal nieuwe inhoudelijke datastromen mogelijk maken en zal de (overheids-) dienstverleningen verbeteren. Het zal leiden tot verhoogde investeringen in innovatie en tot verhoogde kennisopbouw omtrent data inzichten, bedrijfsprocessen, ...</p>
Beoogde impact	VLAANDEREN DIGITAAL TRANSFORMEREN - Toename digitale collectiedata - Versterken van dienstverlening lokale besturen - Versterken innovatiecapaciteit Vlaamse KMO's en bedrijven - DESI Digital public services: open data indicator

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Opstart van het team en gunning ICT-dienstenleverancier worden voorzien.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering.	2021 Q3	Gerealiseerd
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten.	2022 Q4	Gerealiseerd
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Nog niet gestart
De Vlaamse Sensor Data Space realiseert de bouwstenen en standaarden en toont de werkbaarheid aan in een operationele omgeving (TRL 7)	2022 Q4	Op schema
De Vlaamse Sensor Data Space finaliseert de doorontwikkeling van de bouwstenen nodig voor hergebruik en opschaling tot in productie. (TRL 9)	2024 Q1	Nog niet gestart
De Vlaamse Sensor Data Space realiseert de onboarding van een tweede use case in het domein water in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij.	2024 Q4	Nog niet gestart
De Vlaamse Sensor Data Space realiseert iteratief de onboarding van de domein use case 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit'.	2024 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.500.000 EUR
Uitvoering VAK	905.000 EUR
Uitvoering VEK	475.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 7.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.500.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15/10/2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15/10/2021. Projectdossier](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV069 - Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit](#)

[VV032 - Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen](#)

VV074 - VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fednot (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) en dus de notariskantoren CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) en dus de makelaars VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en dus de steden en gemeenten VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 en het relanceplan Vlaamse Veerkracht dat op 26 september 2020 goedgekeurd werd door de Vlaamse regering kiest duidelijk voor digitalisering als een speerpunt in innovatie.

Zo wil de Vlaamse Regering de toegenomen mobiliteit op de Vlaamse vastgoedmarkt verder ondersteunen via doorgedreven digitalisering. Burgers en bedrijven verwerven en verkopen steeds vaker onroerend goed en verwachten daarbij dat de verschillende overheden sneller en laagdrempeliger dan vandaag relevante én correcte informatie over dat vastgoed kunnen verschaffen. Om de baten voor alle actoren binnen bereik te brengen, moet in het domein van vastgoedinformatie een data-snelweg worden aangelegd.

Het voorliggend projectvoorstel omvat twee trajecten. Het eerste traject beoogt de ontwikkeling en uitrol en het beheer en de exploitatie van het vastgoedinformatieplatform waarbij een nieuwe informatiesnelweg in het domein van vastgoedinformatie wordt aangelegd. Het tweede traject zet in op het digitaliseren en doelgericht verbeteren van de kwaliteit van de aan het vastgoedinformatieplatform gerelateerde gegevensbronnen. Dit is cruciaal om op termijn alle voordelen van het platform te kunnen realiseren aangezien op heden minder dan 50% van de noodzakelijke gegevensbronnen volledig digitaal centraal beschikbaar zijn.

Het projectvoorstel kwam tot stand op basis van een door Informatie Vlaanderen uitgevoerde haalbaarheidsstudie in opdracht van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB), de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en departement Omgeving

PROJECTOMSCHRIJVING

(dOMG). De conclusies van deze haalbaarheidsstudie en het voorliggend projectvoorstel werd voorgelegd aan het Stuurorgaan Informatie en ICT beleid alsook goedgekeurd door de bestuursorganen van de vermelde partners en maakt deel uit van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

In de investeringsjaren 2021 – 2023 ligt de nadruk op het eerste traject waarbij de voorziene middelen in hoofdzaak worden aangewend voor de ontwikkeling en de uitrol van het platform. Om de meerwaarde van het platform binnen bereik te kunnen brengen wordt ook meteen het tweede traject opgestart waarbij inzake digitalisering van gegevensbronnen focus wordt genomen op het realiseren van een digitaal register met historische milieu- en vergunningsinformatie .

Dit resulteert in een eerste versie van het vastgoedinformatieplatform dat volgens planning in productie gaat tegen einde Q3 2022. Tegen eind 2023 worden alle beoogde datadiensten en functionaliteiten via het platform aangeboden aan de partners en start de operationele fase waar de partners die informatie van het platform afhalen een betalende toegang krijgen tot het platform.

Informatie Vlaanderen zal instaan voor de ontwikkeling en uitrol van het vastgoedinformatieplatform. De projectsturing verloopt via een passende governance structuur waar de bovenvermelde partners via de projectstuurgroep kunnen toezien op de vorderingen en eventuele bijsturingen kunnen laten beslissen.

Vanaf 2024 wint het tweede traject duidelijk aan belang. Daarbij wordt ingezet op een versnelde digitalisering en verdere kwaliteitsverbetering van de aan het platform gerelateerde gegevensbronnen. In het eerste traject komt vanaf 2024 de nadruk te liggen op exploitatie, beheer en doorontwikkeling.

De realisatie van het platform en de versnelde digitalisering van de gegevensbronnen brengt significante baten met zich mee voor alle partners. De gebruikers die gegevens afhalen van het platform ondervinden duidelijk meetbare efficiëntiewinsten in termen van kost en doorlooptijd in vergelijking met de huidige situatie. De bronbeheerders en de lokale besturen in het bijzonder zullen dankzij het platform via 1 uniforme en digitale weg benaderd worden voor het verstrekken van vastgoedinlichtingen.

De totale investeringskost van het platform bedraagt 9 954 keuro . Via het relancefonds prefinanciert de Vlaamse Regering 8 590 keuro. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat prefinanciert 954 keuro. In de investeringsfase is er ook al opstart van het tweede traject rond digitalisering en kwaliteitsverbetering van gegevensbronnen voorzien waarbij focus genomen wordt op een optimalisatietraject voor het register van stedenbouwkundige inlichtingen en een referentie register voor milieu informatie. De Vlaamse regering voorziet hiervoor een bijkomende investering 410 keuro aanvullend op de prefinanciering om het register breed inzetbaar te maken voor overheden in Vlaanderen, ook buiten de scope van het vastgoedinformatieplatform.

Het bedrag van de prefinanciering (8 590 keuro vanuit de Vlaamse Regering en 964 keuro vanuit de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat wordt vanaf 2024 en binnen de 5 jaar volledig terugbetaald door de gebruikers van het platform op basis van het financieel plan opgenomen in deze nota. Een passend decretaal kader daartoe wordt tijdig voorgelegd aan het Vlaams parlement en verankert het financieringsmodel en het engagement van alle partners in dit

platform.

Van de 8 590 keuro aan middelen die op deze manier tussen 2024 en 2028 terugvloeien naar de Vlaamse overheid wordt 5 900 keuro geherinvesteerd in het tweede traject om op die manier de noodzakelijke digitalisering en de gerichte kwaliteitsverbetering van de betrokken gegevensbronnen te versnellen. De resterende 2 690 keuro vloeit terug naar de algemene middelen en is het resultaat van de directe economische return van het platform.

Het voorliggend project raakt op geen enkele wijze aan de bestaande gemeentelijke retributies voor het verstrekken van vastgoedinlichtingen. Dit blijft de autonome bevoegdheid van de lokale besturen.

Doelstellingen

Het deelplatform vastgoedinformatie is de oplossing voor het vlot en efficiënt digitaal uitwisselen van alle vastgoedinlichtingen tussen overheden en vastgoedmakelaars, notarissen en burgers.

Het deelplatform vastgoedinformatie werkt de onderliggende complexiteit van de huidige manier van werken weg. Aanvragers kunnen via één kanaal en - indien gewenst - vanuit de eigen dossiertoeepassingen authentieke en officiële inlichtingen digitaal opvragen en aangeboden krijgen en de verkregen gestructureerde data rechtstreeks in dossiertoeepassingen verwerken.

Ook bronhouders hebben hierbij het voordeel dat alle aanvragen via één kanaal ontvangen en beantwoord kunnen worden, waarbij reeds verstrekte inlichtingen hergebruikt kunnen worden voor toekomstige aanvragen.

Het verhogen van datakwaliteit en -interoperabiliteit bij achterliggende gegevensbronnen is een essentiële en noodzakelijke voorwaarde om aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinlichtingen naar de toekomst toe sneller te kunnen afhandelen en beantwoorden. De lange termijn ambitie van het vastgoedplatform bestaat erin om een aanvraag ten laatste “next business day” af te handelen. Om deze doelstelling op termijn binnen bereik te brengen, zijn structurele ingrepen op de onderliggende data vereist. Door in te zetten op Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) en op kwalitatieve koppelingen met de Vlaamse basisregisters (adres, gebouw) en de Vlaamse basiskaart en door gestructureerde data in te winnen in het proces waar ze ontstaan (zoals bijvoorbeeld in lokale besluiten) kunnen manuele tussenkomsten en interpretaties in de afhandeling van aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinlichtingen in de toekomst tot een minimum beperkt worden.

Door het vermijden dat dezelfde informatie meermaals wordt opgevraagd, te onderzoeken welke informatie in welk proces nodig is en het implementeren van automatische dossieropvolging zorgen we voor de verlaging van administratieve lasten en procesoptimalisatie.

De rol van de lokale overheden is in de totstandkoming van het vastgoedinformatieplatform erg belangrijk omdat zij in vele gevallen bronbeheerder zijn en daarnaast ook instaan voor de kwaliteitscontrole op informatiebronnen die een interpretatie van de lokale context behoeven.

Er is een verdere digitalisering en groeipad mogelijk waardoor de administratieve lasten in het kader van de verkoop nog verder dalen, wat zowel de bronhouders als de professionele actoren

PROJECTOMSCHRIJVING

(makelaars, notarissen) ten goede komt.

Ten slotte is reeds gesteld dat het deelplatform vastgoedinformatie ook de burgers in de mogelijkheid wil brengen om nog meer inzicht en transparantie te krijgen in de gegevens die de overheid heeft over haar of zijn grond of woning. Door het deelplatform vastgoedinformatie te koppelen aan initiatieven zoals de woningpas en Mijn Burgerprofiel, brengen we de burger meer in controle over zijn gegevens.

Algemene baten

Uit de voordelen die het platform oplevert voor de Vlaamse overheid en haar partners volgen enkele algemene baten:

- * Snellere afhandeling van het volledige dossier voor de verkoop , waarbij een daling van 30 % gerealiseerd kan worden door het afleveren van vastgoedinlichtingen op 1 dag.
- * Doorgedreven digitalisatie waardoor geïnteresseerde kopers van vastgoed meer zekerheid hebben over termijnen waarbinnen de verkoop kan geformaliseerd en tegenstelbaar aan derden kan worden gemaakt,
- * Sneller schakelen en aanpassingen zijn mogelijk dankzij dossierautomatisatie
- * Daling van de administratieve lasten
- * Realiseren van procesoptimalisatie
- * Aanbieden en gebruiken van gestructureerde data
- * Kosteneffectiviteit door een gezamenlijke investering
- * Het ter beschikking komen van kwalitatieve basis data i.v.m. grondgebonden gegevens die het mogelijk zal maken een aantal dienstverleningen van de overheid te optimaliseren

Te realiseren kostenbesparing in de dossierbehandeling

- * Een eerste conservatieve schatting leert dat per opvraging van vastgoedinlichtingen minstens 75 euro kan worden bespaard in de behandeling van het dossier door de gebruiker van het platform:
- * Een besparing van 25 € bij de aanvraag (30 min)
- * Een besparing van 50 € bij de verwerking (1 uur)
- * Dit komt neer op minimaal 10 miljoen euro aan kostenbesparing op jaarbasis op basis van 130.000 aanvragen.

Te realiseren kostenbesparing bij de bronhouders en lokale besturen

* Ook bij de bronbeheerder en de lokale overheden kan het platform door de gecoördineerde aanpak zorgen voor een kostenbesparing, met name door het hergebruik van informatie op het platform wat resulteert in het niet meer aanbieden van identieke aanvragen, binnen de geldigheidsduur van de verstrekte informatie. Ook de geautomatiseerde afhandeling van aanvragen inclusief facturatie zorgt voor een efficiëntiewinst. Verderop in de nota wordt dieper ingegaan op de baten voor de lokale besturen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	9.000.000 EUR
Output	Digitaal vastgoedplatform.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Outcome	Snellere aflevering dossiers: Aantal opgeleverde vastgoeddossier via het digitaal platform met 30% van de informatierubrieken binnen 1 dag; efficiënte aflevering dossiers: 75 Euro besparing x 75 Euro per dossier
Beoogde impact	Efficiëntie Vlaamse overheid (imago) - Toegankelijkheid Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Ontwikkeling vastgoedplatform verloopt zoals gepland richting de in-productiestelling van de basisversie in Q3 2022.
Noodzakelijke politieke actie	geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Opstart van de backend ontwikkeling zomer 2021, vanaf oktober 2021 wordt elke maand een publieke demo van de voortgang voorzien.	2021 Q2	Gerealiseerd
Oplossingsarchitectuur is opgesteld in samenwerking met de partners en gevalideerd door het bestuurscomité.	2021 Q3	Gerealiseerd
Kandidaat OSLO standaard is gevalideerd door het stuurorgaan voor ICT en informatie, public review periode is gestart.	2021 Q3	Gerealiseerd
In productiestelling van de basisversie : er worden aanvragen op het platform gedaan, er worden gegevens van centrale bronnen opgehaald en aangevuld vanuit een gemeentelijk systeem. Het antwoord wordt verstuurd naar de aanvrager.	2022 Q3	Op schema
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd
In productiestelling van de betalende versie van het platform : De volledige functionaliteit zoals beschreven in de business case is gerealiseerd. De bronnen zijn aangesloten. De gemeentelijke systemen zijn aangesloten. Alle gemeenten beantwoorden de vraag via het platform. Alle aanvragen voor vastgoedinlichtingen verlopen via het platform.	2024 Q1	Nog niet gestart
Het doel is om binnen het jaar na de betalende toegang – einde 2024 – reeds 30 % van de informatierubrieken binnen de dag afgehandeld te hebben. Het aandeel van de informatierubrieken die binnen de dag afgehandeld wordt, zal jaarlijks stijgen tot er maximaal 10 % van de	2024 Q4	Nog niet gestart

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL			TIMING	STATUS
informatierubrieken niet binnen de dag afgehandeld wordt. Dit omwille van dossiers waar geen informatie over bestaat of complexe interpretaties die terrein onderzoek vragen.				
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep			2025 Q4	Op schema
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vastgoedplatform 100% opgeleverd.	Alle steden en gemeenten aangesloten op het vastgoedplatform	2024 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.534.000 EUR
Uitvoering VEK	1.361.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 7.400.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 19 maart 2021 - ontwikkeling, uitrol en beheer en exploitatie van het Vlaams Vastgoed Informatie Platform

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV075 - VLM - MAP6 EN DATAWAREHOUSE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	*Mestbankloket : landbouwers, mestvoerders, mest be-/verwerkers, kunstmesthandelaren, veevoederfabrikanten en producenten andere meststoffen *loket landinrichting : eigenaars, bewoners en gebruikers, lokale besturen, leden van projectorganen en de landcommissies

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het project MAP6 en datawarehouse bestaat uit 3 deelprojecten :</p> <p>1. Versnellen van de aanpassingen en ontwikkeling van toepassingen voor de nieuwe processen van MAP6</p> <p>Met het 6de Mestactieplan ambieert Vlaanderen een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het 6de Mestactieplan (MAP 6) bevat hierbij fundamenteel nieuwe en gewijzigde processen die op IT-vlak belangrijke investeringen vragen, noodzakelijk om de complexe regelgeving te implementeren. De VLM ondersteunt sinds jaren de sector bij de implementatie van de mestactieplannen door steeds maatwerk per bedrijf/perceel te leveren. Landbouwers, mestvoerders, en alle aanverwante bedrijven kunnen hun aangiften/aanvragen volledig digitaal afhandelen en meteen nagaan of ze in regel zijn, en/of aanpassingen noodzakelijk zijn.</p> <p>Een versnelde digitale implementatie van de MAP6 maatregelen bevordert de opvolging en uitvoering van deze maatregelen. Dit zal dan ook een positieve impact hebben op het milieu.</p> <p>2. Nieuw datawarehouse voor de Mestbank</p> <p>Om haar kerntaken te kunnen uitvoeren moet de Mestbank zelf op een vlotte, eenduidige manier aan zo goed als al haar gegevens kunnen. Data en dataverwerking zullen in de toekomst nog meer aan belang winnen voor dossieropvolging, het genereren van risicoanalyses voor gerichte handhaving en doorlichtingen, kwaliteitsbewaking, communicatietrajecten,</p> <p>De belangrijkste doelen van het datawarehouse zijn :</p> <ul style="list-style-type: none"> -een duidelijk gestructureerd datawarehouse waarbij het voor de gebruikers duidelijk is welke data ze waar kunnen terugvinden. -Opvolgbaarheid van het gebruik van de verschillende onderdelen van het datawarehouse -Integratie van andere databronnen dan de Mestbank databank 	

PROJECTOMSCHRIJVING

-Integratie met moderne tools voor data-analyse (vb. SharePoint, Power-BI, ...)

3. Loket Landinrichting

De afdeling 'Landinrichting en Grondenbank' is 1 van de 3 kernafdelingen binnen de Vlaamse Landmaatschappij. De activiteit 'Landinrichting en Grondenbank' focust zich voornamelijk op het inrichten van de open ruimte in Vlaanderen zodat omwonenden en gebruikers er wel bij varen. Tijdens het uitvoeren van de processen met de hierbij horende beschikbare instrumenten gebeurt er veel onderlinge communicatie met de belanghebbenden. Het loket landinrichting zal bestaan uit volgende 3 onderdelen :

- Een digitale brievenbus zal er voor zorgen dat alle gerichte onderlinge 'persoons- en/of bedrijfsspecifieke' communicatie digitaal aan onze externe klanten kan bezorgd worden.
- Een interactieve tool en opvolgingssysteem voor projectopvolging. Het aanbieden van een hedendaagse digitale tool voor de belanghebbenden die betrokken zijn in grote herverkavelingsprojecten (projectadministratie) zal de onderlinge communicatie optimaliseren. In deze tool zullen alle procesmatige documenten ter inzage worden gelegd én kan de belanghebbende in interactie gaan met de VLM (bezwaren en wensen toedeling). Bovendien kunnen de belanghebbenden hier het volledige proces (stand van zaken) van het project opvolgen
- Een vergoedingenloket en -databank. Het uitwerken van een vergoedingenloket en een vergoedingendatabank zal er voor zorgen dat de aanvrager van een vergoeding zijn aanvraag digitaal kan indienen (loket) en dat de betrokken VLM'ers, de leden van de landcommissies en andere Vlaamse overheidspartners efficiënt en gestructureerd kunnen werken aan vergoedingendossiers via een goed werkende backoffice (databank).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	2.450.000 EUR
Output	100% digitale aangifte van kunstmestgegevens en debietmeters aantal afgewerkte IT-projecten in het kader van MAP6 Beschikbaarheid van nieuw datawarehouse aantal digitale communicaties met de betrokkenen ivm inrichtingsprojecten aantal digitale aanvragen voor vergoedingen ikv het instrumentendecreet
Outcome	Betere waterkwaliteit door een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw Betere opvolging en uitvoering van de maatregelen opgelegd door MAP6 Maximale digitale communicatie en online projectopvolging door betrokkenen in het kader van inrichtingsprojecten Digitale loket voor aanvragen van vergoedingen en het opvolgen hiervan.
Beoogde impact	Contact met overheid via internet - Toename digitale collectiedata - Toegankelijkheid Vlaamse overheid (imago) - Ecologische toestand oppervlaktewater

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	De ontwikkeling van MAP6 toepassingen loopt. TOMAS en kunstmestregister zijn reeds opgeleverd. Debietmeters wordt nog voor 1/1/2022 in productie gezet. De aanbesteding voor de conceptuele analyse van het nieuw datawarehouse zal nog in 2021 toegewezen worden, voor uitvoering in de 1e helft van 2022. De aanbesteding voor de ontwikkeling van loket landinrichting is gestart en zal begin 2022 toegewezen worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
conceptuele analyse datawarehouse		2021 Q4	Vertraging	
MAP6 :oplevering toepassingen maatregelen (TOMAS), kunstmestregister en debietmeters		2021 Q4	Op schema	
MAP6 :oplevering toepassingen boetes, bezwaarmodule en uitrijtool		2023 Q4	Op schema	
MAP6 :oplevering toepassingen terreinopvolgingsapplicatie (TOA) en staalnames (SNAPP en SMIL)		2023 Q4	Op schema	
oplevering datawarehouse		2023 Q4	Nog niet gestart	
oplevering loket landinrichting		2024 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
digitale aangifte van kunstmestgegevens en debietmeter	100%	2022 Q4		50 %
Beschikbaarheid van nieuw datawarehouse	1	2024 Q4		
aantal afgewerkte IT-projecten in het kader van MAP6	8	2024 Q4	2	25 %
Communicatie met belanghebbenden in inrichtingsprojecten verloopt digitaal na inwerkingtreding LOLA		2025 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vergoedingsaanvragen verlopen digitaal na inwerkingtreding LOLA		2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.450.000 EUR
Uitvoering VAK	750.000 EUR
Uitvoering VEK	354.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.450.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 5 maart 2021
Nota VR 26 november 2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV076 - ZELFBEHEERDE IDENTITEIT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle Vlaamse entiteiten, lokale besturen en ondernemingen die gebruik maken van de persoonlijke gegevens alsook de personen in kwestie zelf.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Vanuit het relanceplan “Vlaamse Veerkracht 2020” wordt ingezet op het versterken van het vertrouwen van de burger in de data-economie waarbij burgers zelf controle hebben over data zodat ze die vlotter en veiliger kunnen delen en zo een zelfbeheerde digitale identiteit kunnen creëren. Het relanceproject VV076 “Zelfbeheerde Identiteit” maakt deze ambitie concreet met de ontwikkeling van een sterke Vlaamse data-economie als uitgangspunt.</p> <p>Vlaamse burgers worstelen met de data paradox: ze houden enerzijds van het gebruiksgemak die datagedreven diensten hen bieden maar anderzijds is er bij veel Vlamingen weerstand door de intransparantie waarmee ‘big tech’ bedrijven omgaan met hun persoonlijke data. Door het uitbouwen van een innovatief platform voor persoonlijke datakluis gebaseerd op de wereldwijde Solid-standaard, wordt deze paradox overbrugd.</p> <p>De persoonlijke datakluis versterkt de privacy van de burger en zal ertoe leiden dat persoonsgegevens digitaal veiliger en met een grotere transparantie en bewustzijn gedeeld kunnen worden terwijl bedrijven kunnen focussen op nieuwe businessmodellen op basis van deze data die in lijn met GDPR beschikbaar komt. Voor de Vlaamse data-economie betekent dit een belangrijke verlaging van drempels op niveau van ondermeer kosten en doorlooptijd. Hiermee wordt bovendien toekomstgericht ingezet op de Europese digitale identiteit, een kader dat de Europese Commissie uitwerkt om alle burgers, ingezetenen en bedrijven in de EU hun identiteit digitaal te laten bewijzen en elektronische documenten vanuit een persoonlijke datakluis te laten delen. Door gebruik te maken van het platform voor persoonlijke datakluis kunnen Vlaamse bedrijven zich volop voorbereiden op de komst van deze nieuwe verordening. Een eerste toepassing van deze persoonlijke datakluis wordt binnen dit project uitgewerkt en laat een burger toe het domicileadres en contactgegevens in zijn persoonlijke datakluis op te laden en na toestemming ter beschikbaar te stellen aan derden. Bedrijven die van deze data gebruik willen maken, kunnen de geldigheid en juistheid ervan verifiëren. Het project bepaalt</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

eveneens de regels en afspraken voor de deelnemers aan dit nieuwe data-ecosysteem.

De operationele doelstellingen voor dit project zijn als volgt gedefinieerd:

- 1) Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluis in een Software-as-a-Service (SAAS) aanbod, inclusief GDPR-compliant infrastructuur, hosting, licenties en servicemanagement (vanaf Q1 2022)
- 2) Derde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis – na toestemming van de burger - een manier aanbieden waarbij die partijen de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (vanaf Q2 2022)
- 3) Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case waarbij de burger data kan opladen in zijn persoonlijke kluis (bv. domicilie adres, contactgegevens) en na toestemming ter beschikbaar kan stellen aan derden (Q4 2022)
- 4) Opschalen van het Solid ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden door middel van het aansluiten van nieuwe use cases en het hergebruik van de persoonlijke datakluis (vanaf Q2 2022)

De ontwikkeling en het operationeel beheer van dit platform voor persoonlijke datakluis wordt opgenomen vanuit het op te richten Vlaams Datanutsbedrijf (relanceproject VV061), verwacht in het tweede kwartaal 2022.

Om deze operationele doelstellingen te realiseren werden een aantal projectonderdelen uitgewerkt.

Deze bevinden zich op verschillende niveau's. Er wordt stelselmatig toegewerkt naar het realiseren van een innovatief platform voor persoonlijke datakluis. Als eerste stap moet er een GDPR-compliant platform ter beschikking zijn en worden de servicemanagement processen ingericht. Ondertussen lopen er business cases die met een aantal stakeholders de eerste use case definiëren. Deze zijn beschreven in het businessplan van het Vlaamse Datanutsbedrijf. Na een initiële opzet is het de bedoeling om middels implementatie van bijkomende use cases het totale aantal gebruikers tegen einde 2024 op te schalen tot 1 miljoen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	4.000.000 EUR
Output	Digitaal platform van persoonlijke datakluis op basis van de SOLID specificatie
Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluis in een Software-as-a-Service (SAAS) aanbod, inclusief GDPR-compliant infrastructuur, hosting, licenties en servicemanagement (vanaf Q1 2022) 2) Derde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis – na toestemming van de burger - een manier aanbieden waarbij die partijen de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (vanaf Q2 2022) 3) Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case waarbij de burger data kan opladen in zijn persoonlijke kluis (bv. domicilie adres, contactgegevens) en na toestemming ter beschikbaar kan stellen aan derden (Q4 2022) 4) Opschalen van het Solid ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden door middel van het aansluiten van nieuwe use cases en het hergebruik van de persoonlijke datakluis (vanaf Q2 2022)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Toename digitale collectiedata - Efficiëntie Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> - Na gunstig advies van Inspectie Financiën en Begroting, werd het dossier door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 26 november 2021. - Programma management Solid offering opgestart - Verschillende workstreams gedefinieerd en opgestart
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
	MIJLPAAL	TIMING	STATUS
	Dit project werd goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 26 november 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd
	Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluisen in een SAAS aanbod.	2022 Q1	Op schema
	Derde partijen een manier aanbieden om geldigheid en correctheid van data te kunnen verifiëren.	2022 Q2	Nog niet gestart
	Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case.	2022 Q4	Op schema
	Opschalen ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden.	2022 Q2	Nog niet gestart
	RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema
	RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.000.000 EUR
Uitvoering VEK	770.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 3.300.000 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 700.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 26/11/2021 betreft relanceproject Zelfbeheerde identiteit](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV061 - Datanutsbedrijf](#)

14. Culturele infrastructuur

VV077 - BELFORT AALST

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatieproject voor het Aalsterse Belfort ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het gebouw en de uitbouw van een permanente museale werking. De totale projectkost wordt geraamd op 2 mio euro. Het departement CJM subsidieert tot 60% van de voorziene werken met relancemiddelen, tot een maximum van 1,093 mio euro. De toekenning van de investeringssubsidie is voorzien in 2021, de opstart van het beheersplan en restauratiedossier in 2022. De uitvoering van de restauratie zal plaatsvinden in de periode 2023-2025.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.093.000 EUR
Output	Herbestemming van het Aalsterse Belfort tot publiek toegankelijk (stads)museum.
Outcome	Het Belfort wordt omgevormd tot een hedendaags (stads)museum waardoor het Belfort meer bezoekers kan ontvangen in een hedendaagse context. De focus ligt op een verhoging van het aantal bezoekers, een verbeterde aantrekkelijkheid...
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening van het projectvoorstel tegen 15/5/2021 voerde de administratie een controle uit op de volledigheid van het dossier. Daarna volgde een

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	adviesformulering aan de minister, het advies door Inspectie Financiën (10/10/2021) en tenslotte werd het begrotingsakkoord verleend op 2 december 2021. Het dossier wordt voorgelegd in 2022 aan de Vlaamse regering voor het verlenen van een subsidie op naam.
Noodzakelijke politieke actie	Beslissing Vlaamse Regering.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie	2022 Q1	Op schema
Oplevering van het project (concrete planning onder voorbehoud).	2025 Q3	Nog niet gestart
Aanbesteding studiefase	2021 Q4	Op schema
Gunning studiefase	2022 Q1	Nog niet gestart
Opmaak definitief ontwerp	2023 Q2	Nog niet gestart
Aanbesteding werken	2023 Q4	Nog niet gestart
opmaak beheersplan en restauratiedossier	2023 Q4	Op schema
Uitvoering werken	2025 Q1	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.093.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.093.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project omvat de bouw van een nieuw cultuurhuis, incl. theaterzaal cap. 400 personen en een polyvalente zaal voor expo's en clubconcerten. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 9 miljoen euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 3 miljoen euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	3.000.000 EUR
Output	De bouw van een nieuw cultuurhuis.
Outcome	Een nieuw cultuurhuis wordt gebouwd om een nieuwe hedendaagse productie- en presentatieplek te realiseren waardoor culturele actoren een plek kunnen krijgen en er producties en evenementen kunnen gehost worden.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	Na indiening van het projectvoorstel tegen 15/5/2021 voerde de administratie een controle uit op de volledigheid van het dossier. Daarna volgde een adviesformulering aan de minister, het advies door Inspectie Financiën (10/10/2021) en tenslotte werd het begrotingsakkoord verleend op 2 december

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	2021. Het dossier staat momenteel on hold, gelet op de onduidelijkheid veroorzaakt door de communicatie van de stad Blankenberge.
Noodzakelijke politieke actie	Beslissing VR.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Aanstellen ontwerper	2021 Q4	Vertraging
Toekennen investeringssubsidie	2022 Q1	Nog niet gestart
Opmaak ontwerp	2022 Q4	Nog niet gestart
aanbesteding werken	2023 Q2	Nog niet gestart
Oplevering project	2026 Q2	Nog niet gestart
uitvoering werken	2026 Q2	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV079 - DESINGEL ANTWERPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	DeSingel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Als eigen cultuurinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap wordt er in het kader van de relance de komende jaren ook extra geïnvesteerd in de verdere renovatie van deSingel. De verbindende wandelgangen bieden een mooi uitzicht op het geheel van de kunstsitatie en de diverse fases waarin ze gerealiseerd zijn. Wie de blik naar binnen richt, wordt echter geconfronteerd met een interieur dat na veertig jaar een grondige vernieuwing nodig heeft. Een aantal foyerruimtes, concertzalen en wandelgangen zullen dan ook grondig gerenoveerd worden. De studieopdracht start in 2021 en de realisatie van werken start in 2022. De investering vanuit relancemiddelen bedraagt 1,65 miljoen. De totale projectkost wordt geraamd op 3,7 miljoen euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.650.000 EUR
Output	Via een investeringsbudget van 1,65 miljoen worden extra middelen vrijgemaakt voor deze noodzakelijke renovatie: de wandelgangen, aantal foyerruimtes en concertzalen.
Outcome	deSingel wordt opnieuw een toonaangevende hedendaagse kunstsitatie incl. een hedendaagse productie- en presentatieplek, waardoor het huis aan zowel gebruikers, gezelschappen als bezoekers een hedendaagse kunstervaring kan aanbieden in een grootstedelijke context. Specifiek zullen de gerenoveerde wandelgangen en foyerruimtes van deSingel de bestaande ruimtes opnieuw integraal verbinden..
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	In het kader van de aanbestedingsprocedure voor de studieopdracht beoordeelde de jury eind september de ingediende offertes en formuleerde ze haar advies. Op basis van dit advies werd het gunningsverslag in oktober opgemaakt en wordt in de loop van december overgegaan tot het nemen van de gunningsbeslissing.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Opstart aanbesteding studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd
Toekenning investeringsbudget	2021 Q2	Gerealiseerd
Gunning studieopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd
Opstart studie door studiebureau	2022 Q1	Op schema
Oplevering studie	2022 Q3	Nog niet gestart
Opstart aanbesteding renovatiewerken	2022 Q3	Nog niet gestart
Gunning renovatiewerken	2023 Q2	Nog niet gestart
Opstart renovatiewerken door aannemer	2023 Q2	Nog niet gestart
Oplevering renovatie	2024 Q2	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.650.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.650.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De site 'Groeningeabdij' te Kortrijk wordt een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingsite in Kortrijk met beeldende kunst als motor en met identiteit als centraal thema op een historisch uitzonderlijke erfgoedlocatie.

Het wordt een hybride mix van een kunsthall, een museum en een plek voor de hele stad als bruisende ontmoetingsplaats. De studieopdracht is reeds gestart en de werken zullen opstarten in het voorjaar van 2022. Het gebouw zal in gebruik genomen worden vanaf 2024.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	7.500.000 EUR
Output	Verlenen van de investeringssubsidie van 7,5 mio euro voor de Groeningeabdij in Kortrijk. Door de investeringssubsidies wordt de site 'Groeningeabdij' een innovatieve tentoonstellingsite.
Outcome	De bouw van een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingsite in Kortrijk als innovatieve bruisende ontmoetingsplaats voor alle gebruikers en bezoekers in een hedendaagse context.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het ontwerpteam werkt het dossier verder uit.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Gunning studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd
Start studie	2021 Q1	Op schema
Oplevering studie	2022 Q2	Nog niet gestart
start aanbesteding werken	2022 Q1	Nog niet gestart
Start uitvoering	2022 Q2	Nog niet gestart
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2024 Q1	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	7.500.000 EUR
Uitvoering VEK	463.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

In de periode 2021-2022 is er in totaal 7.000.000 euro uit de relancemiddelen beschikbaar voor het verlenen van investeringssubsidies voor grote cultuurinfrastructuur, met een werking die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer. In 2021 en 2022 wordt hiervoor budget voorzien zodat een aantal geplande relanceprojecten kunnen versneld worden met deze financiële ondersteuning.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	7.000.000 EUR
Output	Via het toekennen van één of meer investeringssubsidies voor grote culturele infrastructuur wordt de grote cultuurinfrastructuur in Vlaanderen gerenoveerd en/of gerestaureerd met het oog op meervoudig en hedendaags gebruik. De precieze output is afhankelijk van ingediende projectvoorstellen die een investeringssubsidie ontvangen.
Outcome	Er wordt geïnvesteerd in performante, veilige en milieuvriendelijke culturele infrastructuur van uitzonderlijke omvang (infrastructuur die zich richt tot de Vlaamse gemeenschap en ruimer); voor alle makers en gebruikers in een hedendaagse context.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>De administratie van het departement CJM ontving op 15 mei 9 aanvragen voor een investeringssubsidie Grote Culturele Infrastructuur. De administratie verleende advies op 19 oktober.</p> <p>Op 28 oktober 2021 nam de minister een principiële beslissing. Het advies van de Inspectie Financiën werd verleend op 22 november. Na goedkeuring van het nodige begrotingsakkoord en beslissing van de Vlaamse Regering worden de subsidies vastgelegd in het eerste kwartaal van 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Beslissing Vlaamse Regering.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Indienen aanvragen investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur 2021	2021 Q2	Gerealiseerd
Principiële beslissing en advies IF	2021 Q3	Gerealiseerd
Toekenning investeringssubsidies (BVR)	2022 Q1	Nog niet gestart
Realisatie bouwprojecten (onder voorbehoud van de bouwprojecten die een investeringssubsidie toegekend krijgen).	2026 Q4	Nog niet gestart
Indienen aanvragen investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur 2022	2022 Q2	Nog niet gestart
Principiële beslissing en advies IF	2022 Q3	Nog niet gestart
Toekenning investeringssubsidies (BVR)	2022 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 7.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Literatuur Vlaanderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De restauratie en de renovatie van het Hotel Dumont in Antwerpen heeft als doel het realiseren van een semi-publiek 'Huis van de Letteren', waarin zowel Literatuur Vlaanderen als Iedereen Leest hun intrek zullen nemen in het kader van een geïntegreerd letterenbeleid in Vlaanderen. Op het binnenplein zal bijkomend een nieuwbouwpaviljoen worden gerealiseerd. De werken werden ondertussen twee keer aanbesteed, maar de aanbestedingsprijzen blijken hoger te liggen dan oorspronkelijk geraamd, vandaar dat er bijkomend budget wordt gevraagd. Via de relancemaatregelen werd een bijkomende financiering van 750.000 euro toegekend om het project haalbaar te houden. Totale kostprijs van het project: 3.520.000 euro incl. BTW (reeds goedgekeurde investeringssubsidies van FoCI voor een bedrag van 950.000 euro).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	750.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 750.000 euro wordt het renovatiebudget van Hotel Dumont als nieuwe thuishaven voor Literatuur Vlaanderen en Iedereen Leest dicht gereden. Daardoor kan het bouwproject gerealiseerd worden.
Outcome	Realisatie van een semi-publiek 'Huis van de Letteren' door de renovatie van het Hotel Dumont en de bouw van een nieuwbouwpaviljoen met literaire tuin op het binnenplein. Hierdoor ontstaat een nieuwe culturele infrastructuur die literaire activiteiten kan hosten.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De uitvoering van de werken zit op schema.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd
oplevering renovatie hotel Dumont en nieuwbouw in binnengebied	2022 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	750.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 750.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV083 - INVENTARIS CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.

Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken

De inventaris brengt de cultuur- en jeugdinfrastructuur in kaart via een omvattende databank, met een uitbreidbare set relevante gegevens. Deze informatie wordt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media aangewend om een overzicht te krijgen over de bestaande infrastructuur. Dit enerzijds voor de toetsing van toekomstige aanvragen voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur. Anderzijds voor analyse en de opmaak van een periodieke landschapstekening van de cultuur- en jeugdinfrastructuur om zicht te krijgen op lacunes, noden en dynamieken met het oog op de ontwikkeling en actualisering van beleid. De dataset wordt volgens de principes van open data door het Departement publiek beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in overleg met de sectoren onderzocht welke noden en/of opportuniteiten er momenteel zijn omtrent infrastructuurgegevens (bijvoorbeeld naar gedeeld gebruik,...) en op welke manieren deze ontsloten kunnen worden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	600.000 EUR
Output	een omvattende databank van de cultuur- en jeugdinfrastructuur
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - toetsing van aanvraagdossiers voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur - overzicht en data over de bestaande infrastructuur als input voor analyse en beleidsondersteuning - tegemoet komen aan kennis- en informatienoden bij de sector
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het voorbereidend onderzoek voor de inventarisatie loopt, maar liep enige vertraging op. De huidige timing voor de oplevering is januari 2022. Een externe functionele analist/projectleider is intussen ingewerkt om een spoedige voortgang van de uitwerking mee te ondersteunen en de volgende stappen voor de bereiden. In samenwerking met de projecten rond digitalisering werd een OSLO traject voor standaardisatie opgestart. De eerste werkgroep vond plaats in december 2021.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Opstart voorbereidend onderzoek inventarisatie cultuur- en jeugdinfrastructuur	2021 Q2	Gerealiseerd
Afronding voorbereidend onderzoek en bepaling van eventuele nodige tussenstappen/mijlpalen voor uitvoering	2022 Q1	Nog niet gestart
Opmaak bestek en aanbesteding voor implementatie	2022 Q3	Nog niet gestart
Start implementatie inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur	2023 Q1	Nog niet gestart
Oplevering 1 basis databank met set relevante parameters	2023 Q3	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	600.000 EUR
Uitvoering VAK	51.000 EUR
Uitvoering VEK	12.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	kunstenaars, lokale en regionale overheden, organisaties uit diverse sectoren, burgers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Stimuleringsinstrument voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte als hefboom voor de realisatie van kunstopdrachten zowel in de stedelijke publieke ruimte als de open ruimte in Vlaanderen. Het uitgangspunt van het stimuleringsinstrument is niet de realisatie van een kunstopdracht naar aanleiding van een specifiek bouw- of verbouwproject zoals in het decreet Kunst in Opdracht, maar laat open welke context ingezet wordt voor het initiëren van een locatie-specifieke kunstopdracht en wie hier precies de initiatiefnemer voor is. Het betreft aanvragen waarbij maximum 50% cofinanciering als principe gehanteerd wordt en het conglomeraat van partners die een project indienen en investeren in de kwaliteit van de publieke ruimte een deel van het kunstproject zelf financieren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	3.000.000 EUR
Output	60 kunstopdrachten in de publieke ruimte
Outcome	Met de subsidielijn van het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte wordt de realisatie van kwaliteitsvolle kunstopdrachten in de publieke ruimte beoogt die doordat een diverse groep van opdrachtgevers uit verschillende maatschappelijke geledingen de weg vindt naar een professionele aanpak om kunstopdrachten te initiëren en zich te richten op een diverse groep van burgers die gebruik maken van de publieke ruimte.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Op 4/10 werden 16 projecten positief geadviseerd door het expertenpanel. Vervolgens werden deze adviezen voorgelegd aan IF en de minister die het voorstel van het expertenpanel volgden. De MB's werden op 12/11 ondertekend, waarna de vastleggingen voor deze 16 projecten werden genomen. De volgende 16 projecten worden elk volgens een eigen timing gerealiseerd :</p> <p>Murals Zennepark voor ABC for Children te realiseren in Schaarbeek voor een bedrag van 21.916,13 euro</p> <p>Project Veldwerkers voor AGW Genk te realiseren in Genk voor een bedrag van 120.000 euro</p> <p>Contemporary Lukasa voor AG Culturele Instellingen/Kunst in de Stad te realiseren in Antwerpen voor een bedrag van 70.000 euro</p> <p>Project in de Perifere stad voor Ag Culturele Instellingen/Kunst in de Stad te realiseren in Deurne, Merksem, Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout en Hoboken voor een bedrag van 240.000 euro</p> <p>Mijnkathedraal voor stad Beringen te realiseren in Beringen voor een bedrag van 59.750 euro</p> <p>Landschap in Landschap voor AGB Bornem te realiseren in Bornem voor een bedrag van 75.000 euro</p> <p>Migrating Churches voor AGB Bornem te realiseren in Wintam voor een bedrag van 15.000 euro</p> <p>De Gouden Boom voor Brugge Plus vzw te realiseren in Brugge voor een bedrag van 70.220 euro</p> <p>18 banen voor Beatrijs voor De Wilde Plas vzw te realiseren in Antwerpen voor een bedrag van 53.679,23 euro</p> <p>Klare Wal van De Nieuwe Opdrachtgevers vzw te realiseren in Alveringem voor een bedrag van 40.000 euro</p> <p>Een kunstwerk op de gemeentepplaats voor de gemeente Hemiksem te realiseren in Hemiksem voor een bedrag van 50.000 euro</p> <p>Kunst op de ILVO onderzoekskouter als verbinding tussen maatschappij en wetenschap voor ILVO te realiseren in Melle/Merelbeke voor een bedrag van 30.098,75 euro</p> <p>Covid19-herdenkingsmonument voor de gemeente Kruikebe te realiseren in Kruikebe voor een bedrag van 15.000 euro</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>Tuin van Eten voor 't Arsenaal/MMT vzw te realiseren in Mechelen voor een bedrag van 24.200 euro</p> <p>Sound of Sand voor Musica Impulscentrum voor Muziek vzw te realiseren in Pelt en Lommel voor een bedrag van 16.000 euro</p> <p>PLOT, een opera voor Tondelier voor Pilotproject Tondelier vzw te realiseren in Gent voor een bedrag van 50.000 euro.</p> <p>Het totale toegekende subsidiebedrag voor deze 16 projecten is 950.864,11 euro.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Goedkeuring reglement stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte	2021 Q2	Gerealiseerd		
Toekennen subsidies oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd		
Start realisatie van de geselecteerde kunstopdrachten uit de oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd		
Toekennen subsidies oproep 2022	2022 Q4	Nog niet gestart		
Uitvoeren van de geselecteerde kunstopdrachten oproep 2022	2023 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
16 kunstopdrachten zijn het realisatietraject opgestart. Hiervan worden er 10 gerealiseerd in 2022, 3 in 2023 en 3 in 2024.	60	2024 Q4	16	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	951.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK	287.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV085 - KURSAAL OOSTENDE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het concept bestaat uit een uniek, mobiel hefsysteem dat de volledige zaal kan ombouwen tot een multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.

Dit innovatief zaalconcept kent verschillende opstellingen:

- zittende opstelling (auditorium): capaciteit van 2.000 zitplaatsen;
- vlakke opstelling voor staande concerten: capaciteit van 2.750 personen op parterre, incl. balkon is dat 3.150;
- foyeropstelling: extra capaciteit van 1.500m² voor beurzen, galadiners, etc.

De werken zorgen verder voor de integrale toegankelijkheid van het gebouw en er gebeuren aanpassingen aan de scène-opening, het HVAC-systeem en de licht- en klankinstallatie.

Het project legt de focus op ontsluiting van erfgoed en wil de link leggen met de evenementensector en het kusttoerisme.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 16.670.358,89 euro excl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 9 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	9.000.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 9.000.000 euro (maximaal 60% van de projectkost) wordt het Kursaal in Oostende omgevormd tot een innovatieve multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.
Outcome	Realisatie van verbouwing van grote zaal van het Kursaal Oostende tot multifunctionele zaal met grotere zaalcapaciteit waardoor een nieuwe culturele infrastructuur ontstaat op het snijvlak tussen enerzijds cultuur en anderzijds de evenementensector en kusttoerisme.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	EKO NV bezorgde de administratie de aanbesteding- en gunningsdocumenten m.b.t. de studieopdracht. Een multidisciplinair team werd aangesteld. Momenteel inventariseren zij de bestaande toestand met het oog op de opmaak van een voorontwerp begin 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
opstart aanbesteding studieopdracht	2021 Q3	Gerealiseerd	
gunning studieopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
definitief ontwerp door studiebureau	2022 Q2	Op schema	
opstart aanbesteding werken	2022 Q4	Nog niet gestart	
gunning werken	2023 Q1	Nog niet gestart	
uitvoering werken deel 1: engineering en productie	2023 Q2	Nog niet gestart	
uitvoering werken deel 2: werf	2024 Q1	Nog niet gestart	
oplevering werken	2024 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.000.000 EUR
Uitvoering VEK	59.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 9.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

In het masterplan voor de Schouwburg worden de kleedkamers en de bureaus vernieuwd en de foyer omgebouwd tot een cultuurcafé, dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats en als co-working space. Door de nieuwe verbouwingsfase zal het gebouw voldoen aan de hedendaagse normen rond toegankelijkheid en duurzaamheid en wordt het Arenatheater uitgebreid van 120 naar 200 plaatsen met daarboven een vernieuwde dansstudio. De studieopdracht van dit project start in mei 2021, de realisatie van de werken start in 2023 en duurt tot en met 2025.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	7.800.000 EUR
Output	Uitbouw van en masterplan waardoor de schouwburg gerenoveerd en uitgebouwd wordt tot een open meervoudig bruikbaar huis dat toonaangevend is m.b.t. toegankelijkheid en duurzaamheid.
Outcome	Een hedendaagse productie- en presentatieplek waardoor het huis aan meer makers en bezoekers een plek kan bieden.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het ontwerpteam werkt het dossier verder uit.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd
Opstart studie	2021 Q3	Op schema
Oplevering studie	2022 Q4	Nog niet gestart
Opstart aanbesteding werken	2023 Q1	Nog niet gestart
Gunning werken	2024 Q2	Nog niet gestart
Opstart werken	2024 Q3	Nog niet gestart
Oplevering werken	2026 Q3	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.800.000 EUR
Uitvoering VAK	7.800.000 EUR
Uitvoering VEK	191.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige 'Materniteit' op de Gentse Bijlokesite wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte om als creatiecluster ruimte te geven aan organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen. De infrastructuur zal zorgen voor de nodige kruisbestuivingen tussen de verschillende organisaties die er hun intrek nemen, waaronder Festival van Vlaanderen, Les Ballets C de la B, Muziektheater LOD, Symfonie orkest Vlaanderen en Studio Orka. Er wordt gefocust op gedeeld ruimtegebruik inzake studio's, flexwerkplekken en ruimtes voor individuele repetities.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	4.980.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 4.98 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt in de materniteit van de Gentse Bijlokesite ruimte voor een creatiecluster gerealiseerd voor organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen.
Outcome	Via de herbestemming en renovatie van voormalige Gentse Materniteit wordt een hernieuwde culturele infrastructuur gerealiseerd die ruimte biedt voor kruisbestuivingen en meer culturele activiteiten.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Aandacht nodig
---------------	----------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>Na indiening van het projectvoorstel in februari 2021 voerde de administratie een controle uit op de volledigheid van het dossier. Daarna volgde een adviesformulering aan de minister.</p> <p>Het financieel plan van het project is niet volledig, in afwachting van bijkomende financiering wordt het dossier nog niet voorgelegd bij de Vlaamse Regering om de investeringssubsidie definitief toe te kennen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Beslissing Vlaamse Regering.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Vertraging
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2027 Q4	Nog niet gestart
aanbesteding en gunning stabiliteitsonderzoek	2021 Q1	Gerealiseerd
ontwerpfase	2021 Q4	Vertraging
Aanbesteding ontwerper	2021 Q4	Vertraging
Aanbestedingsdossier en omgevingsvergunning werken	2022 Q4	Nog niet gestart
uitvoering van de werken	2023 Q3	Nog niet gestart
Gunning werken	2023 Q3	Nog niet gestart
Voorlopige oplevering van de werken	2025 Q3	Nog niet gestart
Definitieve oplevering	2027 Q3	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.980.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.980.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV088 - MOOOV TURNHOUT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	MOOOV vzw

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatie zalencomplex Den Bond. Presentatieplek voor kunstenaars, i.s.m. De Warande, en art house cinema. Totale projectkost: €3.200.000

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.300.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 1.3 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een hedendaagse presentatieplek voor kunstenaars en art house cinema gecreëerd.
Outcome	Het zalencomplex Den Bond wordt omgevormd tot een hedendaagse art house cinema in Turnhout waardoor een culturele infrastructuur gecreëerd wordt die aan makers en gebruikers nieuwe kansen biedt en meer producties en culturele evenementen kan hosten.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening van het projectvoorstel tegen 15/5/2021 voerde de administratie een controle uit op de volledigheid van het dossier. Daarna volgde een adviesformulering aan de minister, het advies door Inspectie Financiën (10/10/2021) en tenslotte werd het begrotingsakkoord verleend op 2 december

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	2021. Het dossier wordt voorgelegd in 2022 aan de Vlaamse regering voor het verlenen van een subsidie op naam.
Noodzakelijke politieke actie	Beslissing VR

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekennen investeringssubsidie	2022 Q1	Op schema
Oplevering project	2023 Q2	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Musea Brugge, onderdeel van de Stad Brugge, zal een bruisende museumsite realiseren op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge. De site zal bestaan uit een prestigieuze tentoonstellingshal, een onderzoekscentrum met museumbibliotheek en een nieuw museumpark en een gerenoveerd het Groeningemuseum. De opening van de tentoonstellingshal is voorzien in 2024, vanaf 2025 start het renovatietraject van de Groeningesite en aanliggende gebouwen. Het betreft het versnellen van een gepland investeringsproject uit het Vlaams Regeerakkoord.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	27.253.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 27 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een museumsite gerealiseerd in het historisch centrum van Brugge via restauratie en renovatie van de bestaande gebouwen enerzijds en de aanleg van een nieuw museumpark.
Outcome	Op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge wordt een nieuwe museale museumsite gerealiseerd die plek geeft aan nieuwe makers en evenementen enerzijds en nieuwe bezoekers anderzijds.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>In het najaar 2021 werd de opdracht van het Design & Build-team uitgebreid voor de volledige site en werd er verder gewerkt aan de omgevingsvergunning die eind december wordt ingediend. Er is werk gestopt in het verder uittekenen van de totale visie op de site en de parkaanleg. Veel aandacht ging daarbij naar het bomenpatrimonium op de site. Daarnaast was er nog nieuw overleg met de buurtbewoners, en werd het ontwerp verder verfijnd.</p> <p>In het Groeningemuseum zijn de HVAC-werken opgestart, ter voorbereiding van de geplande renovatie.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Begrotingsakkoord	2020 Q4	Gerealiseerd
Aanbesteding Design en Build procedure BRUSK	2021 Q1	Gerealiseerd
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd
Sloopwerken Groeningemuseum	2022 Q3	Nog niet gestart
Plaatsing HVAC Groeninge	2022 Q3	Op schema
Uitvoering werken deelproject Centrum voor Collectieonderzoek	2023 Q3	Nog niet gestart
Uitvoering werken verbinding BRUSK-Groeningemuseum	2024 Q4	Nog niet gestart
Voorlopige oplevering deelproject BRUSK	2024 Q4	Nog niet gestart
Verhuis scenografie en inregelen van technieken BRUSK	2025 Q3	Nog niet gestart
Uitvoering werken Museumpark	2026 Q4	Nog niet gestart
Renovatie Groeningemuseum en Groeningekapel	2026 Q4	Nog niet gestart
Voorlopige oplevering deelproject renovatie Groeningemuseum	2027 Q4	Nog niet gestart
Oplevering Museumsite	2027 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.253.000 EUR
Uitvoering VAK	27.253.000 EUR
Uitvoering VEK	389.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 27.253.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Momenteel zit SteM Sint-Niklaas verspreid over 3 locaties: het SteM/Zwijgershoek, het Mercatormuseum (museumtuin) en de Salons. De komende jaren beoogt de stad de uitbouw van de site Zwijgershoek als een volwaardige museumsite en culturele hotspot. In 2022 worden de Salons overgebracht naar het gerestaureerde Huis Janssens. Tevens worden de verschillende onderdelen op de site met elkaar verbonden door de aanleg van een museumtuin. De stad wenst d.m.v. de middelen in het kader van de Relance o.a. ingrepen te doen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid, waardoor een museumsite wordt gecreëerd waar topstukken in een veel betere conditie kunnen getoond en bewaard worden. Voor het SteM zal de stad ook een Energieprestatiecontract afsluiten met een ESCO om op termijn tot een significante energiekostenbesparing te komen. De verschillende werken kennen een gefaseerd verloop, waarbij de laatste fase medio 2023 wordt voltooid.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 1.923.126,77 euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 900.000 euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	900.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 46,8% (op de totale projectkost of 900 keuro) wordt de site Zwijgershoek tot een volwaardige museumsite omgebouwd.
Outcome	Via de realisatie van 4 deelprojecten, wordt de site Zwijgershoek tot een volwaardige museumsite en culturele hotspot omgevormd waardoor de site aan meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De administratie volgt de verschillende projectonderdelen op. Het deelproject betreffende de entresolvloer is inmiddels gerealiseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Start van de werken Huis Janssens	2021 Q1	Gerealiseerd
Start werken entresolvloer	2021 Q2	Gerealiseerd
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd
Oplevering werken entresolvloer	2021 Q3	Gerealiseerd
Gunning studie Mercator museum	2022 Q1	Nog niet gestart
Aanbesteding studie Mercator museum	2022 Q1	Nog niet gestart
Definitief ontwerp Mercator museum	2022 Q2	Nog niet gestart
Oplevering werken Huis Janssens	2022 Q2	Nog niet gestart
Aanbesteding werken Mercatormuseum	2022 Q4	Nog niet gestart
Gunning werken Mercatormuseum	2022 Q4	Nog niet gestart
Start werken Mercatormuseum	2023 Q2	Nog niet gestart
Oplevering werken Mercatormuseum	2023 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	900.000 EUR
Uitvoering VAK	900.000 EUR
Uitvoering VEK	300.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 900.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kopergietery vzw

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Kopergietery is een organisatie voor kinderkunsten in Gent, opgericht door Eva Bal. Kopergietery is eigenaar van het gebouw waarin zich ook de theaterzaal bevindt, en huurde tot voor kort het aanpalende gebouw. Dit aanpalende gebouw werd recent aangekocht, en wil men vervangen door een nieuwbouw. In deze nieuwbouw zullen de volgende ruimtes worden voorzien: drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers voor de artiesten, transparante en open bureaus voor de medewerkers, een bouw-atelier en twee technische ateliers. Het betreft in totaal een oppervlakte van +- 1.400 m². De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 3.543.464 euro excl. BTW (BTW medecontractant), de Vlaamse overheid investeert hiervan 2,125 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	2.125.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 2,125 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een nieuwbouw gerealiseerd met drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers, open bureaus, een bouwatelier en twee technische ateliers.
Outcome	Realisatie van Kopergietery STUDIO's, uitbreiding van bestaande culturele infrastructuur met nieuwbouwproject waardoor het huis meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Na het bekomen van het begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. De administratie is gestart met de opvolgingsprocedure van de aanbesteding en uitvoering van dit project. In het najaar van 2021 werd het ontwerpteam aangesteld. In een volgende fase wordt het bestek met programma van eisen opgemaakt voor uitvoering van de werken.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd
Aanbesteding ontwerper	2021 Q3	Gerealiseerd
Opmaak aanbestedingsdossier	2022 Q2	Op schema
Gunning en sluiting van de opdracht voor werken	2022 Q3	Nog niet gestart
Oplevering nieuwbouw repetitiestudio's (timing onder voorbehoud)	2024 Q2	Nog niet gestart
Uitvoering van de werken	2024 Q3	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.125.000 EUR
Uitvoering VAK	2.125.000 EUR
Uitvoering VEK	402.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.125.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De stad Sint-Niklaas wenst een nieuwe bibliotheek te realiseren. De beoogde nieuwbouw zal ook onderdak bieden aan het 'Huis van het Kind'. In het kader van dit bouwproject opteert de stad voor een Design & Build procedure. In de aanloop van deze procedure wordt er in 2021 werk gemaakt van een projectdefinitie en een selectieleidraad. Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd dossier heeft de stad nood aan juridische en technische ondersteuning. Voor een deel van de kosten van dit voorbereidend onderzoek wenst de stad een beroep te doen op de middelen in het kader van de Relance. Tegen november-december 2022 wil de stad een ontwerper/aannemer aanstellen en in januari 2024 starten met de bouw. De hiervoor vrijgemaakte relancemiddelen bedragen ongeveer 15% van de geraamde totale projectkost (15 mio incl. BTW).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	300.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 2% op de totale projectkost wordt een deel van de kosten van het voorbereidend onderzoek gefinancierd. Het gaat over juridische en technische luiken in de aanloop van een Design & Build procedure.
Outcome	Het voorbereidend onderzoek zal leiden tot de realisatie van een nieuwe bibliotheek d.m.v. een Design & Build procedure.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	Eind november keurde de gemeenteraad de selectieleidraad voor het DBFM-project goed.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd
Goedkeuring selectieleidraad DBFM door gemeenteraad	2021 Q4	Gerealiseerd
Goedkeuring gunningsleidraad DBFM door gemeenteraad	2022 Q1	Op schema
Gunning & contractafsluiting DBFM	2022 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Uitvoering VAK	300.000 EUR
Uitvoering VEK	120.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR
INSTITUUT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	VAI

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De huidige werking van het VAI zit momenteel verspreid over twee locaties (Kunstencampus deSingel & depotruimte provincie Antwerpen). Met dit project wil het VAI haar functies onder een dak brengen via de herbestemming van een parochiekerk te Berchem (Antwerpen). Het concept van deze herbestemming is een box-in-a-box depot samen met de kantoren en de publiekswerking van het VAI. Het VAI wil zo ook fungeren als ankerpunt in de wijk en zal het project in 2021 lanceren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	5.800.000 EUR
Output	Een nieuwe huisvesting voor het VAI met alle functies onder één dak.
Outcome	Een nieuwe culturele infrastructuur in een toonaangevend pand nl. de parochiekerk van Berchem waardoor het huis aan meer gebruikers en bezoekers een plek kan bieden en culturele activiteiten kan hosten.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening 2022: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsopmaak. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Indiening subsidieaanvraag door VAI	2022 Q2	Op schema
Toekenning investeringssubsidie (timing onder voorbehoud)	2022 Q4	Nog niet gestart
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2026 Q2	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.800.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Hasselt

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Stad Hasselt plant de bouw van een open kunsthuis/ kunstenwerkplaats in het centrum van de stad. Op het Groenplein – naast het historische stadhuis – wil de stad Hasselt het voormalig administratief centrum Groenplein verbouwen tot een hybride plek, waar spelers uit het lokale werkveld, diverse disciplines een unieke werking kunnen opbouwen binnen de functies productie, ontwikkeling en presentatie. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 8.564.547,75 euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 5,1 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	5.100.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 5.100.000 euro (maximaal 60% van de projectkost) wordt een open kunsthuis/kunstenwerkplaats gerealiseerd. .
Outcome	De Realisatie van een kunsthuis/ kunstenwerkplaats waar verschillende disciplines een unieke werking kunnen opbouwen en waar meer culturele activiteiten kunnen geproduceerd, ontwikkeld en gepresenteerd worden.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	In het najaar 2021 werd een bureau aangesteld dat de stad Hasselt begeleidt bij de DBM-opdracht. Zij bereiden de aanbesteding van DBM-opdracht voor. De aanbesteding zal gebeuren begin 2022 via een 2-stapsprocedure (selectie- en gunningsfase BAFO).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALLEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd
Start voorbereiding aanbesteding DBM	2021 Q4	Gerealiseerd
opstart aanbesteding DBM	2022 Q1	Nog niet gestart
gunning DBM	2022 Q4	Nog niet gestart
oplevering definitief ontwerp	2023 Q2	Nog niet gestart
omgevingsvergunning	2023 Q4	Nog niet gestart
start van de werken	2024 Q1	Nog niet gestart
oplevering werken	2026 Q1	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.100.000 EUR
Uitvoering VAK	5.100.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.100.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige stadsbibliotheek op de parterre van CC De Werf in Aalst wordt met dit project omgevormd tot een polyvalente ruimte met een co-creatieve werking als opzet, met focus op de digitale en multimediale wereld, zowel voor creatie en presentatie van content als voor een educatief programma. Het project kadert binnen de nieuwe visie van CC De Werf en in het kader van de toekomstige programmatie zal de Werf dan ook samenwerking zoeken met andere partners binnen en buiten Aalst. De investering moet toelaten op kleinere schaal culturele voorstellingen te laten doorgaan, en biedt ruimte voor zowel kleine als grotere organisaties voor repetitie en presentatie. De Vlaamse overheid investeert 450.000 euro voor de uitvoering van dit project in het kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	450.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 450.000 euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt de voormalige stadsbibliotheek in Aalst omgevormd tot een polyvalente ruimte.
Outcome	De realisatie van vernieuwde parterre voor CC De Werf voor een hedendaagse co-creatie met focus op de digitale en multimediale wereld waardoor er meer plek is voor culturele productie en presentatie.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Na het bekomen van het begrotingsakkoord op 5/7 werd de investeringssubsidie op naam op 9/7 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd het BVR ondertekend. De administratie is gestart met de opvolgingsprocedure van de aanbesteding en uitvoering van dit project.</p> <p>De eerste werken in kader van brandveiligheid werden reeds uitgevoerd via het raamcontract van de Stad Aalst. De gunning van de studiefase voor het inrichten van de ruimte is voorzien voor 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd
Aanbesteding Studie	2022 Q1	Nog niet gestart
gunning studie	2022 Q2	Nog niet gestart
aanbesteding werken	2022 Q3	Nog niet gestart
Start van de werken	2022 Q4	Nog niet gestart
Voorlopige oplevering project (timing onder voorbehoud)	2023 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	450.000 EUR
Uitvoering VAK	450.000 EUR
Uitvoering VEK	36.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 450.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV096 - SCHOUWBURG BOOM

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Gemeente Boom

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project omvat diverse werken in het kader van de renovatie van de schouwburg van CC De Steiger te Boom. Concreet gaat het onder meer over de vernieuwing van de inkom, de renovatie van de artiestenvertrekken, de aanpassing van de laad- en loszone, het vervangen van de podiumvloer en het plaatsen van een nieuwe lichtbrug/trekken. De hiervoor vrijgemaakte relancemiddelen bedragen 300K euro, de geraamde totale projectkost bedraagt 705K euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	300.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 300K euro wordt de schouwburg van CC De Steiger in Boom opnieuw een hedendaagse speelplek.
Outcome	De realisatie van een gerenoveerde schouwburg waardoor een hedendaagse werking mogelijk gemaakt wordt en meer culturele activiteiten gehost kunnen worden.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening van het projectvoorstel tegen 15/5/2021 voerde de administratie een controle uit op de volledigheid van het dossier. Daarna volgde een adviesformulering aan de minister, het advies door Inspectie Financiën (10/10/2021) en tenslotte werd het begrotingsakkoord verleend op 2 december 2021. Het dossier wordt voorgelegd in 2022 aan de Vlaamse regering voor het verlenen van een subsidie op naam.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie	Beslissing Vlaamse Regering.
-------------------------------	------------------------------

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie	2022 Q1	Op schema
Opstart aanbesteding studieopdracht	2022 Q1	Op schema
Gunning studieopdracht	2022 Q2	Nog niet gestart
Oplevering definitief ontwerp door studiebureau	2022 Q3	Nog niet gestart
Opstart aanbesteding renovatiewerken	2022 Q3	Nog niet gestart
Gunning renovatiewerken	2022 Q4	Nog niet gestart
Opstart renovatiewerken door aannemer	2022 Q4	Nog niet gestart
Oplevering renovatiewerken	2023 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

In de periode 2021-2022 is er extra budget uit de relancemiddelen voor het verlenen van sectorale investeringsubsidies voor bovenlokale culturele infrastructuur. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor het automatiseren van theatertrekken, het nemen van energiezuinige maatregelen of voor het toegankelijker maken van de infrastructuur. Voor 2022 worden deze middelen toegekend o.b.v. het nieuwe subsidiereglement. We verlenen € 4.100.000 extra sectorale investeringsubsidies. We voorzien € 900.000 voor personeelondersteuning, die ook wordt ingezet voor de overige cultuurinfrastructuurprojecten uit het relanceplan.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	5.000.000 EUR
Output	Via sectorale investeringsubsidies wordt in Vlaanderen de bestaande culturele infrastructuur verbeterd m.b.t. toegankelijkheid, veiligheid en energiezuinigheid. Beoogde resultaat: verlenen van € 4.100.000 extra sectorale investeringsubsidies in 2021 en 2022 (maximum 60% van de totale projectkost).
Outcome	Investeren in toegankelijke, veilige en energiezuinige infrastructuur. Beoogde resultaat: verlenen van € 4.100.000 extra sectorale investeringsubsidies in 2021 en 2022 (maximum 60% van de totale projectkost). Het ondersteunen van projecten met oog op een performante en duurzame infrastructuur die op een kwaliteitsvolle manier plaats moet bieden aan meer gebruikers en bezoekers.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De minister kende op 24 november een investeringssubsidie toe aan 26 infrastructuurprojecten voor bovenlokale culturele infrastructuur voor een totaalbedrag van 5,5 mio euro. Het aandeel relancemiddelen voor deze ronde bedraagt 2,05 mio euro.</p> <p>De aanvraagronde in 2022 wordt opgestart na goedkeuring van het nieuwe subsidiereglement.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Aanvraagperiode 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning sectorale investeringssubsidies ronde 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Aanvraagperiode 2022	2022 Q3	Nog niet gestart	
Toekenning investeringssubsidies ronde 2022 (timing onder voorbehoud i.f.v. nieuwe subsidiereglement, van kracht in 2022)	2022 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.482.000 EUR
Uitvoering VEK	90.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV098 - VERSNELLING OPERA GENT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent, Ballet Vlaanderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de aankoop van het post-telegraafkantoor en het vredegerrecht zag Opera Ballet Vlaanderen in het kader van haar masterplan voor de Gentse Opera een unieke opportuniteit om het historisch pand niet alleen te restaureren maar ook te herdenken tot een meervoudig bruikbaar open huis. Door de omvorming van productie- naar presentatieplek kan het huis een plek bieden aan meer gezelschappen en ook meer producties en evenementen hosten. Deze 5 mio euro extra uit de relancemiddelen zorgt voor een versnelling van het dossier, waarvoor in 2021 ook 4 mio euro uit de reguliere middelen is voorzien. De financiële impact op de volgende legislatuur wordt hierdoor verkleind. De totale projectkosten bedragen 112.220.000 euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	5.000.000 EUR
Output	Een deel van de architectuurstudie voor de renovatie en restauratie van de Gentse Opera tot een open meervoudig bruikbaar huis.
Outcome	De opera wordt omgevormd tot een hedendaagse productie- en presentatieplek, waardoor het huis aan meer gezelschappen een plek kan bieden en meer producties en evenementen kan hosten.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	De Stuurgroep keurde het Masterplan goed. De architectuurstudie werd vervolgens opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd
Opstart studie	2021 Q2	Gerealiseerd
Oplevering studie	2023 Q1	Nog niet gestart
Opstart aanbesteding uitvoering	2023 Q2	Nog niet gestart
Gunning uitvoering	2024 Q1	Nog niet gestart
Opstart uitvoering werken	2024 Q2	Nog niet gestart
Oplevering renovatie	2030 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	505.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

15. Investerings onroerend erfgoed

VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Onroerend Erfgoed
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	- alle categorieën 'premiënemers' (initiatiefnemers van erfgoedontwikkelingsprojecten), zowel privé als publiek, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen; - de erfgoedsector (inclusief specialisten, erfgoedverenigingen ...); - de toeristische sector; - de gebruikers van erfgoed.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	15. Investerings onroerend erfgoed
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het investeren van relancemiddelen in Onroerend Erfgoed onderstreept het economisch belang van het beleidsdomein. Het wordt algemeen erkend dat de restauratiesector een bijzonder arbeidsintensieve en gespecialiseerde sector is, het gaat dan om die sectoren die 'hands on' aan het onroerend erfgoed werken zoals restaurateurs, aannemers of archeologen. Ook vormt erfgoed een belangrijke drager van toerisme, onroerend erfgoed is een van de belangrijkste motivatoren om plaatsen te bezoeken, te beleven en te ervaren.</p> <p>In het kader van 'relance' zal in het beleidsveld onroerend erfgoed worden geïnvesteerd in:</p> <p>(1) een reeks gerichte projecten uit de wachtlijst voor erfgoed- en restauratiepremies. Hiervoor zijn in 2 beslissingsrondes 46 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd: 32 miljoen euro is toegezegd op 2 april 2021 (cf. de toenmalige mededeling aan de Vlaamse Regering), op 3 december 2021 volgde de bijkomende toezegging van 14 miljoen euro (cf. mededeling aan de Vlaamse Regering op die datum). De middelen worden besteed onder de vorm van restauratie- en erfgoedpremies volgens de onroerendoerfgoedregelgeving. Deze premies bedragen een bepaald percentage van de projectinvesteringen, 40 tot 90% naargelang het soort project en het soort premienemer. De rest is als eigen aandeel door de premienemer op te leggen. De premie is aan strikte uitvoeringsvoorwaarden en -termijnen gebonden. Kandidaat-dossiers worden administratief gekeurd en mits ontvankelijk opgenomen in een wachtlijst. Begin de 2021 omvatte deze wachtlijst 561 dossiers voor een totaal premiebedrag van 304.468.767,32 euro aan</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

aangevraagde premies. Het betreft uitvoeringsklare dossiers met focus op de restauratie van beschermd erfgoed. Uitvoering mag pas van start gaan zodra de premie is toegekend. Dit gebeurt bij jaarlijkse programmatierondes, waarvoor in principe reguliere middelen worden gebruikt. Pro memorie: het jaarlijkse reguliere budget voor alle soorten erfgoedpremies schommelt rond de 80 miljoen euro. De 46 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd voor de 'wachlijst' zal worden besteed aan een gerichte selectie van dossiers uit de wachlijst, met name projecten die:

- bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling: projecten die vanuit de beoogde functie of finaliteit bijdragen tot een ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Dit gaat zowel om projecten met een sociale finaliteit (welzijn en schoolgebouwen) als projecten met een meer culturele finaliteit (musea, toeristische ontsluiting), maar ook projecten die bijdragen tot ontwikkeling van de omgeving (bv stedelijke parken, cfr link met vrijetijdsbesteding in Covid-crisis);
- bijdragen aan de groene transitie omdat ze inzetten op een duurzaam hergebruik (herbestemming) van erfgoedsites;
- bijdragen aan de ondersteuning van KMO's: projecten met een directe impact op werkgelegenheid voor kleinere en middelgrote bedrijven. Het gaat hier zowel om kleine bedrijven in de restauratiesector, zoals orgelrestaurateurs, molenbouwers, glas-in-loodateliers of interieurrestaurateurs. Het gaat dan om kleinschalige projecten die werkgelegenheid voorzien voor kleinere bedrijven in onze sector die meer geleden hebben onder de Covid-crisis en dreigen te verdwijnen bij gebrek aan werkgelegenheid. Daarnaast vallen onder deze categorie ook projecten die geïnitieerd worden door andere KMO's: handelspanden die gevestigd zijn in beschermde panden die een premie aanvragen voor de restauratie van dit pand;
- bijdragen aan de groene transitie: projecten die inzetten op verbetering van energiestatistiek, zoals de vernieuwing van technische installaties in beschermde gebouwen.

Dossiers die niet aan deze criteria voldoen worden met reguliere middelen gehonoreerd bij toekomstige programmaties.

(2) Enkele gerichte oproepen voor erfgoedpremies in toepassing van de vernieuwde erfgoedpremieprocedure. Er zal worden ingezet op volgende thema's: economische herinvulling van erfgoed, her- en nevenbestemming van kerken, erfgoed en wonen, erfgoed en toerisme. Voor deze oproepen wordt een totaal van 15 miljoen euro aan relancemiddelen gereserveerd (cf. mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021), aangevuld met telkens 5 miljoen euro aan reguliere middelen vanwege Toerisme en Wonen voor de desbetreffende oproepen. Via oproepen worden kandidaat-premienemers uitgenodigd te kandideren voor een erfgoedpremie. De oproepen monden dus uit in erfgoedpremies en dekken dus een bepaald percentage van de investeringen (cf. supra).

(3) Enkele voorbeeldprojecten:

- Op 2 april 2021 (cf. bovenvermelde mededeling aan de Vlaamse Regering) is de keuze gemaakt voor een investering in de casco-restauratie van het kasteel van Heers. De kasteelsite, sinds het voorjaar eigendom van de Vlaamse overheid, wordt een erfgoedlabo waarin partners, zowel van overheid als particulier, samen de toekomst van de site veilig stellen. Het toepassen van nieuwe technieken in conservering, restauratie, exploitatie, programmering en communicatie zal van Heers een voorbeeldsite maken over omgang met landgoederen in de 21ste eeuw. Daarin komt naast de historische betekenis, ook de economische en sociale meerwaarde voor de directe omgeving in het centrum van de ontwikkeling te staan. Het klassieke functie- en herbestemmingsdenken wordt verrijkt met een open aanpak die met de aanwezige

PROJECTOMSCHRIJVING

erfgoedwaarden aan de slag gaat. Een mix aan verdienmodellen kan er getest en geborgd worden. In een eerste fase worden alle kennispartners rond de tafel gebracht, om zo effectief mogelijk de kansen van de site te verbinden aan externe expertise (van kennis rond restauratietechnieken, over gemeenschapsvorming, tot natuurbeheer en beleving inclusief duurzaam toerisme).

Belangrijke delen van het kasteel krijgen een casco-restauratie zodat herbesteding en invulling op korte termijn mogelijk is. Hiervoor wordt 10 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd. De uiteindelijke projectkost zal worden bepaald door de keuzes die in de loop van het toekomsttraject worden gemaakt;

- Op 3 december 2021 (cf. bovenvermelde mededeling aan de Vlaamse Regering) is de keuze gemaakt voor een investering van 10 miljoen in het project Thermae Palace (Oostende). Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de 10 miljoen euro louter te besteden aan de restauratie van Thermae Palace en de Koninklijke gaanderijen. Een ruimere omgevingsaanpak door de stad Oostende staat los van de financiële bijdrage vanuit Onroerend Erfgoed. De totaalrestauratie en herbesteding van Thermae Palace is een bijzonder grootschalig en complex gegeven (gaanderijen en hotel). De geplande toekenning van 10 miljoen euro dient gezien te worden als een eerste injectie (maar vanuit Onroerend Erfgoed tevens de definitieve) om de meest dringende werken aan te pakken. Aanvullend nog premies aanvragen wordt uitgesloten. De huidige restauratieve werken en de herbesteding van het hotel wordt geraamd op minimum 70 miljoen euro. Voor de restauratie van de gaanderijen is ca. 12 miljoen euro nodig.

Indien het huidige consortium niet tot een economisch haalbare én uitvoerbare piste komt, creëert de uitvoering van de meest dringende werken mogelijk extra ruimte om een nieuw verhaal te schrijven, enerzijds qua tijdsdimensie, anderzijds qua stakeholders en participanten, waarbij mogelijks wel een integrale herbesteding mogelijk en haalbaar is. De relancemiddelen kunnen zorgen voor dit verhoopt katalysator-effect.

Van zodra het restauratiedossier voor de meest dringende werken volledig is, kan het subsidiedossier gelanceerd worden. Gelet op de decretale basis die nog moet voorzien worden via de begrotingsaanpassing 2022, zal de toekenning pas mogelijk zijn vanaf juli 2022.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	100.000.000 EUR
Output	De onder (1) en (2) vermelde investeringen gebeuren onder vorm van restauratie- en erfgoedpremies en leiden dus tot een aantal premies die in eerste instantie worden vastgelegd, en naargelang de uitvoering volgt effectief uitbetaald. Er is een voorschottenregeling. Over het precieze aantal premies wordt gericht gerapporteerd (dit hangt af van het selectieproces en de omvang van dossiers). De onder (3) vermelde investeringen zullen gebeuren onder de vorm van gerichte subsidies, zodra hiervoor dossiers beschikbaar zijn.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Elke premie en subsidie staat voor een erfgoedontwikkelingsproject, met focus op restauratie. Uitvoering leidt tot gerestaureerde en herbestede erfgoedlocaties. Projecten worden in het kader van relance geselecteerd in functie van de maatschappelijke meerwaarde die ze genereren, bovenop het restaureren (zie hoger). Projecten gaan pas effectief van start na het toekennen van de premies, maar in functie van relance gelden strakke uitvoeringstermijnen (2025). - Ook de projecten 'kasteel van Heers' en 'Thermae Palace' zijn in wezen erfgoedontwikkelingsprojecten met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	Het proces is echter even belangrijk als het eindresultaat.
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>In de tweede helft van 2021 zijn met betrekking tot de relancedossiers waarvoor investeringen zijn voorzien volgende stappen gezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De eerste stappen zijn gezet in het de besteding van de eerste 32 miljoen, die in april al waren gereserveerd voor een gerichte selectie van dossiers uit de wachtlijst voor restauratie- en erfgoedpremies. Er zijn uiteindelijk 66 premies vastgelegd. 13 premienemers hebben de werken al aanbesteed en zijn hetzij al gestart met de uitvoering, of starten binnenkort. Voor drie dossiers is al een eerste voorschot uitbetaald conform de onroerenderfgoedregelgeving (in totaal is 515.206,40 euro aan vereffeningskredieten al besteed). Begin 2022 worden de premienemers die nog geen aanbesteding meldden gecontacteerd met het oog op een snelle start van de dossiers; • Op 3 december reserveerde de Vlaamse Regering nog eens 14 miljoen euro aan middelen voor de afbouw van de wachtlijst, volgens de in april aangehaalde criteria. Deze zullen samen met het (beperkte) overschot van de eerste 32 miljoen worden gebruikt voor een selectie van 33 bijkomende premiedossiers. Het is de bedoeling hiervoor nog in 2021 de premies vast te leggen; • Op 1 november verstreek de indientermijn voor dossiers in toepassing van de 4 relance-oproepen voor erfgoedpremies. Na administratieve controle zijn 41 dossiers ontvankelijk verklaard. Deze worden nu door een jury beoordeeld, zodat de minister uiterlijk op 1 maart 2022 een preselectiebeslissing kan nemen. Gepreselecteerde dossiers worden vervolgens uitgenodigd een definitief dossier uit te werken, met het oog op een definitieve beslissing (vastlegging premies) aan het einde van het jaar. Hiervoor is 15 mio euro aan VAK gereserveerd. Voor de oproepthema's 'erfgoed en wonen' en 'erfgoed en toerisme' worden extra budgetten (niet noodzakelijk relance) voorzien door de betreffende bevoegdheidsdomeinen (5 mio vanwege wonen, 5 mio vanwege toerisme). Vanaf 2023 kunnen de dossiers worden uitgevoerd; • Inzake het dossier 'Heers' worden nu de voorbereidingen getroffen om het kasteel in erfpracht te geven aan Herita. Het restauratietraject (waarvan de inleidende fases met relancemiddelen zullen worden gefinancierd) krijgt intussen langzaam gestalte.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremies uit de bestaande wachtlijst	2021 Q2	Gerealiseerd		
Oproepen voor erfgoedpremies in het kader van relance zijn gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd		
Het toekomsttraject voor het kasteel van Heers is opgestart	2021 Q3	Gerealiseerd		
Tweede gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremies uit de wachtlijst	2021 Q4	Gerealiseerd		
Uitvoering oproepen voor erfgoedpremies: ontvangen kandidaat-dossiers, jurering en preselectie	2022 Q2	Op schema		
Lancering subsidiedossier Thermae Palace	2022 Q4	Nog niet gestart		
Uitvoering oproepen voor erfgoedpremies: ontvangen en beoordelen 'definitieve dossiers', definitieve selectie en toekennen van premies	2022 Q4	Nog niet gestart		
Uitvoering oproepen erfgoedpremies: uitvoering van de geselecteerde premiedossiers	2025 Q4	Nog niet gestart		
Uitvoering van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremedossiers	2025 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal toegekende restauratie- en erfgoedpremies in het kader van relance		2022 Q4	99	
Aantal uitgevoerde restauratie- en erfgoedpremedossiers		2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	44.539.000 EUR
Uitvoering VEK	515.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 100.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen - nota](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance](#)

[Advies van de Raad van State. Over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening

VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Omgeving
Belanghebbenden	Aanvragers van de subsidie zoals decretaal bepaald.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het hoofddoel van de Vlaamse subsidie-instrumenten ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is het tegengaan van één van de belangrijkste ruimtelijke problemen die zich reeds jarenlang voordoen, namelijk het stedelijk verval. Dat komt tot uiting in twee fundamentele ontwikkelingen: enerzijds de uitholling en anderzijds het uitdijen van de stad. Bij het fenomeen uitholling wordt men onder meer geconfronteerd met een verlies aan bedrijven, wat een duidelijke ruimtelijke impact heeft op het stedelijk weefsel. Wanneer bedrijven hun activiteit om economische redenen stopzetten of omwille van uitbreidingsproblemen of milieuhygiënische redenen naar nieuwe locaties moeten verhuizen, worden de oude bedrijfsruimten achtergelaten. Naargelang het type van gebouw, de al dan niet resterende bedrijfsinfrastructuur en de aantrekkelijkheid van de onmiddellijke omgeving, wordt door het marktmechanisme bepaald hoe snel deze gebouwen opnieuw in gebruik worden genomen. Leegstaande bedrijfsruimten die niet onmiddellijk worden heropgenomen in het marktaanbod leiden uiteindelijk tot verwaarlozing en verkrotting. Dergelijke panden oefenen bovendien een negatieve invloed uit op de omgeving. Daardoor dreigen de aanpalende buurten of wijken eveneens in een verkrottingsspiraal terecht te komen. Zulke bedrijfsruimten moeten dan ook beschouwd worden als probleemgebieden, zowel vanuit economisch standpunt, als vanuit het streven naar een kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving. Als men deze trend wil tegengaan, moet men / vertrekken van een ruimtelijke ordening die uitgaat van de principes van een duurzame ontwikkeling, waarbij het beheer van de ruimte centraal staat. In stedelijke gebieden betekent dit in de eerste plaats een meer efficiënte organisatie en beheer van de ingenomen ruimte. De leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten nemen in deze stedelijke gebieden immers ruimte in beslag die in principe, via inbreidingsprojecten, een nieuwe aangepaste bestemming kan krijgen. Een efficiënter beheer van de reeds ingenomen ruimte zal bovendien een verder ongecoördineerd aansnijden en versnipperen van de open ruimte helpen vermijden.</p> <p>De Vlaamse regering zit via het relancebeleid in op een inhaalbeweging op het vlak van de</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

subsiëring van openbare en private initiatieven om de sanering van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten te versnellen. Hiervoor wordt een extra budget van 15 miljoen euro voorzien via dit project.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	15.000.000 EUR
Output	Aantal toegekende saneringssubsidies leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten
Outcome	Aantal dossiers waarvan de saneringswerken werden gestart
Beoogde impact	Opheffen van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	20 subsidieaanvragen werden bij MB goedgekeurd door de minister.
Noodzakelijke politieke actie	Voortgang is afhankelijk van de goedkeuring van de aan de minister voorgelegde subsidieaanvragen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
14 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie voor de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	2021 Q3	Gerealiseerd
20 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie van de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving	2021 Q4	Gerealiseerd
Door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie voor de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	2026 Q2	Op schema

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal opgestarte saneringsprojecten	100% - Maximale benutting van het beschikbare budget.	2022 Q4	5	25 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	7.493.000 EUR
Uitvoering VEK	2.178.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 15.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 12 maart 2021 - nota

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

We blijven investeren in kwalitatieve ruimte om te ondernemen. We versnellen de transformatie van bestaande, verouderde bedrijventerreinen naar moderne en duurzame terreinen van de 21e eeuw. Bijzondere aandacht gaat naar meer ruimte voor groene en blauwe corridors, benutting van het potentieel van warmtenetten en zonne-energie, de verbetering van waterhuishouding, en aangepaste weginfrastructuur met meer ruimte voor veilig fietsen zodat ook meer werknemers met de fiets naar het werk kunnen komen.

Voor de aanwending van de relancemiddelen zoeken we naar her in te richten terreinen waar er zich knelpunten voordoen waardoor de realisatie geblokkeerd is of vertraagd wordt.

Stand van zaken op datum 31/12/2021: drie dossiers goedgekeurd door de VR voor een totaalbedrag van 4.761.529 euro.

1) Dossier Tybersite te Menen

De realisatie van het brownfieldconvenant Menen – Tybersite is afhankelijk van het omvormen van de rotonde N58xN8 tot een lichtengeregeld kruispunt. Deze omvorming van het kruispunt is conform het RUP Tybersite een voorwaarde voor de volledige realisatie van het brownfieldproject. Ook de realisatie van het regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik is afhankelijk van het omvormen van de rotonde N58xN8 tot een lichtengeregeld kruispunt, eveneens omwille van de verplichtingen uit het RUP. De actuele inschatting van de kostprijs van de werken bedraagt 4,5 miljoen euro excl. de bijkomende fietstunnels. Inclusief de fietstunnels wordt dit op 6,5 miljoen euro geraamd.

Een cofinanciering vanuit de relancemiddelen ten belope van 2 miljoen euro zorgt voor duidelijkheid over de beschikbare kredieten kunnen zorgen zodat het realisatietraject voor deze werken kan opgestart worden.

2) Dossier Wildebeek te Erembodegem/Denderleeuw

Door de besprekingen in het kader van het brownfieldconvenant is er momenteel een dialoog

PROJECTOMSCHRIJVING

tussen de gemeente Denderleeuw, de stad Aalst, AWV, MOW, VLAIO, SOLVA en de ontwikkelaar Zabra, om tot een oplossing te komen voor het kruispunt Nachtegaalstraat – N405, en bij uitbreiding het vlak bij gelegen kruispunt Industrielaan (Zuid III) met de N405. Dit is nodig om een volledige herontwikkeling van de Dekalpy site op het grondgebied Denderleeuw mogelijk te maken. Maar ook los van die ontwikkeling bleek eerder al dat verkeerstechnische aanpassingen wenselijk zijn. Belangrijkste uitdaging is de financiering, en in bijzonder de verdeling ervan tussen de verschillende partijen (Denderleeuw, Aalst, Zabra, AWV), in het bijzonder ook de 6 te verwerven eigendommen om een verkeerstechnisch goede oplossing te bekomen.

Een gedeeltelijke financiering van deze verwervingskosten vanuit de relancemiddelen ten belope van 2 miljoen euro kan een oplossing faciliteren. Vervolgens zullen ook bij AWV de nodige kredieten voor de uitvoering van de werken moeten voorzien worden.

3) Dossier Buke te Zottegem.

Herinrichting van de Leeuwrikstraat en de Smalleweg zijn noodzakelijk als ontsluitingsinfrastructuur van het bedrijventerrein. Deze ontsluitingsweg is nu erg smal en onvoldoende uitgerust als ontsluitingsweg van een bedrijventerrein. Het terrein is zo'n 25 ha groot, volledig bezet en een mengeling van diverse soorten bedrijven. Er wordt 761.529 euro voorzien vanuit de relancemiddelen om de verbeterde ontsluitingsweg mogelijk te maken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	10.000.000 EUR
Output	Realisatie van de transformatie van een aantal belangrijke en vaak complexe dossiers inzake verouderde bedrijventerreinen tot moderne, duurzame bedrijventerreinen, waarvan reeds 3 concrete dossiers voorwerp zijn van besluitvorming en andere dossiers worden voorbereid.
Outcome	Doel: Knelpunten rond ontsluitingsinfrastructuur helpen oplossen.
Beoogde impact	Investeren in duurzame infrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Drie dossiers zijn goedgekeurd door de VR van 17/12/2021. Andere dossiers in voorbereiding.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Aantal gedeblokkeerde herinrichtingen van brownfields/verouderde bedrijventerreinen		2022 Q4	Op schema	
Investeringsagenda opmaken		2021 Q2	Gerealiseerd	
VV101 "Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen" --> SVZ (02/09/2021) --> onderzoeksfase ter voorbereiding besluitvorming voor 3 dossiers ten bedrage van ca. 2 miljoen euro/dossier.		2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart projecten		2022 Q1	Nog niet gestart	
Aanbesteding werken.		2023 Q1	Nog niet gestart	
Start uitvoering werken.		2023 Q3	Nog niet gestart	
Einde werken.		2024 Q3	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal dossiers	5	2022 Q4	3	60 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing Vlaamse Regering van 17/12/2021 inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, handelaars

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Investeren in bedrijvige en bruisende kernen - projectoproepen rond aankoop en transformatie van handelspanden, flankerend beleid op vlak van mobiliteit en parkeren en data-gedreven beleidsvoeren op basis van retaildata

- Oproep 'Aankoop en/of transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten' (eerste schijf van 10 miljoen)
- 'Profploeg' en 'Vitrine' (2 miljoen euro)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	25.000.000 EUR
Output	Zorgen voor transformatie van leegstaande of onderbenutte handelspanden/bedrijfspanden tot actieve panden die bijdragen tot de versterking van het lokaal economisch weefsel, en ondersteuning van gemeenten via begeleiding en ervaringsuitwisseling.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Oproep 'Aankoop en/of transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten' --> stimuleren van het lokaal ondernemerschap. - Profploeg --> professionele ondersteuning van steden en gemeenten voor concrete aanpak van uitdagingen handelskernversterking. - Vitrine --> begeleiding van ervaringsuitwisseling tussen gemeenten en het documenteren en verspreiden van goede praktijken.
Beoogde impact	ECONOMIE EN SAMENLEVING VERDUURZAMEN

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Projectoproep subsidiëring aankoop en transformatie leegstaande bedrijfsruimten in de kern: 7 dossiers gunstig en vastgelegd, 3 in evaluatie. Profploeg gestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Lanceren oproepen	2021 Q2	Gerealiseerd		
Start dienstverlening aan lokale besturen en investeringen door lokale besturen. SVZ: Aankondiging opdracht d.d. 28/04/2021 in het Bulletin der Aanbestedingen, Selectieverslag d.d. 10/06/2021, Gemotiveerde selectiebeslissing d.d. 29/06/2021, Bestek nr. VLAIO-2021-07, Procesverbaal van de opening van de offertes d.d. 10/08/2021, Gunningsverslag d.d. 27/08/2021 aan 'Idea Consult', tijdens eerste oproep --> 34 aanvragen voor begeleiding ingediend door gemeenten.	2021 Q3	Gerealiseerd		
Bijkomende oproepen te lanceren	2022 Q1	Nog niet gestart		
Einde oproep	2022 Q4			
Einde fase dienstverlening en investeringen	2025 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal gestarte begeleidingstrajecten om gemeenten te helpen bij het vernieuwen van hun beleid rond bedrijvige kernen	85	2022 Q1	30	39 %
aantal dossiers rond leegstaande bedrijfspanden die getransformeerd	30	2022 Q4	8	27 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
gaan worden met het oog op het versterken van het lokaal ondernemerschap				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.615.000 EUR
Uitvoering VEK	435.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 25.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 12 maart 2021 - nota

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Lantis
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Lantis
Belanghebbenden	De burger, de volksgezondheid

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit initiatief wordt de PFOS-vervuiling afgeschermd die werd aangetroffen bij de aanleg van Oosterweel.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	23.000.000 EUR
Output	
Outcome	Er wordt grondverzet gerealiseerd volgens het standstillprincipe. Hierbij wordt er enerzijds gewerkt met een specifieke afdekmethodiek, anderzijds worden voor het grondwater bemalingsbeperkende invloeden gerealiseerd zodat er enkel gezuiverd grondwater geloosd wordt. De werken worden uitgevoerd conform de adviezen van de commissie Grondverzet (o.l.v. professor Vrancken).
Beoogde impact	Vertrouwen in de Vlaamse overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project is in uitvoering. Er werd een waterzuiveringsinstallatie geïnstalleerd voor de behandeling van het water. De exploitatie van de waterzuiveringsinstallatie is lopende.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>Er werd een fietsbrug gerealiseerd in functie van een vlotte en veilige doorgang voor fietsers.</p> <p>De nodige grond wordt verplaatst. Naast de grondstockage werden opritten verlegd en is er behandeling met teerhoudend asfalt granulaatcement (TAGC).</p> <p>Aangaande de veiligheidsberm rond de 3M-site zullen de aanbevelingen van de commissie Grondverzet integraal en onverminderd geïmplementeerd worden.</p> <p>De afronding van dit project is voorzien in 2024.</p> <p>De juridische rechtsgrond is te vinden in de verkoopovereenkomst uit 2004 tussen het Vlaams Gewest en de BAM aangaande de gronden van de Oosterweelverbinding. Onder artikel 9 van de verkoopovereenkomst verbindt het Vlaams Gewest zich ertoe BAM te vrijwaren alle schade aangaande enige bodemverontreiniging op de site.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR
Uitvoering VEK	20.600.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 23.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING			
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven	aan	relanceprojecten	MOW 2021

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	13 centrumsteden, 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De oproep "Veerkrachtige steden na Corona" wil de steden bijkomend financieel ondersteunen bij de uitvoering van (in hoofdzaak) investeringsprojecten in een bepaalde wijk of stadsdeel. De focus is driedig, namelijk de sociale, fysieke en economische dimensie van een bepaalde wijk of stadsdeel. De oproep mikt op projecten die vanuit een geïntegreerde aanpak inzetten op vernieuwing en innovatie binnen deze drie focusgebieden. Er is ook ruimte voor de ondersteuning van nieuwe werkingen in een opstartfase.</p> <p>Met de economische dimensie worden werkingen en investeringsprojecten beoogd die bijdragen tot de economische heropleving, het verhogen van de werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, opleidingsmogelijkheden, enzovoort.</p> <p>Met de sociale dimensie wil de oproep bijdragen aan een sociaal inclusieve stad met de steden als plaatsen waar iedereen mee aan boord blijft, met een sterk welbevinden en welzijn bij de bewoners, met een sociale mix, participatie en activering van kwetsbare groepen aan het maatschappelijke leven, het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en waar condities voor sociale mobiliteit worden geschapen.</p> <p>Het derde focusgebied gaat over de kwaliteit van de publieke ruimte en de mate waarin omgevingskenmerken zoals toegang tot groen, goede woonomstandigheden, een mix van woonegelegenheden, de aanwezigheid van cultuur en sportinfrastructuur in de buurt, wijk of het stadsdeel bijdragen aan de ontplooiing van de inwoners, de tevredenheid over de buurt, meer ontspanningsmogelijkheden, enzovoort.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	20.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Aan de hand van innovatieve en vernieuwende investeringsprojecten bijdragen aan de stadsvernieuwing van de wijk/stadsdeel/stad - Investeringsprojecten die tegemoet komen aan de tekortkomingen die werden en nog steeds worden ervaren tijdens de Coronapandemie: noden aan ontmoetings- en publieke ruimten, aan kwalitatieve en betaalbare woningen, aan groen en water in de stad, aan publieke infrastructuur (bibliotheken, jeugdhuizen, cultuurcentra, ...), aan ruimte voor jonge ondernemers en starters, ... -
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - De investeringen hebben bijgedragen aan de sociale inclusiviteit van de stad in kwestie waar iedereen mee aan boord blijft, de bewoners zich goed voelen, met een sociale mix, participatie en activering van kwetsbare groepen aan het maatschappelijke leven, het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en waar condities voor sociale mobiliteit worden geschapen. - De investeringen dragen bij tot een verhoogde werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, opleidingsmogelijkheden, ondersteuning van starters, ... - De investeringen zorgen voor betere ontmoetingsruimten binnen het stadsdeel, sport- en culturele infrastructuur, betere woonomstandigheden, ontspanningsmogelijkheden, .. -
Beoogde impact	Investeren in duurzame infrastructuur - ECONOMIE EN SAMENLEVING VERDUURZAMEN - INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR - ANDERE

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De oproep Veerkrachtige steden na corona is afgelopen. 25 aanvraagdossiers werden ingediend. Deze aanvragen werden beoordeeld door een jury. Er werden 9 projecten weerhouden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	2021 Q1	Gerealiseerd
Lancering van de oproep	2021 Q2	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Jurering van de ingediende aanvragen naar stadsvernieuwingsprojecten		2021 Q3	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de geselecteerde stadsvernieuwingsprojecten goed		2021 Q4	Gerealiseerd	
Eindrapport van de gerealiseerde stadsvernieuwingsprojecten binnen deze oproep (deadline: 2026)		2026 Q3	Nog niet gestart	
Jaarlijkse voortgangsrapporten van de stadsvernieuwingsprojecten			Nog niet gestart	
Permanente evaluatie door stuurgroepen			Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal subsidieaanvragen	20	2021 Q3	25	100 %
start van de projecten		2022 Q1		
jaarlijkse rapportering		2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	20.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 5 maart 2021 - nota Goedkeuring VR op 17/12/2021 van projectsubsidies in het kader van de oproep 'Veerkrachtige steden na Corona'

VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	VLM, lokale besturen, middenveldorganisaties

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project zet in op de ecologische ontsnippering van bestaande gewestelijke transportinfrastructuur en draagt zo bij aan het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen. Daarvoor werkten de betrokken entiteiten binnen de VO een Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) uit. Het beoogt een structureel georganiseerde, programmatische aanpak van de versnipperingproblematiek zowel binnen de Vlaamse overheid als in samenwerking met diverse externe partners.

Het eerste deel van het VAPEO is gericht op de verwezenlijking van terreinrealisaties (ecoducten, ecotunnels,...) om de voornaamste versnipperingsknelpunten aan gewest- en snelwegen weg te werken. Hiervoor is een eerste vijfjarenprogramma opgemaakt met 15 concrete projecten die tijdens die periode worden uitgevoerd of verder uitgewerkt. Daarnaast kunnen acute knelpunten opduiken die een snelle uitvoering vragen aangezien het een rollend programma betreft. Ondersteunende instrumenten en een gerichte communicatie maken eveneens deel uit van het VAPEO. De afspraken voor de uitvoering van dit project zijn opgenomen in een protocol dat op 23 september 2020 werd ondertekend door de bevoegde Vlaamse ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters. De financiële verdeelsleutel is als volgt bepaald : ½ AWV, ¼ ANB, ¼ DOMG.

Concreet zullen volgende 6 projecten met Relance-middelen uitgevoerd worden:

- E40 (Bertem): ombouw bestaande brug tot bermbrug;
- N75 (Dilsen-Stokkem) : aanleg nieuwe ecobrug (met medegebruik);
- N71 (Lommel): ontwerp ecoduct en mogelijke uitvoering;
- N76 (Oudsbergen / Genk): ontwerp en aanleg ecobrug met medegebruik;
- E17 (Waasmunster): ombouw bestaande brug tot bermbrug;
- R0 (Hallerbos): ontwerp en aanleg ecobrug met medegebruik.

Verder wordt er binnen Relance gewerkt aan 3 ondersteunende acties:

PROJECTOMSCHRIJVING

- Communicatie;
- Uitwerken ondersteunende instrumenten;
- Acute knelpunten aanpakken.

De andere VAPEO-projecten en ondersteunde acties worden met reguliere middelen aanbesteed tussen 2021-2024.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	25.000.000 EUR
Output	Realisatie van 6 ontsnipperingsprojecten.
Outcome	Verbetering van de ecologische ontsnippering.
Beoogde impact	Aantal opgeloste versnipperingsknelpunten aan gewestwegen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het project 'Ontsnippen van Vlaams landschap' werd goedgekeurd op de VR van 16 juli 2021.</p> <p>Voor de VAPEO-projecten die gefinancierd worden met Relance-middelen zijn de trekkers bij de verschillende entiteiten momenteel bezig met het nodige overleg, opmaak en ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten, en opmaak van ramingen en bestekken. Daarnaast wordt er gewerkt aan de uitwerking van acute knelpunten (bv. wilddetectiesysteem N76), opmaak van een communicatieplan en uitwerking van ondersteunende instrumenten (bv. Dieren Onder de Wielen 4).</p>
Noodzakelijke politieke actie	Geen bijkomende politieke actie vereist.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Communicatie - aanbesteding opdracht	2021 Q4	Op schema
E17 (Waasmunster): ontwerp en aanbesteding ombouw bestaande brug tot bermbrug	2021 Q4	Op schema
E40 (Bertem): ontwerp en aanbesteding ombouw bestaande brug tot bermbrug	2021 Q4	Op schema

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Acute knelpunten aanpakken - aanbesteding		2022 Q4	Op schema	
N76 (Oudsbergen / Genk): ontwerp en aanbesteding ecobrug met medegebruik		2022 Q4	Op schema	
N71 (Lommel): ontwerp en mogelijke aanbesteding ecoduct		2022 Q4	Op schema	
R0 (Hallerbos): ontwerp en aanbesteding ecobrug met medegebruik		2022 Q4	Op schema	
N75 (Dilsen-Stokkem): ontwerp en aanbesteding ecobrug (met medegebruik)		2022 Q4	Op schema	
Uitwerking ondersteunende instrumenten - aanbesteding		2022 Q4	Op schema	
N75 (Dilsen-Stokkem): oplevering ecobrug (met medegebruik)		2026 Q4	Nog niet gestart	
R0 (Hallerbos): oplevering ecobrug met medegebruik		2026 Q4	Nog niet gestart	
N71 (Lommel): oplevering ecoduct		2026 Q4	Nog niet gestart	
E40 (Bertem): oplevering bermbrug		2026 Q4	Nog niet gestart	
Acute knelpunten - oplevering		2026 Q4	Nog niet gestart	
E17 (Waasmunster): oplevering bermbrug		2026 Q4	Nog niet gestart	
N76 (Oudsbergen / Genk): oplevering ecobrug met medegebruik		2026 Q4	Nog niet gestart	
Uitwerking ondersteunende instrumenten - oplevering		2026 Q4	Nog niet gestart	
Communicatie - oplevering opdracht		2026 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde ontsnipperingsprojecten	6	2026 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 24.700.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontsnippen Vlaams landschap Vlaams actieprogramma ecologische ontsnippering. Deel 1 - wegen. Bijlage Protocol in verband met de uitvoering van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) Deel 1 - wegen. Bijlage Budget. Bijlage

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)

VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Lijn
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	De Lijn
Belanghebbenden	Inwoners, weggebruikers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
De doelstelling van dit project is een gefaseerde overgang naar een groene en duurzame busvloot van vervoersmaatschappij De Lijn. Naast een bijdrage aan de vergroening van het transport en de modal shift wil men via dit initiatief het economisch herstel te ondersteunen door te investeren in duurzame en openbare mobiliteit.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	93.000.000 EUR
Output	De concrete outputs betreffen het realiseren van een verdere elektrificatie van de busvloot. In functie hiervan worden hybride bussen omgebouwd naar e-hybride bussen en worden e-hybride bussen aangekocht. In functie van het onderhoud van deze bussen worden de stelplaatsen aangepast en wordt voorzien in een raamcontract voor het onderhoud van deze bussen.
Outcome	Verbetering luchtkwaliteit.
Beoogde impact	Aandeel hernieuwbare energie in totaal energiegebruik - Emissie van broeikasgassen door transport per modus (in kton CO ₂ -equivalent)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> - De bestelling voor de ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen werd geplaatst en de aanpassingen zijn opgestart. De aanpassingen zullen gefaseerd uitgevoerd worden in de periode Q1 tot Q4 2022.. - Er werden 44 gelede e-hybride bussen besteld. De e-hybride gelede bussen zullen gefaseerd instromen in de periode Q2-Q4 2022. - De bestelling werd geplaatst voor de uitvoering van de studies voor de aanpassingen voor de eerste drie stelplaatsen voor elektrische bussen. Voor de uitvoering van de studies voor aanpassingen voor de stelplaatsen is het contract gesloten. De uitvoering van de studies van de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen) is lopende. - De adviesopdrachten en ondersteuning voor de programmawerking werden besteld. De studie over de brandveiligheid is lopende. - De eerste bestelling voor de laadinfrastructuur voor de 60 e-bussen en e-hybride bussen werd geplaatst bij twee leveranciers. Beide leveranciers zullen elk de helft van de bestelling installeren en in bedrijf stellen. Deze laadinfrastructuur zal ervoor zorgen dat de eerste e-bussen en e-hybrides op hun stelplaatsen geladen kunnen worden. De volgende bestellingen voor laadinfrastructuur in het gegunde raamcontract zullen in 2022 toegewezen worden via een mini-competitie. - Een eerste bestelling voor 60 e-bussen werd geplaatst bij twee leveranciers. Het raamcontract laat een afname toe tot in totaal 350 e-bussen . Uit de 11 kandidaten werden Van Hool en VDL als best geplaatste inschrijvers uit de openbare aanbestedingsprocedure. Ze beantwoordden het best aan de gunningscriteria en boden de beste prijs-kwaliteitsverhouding aan inzake total cost of ownership (TCO), autonomie tussen laadbeurten, technische kwaliteit en look & feel. Als best gerangschikte inschrijver mag Van Hool 60% van de 60 e-bussen of 36 stuks leveren, VDL als tweede gerangschikte levert 40% of 24 stuks. De bussen zullen, afhankelijk van de productie, vanaf Q4 2022 gefaseerd geleverd worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Plaatsen van een bestelling voor de ombouw van bestaande hybride naar plug-in e-hybride bussen.	2021 Q2	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Het plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van adviesopdrachten voor de uitrol van elektrische bussystemen en ondersteuning programmawerking.		2021 Q2	Gerealiseerd	
Plaatsen van een bestelling voor plug-in hybride gelede bussen binnen het bestaande contract		2021 Q2	Gerealiseerd	
Plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van de studies voor de aanpassingen voor de stelplaatsen voor elektrische bussen.		2021 Q2	Gerealiseerd	
Bestelling voor e-bussen (volelektrische bussen).		2021 Q3	Gerealiseerd	
Het plaatsen van een bestelling voor de installatie voor de laadinfrastructuur op de stelplaatsen voor de e-bussen (volelektrische bussen) en de plug-in hybride bussen.		2021 Q3	Gerealiseerd	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
<p>Formele bestelling van groene bussen en daarmee samenhangende oplaadinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestelling geplaatst voor de ombouw van hybride bussen in e-hybride bussen via een wijziging van de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor hybride plug-inbussen binnen de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor vol-elektrische bussen - Bestelling geplaatst voor de installatie van oplaadinfrastructuur in de depots van de (vol-)elektrische bussen en de hybride plug-inbussen 	4	2024 Q4	4	100 %
<p>Levering van de nieuwe of aangepaste bussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe en omgebouwde e-hybride plug-inbussen zijn geleverd en in dienst gesteld (de bussen zijn aangepast om diensten te verlenen in de gebieden waaraan zij toegewezen zijn) - Vol-elektrische bussen zijn geleverd 	311	2025 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
en in dienst gesteld (de bussen zijn aangepast om diensten te verlenen in de gebieden waaraan zij toegewezen zijn) - De oplaadinfrastructuur is in werking gesteld in de busdepots van de toegewezen gebieden.				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	93.000.000 EUR
Uitvoering VAK	69.144.000 EUR
Uitvoering VEK	1.474.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 93.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

18. Brexit

VV107 - INITIATIEVEN VANUIT VLAM VOOR DE PROMOTIE EN AFZET VAN PRODUCTEN, O. A. ALS GEVOLG VAN BREXIT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>VLAM werkt in 2021 en 2022 een relancebeleid uit voor de zwaar getroffen sectoren van de agrovoeding en sierteelt. Volgende maatregelen worden voorgesteld.</p>	
<p>1. Bedrijfssubsidies</p> <p>VLAM lanceert een open oproep naar Vlaamse bedrijven actief in de agrovoeding en sierteelt om een innovatief project in te dienen om de export richting het VK en wereldwijd te ondersteunen. Ook wordt er een mini-incubator gelanceerd op maat van kleinere en startende exporteurs van Vlaamse agrovoeding en sierteelt.</p>	
<p>2. Communicatie</p> <p>Er worden imagocampagnes opgezet om de Vlaamse agrovoeding en sierteeltsector te promoten in het VK en onze marktpositie daarbuiten te versterken.</p>	
<p>3. Personeel</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	3.000.000 EUR
Output	- Bedrijfssubsidie: minimum 2 incubators Brexit, minimum 2 mini-incubators - Communicatie: 4 imagocampagnes - Personeel: 3 FTE's, waarvan 1 consulent Brexit

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Bedrijfssubsidies: innovatieve bedrijven rechtstreeks subsidiëren om de export richting VK en wereldwijd te ondersteunen. - Communicatie: imagocampagnes om de Vlaamse agrovoeding en sierteeltsector te promoten in het VK en onze marktpositie daarbuiten te versterken.
Beoogde impact	Evolutie buitenlandse handel

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	a) bedrijfssubsidies: in kader van de oproep incubator 2021 zijn 30 initiatieven goedgekeurd. In het kader van de oproep mini-incubator 2021 zijn 7 dossiers goedgekeurd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Bedrijfssubsidies: oproep incubator 2021	2021 Q1	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering incubator 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: oproep incubator 2022	2022 Q1	Nog niet gestart	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering incubator 2022	2022 Q2	Nog niet gestart	
Bedrijfssubsidies oproep mini-incubator 2021	2021 Q3	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering mini-incubator 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
bedrijfssubsidies: oproep mini-incubator 2022	2023 Q3	Nog niet gestart	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering mini-incubator 2022	2022 Q4	Nog niet gestart	
communicatie: imagocampagne VK (mediaplan B2B)	2021 Q2	Gerealiseerd	
communicatie: imagocampagne VK (prinselijke missie)	2022 Q4	Op schema	
communicatie: campagne marktpositie versterken (twee prospecties)	2022 Q4	Op schema	
tewerkstelling personeel	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aanwerving personeel in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren	3	2021 Q4	3	100 %
Bedrijfssubsidies in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: oproep incubator	2	2022 Q1	1	
bedrijfssubsidies in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: oproep mini-incubator	2	2022 Q4		
Communicatie in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: imagocampagne	4	2022 Q4	1	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.500.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 3.000.000 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING			
VR	26	februari	2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN	

VV108 - SUBSIDIES AAN BEDRIJVEN (FINANCIËLE STEUN VOOR BEDRIJVEN, KOSTENVERLAGING VOOR DEELNAME AAN BEURZEN, ONDERSTEUNING VOOR BREXIT) + INZET VAN CONSULTANTS OM VLAANDEREN IN HET BUITENLAND TE PROMOTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	De belanghebbenden van deze maatregelen zijn de in Vlaanderen actieve bedrijven of buitenlandse bedrijven met plannen voor een investering in Vlaanderen/Europa

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
Ondersteuning van bedrijven die getroffen werden door de gevolgen van Brexit in hun exportgeoriënteerde activiteiten en het versterken van onze inspanningen om investeringen aan te trekken naar Vlaanderen in het kader van de ontwikkelingen met betrekking tot Brexit	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	30.000.000 EUR
Output	De maatregelen uit deze actie hebben in het kader van de relance tot doel: 1. exporterende bedrijven die geïmpacteerd zijn door Brexit te helpen bij ofwel het behouden/heroveren/uitbreiden van hun marktaandeel in het VK ofwel de impact van Brexit op hun handelsactiviteiten te compenseren door actief nieuwe markten en exportbestemmingen te gaan opzoeken buiten het VK. Subsidies, extra steun en bijzondere acties moeten hen helpen om meer te doen dan gebruikelijk en dit sneller en intensiever uit te voeren dan in reguliere omstandigheden. 2. in een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.
Outcome	Behoud en groei van de exportcapaciteit van Vlaanderen Behoud en groei van het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Beoogde impact	Evolutie buitenlandse handel - Evolutie buitenlandse investeringen
----------------	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>In het kader van de budgettaire verdeling van de middelen met betrekking tot het Vlaams relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' besliste de Vlaamse regering om de financiering van het plan met betrekking tot het internationaal ondernemen ten behoeve van de door Brexit geïmpacteerde bedrijven te halen uit de Brexit Adjustment Reserve.</p> <p>Deze Brexit Adjustment Reserve werd na verschillende overleggronden binnen de EU pas eind september 2021 door de Raad definitief goedgekeurd. De referentieperiode voor de Brexitreserve loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2023.</p> <p>Ondertussen werden de modaliteiten voor de subsidiabiliteit scherper gesteld, meer specifiek met betrekking tot de noodzaak van een 'directe link' van de maatregelen met Brexit.</p> <p>Het document 'Brexit Adjustment Reserve – 'Direct link' -generic examples' omschreef de zienswijze van de Commissie met betrekking tot dit item. Het is duidelijk dat de visie ontwikkelt in de nota van 18 december 2020 in lijn met het Vlaams relanceplan een ruimer kader en actieradius voorzag dan wat de Commissie in haar document als aanvaardbare financiering definieert.</p> <p>De nota aan de Vlaamse Regering van 18 december 2020 : Maatregelen met betrekking tot het internationaal ondernemen ten behoeve van de door de Brexit geïmpacteerde bedrijven in het kader van het Relanceplan: Vlaamse Veerkracht, die de basis vormt van dit actiepun VV108, dient dan ook aangepast om te voldoen aan de voorwaarden die de Commissie de lidstaten oplegt in het kader van de BAR.</p> <p>Een nieuwe nota aan de Vlaamse regering (Maatregelen met betrekking tot het internationaal ondernemen ten behoeve van de door de Brexit geïmpacteerde bedrijven gefinancierd uit de Brexit Adjustment Reserve) nadert de finale fase waardoor half januari 2022 dit aangepaste plan op de Vlaamse regering kan komen voor goedkeuring. Het is de bedoeling dat dit aangepaste plan dan ook de nieuwe basis zal vormen voor deze VV108.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Goedkeuring van het aangepaste plan op de Vlaamse regering (gepland voor half januari 2022)

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven mbt brexit	2022 Q4	Op schema		
Subsidies: aanwenden van de bijzondere exportsteun en het starterspakket internationalisering	2022 Q4	Op schema		
Lead generation	2022 Q4	Op schema		
Versterken van de acties tot internationale diversificatie door het toevoegen van een culturele omkadering	2022 Q4	Op schema		
Kostenverlaging voor deelname aan acties van Flanders Investment & Trade	2022 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
<p>De maatregelen uit deze actie hebben in het kader van de relance tot doel:</p> <p>1. exporterende bedrijven die geïmpacteerd zijn door Brexit te helpen bij ofwel het behouden/heroveren/uitbreiden van hun marktaandeel in het VK ofwel de impact van Brexit op hun handelsactiviteiten te compenseren door actief nieuwe markten en exportbestemmingen te gaan opzoeken buiten het VK.</p> <p>Subsidies, extra steun en bijzondere acties moeten hen helpen om meer te doen dan gebruikelijk en dit sneller en intensiever uit te voeren dan in reguliere omstandigheden.</p> <p>2. in een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.</p>		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.138.000 EUR
Uitvoering VEK	1.936.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 30.000.000 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2020: VR 2020 1812 DOC.1581/1BIS

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV109 - VLAIO BREXIT ACTIEPLAN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering voorziet 83 miljoen euro extra relancemiddelen voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de Brexit. Daarvan is 30 miljoen euro voorzien voor FIT, 50 miljoen euro voor VLAIO, en 3 miljoen euro voor VLAM.

Volgende gerichte steunmaatregelen voor de betrokken doelgroepen worden binnen het voor VLAIO vooropgestelde budget van 50 miljoen euro gerealiseerd.

1. Post-Brexit Veerkrachsubsidie. Extra relancebudget voor 2021 en 2022 telkens 14,3 miljoen euro.

Deze oproep is gericht op bedrijven die omwille van Brexit hun strategische businessplannen duurzaam moeten omvormen en vervolgens die transformatie implementeren. De doelgroep voor deze oproep zijn dus: Kmo's die getroffen zijn door de gevolgen van de Brexit, hetzij direct in hun export- en importactiviteiten, hetzij indirect omwille van problemen bij outsourcing, insourcing, disruptie in hun waardeketen,

2. Gerichte Transformatie Opleidingen. Extra relancebudget 5 miljoen euro.

SYNTRA gaat opleidingen organiseren die ondernemers in staat stelt om de uitdagingen van BREXIT te counteren.

3. Versterking Brexit Helpdesk

De Helpdesk geeft antwoorden op vragen die ondernemingen hebben aangaande Brexit. Voornamelijk betreffen deze vragen export-gerelateerde thema's.

4. Vlaams Green Lane project. Extra relancebudget 2 miljoen euro

Teneinde wachttijden voor Vlaamse exporteurs in Calais te vermijden wordt er gedacht aan een fysieke en digitale voorpost in Vlaanderen om hier de douane formaliteiten af te werken.

PROJECTOMSCHRIJVING

5. Ontwrichte Zone

Er wordt onderzocht of er bijkomende ontwrichte zones in Vlaanderen haalbaar zijn. In een ontwrichte zone is er een tijdelijke vermindering van de loonkost voor bijkomende duurzame tewerkstelling.

6. Uitbreiding VLAIO Contract Ondernemerschap en DYZO

Voor 2021 en 2022 extra relancebudget van telkens 2.350.000 euro. Voor DYZO 150.000 euro voor 2021 en 2022. VLAIO gaat met de geschikte partners in het contract Ondernemerschap in gesprek om voorstellen – die zich situeren op het niveau van informatieverschaffing, individuele begeleiding, collectieve begeleiding, lerende netwerken op het vlak van bedrijfsvoering voor Brexit-gerelateerde import/exportthema's af te wachten.

Met de middelen voorzien in het Brexit-actieplan van de Vlaamse Regering voor de versterking van de dienstverlening ondernemerschap, zullen - na hierover het advies van de Inspectie van Financiën ingewonnen te hebben - aanvullende diensten besteld worden bij verschillende partners uit het contract. Met name bij:

- Netwerk Ondernemen;
- Unizo;
- Voka;
- het Industrieconsortium, en met name bij de partners Fevia, Fedustria en Agoria

DYZO vzw - dat ondernemingen in moeilijkheden helpt - krijgt extra middelen voor de aanwerving van twee personeesleden.

7. Versterken van het aantrekken of behoud van investeringen, extra relancebudget 10 miljoen euro

Om nieuwe investeerders te ondersteunen wordt het bestaande budget van Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun versterkt met 10 miljoen euro. De focus ligt op Brexit gerelateerde investeringen.

Er worden ook 8 extra personeesleden voorzien voor een periode van één jaar ter versterking van de Helpdesk en het team Veerkrachtsubsidie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	50.000.000 EUR
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Post-Brexit Veerkracht subsidie : er lopen enkele tientallen dossiers. 2. Gerichte Transformatie Opleiding : de eerste opleidingen starten medio september 3. Versterking Brexit helpdesk. Er zijn drie personeesleden aangeworven. Er werden 478 vragen beantwoord. 4. Vlaams Green Lane Project. Een eerste fase van het studieproject door VIL/Deloitte is goedgekeurd. 5. Ontwrichte zone. Er wordt permanent gemonitord of er een bijkomende zone mogelijk is.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	6. Uitbreiding VLAIO Contract Ondernemerschap en VIZO. 7. Versterken van het aantrekken of behoud van investeringen. Er zijn nog geen dossiers goedgekeurd.
Outcome	Momenteel beperkt de output zich tot het verstrekken van antwoorden op Brexit gerelateerde vragen van ondernemers, en het geven van veerkracht subsidies. De andere instrumenten (opleidingen, extra subsidies, Green Lane, uitbreiding Contract Ondernemerschap, Ontwrichte Zone) zijn nog in opbouw, of worden nog niet gebruikt.
Beoogde impact	Evolutie buitenlandse investeringen - Vertrouwen in de Vlaamse overheid - Efficiëntie Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>1. Post-Brexit Veerkrachtsubsidie</p> <p>Voor deze gerichte subsidiemaatregel hebben we intussen 37 aanvragen binnen, waarvan 18 positief, 10 onontvankelijk en 3 teruggetrokken, 6 dossiers moeten nog beslist worden.</p> <p>Er werd een budget van € 555.221,00 vastgelegd, bij Inspectie Financiën bevindt zich nog een goed te keuren bedrag van € 89.904,00. De nog te behandelen dossiers betreffen een bedrag van € 186.354,00 .</p> <p>2. Gerichte Transformatie Opleiding</p> <p>Momenteel zijn er twee Brexitopleidingen lopende:</p> <p>1) Junior customs consultant met 18 cursisten verdeeld over twee SYNTRA;</p> <p>2) 'Brexit-proof maken van kmo's – douanetechnische vraagstukken na Brexit' met 4 cursisten.</p> <p>Er staan twee opleidingen op de planning:</p> <p>1) herhaling van 'Brexit-proof maken van kmo's – douanetechnische vraagstukken na Brexit' in het voorjaar;</p> <p>2) opstart customs consultant in januari.</p> <p>3. Helpdesk Brexit</p> <p>Tussen 1 december 2020 en 19 november 2021 werden 658 vragen beantwoord, In het tweede deel van het 'Brexit-impact en begeleiding' rapport zijn 46 interviews afgenomen.</p> <p>Thema Aantal</p> <p>Algemeen 71</p> <p>Douaneformaliteiten 177</p> <p>Import 38</p> <p>Btw 37</p> <p>Etikettering 4</p> <p>Contracten 7</p> <p>Vrije verkeer personen 16</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Britse invoerformaliteiten 68
 Standaarden (CE/UKCA) 30
 Paletten 3
 Exportvergunningen 36
 Incoterms 0
 Noord-Ierland 12
 Oorsprongsregels 48
 REACH 1
 Vrijhandelsakkoord 3
 Optreden als invoerder 0
 Brexit veerkrachtsubsidie 58
 Ierland 4
 Invoerrechten 13
 Accijnzen 3
 Diensten 29
 Totaal Vragen 658

4. Flanders Green Lane

De Vlaamse Regering keurde het project VIL (Gateway2Brittain) goed. Deloitte zal het vervolgstuk uitvoeren. De voorstudie voor de uitrol van de Green Lane is gestart.

5. Vlaanderen Ontwrichte zone

Het onderzoek loopt.

6. Contract Ondernemersschap

Er werden 20 projecten, ingediend door VOKA, UNIZO, TM Sirris Agoria en Netwerk Ondernemingen aanvaard. Hiervan zijn er inmiddels vier (van VOKA en UNIZO) gefinaliseerd. Bij VOKA betreft het infosessies en kortlopende intensieve begeleidingstrajecten, bij UNIZO om starterssessies en individuele post-Brexit begeleiding.

7. Extra middelen Brexit-gerelateerde investeringen

Er werd één project goedgekeurd.

Noodzakelijke
politieke actie

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Green Lane. Eerste deel studie aangevat	2021 Q2	Op schema
Versterken/aantrekken/behoud investeringen door extra middelen aan te bieden. Eerste dossier goedgekeurd	2021 Q2	Op schema
Brexit Helpdesk - aanwerving extra personeel - is gebeurd	2021 Q2	Op schema
Uitbreiding Contract Ondernemersschap & DYZO,	2021 Q2	Op schema
Gerichte Transformatie Opleidingen	2021 Q2	Op schema
Versterking Brexit Helpdesk	2021 Q3	Op schema
Opleidingen Syntra. Eerste opleidingen aangevat	2021 Q3	Op schema
VLAIO Contract Ondernemersschap. Eerste contracten getekend	2021 Q3	Op schema
Post-Brexit Veerkrachtsubsidie.	2021 Q4	Op schema
Brexit Veerkrachtsubsidie	2022 Q2	Gerealiseerd
Ontwrichte Zones in Vlaanderen	2022 Q4	Op schema
Flanders Green Lane	2022 Q4	Op schema
Versterken (directe en indirecte) STS en STRES Aantrekken of behoud van investeringen	2022 Q4	Op schema
West-Vlaanderen Ontwrichte Zone	2022 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.805.000 EUR
Uitvoering VEK	939.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 50.000.000 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 december 2020](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur

VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Belanghebbenden	Lokale besturen, brede MICE-sector, toeristische logies

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Door de COVID-crisis zijn bestaande trends op vlak van MICE-toerisme in een stroomversnelling terechtgekomen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan hybride events, het belang van belevingstoerisme, ... Om de concurrentiepositie van Vlaanderen als MICE-bestemming te vrijwaren, wil dit project focussen op capaciteits- en kwaliteitsverhoging van bestaande MICE-infrastructuren en nieuwbouw waar nodig. Waar mogelijk wordt ook een culturele nevenbestemming nagestreefd. De deelprojecten zullen als publiek-private samenwerking worden uitgevoerd.</p> <p>4 x 5 MEUR beschikbaarheidsvergoedingen</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	20.000.000 EUR
Output	<p>Met de realisatie van de deelprojecten binnen dit project, wensen we de kwaliteit van de infrastructuren te verhogen. Hierbij wordt specifiek ingespeeld op het gegeven dat meetings en congressen in de toekomst vaak een 'digitale' component zullen hebben. Deze hybride events waar een deel van de bezoekers fysiek aanwezig zullen zijn en een deel via digitale manier aanwezig kunnen zijn, vergen de nodige kwaliteitsvolle infrastructuur.</p> <p>Naast het element van de hybride events, willen we ook de beleving die de bezoeker krijgt te versterken.</p>
Outcome	Het aantrekken van extra bezoekers naar Vlaanderen en (associatie)congressen zorgt voor economische meerwaarde voor Vlaanderen en zorgt op deze manier ook voor extra tewerkstelling.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Economische impact toerisme

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De onderhandelingen met de begunstigden lopen verder. Begin 2022 zullen eerste dossiers geagendeerd worden op de Vlaamse regering.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opzetten projectgroepen voor de verschillende infrastructuurprojecten	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing Vlaamse regering	2022 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Toerisme Vlaanderen - Agentschap Onroerend Erfgoed - Departement Cultuur, Jeugd en Media - Agentschap Natuur en Bos
Belanghebbenden	Provinciale en lokale besturen, publieke en private toeristische actoren, erfgoedgemeenschappen, binnen- en buitenlandse bezoekers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project beoogt gerichte investeringen te doen in toeristische infrastructuur. Hierbij wordt enerzijds gemikt op investeringen die op korte termijn leiden tot economisch herstel van onze sector, kwaliteitsverbetering van ons aanbod, aantrekken van binnen- maar vooral ook buitenlandse. Anderzijds wordt ook gekeken naar inspanningen gericht op de langere termijn (bv aanpassen wetgevend kader, oproepen voor meerjarige investeringen in duurzaamheid, opbouw van netwerken van sites maar ook van verhalen en van partners).

Deze middelen worden ingezet op infrastructuurprojecten die het potentieel hebben om op beide vlakken een hefboomeffect te realiseren. Daarbij dient vermeld te worden dat elke euro (overheids)investering in toerisme een multiplicatoreffect heeft voor andere delen van de economie (bvb de bouw, de retail, IT, diensten, de maakindustrie, de landbouw, de creatieve industrie etc). Er bestaat geen onderzoek over de totale impact maar deelstudies over economische return (omzetgroei, jobcreatie etc) geven grofweg een multiplier van vier (cfr studies return Herdenking WO1 en tussentijdse resultaten Vlaamse Meesters). Dus elke euro geïnvesteerd in toerisme worden er vier in onze ruimere Vlaamse economie. Investeren in het zakentoeisme heeft een aanzienlijk hogere return in spenderingen (x 2,5) dan in vrijetijdstoerisme, maar de tendens is dat de grens tussen beiden vager wordt (impact op spenderingen nog niet gekend). Effecten van investeringen in toerisme zijn bovendien niet enkel economisch, maar ook breed maatschappelijk, cultureel, sociaal,...

Inhoudelijk wordt hierbij in de eerste plaats gekeken naar projecten die aansluiten bij de thematische krachtlijnen uit de beleidsnota toerisme. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden om deze thema's versneld en versterkt uit te rollen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	50.000.000 EUR
-------	----------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	Zowel via gerichte investeringen als de oproepen wensen we een kwaliteitsopwaardering te doen van de toeristische infrastructuur. De kwaliteit zal gemeten worden door de tevredenheid van de bezoeker te bevragen over de beleving na realisatie.
Outcome	Kwalitatieve belevingen in toeristische infrastructuur zorgt voor het aantrekken van buitenlandse bezoekers en voor een meerwaarde voor de bewoners. Ook de toeristische ondernemers zullen een meerwaarde ondervinden. In lijn met de visie van Toerisme Vlaanderen zal er gestreefd worden naar een evenwicht tussen de meerwaarde voor de bezoeker, bewoner, ondernemer en de plek zelf.
Beoogde impact	Economische impact toerisme - ANDERE

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>Het project is in opstartfase. De hefboomprojecten die met de relancemiddelen worden ondersteund, worden momenteel nog verder uitgewerkt naar doelstellingen en inhoud toe.</p> <p>Eind 2021 werd reeds een eerste deeldossier ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd.</p> <p>Er worden in 2022 enkele subsidieoproepen gelanceerd om projecten te selecteren. De begunstigden moeten gekend zijn tegen eind 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	In Q1 2022 zullen de subsidieoproepen geagendeerd worden op de Vlaamse regering.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	2021 Q2	Gerealiseerd
Beslissing Vlaamse regering (diverse beslissingen voor directe investeringen en de subsidieoproepen)	2022 Q3	Op schema
Beslissing begunstigden subsidieoproepen	2022 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 50.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs

VV112 - VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Belanghebbenden	Instellingen hoger onderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het Voorsprongfonds zal ons hoger onderwijs sterker, flexibeler en digitaal maken. In de toekomst zal het digitale immers nog veel meer dan vandaag een rol spelen in onze samenleving. De coronacrisis heeft ons een gouden kans gegeven daarop in te zetten. Bovendien zijn we ons tegelijk ook bewust geworden van het onmisbare belang van het tastbare en het fysieke in ons leven. Het komt er nu op aan daar ons voordeel mee te doen.</p> <p>We vertrekken vanuit de kansen die zich postcorona voordoen en pakken tegelijkertijd de structurele uitdagingen aan. We mikken op vernieuwingen die het hoger onderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte/maatschappelijke focus, een focus op levenslang leren en een 21ste eeuwse, digitaal karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en verduurzaming staan voorop. Om deze ambitie waar te maken richten we ons op 3 inhoudelijke speerpunten :</p> <ol style="list-style-type: none">1. De uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio dat toekomstbestendig en wendbaar is Binnen dit speerpunt zullen we inzetten op de implementatie van trajecten die leiden naar een toekomstbestendig en wendbaar opleidingsportfolio in alle hogeronderwijsinstellingen, de heroriëntering van curricula en een breed proces naar een nieuwe profilering van hoger onderwijs in Vlaanderen.2. Veel meer mogelijkheden aanreiken om levenslang te leren binnen het hoger onderwijs Binnen dit speerpunt kunnen hogeronderwijsinstellingen concrete initiatieven vormgeven die zich richten op het (her)ontwerpen van hun opleidingsaanbod om het toegankelijk en wendbaar te maken met het oog op levenslang leren. Daarnaast zal er werk gemaakt worden van Vlaamse visie rond levenslang leren in hoger onderwijs.3. Volop inzetten op digitale onderwijsvormen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het Voorsprongfonds wil onderwijsinstellingen ondersteunen bij het kwaliteitsvol verduurzamen van nieuwe werkvormen binnen het hoger onderwijs waarbij een ideale mix van fysiek onderwijs op de campus en digitaal onderwijs op afstand wordt nagestreefd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	60.000.000 EUR
Output	7 instellingen voor hoger onderwijs hebben gebruik gemaakt van het Voorsprongfonds Hoger Onderwijs (RFF mijlpaal)
Outcome	Visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs (RFF mijlpaal) Met het Voorsprongfonds wil de Vlaamse Regering instellingen aanzetten om zich anders te organiseren, zodat hun aanbod toekomst gericht en wendbaar is, en klaar voor de uitdagingen die zich de komende jaren nog zullen stellen. Zo wil de Vlaamse Regering, samen met de instellingen voor hoger onderwijs zorgen voor kwaliteitsvol, rationeel aanbod, dat toekomstbestendig, wendbaar, duurzaam en digitaal is.
Beoogde impact	Opleidingsdeelname van de bevolking (25-64 jaar)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Op 9 juli 2021 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de “Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, tot het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds”. Deze oproep werd overgemaakt aan de betrokken instellingen. Zij hadden de tijd tot 8 september 2021 om een plan in te dienen.</p> <p>In de periode tussen 9 juli en 8 september 2021 heeft de minister, bevoegd voor onderwijs, een jury samengesteld. Alle hogeronderwijsinstellingen dienden een plan en projecten in voor het Voorsprongfonds, waarbij de deadline van 8 september door alle instellingen gerespecteerd werd.</p> <p>Op 7 oktober 2021 heeft de jury haar advies overgemaakt aan de minister, bevoegd voor onderwijs. De jury adviseert om 146 projecten goed te keuren, waarvan voor 1 project de goedkeuring afhankelijk is van de goedkeuring van andere projecten. Voor 138 projecten adviseert de jury om een negatief oordeel uit te spreken en aan de instelling te vragen om het project te herwerken en opnieuw in te dienen.</p> <p>Met het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ (VV112), heeft de Vlaamse Regering de toekenning van projectmiddelen voor de projecten die in eerste</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>ronde een positief advies kregen, goedgekeurd.</p> <p>Zoals voorzien in de “Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, tot het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht”, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 juli 2021, konden projecten die in de eerste juryronde geen positief advies ontvingen, opnieuw aangeboden worden in een tweede juryronde.</p> <p>17 hogeronderwijsinstellingen dienden projecten in voor deze tweede juryronde. De Hogere Zeevaartschool diende voor deze tweede ronde geen projecten in. De deadline van 27 oktober, middernacht, werd daarbij door alle instellingen gerespecteerd. Op 17 november 2021 heeft de jury haar advies overgemaakt aan de minister, bevoegd voor onderwijs. De jury adviseert om 107 projecten bijkomend goed te keuren in deze tweede ronde, waarvan voor 1 project de goedkeuring afhankelijk is van de goedkeuring van andere projecten.</p> <p>Met het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ (VV112) heeft de Vlaamse Regering de toekenning van projectmiddelen voor de projecten die in tweede ronde een positief advies kregen, goedgekeurd.</p> <p>Met dit besluit eindigt de mogelijkheid voor instellingen om een toelage te verkrijgen via de modaliteiten opgenomen in de “Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, tot het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht” (VV 112), zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 juli 2021.</p> <p>Daarnaast zal de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 april 2021, betreffende het opzetten van een Beheers- Controle en Auditsysteem bij de projecten ingediend in het kader van de Europese Faciliteit voor Veerkracht en Herstel, een beheers- en controlesysteem uitwerken en installeren.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
De Vlaamse Regering keurt de visienota Voorsprongfonds hoger onderwijs goed.	2021 Q1	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
De Vlaamse Regering kent de projecttoelages goed, op basis van plannen ingediend door de hogescholen en universiteiten.		2021 Q4	Gerealiseerd	
Het traject voor de opmaak van een visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs is opgestart.		2022 Q1	Nog niet gestart	
Tussentijdse opvolging van de projecten die een toelage ontvangen van het Voorsprongfonds hoger onderwijs.		2022 Q4	Nog niet gestart	
7 instellingen voor hoger onderwijs hebben deelgenomen aan het Voorsprongfonds. (RFF mijlpaal)		2023 Q4	Op schema	
De visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs is beschikbaar en goedgekeurd door de minister, bevoegd voor hoger onderwijs.		2023 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal instellingen die deelnemen aan het VPF	7	2023 Q4		50 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	24.000 EUR
Uitvoering VEK	21.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 53.800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ (VV112)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ \(VV112\)](#)

Beslissing van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, voor het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds

[Nota aan de Vlaamse Regering van 26 februari 2021. Visienota. Voorsprongfonds hoger onderwijs](#)

[Visienota Voorsprongfonds Hoger Onderwijs. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, tot het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds](#)

[Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, tot het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

21. Digitalisering zorgbeleid

VV113 - BLENDED-CARE JEUGDHULP - BANDBREEDTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Digitaal Vlaanderen - Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Jongeren, gezinnen, netwerk van een jongere of een gezin Agentschap Opgroeien Private welzijns- en jeugdhulpvoorzieningen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Tijdens Corona hebben de digitale kanalen versneld ingang gevonden in zorg en welzijn. Online-begeleiding staat 'an sich' ook niet meer ter discussie. De oplossingen die men tijdens de eerste Corona-golf koos waren pragmatisch en dienden het hogere belang 'beter op deze manier contact, dan geen contact', maar waren niet informatieveilig, noch privacy-proof en ook niet geïntegreerd in het begeleidingsproces.</p> <p>Met het project Bandbreedte willen we onze ondersteuning binnen de jeugdhulp verbreden en versterken. Dat zorgt letterlijk voor extra bandbreedte. Méér manieren om onze jongeren te ondersteunen en bredere wegen om bij Jeugdhulp terecht te komen, zowel online als offline. We willen blended werken duurzaam ingang laten vinden in de jeugdhulp in Vlaanderen en de jongeren en hun gezin transparantie bieden over eigen gegevens en in hun kracht zetten. Daarmee streven we volgende 4 doelstellingen na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitale vormen van contact zoals chatten en beeldbellen zijn vandaag meer en meer ingeburgerd in het leven van jongeren en ouders. Deze vormen van contact verlagen de drempels en maken contact mogelijk op momenten dat dit omwille van afstand, tijd of andere redenen (bv. een gezondheids crisis) niet mogelijk is. Binnen de hulpverlening blijft er zeker een grote nood aan reële (face to face) nabijheid. Digitale contacten kunnen en mogen deze nabijheid nooit vervangen, maar kunnen wel versterkend werken. Tegelijk moet, wanneer gekozen wordt voor digitale instrumenten, eenzelfde veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Een hulpverleningsgesprek wordt ook niet georganiseerd op plaatsen waar iedereen kan meeluisteren. Daarom investeren we in veilige beeldbeltools en chatfuncties.

PROJECTOMSCHRIJVING

2. De digitale transformatie naar blended care staat nog maar aan het begin. Online tools creëren een heel nieuw gamma aan mogelijkheden. Ze verrijken de hulpverlening, ondersteunen de face to face-contacten, vergroten de autonomie van jongeren en hun ouders. Het zijn instrumenten om jongeren en ouders te empoweren, ook op momenten dat de hulpverlener niet aanwezig is. Blended care sluit nauw aan bij de leefwereld van de jongere, versterkt het eigenaarschap en maakt hulpverlening aangenamer en doeltreffender. Blended care houdt ook risico's in op versnippering, datalekken, gebrek aan transparantie. Iedere app of website is hopelijk beveiligd op zichzelf, maar voor jongeren betekent dit vooral zich telkens opnieuw aanpassen, aanmelden, een andere gebruikerservaring etc. Dit is een cruciaal aandachtspunt als we blended care echt willen laten slagen. Daarom investeren we in blended care en het opzetten van een changetraject binnen de sector jeugdhulp.

3. Transparantie en toegankelijkheid van eigen gegevens zijn basisrechten. We willen de regie over die gegevens veel meer in eigen handen van jongeren geven. Het zijn immers hun eigen gegevens. Jongeren zullen zelf ook mee kunnen bepalen wie welke gegevens over hen te zien krijgt. We werken aan een schakelbord waarin ze die toegangen zelf kunnen beheren. Daarom investeren we in een "jongerenprofiel"(burgerprofiel) binnen ikgroeiop.be.

4. Gezinnen en jongeren vragen naar geïntegreerde samenwerking tussen hulpverleners, en vragen ook dat dit in alle transparantie en met betrokkenheid van henzelf gebeurt. Deze transparantie en samenwerking moet ook een vertaling krijgen in een digitale gedeelde werkruimte. We maken een grondige analyse samen met de stakeholders over welke tools en kwaliteitseisen er nodig zijn om goed digitaal te kunnen samenwerken. Daarbij zijn snelle en vlotte verbindingen en uitwisseling met onze eigen systemen noodzakelijk. Daarom investeren we in digitale werkruimtes die samenwerking vergemakkelijken.

Bij het bereiken van deze 4 doelstellingen zal maximaal ingezet worden in de integratie in bestaande zorginformatiesystemen en zullen ook de mogelijkheden om het breder in te zetten in het welzijnslandschap in Vlaanderen bekeken worden.

Bij digitale zorginnovatie moet naast de technische ontwikkeling altijd 75% van de middelen geïnvesteerd worden in de sociale adoptie van deze digitale zorginnovatiesystemen. E-inclusie staat hier voorop als belangrijk designprincipe. De 4 belangrijke pijlers (toegang, motivatie, digitale vaardigheden & ondersteuning) van E-inclusie worden dus meegenomen in het plan van aanpak van iedere doelstelling op zich. Project breed investeren we dus in het opzetten van een communicatie en changetraject en zetten we een participatiepool op van jongeren en hun sociaal netwerk.

Waar mogelijk leggen we intersectorale linkjes om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	5.000.000 EUR
Output	Tegen eind 2023 kunnen alle jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen veilig online communiceren met elkaar.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	<p>Tegen eind 2023 hebben minstens 70% van alle gesubsidieerde jeugdhulporganisaties van opgroeien (202 voorzieningen) een trekker of mediacoach die mediawijsheid intern en extern opvolgt</p> <p>Tegen eind 2023 heeft van de 202 gesubsidieerde instellingen jeugdhulp waarin ongeveer 10 000 medewerkers tewerkgesteld zijn heeft minstens 10% van de werknemers één of meerdere modules blended-care competenties gevolgd en binnen minstens 50 % van de gesubsidieerde instellingen heeft één werknemer een train-the-trainer in huis inzake de mix van de verschillende modules blended-care.</p> <p>Tegen eind 2023 is een advies gegeven en heeft het agentschap Opgroeien zijn positie bepaald inzake het gebruik van een gedeelde digitale werkruimte voor jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en de hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen</p> <p>Tegen eind 2023 kunnen alle jongeren in Vlaanderen vanaf 12 jaar inloggen in mijnburgerprofiel en via hun jongerenprofiel hun gegevens inzake de jeugdhulp inkijken</p> <p>Tegen eind 2023 is het duidelijk voor jeugdhulpactoren welke rol het agentschap Opgroeien zal innemen inzake het gebruik van een digitale werkruimte.</p>
Outcome	<p>Veilig online communiceren voor jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen</p> <p>De blended hulp competenties; mediawijsheidscompetenties en e-inclusiecompetenties verhogen binnen de jeugdhulporganisaties in Vlaanderen om zo de digitale transformatie binnen de jeugdhulp verder te realiseren en te implementeren. Het opleiden van een mediacoaches en blended-care coaches binnen jeugdhulporganisaties en het beschikbaar stellen van ondersteunde info en materiaal is hierin cruciaal.</p> <p>Snelle toegang en transparantie tot eigen gegevens in de jeugdhulp realiseren.</p> <p>Hulpverleners en gezinnen kunnen veilig gegevens delen met elkaar en samenwerken</p>
Beoogde impact	<p>VLAANDEREN DIGITAAL TRANSFORMEREN - HET VLAAMSE ZORG- EN WELZIJNSSYSTEEM VERSTERKEN - Toegankelijkheid Vlaamse overheid (imago) - Contact met overheid via internet</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er werd een kaderovereenkomst met Digitaal Vlaanderen afgesloten voor de uitwerking van een roadmap voor de verdere uitwerking en realisatie van project Bandbreedte. Een nieuwe nota VR wordt geagendeerd januari 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Vorbereiding: Opmaken van plan van aanpak	2021 Q2	Gerealiseerd
pijler 3: digitaal aanvragen van inzage in dossier via mijn burgerprofiel	2022 Q4	Nog niet gestart
Algemeen: Schrijven en agenderen eerste nota Vlaamse Regering van het project Bandbreedte	2021 Q2	Gerealiseerd
Pijler 1: Gebruikersonderzoek door Ipsos in samenwerking met digitaal Vlaanderen inzake gebruikerservaringen inzake online communiceren	2021 Q4	Gerealiseerd
Pijler 1: Rapport Ipsos inzake de gebruikerservaring van jongeren en hun sociaal netwerk inzake online communicatie en beschrijving van de vereisten inzake de communicatieoplossing	2021 Q4	Gerealiseerd
Pijler 2: Schrijven van overheidsopdracht "organiseren van mediacoach opleidingen" en publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd
Pijler 2: Schrijven en publiceren van overheidsopdracht voor het oprichten en begeleiden van een adviesgroep om te komen tot een voorstel van visie en positionering van blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid	2021 Q2	Gerealiseerd
Pijler 2: Schrijven van overheidsopdracht en publiceren ervan voor het ontwikkelen van materiaal inzake mediawijsheid en e-inclusie dat de sector jeugdhulp kan gebruiken in de zorgtrajecten van jongeren en ouders	2021 Q2	Gerealiseerd
Pijler 2: Schrijven overheidsopdracht "het ontsluiten en implementeren van veilige digitale tools om blended werken binnen de jeugdhulp te versterken" en het publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd
Pijler 2: Schrijven en publiceren van bestek voor het verhogen van digitale competenties bij jeugdhulpmedewerkers in online en blended hulpverlening.	2021 Q2	Gerealiseerd
Pijler 2: uitschrijven overheidsopdracht "Ontwikkelen van kaders voor organisaties jeugdhulp" en het publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd
Pijler 2: Gunning van bestek voor het oprichten en begeleiden van een adviesgroep om te komen tot een voorstel van visie en positionering van blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid	2021 Q4	Gerealiseerd
Pijler 2: Gunning van bestek ontwikkelen van materiaal inzake mediawijsheid en e-inclusie dat de sector jeugdhulp kan gebruiken in de zorgtrajecten van jongeren en ouders	2021 Q4	Gerealiseerd
Pijler 2: Gunning van bestek "Ontwikkelen van kaders voor organisaties jeugdhulp":	2021 Q4	Bij te sturen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Pijler 2: Gunning bestek "het ontsluiten en implementeren van veilige digitale tools om blended werken binnen de jeugdhulp te versterken"	2021 Q4	Gerealiseerd
Pijler 2: Gunning bestek het verhogen van digitale competenties bij jeugdhulpmedewerkers in online en blended hulpverlening.	2021 Q4	Gerealiseerd
Pijler 2: Gunning van bestek organiseren van mediacoach opleidingen	2021 Q4	Gerealiseerd
Pijler 2: Investeren in en implementeren van blended-care jeugdhulp – integratie van zorginformatiesystemen (oplevering haalbaarheidsstudie blended care platform)	2022 Q3	Op schema
Pijler 3: Ontsluiting van jeugdhulphistoriek via Mijn Burgerprofiel voor minderjarigen	2021 Q4	Vertraging
Pijlers 4: Schrijven en publiceren van bestek voor onderzoek naar behoefteanalyse voor digitale werkruimte	2021 Q2	Gerealiseerd
Pijlers 4: Gunning van bestek voor onderzoek naar behoefteanalyse voor digitale werkruimte	2021 Q3	Gerealiseerd
Pijler 4: Oplevering onderzoek behoefteanalyse digitale werkruimte	2022 Q1	Op schema
pijler 2: opzet en lanceren portaalpagina bandbreedte	2022 Q1	Op schema
Algemeen: kaderovereenkomst afsluiten met Digitaal Vlaanderen voor digitale strategie en roadmap	2022 Q1	Op schema
Algemeen: nota vlaamse regering fase 2	2022 Q1	Op schema
pijler 2: kick off: bekendmaking bandbreedte voor jeugdhulpsector	2022 Q1	Op schema
pijler 4: opmaak roadmap digitale werkruimte	2022 Q2	Nog niet gestart
pijler 1: opmaak roadmap veilig online communiceren (ism Digitaal Vlaanderen)	2022 Q3	Op schema
pijler 3: opmaak roadmap portaal minderjarigen (werktitel ikgroeioop)	2022 Q3	Nog niet gestart
pijler 3: ontsluiten van rekeningnummer, aangemaakt door Opgroeien in MBP	2022 Q4	Nog niet gestart
pijler 4: start uitvoering roadmap digitale werkruimte	2022 Q4	Nog niet gestart

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
pijler 1: start uitvoering roadmap veilig online communiceren		2022 Q4	Nog niet gestart	
pijler 3: start uitvoering roadmap portaal voor eigen inzage minderjarigen		2022 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
kickoff voor sector jeugdhulp		2022 Q1		
webpagina bandbreedte voor ontsluiten van opgeleverd materiaal		2022 Q1		
een roadmap digitale strategie voor Opgroeien		2022 Q3		
Eerste advies inzake visie blended werken in een geïntegreerd gezins-en jeugdbeleid	1 adviestekst	2023 Q1		
Aantal werknemers binnen de sector jeugdhulp die een opleiding mediacoach gevolgd hebben	142	2024 Q4		
Aantal apps voor kinderen en ouders die gescreend zijn om opgenomen te worden of niet op de welzijns-appstore	100	2024 Q4		
Beschikbare producten voor jongeren en ouders binnen die jeugdhulp inzake mediawijsheid en e-inclusie	50	2024 Q4		
Aantal modules blended -care competenties die gevolgd werden door werknemers uit de jeugdhulpsector	1000	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	570.000 EUR
Uitvoering VEK	60.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 18 juni 2021. Blended care jeugdhulp](#)

[Blended care jeugdhulp -indicatieve planning. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie](#)

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

[VV114 - Digitale hulpverlening - kwaliteitsbevordering](#)

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel](#)

[VV116 - Elektronisch patiëntendossier - Geïntegreerd zorg en ondersteuningsplan](#)

VV114 - DIGITALE HULPVERLENING - KWALITEITSBEVORDERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitale hulp- en dienstverlening nam de voorbije maanden een groot deel van de fysieke hulpverlening over. Gelukkig kon men rekenen op bepaalde expertise bij een deel van de organisaties en een deel van het personeel. Zo bleken de chat- en telefoondiensten zeer corona-proof. In andere sectoren waren er al voorzichtige experimenten met online-hulp. Vandaag heeft het gros van de hulpverleners kennis gemaakt met onlinehulpverlening. Om de mogelijkheden hiervan te benutten, maar ook om te bewaken dat de kwaliteit van deze hulpverlening ook op een hoog niveau staat, moet de ondersteuning voor opleidingen en vorming of ondersteuning voor nieuwkomers op het terrein opgedreven worden. Als digitaal een echt alternatief wil zijn, ook post corona, moet deze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen.

Aandachtspunt: waar mogelijk leggen we intersectorale linkjes om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	500.000 EUR
Output	Het aantal vormingen en begeleidingen gegeven aan professionals in zorg en welzijn
Outcome	meer professionals in zorg en welzijn zijn versterkt in hun online en blended competenties en bieden op een kwaliteitsvolle manier online of blended zorg en ondersteuning aan
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
---------------	-----------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	we zijn een ondersteuningsplan aan het uittekenen gericht op het versterken van competenties in het kader van online en blended werken bij professionals in zorg en welzijn.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Zorgactoren (overgedragen zorgsectoren zesde staatshervorming) Zorgkassen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Agentschap Vlaamse sociale bescherming

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Er zijn een aantal essentiële bouwstenen voor de inkanteling en inbedding van zorgsectoren in de Vlaamse Sociale Bescherming. Deze zijn noodzakelijk om een performant systeem uit te bouwen waarmee de doelstellingen van VSB vanuit administratief oogpunt kunnen gerealiseerd worden. Deze investering dient o.a. om de voorzieningen te digitaliseren om zo de sectoren die naar Vlaanderen werden overgedragen vanuit het RIZIV bij de 6de staatshervorming op eenzelfde (minimaal) niveau van informatisering te krijgen op het gebied van de basisprocessen en bijhorende applicaties (digitalisering boekhouding, facturatie, gegevensregistratie, elektronisch patiëntendossier, ...).

Zowel de zorgaanbieders als de zorgkassen moeten ook een digitale koppeling maken met het centrale VSB- platform. Via dit platform wordt de verzekeraarbaarheid binnen VSB getoetst alsook de financiering van het zorgticket en de zorgbudgetten toegekend.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	11.000.000 EUR
Output	De sectoren uit het overnamedecreet zijn eind deze legislatuur gedigitaliseerd. Het gaat om de volgende sectoren: de revalidatieziekenhuizen, de revalidatieconventies, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen. De digitalisering verloopt gefaseerd (niet alle sectoren tegelijk).
Outcome	Geen papieren circuit tussen zorgkassen, voorzieningen en agentschap. Agentschap beschikt centraal over alle relevante data.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Toename digitale collectiedata

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>VAK 7.775.000 EUR VEK 6.620.000 EUR, 1.155.000 in aanvraag ronde 10</p> <p>1.150k vastgelegd, 92k uitbetaald 500k subsidie consortium voorzieningen overnamedecreet + 650k subsidie investeringen zorgkassen</p> <p>2200k vastgelegd, 2200k uitbetaald subsidie verzekeringsinstellingen</p> <p>2225k vastgelegd, 716k uitbetaald 1475k Centrale Gemeenschappelijke Applicatie revalidatieziekenhuizen + 750k Centrale Gemeenschappelijke Applicatie revalidatieconventies eerste golf</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Digitalisering revalidatieziekenhuizen - functionele analyse	2021 Q3	Gerealiseerd
Applicatie revalidatieziekenhuizen	2021 Q4	Gerealiseerd
Digitalisering revalidatieziekenhuizen - applicatie in productie eind december 2021	2021 Q4	Op schema
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2021 Q3	Op schema
Consortium: aanstellen coördinator	2021 Q4	Gerealiseerd
Consortium: installeren stuurgroep	2021 Q4	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Op schema
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Op schema
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q1	Nog niet gestart
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q1	Nog niet gestart
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q1	Nog niet gestart
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Op schema
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Op schema
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Op schema
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Op schema
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Op schema
Consortium: Omzetten van ICT-planning naar changemanagement: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Op schema
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Op schema
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q2	Op schema
VI: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q2	Op schema
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Nog niet gestart
Consortium: Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q3	Op schema

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Consortium : Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q3	Op schema
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Nog niet gestart
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Nog niet gestart
Applicatie revalidatieconventies - psychische problemen	2022 Q4	Op schema
VI: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q4	Op schema
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q4	Op schema
Consortium: Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q1	Nog niet gestart
Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q2	Nog niet gestart
VI: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Nog niet gestart
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Nog niet gestart
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Nog niet gestart
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Nog niet gestart
Consortium : Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicaties fysieke problemen	2023 Q3	Nog niet gestart
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Nog niet gestart
VI: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Nog niet gestart
Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Nog niet gestart

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Nog niet gestart
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2024 Q1	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	11.000.000 EUR
Uitvoering VAK	7.775.000 EUR
Uitvoering VEK	5.658.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 11.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Digitalisering RIZIV – sectoren
Besluit van de VR van 26/11/2021 subsidie digitalisering RIZIV-sectoren

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV116 - ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER - GEÏNTEGREERD ZORG EN
ONDERSTEUNINGSPLAN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De patiënt moet centraal staan in de zorg. Daarom streven we ernaar om de zorg beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren van elke burger. Om deze ambitie in de praktijk mogelijk te maken, is het cruciaal dat ook de gegevensuitwisseling versterkt wordt. We investeren prioritair in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan en een elektronisch patiëntendossier voor de eerste lijn. Door hierbij ook samen te werken met andere betrokken actoren, vergroten we ook het vertrouwen in en het draagvlak voor dit elektronisch patiëntendossier bij de bevolking. Deze investeringen dragen bij tot multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling in het kader van integrale zorg. De zorgnoden en –doelstellingen van de persoon worden als uitgangspunt genomen. Data uit het elektronisch patiëntendossier zullen in een volgende fase gedeeld kunnen worden tussen de zorgverstrekkers onderling én met de patiënt, met respect voor het medische geheim en de privacy.</p> <p>Bij de opmaak van een zorg- en ondersteuningsplan wordt rekening gehouden met de BelRAI-indicatie maar ook met de persoonlijke herstel- en revalidatiedoelstellingen van de persoon met een zorgnood. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Vitalink als platform om data te delen. Dit alles moet het mogelijk maken om digitale gedeelde informatie in te zetten voor het bepalen en evalueren van het gezondheidsbeleid, bruikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van de zorg- en hulpverlening. Digitale informatiedoorstroming in een uniforme taal (BELRAI) tussen zorgactoren en overheid is essentieel om tot kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te komen in de hele keten van zorg (eerstelij, tweedelij, derdelij).</p> <p>De gegevens gekend bij het VAPH omtrent de persoon met een handicap dienen geïntegreerd in het digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Met Zorg & Gezondheid dient bekeken welke informatie een meerwaarde kan bieden en ontsloten worden. Dit biedt ook mogelijkheden naar de persoon met een handicap. Het biedt kansen op een eenvoudig, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk e-loket. We zorgen dat we niet inboeten op toegankelijkheid.</p> <p>Aandachtspunt: waar mogelijk leggen we intersectorale linkjes om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	30.000.000 EUR
Output	Aangeboden of ontsloten toepassingen om digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en zorggebruikers en de cliënt te faciliteren
Outcome	Efficiëntieverhoging van de zorg- en welzijnssector en versterking van patiëntveiligheid
Beoogde impact	Aandeel van de bevolking in (zeer) goede gezondheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Voor de verdere ontwikkeling van het ZorgAtlas-platform heeft de VR in 2021 voor de ontwikkelingen die meer toekomstgericht zijn (minder gerelateerd aan de COVID-19 crisis) in 880.000€ uit de relancemiddelen voorzien. De beoogde ontwikkelingen van de ZorgAtlas sluiten aan bij de doelstelling van actie VV116 waarbij ook het objectief is dat digitale gedeelde informatie ingezet wordt voor het bepalen en evalueren van het gezondheidsbeleid, bruikbaar maken voor wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van de zorg- en hulpverlening. De VR heeft ook relancemiddelen voorzien voor de verdere uitbouw van het Samenwerkingsplatform Uitbraak Management zodat het platform in de toekomst inzetbaar is voor nieuwe pandemieën en opvolging van andere ziektebeelden.</p> <p>het project is nog niet goedgekeurd door VR</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
	MIJLPAAL	TIMING	STATUS
	Beslissing om te investeren in de verdere ontwikkeling van ZorgAtlas-platform door post COVID-19 klaar te maken en in te zetten als een volwaardige population and health and care omgeving	2021 Q3	Gerealiseerd
	Definiëren van use-cases gelinkt aan de Beleidsnota WVG 2019-2024 en gebaseerd op concrete beleidsmatige noden mho verdere uitbouw van het ZorgAtlas-platform	2021 Q4	Op schema
	Beslissing om te investeren in de verdere ontwikkeling van ZorgAtlas-platform door post COVID-19 klaar te maken en in te zetten als een volwaardige population health and care management omgeving.	2021 Q3	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Definiëren van use-cases gelinkt aan de Beleidsnota WVG 2019-2024 en gebaseerd op concrete beleidsmatige noden met het oog op de verdere uitbouw van het ZorgAtlas-platform	2021 Q4	Op schema
Beslissing over platform/toepassing dat elke sector/entiteit wil/zal gebruiken voor digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en de cliënt, met oog voor onderlinge mogelijkheden tot uitwisseling.	2022 Q1	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.009.000 EUR
Uitvoering VEK	453.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 30.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Verdere ontwikkeling Zorg Atlas en SUM in 2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV117 - ENKELBANDEN EN STRAFUITVOERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De coronapandemie heeft een significante impact gehad op de uitvoering van de werkstraf en het aanbod aan beschikbare werkplaatsen. De aanhoudende corona maatregelen hadden als gevolg dat veel prestatieplaatsen gedurende een lange tijd gesloten bleven voor werkgestraften of met een lager aantal werkgestraften konden werken. Tegelijkertijd werden er nog evenveel werkstraffen uitgesproken en merken we dit jaar zelfs een stijging gezien er ook veel werkstraffen werden uitgesproken voor overtredingen van coronamaatregelen. In sommige regio's (voornamelijk Antwerpen, Limburg, Brussel en Leuven) vraagt deze bijzondere situatie ten gevolge van de coronapandemie dan ook bijkomende maatregelen :

- Een tijdelijk en bijkomend omkaderingsaanbod bij de Stad Antwerpen:

Voor de regio Antwerpen willen we aan de Stad Antwerpen de mogelijkheid geven om bijkomend 1 VTE werkvloerbegeleider niveau B tijdelijk in te zetten voor de omkadering van de werkstraffen. Het gaat om een tijdelijke periode, nl. van 1 september 2021 tem 31 december 2023. De Antwerpse begeleidingsdienst (dienst Samen Werken) bestaat reeds meer dan 10 jaar en heeft dus al een aanbod dat afgestemd is op de vraag van de partners van de strafrechtsketen.

- Een tijdelijk werkvloerproject bij vzw VOC Neteland:

De afdeling Mechelen van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen signaleert dat er voornamelijk een tekort is in de regio's Heist-op-den-Berg, Berlaar en Nijlen. Met de voorgestelde subsidiemiddelen wordt aan vzw VOC Neteland de mogelijkheid gegeven om bijkomend een halftijds personeelslid in te zetten voor de uitbouw van een tijdelijk werkvloerproject, dit ter omkadering van de werkstraffen en voor een periode van 6 maanden. Er kunnen zowel door de week als in het weekend werkgestraften worden ingeschakeld voor de uitvoering van diverse taken, zoals de verzorging van dieren en ondersteuning bij de aanleg of het onderhoud van de infrastructuur.

- Een tijdelijk werkvloerproject bij vzw Natuurpunt

Voor de regio's Antwerpen, Borgloon, Genk en Leuven wensen we tijdelijk 1 extra VTE niveau B per regio toe te kennen gedurende een periode van 2 jaar. Met Natuurpunt Beheer vzw is er reeds enkele jaren een goede samenwerking en de organisatie beschikt over de kennis en vaardigheden

PROJECTOMSCHRIJVING

om met het doelpubliek te werken. Via Natuurpunt krijgen justitiabelen de kans om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk belang in de samenleving, namelijk het beschermen van de natuur, open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu in Vlaanderen.

- Mobiele werkvloerprojecten in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Limburg en Brussel

We wensen in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg een mobiel werkvloerproject op te starten. Een mobiel werkvloerproject houdt in dat er met een groep werkgestrafden taken worden uitgevoerd bij externe organisaties die een nood hebben. De opdracht van het mobiel werkvloerproject is tweeledig. We verwachten dat het mobiel werkvloerproject zelf actief op zoek gaat naar taken/opdrachten bij organisaties en daarnaast zelf een planning opmaakt om deze taken met een groep werkgestrafden uit te voeren.

Gezien de bijkomende nood die zich in het gerechtelijk arrondissement Brussel stelt, willen we voor deze regio inzetten op een integratie van een dispatchingsfunctie in een mobiel werkvloerproject. Enerzijds voorziet het luik dispatching in de toeleiding van de werkgestrafden naar een prestatieplaats en de verdere opvolging van de werkstraffen, en anderzijds kan het luik mobiele werkvloer ondersteuning aan de andere prestatieplaatsen bieden en inspelen op opportuniteiten die zich bij externe organisaties voordoen.

- Mobiel werkvloerproject in samenwerking met OVAM in het kader van het opruimen van zwerfvuil door werkgestrafden.

Verder wordt er ook ingezet op de bouw van het bestuurlijk sanctieregister. Dat is de allereerste IT-toepassing in België die alle bestuurlijke sancties die op basis van Vlaamse regelgeving worden opgelegd op een gecoördineerde wijze ontsluit zodat alle sanctionerende overheden, zowel gerechtelijke als bestuurlijke, met kennis van zaken kunnen handelen. De informatie kan ook worden geraadpleegd in functie van de gerechtelijke of bestuurlijke opsporing en wordt de gegevensbron voor de ontwikkeling van een kruispuntbank bestuurlijke Handhaving, die een preventief en reactief bestuurlijk optreden tegen maatschappelijk ondermijnende activiteiten moet ondersteunen.

De decretale basis is gelegd met het kaderdecreet bestuurlijke handhaving van 22 maart 2019. Er werd in de loop van 2020 en 2021 in samenwerking met Digitaal Vlaanderen een business case uitgevoerd met betrokkenheid van alle handhavingspartners (politie, parket, lokale besturen, Vlaamse handhavingdiensten..). Op 18 juni 2021 besliste de Vlaamse regering op basis van het eindrapport van deze business case dat de informatie met betrekking tot bestuurlijke vervolging en sanctionering voor de gehele Vlaamse regelgeving wordt opgenomen in het te ontwikkelen bestuurlijk sanctieregister en dat alle Vlaamse ministers hier hun medewerking voor verlenen.

Er werd een samenwerkingsovereenkomst (SWO) met Digitaal Vlaanderen onderhandeld om het Vlaams bestuurlijk sanctieregister te ontwikkelen op zodanige wijze dat het tegelijkertijd de digitalisering van de handhavingprocessen ondersteunt, dat het een cruciale bouwsteen wordt en dat de data consulteerbaar worden binnen een kruispuntbank handhaving. Deze SWO wordt in de loop van december 2021 getekend.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	4.000.000 EUR
Output	
Outcome	
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>- Inzake het werkvloerproject bij vzw VOC Neteland : er werd een halftijdse werkvloerbegeleider aangeworven om een tijdelijk werkvloerproject uit te bouwen. Dit werkvloerproject werd ondertussen uitgebouwd en is operationeel. Concreet werkt in het kader van dit project de werkvloerbegeleider samen met de werkgestraften binnen de eigen organisatie, zowel door de week als in het weekend, en worden er taken zoals verzorging van dieren en onderhoud van de infrastructuur uitgevoerd. Zowel vanuit het justitiehuis van Mechelen als het justitiehuis van Turnhout wordt er doorverwezen en betekent het project aldus een meerwaarde voor beide justitiehuizen. De samenwerking met beide justitiehuizen verloopt vlot. Om het kwartaal zal er een stand van zaken omtrent het aantal behandelde dossiers worden overgemaakt. In januari zal het eerste kwartaalverslag met betrekking tot het aantal behandelde dossiers worden overgemaakt alsook een kwalitatief verslag van het project, waardoor er reeds een eerste beknopte evaluatie van het project kan plaatsvinden.</p> <p>- Inzake het werkvloerproject bij vzw Natuurpunt (Leuven) : sinds midden september werd een bijkomend werkvloerproject in de regio Leuven geïnstalleerd, waardoor er een ontubbeling van het reeds bestaande werkvloerproject met zowel standplaats Tienen als Dienst mogelijk was. Op die manier werd de capaciteit inzake het aanbod voor het justitiehuis Leuven vergroot. Het werkvloerproject zet in op natuurbeheer binnen de eigen organisatie, waarbij de werkvloerbegeleider met een aantal werkgestraften werkzaamheden in de verschillende natuurgebieden verricht. De samenwerking met de organisatie verloopt goed. Om het kwartaal zal er een stand van zaken omtrent het aantal behandelde dossiers worden overgemaakt. In januari zal het eerste kwartaalverslag met betrekking tot het aantal behandelde dossiers worden overgemaakt alsook een kwalitatief verslag van het project, waardoor er reeds een eerste beknopte evaluatie van het project kan plaatsvinden.</p> <p>De projecten OVAM, mobiele werkvloeren en Stad Antwerpen zijn nog niet opgestart dus hier kan inhoudelijk nog niet over gerapporteerd worden. De mobiele werkvloerprojecten werden door de VR van 17/12/21 wel gegund en de overeenkomsten met OVAM en de stad Antwerpen werden wel ondertussen getekend, zodat al deze initiatieven binnenkort kunnen opstarten.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>Hetzelfde geldt voor 3 van de 4 werkvloerprojecten bij Natuurpunt. Ook hier werden de overeenkomsten getekend en worden die binnenkort opgestart.</p> <p>Hetzelfde geldt voor het Vlaams bestuurlijk sanctieregister.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
----------	--------	--------

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	134.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 juni 2021. Vlaams bestuurlijk sanctieregister](#)

[Eindrapport. Bestuurlijk sanctieregister. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV118 - GROEIPAKKET - VERDERZETTEN DIGITALISERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Uitbetaling Groeipakket
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Uitbetaling Groeipakket - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Burgers met kinderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

VERDERE DIGITALISERING GP

Door verder in te zetten op een verregaande digitalisering van de berekening, gegevensdeling en uitbetaling van het Groeipakket werken we aan een efficiënte overheid en creëren we via automatische rechtentoekenning een solide basis voor de verschillende beleidsdoelstellingen die we met het Groeipakket realiseren.

Begin 2021 werd een scope voor de verdere doorontwikkeling van de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) vastgelegd. Deze applicatie staat in voor de automatische rechtentoekenning en dossieropvolging van de Groeipakketten waaronder bijvoorbeeld de berekening van de correcte GP bedragen.

Voor 2021 werden 420 story points (functionaliteiten) vastgelegd voor de doorontwikkeling van CGPA. Deze worden bepaald en geprioriteerd op basis van volgende invalshoeken.

Wettelijk: Is het noodzakelijk om de functionaliteit verder te ontwikkelen om automatisch (zonder menselijke tussenkomst) aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen.

Technisch: Zijn de ontwikkelingen technisch nodig om de garanties op een stabiele en optimale werking van de toepassing te kunnen garanderen.

Burger: Bijkomende functionaliteiten die een directe meerwaarde zullen betekenen voor de burger.

Gebruiksgemak: Ontwikkelingen die het gebruik door de consumenten van de toepassing optimaler/vlotter laten verlopen.

DEELPROJECT ZOË 2.0 (Zorgtoeslag evaluatie - Attestering specifieke ondersteuningsbehoeften)

Bij de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid voor de zorgtoeslag overgedragen van het Federale naar het gewestelijke niveau. Omwille van diverse redenen werd op dat moment het as is proces overgenomen en aan de hand van een minimaal levensvatbare toepassing uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat de zorgtoeslag dienstverlening niet optimaal efficiënt verloopt. Met het ZOË 2.0 project willen we de zorgtoeslag processen optimaal ondersteunen met een geïntegreerd

PROJECTOMSCHRIJVING

applicatieplatform op basis van een nieuwe technologische visie. Daarenboven maken we zoveel als mogelijk gebruik van de bouwstenen van Digitaal Vlaanderen.
 In functie van efficiëntie en transparantie naar de burger toe willen we tevens de Corona-crisis aangrijpen om het proces versneld te digitaliseren naar de burger.
 We voorzien 2 fases (releases) waarbij we in release 1 vooral focussen op de digitalisering van de bestaande werking en de opzet van een vernieuwde architectuur klaar voor de toekomst. In fase 2 (release 2) focussen we ons op bijkomende optimalisaties, niet-functionele verplichtingen i.h.k.v. bedrijfscontinuïteit en veiligheid en de implementatie van eventuele nieuwe beleidsinzichten.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	7.000.000 EUR
Output	<p>VERDERE DIGITALISERING VAN HET GROEIPAKKET Eén verdere geoptimaliseerde Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding van de module automatische rechtsbepalingen. - Uitbreiding van de module Ex post controle van gegevens met betrekking op de prestaties. - Uitbreiding van de module controles van de schoolactiviteiten. - Uitbreiding van de module schulden en inningen. <p>DEELPROJECT ZOË 2.0 : Eén nieuwe applicatie voor de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoeften ZOE 2.0</p>
Outcome	<p>VERDERE DIGITALISERING VAN HET GROEIPAKKET</p> <ul style="list-style-type: none"> - Snellere toekenning van de GP rechten en de bijbehorende uitbetalingen van de correcte GP bedragen. - Kwaliteitsvollere dienstverlening en transparantie naar de burger. - Bereiken van efficiëntiewinsten (performantie/kosten) in de wijze van GP uitbetalingen <p>DEELPROJECT ZOË 2.0 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snellere & efficiëntere dossiervoorbereiding: verkorting van de 'dossiervoorbereiding' met gemiddeld 1 maand en een substantiële verkorting qua doorlooptijd voor de burger zodra het tekort aan evaluerend artsen is weggewerkt (*) • Transparantie naar de burger: inzage in zijn/haar dossier • Kwaliteitsvollere dienstverlening: lagere foutgevoeligheid van het administratieve proces & een hogere bedrijfscontinuïteit van de toepassing 99% uptime m.u.v. geplande onderbrekingen • Ecologische voetafdruk verkleinen: besparing van jaarlijks ongeveer 325.000 vellen papier (equivalent van 6-7 bomen) wanneer we een optimale digitaliseringsgraad bereiken <p>(*) Het technische project kan geen oplossing bieden voor het tekort aan evaluerend artsen waardoor de algemene doorlooptermijnen vandaag ook oplopen.</p>
Beoogde impact	Toegankelijkheid Vlaamse overheid (imago) - Efficiëntie Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>VERDERE DIGITALISERING VAN HET GROEIPAKKET</p> <p>De laatste ontwikkelingen voor een omvang van 210 story points van de doorontwikkeling van Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) werden via de scrum methodiek eind december 2021 opgeleverd. Dit beschouwen wij als de oplevering van de tweede mijlpaal (uitbreiding CGPA deel 2). Hiermee werd het deelproject 'Uitbreiding aan de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA)' volledig gerealiseerd.</p> <p>De belangrijkste functionaliteiten die werden opgeleverd in dit tweede deel zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het betalingsattest voor de burger werd inhoudelijk verder gestoffeerd en geautomatiseerd. • De nieuwe regels voor het toekennen van de schooltoeslag werden in CGPA ingebouwd zodat deze bij de toekenning van de schooltoeslag toegepast worden. • Een verdere automatisatie van de verwerking van de DMFA gegevens en vervangingsinkomens om de Groeipakketrechten nog meer automatisch toe te kunnen kennen. • Opzet van automatische controles van het inkomen in kader van de toegekende sociale en schooltoeslagen. Deze controles worden nu toegepast op de uitbetalingen van het eerste jaar Groeipakket op basis van het aanslagbiljet van aanslagjaar 2019. • De realisatie van de eigenlijke procesflow met bijhorende controles voor het doorgeven van bepaalde schulden aan Vlabel waardoor Vlabel deze schulden kan gaan innen. <p>Een gedetailleerd overzicht van deze CGPA ontwikkelingen werd op kwartaalbasis overgemaakt aan de raad van bestuur van het VUTG.</p> <p>DEELPROJECT ZOË 2.0: Uit de testen eind november is gebleken dat we de kwaliteit die we de gebruikers en gezinnen willen bieden nog niet volledig kunnen garanderen. Daarom werd beslist om de voorziene go-live van 13 december met enkele weken uit te stellen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Er is nog een akkoord van de Vlaamse Regering nodig voor de toekenning van de gevraagde relancemiddelen voor deel 2 (2022).

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Uitbreidingen aan de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) deel 1 : realisatie van 210 functionele story points binnen CGPA.	2021 Q2	Gerealiseerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Uitbreidingen aan de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) deel 2 : realisatie van de volgende 210 functionele story points binnen CGPA.		2021 Q4	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 1 – Opzetten van de nodige architectuur		2021 Q2	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 2 – Bestaande processen digitaal herdenken en scope release 1 bepalen		2021 Q2	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 3 – Realisatie Salesforce-applicatie ZOE 2.0 & bijhorende integraties met de Magda Documentendienst, het Burgerprofiel (eBox, Dosis, Notificaties en Attesten), de Magda-stromen & KRING (persoonsgegevens, aanvragen, beslissingen), Kariboe (artsgegevens Opgroeien), eHealth (medische formulieren)		2021 Q4	Vertraging	
ZOE 2.0 Mijlpaal 4 - Migratie van de bestaande dossiers naar het nieuwe platform		2021 Q4	Vertraging	
ZOE 2.0 Mijlpaal 5 - GO LIVE Release 1		2021 Q4	Vertraging	
ZOE 2.0 Mijlpaal 6 - Bepalen scope release 2 (optimalisaties en nieuwe beleidsinzichten) en agenderen op VR		2021 Q4	Op schema	
ZOE 2.0 Mijlpaal 7 - Release 2 uitwerken en implementeren		2022 Q3	Nog niet gestart	
ZOE 2.0 Mijlpaal 8 - GO LIVE Release 2		2022 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Eén verdere geoptimaliseerde Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA).	1	2021 Q4		100 %
Eén nieuwe applicatie voor de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoeften ZOE 2.0.	1	2022 Q4		50 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.749.000 EUR
Uitvoering VEK	5.309.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 7.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Ontwerpnota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Verder zetten digitalisering Groeipakket](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV119 - ONTWIKKELEN RECHTENVERKENNER 2.0 MET EEN MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOOL IN STERKE SAMENWERKING MET DE LOKALE BESTUREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Professionele zorg en hulpverleners (Wordt uitgewerkt in een samenwerkingsverband met ABB, Digitaal Vlaanderen, VVSG en Kenniscentrum Kernsteden)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De rechtenverkenner wordt gebruik door voornamelijk hulpverleners van OCMW, CAW, lokale besturen, ... om op basis van het profiel van een hulpvrager te bekijken voor welke rechten deze persoon in aanmerking komt. Dit kan gaan over allerlei levensdomeinen en evenzeer over rechten op het niveau het federale, regionale of lokale niveau. De rechtenverkenner is toe aan een grondige update tot rechtenverkenner 2.0. Zo verhoogt het gebruikerscomfort en kan het structurele gebruik toenemen. De nodige aanpassingen moeten leiden tot verbeterde resultaten in rechtentoekenning en eenvoudiger aanpassingen bij veranderende regelgeving. Zo zal de site ook meer gebruiksvriendelijk zijn voor de geïnteresseerde burger en niet enkel voor de hulpverleners</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	1.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Een unieke database met informatie over sociale rechten toegekend door de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Overheid en zo mogelijk aangevuld met federale sociale rechten - Organisatie van het decentraal beheer van de database en centrale kwaliteitsbewaking. - Venster op de database ter beschikking stellen voor burgers en professionele hulpverleners via een gebruiksvriendelijke toepassing te consulteren via website - Database wordt via open data ter beschikking gesteld voor hergebruik (Kenniscentrum Vlaamse Steden wil dit hergebruiken voor rechtentoekenning zit niet in scope van dit project)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Outcome	Interbestuurlijke samenwerking rond sociale rechten, werkinstrument voor zorgprofessionals, geactualiseerde basisinformatie over lokale en Vlaamse sociale rechten . Potentieel basisbestand voor eventuele rechtentoekenning.
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Dit project is opgestart en de nodige contacten zijn gelegd. De projectorganisatie vergt meer tijd omwille van beperkte personeelscapaciteit en veelheid aan prioriteiten.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Businesscase opstellen en laten goedkeuren	2020 Q4	Gerealiseerd
Projectinitiatie opstellen met de partners	2021 Q4	Gerealiseerd
Product discovery	2022 Q2	Op schema
Product fundament	2022 Q4	Nog niet gestart
Agile Product ontwikkeling opstarten	2023 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV120 - VERBETEREN VAN DE SOCIALE KAART

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle burgers die informatie zoeken over zorgaanbod of zorgverstrekkers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De sociale kaart is voor de hulp- en dienstverleners, zorgpersoneel, OCMW-medewerkers of de burger zelf een instrument om in de eigen buurt de nodige hulpverleners en instellingen te kunnen terugvinden. Het departement WVG nam dit enkele jaren geleden over van de provincies toen hun welzijnsopdracht werd overgeheveld. De sociale kaart bevat veel gegevens en wordt voortdurend bijgewerkt. Toch blijkt de toepassing vatbaar voor verbetering door onder meer de koppeling te maken met bijkomende authentieke datasets die zo automatisch actuele gegevens op de kaart te zetten. Sterke verbeteringen zijn ook nodig aan de zoekfunctie om tot de juiste resultaten te komen en de gebruiksvriendelijkheid kan verbeterd worden. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden voor de toevoeging van nieuwe informatie. De verbeteringen zijn reeds opgestart met gewone middelen</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	500.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - In de eerste fase: <ul style="list-style-type: none"> o In de achterliggende database worden de gegevens over de zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers overgenomen uit andere authentieke bronnen van Vlaamse en federale diensten o De achterliggende databank wordt als open data ter beschikking gesteld. o Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers kunnen hun gegevens van de overheidsdiensten zelf verrijken met eigen gegevens. (adressen, openingsuren, telefoon, email,...) o Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers worden gesensibiliseerd om hun gegevens aan te vullen. De overheidsdiensten zullen deze gegevens ook hergebruiken. o Het doelpubliek wordt geïnformeerd over de nieuwe sociale kaart

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	- In de tweede fase, (na onderzoek en overleg) : o Uitbreiding van de gegevens die relevant kunnen zijn voor de burgers: waar kunnen burgers met hun klacht terecht, inspectieverslagen, kwaliteitsindicatoren,...
Outcome	Betere informatie voor zorgpersoneel en zorggebruikers. Hergebruik van overheidsinformatie van het beleidsdomein WVG en de federale overheid
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	De externe firma die de ontwikkeling van de vernieuwde database doet heeft ernstige vertraging opgelopen. Daar waar de toepassing initieel voorzien was voor 2021 Q2, zal deze pas in Q2 van 2022 klaar zijn. Hierdoor verschuift de hele planning en ook van fase 2, het uitbreidingsproject met relancemiddelen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.1 Verbeteren van de toepassing	2020 Q4	Gerealiseerd
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.2 Afwerken en in productie nemen van de nieuwe toepassing	2022 Q2	Vertraging
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.3 Toevoegen en actualiseren van gegevens van de gezondheidszorgverstrekkers in de databank.	2022 Q2	Vertraging
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.4 Opmaken en uitvoeren van een communicatiestrategie en -campagne in functie van de nieuwe sociale kaart. Eerste fase:: 1.1	2022 Q3	Vertraging
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.1 Onderzoeken welke bijkomende informatie via de sociale kaart kan ontsloten worden	2022 Q2	Op schema
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.2 Concept valideren, overleggen met sectoren en laten bekrachtigen door Vlaamse Regering	2022 Q1	Op schema

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.3 Implementatie van de tweede fase	2023 Q2	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

22. Investeren in personen met een handicap

VV121 - VOORUITSCHUIF UITBREIDINGSBELEID - FASE 1

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	personen met een handicap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	22. Investeren in personen met een handicap
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Fase 1 van de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid bij personen met een handicap: de in de periode 2020-2024 voorziene extra middelen voor de toekenning van bijkomende budgetten aan personen met een handicap wordt versneld vanaf 2021.</p> <p>Reguliere middelen: 4.500.0000 EUR</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	55.000.000 EUR
Output	2.700 meerderjarige personen met een handicap in prioriteitengroep 1 zullen op korte termijn een persoonsvolgend budget ontvangen waarmee ze hun zorgbehoefte kunnen invullen. Op 1 december kregen reeds 2.250 personen een persoonsvolgend budget. (zie ook VV180).
Outcome	Personen met handicap met een ondersteuningsvraag in prioriteitengroep 1, zullen op korte termijn effectief een persoonsvolgend budget ontvangen, waarmee ze zorg en ondersteuning kunnen inkopen. (zie ook VV180)
Beoogde impact	Aantal personen met een Handicap die ondersteuning geniet

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De eerste fase van de versnelling van de terbeschikkingstellingen is in volle uitvoering. Aan 2.250 meerderjarige personen uit prioriteitengroep 1 werd in 2021 reeds een PVB ter beschikking gesteld.
Noodzakelijke politieke actie	Voor bepaalde doelgroepen is nog een beslissing van de Vlaamse regering vereist, omtrent de wijze van terbeschikkingstelling en de voorwaarden waaronder dat zal gebeuren. Dit is het geval voor de Rechtstreeks Toegankelijke hulp, de minderjarigen en de meerderjarigen in prioriteitengroep 2.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALLEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Toekennen van bijkomende budgetten voor personen met een handicap	2021 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
2.700 erkende personen met een handicap in prioriteitengroep 1 zullen op korte termijn een persoonsvolgend budget ontvangen	2.700	2021 Q4	2.250	84 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 55.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Uitrol uitbreidingsbeleid 2021 met het oog op perspectief bieden aan de personen met een handicap met ondersteuningsnoden

23. Sportinfrastructuur

VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Sport Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Sport Vlaanderen
Belanghebbenden	De sporter, sportfederaties, sportclubs, de lokale besturen alsook private investeerders in sportinfrastructuur

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	23. Sportinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Om investeringen in sportinfrastructuur te faciliteren en te versnellen heeft Sport Vlaanderen "Sportsput" in het leven geroepen. Er bestaat de mogelijkheid om via het decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur jaarlijks op een vast tijdstip (31/03/20xx) een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen voor de bouw en/of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur. In het decreet wordt een minimaal budget van 5.000 keuro verankerd dat wordt gebruikt om sportinfrastructuur te cofinancieren tot 30% en een maximaalbedrag van 1.250k euro.</p> <p>Vanaf 2021 kan Sport Vlaanderen twee projectoproepen organiseren. Subsidieaanvragen kunnen dan uiterlijk 31/03/20xx en 30/09/20xx worden ingediend. Bovendien worden er deze legislatuur extra budgetten bovenop het decretaal minimum vrijgemaakt om te investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. Gezien de grote behoefte en de vraag om een inhaalbeweging inzake sportinfrastructuur te versnellen alsook de positieve effecten van sport en bewegen in tijden van een pandemie wordt de eerste grote impuls in 2021 reeds voorzien.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	55.000.000 EUR
Output	Via deze subsidiepiste worden bestaande bovenlokale sportinfrastructuren verbeterd en wordt nieuwe bovenlokale sportinfrastructuur gerealiseerd. Er wordt een subsidie toegezegd van 22,8 miljoen euro (oproep 2021-mrt) en 15,4 miljoen euro (oproep 2021-sep) voor de realisatie van 73 bouwprojecten. In totaal

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	werden in 2021 93 dossiers ingediend. In 2022 wordt eenzelfde ambitie nagestreefd.
Outcome	Een substantiële investering wordt gecreëerd voor de sportinfrastructuur in Vlaanderen
Beoogde impact	Sportparticipatie - Aantal nieuwe of gerenoveerde sportinfrastructuren

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Oproep 2 2021 bovenlokale sportinfrastructuur
Noodzakelijke politieke actie	Beslissing minister over de projecten van oproep 2 2021 bovenlokale sportinfrastructuur

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Decretale regeling organiseren twee projectoproepen per jaar.	2021 Q1	Gerealiseerd		
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2021	2021 Q3	Gerealiseerd		
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2021	2021 Q4	Gerealiseerd		
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2022	2022 Q3	Op schema		
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2022	2022 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal ingediende dossiers 2021 voor bovenlokale sportinfrastructuren	90	2021 Q4	93	100 %
Het aantal ingediende dossiers 2022 voor bovenlokale sportinfrastructuren	90	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Uitvoering VAK	22.781.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK	212.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 55.000.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR 26/2/2021](#)

[BVR 26/2/2021 - nota](#)

[BVR 26/2/2021 - advies Sportraad](#)

[BVR 26/2/2021 - advies RVS](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Versterken van oproepen bovenlokale sportinfrastructuur](#)

[Belgisch Staatsblad. Bijlage](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

24. Uitbouwen circulaire economie

VV123 - CIRCULAIR BOUWEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>We willen via innovatie nieuwe Circulaire bouwtechnieken en recyclage tot stand brengen. Tegelijk moet dit aanleiding geven tot nieuwe circulaire businessmodellen in de sector van bouwmaterialen en gebouwen. Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten zoals COOCK-projecten (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding), de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs.</p> <p>De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.</p> <p>Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe business-modellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	10.000.000 EUR
Output	projectoproepen gelanceerd
Outcome	Steun toegekend aan 100 projecten voltooid over circulair bouwen, voor kennisverspreiding over circulaire maakindustrie, voor de inkoop van (externe en interne) adviezen over circulaire productie, en voor de oprichting van collectieve living labs door particuliere ondernemingen, en ten minste 500 ondernemingen (kmo's) en organisaties die als rechtstreekse begunstigde of als deelnemer van collectieve

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	projecten subsidies hebben ontvangen voor beide thema's circulair bouwen en circulaire maakindustrie samen (zie ook VV124)
Beoogde impact	O&O-bestedingen door bedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	loopt zoals gepland
Noodzakelijke politieke actie	nvt

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
KMO groeisubsidie eerste oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Op schema	
KMO groeisubsidie eerste oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Gerealiseerd	
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	2022 Q2	Op schema	
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	2022 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.255.000 EUR
Uitvoering VEK	347.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 10.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Steunmaatregelen ten behoeve van Circulair Bouwen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Om de omslag te kunnen maken naar een circulaire maakindustrie moet worden ingezet op alle circulaire strategieën van design over hergebruik en delen, herstellen, hermaken tot recycleren. In het algemeen moeten nieuwe circulaire business concepten gepromoot worden in de maakindustrie.

In het kader van de werkagenda ‘circulaire maakindustrie’ van het transversale programma ‘Vlaanderen Circulair’ onderzoeken we in de tweede helft van 2021 welke waardeketens in Vlaanderen het meest potentieel hebben om de opschaling van de circulaire economie te realiseren. Die waardeketens zijn breed en divers samengesteld en via het relancebeleid willen we extra inzetten op het behoud en het stimuleren van een nieuwe circulaire maakindustrie.

Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten, in het bijzonder COOCK-projecten, de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs..

De concrete keuze over welke instrumenten wanneer voor welke waardeketen zullen worden ingezet zal worden gemaakt in overleg met de betrokken stakeholders, die samenkomen in de aansturing van de werkagenda's.

De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.

Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe business-modellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	15.000.000 EUR
Output	projectoproepen gelanceerd
Outcome	Steun toegekend aan 100 projecten voltooid over circulair bouwen, voor kennisverspreiding over circulaire maakindustrie, voor de inkoop van (externe en interne) adviezen over circulaire productie, en voor de oprichting van collectieve living labs door particuliere ondernemingen, en ten minste 500 ondernemingen (kmo's) en organisaties die als rechtstreekse begunstigde of als deelnemer van collectieve projecten subsidies hebben ontvangen voor beide thema's circulair bouwen en circulaire maakindustrie samen (zie ook VV123)
Beoogde impact	O&O-bestedingen door bedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	loopt zoals gepland
Noodzakelijke politieke actie	nvt

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
KMO groeisubsidie voor circulair bouwen en circulaire maakindustrie - eerste oproep gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire mlaakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Op schema
KMO groeisubsidie circulair bouwen en circulaire maakindustrie beslissingen eerste oproep	2022 Q2	Op schema
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	2022 Q2	Op schema
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	2022 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	1.598.000 EUR
Uitvoering VEK	46.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 15.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Steunmaatregelen ten behoeve van Circulaire Maakindustrie

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Denuo, sectororganisatie (bv. essenscia, Centexbel, Agoria, ...)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Algemeen beogen we recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen bv. investeringen in nieuwe voorbehandelingstechnieken, recyclage-installaties of uitbreiding van bestaande installaties; of aanpassingen van productieprocessen om gerecycleerde materialen te kunnen verwerken. We beogen hierbij een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning bv. milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten.</p> <p>Een marktverkenning werd uitgevoerd waarin we in eerste instantie als scope hanteerden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asbest: De sectorprotocollen, de gesubsidieerde asbestafbouwprojecten bij lokale besturen en de nieuwe asbestpremie voor isolatie en asbestverwijdering zorgen voor een sterk stijgend volume aan te storten asbestafval. De extra relance-middelen gaan de komende jaren deze dynamiek nog versterken. Om de druk op de beperkte stortcapaciteit te verlagen, is de nood aan andere verwerkingstechnologie hoog. - matrassen: De nieuwe aanvaardingsplicht vanaf 1 januari 2020 creëert een aanbod aan selectief ingezamelde afvalstoffen waarvoor nieuwe verwerkingstechnieken mogelijk zijn. - luiers: Het opzetten van een nieuwe selectieve inzameling voor babyluiers en incontinentiemateriaal, evenals een normenkader voor de gerecycleerde materialen, wordt momenteel onderzocht - textiel: De voorbije crisis heeft duidelijk gemaakt dat onze economie kwetsbaar is voor deze stroom door het ontbreken van een aantal schakels in de verwerkingsketen in Vlaanderen/Europa. - kunststoffen (bv. verpakkingen): Enerzijds zetten we beleidsmatig sterk in op de afvalstroom verpakkingen waarbij we een betere sortering en recyclage verwachten, anderzijds stellen we vast dat het de inzet van kunststofrecyclaten sterk onder druk staat (o.a. gelinkt aan de olieprijs). <p>Deze lijst is echter te beschouwen als niet-limitatief. Elk initiatief dat Vlaanderen op weg zet om</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

een toonaangevende recyclagehub binnen Europa te worden, komt potentieel in aanmerking voor ondersteuning. We streven daarbij naar een instrument dat het materialenbeleid en circulaire economie ondersteunt, en complementair is tov bestaande ondersteuningsinstrumenten.

In theorie komen meerdere instrumenten in aanmerking om Vlaamse bedrijven te ondersteunen: subsidies, participaties, leningen, Op basis van de beschikbare juridische en financiële informatie is de voorkeurspiste om een investeringssubsidie uit te werken gezien dit de mogelijkheid om meer projecten te ondersteunen dan bij keuze voor participatie. Indien echter uit de marktverkenning zou blijken dat er ook potentieel is voor een mogelijke participatie, kunnen deze relancemiddelen ook zo worden ingezet of kan worden samengewerkt met PMV, om de beschikbare CE-middelen daar te activeren.

Met het recyclinghub-project willen wij ten minste zes grote investeringen in nieuwe recyclingfaciliteiten stimuleren die lokale recycling en gesloten kringlopen mogelijk maken. Hiervoor worden 2 calls georganiseerd.

De financiering van dit project verloopt in hoofdzaak via de extra toegekende relancemiddelen. De verkennende studie van Möbius (2020) werd gefinancierd vanuit de reguliere middelen. Na afronden van de 2e call wordt een evaluatie-opdracht voorzien vanuit de reguliere middelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	30.000.000 EUR
Output	Aantal toegekende subsidies aan nieuwe recyclage-installaties of recyclage-eenheden: minstens 6 tegen medio 2026
Outcome	Een stijging van de hoeveelheid afval die selectief wordt ingezameld en gerecycleerd. Daling van de hoeveelheid afval die naar verbranding gaat. Alternatief voor het storten van asbestafval beschikbaar.
Beoogde impact	Aandeel materiaalrecuperatie huishoudelijk afval - Aandeel materiaalrecuperatie bedrijfsafval

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het BVR werd goedgekeurd op de VR van 3 september. Het MB werd ondertekend door de minister van Omgeving op 20 oktober. Op 25 oktober werd de eerste call gelanceerd voor een totaal subsidiebedrag van 15 mio euro. De steun richt zich op alle ondernemingen die substantiële investeringen (minstens 500 000 euro) willen doen in recyclagetechnieken die de stand der techniek overtreffen. De toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de innovatieve technologie ten opzichte van een conventionele recyclagetechnologie, met een maximum steunbedrag van 3

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>miljoen euro. Alle informatie is te vinden op de website van de OVAM (https://ovam.be/subsidies-recyclagehub)</p> <p>De eerste call liep tot 10 december. Er zijn 18 projectvoorstellen ingediend. De beoordeling door een multidisciplinaire jury is voorzien voor medio januari 2022. Daarna volgt het administratieve goedkeuringstraject.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALLEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Beoordelingskader (uitbesteed aan Möbius)	2021 Q1	Gerealiseerd		
Marktverkenning (uitbesteed aan Möbius)	2021 Q1	Gerealiseerd		
Implementatie van het beoordelingskader	2021 Q2	Gerealiseerd		
Lanceren 1e call	2021 Q4	Gerealiseerd		
Eerste call afgerond	2022 Q1	Op schema		
Lanceren 2e call	2022 Q2	Nog niet gestart		
MP RRF: Minstens 6 recyclage-installaties zijn gerealiseerd	2026 Q2	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde recyclage-installaties of eenheden	6	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 30.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3/09/2021. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaal kringlopen te sluiten](#)

[Briefadvies Mineraad. BVR ondernemingssteun recyclagehub. Bijlage](#)

[Advies SERV. BVR Recyclagehub. Bijlage](#)

[Advies Raad van State. BVR Recyclagehub. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

25. Investerings groene warmte

VV126 - CALL GROENE WARMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Investeerders in grootschalige installaties voor de productie van groene warmte, benutting van restwarmte en warmtenetten.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	25. Investerings groene warmte
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Verhogen van het budget investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie. De investeringssteun wordt toegekend via de calls groene warmte, restwarmte en warmtenetten. In 2021 en 2022 worden telkens 2 calls per jaar opengesteld voor projectaanvragen. Meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen gaat naar de productie van warmte. Er wordt nog steeds massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Grootschalige restwarmtebenuttingsprojecten recupereert warmte die anders verloren zou gaan, groene-warmte-projecten verhoogt het aandeel warmteproductie uit hernieuwbare energiebronnen.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	50.000.000 EUR
Output	Minstens 100% aangevraagd budget ten opzichte van het opengestelde budget
Outcome	710 kton vermeden CO ₂ -emissies en ca. 3500 GWh warmteproductie in de eerste 10 jaar, waarvan de helft groene warmte.
Beoogde impact	Broeikasgasemissies - Aandeel hernieuwbare energie in totaal energiegebruik

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De eerste projectoproep werd ondertussen gegund. De gunning voor de tweede oproep is lopende. De derde oproep zal gelanceerd worden Q1-2022. De callregeling werd bij beslissing van de VR van 2 juli 2021 aangepast en geoptimaliseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
MB eerste call gepubliceerd	2021 Q1	Gerealiseerd
Gunning eerste call	2021 Q2	Gerealiseerd
Aanpassingen Energiebesluit optimalisering callregeling	2021 Q3	Gerealiseerd
MB tweede call gepubliceerd	2021 Q4	Gerealiseerd
Gunning tweede call	2022 Q1	Op schema
MB derde call gepubliceerd	2022 Q1	Op schema
Gunning derde call	2022 Q2	Nog niet gestart
MB vierde call gepubliceerd	2022 Q4	Nog niet gestart
Gunning vierde call	2023 Q1	Nog niet gestart
Gunning van opdrachten in het kader van de aanbesteding voor projecten van hernieuwbare energie of afvalwarmte in het kader van de maatregel "Call groene warmte".	2023 Q1	Op schema
Voltooiing van de projecten die gegund zijn in het kader van de call groene warmte, met 39 870 000 EUR (of 90% van de RRF-steun) uitgevoerd	2026 Q2	Op schema

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Budget uitbetaald voor in 2021 en 2022 ingediende en gegunde projecten voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten	5.700.000 euro (REACT-EU)	2023 Q1	580.898	10,19 %
Budget uitbetaald voor in 2021 en 2022 ingediende en gegunde projecten voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten	44.300.000 euro (RRF)	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	11.445.000 EUR
Uitvoering VEK	13.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 44.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Energiebesluit van 19 november 2010 Titel VII Hoofdstuk IV en V</p> <p>Bisnota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Call groene warmte</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Call groene warmte</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan</p> <p>Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan. Bijlage</p>

26. Digibanken

VV127 - DIGIBANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	We kiezen er voor om digibanken tot stand te laten komen als een samenwerking tussen diverse (lokale) partners, zoals overheden, bedrijven, kennisinstellingen, opleidingspartners, sociale economie en het middenveld. Binnen de lokale partnerschappen zal betrokkenheid van sociale economie-ondernemingen en lokale VDAB-actoren sterk gestimuleerd worden, net zoals de samenwerking met reguliere of lokale ondernemingen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	26. Digibanken
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Volgens de 'Barometer Digitale Inclusie' van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een kwetsbare positie (onder meer kortgeschoolden, mensen in armoede en laaggeletterden) in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze kloof is (cumulatief) aanwezig op meerdere facetten.</p> <p>Met de oprichting van 'digibanken' wil de Vlaamse Overheid het risico op digitale uitsluiting verkleinen via drie inhoudelijke doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (vb. uitleendienst). • Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal). • Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, enz.) via zogenaamde fysieke knooppunten. <p>De doelgroep als eindgebruiker van de digibanken omvat volwassen personen (+18 jaar) in Vlaanderen met een (risico op) digitale achterstand.</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

Binnen Vlaanderen is een scala aan ondernemingen en organisaties reeds actief op één van bovenstaande doelstellingen en activiteiten. Samenwerking tussen deze partners is momenteel eerder onbestaande of louter ad hoc, en afhankelijk van menselijk en financieel kapitaal. De uitdagingen rond de digitale kloof variëren daarnaast ook regionaal en lokaal.

Het is de ambitie om via dit project deze diverse spelers in lokale samenwerkingsverbanden als 'digibanken' te verenigen en te stroomlijnen in een ketenstructuur met een gezamenlijke doelgerichte strategie en dienstverlening. De digibanken-partnerschappen worden zichtbaar in een laagdrempelige fysieke toegangspoort voor de publieksgroepen naar verschillende (digitale) diensten.

De structuur en samenstelling van elk 'digibank'-project kan lokaal of regionaal verschillen, met voldoende aandacht voor de lokale autonomie en diversiteit, en wordt 'bottom-up' bepaald binnen de kwaliteitsvereisten voorzien in de oproepen. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden liggen binnen de opgezette partnerschappen.

De lokale digibank-projecten zullen worden toegewezen via open subsidie-oproepen verspreid over meerdere parallele indieningsrondes in 2021 en 2022.

De oproep 'Digibanken – Voortraject' voorziet de mogelijkheid aan (kandidaat-)partnerschappen om a) de strategie voor de implementatie van het lokale digibank-project en de gedeelde dienstverlening en b) het partnerschap verder concreet vorm te geven. Binnen de strategie is aandacht voor de doelgroep, outreachstrategie, samenwerking met sociale economie, circulariteit, duurzaamheid en opschaalbaarheid van het model, connectiviteit en impactmeting.

De oproep 'Digibanken – Implementatietraject' wil de effectieve uitvoering van lokale digibank-projecten vanuit het geformaliseerde partnerschap en de samenwerkingsstrategie ondersteunen. Tijdens deze uitvoering werken de partnerschappen aan de drie bovenstaande doelstellingen.

We beogen hierbij partnerschappen met een voldoende schaalgrootte en/of bereik te ondersteunen. We beogen eveneens een duurzame impact: de ontwikkeling van leefbare en innovatieve modellen, met voldoende maturiteit, economische rendabiliteit en opschaalbaarheid die na de ondersteuningsperiode operationeel kunnen blijven.

Bovenstaande doelstellingen omvatten ook activiteiten die een breder circulair en sociaal doel kunnen verwezenlijken. Bijvoorbeeld, herstel en recyclage van (ICT-)materiaal, of circulaire aankopen. Via de digibank-projecten willen we bijdragen tot een circulaire economie via vernieuwende antwoorden.

De projecten zullen vrijblijvend beroep kunnen doen op ondersteuning voor de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst- en strategie, om de kwaliteit van samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden te garanderen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	50.000.000 EUR
-------	----------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Output	<p>100 gemeenten in Vlaanderen maken deel uit van het werkingsgebied van de digibank-partnerschappen, om</p> <p>1) gelijke toegang tot digitale technologie te garanderen via de voorwaardelijke terbeschikkingstelling van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (zoals een uitleendienst);</p> <p>2) de digitale vaardigheden te versterken, zowel persoonlijke als technische vaardigheden (zoals herstelling van IT-uitrusting) via opleiding en kennisdeling;</p> <p>3) digitale toegang te verschaffen tot essentiële diensten (zoals de digitale diensten van de Vlaamse overheid, Tax-on-Web) via zogenoemde fysieke knooppunten. (RRF)</p>
Outcome	Bereikte volwassen personen door de digibank-partnerschappen
Beoogde impact	Aandeel bevolking dat over digitale basisvaardigheden beschikt

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Een eerste ronde oproepen werd gelanceerd op 4 oktober 2021. Projectaanvragen konden ingediend worden tot 15 november 2021. De formele en inhoudelijke beoordeling van de projectvoorstellen is nog lopende. Er werden in deze eerste ronde 29 aanvragen tot de voortrajecten (voor samenstelling en uitwerking van het lokale partnerschap) en 6 aanvragen tot implementatietrajecten (effectieve uitvoering lokale digibank) ingediend. De beslissing wordt verwacht midden januari 2022, met een opstart van de goedgekeurde projecten in 2022.</p> <p>Het BVR tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken werd ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering op 17 december 2021. Vervolgens zal er in januari 2022 een tweede periodieke oproep plaatsvinden om nieuwe projectvoorstellen in te dienen voor een voor- of implementatietraject voor de realisatie van lokale digibanken.</p> <p>De flankerende acties zijn eveneens lopende. Enerzijds is een communicatie-opdracht in uitvoering om communicatietools voor de projecten en een overkoepelende website te ontwikkelen. Anderzijds zal de opdracht voor de procesbegeleiding en lerende netwerken gegund worden in januari 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Kadernota VR		2021 Q2	Gerealiseerd	
Oproepen 'Digibanken - Voortraject' en 'Digibanken - Implementatietraject'		2021 Q4	Op schema	
Ondertekening van partnerschappen voor de promotie van digitale inclusie (RRF)		2022 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal gemeenten in Vlaanderen dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de digibank-partnerschappen (RRF)	100	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	86.000 EUR
Uitvoering VEK	60.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 50.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 2/04/2021 Digibanken - nota
VR 2/04/2021 Digibanken - bijlage
VR 2021 2506 VV DOC.0087/2BIS - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken – principiële goedkeuring
VR 2021 2506 VV DOC.0087/1TER - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken - nota

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2021 1009 VV DOC.0138/1 – Nota aan de Vlaamse Regering - Digibanken: Oproepen 'Voortraject' en 'Implementatietraject' - 2021](#)

[VR 2021 1712 VV \(agendapunt 10\) – Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken. Goedkeuring na adviezen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

[VV050 - Digitalisering integratie & inburgering](#)

[VV051 - Gemeente zonder gemeentehuis](#)

[VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies](#)

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

[VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet](#)

[VV056 - Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022](#)

[VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie](#)

[VV058 - AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening \(inclusief bijdrage subsidieregister\)](#)

[VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel](#)

[VV063 - Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck](#)

[VV065 - HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM \(Security Information & Event Management\)](#)

[VV076 - Zelf beheerde identiteit](#)

27. Digitale vaardigheden

VV128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Sociale partners, VESOC, (RvB) VDAB, expertisecentrum Innovatieve leerwegen, Departement Onderwijs, opleidingspartners, werkgevers, sectorfondsen, VLABEL, RSZ, FOD FIN, KSZ, AIV

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	27. Digitale vaardigheden
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>We grijpen de mogelijkheden van de huidige crisisperiode aan om de digitale revolutie waar te maken. We bouwen Vlaanderen uit tot een toonaangevende data-economie en -maatschappij en benutten de mogelijkheden die digitalisering aanreikt om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.</p> <p>Door binnen dit akkoord in te zetten op de ontwikkeling van digitale talenten verzekeren we het succes van deze noodzakelijke digitale transformatie. Vlaanderen treedt hier naar voor als pionier en zal in dit kader onder meer een gepersonaliseerd loopbaanplatform en leer- en loopbaanrekening lanceren om mensen te helpen werk te vinden, (online) opleiding te volgen, zich te herscholen en de werkzaamheidsgraad verder te verhogen. Ook ondernemingen en hun werknemers ondersteunen we in de digitale transformatie.</p> <p>Tegelijkertijd hebben we aandacht voor de digitale kloof. We versterken de digitale vaardigheden van alle Vlamingen en ondersteunen initiatieven om kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf.</p> <p>De Vlaamse overheid speelt hier een voorbeeldrol, zowel in de digitalisering van de eigen dienstverlening als wat digitale toegankelijkheid en de ontsluiting en benutting van data betreft.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	54.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Overeenkomst tussen de sociale partners en de Vlaamse regering over een visienota waarin wordt voorgesteld hoe de leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen zal worden ingevoerd, rekening houdend met de behoefte aan meer transparantie voor burgers, betere inclusie van kwetsbare groepen en in overeenstemming met het digitale leerrekeningsplatform dat op federaal november (sic) wordt opgezet. (RRF) • 70 e-learningprojecten worden goedgekeurd, gelanceerd en voltooid op basis van een oproep tot het indienen van projecten. (RRF) • Volgende digitale tools en diensten voor burgers, werkgevers en VDAB-partners in Vlaamse Gemeenschap zullen worden ontplooid: <ul style="list-style-type: none"> o Een gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform, gekoppeld aan een gepersonaliseerd aanbod van opleidingskansen en incentives voor burgers is toegankelijk en operationeel. o Het digitaal werkgeversloket van de VDAB en digitaal partnerplatform is operationeel, waardoor VDAB-bemiddelaars alle werkgevers met vacatures in gedeeld beheer actief kunnen contacteren en hen digitaal kunnen ondersteunen bij het opvullen van de vacatures. De follow-up van alle VDAB-partners wordt ook verricht via het digitaal partnerplatform. o De digitale diensten voor werkgevers zijn uitgebreid door middel van een digitaal werkgeversloket van het departement Werk en Sociale Economie, dat openstaat voor alle werkgevers. o Het data-ecosysteem voor partners van het departement Werk en Sociale Economie is operationeel gemaakt: 15 relevante gegevensbanken zijn ter beschikking gesteld op het opendataplatform voor onderzoek en andere doeleinden.
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)
Beoogde impact	Aandeel bevolking dat over digitale basisvaardigheden beschikt

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> • Rond het actieplan e-leren: <ul style="list-style-type: none"> o zijn de dienstverleners voor de bouw van de website en voor de content aangesteld voor het centraal informatiepunt. De website wordt eind januari/begin februari 2022 gelanceerd. VDAB zet hiervoor ook een informatie- en communicatiecampagne op. In september werden er 3 webinars gelanceerd: 1) aan de slag met e-leren, 2) leren als zuurstof voor de wendbare organisatie en 3) aan de slag met hybride leren. o Er werden 83 projecten ingediend. Na het oordeel van de jury werden 65 projecten ikv. de oproep e-leren op 15/10/2021 opgestart. Deze lopen voorlopig tot 30/9/'22. Met deze oproep willen we opleidingsverstrekkers met een bestaande of toekomstige opleiding in de opleidingsdatabank (databank voor Vlaamse opleidingsincentives) ondersteunen op vlak van e-leren. Binnen deze

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

oproep wordt verplicht gewerkt aan het aanpassen van een bestaande opleiding naar een e-opleiding, het aanpassen van een bestaande e-opleiding of het ontwikkelen van een nieuwe e-opleiding. Naast het onderzoeken van technologische mogelijkheden heeft de promotor daarbij oog voor de ontwikkeling van de noodzakelijke didactiek en dient de promotor eveneens verplicht een adequate begeleiding van de lerenden uit te werken naar, tijdens en na het online traject (nazorg), met extra aandacht voor lerenden met specifieke ondersteuningsnoden. Aansluitend wordt ook een begeleiding van de docenten uitgewerkt. Tenslotte kan men optioneel inzetten op bewustmaking en bekendmaking van het online aanbod bij mogelijke cursisten en werkgevers. Het is de bestekken van de overheidsopdrachten begeleiding voor lerenden met een digitale achterstand bezorgd aan kandidaat-inschrijvers. Deadline voor het indienen van de offerte was 23/12/2021. De uitrol van de overheidsopdrachten start begin 2022 en omvat het volgende:

- In de overheidsopdracht 'Onderzoek E-leren in Vlaamse ondernemingen' werkt de opdrachtnemer op basis van outcome mapping een visie en strategie uit op vlak van blended leren, met focus op inclusiviteit, specifiek naar lerenden met een digitale achterstand binnen de werkende populatie in Vlaanderen. De uitvoering van de opdracht Onderzoek E-leren in Vlaamse ondernemingen heeft een looptijd van 6 maanden.
- De opdracht 'Lerend netwerk' voorziet in een faciliterend ondersteuningsaanbod voor de promotoren/opleidingsverstrekkers uit de oproep E-leren, in de vorm van één overkoepelend en actief Lerend Netwerk dat zal focussen op enerzijds ervaring- en kennisdeling stimuleren tussen de opleidingsverstrekkers binnen de oproep en erbuiten en anderzijds inzichten delen naar het infopunt van de VDAB in een nauwe samenwerking met de beheerders van het infopunt van VDAB.
- De opdracht 'Coaching en advies inzake instructional design/usability design/user design' richt zich op experts inzake instructional design/usability design/user experience die als coach de promotoren binnen de oproep E-leren professioneel advies en ondersteuning zullen bieden en hen zullen versterken op vlak van gebruiksvriendelijkheid zodat e-leren voor iedereen maximaal toegankelijk wordt.
- Een eerste versie van het gepersonaliseerd loopbaanplatform (VDAB) is toegankelijk voor publiek sinds 17/09.

Voor de nota VR digitaliseringsprojecten VDAB en DWSE zijn volgende zaken te melden:

- Om te voorzien in een vernieuwd digitaal werkgeversloket, wordt in eerste instantie gewerkt aan het verbeteren van het werkgeversplatform 'Mijn VDAB' met een versnelde toegang en een nieuwe landingspagina. In 2021 liep de vernieuwde 'Vind een Werknemer', de self service tool voor de werkgever om zelf gepaste kandidaten te zoeken reeds in testfase, in 2022 wordt deze uitgerold waardoor deze een verbeterde user experience en bijkomende selectiecriteria krijgt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- Digitale jobbeurzen: Eerder in 2021 liepen experimenten in de provincies met als doel digitale jobevents structureel uit te werken. De experimenten met het geselecteerde virtuele platform zijn intussen afgelopen na aanpassing aan de bijkomende vereisten van VDAB. Dit project wordt nu structureel ingebed in de dienstverlening van VDAB als volwaardig alternatief op fysieke jobevents. In de loop van 2022 zullen verschillende digitale jobevents plaatsvinden.
- Ook de digitalisering van het partnermanagement is een project dat over verschillende jaren (2021 - 2023) wordt uitgerold: Ten eerste is een belangrijke basis is gelegd met de sourcingstrategie van VDAB waarmee een beslissingskader wordt gecreëerd voor de samenwerking van VDAB met partners. Ten tweede zijn de kadercontracten tussen de Vlaamse overheid en de geselecteerde CRM-leverancier afgesloten. Hierin is wat vertraging opgelopen, waardoor de opstart voor configuratie van het platform vooruit zal schuiven. Ten derde werd het kader voor de business architectuur intussen uitgewerkt. Tot slot wordt momenteel gewerkt aan een roadmap voor de komende jaren.
- Voor de leer- en loopbaanrekening is een visienota/discussienota over de leer- en loopbaanrekening voor het kabinet voorzien tegen eind 2021, ter voorbereiding van visienota VR voor Q1 2022. Ook zijn reeds operationele stappen opgestart om bestaande opleidingsincentives beter te ontsluiten (zie hieronder):
Fase 1: Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives werd gelanceerd op 19 augustus.
Fase 2: Analyse voorbereiding gepersonaliseerd overzicht opleidingsincentives opgestart, voortraject bijna afgerond. Moet resulteren in voorstel van Mijn Burgerprofiel rond plan van aanpak, budgetinschatting etc. tegen eind 2021 (op basis waarvan samenwerkingsovereenkomst volgt).
- WSE digitaliseringsprojecten naar burgers: Verschillende digitaliseringsprojecten komen stilaan op koers:
 - Dienstencheque innovatie: gunning strategische consultancy-opdracht werd voltooid. Opdracht is lopende, in samenwerking met Ernst & Young.
 - Verdere digitalisering van aanmoedigingspremies is in uitvoering
 - Digitalisering incentives werkplekken dual moet nog opgestart worden
 - Digitalisering aanvraag jobbonus is in uitvoering.
- WSE digitaal werkgeversloket is in volle opbouw:
 - Productkeuze customer service management in uitvoering en gebruikersonderzoek ifv. behoeftenanalyse lopende.
 - Digitaal Vlaams ecosysteem wordt uitgewerkt
 - Digitale aanvraag voor collectief maatwerk en ondersteuningsdecreet werd reeds gerealiseerd
 - Lancering WSE-loket beroepskaarten (ikv digitaal nieuw beleid) voorzien jan '22 en dit gefaseerd.
 - Integratie werk met uniek loket single permit in gebruik genomen
- WSE digitaliseringsprojecten naar partners worden voorbereid:
 - Gebruikersonderzoek ifv. behoeftenanalyse lopende

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<ul style="list-style-type: none"> • Eerste implementatie digitaal cijferportaal ism steunpunt in uitvoering • Digitalisering duaal leren: operationalisering richting 2022 • Leveranciersplatform beroepskwalificerende trajecten: Ontwikkeling lopende. Wetgevende wijziging uitgevoerd en protocol in opmaak.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Digitale jobbeurzen (VDAB)	2022 Q4	Op schema
Gepersonaliseerde burgerwebsite voor de loopbaan (VDAB)	2022 Q4	Op schema
Actieplan e-leren voor opleidingspartners	2022 Q4	Op schema
Digitale dienstverlening WSE naar partners	2023 Q4	Op schema
Digitale dienstverlening WSE naar burgers	2023 Q4	Op schema
Digitale dienstverlening naar werkgevers	2023 Q4	Op schema
Digitalisering VDAB partnermanagement (VDAB)	2023 Q4	Op schema
Digitaal WG loket VDAB (VDAB)	2023 Q4	Op schema
Digitaal opleidingsplatform (VDAB)	2023 Q4	Op schema
Leer- en loopbaanrekening	2024 Q4	Op schema
Visienota over leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen (RRF)	2022 Q2	Op schema
Ontwikkeling van een elektronisch leeraanbod in Vlaanderen (RRF)	2022 Q4	Op schema
Digitale tools en diensten voor burgers, werknemers en partners van de Vlaamse Openbare Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), volledig ontplooid in Vlaanderen (RRF)	2023 Q4	Op schema

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL			TIMING	STATUS
Versnelling uitrol werkgeversbenadering			2022 Q4	Op schema
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal e-learningprojecten dat wordt goedgekeurd, gelanceerd en voltooid op basis van een oproep tot het indienen van projecten. (RRF)	70	2022 Q4	65	92,9 %
Aantal jaarlijks gemelde vacatures bij VDAB (periode augustus - juli)	Stijging tov. augustus 2020 - juli 2021 (297.928)	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	54.000.000 EUR
Uitvoering VAK	13.666.000 EUR
Uitvoering VEK	3.044.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 43.200.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Digitaliseringsprojecten VDAB en Departement WSE in kader van AHAD
Mededeling aan het stuurorgaan Vlaams informatie en ICT-beleid. Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 22 oktober 2021. Actieplan E-leren

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digiSprong\)](#)

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

[VV050 - Digitalisering integratie & inburgering](#)

[VV051 - Gemeente zonder gemeentehuis](#)

[VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies](#)

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

[VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet](#)

[VV056 - Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022](#)

[VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie](#)

[VV058 - AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening \(inclusief bijdrage subsidieregister\)](#)

[VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel](#)

[VV063 - Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck](#)

[VV065 - HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM \(Security Information & Event Management\)](#)

[VV076 - Zelf beheerde identiteit](#)

28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector

VV129 - CULTUUR - BETERE INFORMATIEDOORSTROMING EN KOPPELING DATABANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.</p> <p>Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoed-databanken.</p> <p>Het departement CJM maakt eveneens deel uit van dit ecosysteem en wil haar dienstverlening en data zo maximaal mogelijk afstemmen, inrichten en opbouwen dat ze de processen en digitale transformatie in de sectoren cultuur, jeugd en media mee aanjaagt. Het departement ontwikkelt haar datastrategie verder door, ook in lijn met de in 2021 opgemaakte datastrategie van de Vlaamse overheid. Digitalisering van dienstverlening en datastromen zijn hierin de rode draad. Het wil evolueren tot een situatie waarbij data gestandaardiseerd kunnen vloeien, waarbij het departement unieke databronnen kan aanspreken in functie van haar beleids- en evaluatienoden en deze voor bepaalde processen (subsidieprocessen, gegevensregistratie) ook zelf kan ontwikkelen, waarbij de sector tegelijk ontzorgt wordt en datamogelijkheden beter kan benutten.</p> <p>De uitwerking van bovenvermelde projecten brengen duidelijke knelpunten mee op vlak van de nodige fundamentele datapraktijken (datamanagement, datagovernance, datakwaliteit, ...). De</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

veelheid aan externe en interne projecten onderstreept de nood aan een duidelijk samenwerkingsverband tussen mensen die verantwoordelijkheid opnemen om de bruikbaarheid van data binnen het ecosysteem te garanderen en dit over teams en organisaties heen. Dit onderliggend project zet daarom in de periode 2022-2023 in op de verdere ontwikkeling van een duidelijk data strategisch raamwerk om zo de nodige organisatorische bouwstenen te voorzien voor de onderbouwing van de basismonitoring, de data governance en het doorstromen van data doorheen het ecosysteem om de datamogelijkheden optimaler te benutten.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	250.000 EUR
Output	<p>Dit project voorziet volgende output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niet alle ontwikkelingen binnen de digitale transformatie op vlak van data centric denken kunnen gelijktijdig doorgevoerd worden. De implementatie van de datastrategie en datagedreven dienstverlening wordt op volgorde gezet. Dit project voorziet dan ook in de opstart van een data strategie backlog die transparant en toegankelijk bestaande knelpunten documenteert en die duidelijke de gestelde prioriteiten communiceert. Dit houdt dus ook in dat er een referentiekader ontwikkeld moet worden op basis waarvan deze prioriteiten gesteld zullen worden. - Verantwoordelijkheden met betrekking tot data en producten die gebruik maken van data worden gekoppeld aan een aantal rollen, zoals data governance Lead, data steward of data owner, en werken samen met 1 doel: vragen, problemen, drempels die het ecosysteem tegenkomt op haar pad naar een data gedreven, digitale toekomst uit de weg ruimen. Waar nodig reactief, waar mogelijk proactief. - Niet iedereen zal onmiddellijk overtuigd zijn van de noodzaak én van de aanpak. Gezien de impact van de digitale transformatie is dit niet verwonderlijk en ook niet per se problematisch: de digitale transformatie brengt organisatorische cultuuruitdagingen mee binnen het ecosysteem. Om data-gedreven beleid succesvol te introduceren, is een zekere mate van change management dus cruciaal. Binnen dit project zal expliciet aandacht geschonken worden aan change management en concrete stappen op dit vlak mee opgenomen worden in de roadmap. Dit houdt in dat concrete acties worden vastgelegd die tot doel hebben mensen en organisaties van de nieuwe aanpak binnen het ecosysteem te overtuigen en ook richtlijnen omtrent hoe omgegaan zal worden met diegene die niet onmiddellijk mee aan boord zijn. - Als onderdeel van bovenvermeld change management zal ook concreet gewerkt worden aan een overkoepelend communicatieluik. Gebrek aan informatiedoorstroming met betrekking tot initiatieven die lopen of in het verleden liepen, is een grote risicofactor ten aanzien van het draagvlak van de digitale transformatie. Ook mensen die overtuigd zijn van het nut ervan, hebben nood aan een duidelijk overzicht van wat ze kunnen verwachten en waar zij zich bevinden binnen het ecosysteem.
Outcome	<p>De data waarover het ecosysteem beschikt, biedt meerwaarde voor het ecosysteem. Dit betekent dat de data waarover het departement beschikt of het departement vanuit haar positie de gereede partij is om ze capteren, maximaal ter beschikking en open krijgt voor het ecosysteem. Om de data-gedreven dienstverlening te realiseren en de rol binnen het ecosysteem te versterken, beschikt het departement over een robuuste, programmatorische aanpak voor haar datastrategie.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Efficiëntie Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	heroriëntatie van projectscope
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
opdrachtsomschrijving afgewerkt en bestek gepubliceerd	2022 Q2	Op schema
opdracht gegund	2022 Q3	Nog niet gestart
oplevering opdracht	2023 Q2	Nog niet gestart
implementatieplan in uitvoering	2023 Q4	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 250.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Digitale transformatie van de cultuursector. Koppeling databanken en betere informatiedoorstroming

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Business Case Doelgericht Digitaal Transformeren. Bijlage](#)

[Budget. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV130 - CULTUUR - DIGITALISERING VAN COLLECTIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt. Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken

Een kritische massa aan digitale content is een voorwaarde om het digitale culturele ecosysteem te optimaliseren. De achterstanden inzake gedigitaliseerde (en gemetadateerde) content zijn nog steeds aanzienlijk, zowel binnen cultureel-erfgoed als binnen kunsten, ondanks de huidige werking van meemoo en de mogelijkheden die door het Cultureel-erfgoeddecreet en ad hoc reglementen zoals de inhaalbeweging digitale collectieregistratie worden geboden. Dit project beoogt om via coördinatie en schaalvoordelen een belangrijke stap vooruit te zetten inzake de digitalisering, metadatering en duurzame beschikbaarheidsstelling van culturele collecties en wil komen tot een situatie waarbij er een duidelijke stand van zaken is, en een stappenplan voor verdere evoluties.

Na afloop van dit project zullen de grootste achterstanden weggewerkt zijn en is het gecreëerde materiaal open -conform de OSLO uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed - toegankelijk zodat dit verder maatschappelijk gevaloriseerd kan worden.

Het project valt uiteen in volgende deelprojecten:

1. Gecoördineerde digitaliseringsactie door een door meemoo gecoördineerd consortium dat de

PROJECTOMSCHRIJVING

organisatorische en technische expertise heeft om dit digitaliseringsproject op een gecoördineerde manier uit te voeren teneinde schaalvoordelen te realiseren.

2. Een versterking van het reglement inhaalbeweging op het vlak van digitale collectieregistratie. Meemoo voorziet begeleiding tijdens de voorbereidingsfase én tijdens de uitvoering van de projecten. Met dit subsidiereglement worden naast sterker gecoördineerde acties (deelproject 1) ook kansen geboden aan kleinschaliger initiatieven vanuit één of enkele organisaties. Uiteraard wordt er een optimale afstemming beoogd tussen beide deelprojecten. Wat de doelstellingen van het subsidie-reglement betreft, gaat het om een gecontinueerde inzet op het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie, het inzetten van de collectiedata als open data en het zichtbaar maken van de collectie(data) en het sterker reflecteren over de bredere visie van organisaties op het gebruik van digitale technologie in het beheren en zichtbaar maken van de collectie en de collectiedata.

3. Businesscase mbt de randvoorwaarden ifv creatie, duurzame preservatie en ter beschikkingstelling van digitale collecties. Het resultaat is een roadmap voor een optimale organisatorische en technische inrichting van de cultureel-erfgoedsector.

4. 'cultuur na corona': In het kader van de relance van de culturele sector werd eind 2020 de Taskforce Relance Cultuur opgericht. Deze Taskforce geeft de opdracht aan een werkgroep korte termijn (WGKT) en een werkgroep middellange termijn (WGMLT) om een aantal voorstellen uit te werken. De WGMLT bestaat onder de naam Toekomsttraject 'Cultuur na corona' uit drie deeltrajecten: kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk. De opdracht wordt in drie (overlappende) fasen gegeven aan Cultuurloket, die voor elk deeltraject samenwerkt met het sectorale steunpunt. Het einddoel is de organisatie van een staten-generaal voor cultuur. Een precieze timing opgeven is momenteel moeilijk. Het evenement moet de kick off zijn van een terugkeer naar een coronavrije samenleving. Het toekomstperspectief is belangrijk: hoe is de sector veranderd, hoe gaat die anders werken in de toekomst en hoe moet het beleid daarop afstemmen?

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	5.000.000 EUR
Output	<p>1/ Aantal gerealiseerde projecten - december 2023</p> <p>2/ Realisatie van de roadmap - mei 2022</p> <p>3/ Gecoördineerde actie meemoo - december 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toename van hoogwaardige digitale content van onder andere kranten, glasplaten en een fotografische productie van Vlaamse Topstukken; - Aanbieden van hulp bij identificatie fotomateriaaltypes; - Metadatacreatie (spraakherkenning en gezichtsdetectie). <p>4/ De Staten-Generaal is een fysieke samenkomst van de cultuursector en zal perspectief bieden op een nieuwe start na corona. Cultuurloket stelt samen met de drie sectorale steunpunten hun rapport voor, daarna zullen drie internationale</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	experten hierover terugkoppelen en vergelijken met de aanpak bij hen. Er wordt een publiek van +/- 500 pers. verwacht.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - een aanzienlijke toename van bruikbare digitale content in functie van maatschappelijke valorisatie - een roadmap voor de optimale inrichting (organisatorisch / technisch) van de cultureel-erfgoedsector ivf digitale collectieprocessen - het rapport van de Taskforce Relance Cultuur zal een aantal perspectieven bieden op de situatie van de sector na de pandemie. Aan bod komen ook best practices vanuit de sector om zich aan te passen aan een veranderde cultuurbeleving.
Beoogde impact	Toename digitale collectiedata

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> • Versterking reglement inhaalbeweging: 16 projecten werden gehonoreerd binnen het reglement Inhaalbeweging digitale collectiedata. De projecten gaan van start in 2022. • Businesscase: Digitaal Vlaanderen is gestart met het ontwikkelen van de roadmap. • Cultuur na corona: definitief rapport voorgesteld door Cultuurloket, netwerkmoment 'Cultuur na corona: aanpassen en innoveren' werd uitgesteld naar het voorjaar 2022 (omwille van de coronamaatregelen). • Gecoördineerde acties meemoo: De acties zijn opgestart, zo worden de aanbestedingen geschreven, de technische specificaties opgemaakt en is er coördinatie met de betrokken erfgoedbeheerders.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Lancering oproep reglement	2021 Q3	Gerealiseerd	
finetunen opdrachtsomschrijving business case duurzame omgang met digitale collecties en ondertekening SWO digitaal vlaanderen / cjm	2021 Q3	Gerealiseerd	
Organisatie Staten-Generaal cultuur waar het rapport van de werkgroep Middellange Termijn van de Tasforce Relance Cultuur voorgesteld wordt. De taskforce levert dit op 30 september op. Het sector- en	2021 Q4	Vertraging	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
netwerkmoment 'Cultuur na corona: aanpassen en innoveren' kan niet doorgaan op 20 december en wordt uitgesteld naar het voorjaar.'				
gecoördineerde actie meemoo: Gunning digitaliseringsopdrachten topstukken / kranten / glasplaten		2022 Q1	Op schema	
oplevering roadmap (= resultaat van businesscase) voor de technische en organisatorische inrichting van de cultureel-erfgoedsector ifv de omgang met digitale collecties(doorlooptijd sept 21 - mei 22)		2022 Q2	Op schema	
gecoördineerde actie meemoo: Oplevering foto gedeelte kenjedorger tool		2023 Q2	Op schema	
gecoördineerde actie meemoo: Oplevering spraakherkenning op 163k bestanden		2023 Q3	Op schema	
gecoördineerde actie meemoo: Einde digitalisering glasplaten (170000 platen) / Einde digitalisering topstukken / Einde van de digitalisering van de kranten (630000 pagina's) / Oplevering entiteit extractie op tekst (163k bestanden) / Oplevering gezichtsdetectie op video (120k bestanden)		2023 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
roadmap voor de optimale inrichting (organisatorisch / technisch) van de cultureel-erfgoedsector ifv digitale collectieprocessen	strategische roadmap	2022 Q3		25 %
aanzienlijke toename van bruikbare digitale content in functie van maatschappelijke valorisatie		2023 Q4		
Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Kranten: creatie van hoogwaardige digitale beelden van 630.000 krantenpagina's van ca. 10 erfgoedinstellingen.	630000	2023 Q4		
Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Glasplaten: digitalisering van 170000 glasplaten van zo'n 40 cultureelerfgoedinstellingen.	170000	2023 Q4		
Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Metadatacreatie via	120000	2023 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
machine learning: Gezichtsdetectie- en herkenning op 120.000 bestanden.				
Aantal gerealiseerde projecten	11	2023 Q4	16	100 %
Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Hoogwaardige fotografische reproductie van Vlaamse Topstukken: 2D: ca. 175 schilderijen, etsen, gravures e.d. / 3D: collectie-Van Herck en 10 andere sculpturen / Ca. 40 50 manuscripten / Gigapixelopnames: 25 topwerken van de Vlaamse schilderkunst / Aangeboden via meemoo platformen en site van content partner.	175	2023 Q4		
Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Metadatacreatie via machine learning: Spraakherkenning op 163.000 bestanden.	163000	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.484.000 EUR
Uitvoering VEK	587.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 5.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: dossier 130. Goedkeuring VR 21/05/2021

VV131 - CULTUUR - INTEGRATIETRAJECT ERFGOEDDATABANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	- Collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg als kerntaak hebben - Collectiehoudende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben, inclusief private organisaties - brede publiek / onderwijs / onderzoekers / ...

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.</p> <p>Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken. Sinds 2018 vallen de (vroeger provinciale) erfgoeddatabanken onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. De integratie op organisatorisch en technologisch vlak moet nog worden gerealiseerd. Het project om deze erfgoeddatabanken te integreren is een belangrijke projectstap om de digitale transformatie binnen de culturele sector te stimuleren. Daarenboven is het een belangrijke stap om een goed functionerend ecosysteem op te zetten waarin collectiedata uitwisselbaar wordt. De OSLO uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed zal in de collectieregistratietool geïmplementeerd worden. Het finale doel van dit project is het duurzaam en kostenefficiënt faciliteren van 'collectieregistratie' en '-beheer' en 'hergebruik van data' voor organisaties die collectiezorg als kerntaak hebben maar ook de vele houders van erfgoed die de zorg ervan niet als kerntaak hebben.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	2.000.000 EUR
Output	Op het einde van dit project is er één laagdrempelig collectieregistratiesysteem ter beschikking van collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben. Er is ook één collectiebeheersysteem voor collectiebeherende organisaties wiens kerntaak erfgoedzorg is. Daaraan gekoppeld is er een kwalitatieve dienstverlening op maat van de diverse gebruikers.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruikers van de bestaande systemen maken ook gebruik van de nieuwe systemen om collectiedata te registreren en collecties te beheren - het digitale beheer van erfgoedcollecties bij erfgoedhouders die erfgoedzorg als kerntaak hebben wordt verder geprofessionaliseerd - samenwerking en uitwisseling tussen erfgoedhouders wordt gestimuleerd - steeds meer open data beschikbaar - de OSLO standaard ontwikkeld voor de registratie van erfgoedcollecties wordt algemeen gebruikt.
Beoogde impact	Toename digitale collectiedata

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> - datamigratie tussen de twee bestaande erfgoeddatabanken wordt uitgevoerd. Dit vormt een belangrijke voorbereidende fase naar de toekomst toe. Voorziena afronding in juni 2022 - omwille van de krapte op de arbeidsmarkt liep de aanwerving van een projectleider vertraging op. - aanwerving is intussen afgerond, voorziena start van projectleider in januari 2022
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
collecties 'collectiehouders die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben' worden gemigreerd van EIZ naar Erfgoedplus (voorbereidende stap)	2022 Q1	Op schema	
Goedkeuring projectplan VR	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Officiële start project na aanwerving projectleider		2021 Q3	Vertraging	
Technische en functionele analyse collectiebeheersysteem en collectieregistratiesysteem		2022 Q2	Nog niet gestart	
Aanbesteding collectiebeheersysteem en collectieregistratiesysteem		2022 Q3	Nog niet gestart	
ontwikkeling collectieregistratiesysteem		2023 Q2	Nog niet gestart	
configuratie en aanpassingen collectiebeheersysteem		2023 Q2	Nog niet gestart	
test en migratieproefsets collectieregistratiesysteem		2023 Q3	Nog niet gestart	
testfase en migratie pilootklanten collectiebeheersysteem		2023 Q3	Nog niet gestart	
uitrol en migratie collectieregistratiesysteem		2023 Q4	Nog niet gestart	
migratie en configuratie per klant collectiebeheersysteem		2024 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Er is een performant collectieregistratiesysteem voor collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben	1	2023 Q2		
Er is een performant collectiebeheersysteem voor collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg wel als kerntaak hebben	1	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.245.000 EUR
Uitvoering VEK	286.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 2.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Goedkeuring VR 9/07/2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV132 - DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - INVESTERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur - Agentschap Innoveren en Ondernemen - Sport Vlaanderen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering wenst een digitaal Verenigingsloket op te zetten naar analogie met Mijn Burgerprofiel en het e-Loket voor Ondernemers. Dit unieke loket moet verenigingen (vzw's en feitelijke verenigingen) beter ondersteunen bij hun interacties met overheden en andere dienstverleners op alle niveaus, via een betere digitalisering van (overheids)diensten allerhande.

Beschikbare reguliere middelen: 4.050.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	2.850.000 EUR
Output	We koppelen dienstverleningsproducten aan het V-loket. We sluiten (overheids)instanties op alle niveaus aan die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren. We identificeren verenigingen die via het V-loket met de overheid interageren.
Outcome	Door het V-loket wordt het dienstverleningsaanbod van overheden (en andere dienstverleners) aan verenigingen vaker digitaal georganiseerd, en bovendien op een efficiëntere wijze: de administratieve last bij aanvraag en afhandeling neemt af, zowel aan de kant van de vrijwilligers als van ambtenaren. Daarnaast creëert het V-loket een overkoepelend overzicht van het beschikbare dienstverleningsaanbod, zodat verenigingen sneller en vaker toegeleid worden naar ondersteunende of omkaderende maatregelen die op hen van toepassing zijn.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Contact met overheid via internet - Toegankelijkheid Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het V-loketprogramma werd eind oktober officieel opgestart met een pers- en partnermoment in aanwezigheid van minister-president Jan Jambon. Op dat ogenblik werd het communityplatform gelanceerd. Intussen werken we verder aan de verschillende deelprojecten in samenwerking met alle stakeholders die vertegenwoordigd zijn in de daartoe ingerichte governance-organen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
	MIJLPAAL	TIMING	STATUS
	Lanceren interactief ideeën-management en burgerparticipatie platform ('community platform')	2021 Q4	Gerealiseerd
	Lanceren bètaversie verenigingsloket: architectuur en eerste informatief overzicht	2022 Q1	Op schema
	Doorlopen OSLO-traject om een datastandaard te bepalen om feitelijke verenigingen uniek te identificeren, met het oog op het ontwikkelen van een gegevensbron voor (feitelijke) verenigingen (onderdeel van Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 - trekker: Digitaal Vlaanderen)	2022 Q2	Op schema
	Selecteren van eerste pilootprojecten van transactionele dienstverleningsproducten	2022 Q2	Nog niet gestart
	Ontwikkelen van een gegevensbron voor verenigingen, op voorwaarde dat OSLO-traject is afgerond	2022 Q4	Nog niet gestart
	Lanceren productieversie van het verenigingsloket: architectuur en digitale ontsluiting van het digitale verenigingsloket	2023 Q1	Nog niet gestart
	Opzetten van eerste reeks transversale transactionele diensten die ontsloten en verbonden zullen worden via dit loket en die de werking van het loket illustreren en in de praktijk brengen	2023 Q1	Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
<p>"We identificeren verenigingen die via het V-loket met de overheid interageren."--> Het project focust zowel op vzw's als op feitelijke verenigingen. Op dit moment is het niet mogelijk om feitelijke verenigingen uniek te identificeren (een VRD2-project waarin we vanuit het Verenigingsloket meewerken heeft precies tot doel dit mogelijk te maken). Dit heeft tot gevolg dat er momenteel nog geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn over het totale aantal verenigingen dat dienstverlening afneemt van overheden in Vlaanderen. Dit gegeven maakt het onmogelijk om voor deze indicator een realistische target te definiëren. Dit zal bovendien pas mogelijk zijn als de voorgaande indicator (het aantal (overheids)instanties die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren) concreet is vastgelegd, want beide zijn verbonden met elkaar: pas als er een inschatting gemaakt kan worden van welke overheidsinstanties welke onderdelen van hun dienstverlening via het Verenigingsloket willen gaan aanbieden, is het mogelijk om af te leiden hoeveel verenigingen redelijkerwijs aangesloten zullen kunnen worden op het V-loket.</p>	(zie toelichting)	2023 Q4		
<p>"We sluiten (overheids)instanties op alle niveaus aan die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren."--> De dienstverleningsproducten die diverse overheden (en andere dienstverleners) aanbieden aan verenigingen zijn nog niet in kaart gebracht (zie ook vorige indicator). Daarnaast moeten met de diverse stakeholders nog diepgaander de opportuniteiten en risico's van aansluiting op het V-loket verkend</p>	(zie toelichting)	2023 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
worden. Beide zaken samen maken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om realistische targets in te stellen.				
"We koppelen dienstverleningsproducten aan het V-loket." --> Hieraan is nog geen concrete indicatorwaarde toegewezen, omdat in deze fase van het project nog geen duidelijkheid is verkregen over het precieze aantal dienstverleningsproducten die verenigingen als doelgroep hebben. Hierdoor is het op dit ogenblik nog niet mogelijk een concrete target te definiëren. Het in kaart brengen van dienstverlening gericht op verenigingen is onderdeel van één van de deelprojecten binnen het Digitaal Verenigingsloket.	(zie toelichting)	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.850.000 EUR
Uitvoering VAK	983.000 EUR
Uitvoering VEK	515.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.850.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 12/3/2021 - nota
VR 12/3/2021 - bijlage

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De brede Vlaamse mediasector

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. De focus ligt hierbij op samenwerking tussen mediaorganisaties en extra waardecreatie binnen een globale competitieve context, zowel voor de mediaconsument, als voor de Vlaamse mediaspelers. Het programma zal investeren in gedeelde digitale media-infrastructuur en innovatieve diensten en oplossingen rond verschillende thema's (betrouwbare informatie en data / dieper inzicht in het gedrag van de mediaconsument / meer efficiënte en kwaliteitsvolle productie, opslag en distributie van mediacontent / betere vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent).

Het digitaal transformatieprogramma zal uitgevoerd worden via 5 projectwerven:

1) Crossmediaal meetsysteem en 'De Marktplaats': financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van een geavanceerd en sectorbreed crossmediaal meetsysteem dat een totaalbeeld zal geven van het mediagebruik in Vlaanderen. De scope omvat alle mediacontent die in Vlaanderen bekeken (totaal video), beluisterd (totaal audio) en gelezen (totaal lezen) wordt. De ambitie van dit project is een brug te slaan tussen traditioneel gebruikersonderzoek en de analytics aanpak voor digitale media door een hybride onderzoeksarchitectuur. Daarbij worden socio-demografisch geprofileerde data uit een nieuw representatief panel en grote hoeveelheden gebruikersdata van participerende Vlaamse mediaspelers slim aan elkaar gekoppeld. Dit moet leiden tot nieuwe en rijkere inzichten in cross-platform user life experience, in content keuzes van mediagebruikers en de context en behoeftes die deze keuzes bepalen. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van een multiplatform order management systeem (De Marktplaats) voor crossmediale mediacampagnes.

2) Mediahub cloudplatform: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van een gedeeld netwerk en cloudplatform voor de Vlaamse mediasector dat de deelnemers in staat moet stellen om verbindingen te leggen met andere mediaorganisaties. De Mediahub zal toelaten om mediastreams en -bestanden te versturen, te ontvangen, op te slaan en te bewerken. De

PROJECTOMSCHRIJVING

aangeboden diensten betreffen zowel live-verbindingen als datatransfers. Dit moet leiden tot meer efficiëntie voor professionele mediamakers doordat de productiemiddelen gedeeld kunnen worden en makkelijker te schalen zijn.

3) Projectoproep desinformatie: via een open oproep door het Departement CJM wordt financiële steun toegekend aan samenwerkingsprojecten die inzetten op verschillende facetten van de strijd tegen desinformatie. In dit kader worden onderbouwde initiatieven ondersteund van nieuwsmediaspelers (samen met het mediawijsheidsveld en onderzoeksgroepen rond media) in hun opdracht en verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie die zij verspreiden. Hierbij zal de focus liggen op vier thema's en aspecten: mediawijsheid van burgers en redacties / nieuwe (academische) inzichten inzake desinformatie / innovatieve tools en technologieën om desinformatie te detecteren en weerleggen / factchecking initiatieven.

4) Digitaal transformatieplan regionale omroepen: financiële steun voor de uitvoering van een digitaal transformatieplan op maat van de regionale omroepen dat inzet op noodzakelijke investeringen en gemeenschappelijke projecten die een meerderheid van de betrokken spelers kunnen implementeren. De focus ligt hierbij op toekomstgerichte projecten en investeringen binnen vijf inhoudelijke werven: 1) data, 2) connectiviteit, 3) distributie, 4) multiplatform redactie- en publicatiesysteem en 5) business modellen van de toekomst.

5) Projectoproep digitale transformatie mediasector: via een open projectoproep door het Departement CJM wordt financiële steun toegekend aan zowel grootschalige als kleinschalige samenwerkingsprojecten inzake media-innovatie en digitale transformatie. Hierbij zal de focus liggen op ontwikkelingsprojecten met een kort implementatietraject (2-3 jaar) die inzetten op een van volgende kernthema's: 1) het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse content, 2) slimme technologieën en digitale tools die de efficiëntie en kwaliteit van mediaproductie, opslag en distributie verhogen en 3) mediaplatformen en tools van de toekomst (kijken, luisteren, lezen).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	27.000.000 EUR
Output	Dit programma heeft als doel digitale transformatie en media-innovatie in de Vlaamse mediasector te stimuleren en accelereren. Het programma omvat meerdere projecten met verschillende outcomes. Ten eerste wordt beoogd dat mediaorganisaties gebruik maken van een crossmediaal meetsysteem en een multiplatform order management systeem. Ten tweede wordt ernaar gestreefd om mediaorganisaties gebruik te laten maken van het Mediahub cloudplatform. Ten derde wordt er ingezet op de strijd tegen desinformatie. Hiervoor wordt een projectoproep gelanceerd voor samenwerkingsprojecten die werken rond desinformatie. Ten vierde wordt beoogd om ook regionale omroepen de digitale omslag te laten maken aan de hand van een transformatieplan. Ten vijfde wordt digitale transformatie en media-innovatie binnen de sector gestimuleerd. Hiervoor wordt een projectoproep gelanceerd voor grootschalige en kleinschalige samenwerkingsprojecten binnen de brede mediasector.
Outcome	1. Een rijk en diepgaand totaalbeeld van het on- en offline mediagedrag van de Vlaming over de verschillende platformen heen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	<p>2. Vlaamse mediaorganisaties zijn met elkaar geconnecteerd via een cloudplatform (Mediahub) dat een gedeelde basis vormt voor een gebruiksvriendelijk digitaal ecosysteem voor professionele mediatools en diensten.</p> <p>3. De Vlaamse mediasector en burgers zijn weerbaarder tegen desinformatie.</p> <p>4. De regionale omroepen maken de digitale omslag en vullen hun kernopdracht efficiënter en kwaliteitsvoller in.</p> <p>5. De technologische weerbaarheid en economische leefbaarheid van de Vlaamse sector wordt versterkt via digitale innovatie en transformatie.</p>
Beoogde impact	Tewerkstelling in de Vlaamse mediasector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> - Het digitaal transformatieplan voor de regionale omroepen werd op 12/11/2021 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het project is vervolgens van start gegaan. - De reglementen van de projectoproepen desinformatie en digitale transformatie werden op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Beide projectoproepen zullen vervolgens gelanceerd worden in Q1 2022. - Er werd binnen de mediasector een finale consensus bereikt over de gezamenlijke ontwikkeling en uitrol van een crossmediaal meetsysteem en een multiplatform order management systeem. De afspraken hieromtrent werden eind december vastgelegd in een Letter of Intent (LOI). In januari 2022 wordt een consortium van participerende mediaorganisaties opgericht dat vervolgens het finale projectplan zal voorleggen aan de Vlaamse Regering. De start van het project is voorzien in Q1 2022. - Er werd binnen de mediasector een finale consensus bereikt over de gezamenlijke ontwikkeling en uitrol van het Mediahub cloudplatform. De afspraken hieromtrent worden in januari 2022 vastgelegd in een Letter of Intent (LOI). In Q1 2022 wordt een consortium van participerende mediaorganisaties opgericht dat vervolgens het finale projectplan zal voorleggen aan de Vlaamse Regering. De start van het project is voorzien in Q3 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Start uitvoering digitaal transformatieplan regionale omroepen		2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering projectoproep digitale transformatie mediasector (kleinschalige en grote projecten)		2022 Q1	Op schema	
Lancering projectoproep desinformatie		2022 Q1	Op schema	
Start ontwikkeling crossmediaal meetsysteem en multiplatform order management systeem		2022 Q1	Nog niet gestart	
Selectie projecten uit projectoproep digitale transformatie mediasector (kleinschalige en grote projecten)		2022 Q2	Nog niet gestart	
Start ontwikkeling Mediahub cloudplatform		2022 Q3	Nog niet gestart	
Selectie projecten desinformatie		2022 Q4	Nog niet gestart	
Afronding digitaal transformatieplan regionale omroepen		2023 Q3	Op schema	
Afronding projecten (kleinschalige + grote) in kader van de projectoproepen digitale transformatie		2024 Q2	Nog niet gestart	
Afronding projecten desinformatie		2024 Q2	Nog niet gestart	
Finale oplevering crossmediaal meetsysteem en multiplatform order management systeem		2025 Q4	Nog niet gestart	
Finale oplevering Mediahub cloudplatform		2026 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal projecten die gesteund worden in het kader van de projectoproep digitale transformatie.	15	2022 Q2		
Aantal projecten die gesteund worden in het kader van de projectoproep desinformatie.	5	2022 Q4		
Aantal regionale omroepen die betrokken zijn bij de uitvoering van het digitaal transformatieplan.	10	2023 Q3		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal Vlaamse mediaorganisaties die gebruik maken van het crossmediaal meetsysteem en het multiplatform order management systeem.	10	2025 Q4		
Aantal Vlaamse mediaorganisaties en andere relevante mediagerelateerde actoren die gebruik maken van het Mediahub cloudplatform.	10	2026 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.227.000 EUR
Uitvoering VEK	268.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 2/04/2021 Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media - nota Beslissing VR van 12/11/2021. NORTV subsidie uitvoering digitaal transformatieplan regionale tv-omroepen

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. De focus ligt hierbij op samenwerking tussen mediaorganisaties en extra waardecreatie binnen een globale competitieve context, zowel voor de mediaconsument, als voor de Vlaamse mediaspelers. Het programma zal investeren in gedeelde digitale media-infrastructuur en innovatieve (digitale) diensten en oplossingen rond verschillende thema's (betrouwbare informatie en data / dieper inzicht in het gedrag van de mediaconsument / meer efficiënte en kwaliteitsvolle productie, opslag en distributie van mediacontent / betere vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent, ...).

Het digitaal transformatieprogramma zal uitgevoerd worden via 6 projectwerven waarvan F. 'Instrumentarium / projectoproep media-innovatie' onder de coördinatie van minister Crevits valt. Voor deze werf, waarvoor 8 miljoen EUR relancemiddelen beschikbaar zijn, zal onder beheer van VLAIO een mix van acties uitgerold worden:

- Oproep voor media-ICON projecten
- Oproep voor media-TETRA projecten en/of media-proeftuinen
- Ondersteuning van media-acceleratoren

De acties zijn hierbij gericht naar

- (i) de grote en kleine mediabedrijven (VRT, DPG Media, Roularta, Mediahuis, Regionale omroepen...);
- (ii) toeleveranciers op het vlak van technologie aan de mediasector;
- (iii) contentleveranciers/productiehuizen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	8.000.000 EUR
Output	- ondersteuning van minstens 3 media-ICON projecten - ondersteuning van minstens 3 of 5 media TETRA projecten en/of maximum 2 proeftuinen voor de media - ondersteuning van minstens 2 media-acceleratoren
Outcome	De technologische weerbaarheid en economische leefbaarheid van de Vlaamse mediasector (en de toeleveringsbedrijven) wordt versterkt via digitale innovatie en transformatie.
Beoogde impact	O&O-bestedingen door bedrijven - Aandeel innoverende bedrijven in de industrie- en dienstensector - Tewerkstelling in de Vlaamse mediasector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er werden in tussentijd 2 projectoproepen gelanceerd: (i) MEDIA-ICON (ii) TETRA-MEDIA Verder werden gesprekken opgestart rond de opstart van de incubatoren en proeftuinen. Beslissingen hierover zullen genomen worden in Q1 2022
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Opstart ICON voor de media	2021 Q4	Op schema
Opstart media-accelerator(en)	2022 Q1	Op schema
Opstart TETRA en/of proeftuin voor de media	2022 Q2	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 8.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2/04/2021 Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media - nota](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV135 - INVESTEREN IN MEDIAWIJSHEID VAN DE VLAMING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, jongeren in het secundair onderwijs en organisaties die zich richten op kwetsbare doelgroepen.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Via twee projecten wordt er bijkomend geïnvesteerd in het versterken van mediawijsheid bij de burger. De ontwikkeling en coördinatie van beide projecten gebeurt door Mediawijs - het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid.

1. Er wordt een flankerend traject bij het bestaande project Nieuws in de Klas opgezet waarbij ingezet wordt op meer interactie om kinderen en jongeren nog nieuwsvaardiger te maken. Het doel van Nieuws in de Klas is om van kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel nieuws- en informatiewijze burgers te maken. Het flankerende traject voegt een extra dimensie van interactiviteit toe. Er zal specifiek gewerkt worden op drie elementen: 1) een 'Nieuwsmakers' wedstrijd gericht op de 1ste graad van het secundair onderwijs, 2) een initiatief rond factchecking gericht op de 2de graad van het secundair onderwijs en 3) een debatmarathon gericht op de 3de graad van het secundair onderwijs.

2. De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren en organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren begeleiden in Vlaanderen wordt versneld. Mediawijs zal ondersteuning bieden bij het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen deze sectoren en organisaties. Mediawijs zal goede praktijkvoorbeelden en informatieve of educatieve materialen inzake digitale inclusie en mediawijsheid op maat van deze sectoren verzamelen en opschalen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.000.000 EUR
-------	---------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	De output van dit project is tweeledig. Ten eerste wil de minister klassen uit het secundair onderwijs laten deelnemen aan het flankerend traject bij Nieuws in de Klas. Ten tweede wil de minister personen uit organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren informeren via vormingen over het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.
Outcome	1. Jongeren uit het secundair onderwijs worden nieuwsvaardiger en gaan op een meer bewuste en kritische manier met digitale media, nieuws en informatie om. 2. De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren en organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in Vlaanderen wordt versneld.
Beoogde impact	ANDERE

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Beide projecten (flankerend traject Nieuws in de Klas + bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan) zijn van start gegaan op 1 mei 2021. De middelen vanuit relance werden via twee MB's toegekend aan Mediawijs.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
De ontwikkeling van het basisconcept voor het flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt afgerond en de nodige partnerschappen worden aangegaan.	2021 Q4	Gerealiseerd
Tijdens een pilootfase wordt het basisconcept van het flankerend traject rond Nieuws in de Klas uitgetest en geëvalueerd.	2022 Q2	Nog niet gestart
Het finaal uitgewerkte flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt uitgerold in het schooljaar 2022-2023.	2022 Q3	Nog niet gestart
Sectoren en organisaties gericht op kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren werden in de periode 05/2021 - 06/2023 door Mediawijs begeleid en ondersteund bij het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen hun sector.	2023 Q2	Nog niet gestart

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Het finaal uitgewerkte flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt uitgerold in het schooljaar 2023-2024.		2023 Q3	Nog niet gestart	
Het flankerend traject bij Nieuws in de Klas wordt afgerond op het einde van het schooljaar 2023-2024.		2024 Q2	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uren vorming georganiseerd in het kader van het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.	100	2023 Q2		
Aantal deelnemersuren van personen uit organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in het kader van het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.	1000	2023 Q2		
Aantal klassen uit het secundair onderwijs die hebben deelgenomen aan het flankerend traject bij Nieuws in de Klas.	1500	2024 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.000.000 EUR
Uitvoering VEK	235.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 2/04/2021 Investeren in mediawijsheid van de Vlaming - nota

29. Versterken mentaal welzijn

VV136 - VERNIEUWENDE PROJECTEN HUIZEN VAN HET KIND

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Gezinnen met kinderen in Vlaanderen en Brussel. Bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Opgroeien lanceert een oproep voor vierentwintig Huizen van het Kind die binnen hun werkingsgebied innovatief willen zijn en samen met hun partners werk willen maken van een (meer) geïntegreerde dienstverlening naar gezinnen, over beleidsdomeinen heen.</p> <p>Wat wordt bedoeld met vernieuwende projecten? In de Huizen van het Kind kunnen gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders terecht voor ondersteuning op het vlak van preventieve gezondheidszorg, spel en ontmoeting en gezinsondersteuning. Hiernaast hebben sommige gezinnen echter vaak ook behoefte aan ondersteuning op het vlak van opvang, onderwijs, werk, opleiding, integratie, inburgering en armoede ... In realiteit zijn heel wat van deze behoeften met elkaar verstrengeld. Een meer geïntegreerde dienstverlening over de beleidsdomeinen heen zou voor gezinnen écht het verschil kunnen maken.</p> <p>De Vlaamse Regering wil dat Huizen van het Kind, samen met partners uit de verschillende beleidsdomeinen, meer inzetten op geïntegreerde dienstverlening en doet vanuit dat perspectief een oproep voor vernieuwende projecten. De vernieuwende projecten spitsen zich toe op het verwezenlijken van doelstellingen en opdrachten die enkel kunnen worden gerealiseerd via een (meer) geïntegreerde dienstverlening. Het gaat steeds om de doelstellingen op vlak van preventieve gezinsondersteuning in combinatie met minstens één van de volgende doelstellingen: integratie en inburgering; opvang en onderwijs; tewerkstelling en opleiding; armoedebestrijding.</p> <p>De inzet op een combinatie van doelstellingen is ook interessant voor (lokale) partners binnen deze andere beleidsdomeinen. Ze kunnen mee investeren in de dienstverlening om op die manier hun eigen doelstellingen te realiseren. De Huizen van het Kind vormen samen met deze partners</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

een lokaal netwerk.

In essentie gaat het over 'de handen in elkaar slaan over beleidsdomeinen heen binnen de context van het lokale Huis van het Kind, om op die manier geïntegreerd werk te maken van de ondersteuning van een gezin'. Zo worden voor het gezin kansen gecreëerd binnen verschillende beleidsdoelstellingen, op het vlak van ondersteuningsbehoeften die voor het gezin in realiteit ook met elkaar verweven zijn. Hierbij maakt het voor een gezin niet uit of het nu door onderwijs, inburgering of welzijn ondersteund wordt: enkel door samen te werken binnen verschillende doelstellingen die met elkaar samenhangen, kan het recht op kansrijk opgroeien uiteindelijk worden gerealiseerd.

Waar het bij geïntegreerde dienstverlening om gaat is dat er, op maat en vertrekkende vanuit het gezin, samengewerkt wordt tussen spelers van verschillende beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein (welzijn, onderwijs, integratie en inburgering, werk, armoedebestrijding) kent zijn eigen doelstellingen, zijn eigen lokale partners en eigen dienstverlening, maar voor een gezin met een ondersteuningsbehoefte maakt het niet uit door welke overheid of subsidiekanaal het uiteindelijk wordt geholpen. Bovendien zien we dat ondersteuningsbehoeften met elkaar samenhangen, en dan kan het echt versterkend werken om ook op lokaal niveau, over beleidsdomeinen heen, de handen in elkaar te slaan. Hierdoor wordt binnen de context van de Huizen van het Kind samen gebouwd aan het kansrijk opgroeien van elk kind. De Huizen van het Kind zijn belangrijk in dit verhaal. Vlaanderen ziet hen als sleutelspeler in het lokaal geïntegreerd gezinsbeleid en wil de Huizen van het Kind deze legislatuur daarom versterken. Deze subsidie aan 24 Huizen van het Kind is een volgende stap in de versterking van de Huizen van het Kind, die vandaag al zeer lokaal een belangrijke meerwaarde vormen als ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en gezinnen, en als plek waar élk gezin terecht kan voor ondersteuning.

Voor de projecten die inzetten op de doelstelling integratie en inburgering is er cofinanciering voorzien vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	3.000.000 EUR
Output	Realiseren van een geïntegreerde dienstverlening in het kader van het vernieuwend project (gezinsondersteuning in combinatie met werk en opleiding, integratie en inburgering, onderwijs en opvang, armoedebestrijding) binnen het Huis van het Kind, in samenwerking met de partners binnen deze andere beleidsdomeinen.
Outcome	Binnen elk geselecteerd project: een netwerk van partners opzetten (Huis van het Kind én partners binnen andere beleidsdomeinen) om op die manier een vernieuwende, geïntegreerde dienstverlening voor gezinnen te organiseren binnen het Huis van het Kind.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van de kinderopvang - Aandeel bevolking onder de armoededrempel - Werkzaamheidsgraad

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De 24 vernieuwende projecten Huizen van het Kind zijn opgestart. Het individueel ondersteuningstraject door Arteveldehogeschool werd opgestart en loopt momenteel. Het collectief ondersteuningstraject en lerend netwerk wordt vanuit Opgroeien/EXPOO georganiseerd en werd ondertussen ook opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd		
Lancering oproep vernieuwende projecten	2021 Q1	Gerealiseerd		
Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd		
Start beoordelingsfase projectaanvragen Huizen van het Kind	2021 Q2	Gerealiseerd		
Kick-Off ondersteuningstraject	2021 Q2	Gerealiseerd		
Alle vernieuwende projecten zijn opgestart	2022 Q1	Op schema		
Verdere uitbouw gezamenlijk ondersteuningstraject en lerend netwerk o.l.v. EXPOO/Opgroeien	2022 Q1			
Verderzetting individueel ondersteuningstraject (impactgericht werken en veranderingstheorie) o.l.v. Arteveldehogeschool	2022 Q1	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
kwalitatieve vernieuwende project opgestart binnen Huis van het Kind	24	2022 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK

567.000 EUR

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 5 maart 2021 - BVR](#)

[VR 5 maart 2021 - nota](#)

[VR 5 maart 2021 - advies](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Enmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen: extra ondersteunen van de werking van lotgenotengroepen, versterkte inzet van herstelacademies, tijdelijke versterking van de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen, enz.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	3.500.000 EUR
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contextgericht werken en verslaving 2. Herstelacademie en verslaving 3. Kwartiermaken 4. Tijdelijke versterking van de verslavingszorgcentra en de psychosociale revalidatiecentra
Outcome	Projectplan is nog in opmaak. De outcome indicatoren zijn nog niet definitief.
Beoogde impact	Aandeel personen met een psychische stoornis - Aandeel van de bevolking in (zeer) goede gezondheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	<p>In het najaar 2021 hebben patiënten- en familieorganisaties, koepelorganisaties, Steunpunt Geestelijke Gezondheid,... een projectplan uitgewerkt.</p> <p>Een centraal principe in dit projectplan is hoe we mensen met een reeds bestaande psychische kwetsbaarheid en hun context laagdrempelig uit hun</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>isolement kunnen halen, rekening houdend met herstel. De doelgroep betreft volwassen personen met een psychische kwetsbaarheid.</p> <p>Het projectplan omvat volgende onderdelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contextgericht werken en verslaving 2. Herstelacademie en verslaving 3. Kwartiermaken 4. Tijdelijke versterking van de verslavingszorgcentra en de psychosociale revalidatiecentra
Noodzakelijke politieke actie	Een conceptnota rond de besteding van de middelen zal geagendeerd worden op de Vlaamse Regering in de loop van januari 2022.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Goedkeuring conceptnota besteding projectmiddelen Vlaamse Regering	2022 Q1	Op schema
Start projecten vanaf 1/1/2022	2022 Q1	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Agentschap Opgroeien - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	Brede bevolking; zorgverleners; kinderen, jongeren en gezinnen, mensen met een psychische en/of sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid; naasten van overleden patiënten; intermediairen.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Het coronavirus COVID-19 heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Met het actieplan mentaal welzijn of 'zorgen voor morgen' willen we een sterk signaal geven aan de bevolking dat we de psychosociale gevolgen van de Corona-maatregelen ernstig nemen en er zowel op korte als op middellange termijn adequate oplossingen voor willen implementeren.

De eenmalige maatregelen vanuit het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben tot doel niet alleen de brede bevolking maar ook specifieke doelgroepen zoals zorgverleners; kinderen, jongeren, gezinnen; mensen met een psychische kwetsbaarheid; mensen met een sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid en de naasten van overleden patiënten te ondersteunen en versterken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	6.500.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliseringscampagnes om hulpaanbod bekend te maken • Hulplijnen versterken om bijkomende vragen op te vangen • Werkgevers ondersteunen bij het voeren van een gezondheidsbeleid
Outcome	Meer personen vinden vroegtijdig hun weg naar het laagdrempelige aanbod en een hoger aantal hulpvragen wordt opgevangen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Aandeel van de bevolking in (zeer) goede gezondheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er zijn twee bijkomende initiatieven genomen om laagdrempelige hulp te versterken, om het aanbod/capaciteit van het aanbod te verhogen om meer hulpvragen op te vangen: de acties Autisme chat en de chatlijn na seksueel geweld.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Het participatieproject wordt voorbereid via overheidsopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd
Werkgevers kunnen aanvragen indienen ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid bij telewerk – projecten zijn geselecteerd en kunnen van start gaan	2022 Q4	Op schema
Diverse hulplijnen ontvangen extra middelen	2024 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.500.000 EUR
Uitvoering VAK	4.486.000 EUR
Uitvoering VEK	1.576.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Versterken mentaal welzijn – Opvolging actieplan mentaal welzijn](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV139 - OVERKOPHUIZEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Jongeren in Vlaanderen en Brussel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Op voorstel van de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, wil de Vlaamse Regering investeren in het welbevinden van jongeren. Opgroeien lanceert daarom een oproep voor de (verdere) ontwikkeling van zestien OverKophuizen. Geselecteerde initiatieven komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro per OverKophuis die wordt toegekend voor een duurtijd van drie jaar. Een OverKophuis is een plek met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en ondersteuning in een omgeving van vertrouwen en geborgenheid. Het gaat om een plek waar je als jongere een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op ondersteuning op vlak van welbevinden zonder een label opgeplakt te krijgen. Een OverKophuis is een toegankelijke ontmoetingsplek waar de doelstellingen van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidsbevordering gecombineerd worden waargemaakt vanuit een sterke participatieve insteek. Deze aanpak sluit ook aan bij een buurtgerichte benadering van de zorg.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	4.800.000 EUR
Output	Zestien OverKopnetwerken starten binnen hun eigen werkingsgebied minstens één OverKophuis op. In totaal zullen er op 1 januari 2022 in Vlaanderen en Brussel minstens 30 OverKophuizen geopend en werkzaam zijn. De zestien OverKopnetwerken worden vanaf het najaar van 2021 ondersteund vanuit het agentschap Opgroeien via een lerend netwerk en ondersteuningstraject.
Outcome	Tegen 1 januari 2022 zijn in Vlaanderen en Brussel minstens 30 OverKophuizen geopend. Dit zijn 30 toegankelijke ontmoetingsplekken met een geïntegreerde werking voor jongeren, waarbij partners vanuit welzijn, vrije tijd, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, ... de handen in elkaar slaan om de doelstellingen te realiseren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	HET VLAAMSE ZORG- EN WELZIJNSSYSTEEM VERSTERKEN

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Tegen eind januari 2021 zullen dertig OverKophuizen in Vlaanderen en Brussel zijn opgestart. Hier en daar werden de OverKophuizen feestelijk geopend dit najaar. Eind september vond ook de kick-off van het lerend netwerk en ondersteuningstraject rond OverKop plaats. Dit lerend netwerk en ondersteuningstraject wordt in 2022 verder uitgewerkt in de vorm van inspiratiedagen, netwerkbabbels, etc. om de OverKopnetwerken zo goed als mogelijk te ondersteunen en om elkaar te inspireren om OverKop op die manier nog sterker te maken en verder uit te bouwen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	
Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering oproep OverKophuizen: https://www.opgroeien.be/overkop	2021 Q1	Gerealiseerd	
Communicatiecampagne (doelgroep jongeren)	2021 Q2	Gerealiseerd	
Publieke communicatie nieuwe locaties OverKophuizen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Start beoordelingsfase ingediende projectaanvragen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opstart ondersteuningstraject OverKophuizenKick-Off lerend netwerk OverKophuizen 30/09/2021	2021 Q3	Gerealiseerd	
Vanaf september 2021 tot en met december 2021: opening nieuwe OverKophuizen in Vlaanderen en Brussel	2021 Q4	Gerealiseerd	
Verdere uitbouw ondersteuningstraject en lerend netwerk	2022 Q1	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal geopende OverKophuizen in 2022	30	2022 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.800.000 EUR
Uitvoering VAK	4.800.000 EUR
Uitvoering VEK	865.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning - nota
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning - advies

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV140 - SAMENWERKINGSVERBANDEN “ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN”

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Zorg en Gezondheid - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan'

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Met 'één gezin, één plan' investeren we sinds 2018 in samenwerkingsverbanden die laagdrempelige, snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulpverlening bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen met pedagogische ondersteuningsnoden. Een eerstelijnspsychologische functie is in deze samenwerkingsverbanden voorzien zodat een geïntegreerd antwoord geboden kan worden, ook wanneer ze sprake is van combinatie van noden op het vlak van pedagogische vaardigheden met geestelijke gezondheidszorgproblematiek</p> <p>De samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan' worden tegen eind 2021 op het volledige grondgebied van Vlaanderen en Brussel actief en zullen een doorstart kennen in 2022. Deze implementatie willen we flankeren met een versterking van de crisisnetwerken, actoren in verontrusting en een ondersteunende campagne.</p> <p>Project VV 140 valt in drie deelprojecten uiteen: 1) de continuering van de uitbreiding van crisisbegeleiding die werd opgestart tijdens de coronacrisis en waarvan stakeholders aangeven dat de nood nog steeds hoog blijft; 2) de uitbreiding van het aantal medewerkers bij de vertrouwenscentra kindermishandeling, ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank, eveneens opgestart in de coronacrisis, met ook hier de vraag om er verder op in te zetten; 3) een ondersteunende campagne om 'één gezin, één plan' beter bekend te maken bij het brede publiek en de connectie met zowel de basisvoorzieningen als de meer gespecialiseerde hulp te versterken zodat we na de relance heel wat vragen rond crisis en verontrusting effectief door deze netwerken kunnen laten opnemen.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	3.200.000 EUR
Output	<p>deelproject 1. uitbreiding van het aanbod crisisbegeleiding met 250 eenheden in 2022 en 150 in 2023.</p> <p>deelproject 2. bijkomende tewerkstelling van 30 medewerkers in vertrouwenscentra kindermishandeling, ondersteuningscentra jeugdhulp en sociale diensten jeugdrechtbank in 2022.</p> <p>deelproject 3. bekendmakingscampagne</p>
Outcome	<p>deelproject 1. er worden in 2022 en 2023 respectievelijk 250 en 150 kinderen in acute situaties begeleid zodat crisissen omgebogen worden en minder intensieve ondersteuning vermeden wordt.</p> <p>deelproject 2. we formuleren antwoorden op het toenemende aantal situaties van verontrusting.</p> <p>deelproject 3. de samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan' zijn beter bekend bij de stakeholders.</p> <p>Finaal slagen we erin om gezinnen met (acute) hulpvragen sneller te bereiken en te ondersteunen zodat ze zonder ingrijpende, intensieve hulpverlening verder kunnen.</p>
Beoogde impact	HET VLAAMSE ZORG- EN WELZIJNSSYSTEEM VERSTERKEN

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Besluit van de Vlaamse Regering is goedgekeurd op 3/12/2021.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
de medewerkers in de ondersteuningscentra jeugdzorg, de vertrouwenscentra kindermishandeling en de sociale diensten jeugdrechtbank zijn geworven.	2022 Q1	Op schema		
De middelen voor de versterking van crisisbegeleiding zijn toegekend.	2022 Q1	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
uitbreiding van het aantal gezinnen in crisissituaties dat begeleid wordt.	250	2022 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
uitbreiding van het aantal gezinnen in crisissituaties dat begeleid wordt	150	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.200.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021 relanceproject Vlaamse Veerkracht – versterking mentaal welzijn (project 140)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

**VV141 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - CRISISOPVANG EN
CRISISBEGELEIDING IN RESIDENTIËLE JEUGDZORG**

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Dit project (nr. 141) zet in op de aanpak van crisissituaties in gezinnen door de jeugdhulp, als reactie op verontrustende opvoedingssituaties. Het project valt uiteen in 2 deelprojecten.</p> <p>In 2020 werd het aanbod van crisisbegeleiding op advies van experts tijdelijk uitgebreid om te anticiperen op een stijging van verontrustende gezinssituaties omwille van Corona. Aangezien de Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn, zetten we een gedeelte van deze middelen in om deze tijdelijke uitbreiding voor 1 jaar aan te houden.</p> <p>Daarnaast willen we de relancemiddelen gebruiken om op basis van de adviezen van het maatschappelijk relancecomité een hefboom te creëren om in te zetten op een duurzame verandering rond de aanpak van complexe casussen in de jeugdhulp, die te vaak tot escalaties en crisissen leiden, en waarvoor de crisismeldpunten geen adequate ondersteuning kunnen bieden. We zetten daarvoor proefprojecten 'de ideale wereld' op, waarin we werk maken van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle regionale actoren en de ondersteuningscentra en de sociale diensten van de jeugdrechtsbank (OSD) voor deze casussen.</p> <p>Tegelijk engageren we de administratie om dit proces mee op te volgen en samen met alle actoren de administratieve en logistieke barrières in kaart te brengen (bv. rol van de toegangspoort, sectorspecifieke regelgeving, onderscheid en combineerbaarheid RTJ/NRTJ, intersectorale schakelmogelijkheden, ...), die samenwerking bemoeilijken of blokkeren en de nodige aanpassingen voor te stellen om de samenwerking op het terrein te faciliteren.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	3.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	<p>deelproject crisisbegeleidingen: het aantal jongeren bereikt met projectmiddelen voor crisisjeugdhulp</p> <p>deelproject 'ideale wereld': ntb</p>
Outcome	<p>deelproject crisisbegeleidingen: de uitkomst van de crisisbegeleidingen bij afloop: terug naar huis/kan thuis blijven, opvang in de context, vraag naar een langdurig verblijf in een residentiële voorziening in de jeugdhulp.</p> <p>deelproject 'ideale wereld': ntb</p>
Beoogde impact	ANDERE

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De drie 'ideale werelden' zijn gestart met de uitwerking van het project. De lerende netwerken zijn in opstart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Drie proefprojecten 'ideale wereld' zijn geselecteerd en opgestart	2021 Q3	Gerealiseerd		
400 extra crisisbegeleidingen	2021 Q4	Op schema		
De lerende netwerken zijn opgestart	2021 Q4	Op schema		
De drie proefprojecten 'ideale wereld' hebben een concreet plan, afgetoetst met alle stakeholders, en zijn klaar om dit te implementeren	2022 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal jongeren begeleid met de projectmiddelen in crisisjeugdhulp.	400	2020 Q4	302	77 %
Verbeterd inzicht in de voorwaarden voor het verknopen van expertise in		2023 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
trajecten van kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven				
Onderzoek naar duurzame verandering rond de aanpak van complexe casussen in de jeugdhulp + testcases		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.418.000 EUR
Uitvoering VEK	1.233.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 5 februari 2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV142 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
bewustmakingscampagnes om (potentiële) plegers te bereiken en hen preventief toe te leiden naar hulpverlening

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	300.000 EUR
Output	
Outcome	
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Sensibiliseringscampagnes - intrafamiliaal geweld		Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV143 - ZORGZAME BUURTEN - ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREKPUNT
WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Apothekers Netwerk (VAN vzw), CAW Groep, VVSG

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Dagelijks zien apothekers mensen uit alle lagen van de bevolking met zeer uiteenlopende vragen en behoeftes. Met een gemiddelde van 100 patiëntencontacten per dag, zijn de apothekers de zorgverleners uit de eerste lijn die een groot bereik hebben en lokaal zijn ingebed. Dit biedt enerzijds veel mogelijkheden om patiënten te sensibiliseren en mee te werken aan de preventie van verschillende chronische aandoeningen, en anderzijds kunnen zij een grote rol opnemen inzake detectie en signalering van psychosociale noden en kwetsbaarheden. Met dit project willen we de rol van apothekers als diegenen die psychosociale noden kunnen detecteren en snel kunnen doorverwijzen naar de gepaste hulp versterken. Het Vlaams Apothekers Netwerk vzw (VAN) wil de apothekers in de toekomst een rol geven in de oriëntatie van slachtoffers van geweld en van kwetsbare burgers met psychosociale noden die onder de radar blijven. VAN vzw wil een duurzame samenwerking opzetten met CAW en lokale besturen, en komen tot een goed onderbouwd samenwerkingsakkoord zodat ze elkaars rol kunnen versterken met als effect dat zowel de problematiek van familiaal geweld als de psychosociale noden en behoeften van elke kwetsbare burger gezien wordt, bespreekbaar wordt en gepast wordt aangepakt.

De doelstellingen en acties van het project zijn:

1° Inventariseren welke samenwerkingen op het terrein reeds bestaan, en bevragen wat de noden en behoeften zijn om deze te verduurzamen en nog efficiënter en kwaliteitsvoller aan te pakken.

a. Een onlinebevraging, die wordt verspreid onder de Vlaamse en Brusselse apothekers en de CAW's en de OCMW's (dit kan via VVSG).
b. Bekijken, in het kader van het GBO, op welke manier de toeleiding van cliënten die door de apothekers worden gedetecteerd, kan verlopen naar de CAW's, OCMW's en DMW's. Als leidraad hanteren we hierbij de expertise van deze kernactoren inzake psychosociale begeleiding, met bijzondere aandacht voor de expertise van de CAW's inzake problematiek van relationeel/huiselijk geweld.

2° Materialen (checklist) en een opleiding ontwikkelen voor apotheekmedewerkers in functie van detectie en herkennen van signalen in het kader van familiaal geweld, en het verbergen en niet

PROJECTOMSCHRIJVING

onderkennen van psychosociale problemen op de verschillende terreinen. Men kijkt eveneens de mogelijkheden op het niveau van de eerstelijnszones.

- a. Een checklist die aangeeft hoe apothekers signalen van familiaal geweld kunnen herkennen;
- b. Een overzicht van algemene kenmerken van 'zorgmijders';
- c. Handvaten en tools (affiches, stickers, flyers ...) die apothekers kunnen gebruiken om problemen bespreekbaar te stellen;
- d. Informatie en afspraken over hoe men dient om te gaan met patiënt-/cliëntinformatie;
- e. Een opleiding om de materialen voor te stellen, de achtergrond ervan mee te geven en toe te lichten hoe ze worden gebruikt;
- f. Ondersteunende instructies voor de vertegenwoordigers in de zorgraden om dit project op te zetten binnen hun eerstelijnszone

3° Taal en tools aanreiken om problemen bespreekbaar te maken, mensen te ondersteunen en te motiveren en ze snel en gemakkelijk toe te leiden naar de hulpverlening. Een onmisbare tool voor het efficiënt doorverwijzen is de sociale kaart.

- a. Een stroomschema met de verschillende stappen die apothekers kunnen zetten bij een vermoeden van familiaal geweld, psychosociale problemen en hoe ze snel kunnen doorverwijzen;
- b. Informatie over de beschikbare hulp en de bereikbaarheid (waar, wanneer en hoe), hoe apothekers kunnen doorverwijzen en aanmelden (aanmeldingstool);
- c. Afspraken in verband met de registratie en verwerking van data op een geaggregeerd niveau, rekening houdend met de GDPR-regelgeving;
- d. Een opleiding/webinar/e-learning die de rol van apothekers in het kader van detectie, signalering en doorverwijzing duidt, concreet maakt en toelichting geeft bij het gebruik van het stroomschema en de afspraken, en handvaten geeft hoe men kan communiceren met slachtoffers en hulpvragers of hulp- en zorgmijders.

Om vanuit de praktijk de link te leggen met het beleidsniveau, zal worden samengewerkt met een academische onderzoeksgroep die de pilootprojecten zal opvolgen, evalueren en kijkt welke relevante data kunnen gegenereerd worden. Men wil ook nagaan in welke mate de samenwerking met de apothekers de drempel naar de hulpverlening verlaagt.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	250.000 EUR
Output	- Een inventaris van bestaande samenwerkingsverbanden en noden/behoefte om deze samenwerkingsverbanden te verduurzamen, efficiënter en kwaliteitsvoller aan te pakken. - Een aantal materialen/tools en twee opleidingen voor apotheekmedewerkers.
Outcome	Snellere detectie van psychosociale noden en doorverwijzing naar gepaste hulp.
Beoogde impact	Aandeel bevolking onder de armoededrempel

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	De subsidie aan het Vlaams Apothekers Netwerk vzw voor de uitvoering van dit project is toegekend. Het project is in uitvoering.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Toekenning subsidie aan VAN vzw voor uitvoering van het project	2021 Q1	Gerealiseerd		
Uitvoering van het project	2022 Q1	Op schema		
Resultaten van het project breed verspreiden	2022 Q3	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Onlinebevraging van samenwerkingsverbanden en noden/behoefden: inventaris	1 inventaris	2021 Q2	100	100 %
Materialen/tools: - een checklist- een overzicht met kenmerken van 'zorgmijders'- handvaten en tools (affiches, stickers, flyers,...)- informatie en afspraken m.b.t. omgaan met cliëntinformatie- ondersteunende instructies- stroomschema- aanmeldingstool- registratie- en verwerkingsafspraken	8 uitgewerkte materialen / tools	2022 Q1		
Opleidingen voor apothekemedewerkers: opleiding voor gebruik van de toolsopleiding omtrent apothekers	2 opleidingen	2022 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000 EUR
Uitvoering VAK	120.000 EUR
Uitvoering VEK	100.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 250.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 12 maart 2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV144 - ZORGZAME BUURTEN - VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Agentschap Zorg en Gezondheid - Agentschap Opgroeien - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	Welzijns- en zorgorganisaties, welzijns- en zorgprofessionals, lokale besturen, patiënten- en cliëntenorganisaties, enz. (Experten zetelend in de Vlaamse Raad WVG)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Vandaag willen mensen met zorg- en ondersteuningsvragen zelf beslissen over de hulp en ondersteuning die ze willen krijgen. Ze zijn niet langer gefocust op gezondheid, maar wel op hun brede levenskwaliteit en willen comfortabel kunnen wonen in hun huis en vertrouwde buurt. Of het nu gaat om ouderen, personen met een handicap, personen met psychische problemen of gezinnen met kinderen of jongeren met een zorg- of ondersteuningsvraag, mensen willen graag maatschappelijk ingebed, in de buurt blijven wonen.</p> <p>Door het ontwikkelen en stimuleren van zorgzame buurten met aandacht voor buurtgerichte zorg kunnen we die evolutie ondervangen. Met zorgzame buurten zetten we in op zorgzaam samenleven, op ontmoeting, solidariteit en de opbouw van sociaal weefsel. Zorgzame buurten kunnen helpen om vereenzaming te voorkomen. Een zorgzame buurt biedt geborgenheid en ondersteuning in de nabije omgeving. Het draait om “het kleine helpen”. Een zorgzame buurt is er voor iedereen. Daarenboven leggen we de link tussen informele hulp en de professionele zorg zodat complexe hulpvragen sneller, makkelijker een weg vinden naar de professionele hulpverlening en professionele hulpverlening die informele zorg ook beter kan ondersteunen. De betrokkenheid van de professionele zorg in zorgzame buurten moet er voor zorgen dat verschillende welzijns- en zorgorganisaties op dat lokale niveau vanuit eenzelfde focus meer en beter gaan samenwerken en uiteindelijk komen tot het aanbieden van geïntegreerde zorg (vanuit gezondheid én welzijn) met een focus op levenskwaliteit.</p> <p>Daartoe zullen we midden juni 2021 een projectoproep lanceren om tot minstens 95 zorgzame buurtprojecten te komen in het Vlaams Gewest. We zetten een apart traject op om tot minstens 5 projecten te komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

We zullen de minstens 100 zorgzame buurtprojecten een financiële impuls geven gedurende twee jaar. De projecten starten op 1 maart 2022 en lopen tot 29 februari 2024. Ze zullen inhoudelijk begeleid en ondersteund worden door een externe partner, die hiervoor beroep zal doen op de beschikbare expertise op het terrein.

In februari 2024 willen we niet enkel tot minstens 100 goedlopende zorgzame buurtprojecten komen, we willen dat deze inspirerend zijn voor andere buurten zodat er zich zorgzame buurten ontwikkelen over heel Vlaanderen en Brussel. Om dat sneeuwbaaleffect te bekomen, zullen we niet enkel een inhoudelijke toolbox uitwerken en ter beschikking stellen van geïnteresseerde buurten in de toekomst, maar ook de projecten en het concept bekend maken zodat het concept leeft op het terrein en andere buurten zin hebben om er zelf mee aan de slag te gaan.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	20.000.000 EUR
Output	Minstens 100 zorgzame buurtprojecten waarvan minstens 95 in het Nederlandse taalgebied en minstens 5 in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Minstens 100 goed werkende, succesvolle zorgzame buurtprojecten waarvan minstens 95 in het Nederlandse taalgebied en minstens 5 in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Minstens 100 verschillende terreinorganisaties (lokale besturen, eerstelijnszones, welzijns- en zorgorganisaties) die een leertraject hebben doorlopen mbt participatief en inclusief werken, het opstellen van een buurtprofiel en buurtanalyse en daaruit verder bouwen om beleid te ontwikkelen, het opstellen van een veranderingstheorie en impactgericht werken en het samenwerken in een netwerk (samenwerking tss welzijn en zorg, beleidsdomeinoverschrijdend, en met buurtbewoners) én wat ze geleerd hebben ook ruimer in de eigen werking kunnen inzetten (bvb impactgericht werken). - Evaluatiekader (met onder meer een long-list van indicatoren) - Toolbox voor welzijns- en zorgorganisaties en lokale besturen met praktische handvaten/methodieken om aan een zorgzame buurt te werken - Beleidsaanbevelingen tav de Vlaamse overheid (WVG) - Ruimere kennis over/bekendheid van "zorgzame buurten", de werking ervan, werkende principes, enz. bij alle lokale besturen en welzijns- en zorgorganisaties (ook diegene die geen lopend project zorgzame buurten hadden)
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op 23 september organiseerde het Departement WVG een digitale informatiedag Zorgzame Buurten. Meer dan 900 mensen schreven zich in. Zowel

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>het plenaire deel als de workshops werden opgenomen en ter beschikking gesteld op de website www.zorgzamebuurten.be De deadline van de projectaanvragen is verstreken; er werden 152 projectaanvragen ingediend in het Nederlandstalig taalgebied (Vlaanderen) en 13 projectaanvragen in het tweetalig taalgebied Brussel-Hoofdstad (Brussel). Het Departement WVG is momenteel bezig met de jurering van de aanvragen uit Vlaanderen; de VGC met de jurering van de aanvragen uit Brussel. Wat het consortium gecoördineerd door de KBS betreft (met effectieve start op 1 februari 2022), is de voorbereiding gestart. Op 21 en 22 oktober werd er samen met universiteiten, hogescholen, middenveldorganisaties (VVSG, VIVEL) nagedacht over de aanpak en de inhoud van een ondersteuning aan de projecten. Op basis van de input die toen collectief werd opgesteld, lanceerde de KBS op 7 december een vacature mbt coaches Zorgzame Buurten.</p>
Noodzakelijke politieke actie	<p>In december 2021 worden het BVR op basis waarvan een subsidie wordt toegekend aan de KBS als coördinator van het consortium van hogescholen, universiteiten en middenveldorganisaties (om de projecten zorgzame buurten te ondersteunen) alsook de overeenkomst die met de KBS zal worden afgesloten, ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Lancering projectoproep zorgzame buurten	2021 Q2	Gerealiseerd
Online inspiratie-/studienamiddag zorgzame buurten	2021 Q3	Gerealiseerd
Deadline indiening van alle projectaanvragen	2021 Q4	Gerealiseerd
Start minstens 100 projecten zorgzame buurten	2022 Q1	Nog niet gestart
Ontvangen van gedragen buurtanalyses en veranderingstheorieën van de projecten	2022 Q3	Nog niet gestart
We ontvangen per project eventuele bijgewerkte veranderingstheorie, eerste evaluatieblauwdruk, inhoudelijk en financieel verslag, voortgangsrapport	2023 Q2	Nog niet gestart
We ontvangen per project een bijgewerkte veranderingstheorie, uitgewerkte evaluatieblauwdruk en eerste dataverzameling, inhoudelijk en financieel verslag, eindrapport	2024 Q2	Nog niet gestart
Eindsymposium met kennisdeling	2024 Q2	Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal startende zorgzame buurtprojecten in Vlaanderen en Brussel	100	2022 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.119.000 EUR
Uitvoering VEK	174.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Versterking mentaal welzijn – zorgzame buurten
Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021: Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake zorgzame buurten
Beslissing van de VR van 10 december 2021 subsidie Koning Boudewijnstichting voor project 'zorgzame buurten'

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

30. Armoedebestrijding en wijkverbetering

VV145 - BUITENSCHOOLSE OPVANG ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Lokale besturen, sectoren onderwijs, cultuur, jeugd en sport, gezinnen en kinderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Groeipad vervroegen voor buitenschoolse opvang (vanaf schooljaar 2021-2022). Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) is in werking getreden in 2021. Hierbij komt de regierol inzake BOA bij de lokale besturen te liggen, inclusief de bevoegdheid om te beslissen over de besteding en verdeling van middelen. Echter, tijdens de overgangstermijn (2021-2026) behouden huidige organisatoren van buitenschoolse opvang hun subsidie via opgroeien. De Vlaamse regering voorziet alvast vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding vanaf 2023 en 2024 respectievelijk 3,3 miljoen en 3 miljoen euro een inzet van middelen, ter ondersteuning van de lokale besturen voor de (verdere) uitbouw van een geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten bij deze opdracht. Met dit project, is het mogelijk dit groeipad voor de lokale besturen te vervroegen naar 1 september 2021. Op die manier kan extra aanbod al worden opgestart vanaf de start van het schooljaar 2021-2022.</p> <p>Elke gemeente heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd. Door lokaal het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten af te stemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen, werkt men lokaal aan de drie doelstellingen van het decreet:</p> <ul style="list-style-type: none">- kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden bieden, inspelen op interesses en talenten- voor ouders: de combinatie werk, opleiding en gezin mogelijk te maken- bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften zich welkom voelt. <p>Bij de uitwerking van het decreet in 2019-2020, werden relevante stakeholders betrokken (lokale besturen, werkgevers en werknemersorganisaties vanuit welzijn, onderwijs, cultuur, jeugd en sport en vertegenwoordigers van gezinnen en kinderen)</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	11.400.000 EUR
Output	43 lokale besturen (goed voor ongeveer. 263.911 inwonende en schoolgaande kinderen) ontvangen vanaf 1 september 2021 een subsidie ter ondersteuning van de uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Lokaal wordt invulling gegeven aan de drie doelstellingen van het decreet. Daarbij: 1) Ontwikkelt het lokaal bestuur een lokaal beleid rond BOA op basis van de noden van kinderen en gezinnen, in samenspraak met relevante actoren 2) Beslist het lokaal bestuur over de besteding van de middelen, binnen het kader van het lokaal beleid in punt 1 3) De middelen worden ingezet voor de organisatie van de buitenschoolse opvang (o.m. kleuteropvang met een kwaliteitslabel) en afstemming met buitenschoolse activiteiten (samenwerking met jeugdwerk, sport...) om te komen tot een geïntegreerd en toegankelijk aanbod.
Outcome	Het voorziene groeipad wordt vervroegd. Lokale besturen met een hoog percentage kwetsbare gezinnen, hoog aantal schoolgaande kinderen en op heden weinig subsidies voor buitenschoolse opvang, kunnen hierdoor vervroegd aan de slag met de doelstellingen van het decreet (zie drie punten bij projectomschrijving)
Beoogde impact	Aandeel bevolking onder de armoederempel - Werkzaamheidsgraad

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle lokale besturen die in aanmerking kwamen voor de subsidie, dienden een ontvankelijke aanvraag in. Deze 43 lokale besturen ontvangen sinds 01/09/2021 de BOA-subsidie.
Noodzakelijke politieke actie	Geen actie meer nodig

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Eerste principiële goedkeuring besluit Vlaamse Regering over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten en subsidies Vooraankondiging subsidies voor lokale besturen	2021 Q2	Gerealiseerd
Lancering oproep BOA-subsidie (zie opgroeien.be/boa/partners/de-boa-subsidie-aan-lokale-besturen)	2021 Q3	Gerealiseerd
Toekenning BOA-subsidie	2021 Q4	Gerealiseerd

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen dat vanaf september 2021 een BOA-subsidie ontvangt en de eerste financiële middelen krijgt ifv de doelstellingen van het decreet (afhankelijk van ingediende aanvragen en ev. reservelijst)	43	2021 Q4	43	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	11.400.000 EUR
Uitvoering VAK	11.400.000 EUR
Uitvoering VEK	2.100.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 11.400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
BVR van 7/09/2021 over het lokaal beleid, de samenwerking en de subsidievoor buitenschoolse opvang en activiteiten

VV146 - COMPENSATIEBESLUIT KO - EXTRA TUSSENKOMST IKT (INKOMENSTARIEF)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien
Belanghebbenden	Ouders die kinderopvang gebruiken in een opvang waar men volgens inkomen kan betalen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>In het kader van kinderopvang kunnen gezinnen bij organisatoren die de subsidie voor inkomenstarief ontvangen van het agentschap Opgroeien regie voor de opvang een prijs betalen op basis van hun inkomen. De regelgeving voorziet de mogelijkheid voor gezinnen die zich in bepaalde specifieke situatie bevinden om een individueel verminderd tarief aan te vragen. Naar aanleiding van de COVID-19- pandemie werden heel wat gezinnen geconfronteerd met een inkomensdaling. Om voor die gezinnen de financiële drempel om hun kind naar de opvang te laten gaan, te verlagen, is beslist om een bijkomend specifiek COVID-tarief te voorzien. Om in aanmerking te komen, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin bedraagt minder dan 44.493,57 euro - bruto maandinkomen van het gezin van de maand voor de aanvraag van het COVID-tarief is 10% lager dan 1/12 van het gezamenlijk belastbaar inkomen <p>In dat geval ontvangt een ouder een korting van 25% op zijn berekend inkomenstarief, met een minimum van het standaard minimumtarief.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	975.000 EUR
Output	Bij de bepaling van het benodigde budget voor deze maatregel hebben we ons gebaseerd op het aantal attesten die er zijn tussen de inkomensgrenzen. Om de maximale mogelijke financiële impact hebben we ons gericht op de attesten inkomenstarieven met de hoogste tarieven met de inschatting dat 1 op 3 ouders binnen de aangehaalde financiële grenzen vallen en effectief een covid-tarief zouden kunnen aanvragen. Dit gaat over circa 14.600 attesten inkomenstarief.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Outcome	kinderen die voorheen omwille van de coronacrisis niet meer naar de kinderopvang kwamen, worden terug opgevangen in de kinderopvang kinderen die voorheen omwille van de coronacrisis minder naar de kinderopvang kwamen, worden terug opgevangen in de kinderopvang volgens het initiële opvangplan
Beoogde impact	Aantal gebruikers van de kinderopvang - Tewerkstelling bij de opvang van baby's en peuters en in de buitenschoolse opvang waar er gewerkt wordt met het systeem van inkomenstarief

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	<p>Uit de evaluatie bleek dat de maatregel slechts beperkt werd gebruikt: 6% (114.160 EUR). Het saldo van de relancemiddelen (860.840 EUR) werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.</p> <p>Ouders hebben niet meer de mogelijkheid om een attest inkomenstarief met covid-tarief aan te vragen. Er kunnen nog aanwezigheidsregistraties aangeleverd door de kinderopvangvoorzieningen, verwerkt worden door Opgroei en regie in functie van subsidiëring.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Voor de komende periode wordt er een evaluatie voorzien en wordt er nagegaan of een verlenging van de maatregel aangewezen is.	2021 Q2	Gerealiseerd
Voor de komende periode wordt er een evaluatie voorzien & wordt er nagegaan of een verlenging en/of bijsturing van de maatregel aangewezen is om dezelfde doelstellingen te realiseren en/of hetzelfde doelpubliek te bereiken.	2021 Q3	Gerealiseerd
Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slechts beperkt werd gebruikt (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.	2021 Q4	Gerealiseerd

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal aangevraagde attesten inkomenstarief met covid-tarief In het kader van kinderopvang	14.600	2021 Q4	1.015	6 %
Diverse maatregelen compensatie Corona – initiatieven kinderopvang	860.840 EUR	2021 Q4	860.840	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	975.000 EUR
Uitvoering VAK	975.000 EUR
Uitvoering VEK	975.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 975.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV147 - DOORGAANDE LIJN KINDEROPVANG – ONDERWIJS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Basisgedachte van dit project is de doorgaande lijn in de ontwikkeling van baby's en peuters tot het einde van de kleutertijd, van nul tot zes jaar, tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kleuteropvang, in verbinding met thuis en met de buurt en over beleidsdomeinen heen.

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Kinderen en alle betrokkenen hebben baat bij zoveel mogelijk continuïteit. Zowel kind als ouder voelen zich veilig en gekend, omdat ze omringd worden door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving

Vanaf het schooljaar 2021-2022 bieden we ruimte aan initiatiefnemers en pioniers die zich in de willen inzetten op een doorgaande lijn van kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kleuteropvang. Daarbij bekijken we hoe verbinding kan worden gemaakt met thuis en de buurt, o.a. de Huizen van het Kind. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de taalontwikkeling en de verwerving van de Nederlandse taal.

Daarvoor zetten we een projectoproep op voor 12 pioniers, ondersteund door externe projectbegeleiding en opgevolgd door een begeleidingscomité, samengesteld uit diverse stakeholders uit beleid, praktijk en onderzoek. De expertise die de pioniers opbouwen wordt gedeeld in het lerend netwerk en moet toelaten om goede praktijken in kaart te brengen, (verder) te ontwikkelen en te dissemineren, om noodzakelijke voorwaarden aan te pakken en om, op basis van een grondige evaluatie, te komen tot beleidsaanbevelingen met het oog op reguliere verankering.

Dit project sluit aan bij de aanbeveling van het Maatschappelijk Relancecomité om proeftuinen op te zetten rond geïntegreerde projecten kinderopvang/(kleuter)onderwijs waarbij ook buitenschoolse activiteiten worden betrokken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	1.800.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - 12 pioniers (samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal 3 kernpartners met name organisator kinderopvang, kleuterschool en buitenschoolse opvang en activiteiten) ontvangen 45.000€/jaar subsidies om gedurende drie jaar (jan 2022 - dec 2024) te groeien naar een meer geïntegreerde werking - 12 pioniers realiseren de doelstellingen van het individuele project en komen samen (binnen lerend netwerk) tot een gedeeld praktijkmodel - een ondersteuningstraject is opgezet (o.a. individuele ondersteuning van de pioniers en opzet van een lerend netwerk) - een stuurgroep (samengesteld uit diverse relevante partners uit praktijk, onderzoek en beleid) is samengesteld en volgt de voorgang van het project
Outcome	Ontwikkeling van een concept en praktijkmodel(len) voor het verwezenlijken van een doorgaande lijn tussen kinderopvang, kleuteronderwijs en kleuteropvang. Het gaat hier om een pedagogisch concept waarin leren, zorg, opvoeding en spelen met elkaar zijn verbonden, in samenwerking met alle betrokken partners in het lokaal samenwerkingsverband en met een diverse groep van ouders met kinderen.
Beoogde impact	Aandeel vroegtijdige schoolverlaters

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De oproep voor de 12 pioniers is afgesloten op 15 oktober 2021. 52 projectdossiers zijn ingediend en verwerkt door een jury, samengesteld uit Opgroeien, Onderwijs (AGODI en Onderwijsinspectie), en de leerpartner. De beslissing is genomen eind november en de verdere verwerking (advies IF, communicatie naar projectindieners) is afgerond tegen ten laatste 24 december 2021.</p> <p>De voorbereiding voor de stuurgroep kent voortgang: de voorzitter is aangesteld met akkoord van beide kabinetten (Welzijn en Onderwijs). De vraag aan de (bij BVR vastgelegde) organisaties is lopende: de leden zullen bij naam gekend zijn tegen 20 december 2021. Koepels, sociale partners en gebruikers worden op deze wijze actief betrokken.</p> <p>De voorbereidingen voor de opstart van het lerend netwerk en eerste stuurgroep bijeenkomst (19 januari 2022) worden genomen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang	2021 Q1	Gerealiseerd
Bestek 'leerpartner' voor het begeleiden van het ondersteuningstraject (ondersteuning 12 pioniers binnen een lerend netwerk)	2021 Q2	Gerealiseerd
Oproep Pioniers Doorgaande Lijn	2021 Q3	Gerealiseerd
Jurering en toekenning 12 projecten	2021 Q4	Op schema
Opstart 1e fase van het traject (jan 2022 - aug 2023)	2022 Q1	Nog niet gestart
Stuurgroep samengesteld, opdracht en mandaat gekend	2021 Q4	Op schema
verdiepende analyse met o.a. inventarisatie van drempels en bijsturen van het ondernemingsplan (pioniers)	2022 Q3	Nog niet gestart
Co-creëren van een gedeeld inhoudelijk kader voor de pilootprojecten (lerend netwerk)	2022 Q4	Nog niet gestart
zelfevaluatie en (financiële) rapportering 1e projectjaar (pioniers)	2023 Q1	Nog niet gestart
vorm geven aan regelluw kader voor de 2e fase (project- en stuurgroep)	2023 Q2	Nog niet gestart
implementatie van een vernieuwde geïntegreerde werking binnen huidige regelgevende kader (pioniers)	2023 Q2	Nog niet gestart
zelfevaluatie en (financiële) rapportering 2 projectjaar (pioniers)	2024 Q1	Nog niet gestart
implementatie van een vernieuwde geïntegreerde werking binnen het ontwikkelde regelluw kader (pioniers)	2024 Q2	Nog niet gestart
ontwikkelen en documenteren van praktijkmodellen; formuleren van beleidsaanbevelingen	2024 Q4	Nog niet gestart
eindevaluatie en (financiële) eindrapportage project	2025 Q1	Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Tussentijdse evaluatie van de 12 pioniers: 12 uitgewerkte ondernemingsplannen met concrete doelstellingen en aanpak en met voorstellen tot afwijking van de bestaande sectorale regelgeving		2022 Q3		
12 gerealiseerde projecten Doorgaande Lijn		2024 Q4		
Eindrapport met o.a. de ontwikkeling van een praktijkmodel Doorgaande Lijn, geïllustreerd vanuit de 12 pioniers en met concrete beleidsaanbevelingen.		2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.800.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000 EUR
Uitvoering VEK	5.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang
Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang. Bijlage

VV148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Herw!n vzw, sociale distributieplatformen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

De COVID-19 crisis heeft het belang van voedselbedeling voor een belangrijke kwetsbare doelgroep van mensen in armoede bevestigd. Op dit ogenblik zijn in Vlaanderen een aantal sociale distributieplatformen actief die een cruciale rol opnemen in de verdeling van voedsel(overschotten) naar organisaties die het voedsel lokaal bezorgen aan mensen in armoede die hier nood aan hebben. Vaak zetten deze platformen ook doelgroepmedewerkers in voor de uitvoering van hun activiteiten.

Vlaanderen subsidieert momenteel op projectmatige basis enkele van deze distributieplatformen. Deze subsidies lopen af midden 2021. Gelet op het bewezen nut van deze platformen, zal werk gemaakt worden van een structurele verankering van dergelijke distributieplatformen. In afwachting van dit structureel kader dat er ten vroegste in 2024 zal zijn, is het belangrijk de huidige distributieplatformen te blijven ondersteunen.

Het project betreft daarom concreet in eerste instantie het uitwerken van een financieringskader voor de periode 2021-2025 waarbij er zowel oog is voor de leefbaarheid van de huidige platformen als voor het vergroten van het werkingsgebied waarbinnen de platformen actief zijn, dit door uitbreiding van hun bestaande werkingsgebieden of waar nodig het opzetten van nieuwe platformen. Want het aanbod is op dit ogenblik niet Vlaanderen-dekkend.

In tweede instantie betreft dit project dan de effectieve financiering van de sociale distributieplatformen, conform het uitgewerkt financieringskader, dit met het oog op een duurzame verderzetting van deze platformen na 2025. Naast 2.400.000 euro Vlaamse relancemiddelen, wordt ook 400.000 euro reguliere middelen ingezet voor dit project.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	2.400.000 EUR
Output	In elke referentieregio in het Vlaamse Gewest wordt een distributieplatform gesubsidieerd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Outcome	<p>Elke organisatie in het Vlaamse Gewest die voedsel bedeed aan mensen in armoede, kan een beroep doen op een sociaal distributieplatform. Er zal dus een stijging zijn van het aantal organisaties dat een beroep doet op een sociaal distributieplatform.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daling in ton van voedselverspilling • Stijging in ton van voedseloverschotten dat terecht komt bij mensen in armoede • Stijging van het aantal doelgroepmedewerkers actief in de sectoren actief in de herbestemming van voedseloverschotten
Beoogde impact	Aandeel bevolking onder de armoededrempel

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het financieringskader is uitgewerkt en neergeschreven in een projectoproep die op 27 juli 2021 is gelanceerd. Initiatiefnemers kunnen intekenen op de projectoproep uiterlijk op 30 september 2021. Er werden 14 projectaanvragen ingediend.
Noodzakelijke politieke actie	Toekenning van een subsidie aan 12 projecten i.k.v. projectoproep 'sociale distributieplatformen naar voedselhubs 2021 dient door de Vlaamse Regering goedgekeurd te worden

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Uittekenen van het financieringskader voor sociale distributieplatformen voor de periode 2021-2025.	2021 Q3	Gerealiseerd		
Projectmatige subsidiëring van sociale distributieplatformen	2021 Q4	Op schema		
Uitvoering van de projecten	2025 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal referentieregio's (er zijn 17 referentieregio's) betrokken in goedgekeurde projecten	17	2021 Q4	80	80 %
Aantal sociale distributieplatformen (streefwaarde is maximum)	15	2021 Q4	80	80 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gemeenten die beroep kunnen doen op de diensten van een sociaal distributieplatform	300	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.400.000 EUR
Uitvoering VAK	2.400.000 EUR
Uitvoering VEK	15.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidiëring en ondersteuning van de lokale besturen in functie van het realiseren van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal in heel Vlaanderen en Brussel. 16/07/2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Samenwerkingsverbanden GBO bestaande uit OCMW, CAW en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project past in de implementatie van een nieuw beleid en nieuwe regelgeving gericht op 1) drempelverlaging van de Vlaamse hulp- en dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen en 2) bestrijding van onderbescherming bij kwetsbare doelgroepen door proactieve rechtendetectie en -realisatie. Dit nieuw beleid wordt in de praktijk onder meer vorm gegeven door de oprichting van samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), bestaande uit OCMW's, het centrum algemeen welzijnswerk actief in het werkingsgebied en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Vanaf 2020 wordt de opstart en uitbouw van een beperkt aantal samenwerkingsverbanden GBO financieel ondersteund. Er is ook een divers ondersteuningsaanbod ontwikkeld.

Met het project wordt de uitrol van het Geïntegreerd Breed Onthaal in Vlaanderen gerealiseerd. Dit behelst concreet de financiële ondersteuning van de samenwerkingsverbanden GBO waar dit nu nog niet het geval is, zodat uiterlijk eind 2022 overal in Vlaanderen samenwerkingsverbanden GBO kunnen worden opgestart en eind 2025 overal in Vlaanderen deze samenwerkingsverbanden operationeel zijn. Voor de berekening van de hoogte van de toe te kennen subsidies, wordt gebruik gemaakt van het kader opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.

Binnen dit project zal het ontwikkelde ondersteuningsaanbod opgeschaald worden, zodat dit aanbod ook beschikbaar en bereikbaar komt voor de nieuwe samenwerkingsverbanden GBO.

Tenslotte zal binnen dit project de nodige aandacht gaan naar de uitwerking van regelgeving op het vlak van gegevensdeling naar en binnen GBO-samenwerkingsverbanden, rekening houdend met de doelstellingen van de samenwerkingsverbanden en de geldende regels inzake beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	7.500.000 EUR
Output	Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gesubsidieerd wordt. Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gebruikt maakt van het ondersteuningsaanbod.
Outcome	(1) Snellere detectie van psychosociale noden en toeleiding naar de gepaste hulp en (2) snellere detectie van onderbescherming, en realiseren van rechten
Beoogde impact	Aandeel bevolking onder de armoededrempel

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Subsidie is toegekend aan 15 samenwerkingsverbanden GBO voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteit “het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal”, aan SAM vzw en VVSG voor de ondersteuning van de samenwerkingsverbanden GBO en aan VGC voor het project “Geïntegreerd Breed Onthaal Brussel 2021-2025: Welzijn op school”
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning van subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO begin 2020 en die als voldoende beoordeeld zijn door de jury	2021 Q3	Gerealiseerd
Toekenning van subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een nieuwe aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO begin 2020	2022 Q1	Op schema
Toekenning van subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een aanvullende aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO	2022 Q1	Op schema
Opschaling en beschikbaar en bereikbaar maken van het ondersteuningsaanbod	2022 Q4	Gerealiseerd
Regelgevend kader gegevensdeling naar en binnen samenwerkingsverbanden GBO	2022 Q4	Op schema

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gesubsidieerd wordt met deze subsidie	31	2022 Q1	50	50 %
Aantal samenwerkingsverbanden dat gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod	58	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	3.871.000 EUR
Uitvoering VEK	424.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: Subsiëring en ondersteuning van de lokale besturen in functie van het realiseren van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal in heel Vlaanderen en Brussel. 16/07/2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV150 - WIJKVERBETERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Een wijkverbeteringscontract is een engagementsverklaring waarbij de Vlaamse overheid en het lokale bestuur (met lokale partners) de gemeenschappelijke uitdaging aangaan om problematieken in kwetsbare wijken aan te pakken en deze engagementen vervolgens om te zetten in concrete acties. Er wordt in 2021 een oproep gelanceerd die de lokale besturen uitnodigt tot het indienen van voorstellen.

Zowel de betrokken lokale besturen als de Vlaamse entiteiten en agentschappen engageren zich om de problematieken in deze wijken te doorbreken en de aanwezige kansen te benutten dankzij een gezamenlijke aanpak met vernieuwende instrumenten.

Met de subsidie kan het lokale bestuur zich laten ondersteunen met de inzet van expertise, personeel, werking en beperkte investeringen met het oog op concrete realisaties en dit binnen een termijn van maximaal 4 jaar na de start van het wijkverbeteringscontract.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	4.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - De engagementen zoals geformuleerd in de besluiten van de Vlaamse Regering worden geconcretiseerd aan de hand van een aantal maatregelen en dit op maat van de betrokken wijk. - De concrete maatregelen worden duidelijk afgebakend en maken deel uit van een geïntegreerde aanpak van de kwetsbare wijk. - Inzet van vernieuwende elementen binnen samenwerkingen, publieke dienstverlening, inzet van technologie, coproductie, ... - Voor elk wijkverbeteringscontract wordt een governance ontplooid die de uitvoering bewaakt en aanstuurt, met o.a. een klankbordgroep en een stuurgroep
Outcome	- Gaandeweg de doorlooptijd van het wijkverbeteringscontract worden de noodzakelijke acties om de kwetsbaarheid van de betrokken wijken steeds

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	<p>duidelijker en concreter</p> <ul style="list-style-type: none"> - De (eerste) acties leveren concrete en aantoonbare resultaten op zowel ten aanzien van de wijk als haar kwetsbare bewoners. - Nauwe opvolging van de projecten aan de hand van jaarlijkse voortgangsrapportages en een evaluatierapport op het einde van de rit
Beoogde impact	INVESTEREN IN MENSEN EN TALENTEN - ECONOMIE EN SAMENLEVING VERDUURZAMEN - ANDERE

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De oproep naar wijkverbeteringscontracten is afgelopen. Er werden 20 aanvraagdossier ingediend. Deze aanvragen werden beoordeeld door een jury. 11 wijkverbeteringscontracten werden weerhouden voor een subsidie.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	2021 Q1	Gerealiseerd
Jury: selectie van een beperkt aantal wijkverbeteringscontracten	2021 Q3	Gerealiseerd
Goedkeuring door de Vlaamse Regering van de geselecteerde wijkverbeteringscontracten	2021 Q4	Gerealiseerd
Tweejaarlijks vooruitgangsrapport betreffende de uitvoering van de wijkverbeteringscontracten van de bevoegde minister aan de Vlaamse Regering		Nog niet gestart
Jaarlijkse vooruitgangsrapport door de stuurgroep van elk wijkverbeteringscontract		Nog niet gestart
Lancering van de oproep naar wijkverbeteringscontracten		Gerealiseerd
Evaluatierapporten na het verstrijken van de wijkverbeteringscontracten		Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal subsidieaanvragen	20	2021 Q3	20	100 %
Start van de 11 wijkverbeteringscontracten		2022 Q1		
Stuurgroepen van de wijkverbeteringscontracten	minstens halfjaarlijks	2022 Q2		
jaarlijks voortgangsrapport van de stuurgroep	jaarlijks	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.200.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 26 februari 2021 - Goedkeuring kader oproep Goedkeuring Vlaamse Regering op 17/12/2021 subsidiëring projecten oproep wijkverbeteringscontracten

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV151 - WIJKVERBETERINGSCONTRACTEN - INTEGRALE KETENAANPAK WELZIJN-JUSTITIE-
LOKALE BESTUREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Opgroeien, lokale besturen, lokale actoren breed: politie, justitie, jeugd(welzijns-)werk, buurtwerk, hulpverlening.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Buurtgerichte relanceprojecten op kruispunt lokale besturen – welzijn – justitie Projectsubsidie</p> <ul style="list-style-type: none"> · Voorkomen dat jongeren, jongvolwassenen met een risicoprofiel verglijden naar of hervallen in een criminele levensstijl ('veelplegers') en ingesloten geraken in criminele netwerken. · Bundelen van beschikbare capaciteit in een efficiënt, gestructureerd samenwerkingsverband om systematische, individuele exit-strategieën te bepalen. · Onveiligheid, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in de buurt verminderen <p>We bundelen de krachten voor een integrale ketenaanpak. Het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht biedt bijkomende mogelijkheden om snel en constructief te reageren op jeugddelinquentie, ook op het niveau van het openbaar ministerie. In het Vlaams Regeerakkoord schuiven we de lokale, buurtgerichte aanpak justitie-politie-welzijn sterk naar voren voor een geïntegreerd beleid naar jongeren. In het kader van relance – plan Veerkracht en Herstel geven we lokale initiatieven een bijkomende impuls om te innoveren en goede praktijken van integrale ketenaanpak een doorstart te geven. Hieronder worden de contouren beschreven voor een oproep aan de lokale besturen en partners justitie-politie-welzijn.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	1.125.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - aantal opgestarte projecten in Vlaanderen; - bereik van doelgroep: aantal jongeren conform doelgroepomschrijving bereikt in de projecten; - aantal bereikte situaties jeugddelict binnen de verschillende projecten - output in

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	termen van aantallen vast te leggen (Q 1 2022) - aantal lokale partners: met volledige dekking van de minimale partners; - outputindicatoren nader te definiëren in overleg met de projecten;
Outcome	- voortgang op basis van doelstellingen: de mate van opleiding/werk, woon- en leefsituatie, politiecontacten, overgang van min- meerderjarigheid; - outcome-indicatoren verfijnen met de 5 projecten (Q 1 2022);
Beoogde impact	HET VLAAMSE ZORG- EN WELZIJNSSYSTEEM VERSTERKEN - INVESTEREN IN MENSEN EN TALENTEN - Werkzaamheidsgraad - Aandeel vroegtijdige schoolverlaters - ANDERE

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Sinds de agendering op de Vlaamse Regering zijn alle processtappen in de voortgang gerealiseerd. Met name de selectie van de projecten, de opstart van de lokale projecten en Vlaams overleg in functie van de voortgang werden gerealiseerd in 2021. De lokale projectopvolging loopt met betrokkenheid van de Vlaamse overheid (Opgroeien) voor opvolging .
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Mededeling Vlaamse Regering integrale ketenaanpak jongeren op snijvlak welzijn-justitie en lokale besturen naar jongeren en jongvolwassen in samenwerking met Binnenlands Bestuur en Justitie en Handhaving	2021 Q1	Gerealiseerd
Projectoproep lanceren	2021 Q2	Gerealiseerd
Besluitvorming en selectie van vijf projecten	2021 Q3	Gerealiseerd
Opstart en subsidiebesluit van de 5 geselecteerde projecten: Antwerpen, Genk, Gent, Kortrijk, Mechelen	2021 Q3	Gerealiseerd
Opstart inhoudelijke afstemming van de 5 geselecteerde Vlaamse projecten	2021 Q4	Gerealiseerd
Werkafspraken en kalender in functie van opvolging van projecten	2022 Q1	Op schema

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal opgestarte projecten	5	2021 Q3	5	100 %
Aantal jongeren (doelgroep jongvolwassenen) bereikt in de 5 projecten		2022 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.125.000 EUR
Uitvoering VAK	1.125.000 EUR
Uitvoering VEK	69.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.125.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 12 maart 2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV152 - PROJECTOPROEP KWETSBARE KINDEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kinderen en jongeren, (boven)lokale jeugdwerkinitiatieven, (boven)lokale sport-, cultuur- en welzijnsinitiatieven, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” zet in op het versterken van het mentaal welbevinden en de sociale cohesie in de samenleving. Eén van projecten binnen het deelluik “Armoedebestrijding en wijkverbetering” richt zich tot kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.</p> <p>De doelstelling van deze projectoproep is de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te versterken door samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen ruimte en zuurstof biedt om binnen een gevarieerde, zinvolle, creatieve vrijetijdsbeleving jong te zijn. Dit perspectief draagt ertoe bij dat elke kind en elke jongere zijn of haar plaats vindt in de vrije tijd waardoor de sociale cohesie met hun leeftijdsgenoten, buurt en de maatschappij wordt aangehaald en/of versterkt.</p> <p>De focus ligt op het stimuleren van innovatieve vormen van laagdrempelig en vindplaatsgericht werken, waaronder vernieuwende technieken van fysiek en digitaal outreachend werken en out-of-the-box activiteiten, binnen (boven)lokale netwerken die kinderen en jongeren in kwetsbare situaties bereiken en aanspreken.</p> <p>Naast de resultaten van de projecten zelf worden de gehanteerde methodieken gemonitord en geanalyseerd, met het oog op een duurzame bredere aanpak, opschaling en bredere uitrol in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijken, randvoorwaarden oplossingsstrategieën en werkzame methodieken die innovatief, toeleidend en effectief werkzaam zijn, worden inhoudelijk en methodologisch in kaart gebracht en opgevolgd, zowel op niveau van de netwerken zelf als voor Vlaanderen en Brussel.</p> <p>De projectoproep biedt hefboomen aan lokale en bovenlokale netwerken om hun werking inhoudelijk te verdiepen, te innoveren of hun werkingen geografisch of functioneel te verbreden</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

en/of uit te bouwen.

De minister heeft beslist om naast de relancemiddelen (3 miljoen euro) ook 801.794 euro reguliere middelen (2021) vrij te maken om deze projectoproep te ondersteunen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	3.000.000 EUR
Output	Financiering van 29 projecten ter versterking van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
Outcome	Sterkere lokale en bovenlokale netwerken van organisaties en lokale besturen die de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties versterken door samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen ruimte en zuurstof biedt om binnen een gevarieerde, zinvolle, creatieve vrijetijdsbeleving jong te zijn
Beoogde impact	INVESTEREN IN MENSEN EN TALENTEN

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Projecten zijn opgestart. Aanbesteding voor intervisietraject is gebeurd (opstart in 2021).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Goedkeuring projectoproep door Vlaamse Regering	2021 Q1	Gerealiseerd
Lancering van de projectoproep	2021 Q2	Gerealiseerd
Verzamelen projectvoorstellen	2021 Q2	Gerealiseerd
Beslissing goedkeuring projecten	2021 Q3	Gerealiseerd
Opstart projecten door lokale en bovenlokale netwerken	2021 Q4	Gerealiseerd
Start intervisietraject	2022 Q1	Op schema
Projecten uitgevoerd	2023 Q3	Op schema

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde projecten in het kader van projectoproep kwetsbare kinderen	25	2021 Q4	29	116 %
Aantal gerealiseerde projecten per provincie en BHG in het kader van projectoproep kwetsbare kinderen	3	2021 Q4	4	133 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	467.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 26 februari 2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

31. Investerings audiovisuele sector

VV153 - GARANTIEFONDS VOOR DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle - Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Een belangrijke voorwaarde voor de heropstart van de audiovisuele sector in Vlaanderen is dat er een oplossing komt voor het verzekeren van audiovisuele producties. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het voor producenten immers onmogelijk geworden om schade en annuleringskosten als gevolg van pandemieën te verzekeren. Het risico bestaat dat een productie moet worden stopgezet door besmetting van onvervangbare cast- of crewleden of door overheidsmaatregelen tijdens een besmettingsgolf. Dat kan leiden tot onvoorziene kosten, die nu door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Om onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen te dekken, wordt een garantiefonds gelanceerd voor Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties. Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 200 geregistreerde Vlaamse film- of televisieproducties bij het garantiefonds
Outcome	Het aantal Vlaamse film- en televisieproducties die dankzij het garantiefonds kunnen opstarten doordat ze gedekt zijn tegen onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Het aantal producties die schade ondervonden hebben als gevolg van de COVID-19-maatregelen en waarvoor de schadeclaims zijn uitbetaald.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Aantal Vlaamse films/series/games/ondersteund met Vlaamse overheidsmiddelen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Regering heeft op 5 februari 2021 haar goedkeuring gegeven aan de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds met betrekking tot het garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector. Sinds 9 februari kunnen producenten hun producties registreren bij het VAF, zodat ze in geval van schade door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Tot nu toe werd slechts een schadevergoeding aan een productie toegekend onder het garantiefonds.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Oprichting garantiefonds via een overeenkomst met het Vlaams Audiovisueel Fonds	2021 Q1	Gerealiseerd		
Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties worden ondersteund door het garantiefonds bij onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen.	2022 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal geregistreerde Vlaamse film- of televisieproducties bij het garantiefonds	200	2022 Q4	128	64 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	201.283 EUR
Uitvoering VEK	201.283 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Beslissing van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: Overeenkomst garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV154 - IMPULS AAN VAF FILMFONDS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Vlaams Audiovisueel Fonds; audiovisuele sector

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Via een financiële impuls aan het VAF Filmfonds wordt de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse films en de vertoning ervan gestimuleerd. Tijdens de COVID-19-crisis is immers gebleken dat er in de audiovisuele sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale filmproducties. Ook de bioscoopdistributie- en exploitatiesector ondergaan rechtstreeks de korte en lange termijneffecten van de COVID-19-maatregelen. De extra middelen voor het VAF Filmfonds worden via een 40%-60% ratio verdeeld over respectievelijk 2021 en 2022.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 70 filmproducties en initiatieven binnen de publiekswerking worden door het VAF ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.
Outcome	Versterking van de Vlaamse audiovisuele sector
Beoogde impact	Aantal Vlaamse films/series/games/ondersteund met Vlaamse overheidsmiddelen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Regering heeft op 2/04/2021 haar goedkeuring gegeven aan het addendum bij de beheersovereenkomst 2018-2021 van het VAF - Filmfonds. Een nieuwe beheersovereenkomst m.b.t. het VAF/Filmfonds voor de periode 2022-2025 werden op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Hierin werden specifieke bepalingen opgenomen betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Addendum aan de beheersovereenkomst 2018-2021 voor de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2021 i.h.k.v. de relance aan het VAF/Filmfonds.	2021 Q2	Gerealiseerd		
Opname van bepaling betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance aan het VAF/Filmfonds in de nieuwe beheersovereenkomst 2022-2025.	2021 Q4	Gerealiseerd		
Alle relancemiddelen werden via het VAF/Filmfonds toegekend aan filmproducties en initiatieven binnen de publiekswerking.	2022 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal filmproducties en -organisaties die door het VAF worden ondersteund met de bijkomende relancemiddelen	70	2022 Q4	47	67 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Be slissing van de Vlaamse Regering van 2 april 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: Addendum beheersovereenkomsten 2018-2021 met het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw
Beslissing van de Vlaamse Regering van 17 december 2021: Goedkeuring beheersovereenkomst 2022-2025 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds m.b.t. het VAF/Filmfonds

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV155 - IMPULS AAN VAF MEDIAFONDS EN GAMEFONDS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Audiovisueel Fonds en de Vlaamse audiovisuele en gamesector

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Via een financiële impuls aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds wordt de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse televisiereeksen en games gestimuleerd. Tijdens de COVID-19 crisis is immers gebleken dat er in de sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale audiovisuele producties en games.

De extra middelen voor het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds zullen via een 40/60 ratio verdeeld worden over respectievelijk 2021 en 2022, om zo met een groter budget te kunnen aansluiten bij de nieuwe beheersovereenkomsten 2022-2025.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 20 audiovisuele producties (televisiereeksen en games) worden door het VAF ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.
Outcome	Versterking van de Vlaamse audiovisuele en gamesector
Beoogde impact	Aantal Vlaamse films/series/games/ondersteund met Vlaamse overheidsmiddelen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse Regering heeft op 2/04/2021 haar goedkeuring gegeven aan het addendum bij de beheersovereenkomst 2018-2021 van het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds.</p> <p>Nieuwe beheersovereenkomsten m.b.t. het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor de periode 2022-2025 werden op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hierin werden specifieke bepalingen opgenomen betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Addendum aan de beheersovereenkomst VAF 2018-2021 voor de toekenning van de bijkomende financiering vanuit relance aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor het werkjaar 2021.	2021 Q2	Gerealiseerd		
Bepaling in de nieuwe beheersovereenkomst VAF 2022-2025 voor de toekenning van de bijkomende financiering vanuit relance aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor het werkjaar 2022.	2021 Q4	Gerealiseerd		
Alle relancemiddelen werden via het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds toegekend aan audiovisuele producties (televisiereeksen en games).	2022 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal audiovisuele producties (televisiereeksen en games) die door het VAF worden ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.	25	2022 Q4	11	55 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Beslissing van de Vlaamse Regering van 2 april 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: Addendum beheersovereenkomsten 2018-2021 met het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

32. Jeugdinfrastructuur

VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Het Vlaams Jeugdwerk en bij uitbreiding Vlaamse jongeren

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	32. Jeugdinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Specifiek voor de investeringen in jeugdinfrastructuur werd in het plan Vlaamse Veerkracht een totaalbudget van 30 miljoen euro voorzien voor volgende projecten:</p> <p>A. Investeren in de eigen infrastructuur Hoge Rielen en Destelheide:</p> <p>In de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gerealiseerd waarmee De Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen, de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen ADJ vzw als bouwheer, Het Facilitair Bedrijf als mandataris en het Departement Cultuur, Jeugd en Media als eigenaar van de infrastructuur en als vertegenwoordiger van de subsidiërende overheid. Het projectbudget wordt geraamd op 8.538.866,10 euro incl BTW.</p> <p>Met de relancemiddelen kan ook de effectieve realisatie van het Masterplan voor Destelheide, opgesteld in 2014, versneld verder uitgevoerd worden. Voor het nieuwe paviljoen en de vernieuwing van de slaapblokken in Destelheide kan er 6,8 miljoen euro incl. BTW vastgelegd worden in 2021 en 2022. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media treedt op als bouwheer.</p> <p>B. Optimalisatie aanbod ULDK</p> <p>Door relancemiddelen toe te voegen aan het recurrente budget kan de stock aan seniortenten verhoogd worden met ca. 155 en de stock aan patrouilletenten vernieuwd en verhoogd worden met ca. 240. Dit laatste is een absolute noodzaak want de meest recente aankoop van binnententen dateert van 2012. Bijkomend kunnen ca. 150 extra buitenzeilen voor patrouilletenten worden aangekocht.</p> <p>Door de verhoging van de stock dient de inrichting van het magazijn te worden geoptimaliseerd.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Een klein deel van de middelen wordt daaraan besteed. In 2021 kan er voor de aankoop van tenten en de optimalisatie van het magazijn bijkomend 1.050.000 euro incl. BTW worden vastgelegd.

C. Project gratis energiescans en quick wins voor jeugdwerkinfrastructuur

In samenwerking met Pulse Transitienetwerk Cultuur, Jeugd, Media en het Vlaams Energiebedrijf worden gratis energiescans aangeboden voor organisaties met rechtspersoon zonder commercieel oogmerk, die beschikken over eigen jeugdinfrastructuur of er een langdurig gebruiksrecht op hebben. Het proefproject in 2020 leverde 26 scans op met hoopvolle resultaten richting maatregelen die bij het begeleidingstraject door VEB worden aangereikt. De geraamde kosten voor de verderzetting van dit project in 2021 en 2022 door Pulse bedragen 445.000 euro (+/- 100 scans en begeleiding), waarvan 312.000 euro relancemiddelen. Voor structurelere maatregelen kunnen de organisaties met bovenlokale jeugdinfrastructuur een aanvraag indienen voor de investeringssubsidies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, indien het project voldoet aan de formele en specifieke voorwaarden. Organisaties met infrastructuur die niet in aanmerking komen voor een Energiescan, zullen ondersteund worden voor het nemen van maatregelen met een hoge impact op korte termijn (quick wins). Deze organisaties kunnen subsidie ontvangen tot 80% van de totale geraamde kostprijs van de quick wins (minimaal 20% eigen inbreng). Voor de quick win-maatregelen is een budget van in totaal 1 miljoen euro voorzien, gespreid over 2021 en 2022.

D. Investeren in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur

Deze oproep wil de mogelijkheden van ontmoeting in de georganiseerde vrije tijd en daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte versterken en verbreden. Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning worden ondersteund en gestimuleerd tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving. Er wordt ingezet op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting via drie focusgebieden: "kwaliteitsvolle en duurzame basisvoorziening", "veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren" en "jeugdvrindelijke vormgeving van buurten en speelgebieden". In 2021 en 2022 vindt telkens één oproep plaats met een totaal voorzien subsidiebudget van 7,7 miljoen euro.

E. Bijkomende middelen sectorale investeringssubsidies jeugdinfrastructuur

In de periode 2021-2022 zal via het relancebudget het budget van de sectorale investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur met 4 miljoen euro verhoogd worden. In 2021 kunnen organisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur tot 60% investeringssubsidie ontvangen voor maatregelen ten behoeve van het energiezuiniger of toegankelijker maken van de gebouwen en sites. Vanaf 2022 volgt een nieuwe subsidieregelgeving na de voorziene periodieke herwerking van het huidige Besluit Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor bovenlokaal belang (2012, gewijzigd in 2017). Organisaties met jeugdinfrastructuur zullen opnieuw een aanvraag kunnen indienen voor specifieke investeringslijnen inzake de verbetering van de infrastructuur, volgens de prioriteiten die in het BVR worden vastgelegd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	30.000.000 EUR
-------	----------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	<ul style="list-style-type: none"> - vernieuwing en verdere ontwikkeling van de jeugdsites in beheer van de Vlaamse overheid: Destelheide en Hoge Rielen - Uitbreiding en optimalisering van het aanbod tenten door de ULDK - verlenen van 100 gratis Energiescans en 1 miljoen euro quick win maatregelen voor jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel - verlenen van 7,7 miljoen euro investeringssubsidies voor basisinfrastructuur en inrichting van jeugdwerkinfrastructuur - verlenen van 4 miljoen euro extra investeringssubsidies voor de sectorale prioriteiten voor jeugdinfrastructuur in 2021 en 2022
Outcome	Performantere, veiligere en milieuvriendelijkere jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel.
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De investeringssubsidie werd toegekend aan ADJ vzw voor de 11 infrastructuurprojecten in Hoge Rielen. In tussentijd werd studieopdracht voor dit renovatieproject gegund. De betreffende studie zal begin 2022 aanvangen.</p> <p>Voor het infrastructuurproject Destelheide werd het nodige budget vastgelegd. De bouwvergunning voor het nieuwe paviljoen is afgeleverd en de offerte is gegund aan de aannemer. De werken zullen begin 2022 opstarten. De studie voor de renovatie van de bestaande slaapblokken loopt volgens planning.</p> <p>De oproep voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur werd gelanceerd in september 2021. Op 1 december ontving de administratie 54 aanvragen voor de eerste ronde. De beslissing voor de eerste ronde valt in februari 2022, de volgende indienperiode volgt tot 15 juni 2022.</p> <p>In het najaar van 2021 werd de nieuwe oproep voorbereid voor het verlenen van gratis Energiescans en het toekennen van gratis energiecoaching en middelen voor het nemen van quick-winmaatregelen om de gebouwen waar jeugdwerk plaatsvindt energiezuiniger te maken. Beide instrumenten zullen vervat zitten in één oproep waarvoor jeugdorganisaties zich doorlopend kunnen inschrijven in 2022. Het ontwerpreglement, samenwerkingsovereenkomst met VEB en de projectsubsidie aan Pulse worden begin 2022 voorgelegd bij de minister van Jeugd.</p> <p>In 2021 werd bijkomend budget toegekend voor de sectorale subsidielijnen voor bovenlokale jeugdinfrastructuur, om deze toegankelijker en energiezuiniger te maken. De minister kende op 3 december een investeringssubsidie toe aan 23 infrastructuurprojecten voor bovenlokale jeugdinfrastructuur voor een totaalbedrag van 1,6 mio euro. Het aandeel relancemiddelen voor deze ronde</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>bedraagt 387 keuro. De aanvraagronde in 2022 wordt opgestart na goedkeuring van het nieuwe subsidiereglement.</p> <p>Voor uitbreiding van stock patrouille- en seniortenten in het kader van de optimalisatie van het aanbod van de ULDK worden werd de gunningsprocedure afgerond en is het bedrag voor de bestelling vastgelegd. De vereffening is gepland in 2022. Het railsysteem voor het manipuleren van de tenten bij ULDK werd reeds geïnstalleerd.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekenning investeringssubsidie Hoge Rielen ADJ vzw. Voor de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gestart waarmee de Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen en de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een investeringssubsidie toegekend aan de Hoge Rielen ten bedrage van 8.538.866,10 euro.	2021 Q2	Gerealiseerd
Opstart aanbesteding infrastructuurproject Hoge Rielen	2021 Q3	Gerealiseerd
Gunning studieopdracht infrastructuurproject Hoge Rielen	2021 Q4	Gerealiseerd
Opstart studie door studiebureau voor infrastructuurproject Hoge Rielen	2022 Q1	Op schema
Oplevering studieopdracht infrastructuurproject Hoge Rielen	2022 Q4	Nog niet gestart
Opstart bouwwerken door aannemer voor infrastructuurproject Hoge Rielen	2023 Q1	Nog niet gestart
Oplevering bouwwerken infrastructuurproject Hoge Rielen	2024 Q4	Nog niet gestart
Vastlegging investering Destelheide.	2022 Q4	Op schema
Aanstelling studiebureau Destelheide	2021 Q4	Op schema

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Opstart uitvoering infrastructuurproject Destelheide	2023 Q2	Nog niet gestart		
Oplevering van het project Destelheide (concrete planning onder voorbehoud).		Nog niet gestart		
Aankoop tenten en wijzigingen magazijn ULDK.	2022 Q2	Op schema		
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst dep. CJM en VEB inzake Energiescans jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Vertraging		
Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur, eerste subsidieoproep 2021-2022.	2022 Q1	Op schema		
Goedkeuring subsidiereglement quick win-investeringen op basis van energiescans jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Vertraging		
Toekenning van Energiescans en quick-win maatregelen.	2022 Q4	Nog niet gestart		
Goedkeuring reglement kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Gerealiseerd		
Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur, tweede subsidieoproep 2021-2022.	2022 Q4	Nog niet gestart		
Realisatie infrastructuurprojecten kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur. Concrete timing o.b.v. ingediende projecten.		Nog niet gestart		
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd		
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2022.	2022 Q4	Nog niet gestart		
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2021.	2021 Q2	Gerealiseerd		
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2022.	2022 Q2	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aankoop van senior- en patrouilletenten voor de uitbreiding van de stock in ULDK	300	2022 Q3	386	129 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde dossiers kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur	75	2022 Q4		
Realisatie toekennen 100 gratis Energiescans voor jeugdinfrastructuur	100	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	11.470.000 EUR
Uitvoering VEK	59.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 30.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Beslissing van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: 30 miljoen euro voor Jeugdinfrastructuur

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Brusselfonds
Belanghebbenden	Het Nederlandstalige netwerk in Brussel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>In 2021 en 2022 wordt er geïnvesteerd in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt.</p> <p>De middelen worden ingezet voor infrastructuurinvesteringen aan Vlaamse organisaties en verenigingen in Brussel om hun huisvesting te verbeteren, hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren en verenigingen met een Nederlandstalige dienstverlening die zich inspannen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen.</p> <p>De bestedingsstrategie voor de relancemiddelen via het Vlaams Brusselfonds omvat twee grote pijlers:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur: Vooreerst in de gebouwencomplexen in eigendom van de Vlaamse overheid en die door het Vlaams Brusselfonds wordt beheerd, met name in het gebouwencomplex van het extern verzelfstandigd Agentschap Muntpunt vzw en het Huis van het Nederlands Brussel vzw.<ol style="list-style-type: none">a. Voor Muntpunt gaat het om de vernieuwing van het ICT-omgeving voor de stadsstudiezaal ("zichtbare" hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende "onzichtbare" serveromgeving), de uitbouw van een multimediale leer- en maakplek met aandacht voor kansengroepen: jongeren en (jonge) starters en volwassenen met beperkte digitale skills. en waarbij Muntpunt prioritair inzet op het verbinden van particulieren, scholen, middenveldorganisaties, etc. in het Nederlandstalige netwerk. Tenslotte wordt ook het vernieuwen en optimaliseren van Audio, Video en Livestream in het ganse gebouw vooropgesteld dat Muntpunt ook kan inzetten voor de ontsluiting en promotie van het Vlaams gemeenschapsaanbod.b. Voor het Huis van het Nederlands Brussel wil men de dienstverlening naar de klanten en

PROJECTOMSCHRIJVING

gebruikers optimaliseren door de aanschaf van onder meer een digitaal klantenbegeleidingssysteem, de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs en het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audio-technologie)

Indien de andere structurele partners binnen het Vlaams Brussel beleid (Huis voor Gezondheid, Kenniscentrum WWZ, Brik, ...) digitale noden ervaren kunnen ook zij een aanvraagdossier 'digitalisering' indienen

2. Hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op

a. investeringen en verbouwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

b. een oproep voor projecten 'Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek die aanzetten tot intersectorale samenwerking. en die inzet op matchmaking tussen actoren, initiatieven en de infrastructuur van ons Nederlandstalig netwerk.

c. individuele investeringsaanvragen (welzijn, zorg, jeugd, cultuur en sport..) die voldoen aan het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds Het doel van de infrastructuurinvesteringen is om organisaties de nodige faciliteiten te geven om hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren die zich inspanssen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen. Het richtlijnenkader omvat volgende beleidsdoelstellingen:

I. de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes;

II. de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van) de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte;

III. de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke invulling ervan;

IV. de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen;

V. de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve (pilot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen;

VI. de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop van duurzaam meubilair of materiaal;

VII. de aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te bouwen of aan te kopen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	10.000.000 EUR
Output	<p>Digitalisering: - 3 projecten digitalisering van de werking en infrastructuur in eigendom van de Vlaamse gemeenschap en voor de structurele partners van het Brusselbeleid voor 800.000 euro.</p> <p>Hefboomdossiers Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur:</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	<ul style="list-style-type: none"> - 15-tal investeringsprojecten op basis van het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds voor 4.200.000 euro. De output is afhankelijk van het aantal projectaanvragen. - 5 projecten infrastructuur Deeltijds Kunstonderwijs Brussel voor 3.000.000 euro. - X aantal ingediende projecten in het kader van de oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" voor 2.000.000 euro. De output is afhankelijk van het aantal projectaanvragen.
Outcome	<p>Het realiseren van adequate, duurzame infrastructuur en inrichting van gebouwen zodat de Vlaamse actoren een kwalitatieve dienstverlening kunnen garanderen, hun werking kunnen uitbreiden, meer toegankelijk maken of optimaliseren.</p> <p>In het kader van de oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" wordt er gericht geïnvesteerd in gedeelde infrastructuur zodat er intersectorale samenwerking is tussen organisaties over gemeenschapsbevoegdheden heen. Door uitwisseling versterken organisaties elkaars inhoudelijke werking. De gedeelde ruimtes zijn broedplekken voor nieuwe samenwerkingen, nieuwe ideeën en initiatieven.</p>
Beoogde impact	Aantal gebruikers van cultuur- en jeugdinfrastructuur - Investerings in schoolinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De verschillende pijlers voor de besteding van de relancemiddelen gemeenschapsinfrastructuur in Brussel zijn opgestart , op schema of uitgevoerd De digitaliseringsprojecten Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel zijn worden opgeleverd. de afrekening gebeurt in januari;</p> <p>De individuele aanvragen hefboomdossiers op basis van het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds worden behandeld tussen 2021 Q4 en 2022 Q3: Indiening, administratief behandeling en toekenning (controleren op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF (vanaf 250.000 euro ook aanvraag begrotingsakkoord en goedkeuring van dossier via Besluit Vlaamse Regering). Er zijn ondertussen 9 projecten goedgekeurd en in uitvoering. 2 daarvan zijn voltooid.</p> <p>De oproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" verloopt volgens de volgende tijdslijn:</p> <p>Stap 1- september 2021 – de aanloop - gunning opdracht begeleiding bureau en lanceren projectoproep is gebeurd</p> <p>Stap 2 – oktober 2021 tot april 2022 - dossiervoorbereiding met selectie van ingediende kandidaatstellingen, organisatie van een matchmakingsmoment en koppeling van de samenwerkende organisaties aan experts starttraject van geselecteerde kandidaten met indienen projecten is op schema</p> <p>Stap 3 – mei tot juli 2022 - toewijzing subsidies, inclusief administratieve afhandeling en start uitvoering investeringsprojecten. moet nog worden opgestart</p> <p>We streven naar een maximale realisatiegraad binnen de eerste jaarhelft van 2024.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De uitvoering van 5 projecten in het kader van het infrastructuurplan DKO i.s.m. de Vlaamse Gemeenschapscommissie verloopt over een tijdslijn tot 2024 aan de hand van een gefaseerde uitbetaling van
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Toekennen van subsidies ten belope van 4.200.000 euro aan hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op individuele aanvragen i.k.v. het richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds is gerealiseerd	2022 Q4	Op schema
Projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" gunning van de opdracht aan begeleidingsbureau en lancering van de oproep	2021 Q3	Gerealiseerd
projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" dossiervoorbereiding (indiening kandidaatstellingen, koppeling van samenwerkende organisaties aan experts - starttraject geselecteerde kandidaten met experts - indienen projecten	2022 Q1	Op schema
projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" - toewijzing van investeringsubsidies, inclusief administratieve afhandeling	2022 Q3	Op schema
projectoproep "Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" - realisatie van de projecten	2024 Q1	Nog niet gestart
Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur in de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel is gerealiseerd	2021 Q4	Gerealiseerd
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie-opstart uitvoering infrastructuurplan DKO	2021 Q2	Gerealiseerd
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie- principe akkoorden van de VGC voor 4 infrastructuurdossiers.	2022 Q4	Nog niet gestart
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie - financiële en functionele verantwoording van de uitvoering van het infrastructuurplan DKO	2024 Q4	Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bereikte organisaties via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek"	50	2021 Q4	70	100 %
Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur in de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel	2	2021 Q4	2	100 %
aantal ondersteunde organisaties via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek"	20	2022 Q2		
toegekende individuele hefboomdossiers	15	2022 Q4	9	60 %
aantal gerealiseerde individuele hefboomdossiers	15	2024 Q4	2	13 %
Uitvoeren gesubsidieerde infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel	5	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.955.000 EUR
Uitvoering VEK	1.639.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. De aanwending van relancemiddelen voor Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

34. Spending reviews

VV158 - SPENDING REVIEWS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	34. Spending reviews
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Vlaamse brede heroverweging betreft een doorlichting in het voorjaar 2021 van de 10 beleidsdomeinen alsook van de sociale toeslagen en kortingen.</p> <p>De bedoeling van de doorlichting is:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) om aan de hand van een aantal voor de beleidsdomeinen gemeenschappelijke onderzoeksvragen (doelmatigheid huidige regelgeving, is bevoegdheidsverdeling tussen de diverse overheden en versus de (social) profit sector voor verbetering vatbaar, wat zijn de mogelijke besparingsvarianten) tot onderbouwde aanbevelingen te komen in het kader van evidence based policy, 2) tot een structurele verankering van beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen in het beleids- en begrotingsproces te komen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	10.000.000 EUR
Output	Concrete uitgaventoetsingen per beleidsdomein en verankering van het proces van uitgaventoetsingen in het budgettair proces, met het oog op gezondere overheidsfinanciën en het afremmen van de toename van de overheidsschuld.
Outcome	De uitgaventoetsingen zijn bedoeld om de kwaliteit en samenstelling van de overheidsfinanciën in het land te verbeteren. Door een beter inzicht te verschaffen in hoe overheidsmiddelen worden en zouden moeten worden besteed, helpen uitgaventoetsingen regeringen om een aantal problemen aan te pakken. Ze kunnen de samenstelling van de overheidsuitgaven verbeteren, door de efficiëntie en effectiviteit van de uitgaven te beoordelen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen om de

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
	uitgaven te richten op groeivriendelijke items of items die duurzaamheid op lange termijn bevorderen, ook voor het milieu.
Beoogde impact	Overheidsuitgaven in % van het BBP

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Begin 2021 jaar startte de administratie van de Vlaamse overheid met de Vlaamse Brede Heroverweging als opvolger van het pilootproject spending reviews rond dienstencheques. De Vlaamse Brede Heroverweging beoogde een grondige doorlichting van alle uitgavenposten en waar relevant kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse begroting. Dat heeft tot doel om de kwaliteit van de openbare financiën te verbeteren op het vlak van (beheers)efficiëntie en (beleids)effectiviteit. De eindresultaten zijn hier beschikbaar, zowel op algemeen vlak als op het niveau van de beleidsdomeinen. De beleidsaanbevelingen uit die rapporten vonden reeds hun weg in de begroting 2022 en zullen ook impact hebben op de begrotingsopmaak van 2023 en 2024.</p> <p>Op basis van de resultaten van de Vlaamse Brede Heroverweging worden nu per beleidsdomein ook specifieke uitgaventoetsingen opgestart, de mededeling daarover werd op 19 november goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Specifiek worden voor volgende onderwerpen, uitgaventoetsingen uitgeschreven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De bovenbouw boven de subsidies van departement CJM • Het hoger onderwijs • Duurzaam watergebruik en de organisatie van het waterlandschap • Instrumenten van het woonbeleid • Organisatiestructuur van de Vlaamse overheid • Modal shift in Vlaanderen • Het Vlaams beleid i.k.v. productiviteit • Integreren van de drie zorgbudgetten <p>Elk thema wordt uitgewerkt in een bestek (plan van aanpak) voor de uitvoering van de uitgaventoetsing. Hierin wordt het benodigde budget geraamd, de budgettaire scope van het onderzoek, een exactere omschrijving invulling gegeven aan het thema, de timing, wie er betrokken wordt in het proces naast de inspectie van Financiën en het departement Financiën en Begroting, etc. De onderzoeksvragen van de VBH kunnen grotendeels worden hergebruikt in deze uitgaventoetsingen. Evenwel is het uitgangspunt van de uitgaventoetsing niet het vinden van besparingen. Zodra een thema is uitgewerkt wordt het bestek (plan van aanpak) op de Vlaamse Regering besproken. Na de lancering van de bestekken wordt de uitgaventoetsing door de betrokken administraties</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>uitgevoerd.</p> <p>Daarnaast kunnen beleidsdomeinen nog bijkomende onderwerpen voorstellen voor gelijkaardige uitgaventoetsing/beleidsonderzoeken die eveneens worden besproken in de Vlaamse Regering. Om te kunnen genieten van de relancemiddelen moet er steeds een bestek in de markt worden geplaatst waarbij externen worden betrokken bij de uitgaventoetsing / het beleidsonderzoek.</p> <p>Uiteraard zullen, van zodra de werkgroep leesbare begroting een kader of aanbevelingen heeft uitgewerkt, de nog goed te keuren plannen van aanpak zich hieraan conformeren.</p> <p>Alle analyses worden opgestart tegen het einde van 2022. Doel van de uitgaventoetsingen is om het resultaat ten laatste te kunnen meenemen bij de volgende regeringsvorming. Het resultaat van de uitgaventoetsing dient dus ten laatste beschikbaar te zijn voor de onderhandelende partijen. Om de 6 maanden bij de rapportering over de RRF wordt de voortgang van de opgestarte uitgaventoetsingen toegelicht.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Gunning raamovereenkomst Vlaamse brede heroverweging	2021 Q1	Gerealiseerd
Oplevering eindrapporten van de Vlaamse brede heroverweging	2021 Q3	Gerealiseerd
Integratie van de uitgaventoetsingen in het begrotingsproces: Regeringsbesluiten die bepalen hoe uitgavenherzieningen (of een soortgelijke aanpak) in het begrotingsproces worden geïntegreerd.	2021 Q4	Gerealiseerd
Input spending reviews bij begrotingsopmaak	2022 Q3	Op schema
Integratie van de uitgaventoetsingen in het begrotingsproces: Systematische opname van de resultaten van de uitgaventoetsingen in de jaarlijkse en meerjarige begrotingsplanning vanaf de opstelling van de begrotingswet voor 2024.	2023 Q4	Op schema
Analyse achteraf van de uitgaventoetsingen: Publicatie van beoordelingsverslag.	2024 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.703.000 EUR
Uitvoering VEK	992.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 8.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling aan de Vlaamse Regering van 4 december 2020. Vlaamse Brede Heroverweging Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Vlaamse Brede Heroverweging

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

35. Extra relanceprojecten

VV159 - SNELLERE VERGUNNINGS- EN BEROEPSPROCEDURES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Project “sneller en beter” met 5 werven:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Snelle en correcte rechtsbescherming: snellere beroepsprocedures en wegwerken achterstand. Door dit initiatief zal de gemiddelde doorlooptijd van behandeling verkorten met 6 tot 9 maanden.2. Optimaliseren van de Omgevingsvergunning: het omgevingsvergunningsdecreet wordt geëvalueerd. De belangrijkste opzet is om na te gaan of de doelstellingen van de Unieke Omgevingsvergunning – sneller en beter – gehaald werden en of de beslissingen op het juiste bestuursniveau genomen worden. Dit evaluatietraject zal leiden tot verbeteringen aan de regelgeving. Daarnaast worden technische verbeterpunten verder onderzocht die de behandeling van vergunningsaanvragen meer oplossingsgericht en vlotter moeten maken. De VIP-cel bij het Departement Omgeving wordt versterkt, zodat aan een groter aantal projecten een begeleiding op maat kan geboden worden. Ook het decreet Complexe Projecten wordt aan een eerste evaluatie en optimalisatie onderworpen.3. Omgevingsbesluit: afstappen van een afwijkingsregelgeving maar werken op maat. Een groot deel van onze regelgeving richt zich op uitzondering- en afwijkingsbepalingen. Dit vormt echter vaak de grond voor juridische geschillen en aanvechtingen in beroep. Het omgevingsbesluit moet bijdragen tot het op een adequate manier en op maat laten activeren van de juiste maatregelen en instrumenten nodig op een bepaald moment in het proces. Er wordt onderzocht op welke manier het Omgevingsbesluit kan geïntroduceerd worden.4. Hervorming milieueffectenrapportage tot een slank en efficiënt instrument dat de besluitvorming beter en krachtiger maakt en onze leefomgeving voldoende beschermt. De MEB (Milieueffectenbeoordeling) moet de besluitvorming en het primaat van de politiek zo gericht en efficiënt mogelijk ondersteunen.

PROJECTOMSCHRIJVING

5. Digitale werf: Het omgevingsloket wordt uitgebreid met een publiek loket zodat ook publieke raadplegingen en openbare onderzoeken maximaal digitaal kunnen verlopen. (zie VV 063) Het loket van DBRC wordt gedigitaliseerd (zie VV 062). Ook wordt de BIM datastandaard als informatiedrager voor een efficiëntere en beter geïnformeerde beleidsuitvoering geïntroduceerd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	
Output	
Outcome	
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De evaluatie van het omgevingsvergunningendecreet werd afgerond. Aanbevelingen inzake werking en interne organisatie worden geïmplementeerd. Politieke besluitvorming is nodig omtrent de verdere te nemen stappen inzake aanpassingen decreet en uitvoeringsbesluit. De conceptuele uitwerking van het omgevingsbesluit is afgerond. Politieke besluitvorming is nodig omtrent de uitgangspunten. De conceptuele uitwerking omtrent modernisering MER is afgerond. Politieke besluitvorming is nodig omtrent de uitgangspunten.
Noodzakelijke politieke actie	politieke besluitvorming is nodig omtrent de uitgangspunten inzake de beoogde hervormingen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Omgevingsbesluit	2021 Q4	Op schema
Snelle en correcte rechtsbescherming	2022 Q1	Op schema
Digitale werf	2022 Q4	Op schema
Optimaliseren van de Omgevingsvergunning	2022 Q4	Op schema
Hervorming milieueffectenrapportage	2022 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV160 - ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit project willen we regeldruk en administratieve lasten reduceren om belangrijke kostenbesparingen én een grotere tevredenheid bij burgers, ondernemingen en overheidspersoneel te realiseren. In de verschillende bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid willen we vereenvoudigingsprojecten realiseren waar regelgeving en de bijhorende administratieve procedures de efficiënte werking van de overheid of de vlotte interacties van burgers en bedrijven met die overheid in de weg staan.

We werken daarbij enerzijds "remediërend" door screening van de bestaande regelgeving via zogenaamde "schrapsessies" per beleidsdomein en "citizen journeys" voor een tweetal concrete levensgebeurtenissen, en anderzijds werken we "preventief" en nemen we maatregelen om efficiënte toekomstige regelgeving te verzekeren.

Voor de financiering van dit project wordt er 250.000 euro gehaald uit het budget van 10 miljoen euro voor de spending reviews (VV158).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedetecteerde vereenvoudigingsopportuniteiten (vereenvoudigingsagenda) 2. Monitoring van de uitvoering van de vereenvoudigingsagenda 3. Uitwerking van 10 disruptieve projecten ("vlaggenschepen") 4. Uitwerking ex ante screeningsmechanisme regeldruk
Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verminderen bestaande regeldruk en bestaande administratieve lasten t.a.v. ondernemingen/burgers 2. Beheersen toekomstige regeldruk en administratieve lasten
Beoogde impact	Efficiëntie Vlaamse overheid (imago)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De eerste fase van het project is afgerond en resulteerde in:</p> <p>1° de oplistijng van vereenvoudigingsprojecten op voorstel van de Vlaamse administratie, die daarbij uitgedaagd en ondersteund werd door een externe consultant; De eerste vereenvoudigingsagenda werd voorgelegd aan de Vlaamse Regering op 10 december 2021;</p> <p>2° de toepassing van 3 citizen's journeys (met het doel vanuit het standpunt van een specifieke onderneming of burger knelpunten en belemmeringen in het proces te kunnen detecteren):</p> <ul style="list-style-type: none"> - bouwen en verbouwen - opstarten van een landbouwonderneming - opstarten van een horeca-onderneming <p>3° benchmarking en aftoetsing van de mogelijkheden voor ex ante screeningstool.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Eerste (voorlopige) vereenvoudigingsagenda vastgelegd	2021 Q3	Gerealiseerd
Definitieve vereenvoudigingsagenda vastgelegd	2022 Q3	Op schema
beslissing over ex ante screeningsmechanisme (regeldruktoets)	2022 Q3	Op schema
Uitvoering van de beslissing over regeldruktoets	2023 Q1	Nog niet gestart
Opstart van project met uitwerking van 10 disruptieve vereenvoudigingsprojecten ("vlaggenschepen")	2022 Q2	Nog niet gestart
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2022 Q2	Nog niet gestart
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2023 Q1	Nog niet gestart
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2023 Q3	Nog niet gestart

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"		2024 Q1	Nog niet gestart	
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"		2024 Q3	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gedetecteerde vereenvoudigingsopportuniteiten	250	2022 Q3	214	85 %
Aantal ondersteunde disruptieve vereenvoudigingsprojecten ("vlaggenschipprojecten")	10	2024 Q1		
Aantal uitgevoerde vereenvoudigingsprojecten	250	2024 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 12 maart 2021 Mededeling aan de Vlaamse Regering van 10 december 2021

VV161 - DECENTRALISATIEOEFENING NAAR LOKALE BESTUREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING

In het kader van de 'Vlaamse Brede Heroverweging' werd door de Vlaamse administraties een analyse uitgevoerd omtrent mogelijke taken/bevoegdheden die vanuit de Vlaamse overheid kunnen gedecentraliseerd worden naar de lokale besturen. Vertrekkende vanuit deze resultaten wordt een zogenaamde long-list opmaakt die door de Vlaamse Regering wordt gevalideerd en dit met het oog op verdere bespreking met de lokale besturen in functie van de implementatie. In een commissie Decentralisatie overlegt de Vlaamse Regering samen met de lokale besturen op welke terreinen, bovenop de in dit regeerakkoord gemaakte afspraken, en door aanpassing van welke regelgeving en binnen welke termijn, zij de autonomie voor de lokale besturen verhoogt door, o.a. de afschaffing van Vlaamse sturing; minder of soepelere normering of de aanpassing van administratieve praktijken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	
Output	
Outcome	
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Nota VR betreffende de oprichting van de commissie decentralisatie wordt afgestemd op kabinetsniveau vooraleer ter goedkeuring geagendeerd te worden op de VR (voorziene timing Q1 2022).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	Afstemming nota VR op kabinetsniveau

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Nota VR - voorstel tot oprichting van de commissie decentralisatie	2022 Q1	Op schema
Commissie decentralisatie	2021 Q1	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV162 - INVESTEREN IN VLAAMSE KENNISOVERHEID

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Belanghebbenden	Netwerk Statistiek Vlaanderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING

Investeren in Vlaamse kennisoverheid: 1 miljoen euro recurrente middelen (nieuw beleid in 2021 maar niet in relanceprovisie) voor VSA en SIA vanaf 2021.

Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA)

In het kader van een snelle en flexibele informatieverschaffing naar statistiekgebruikers zetten we in op de data-capaciteit van de Vlaamse Statistische Autoriteit met aandacht voor de verschillende types van databronnen: survey-data, administratieve data en organische (big) data. Dit om veranderingen in de maatschappij en de economie sneller te kunnen duiden. De capaciteit van het VSA Statistisch Datawarehouse wordt uitgebreid om statistische informatie-invoer en verwerking te versnellen en op een overzichtelijke manier weer te geven via innovatieve visualisaties en dashboards met de belangrijkste statistische indicatoren. We breiden eveneens onze survey-capaciteit uit door internet-gebaseerde bevragingen van de Vlaamse bevolking om de enquêtedruk te verminderen. Er wordt hiertoe ook extra geïnvesteerd in een online probability panel survey in samenwerking met Vlaamse universiteiten via de VLIR.

De concrete doelstellingen voor dit deel van het project zijn:

1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV-dataverzameling
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR

Strategische Inzichten en Analyses (SIA)

Om geïnformeerde en toekomstgerichte beleidskeuzes te kunnen maken, richten we ons op macro-economische en statistische analyses. Daartoe wordt geïnvesteerd in het opstarten en verder ontwikkelen van Strategische Inzichten en Analyse (SIA). Naast het beter benutten van

PROJECTOMSCHRIJVING

statistische data, richten we ons ook op analyses van internationale indicatoren, trends en relevante toekomst studies. Dit als onderdeel van het verder optimaliseren van bestaande kenniscapaciteiten en beleidsonderzoek.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.000.000 EUR
Output	De VSA en SIA realiseren in het kader van dit projecten meerdere doelstellingen. De VSA versterkt haar statistisch datawarehouse, ontwikkelt een dashboard met Vlaamse kerncijfers en bouwt surveycapaciteit en online probability panel survey uit. SIA analyseert COVID-19 data, bouwt een relance dashboard, zet haar schouders onder een kennisnetwerk en werkt aan een netwerkmodel kennisoverheid.
Outcome	Enerzijds wordt via een versterkte data-capaciteit van de Vlaamse Statistische Autoriteit gestreefd naar een snelle en flexibele informatieverschaffing naar statistiekgebruikers. Anderzijds wordt er ingezet op een verdere optimalisatie van de bestaande kenniscapaciteiten en beleidsonderzoek.
Beoogde impact	Vertrouwen in de Vlaamse overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>De pilootfase van de integratie van surveydata in het Statistisch data warehouse loopt.</p> <p>Het pilootproject om de twitter-sentiment analyse pipeline te integreren in het Statistisch Datawarehouse wordt eind december afgerond.</p> <p>De scoping-fase van het dashboard is afgerond.</p> <p>De voorbereidingen voor de Covid-vervolgbevraging (gepland voorjaar 2022) met de opmaak van de vragenlijst zijn opgestart.</p> <p>Het veldwerk voor twee in het najaar 2021 opgestarte SV-bevragingen wordt afgerond tegen eind 2021. De geplande rapportering over de SV2- en SV3-bevraging is voorzien voor het voorjaar 2022.</p> <p>Gesprekken met het consortium van universiteiten die het BOPP voorbereiden en uitvoeren blijven lopen, met inbegrip over een structurele financiering door en deelname van de VSA in de uitbouw van het opzet. De timing van de pilootstudie werd herbekeken om ze nauwer te laten aansluiten bij de start van het eigenlijke veldwerk in het najaar van 2022.</p> <p>Een dashboard Vlaamse Veerkracht, dat het maatschappelijk en economisch herstel opvolgt, is geactualiseerd op de website Vlaamse Veerkracht. Kennis netwerkactiviteiten en analyse studies worden door SIA voorbereid.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: a. Versterking van het proces van integratie en verwerking van surveydata en ondernemingsdata tot statistische informatie	2022 Q2	Op schema
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: b. Analyse van de mogelijkheid tot integratie van organische data in het VSA statistisch datawarehouse	2022 Q4	Op schema
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: c. Versneld beschikbaar stellen van interactieve data	2022 Q2	Op schema
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: d. Haalbaarheidsanalyse van een remote access facility voor verwerking van atomaire statistische data in het kader van statistisch en wetenschappelijk onderzoek door entiteiten van de Vlaamse overheid en kennisinstellingen.	2022 Q4	Op schema
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen a. Scoping dashboard	2021 Q3	Gerealiseerd
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen b. Ontwerp- en ontwikkelingsfase visualisaties	2021 Q4	Vertraging
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen c. Testing beta versie	2022 Q1	Op schema
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen d. Launch	2022 Q2	Op schema
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen a. Rapportering Covid-bevraging	2021 Q2	Gerealiseerd
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen b. Scoping verdere surveyplanning/uitbesteding	2021 Q2	Gerealiseerd
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen c. Fit data-infrastructuur	2021 Q4	Op schema
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen d. Uitbesteding veldwerk	2021 Q3	Op schema
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen e. Rapportering SV 2021/2 en 2021/3	2021 Q4	Vertraging

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevestigingen f. Rapportering Covid-vervolgbevestiging	2022 Q2	Op schema
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevestigingen g. Ter beschikking stellen van de atomaire data Covid-vervolgbevestiging aan partners binnen het netwerk Statistiek Vlaanderen en de wetenschappelijke wereld	2022 Q3	Op schema
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR a. Pilotstudie	2022 Q3	Nog niet gestart
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR b. Eerste bevestigingen	2022 Q4	Nog niet gestart
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR c. Rapportering	2023 Q1	Nog niet gestart
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA): opvolgen Covid-19 survey VSA	2021 Q3	Gerealiseerd
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA): versterken onderbouwd afwegingskader relance (dashboard)	2021 Q3	Gerealiseerd
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid: Inzetten op thematische kennisnetwerken	2022 Q2	Op schema
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid: Graduele implementatie netwerkmodel Kennisoverheid (2022-2024)	2022 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	874.000 EUR
Uitvoering VEK	123.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV163 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - PAKKET VAN 500 MILJOEN EURO VOOR ZEER GOEDKOPE ACHTERGESTELDE LENINGEN AAN ENERZIJD'S START-UPS & SCALE-UPS EN ANDERZIJD'S KMO'S

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven, voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep. Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 oktober 2021.</p> <p>Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	500.000.000 EUR
Output	Aantal door PMV verstrekte coronaleningen aan start-ups en scale-ups (doelgroep 1) en kmo's (doelgroep 2)
Outcome	De liquiditeitsbehoefte van Vlaamse bedrijven op middellange termijn, veroorzaakt door de coronacrisis, mee opvangen. Doelgroepen zijn enerzijds start-up-bedrijven en scale-ups en anderzijds mature kmo's die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis.
Beoogde impact	Beloftevolle jonge bedrijven en gezonde kmo's door de crisis loodsen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Per 8/12/2021 werd 167,4 mln. euro uitbetaald in 547 dossiers. Daarnaast werden al 665 dossiers goedgekeurd voor een bedrag van 214 mln. euro. Er vallen dus nog heel wat uitbetalingen te verwachten.</p> <p>De aanvragen voor Coronaleningen werden gestopt sinds 15 oktober 2021. Ondertussen nam de Vlaamse regering (dd. 17 december 2021) een beslissing over een nieuwe leningformule in het kader van Corona: de overbruggingslening. Hiervoor is 100 miljoen ESR 8 middelen voorzien.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Kapitaalsverhoging PMV		2020 Q2	Gerealiseerd	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uitbetaalde leningen KMO's (doelgroep 2)	500	2022 Q1	390	78 %
Aantal uitbetaalde leningen start-ups / scale-ups (doelgroep 1)	200	2022 Q2	157	79 %
Aantal uitbetaalde dossiers (bedrag uitbetaald)	250000000	2022 Q2	167.400.000	67 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	500.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 500.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 15 mei 2020 - COVID-19: Kapitaalsverhoging voor programma achtergestelde leningen](#)

[Nota aan de VR van 17/12/2021 over het besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een overbruggingslening voor ondernemingen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV164 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - EXTRA CAPACITEIT VOOR GIGARANT (3 MILJARD EURO) EN VOOR PMV-Z-WAARBORGEN (400 MILJOEN EURO) - HEFBOOM VOOR MAXIMALE BANCAIRE FINANCIERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Gigarant (3 miljard euro)

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot 15 oktober 2021, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

PMV/Z-Waarborgen (400 miljoen euro)

De bestaande waarborgregeling bij PMV/z (Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) werd tijdelijk uitgebreid met de Waarborg coronacrisis. Deze uitbreiding liep tot eind 2020 en wordt niet verlengd.

Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	3.400.000.000 EUR
Output	Aantal dossiers met door een waarborg ondersteunde bankfinanciering gerealiseerd waarborgbedrag

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Outcome	Oplossen van liquiditeitsnoden (vnl. voor werkkapitaal of investeringen) van Vlaamse ondernemingen via behoud of uitbreiding van bankfinanciering, teneinde op termijn groei van die ondernemingen te bewerkstelligen met bijhorend behoud of uitbreiding van de tewerkstelling in Vlaanderen
Beoogde impact	Tewerkstelling (werknemers / VTE)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Van 1/1/2020 tot en met 1/12/2021 werden 47 waarborgen gerealiseerd voor een bedrag van 683 mln. euro. Hiervan waren er 26 specifieke Covid-19 waarborgen, voor een bedrag van 514,6 mln. euro.</p> <p>De aanvragen voor covid-19 waarborgen bij Gigarant werden gestopt sinds 15 oktober 2021.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING		STATUS	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde Gigarant Covid19-waarborgen	50	2022 Q2	26	52 %
Gerealiseerd Covid-19 waarborgbedrag	1500000000	2022 Q2	515.000.000	34 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.400.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 3.400.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 0405 DOC.0423 - decreet](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - nota](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - memorie](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - advies SERV](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - advies RVS](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

**VV165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN,
KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV)
VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS-PUBLIEK EN REST
PRIVAAT)**

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse overheid gaat een Welvaartsfonds oprichten dat zal beleggen in kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen bij Vlaamse ondernemingen. De overheid zal op termijn een minderheidsparticipatie aanhouden in dat fonds, maar kan bij de opstart wel de meerderheid hebben. Er wordt bij PMV een kapitaalsverhoging van € 240 miljoen voorzien om dit fonds op te starten. Het is de bedoeling om hiermee een fonds ter waarde van € 500 miljoen op te zetten.

Belangrijkste kenmerken:

- Het fonds zal zich focussen op kapitaalsparticipaties en achtergestelde leningen met een looptijd van 4 jaar en meer, steeds in cofinanciering met private investeerders.
- Naast institutionele beleggers zullen ook particulieren in het fonds kunnen investeren en daar een dubbel voordeel genieten:
 - Ze krijgen een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar (de eerste drie jaar) met een maximum van € 1.000 per belastingplichtige.
 - Bij erfenis zullen de aandelen overgaan mits een recht van 3% en niet meegerekend worden in de globalisatie van het vermogen.
- Het fonds zal worden beheerd samen met private spelers.
- Het fonds zal investeren in bedrijven die voldoen aan een ethisch kader. De doelgroepen zijn:
 - start-ups en scale-ups die een financieringsnood hebben van meer dan € 800.000 door de coronacrisis:
 - door een tijdelijke negatieve impact op de business;
 - omdat kapitaalmarkten gesloten zijn;
 - start-ups en scale-ups die een opportuniteit zien in de huidige crisis en bijkomende middelen nodig hebben om een versnelling hoger te kunnen schakelen;
 - waardevolle innovatiegedreven bedrijven die het doelwit kunnen worden van buitenlandse overnemers;

PROJECTOMSCHRIJVING

bedrijven met een buy-out problematiek waar verankering en stabilisatie kan geboden worden
 -- Vlaamse dochterondernemingen van internationale groepen die bijvoorbeeld via een buy-out zelfstandig een toekomst kunnen hebben;
 -- alle innovatieve bedrijven (product, technologie, businessmodellen, diensten, enz...).

- PMV zal vanaf het 6e jaar de liquiditeit van het fonds verzekeren aan boekwaarde voor de particuliere inschrijvers die willen uittreden.

Dit fonds wordt in verschillende fasen gelanceerd:

- In een eerste fase verzamelt het Welvaartsfonds een consortium van sterke partners die zich engageren om samen te werken om de solvabiliteit te versterken van Vlaamse bedrijven die geïmpacteerd zijn door de coronacrisis. Aan de hand van een samenwerkingscharter scharen de partners zich zo achter het gezamenlijke doel om de welvaart voor Vlaanderen op lange termijn te verzekeren.
- In een tweede en derde fase – vanaf het tweede kwartaal van 2021 – wordt het fonds juridisch opgericht en verder opgeschaald. Vanaf dan zal het voor de institutionele investeerders (fase 2) en de particuliere spaarder (fase 3) ook mogelijk zijn om mee te investeren in Vlaamse bedrijven.

Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	240.000.000 EUR
Output	Aantal dossiers gesloten door het Welvaartsfonds
Outcome	De solvabiliteit van Vlaamse bedrijven die positief (versnelde groeimogelijkheden) of negatief (bijkomende financieringsnoden) geïmpacteerd zijn door de coronacrisis versterken: via kapitaalparticipaties, achtergestelde leningen en quasi-kapitaal
Beoogde impact	Solvabiliteit van Vlaamse ondernemingen tijdens en post corona versterken

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Tweede closing gerealiseerd in november 2021, wat het kapitaal van het Welvaartsfonds in totaal op 205 mln. euro brengt. Nog geen gerealiseerde dossiers.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Samenstellen consortium		2020 Q4	Gerealiseerd	
Kapitaalverhoging PMV en LRM		2021 Q1	Gerealiseerd	
Opschalen fonds met institutionele investeerders		2021 Q3	Op schema	
Juridische oprichting fonds		2021 Q3	Gerealiseerd	
oprichting fonds en eerste closing		2021 Q3	Gerealiseerd	
Opschalen fonds met private investeerders		Nog te bepalen	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Opgehaalde investeringsmiddelen (privé en publiek)	500000000	2021 Q4	205.000.000	41 %
gerealiseerd investeringsbedrag vanuit het Welvaartsfonds	180000000	2024 Q4		
aantal gerealiseerde investeringsdossiers vanuit het Welvaartsfonds	25	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	240.000.000 EUR
Uitvoering VAK	245.000.000 EUR
Uitvoering VEK	85.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 240.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 29 januari 2021 - Kapitaalverhoging bij PMV nv en bij LRM nv

VV166 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN,
KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - UITBREIDING VAN DE WIN-WIN-LENING EN
VRIENDENAANDEEL

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Winwinlening

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven.

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, werd deze lening versoepeld.

Vriendenaandeel

Met het Vriendenaandeel moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), gevestigd in het Vlaamse Gewest. De particuliere investeerder (vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot € 300.000 extra kapitaal ophalen.

Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	
-------	--

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Output	Aantal geregistreerde Winwinleningen en Vriendenaandelen
Outcome	De solvabiliteit van Vlaamse kmo's versterken via achtergestelde leningen en kapitaalparticipaties door particulieren, en zo hun toegang tot (bancaire) financiering faciliteren.
Beoogde impact	Solvabiliteit Vlaamse ondernemingen versterken d.m.v. het betrekken van private investeringsmiddelen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Sinds de uitbreiding van de winwinlening in Q4 2020 tot 1/12/2021 werden 8000 winwinlening dossiers geregistreerd voor een bedrag van 151 mln. euro.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Uitbreiding winwinlening		2020 Q4	Gerealiseerd	
Vriendenaandeel operationeel		2021 Q1	Gerealiseerd	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal geregistreerde winwinleningen sinds uitbreiding van het instrument	6000	2021 Q4	9.690	100 %
Geregistreerde winwinleningen (in bedrag) sinds uitbreiding	150.000.000	2021 Q4	183.600.000	100 %
Bedrag aan geregistreerde vriendenaandelen sinds creatie van het instrument	10000000	2024 Q4	310.000	3 %
Aantal geregistreerde vriendenaandelen sinds creatie van het instrument	1000	2024 Q4	37	4 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - BVR
VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - nota
VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - advies

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOUW 2

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Onderwijs en Vorming
Belanghebbenden	schoolbesturen, leerlingen, onderwijspersoneel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering wil deze regeerperiode voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe investeringen in schoolinfrastructuur goedkeuren. De inhaalbeweging van de vorige regeerperiode wordt zo exponentieel doorgezet met een extra investeringsimpuls van 500 miljoen euro. Deze investeringsgolf biedt perspectief voor ruim 1.000 nieuwe of gerenoveerde scholen.

Ten eerste wordt fors geïnvesteerd in de vervanging van de bestaande schoolinfrastructuur gezien het schoolpatrimonium verouderd is (actiepunt 167/1 Vervangingsinvesteringen).

Ten tweede wordt extra capaciteit gecreëerd. Bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen wordt vooral gefocust op het secundair onderwijs, maar ook voor het eerst specifiek voor buitengewoon onderwijs, waar de noden het hoogste zullen zijn in de komende jaren (actiepunt 167/2 Extra capaciteit).

Daarnaast wordt een derde DBFM-programma, Scholen van Vlaanderen, opgestart waardoor verder wordt ingezet op alternatieve financiering (actiepunt 167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen).

Tot slot gebeuren er ook investeringen via huursubsidies met een jaarlijkse oproep (actiepunt 167/4 huursubsidies).

Deze vier actiepunten m.b.t. de investeringsbeleid maken deel uit van het Masterplan Scholenbouw 2.0.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	3.078.000.000 EUR
Output	Via de verschillende actiepunten en subsidiepostes worden de bestaande schoolgebouwen verbeterd en wordt nieuwe schoolinfrastructuur gebouwd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Outcome	Een substantiële investering wordt gecreëerd voor het schoolgebouwenpatrimonium.
Beoogde impact	Investerings in schoolinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Momenteel worden de actiepunten, zoals vermeld in de projectomschrijving en de projectvoortgang, verder uitgevoerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
167/2 Extra capaciteit: goedkeuring door de Vlaamse Regering van extra capaciteitsprojecten voor in totaal 35,5 miljoen aan capaciteitsmiddelen.	2021 Q1	Gerealiseerd
167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen: goedkeuring decretaal kader.	2021 Q4	Gerealiseerd
167/2 Extra capaciteit: goedkeuring selectie door de Vlaamse Regering.	2022 Q4	Op schema
167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen: verdere uitrol van het DBFM-programma	2024 Q2	Op schema
167/1 Jaarlijkse vervangingsinvesteringen; 167/4 Jaarlijkse huursubsidie	2024 Q2	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.078.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 3.078.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0. Bijlage](#)

[Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 5 maart 2021 van extra capaciteitsprojecten voor in totaal 35,5 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen.](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2 - voorontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Memorie van toelichting. Bijlage](#)

[Evaluatie scholen van morgen. Bijlage](#)

[DBFM-scholen van Vlaanderen. Verslag alternatieven en meest passende uitvoeringsvorm. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2 - voorontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Memorie. Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Advies van Vlor over het voorontwerp van decreet over DBFM-scholen van Vlaanderen. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 1 oktober 2021 - ontwerp van Decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen - Definitieve goedkeuring](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen - Vlaamse Regering 1 oktober 2021 - Definitieve goedkeuring](#)

[Memorie van Toelichting van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen - Vlaamse Regering 1 oktober 2021 - Definitieve goedkeuring](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV168 - VERSNELDE UITROL DIGITALE METERS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

In samenwerking met intercommunales en private bedrijven investeren we ook in een versnelde uitrol van digitale meters (ongeveer 2 miljard euro investering door Fluvius gespreid over 10 jaar, waarvan 80% tegen 2025).

Dit kadert in de uitvoering van het Regeerakkoord en is in lijn met de Europese Richtlijn 2019/944 waarin de uitrol van digitale meters wordt bepaald. Uit een kostenbatenanalyse van 16 april 2020 uitgevoerd door VREG blijkt deze versnelde uitrol tot een hogere maatschappelijke winst te leiden. Bovendien wenst de Vlaamse Regering de baten van een digitale meter en de digitalisering van het energiesysteem zo snel mogelijk aan alle Vlamingen aan te bieden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	
Output	Aantal geplaatste digitale meters
Outcome	Zoveel mogelijk netgebruikers maken actief gebruik van de mogelijkheden van de digitale meter. In de eerste plaats gaat het dan om een verbeterd inzicht in het energieverbruik via het webportaal van Fluvius of de lokale gebruikerspoorten. In een volgende stap kan het ook gaan over de mate van actieve sturing van het energiegebruik in functie van eigen productie of de noden van het net.
Beoogde impact	Aandeel hernieuwbare energie in totaal energiegebruik - Finaal energieverbruik in GWh

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	<p>Eind oktober 2021 waren 1 142 578 digitale meters voor elektriciteit en aardgas geïnstalleerd. Dit komt overeen met 18% van de toegangspunten die beschikken over een kleinverbruiksmeterinrichting. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de terugdraaiende teller vernietigde, werd de uitrol bij bestaande prosumanten achteruit geschoven en is er nog steeds heel wat twijfel om een digitale meter te laten installeren waardoor een uitrol van 80% eind 2024 uitdagend is.</p> <p>74% van de budgetmeters is omgebouwd naar een digitale meter. 27% van de elektriciteitsmeters bij prosumanten is een digitale meter. Er werden 7 073 digitale meters geplaatst op vraag van de netgebruiker.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Om het draagvlak voor de energietransitie in het algemeen, en de digitale meter in het bijzonder die hiervoor een belangrijke 'enabler' is, te versterken is in samenwerking met Fluvius een brede communicatiecampagne Meemetdestroom.be opgezet. In het voorjaar 2022 zal in detail ingegaan worden op de digitale meter. Daarna wordt de weigeringsprocedure indien een netgebruiker weigert een digitale meter te plaatsen geoperationaliseerd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Bestaande actieve budgetmeters zijn vervangen door een digitale meter.	2021 Q4	Op schema		
De meters die geplaatst of geactiveerd werden in het proefproject slimme meters en in het proefproject digitale budgetmeter van de distributienetbeheerders zijn vervangen door een digitale meter.	2021 Q4	Op schema		
80% van de toegangspunten met een kleinverbruiksmeterinrichting beschikt over een digitale meter	2024 Q4	Vertraging		
100% van de toegangspunten met een kleinverbruiksmeterinrichting beschikt over een digitale meter	2029 Q3	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
% kleinverbruiksmeterinrichtingen met een bestaande actieve budgetmeter die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	100%	2021 Q4	60.894	74 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
% kleinverbruiksmeterinrichtingen die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	80%	2024 Q4	1.142.578	18 %
% kleinverbruiksmeterinrichtingen die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	100%	2029 Q3	1.142.578	18 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV169 - VERSNELDE UITROL GLASVEZELNETWERK EN 5G

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Belanghebbenden	Telecomoperatoren, intercommunales

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering streeft naar één open netwerk voor 5G. We onderzoeken hiervoor het concept van een tower company. Dit houdt in dat diverse aanbieders hun infrastructuur aanbrengen op een gezamenlijke basisinfrastructuur (bv. elke aanbieder plaatst antennes op een gezamenlijke mast). Op deze manier streven we in samenwerking met de mobiele operatoren in een versnelde uitrol van een glasvezelnetwerk en 5G. Voorwaarde is evenwel een snelle spectrumveiling op federaal niveau, zodat de betrokken operatoren zekerheid hebben over de frequenties waarover ze beschikken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	
Output	n.v.t. (binaire output)
Outcome	Versnelde en brede uitrol van 5G en een glasvezelnetwerk (doormiddel van meer samenwerking tussen mobiele operatoren)
Beoogde impact	Toename digitale collectiedata - Verhoogde connectiviteit (DESI)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Een belangrijke voorwaarde voor dit project is van start gegaan: de veiling van 5G staat gepland voor Q2 van 2022, wat iets later is dan eerst gepland, alhoewel er ook werd gevreesd dat dit op de lange baan kon worden geschoven (bv. bij een negatief advies door de Raad van State).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De noodzakelijke voorwaarde blijft dezelfde: de veiling van 5G moet eerst zijn afgelopen. Ondertussen zijn er we contacten over de eventuele oprichting van een TowerCompany. De Vlaamse regering gaat hier wel geen initiatief in nemen zonder bereidheid bij de operatoren.
Noodzakelijke politieke actie	De noodzakelijke voorwaarde blijft dezelfde: de veiling van 5G moet eerst zijn afgelopen. Daarna kunnen gesprekken geopend worden voor de eventuele oprichting van een TowerCompany.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS		
Tweede versie concept paper voor oprichting 5G TowerCo voor Vlaanderen	2021 Q2	Gerealiseerd		
Goedkeuring veiling 5G in België	2021 Q2	Vertraging		
Overleg tussen telecomoperatoren en algemeen nutsbedrijf Fluvius over oprichten TowerCo	2022 Q3	Op schema		
Oprichting van een tower company	2024 Q2	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Onderzoek van het concept van een tower company en oprichting van een tower company		2022 Q4	1	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV170 - FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAK VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>PMV beheert tevens het Flanders Future Techfund, dat in 2019 werd opgericht met een beschikbaar kapitaal van 75 miljoen euro. Dit kapitaal willen we aanwenden voor investeringen in innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) platformtechnologie.</p> <p>Het gaat hier dus om een injectie vanuit de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	75.000.000 EUR
Output	Aantal gerealiseerde dossiers en geïnvesteerd bedrag
Outcome	Investeringen in beloftevolle technologieplatformen
Beoogde impact	Bredere economische valorisatie van toepassingen op basis van een technologieplatform

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er werden nog geen dossiers gerealiseerd in Flanders' Future Technology Fund. Een aanpassing van dit fonds werd recent doorgevoerd om te voldoen aan de adviezen van het INR en om ESR-neutraal te investeren.. Inmiddels zijn een 4-tal dossiers die voldoen aan de nieuwe investeringscriteria in onderzoek.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie	Geen, De Vlaamse Regering nam op 12 november een nota aan over de heroriëntering van het FFTF.
-------------------------------	--

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
----------	--------	--------

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Gerealiseerd investeringsbedrag vanuit FFTF	65000000	2024 Q4		
Aantal gerealiseerde projecten vanuit FFTF	5	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	75.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 75.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 29 maart 2019 - oprichting Flanders Future Techfund](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 12/11/2021 over de herpositionering van het Flanders Future Techfund](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	IMEC

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Imec (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) ontstaat in 1984 als onafhankelijk onderzoekscentrum voor micro- en later nano-elektronica. Het doel is om alle academische kennis rond chiptechnologie in Vlaanderen te bundelen. Sinds 2016 is ook iMinds (voorheen IBBT), het strategische onderzoekscentrum van Vlaanderen op het gebied van digitale innovatie, onderdeel van imec. Daardoor vind je bij imec vandaag zowel soft- als hardware onderzoek & ontwikkeling onder één dak.

De onderzoekscleanroom van imec is het strategische fundament van de unieke positie van imec als wereldleidend onderzoekscentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Zonder de cleanroom infrastructuur kan imec zijn brugrol tussen de academische wereld en de industrie niet spelen aangezien de cleanroom essentieel is om de industriële toepasbaarheid van de innovatieve concepten aan te tonen in een relevante productieomgeving. Tegen eind 2022 botst imec op de grenzen van de huidige cleanroom capaciteit. Dit resulteert in de nood tot ingebruikname van de "casco" cleanroom extensie die beschikbaar is binnen de huidige infrastructuur.

Sinds zijn oprichting heeft imec zich ook als doelstelling gezet om spinoffs op te richten. Het creëren van startups, waarbij unieke hardware het verschil maakt, is echter zeer kapitaalintensief en risicovol. Om de oprichting van dergelijke kapitaalintensieve hardware spin-offs voldoende te kunnen ondersteunen, heeft imec samen met de Vlaamse Overheid in 2017 het Imec.xpand fonds gelanceerd, een onafhankelijk investeringsfonds dat intussen 117 miljoen euro kapitaal heeft opgehaald. De middelen komen voor meer dan 60% van privé-investeerders, waaronder verschillende buitenlandse investeerders. Imec.xpand werd opgezet als een traditioneel fonds met een investeringsperiode van 5 jaar en een totale looptijd van 10 jaar die 2 keer met een jaar verlengd kan worden. De investeringsperiode loopt binnenkort ten einde. Daarom is er beslist om een nieuw Imec.xpand fonds op te zetten, met het doel om 120 miljoen op te halen bij investeerders verdeeld over overheids- en overheidsgerelateerde entiteiten, universiteiten en internationaal gereputeerde technologiebedrijven. Het is de bedoeling om van start te gaan met een eerste closing van € 60 miljoen euro ten laatste in Q1 2022 en in 2022 de rest van het fonds te closen.

PROJECTOMSCHRIJVING

Zowel de kapitaalsverhoging van Finlab als die van Fidimec worden gefinancierd via esr8 kapitaal, dat voorzien wordt bij begrotingsaanpassing 2021.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	70.000.000 EUR
Output	1. ingebruikname van de casco cleanroom extensie 2. opstart imec.xpand II fonds
Outcome	1. het verrichten van grensverleggend strategisch onderzoek inzake nanotechnologie en digitale technologie, om de industriële toepasbaarheid van de innovatieve concepten aan te tonen in een relevante productieomgeving 2. start-ups in een vroeg stadium van voldoende financiële middelen voorzien: investeren in een aantal start-ups
Beoogde impact	O&O-bestedingen door bedrijven - Aandeel innoverende bedrijven in de industrie- en dienstensector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	1.1 Aandeelhoudersovereenkomst Finlab nv wordt nog besproken. 2.1 Mededeling VR actualisering van de aandeelhoudersovereenkomst van Fidimec nv (VR 2021 1510 VV MED0016) 2.2 Aandeelhoudersovereenkomst Fidimec nv werd ondertekend op 20 oktober 2021 2.3 Storting eerste schijf van het kapitaal Fidimec op 26 oktober 2021
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
1.1 kapitaalverhoging Finlab nv van 40 miljoen euro	2021 Q2	Gerealiseerd
1.2 goedkeuring aandeelhoudersovereenkomst Finlab nv	2021 Q4	Gerealiseerd
1.3 voorontwerp cleanroom indienen	2022 Q2	Nog niet gestart
1.4 oplevering van alle werken	2023 Q4	Nog niet gestart

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
1.5 ingebruikname van de cleanroom	2023 Q4	Nog niet gestart
2.1 kapitaalverhoging Fidimec nv van 30 miljoen euro	2021 Q2	Gerealiseerd
2.2 goedkeuring aandeelhoudersovereenkomst Fidimec nv	2021 Q3	Gerealiseerd
2.3 eerste closing van het imec.xpand 2	2022 Q2	Nog niet gestart

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	70.000.000 EUR
Uitvoering VAK	70.000.000 EUR
Uitvoering VEK	36.822.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 70.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>1. Kapitaalsverhoging van Finlab nv in het kader van de uitbreiding van de 'casco' Imec cleanroom extensie: VR 2021 2105 VV DOC.0057</p> <p>2. Kapitaalsverhoging van FIDIMEC nv in het kader van de participatie in het Imec.xpand II investeringsfonds: VR 2021 0705 VV DOC.0046</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Kapitaalsverhoging van FIDIMEC nv in het kader van de participatie in het Imec.xpand II investeringsfonds</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV172 - INVESTERINGEN IN VLAGGENSCHIPRELANCEPROJECTEN VAN DE VLAAMSE HAVENS
INZAKE CO² CAPTATIE & HERGEBRUIK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaamse havens, bedrijven

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Investerings in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO₂ captatie & hergebruik => zitten deels in de enveloppe O&O en moet op specifiek projectniveau opgevolgd worden door Vlaio. Zij werken met open calls die bottom up worden ingevuld.</p> <p>De klimaatdoelstellingen hebben tot doel de netto uitstoot van CO₂ te beperken, wat kan bereikt worden door de energie efficiëntie op te drijven, processen te veranderen of andere producten aan te maken. Niettemin is het niet altijd mogelijk de aanmaak van CO₂ te vermijden. In deze gevallen bestaat er een mogelijkheid om de aangemaakte CO₂ af te vangen en ofwel na conditionering te transporteren voor opslag (CCS) ofwel om ze aan te wenden mits de inzet van hernieuwbare energie (CCU).</p> <p>De Vlaamse zeehavens, in het bijzonder de haven van Antwerpen en Northseaport zijn een uitermate geschikte locatie om de uitstoot aan CO₂ te reduceren door deze af te vangen en op te slaan. De haven van Antwerpen huisvest de grootste Europese geïntegreerde energie- en chemiecluster en in Northseaport is er een belangrijke concentratie aan zware industrie, waaronder het geïntegreerde staalbedrijf ArcelorMittal. Verschillende belangrijke industriële processen van deze basisindustrie genereren inherent CO₂ en de piste CCS/CCU kan in deze gevallen een oplossing aanreiken.</p> <p>De beoogde toepassingen van CCU noodzaken de aanmaak van groene waterstof aan de hand van hernieuwbare energie, de captatie en de verwerking van CO₂ en de synthese van beide tot een bruikbare grondstof, bv methanol. In het kader van de IPCEI Waterstof (zie fiche VV047) zijn er mogelijkheden om innovatieve projecten, waaronder zogenaamde First Industrial Deployments te steunen, die tot doel hebben groene waterstof te genereren of die de synthese van bv groene methanol aan de hand van afgevangen CO₂ en groene waterstof tot doel hebben. Er is echter een lacune voor de steun aan (innovatieve) projecten, die de captatie en verwerking van CO₂ tot doel hebben. Dit is het onderwerp van het voorliggende project.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

De mogelijkheden om de bedoelde Vlaamse projecten te steunen zijn: Vlaamse steun, al dan niet via de reguliere kanalen, en Europese steun, op de eerste plaats via het ETS Innovatiefonds. Voor minstens twee belangrijke projecten in deze context werd een Letter of Intent (LOI) tot Vlaamse ondersteuning, ondertekend door de Vlaamse minister bevoegd voor innovatie, aangeleverd ter ondersteuning van de aanvraag bij het ETS Innovatiefonds. Vlaamse cofinanciering met als doel het verhogen van de slaagkans bij de evaluatie door het ETS Innovatiefonds behoort immers tot de mogelijkheden. Het is voor alle duidelijkheid mogelijk dat er zich bijkomende bedrijfsprojecten met het oog op de captatie en de verwerking van CO₂ uit de zeehavens aanbieden voor ondersteuning.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	
Output	De voorziene middelen worden onder de vorm van een subsidie toegekend als Vlaamse cofinanciering voor één of meerdere investeringen in CCUS.
Outcome	De toe te kennen subsidie is een essentieel element om de CCUS investering te (kunnen) laten doorgaan. Uiteindelijke outcome is een beschikbare, operationele CCUS installatie.
Beoogde impact	Broeikasgasemissies

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Goedkeuring CCUS project door Europees steuninstrument. Vraag naar goedkeuring Vlaamse cofinanciering aangemeld bij EC. (Vertrouwelijke informatie.)
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Steunbeslissing EC of Vlaamse overheid betreffende Vlaamse projecten CO ₂ -captatie en/of -verwerking.	2021 Q4	Gerealiseerd
Aanvang projectuitvoering Vlaamse projecten CO ₂ -captatie en -verwerking	2030 Q4	Nog niet gestart
Definitieve Investeringsbeslissing Vlaamse projecten CO ₂ -captatie en/of -verwerking	2030 Q4	Nog niet gestart

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Beslissing VR toekenning Vlaamse subsidie	1	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV173 - AD HOC INVESTERINGSMIDDELEN ALS COFINANCIERING VOOR EUROPESE STEUN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We volgen de Europese subsidie- en financieringsmogelijkheden op met het oog op het realiseren van projecten in Vlaanderen op het vlak van innovatie, klimaat en duurzaamheid. Waar nuttig en mogelijk voorzien we aanvullende Vlaamse cofinancieringsmiddelen die inspelen op Europese financieringsmogelijkheden op het vlak van innovatie en duurzaamheid. In de context van projecten voor het ETS-innovatiefonds, kan het gaan om Vlaamse cofinanciering vanuit de reguliere enveloppes O&O en ecologiesteun in het Fonds Innoveren & Ondernemen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	
Output	
Outcome	
Beoogde impact	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De permanente monitoring van subsidiemogelijkheden via Europese kanalen voor projecten op het vlak van innovatie en duurzaamheid is een continu proces dat deel uitmaakt van de recurrente werking binnen het beleidsdomein EWI.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Permanente monitoring Europese opportuniteiten	2021 Q1	Op schema
Start toekenning Vlaamse cofinanciering voor projecten met Europese steun	2021 Q2	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV174 - NOODKOOPLINGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	OCMW's, energiehuizen en noodkopers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het Noodkoopfonds is er op gericht om via projecten van OCMW's renteloze leningen te verstrekken aan noodkopers voor de renovatie van hun woning. Noodkopers zijn eigenaars van kwalitatief en energetisch slecht scorende woningen, die door een gebrek aan financiële middelen hieraan niet kunnen remediëren.

OCMW's die deelnemen aan de projectoproep kunnen een renteloze kredietlijn bekomen van maximaal 1.800.000 euro, waarmee noodkoopleningen kunnen verstrekt worden van maximaal 30.000 euro. Deze noodkooplening dient past te worden terugbetaald bij vervreemding van de woning, of uiterlijk na 20 jaar, gespreid over een periode van 20 jaar.

Dit project wordt volledig gefinancierd met reguliere middelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	40.000.000 EUR
Output	Minimaal 1333 gerenoveerde noodkoopwoningen die voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, vermeld in artikel 3.1 van de Vlaamse codex Wonen.
Outcome	Energiebesparing bij de minimaal 1333 gerenoveerde noodkoopwoningen en overeenkomstige broeikasgasemissiereductie.
Beoogde impact	Broeikasgasemissies - Finaal energieverbruik in GWh

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Call 2021 is afgerond volgens de nieuwe voorwaarden (beslissing VR 16 juli 2021). Projecten zijn geselecteerd, ministeriële subsidiebesluiten zijn ondertekend.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Evaluatie NKF + formuleren optimalisatievoorstellen		2021 Q2	Gerealiseerd	
Lancering projectoproep 2021		2021 Q3	Gerealiseerd	
Projectoproep 2021 gegund		2021 Q4	Gerealiseerd	
Evaluatie call 2021		2022 Q1	Op schema	
Lancering projectoproep 2022		2022 Q3	Op schema	
Projectoproep 2022 gegund		2022 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
gerenoveerde noodkoopwoningen	667	2026 Q3		
gerenoveerde noodkoopwoningen	667	2027 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	40.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 40.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - BVR](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - nota](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - bijlage](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - advies](#)

[VR 16 juli 2021 - nota](#)

[VR 16 juli 2021 - BVR](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV175 - UITBREIDINGSBUDGET VOOR WELZIEN EN ZORG

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De inzet van de bijkomende middelen wordt tripartite afgesproken in het kader van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025, waarbij zowel werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties betrokken zijn. De middelen worden ingezet ten behoeve van het personeel en de gebruikers in de betrokken sectoren. Het uitbreidingsbeleid welzijn en zorg kent een ruimer spectrum aan belanghebbenden en richt zich op de bredere Vlaamse bevolking, in de eerste plaats mensen met een zorgnood of vraag naar andere ondersteuning.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De Vlaamse Regering voorziet naast het VIA-budget van 577 miljoen euro ook 562,5 miljoen extra middelen voor uitbreidingsbudget voor Welzijn en zet deze versneld in. In totaal wordt zo in het relanceplan "Vlaamse Veerkracht" 1,1 miljard euro voorzien voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector.</p> <p>Deze middelen worden ingezet voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere verloning van het zorgpersoneel en aantrekkelijker maken van beroep (o.m. via positieve beeldvorming, werken op zinstroom, extra omscholing tot verpleegkundigen, enz.); - Capaciteit: extra uitbreiding van het zorgaanbod in allerlei sectoren; - Kwalitatieve verbeteringen, verlichting van de werkdruk enz.; - Hervormingen: IFIC, ontschotting enz. <p>Via het uitbreidingsbeleid wordt bijkomend geïnvesteerd in personen met een handicap, de ouderenzorg (meer personeel en betaalbaarheid), jeugdhulp, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, gezondheidsbeleid en preventie.</p> <p>Uitbreidingsbeleid (opstap 2020 + op kruissnelheid in 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personen met een handicap: 270 mio euro; - Ouderenzorg: 140 mio euro; 	

PROJECTOMSCHRIJVING

- Jeugdhulp: 61,4 mio euro;
 - Kinderopvang: 58 mio euro;
 - Geestelijke gezondheidszorg: 18,6 mio euro;
 - Preventie en gezondheidsbeleid: 14,5 mio euro;
- Totaal: 562,5 mio euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	1.139.500.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Betere loonvoorwaarden: naar een gefaseerde invoering of uitrol van IF.IC (nieuwe functieclassificatie met bijhorend loonhuis); - Betere arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijker maken van beroep: o.m. via thuiswerk, verlaging werkdruk, opleiding, positieve beeldvorming, werken op (zij-)instroom, extra omscholing tot verpleegkundigen, ... - Extra personeel, los van het uitbreidingsbeleid: ca. 3.000 VTE; - Extra uitbreiding van het zorgaanbod in allerlei sectoren: zie uitbreidingskalender.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Betere verloning van het zorgpersoneel. - Aantrekkelijker maken van het zorgberoep. - Extra uitbreiding van het zorgaanbod in verschillende sectoren.
Beoogde impact	Aanbod in de Vlaamse zorg- en welzijnssector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De middelen voor VIA 6 en het uitbreidingsbeleid 2021 zijn in de begroting 2021 voorzien, de verdere uitrol van het uitbreidingsbeleid is voorzien in de meerjarenraming.</p> <p>Het voorakkoord VIA 6 werd gesloten op 24/11/2020. Er werd op 30/03/2021 een akkoord bereikt over het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025.</p> <p>Een BVR over de eerste fase van de verdeling van de VIA-middelen voor 2021 werd goedgekeurd op de VR van 16/07/2021. In de respectieve sectoren zijn al verschillende CAO's of protocollen ter uitvoering van VIA6 gesloten. Ook wordt er door de desbetreffende administraties werk gemaakt van de aanpassing van de toepasselijke reglementering waar nodig.</p> <p>Een BVR over de tweede fase van de verdeling van de VIA-middelen voor 2021 werd goedgekeurd op de VR van 12/11/2021 (+ materiële correctie op VR van 10/12/2021).</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>Een BVR over de derde fase van de verdeling van de VIA-middelen voor 2021 is in voorbereiding van agendering op de VR van 17/12/2021.</p> <p>Het uitbreidingsbeleid wordt stapsgewijs ingevuld volgens de in de Vlaamse Regering bepaalde prioriteiten en de ter beschikking gestelde budgetten.</p> <p>In 2021 worden een aantal engagementen uit het uitbreidingsbeleid versneld uitgevoerd. Over de belangrijkste componenten hierin wordt apart gerapporteerd in de projecten VV045 (ouderenzorg) en de projecten VV121 en VV180 (personen met een handicap).</p>
Noodzakelijke politieke actie	De Vlaamse Regering dient nog herverdelingsbesluiten goed te keuren voor het verdelen van de resterende middelen voor 2021 en de middelen voor 2022-2025.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Van voorakkoord naar akkoord	2021 Q3	Gerealiseerd	
Verdeling middelen 2021	2021 Q4	Op schema	
Uitvoering door sociale partners via CAO's en protocollen 2021-2025	2025 Q4	Op schema	
Verdeling middelen 2022-2025	2025 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.139.500.000 EUR
Uitvoering VAK	358.638.562 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 1.139.500.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 2711 MED.0378: Voorakkoord zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 24/11/2020 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025](#)

[VR 2020 2711 MED.0378: Voorakkoord zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 24/11/2020 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025 - bijlage](#)

[VR 2020 1812 DOC.0075: Decreet uitgavenbegroting voor begrotingsjaar 2021](#)

[VR 2021 0204 MED.0131/1: Definitief akkoord VIA6 goedkeuring - mededeling](#)

[VR 2021 0204 MED.0131/1: Definitief akkoord VIA6](#)

[VR 2021 1607 DOC.0967-1: Verdeling budget VIA6 private WVG, WSE en publ. PVT voor het jaar 2021](#)

[VR 2021 1607 DOC.0967-2: Verdeling budget VIA6 private WVG, WSE en publ. PVT voor het jaar 2021 - BVR](#)

[VR 2021 1211 DOC.1272-1 socioQ_public Herverdeling - nota](#)

[VR 2021 1211 DOC.1272-2 SocioQ_public Herverdeling - BVR](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV176 - ZIJINSTROOM VANUIT DE PRIVÉSECTOR NAAR HET ONDERWIJS AANTREKKELIJK MAKEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Toekomstige zijinstromers, scholen en schoolteams

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING

We maken vanaf 1/9/'20 zijinstroom vanuit de privésector naar het onderwijs aantrekkelijker voor een aantal knelpuntvakken- en ambten in het basis- en secundair onderwijs door de in de privésector opgebouwde geldelijke anciënniteit voor nieuwe zijinstromers te honoreren voor maximum 8 jaar. We willen met deze maatregel extra zijinstromers aantrekken en zo het lerarentekort mee helpen wegwerken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	4.000.000 EUR
Output	2.000.000 Euro reeds aangewend budget
Outcome	Ongeveer de helft van het gebudgetteerde bedrag werd aangewend. Vorig schooljaar konden minstens 340 zijinstromers die de overstap maakten van de privésector naar één van de opgenomen knelpuntvakken en -ambten genieten van deze maatregel.
Beoogde impact	Wegwerken van het lerarentekort

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	Uitbreiding maatregel Uit de monitoring van de maatregel na 1 jaar toepassing is gebleken dat het

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>oorspronkelijk gebudgetteerde bedrag slechts voor de helft werd aangewend. Daarom is er ruimte om de maatregel uit te breiden binnen het vooropgestelde budget.</p> <p>In de conceptnota "Herwaardering van de leraar" die op 3/12/'21 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering is voorzien dat we deze uitbreiding nog dit schooljaar op twee manieren aanbrengen.</p> <p>Eenzijds wordt het maximum aantal jaren geldelijke anciënniteit dat een zijinstromer kan meenemen vanuit de privésector opgetrokken van 8 naar 10 jaar. Anderzijds wordt de lijst met knelpuntvakken en knelpuntambten gevoelig uitgebreid: de ambten van directeur en ICT-coördinator worden toegevoegd in het basis- en secundair onderwijs; in het secundair onderwijs worden de vakken informatica, aardrijkskunde, biologie, chemie, Duits, economie, Engels, fysica, Latijn, natuurwetenschappen, PAV en techniek toegevoegd.</p> <p>De minister bevoegd voor Onderwijs werd opgedragen de regelgevende werkzaamheden op korte termijn op te starten. De komende weken wordt een ontwerpbesluit uitgerold met daarin o.a. de uitbreidingen aan deze maatregel zodat deze wellicht op 1/3/'22 in voege kunnen gaan.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Basisonderwijs: 383 FTE - 455 stamnummers Secundair onderwijs: 292 FTE – 495 stamnummers	2021 Q2	Gerealiseerd
Monitoring van de maatregel in 2021	2021 Q3	Gerealiseerd
Uitbreiding lijst knelpuntvakken- en ambten	2022 Q3	Op schema
Monitoring van de maatregel in 2022	2022 Q3	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 4.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot wijziging van de regelgeving betreffende de geldelijke en sociale anciënniteit van sommige personeelsleden van het onderwijs - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot wijziging van de regelgeving betreffende de geldelijke en sociale anciënniteit van sommige personeelsleden van het onderwijs - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot wijziging van de regelgeving betreffende de geldelijke en sociale anciënniteit van sommige personeelsleden van het onderwijs - advies](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV177 - IMPLEMENTATIE VAN DE VLAAMSE JOBBONUS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Werkende Vlamingen en Vlamingen die aan het werk willen gaan, sociale partners, nog andere te bepalen stakeholders

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING

Werken moet lonen. Om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten en tevens de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen, wordt er vanaf 2021 een Vlaamse jobbonus ingevoerd. Die bedraagt netto maximaal 600 euro op jaarbasis voor mensen die voltijds werken en hierbij tot maximaal 1.800 euro bruto per maand verdienen. Het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt vervolgens uitgefaseerd richting een bruto maandloon bij voltijdse prestatie van 2.500 euro. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt rekening gehouden met het werkelijk aantal gepresteerde uren.

De jobbonus heeft de dubbele doelstelling om mensen enerzijds te activeren en anderzijds werken te belonen. De maatregel is bedoeld om meer mensen aan de slag te krijgen en te houden; in het bijzonder voor mensen met lage inkomens is het verschil tussen werken en niet werken vaak te klein om aan de slag te gaan of aan de slag te blijven.

Naast de jobbonus voor loontrekkenden komt er ook een jobbonus + voor zelfstandigen. De jobbonus + richt zich op werknemers met een laag inkomen (< 2.500 bruto per maand, afgestemd op de bovengrens van de jobbonus) die de transitie maken van werknemer naar ondernemer in hoofdberoep. De jobbonus+ is voor de laatste groep een stimulus om de transitie naar ondernemerschap in hoofdberoep te maken. In die zin wordt de jobbonus verlengd voor wie de overstap maakt naar ondernemer in hoofdberoep door een premie van €600 euro bij opstart als zelfstandige in hoofdberoep (mits men voldoet aan de voorwaarden) en een bijkomende premie van €600 wanneer men na 1 jaar nog steeds zelfstandige in hoofdberoep is.

Er wordt eveneens een toepassing ontwikkeld om het uit te betalen bedrag te kunnen bepalen op basis van input uit authentieke bronnen waar beschikbaar en manuele invoer waar niet beschikbaar. De ontwikkeling van deze toepassing is opgenomen in VV128.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	197.000.000 EUR
Output	Aantal uitbetaalde jobbonussen en jobbonus+
Outcome	<p>Aanmoedigen van mensen met lage inkomens om aan de slag te gaan of aan het werk te blijven.</p> <p>Aanmoedigen om als werknemer met een laag inkomen de stap te zetten naar zelfstandige in hoofdberoep.</p>
Beoogde impact	Werkzaamheidsgraad

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De jobbonus is een nieuwe beleidsmaatregel waarmee de Vlaamse Regering wil tegemoet komen aan de landenspecifieke aanbevelingen vanuit de Europese Commissie om werkenden een bijkomende positieve financiële prikkel te geven om aan het werk te gaan of te blijven. De doelgroep van de jobbonus bestaat uit personen met een laag beroepsinkomen. Er wordt gekozen voor een premie die toegekend wordt op basis van het loon op jaarbasis.</p> <p>Naast de jobbonus voor werknemers zullen ook werknemers met een laag inkomen die ondernemer worden een jobbonus+ of starterspremie ontvangen. Die premie moet het ondernemerschap stimuleren door in se de jobbonus nog voor twee jaar te verlengen (twee maal een schijf van 600 euro).</p>
Noodzakelijke politieke actie	<p>De fiscale vrijstelling van de jobbonus is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen starten met de uitbetaling van de maatregel. De fiscale vrijstelling wordt gevraagd aan de Federale overheid voor de jobbonus, en de jobbonus+.</p> <p>Aan Federaal Minister Lalieux wordt gevraagd om de jobbonus vrij te stellen als een bestaansmiddel bij het toekennen van het leefloon.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Definitieve goedkeuring decreet jobbonus	2022 Q2	Op schema
Definitieve goedkeuring decreet jobbonus+	2022 Q3	Nog niet gestart
Definitieve goedkeuring BVR jobbonus	2022 Q2	Nog niet gestart
Definitieve goedkeuring BVR jobbonus+	2022 Q3	Nog niet gestart
Eerste betaling loontrekkenden	2022 Q4	Nog niet gestart

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	
Eerste betaling ondernemers		2022 Q4	Nog niet gestart	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uitbetaalde jobbonussen	716.601 voor het referentiejaar 2021	2022 Q4		
Aantal uitbetaalde jobbonus+ (timing afhankelijk van afbakening doelgroep in decreet/BVR)	Timing en streefwaarde nog afhankelijk van de concrete afbakening van de doelgroep in decreet/BVR (verwacht bereik op jaarbasis: 12.000 personen)	2030 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	197.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 197.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<ul style="list-style-type: none"> • Voorontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus principieel goedgekeurd op de VR van 19 november 2021: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nota Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6196B673364ED9000800028E ○ Ontwerp van decreet: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6196B67F364ED90008000290 ○ Memorie van toelichting: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6196B68F364ED90008000292

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling aan de Vlaamse Regering betreffende conceptnota Jobbonus+ en transitiepremie voor startende zelfstandigen goedgekeurd op de VR van 19 november](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV128 - Digitale vaardigheden](#)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Subsidieaanvragers Circusdecreet, Kunstendecreet, Reglement doorgeven vakmanschap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Via het Kunstendecreet, het Circusdecreet en het reglement 'beurzen voor het doorgeven van vakmanschap' geeft de Vlaamse overheid extra zuurstof aan individueel creatief talent en meesterschap, onder de vorm van beurzen en projectsubsidies, waarbij via bijkomende middelen ook extra beleidsimpulsen worden gegeven. Deze subsidies geven een brede waaier aan creatievelingen groeikansen en ademruimte om hun talent verder te ontwikkelen, van kunstenaars tot ambachtslieden en zij die bij hen in de leer willen gaan.</p> <p>In het Kunstendecreet gaat het om (professionele) kunstenaars, die een beurs (kortlopend of meerjarig) kunnen aanvragen, of een projectsubsidie (met een maximumlooptijd van drie jaar) Een beurs dient als financiële ondersteuning voor kunstenaars die nieuwe ideeën willen ontwikkelen of andere wegen willen verkennen. Een projectsubsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van artistieke initiatieven die beperkt zijn in tijd en doelstelling.</p> <p>De ontwikkelingsbeurzen binnen het Circusdecreet, maken uitzonderlijke inspanningen of een professioneel traject voor circusartiesten mogelijk, voor maximum een jaar. Het proces, het onderzoek en het artistieke experiment primeren op een concrete productie. Het groeipotentieel en concrete verwachtingspatroon van de kunstenaar zijn cruciaal. Het begrip circusartiest krijgt een brede invulling waarmee ook technische, pedagogische en dramaturgische opleidingen aan bod kunnen komen.</p> <p>De beurzen voor het doorgeven van vakmanschap situeren zich binnen het beleid rond 'immaterieel cultureel erfgoed': vakmanschap met wortels in traditie kan worden doorgegeven in zogenaamde 'meester-leerling-trajecten': een meester en één of meerdere leerling (en) gaan samen een traject aan van maximum twee jaar, waarbij kennis en vaardigheden worden doorgegeven, in diverse domeinen (bv ambachten, muziek-en podiumkunsten, agrarische technieken, culinair erfgoed, etc).</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

Naast andere subsidies, die eerder gericht zijn op de ondersteuning van organisaties, investeert de Vlaamse overheid met deze instrumenten rechtstreeks in het menselijk kapitaal binnen de cultuursector, met een focus op de ontwikkeling van mensen. Door creatievelingen te stimuleren, ontstaat later ook weer nieuw werk, waar het brede publiek op haar beurt weer volop kan van genieten.

De voorziene budgetten voor deze subsidielijnen kunnen worden geraadpleegd via de BBT.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	
Output	Aantal toegekende subsidies en beurzen is afhankelijk van aantal aanvragen en beschikbaar budget
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> -kansen geven aan individuele kunstenaars om de eigen praktijk te ontwikkelen/parcours uit te stippelen -kansen geven aan vaklieden/ambachtslieden om vakmanschap door te geven en te verwerven, opdat dit immaterieel erfgoed niet verloren gaat, en om het in nieuwe toepassingen te gebruiken -goed opgeleide circusdocenten voor de markt hebben
Beoogde impact	Ontwikkeling bij cultuurwerkers

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>-Wat betreft projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten op het Circusdecreet werden sinds het laatste meetmoment geen aanvragen ingediend (0 aanvragen voor indienronde 15/10/2021).</p> <p>-Wat betreft de beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in meester-leerling-trajecten werden bij de indienronde 15/9/2021 93 aanvragen ingediend, waarvan 89 ontvankelijk. De minister honoreerde 21 aanvragen voor een totaalbedrag van 597.389,82 euro. Vanaf januari 2022 gaan 21 meesters en 35 leerlingen aan de slag in leertrajecten van enkelen maanden tot maximum twee jaar.</p> <p>-Wat betreft beurzen en projecten op het Kunstendecreet:</p> <p>Subsidieaanvragen voor initiatieven die starten in de periode januari tot augustus 2022 konden tot en met 15 september 2021 ingediend worden. 289 kunstenaars deden een aanvraag voor een beurs en er werden ook 90 aanvragen voor een projectsubsidie voor een kunstenaar ingediend. 194</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

beursaanvragen en 64 aanvragen voor een projectsubsidie kregen een positief advies.

De minister neemt uiterlijk op 15 januari 2022 een beslissing over deze ronde.

In de begroting 2022 is 9.709.000 euro ingeschreven voor beurzen en projectsubsidies voor kunstenaars en organisaties, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door het Vlaams Parlement. Deze projectmatige middelen worden niet geormerkt naar subsidie-instrument, noch naar aanvraagronde.

Dit is de laatste aanvraagronde binnen het Kunstendecreet van 13 december 2013. De tweede aanvraagronde 2022, met uiterste indiendatum op 15 mei 2022, voor initiatieven die van start gaan in de periode september tot december 2022, wordt geregeld binnen het nieuwe Kunstendecreet van 23 april 2021, dat in werking treedt op 1 januari 2022.

De vernieuwingen binnen dit decreet hebben onder meer als doel om kunstenaars volop kansen te geven om hun praktijk te ontwikkelen, zowel via op kunstenaars gerichte instrumenten als via de subsidiëring van organisaties die hen een goede werk- en presentatiecontext bieden.

Het nieuwe Kunstendecreet behoudt de beurs als subsidie-instrument voor de kunstenaar, maar de aanwending ervan wordt aangepast en verscherpt, met een afbakening op vlak van o.m. looptijd en toepassing: een beurs opkomend talent (looptijd van maximaal één jaar) en een beurs bewezen talent (looptijd van maximaal drie jaar). Voor welke beurs een kunstenaar in aanmerking komt, hangt af van de fase van de professionele artistieke carrière waarin de kunstenaar zich bevindt. Een beurs wordt toegekend voor een forfaitair bedrag per jaar (7.500 euro voor een beurs opkomend talent, 12.000 euro voor een beurs bewezen talent). Nieuw is ook een bijkomend aandachtspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van de motivatie en het werkplan, met name de 'begeleiding'. Deze begeleiding is geen verplichting, maar aanvragers worden zo gestimuleerd om hun onderzoek en werk in te bedden in het veld, het met peers of experts te delen en hierover in dialoog te gaan. Diverse vormen van begeleiding en ondersteuning zijn mogelijk. Het kan gaan om een mentor, coaching, samenwerking met een werkplaats, een klankbord enz.

Het nieuwe decreet stelt de projectsubsidies ook expliciet open voor kunstwerkers als natuurlijk persoon. Binnen het Kunstendecreet van 13 december 2013 werden subsidieaanvragen van individuele intermediairen voor een project met of voor kunstenaars wel reeds aanvaard.

Tot slot voorziet het nieuwe Kunstendecreet ook in een residentiebeurs voor kunstenaars voor een verblijf in een residentie in het binnen- of buitenland. Zowel residenties bij een residentieplek waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media een overeenkomst heeft gesloten, als andere komen in aanmerking. De beurs bedraagt maximaal 10.000 euro en dekt maximaal de kosten die aan de residentie verbonden zijn, uitgezonderd de kosten die door de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	residentieplek waarmee een overeenkomst is gesloten, zelf worden opgenomen. Een residentiebeurs kan aangevraagd worden vanaf 1 januari 2022.
Noodzakelijke politieke actie	beslissingen minister na oproepen in het kader van decreten en reglementen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	
Lancering oproepen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet 2021 (15/3 en 15/9)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering oproepen beurzen Circusdecreet 2021 (15/10, 15/2/15/6)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering oproep beurzen vakmanschap 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Oproepen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet 2022 (indiendata 15/5 en 15/9)	2022 Q4	Nog niet gestart	
Oproepen beurzen Circusdecreet 2022 (15/10, 15/2, 15/6)	2022 Q4	Nog niet gestart	
Oproep beurzen vakmanschap 2022	2022 Q4	Nog niet gestart	
Oproepen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet 2023 (indiendata 15/3 en 15/9)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oproep beurzen vakmanschap 2023	2023 Q4	Nog niet gestart	
Toekenningen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet (twee oproepen per jaar, 15/3 en 15/9, zowel voor beurzen als projecten)	2023 Q4	Op schema	
Toekenningen beurzen circusdecreet (3 aanvraagrondes per jaar: 15/10, 15/2 en 15/6)	2023 Q4	Op schema	
Toekenningen beurzen doorgeven vakmanschap (jaarlijks een indienronde 15/9)	2023 Q4	Op schema	
Oproepen beurzen circusdecreet 2023 (15/10, 15/2, 15/6)	2023 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV179 - INSPANNINGEN OM INVESTERINGEN AAN TE TREKKEN VERHOGEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	De belanghebbenden zijn buitenlandse investeerders met investeringsplannen die potentieel in Vlaanderen kunnen landen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Tevens versterken we onze inspanningen om investeringen aan te trekken, o. a. door Vlaanderen te promoten bij investeerders als innovatieve kennisregio met behulp van gespecialiseerde consultants in 15 toplanden en virtuele site visits met behulp van verbeterde technologie; de Brexit is ook een opportuniteit om bepaalde logistieke activiteiten aan te trekken (Vlaanderen als “gateway to Europe”)</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Input	
Output	<p>De maatregelen uit deze actie zijn een aanvulling op VV108. VV108 wordt gefinancierd via de Brexit Adjustment Reserve waarbij (op aangeven van de Commissie van de EU) steeds een directe link met het VK aangetoond moet worden.</p> <p>De maatregelen uit de actie VV179 hebben in het kader van de relance een zelfde doel als deze onder VV108 maar zijn wereldwijde acties die zich niet beperken tot het VK.</p> <p>De output van VV179 is identiek aan deze van VV108, nl: In een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders willen we snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.</p>
Outcome	Behoud en groei van het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT	
Beoogde impact	Evolutie buitenlandse investeringen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>In aanvulling op de rapporteringen vroeger in het jaar kunnen we meegeven dat het algemeen investeringsklimaat in Europa zich voortbeweegt via zowel versnellingen als vertragingen in het investeringslandschap.</p> <p>Het investeringsklimaat voor investeerders van buitenlandse oorsprong kenmerkt zich in 2021 door een blijvende mate van onzekerheid ten gevolge van de Covid-19 pandemie (die met golven heropflakert en voor onzekerheid zorgt), algemene grondstoffentekorten en wereldwijde logistieke problemen. De bemoeilijkte wereldwijde mobiliteit heeft ook tot gevolg dat er minder site visits kunnen uitgevoerd worden waardoor er bovengemiddeld geïnvesteerd wordt is in de begeleiding van bestaande buitenlandse investeerders. Daarnaast zagen we in vanaf september wel een toename in de beslissingen rond projecten die on hold gezet waren ten gevolge van Covid-19. Het blijft bijgevolg een jaar met een janusgezicht waar ups en downs in de prospectie en begeleiding van buitenlandse investeerders zich opvolgden.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING		STATUS	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
<p>De maatregelen uit deze actie zijn een aanvulling op VV108. VV108 wordt gefinancierd via de Brexit Adjustment Reserve waarbij (op aangeven van de Commissie van de EU) steeds een directe link met het VK aangetoond moet worden. De maatregelen uit de actie VV179 hebben in het kader van de relance een zelfde doel als deze onder VV108 maar zijn wereldwijde acties die zich niet beperken tot het VK. De output van VV179 is identiek aan deze van VV108, nl:</p>		2023 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
In een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders willen we snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 2020 1812 DOC.1581/1BIS

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

VV180 - WACHTLIJSTEN GEHANDICAPTENZORG

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Wouter Beke
Trekkende entiteit VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	personen met een handicap

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Fase 2 van de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid voor het wegwerken van de wachtlijsten: Door de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid - gekoppeld aan de hervorming van de toeleiding en de voorwaarden voor budgettoekenning - wordt een perspectief geboden aan personen met een handicap om sneller een budget te verkrijgen zodat ze de nodige zorg kunnen inkopen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME, BEOOGDE IMPACT

Input	130.000.000 EUR
Output	2.700 erkende personen met een handicap in prioriteitengroep 1 zullen op korte termijn een persoonsvolgend budget ontvangen waarmee ze hun zorgbehoefte kunnen invullen. Op 1 december kregen reeds 2.250 personen een persoonsvolgend budget. (zie ook VV121)
Outcome	Personen met handicap met een ondersteuningsvraag in prioriteitengroep 1 op datum van 31/12/20 zullen op korte termijn effectief een persoonsvolgend budget ontvangen, waarmee ze zorg kunnen inkopen. (zie ook VV121)
Beoogde impact	Aantal personen met een Handicap die ondersteuning geniet

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart na agendering VR
---------------	----------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	De eerste fase van de versnelling van de terbeschikkingstellingen is in volle uitvoering. Aan 2.250 meerderjarige personen uit prioriteitengroep 1 werd in 2021 reeds een PVB ter beschikking gesteld.
Noodzakelijke politieke actie	Voor bepaalde doelgroepen is nog een beslissing van de Vlaamse regering vereist, omtrent de wijze van terbeschikkingstelling en de voorwaarden waaronder dat zal gebeuren. Dit is het geval voor de Rechtstreeks Toegankelijke hulp, de minderjarigen en de meerderjarigen in prioriteitengroep 2.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG		
MIJLPALEN		
MIJLPAAL	TIMING	STATUS
Fase 2 toekenning bijkomende budgetten aan personen met een handicap	2021 Q4	Op schema

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	130.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 130.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Uitrol uitbreidingsbeleid 2021 met het oog op perspectief bieden aan de personen met een handicap met ondersteuningsnoden

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV121 - Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1



**DEPARTEMENT
KANSELARIJ &
BUITENLANDSE ZAKEN**

Havenlaan 88 bus 100
1000 Brussel
www.vlaanderen.be
