

Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Voortgangsrapport en covernota

Meetmoment juni 2022



MONITORING
RELANCEPLAN
VLAAMSE
VEERKRACHT

**Voortgangsrapport en covernota
Meetmoment juni 2022**



INHOUD

MANAGEMENTSAMENVATTING	11
1 INLEIDING	15
2 AANLOOP, DOELSTELLINGEN, GOVERNANCE EN COMMUNICATIE VAN HET RELANCEPLAN	17
2.1 Aanloop naar het relanceplan	17
2.2 Doelstellingen van het relanceplan	17
2.3 Governance van het relanceplan	20
2.4 Communicatie	20
2.4.1 Open en transparante communicatie over monitoring	20
2.4.2 Communicatie-initiatieven in 2022	21
3 VOORBEREIDING METING 4	22
3.1 Feedback uit begeleidingsorganen bij meting 3	22
3.2 Aanbevelingen Rekenhof bij meting 3	23
3.3 Nieuwigheden bij meting 4	23
4 ANALYSE BIJ METING 4	25
4.1 Contextanalyse	25
4.2 Kernindicatoren	27
4.3 Realisaties	30
5 KERNCIJFERS OVER DE RELANCEPROJECTEN OP MEETMOMENT 1 JUNI 2022	38
5.1 Projectvoortgang	38
5.1.1 Algemene projectvoortgang	38
5.1.2 Projectvoortgang per speerpunt	41
5.1.3 Projectvoortgang per cluster	41
5.2 Mijlpalen	42
5.2.1 Globaal	42
5.2.2 Mijlpalen per speerpunt	44
5.2.3 Mijlpalen per cluster	52
5.3 Vastleggingen en vereffeningen	53
5.3.1 Vastleggingen en vereffeningen voor VV001-VV158	53
5.3.2 Vastleggingen en vereffeningen per speerpunt voor VV001-VV158	53
5.3.3 Globaal overzicht vastleggingen en vereffeningen per speerpunt voor VV001-VV158	57

5.3.4	Globaal overzicht vastleggingen en vereffeningen per cluster voor VV001-VV158	58
6	RRF-PROJECTEN	60
6.1	Overzicht van de RRF-projecten	60
6.2	Analyse	62
7	LEESWIJZER BIJ HET GLOBALE RAPPORT	65
8	VOORTGANGSRAPPORT: GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN ALLE PROJECTEN	67
	01. RENOVATIE GEBOUWENPATRIMONIUM (ENERGETISCH & ASBESTVERWIJDERING)	67
	VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE	67
	VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE	72
	VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE	76
	VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)	79
	VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)	81
	VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE	84
	VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET	89
	VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL	92
	VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN	95
	VV010 - SOCIALE WONINGBOUW	98
	VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID	101
	VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE	105
	02. FIETSINFRASTRUCTUUR	108
	VV013 - DE INRICHTING VAN EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN	108
	VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN	112
	03. DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS	115
	VV015 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS (DIGISPRONG)	115

04. OPLEIDINGS- EN LOOPBAANOFFENSIEF	120
VV016 - ACTIVERING-VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80 PROCENT VESOC	120
VV017 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN	125
VV018 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT	131
VV019 - VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN	138
05. VERSTERKING O&O	143
VV020 - BIO-ECONOMIE	143
VV021 - ONDERZOEKINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S), SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS)	148
VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN	152
VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O	155
06. BLUE DEAL	161
VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE	161
VV025 - BLUE DEAL - ONDERZOEK	166
VV026 - BLUE DEAL - MOW	170
VV027 - BLUE DEAL - ECONOMIE	174
VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN	178
VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN	181
VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER	184
VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR IN DE BEBOUWDE OMGEVING	187
VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN	191
VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING	197
VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN	200
VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN	206
VV036 - NATTE NATUUR	209
07. INVESTERINGEN IN VERKEERSVEILIGE WEGEN	214
VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT	214

VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN	218
VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES	222
VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT	226
08. MODAL SHIFT NAAR WATER	230
VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)	230
VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN	233
VV043 - WATERBEHEERSING DENDER	236
VV044 - MINNELIJKE VERWERVINGEN EN ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE	238
09. WELZIJNSINFRASTRUCTUUR	241
VV045 - INZETTEN OP KWALITEIT EN GOOD GOVERNANCE VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID	241
VV046 - OPTREKKEN STRATEGISCHE FORFAITS ZIEKENHUIZEN	250
10. WATERSTOFONDERZOEK	253
VV047 - WATERSTOFONDERZOEK	253
11. VERGROENING WEGINFRASTRUCTUUR	259
VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP)	259
VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR	262
12. IEDEREEN LOKAAL DIGITAAL	267
VV050 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING	267
VV051 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS	273
VV052 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES	277
VV053 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING	279
VV054 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET	282
VV055 - SMART CITIES	284
13. DIGITALISERING VLAAMSE OVERHEID	287
VV056 - ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING – ONBOARDING RAAMOVEREENKOMSTEN	287

VV057 - ONDERSTEUNING DIGITALE TRANSFORMATIE	290
VV058 - VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING	296
VV059 - DIGITALISERING ASSET MANAGEMENT AQUAFIN	300
VV060 - VERSNELLING EN VERDERE UITBOUW VAN MIJN BURGERPROFIEL	304
VV061 - DATANUTSBEDRIJF	307
VV062 - DIGITALISERING DBRC - TOEGANG TOT DE VLAAMSE BESTUURSRECHTSpraak	310
VV063 - HET OMGEVINGSLOKET – DIGITALISERING INZAGE-LOKET EN OMGEVINGSCHECK	313
VV064 - FIT – DATAGEDREVEN ORGANISATIE EN DIGITALISERING DIENSTVERLENING	316
VV065 - CYBERSECURITY EN UITROL SIEM	321
VV066 - HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK	324
VV067 - MODERNISERING CLOUD- EN NETWERKINFRASTRUCTUUR	326
VV068 - KALEIDOS – DIGITALISERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE VLAAMSE REGERING	328
VV069 - DATA INTEGRATIEDIENSTEN VOOR SLIMME MOBILITEIT	333
VV070 - MATIS, HET VLAAMSE MATERIALENINFORMATIESYSTEEM	339
VV071 - POOLSTOKALIAS	344
VV072 - DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN	346
VV073 - VLAAMSE SENSOR DATA SPACE	350
VV074 - VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM	354
VV075 - VLM - MAP6 EN DATAWAREHOUSE	360
VV076 - ZELFBEHEERDE IDENTITEIT	364
14. CULTURELE INFRASTRUCTUUR	368
VV077 - BELFORT AALST	368
VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE	370
VV079 - DESINGEL ANTWERPEN	372
VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK	374
VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR	376
VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN	379

VV083 - INVENTARIS CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR	381
VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE	384
VV085 - KURSAAL OOSTENDE	387
VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK	389
VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)	391
VV088 - MOOOV TURNHOUT	394
VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE	396
VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS	399
VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT	402
VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS	405
VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT	407
VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT	409
VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST	411
VV096 - SCHOUWBURG BOOM	413
VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES	415
VV098 - VERSNELLING OPERA GENT	417
15. INVESTERINGEN ONROEREND ERFGOED	419
VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED	419
16. VERBETERING EN VERDUURZAMING RUIMTELIJKE ORDENING	425
VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN	425
VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN	428
VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN	431
VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING	434
VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING)	437
VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP	440
17. VERGROENING OPENBAAR VERVOER (DE LIJN)	444
VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN	444

18. BREXIT	450
VV107 - INITIATIEVEN VANUIT VLAM VOOR DE PROMOTIE EN AFZET VAN PRODUCTEN, O. A. ALS GEVOLG VAN BREXIT	450
VV108 - SUBSIDIES AAN BEDRIJVEN (FINANCIËLE STEUN VOOR BEDRIJVEN, KOSTENVERLAGING VOOR DEELNAME AAN BEURZEN, ONDERSTEUNING VOOR BREXIT) + INZET VAN CONSULTANTS OM VLAANDEREN IN HET BUITENLAND TE PROMOTEN	453
VV109 - VLAIO BREXIT ACTIEPLAN	457
19. CONGRES-, BEURS- EN TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR	462
VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)	462
VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN	464
20. VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS	467
VV112 - VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS	467
21. DIGITALISERING ZORGBELEID	471
VV113 - BLENDED-CARE JEUGDHULP - BANDBREEDTE	471
VV114 - DIGITALE HULPVERLENING - KWALITEITSBEVORDERING	479
VV115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN	484
VV116 - ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER - GEÏNTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN	489
VV117 - ENKELBANDEN EN STRAFUITVOERING	492
VV118 - GROEIPAKKET - VERDERZETTEN DIGITALISERING	497
VV119 - ONTWIKKELEN RECHTENVERKENNER 2.0 MET EEN MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOOL IN STERKE SAMENWERKING MET DE LOKALE BESTUREN	503
VV120 - VERBETEREN VAN DE SOCIALE KAART	506
22. INVESTEREN IN PERSONEN MET EEN HANDICAP	509
VV121 - VOORUITSCHUIF UITBREIDINGSBELEID - FASE 1	509
23. SPORTINFRASTRUCTUUR	512
VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR	512
24. UITBOUWEN CIRCULAIRE ECONOMIE	515
VV123 - CIRCULAIR BOUWEN	515

VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE	518
VV125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB	521
25. INVESTERINGEN GROENE WARMTE	525
VV126 - CALL GROENE WARMTE	525
26. DIGIBANKEN	528
VV127 - DIGIBANKEN	528
27. DIGITALE VAARDIGHEDEN	534
VV128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN	534
28. DIGITALISERING VLAAMSE MEDIA- EN CULTUURSECTOR	541
VV129 - CULTUUR - BETERE INFORMATIEDOORSTROMING EN KOPPELING DATABANKEN	541
VV130 - CULTUUR - DIGITALISERING VAN COLLECTIES	545
VV131 - CULTUUR - INTEGRATIETRAJECT ERFGOEDDATABANKEN	550
VV132 - DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - INVESTERING	554
VV133 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VLAAMSE MEDIASECTOR	558
VV134 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR	564
VV135 - INVESTEREN IN MEDIAWIJSHEID VAN DE VLAMING	567
29. VERSTERKEN MENTAAL WELZIJN	571
VV136 - VERNIEUWENDE PROJECTEN HUIZEN VAN HET KIND	571
VV137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN	575
VV138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN	579
VV139 - OVERKOPHUIZEN	583
VV140 - SAMENWERKINGSVERBANDEN "ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN"	586
VV141 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - CRISISOPVANG EN CRISISBEGELEIDING IN RESIDENTIËLE JEUGDZORG	589
VV142 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES	592
VV143 - ZORGZAME BUURTEN - ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT	594

VV144 - ZORGZAME BUURTEN - VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN	599
30. ARMOEDEBESTRIJDING EN WIJKVERBETERING	604
VV145 - BUITENSCHOOLSE OPVANG ONDERSTEUNEN	604
VV146 - COMPENSATIEBESLUIT KO - EXTRA TUSSENKOMST IKT (INKOMENSTARIEF)	607
VV147 - DOORGAANDE LIJN KINDEROPVANG – ONDERWIJS	610
VV148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN	614
VV149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK	617
VV150 - WIJKVERBETERING	621
VV151 - WIJKVERBETERINGSCONTRACTEN - INTEGRALE KETENAANPAK WELZIJN-JUSTITIE-LOKALE BESTUREN	624
VV152 - PROJECTOPROEP KWETSBARE KINDEREN	627
31. INVESTERINGEN AUDIOVISUELE SECTOR	630
VV153 - GARANTIEFONDS VOOR DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR	630
VV154 - IMPULS AAN VAF FILMFONDS	633
VV155 - IMPULS AAN VAF MEDIAFONDS EN GAMEFONDS	636
32. JEUGDINFRASTRUCTUUR	639
VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR	639
33. GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL	645
VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL	645
34. SPENDING REVIEWS	652
VV158 - SPENDING REVIEWS	652
35. EXTRA RELANCEPROJECTEN	656
VV159 - SNELLERE VERGUNNINGS- EN BEROEPSPROCEDURES	656
VV160 - ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING	658
VV161 - DECENTRALISATIEOEFENING NAAR LOKALE BESTUREN	661
VV162 - INVESTEREN IN VLAAMSE KENNISOVERHEID	664

VV163 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - PAKKET VAN 500 MILJOEN EURO VOOR ZEER GOEDKOPE ACHTERGESTELDE LENINGEN AAN ENERZIJD'S START-UPS & SCALE-UPS EN ANDERZIJD'S KMO'S	669
VV164 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - EXTRA CAPACITEIT VOOR GIGARANT (3 MILJARD EURO) EN VOOR PMV-Z-WAARBORGEN (400 MILJOEN EURO) - HEFBOOM VOOR MAXIMALE BANCAIRE FINANCIERING	672
VV165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS-PUBLIEK EN REST PRIVAAT)	675
VV166 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - UITBREIDING VAN DE WIN-WIN-LENING EN VRIENDENAANDEEL	678
VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOUW 2	681
VV168 - VERSNELDE UITROL DIGITALE METERS	684
VV169 - VERSNELDE UITROL GLASVEZELNETWERK EN 5G	687
VV170 - FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAAG (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE	689
VV171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD	691
VV172 - INVESTERINGEN IN VLAGGENSCHIPRELANCEPROJECTEN VAN DE VLAAMSE HAVENS INZAKE CO ² CAPTATIE & HERGEBRUIK	695
VV173 - AD HOC INVESTERINGSMIDDELEN ALS COFINANCIERING VOOR EUROPESE STEUN	698
VV174 - NOODKOOPLINGEN	700
VV175 - UITBREIDINGSBUDGET VOOR WELZIJN EN ZORG	703
VV176 - ZIJINSTROOM VANUIT DE PRIVÉSECTOR NAAR HET ONDERWIJS AANTREKKELIJK MAKEN	706
VV177 - IMPLEMENTATIE VAN DE VLAAMSE JOBBONUS	709
VV178 - EXTRA ZUURSTOF VOOR INDIVIDUEEL CREATIEF TALENT - MEESTERSCHAP	713
VV179 - INSPANNINGEN OM INVESTERINGEN AAN TE TREKKEN VERHOGEN	716
VV180 - WACHTLIJSTEN GEHANDICAPTENZORG	719

MANAGEMENTSAMENVATTING

Vlaamse Veerkracht grotendeels op schema


Ondanks de vijf covid-golven en de Oekraïne-crisis is de uitvoering van het plan Vlaamse Veerkracht grotendeels op schema. 96% van de projecten verloopt volgens schema, 92% van de opgestarte mijlpalen staat op gerealiseerd of op schema. Ook bij de vastleggingen zien we een substantiële sprong naar 46,5% van de relancemiddelen of 2 miljard euro.

96% van de projecten op schema

In vergelijking met de meting in maart, september en december 2021 is opnieuw een duidelijke vooruitgang geboekt. Meer dan 96% van de projecten verlopen globaal op schema bij het vierde meetmoment van juni 2022.

Voortgang

Projectstatus ● Nog niet opgestart ● Opgestart ● In uitvoering na agendering VR ● Aandacht nodig ● Actie nodig ● Gerealiseerd

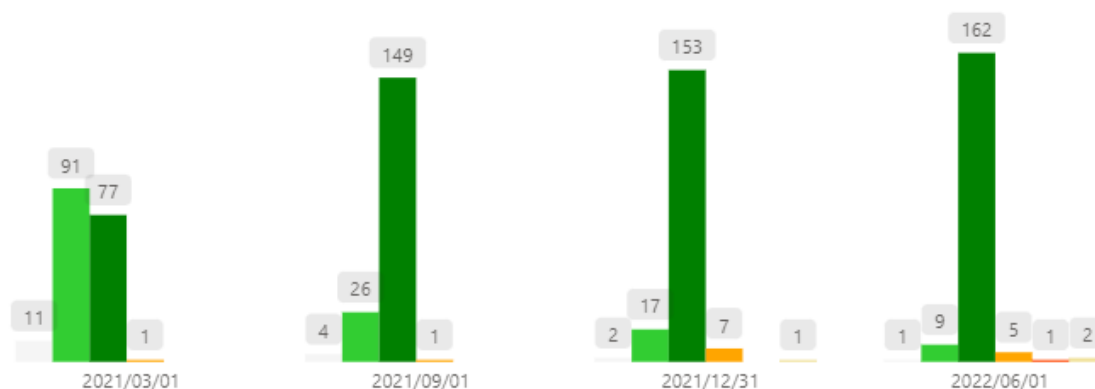

173 van de 180 relanceprojecten (96%) zijn in juni 2022 in uitvoering en lopen op schema:

- 9 projecten (5%) hebben de status 'opgestart' maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
- 162 projecten of (90%) hebben de status 'in uitvoering na agendering VR', en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.
- 2 projecten of (1%) hebben de status 'gerealiseerd'. Het gaat over VV146 'Compensatiebesluit KO (Kinderopvang) – extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)' en VV139 'Overkophuizen'.

Voor 5 van de 180 relanceprojecten (3%) is bijzondere aandacht nodig (oranje). Dit betreft:

- VV014 'Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen: de maatregel is positief onthaald en de aanmeldingen komen binnen, maar volstaan niet om de beoogde doelstellingen te behalen. Op lokaal niveau dienen de nodige middelen te worden voorzien in de meerjarenplanning. De beschikbare lokale personeelscapaciteit speelt verder ook een rol. Er loopt een tussentijdse evaluatie met het oog op een

bijsturing van het BVR, om de scope van het project uit te breiden en om de modaliteiten aan te passen.


- VV056 'Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamcontract 2022': de operationele service integratiediensten, evenals de verschillende ICT-dienstverleningspakketten zijn van start gegaan op 1 februari 2022. De transitie kon echter nog niet volledig worden afgerond. Er zijn echter geen grote onderbrekingen in de ICT-dienstverlening. De verwachting t.o.v. de ICT-partners is om de dienstverlening uiterlijk eind juni 2022 naar het beoogde peil te brengen.
- VV087 'Materniteit de Bijloke – de Creatiecluster (Gent)': het initiatief vergt een investeringssubsidie van 4,98 miljoen euro voor een maximum van 60% van de totale projectkost. De budgettering van het project is nog niet volledig rond. In afwachting van bijkomende financiering wordt het dossier nog niet aan de Vlaamse Regering voorgelegd.
- VV120 'Verbeteren van de sociale kaart': de externe firma, die in de eerste fase de ontwikkeling van de vernieuwde database en de toepassing doet, loopt ernstige vertraging op. Was de toepassing initieel voorzien voor 2021 Q2, zal deze pas in Q3 van 2022 klaar zijn. Hierdoor verschuift alles en dus ook de planning van het uitbreidingsproject met de voorziene relancemiddelen.
- VV168 'Versnelde uitrol digitale meter': in samenwerking met intercommunales en private bedrijven investeren we in een versnelde uitrol van digitale meters, een investering van ongeveer 2 miljard euro door Fluvius, gespreid over 10 jaar. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de terugdraaiende teller vernietigde, werd de uitrol achteruit geschoven en is er nog steeds heel wat twijfel om een digitale meter te laten installeren. Door corona ontstaat bijkomende vertraging en is uitrol van 80% tegen 2025 een grote uitdaging.

Eén relanceproject krijgt de projectstatus 'rood', waarbij bijkomende actie noodzakelijk is. Het gaat over VV078 'Cultuurhuis Blankenberge'. Het initiële projectvoorstel voorzag in een nieuw cultuurhuis voor de stad Blankenberge. Het gemeentebestuur communiceerde in het najaar van 2021 dat het de 3 miljoen euro voor een andere (niet-culturele) invulling zou aanwenden. Het gemeentebestuur kon echter geen alternatief project voorleggen dat aan de bestedingsvoorschriften voldeed. De Vlaamse minister voor Cultuur heeft daarom beslist om de relancemiddelen opnieuw vrij te maken.

Eén relanceproject is nog niet gestart (grijs). Het gaat over VV142 'Versterking aanpak intrafamiliaal geweld – bewustmakingscampagnes'. Het blijft de bedoeling om de campagne in 2022 te lanceren. De vastlegging zal bijgevolg in 2022 gebeuren.

92% van de opgestarte mijlpalen op schema of gerealiseerd

Tussen meting 3 van december 2021 en meting 4 van juni 2022 werden bijkomende mijlpalen aangebracht en steeg het aantal van 1257 naar 1469 mijlpalen. Deze mijlpalen situeren zich tussen de jaren 2020 en 2030.

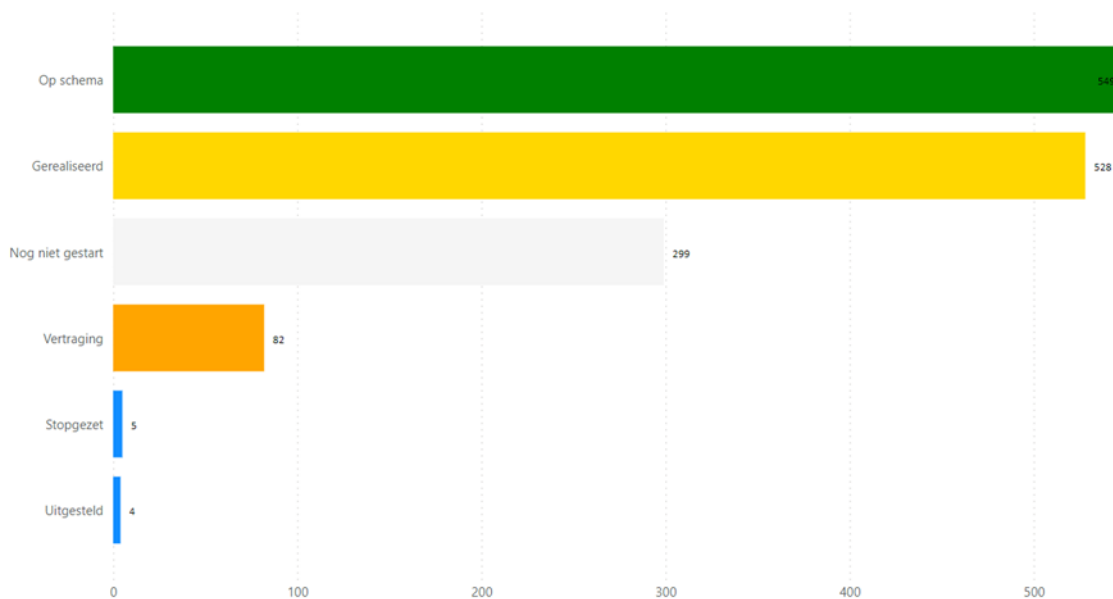

1077 van de 1469 mijlpalen die zich situeren tussen 2020 en 2030 zijn, ofwel op schema, ofwel gerealiseerd. Dit is 73,3% van alle mijlpalen. Als we de verhouding nemen van de mijlpalen op schema en gerealiseerd t.o.v. alle mijlpalen zonder rekening te houden met de verder in de toekomst liggende en dus nog niet opgestarte mijlpalen (299 of 20,4%), dan komen we zelfs aan 92% van de opgestarte mijlpalen die in juni 2022 op schema staan of al gerealiseerd zijn. 82 mijlpalen hebben vertraging, 5 mijlpalen werden stopgezet, en 4 mijlpalen werden uitgesteld.

Er worden verschillende redenen aangehaald voor de 82 vertraagde mijlpalen: gebrek aan interne en externe capaciteit, bijgestelde planning door een groter dan verwachte complexiteit of onvoorziene omstandigheden, men wacht op een beslissing van een andere overheid, interne enveloppeverschuivingen tussen projecten binnen Vlaamse Veerkracht, het financieel plan is nog onvolledig,

Vier mijlpalen werden uitgesteld. Uitgestelde mijlpalen zijn mijlpalen waarbij de activiteiten voor het realiseren van de mijlpaal nog niet zijn opgestart, en waar een nieuwe deadline voor een mijlpaal gepland wordt. Er worden verschillende redenen aangehaald voor de uitgestelde mijlpalen: focuswijziging, noodzaak aan bijkomende besluitvorming, uitstel van een publiek event omwille van COVID, en prioritering omwille van de Oekraïne-crisis.

Vijf mijlpalen werden stopgezet. In dat geval worden de activiteiten voor het realiseren van de mijlpaal niet opgestart of verdergezet. Er worden verschillende redenen aangehaald voor de stopgezette mijlpalen: focuswijziging, hogere kostprijs van de projecten, heroriëntering van middelen voor Oekraïne-maatregelen, en de vervanging van een initiatief door een ander initiatief dat wel nog kan worden aanbesteed in 2022.


Substantiële sprong in vastleggingen naar 46,5% van de relancemiddelen

Op 1 juni 2022 was er 2 miljard euro of 46,5% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen vastgelegd. Dat is 476 miljoen euro meer dan bij de vorige meting in december 2021.

446 miljoen euro of 10% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was begin juni vereffend. Dat is een stijging van 227 miljoen euro in vergelijking met de vorige meting.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend



1 INLEIDING

COVID-19 trof Vlaanderen en de wereld hard. Daarom investeert de Vlaamse Regering **4,3 miljard euro extra** om het economische en maatschappelijke weefsel te herstellen. De Vlaamse regering investeert bijkomend ook in zorg (bv. uitbreidingsbudget), werk (bv. jobbonus) en onderwijs (scholenbouw). Het Relanceplan '[Vlaamse Veerkracht](#)' is daarmee het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers zette.

Om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te verzachten, creëerde de Europese Unie een herstelfonds - [NextGenerationEU](#). Het biedt de lidstaten rechtstreekse steun en leningen - de **Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV)**. Voor België is er een maximum van 5,9 miljard euro steun voorzien. Daarvan heeft Vlaanderen voor zijn relanceplan recht op een maximum van 2,255 miljard euro. Vijfenvijftig van de Vlaamse Veerkracht projecten worden met deze middelen gefinancierd. Eind juni 2022 wordt duidelijk op hoeveel middelen Vlaanderen uiteindelijk zal kunnen rekenen. Wat niet Europees gefinancierd wordt, zal de Vlaamse overheid zelf financieren.

Sinds de vorige meting in januari veranderde de context waarin het Vlaams herstelbeleid zich afspeelt drastisch. De **inval van Rusland in Oekraïne** heeft wereldwijde gevolgen waar ons herstelbeleid niet aan ontsnapt. Het **belang van het relanceplan neemt toe**, want veel van de maatregelen uit Vlaamse Veerkracht bieden een antwoord op de vraagstukken die uit deze crisis naar voren komen. Vlaanderen wil schok- en crisisbestendiger worden en besteedt daarom meer aandacht aan isolatie van gebouwen, groene mobiliteit, circulaire economie, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, snellere vergunningen en ondersteunend PMV-instrumentarium. De Vlaamse overheid realiseert, om de economie aan te zwengelen, grote publieke investeringen in, onder meer, infrastructuur.

Bij deze meting 4, maar ook tussentijds, houden we via ons **dashboard met kernindicatoren** de vinger aan de pols. Dit zijn enerzijds macro-economische indicatoren over de context van het plan, zoals de hoge inflatie, waar het plan zelf geen invloed op heeft. Anderzijds volgen we ook kernindicatoren op, die kenmerkend zijn voor (clusters van) projecten, waarvan we voorzichtig aannemen, dat er een positieve bijdrage kan worden verwacht. Voorzichtig, omdat uiteraard nog veel andere zaken een invloed hebben, zoals het reguliere beleid, maar ook contextfactoren waar de Vlaamse overheid geen vat op heeft.

De vierde meting houdt ook rekening met de aanbevelingen van het **Rekenhof**. Het formuleerde eerder dit jaar verbeterpunten voor de aanpak en de kwaliteit van de monitoring. In dat verband verwijzen we naar de uitgebreide, gezamenlijke presentatie van minister-president Jambon en collega-minister Diependaele van 22 maart jl. in de parlementscommissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie. Op hun voortgangsrapport, volgde een uitgebreide gedachtewisseling. Het **Vlaams Parlement** wordt goed geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering, zowel globaal in deze commissie, als op projectniveau in de specifieke commissies. We blijven inzetten op de kwaliteitsverbetering van de gegevens en houden rekening met de aanbevelingen van het Rekenhof en de suggesties vanuit het Vlaams Parlement. De bevattelijke voorstelling van de monitoringsgegevens is een permanent aandachtspunt.

Deze nota houdt verder ook rekening met de aandachtspunten aangebracht vanuit het **Directiecomité Vlaamse Veerkracht**, het **Economisch Relancecomité**, het **Maatschappelijk Relancecomité**, het **Klimaatexpertenpanel**, het **Vlaamse Economisch Sociaal Overlegcomité** en de **Taskforce Vlaamse Veerkracht**. Deze organen steunen met hun inzichten en advies de uitvoering van het plan.

Hierna behandelen we eerst de aanloop, de doelstellingen, de governance en de communicatie van het relanceplan. Vervolgens blik de covernota kort terug op de aanbevelingen bij de derde meting en de voorbereidingen voor meting 4. De hoofdbrok van deze covernota gaat over de kerncijfers van **het vierde meetmoment van juni 2022** met een analysehoofdstuk, een hoofdstuk met de kerncijfers over alle projecten en een hoofdstuk over de voortgang van de RRF-projecten. We eindigen de covernota met een leeswijzer bij het monitoringsrapport als geheel.

2 AANLOOP, DOELSTELLINGEN, GOVERNANCE EN COMMUNICATIE VAN HET RELANCEPLAN

2.1 AANLOOP NAAR HET RELANCEPLAN

Op 30 april 2020 besliste de Vlaamse Regering om een **Economisch Relancecomité** op te richten, om aanbevelingen voor een snel en krachtig economisch herstel uit te werken. De regering was even zeer bezorgd over de impact van de coronacrisis en de begeleidende overheidsmaatregelen op het maatschappelijke leven. Daarom richtte de Vlaamse Regering, op 16 mei 2020, naast een adviesorgaan voor economie, het **Maatschappelijk Relancecomité op**.

Het Economisch Relancecomité bestaat uit onafhankelijke experts, die elk in hun vakgebied een prominente rol spelen, en afgevaardigden van de Vlaamse ministers.

Het Maatschappelijk Relancecomité bestaat uit onafhankelijke experts, die in hun werkdomein evenzeer vooraanstaande deskundigen zijn, en afgevaardigden van de Vlaamse ministers.

Beide Relancecomités bundelden hun aanbevelingen in [rapporten](#). Ze werden op 14 juli 2020 bekend gemaakt. De Vlaamse Regering ging met deze rapporten aan de slag en stelde eind september 2020 haar Relanceplan '[Vlaamse Veerkracht](#)' voor. In de [Septembeerklaring van 2020](#) ging de minister-president uitvoerig op de inhoud van het plan in.

2.2 DOELSTELLINGEN VAN HET RELANCEPLAN

Het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' dient verschillende doelen:

- Het plan bevat maatregelen om de **acute crisissen** van de covid-golven te bestrijden.
- Daarnaast bevat het plan **herstelmaatregelen** om de maatschappij en economie terug op adem te laten komen en te blijven.
- Voorts maakt de Vlaamse Regering van de verschrikkelijke crisis een opportuniteit. Ze doet **substantiële publieke investeringen** in zorg en welzijn, in mensen en talenten, in infrastructuur, maar ook in de transitie naar een duurzame en digitale economie en samenleving.
- Tot slot maakt de Vlaamse Regering van de gelegenheid gebruik om, met het oog op een grotere efficiëntie en effectiviteit, de organisatie en de werking van de **Vlaamse overheid te heroverwegen**.


De **zeven speerpunten** van het relanceplan reflecteren deze doelstellingen. Het zijn:

- **De coronacrisis en Brexit beheersen:** een wereldwijde pandemie en een drastische shift in de handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk zet ons economisch weefsel onder druk. De Vlaamse Regering levert heel grote inspanningen om de **Vlaamse economie en bedrijven te ondersteunen** door hun **financiële slagkracht** maximaal intact te houden. Daarnaast neemt de Vlaamse Regering maatregelen die de **impact van Brexit** moeten verzachten, en tegelijk de economische mogelijkheden met het VK maximaal kansen geven.


Uiteraard dragen deze maatregelen ook bij tot het mitigeren van de gevolgen van de Oekraïne-crisis en de economische schade die eruit voortvloeit.

- **Versterking van het Vlaams Zorg- en Welzijnssysteem:** de Vlaamse economie kende een stevige terugval, maar ook onze samenleving ging en gaat nog steeds door een zware crisis. COVID-19 plaatst een enorme druk op onze **ziekenhuizen**, onze **woonzorgcentra**, onze **zorgvoorzieningen** in de sector van **personen met een handicap**, onze **kinderopvang en jeugdhulp**, en onze **scholen**. Zowel fysiek als mentaal was en is dit voor veel Vlamingen een moeilijke periode. De vijfde covidgolf in het voorjaar, na de massale en succesvolle vaccinatiecampagne, viel velen zwaar. De Vlaamse Regering spendeert daarom extra middelen voor het zorgpersoneel, voor het fysiek en mentaal welzijn van de Vlaming, voor armoedebestrijding en wijkverbetering.
- **Investeren in mensen en talenten:** actieve handen en hoofden zijn de basis voor onze Vlaamse welvaart, vandaag en morgen. Onze arbeidsmarkt kende een stevige dreun, maar is er intussen al bovenop. De Vlaamse Regering blijft investeren in **opleiding en begeleiding**, om zo veel mogelijk Vlamingen naar **werkbaar werk** te leiden en een **werkzaamheidsgraad van 80%** te bereiken. Daartoe maakt ze met de **jobbonus** werken ook meer lonend.
- **Investeren in infrastructuur:** ondersteunen door investeringen in onze infrastructuur te versnellen. We maken van deze crisis gebruik om fors in te zetten op **veiliger en groener verkeer**: van meer fietspaden, over verkeersveilige wegen tot een 'modal shift' naar duurzame mobiliteit en transport. We zorgen voor **kwaliteitsvolle ontmoetingsplekken** voor vrijetijdsbeleving, zelfontplooiing en gemeenschapsvorming in alle domeinen, van cultuur en onroerend erfgoed, over sport tot toerisme. Tot slot versnellen we de bouw van **schoolinfrastructuur**. Deze investeringen zorgen voor werkgelegenheid, voor hogere welvaart, meer levenskwaliteit van de Vlaming en zetten een belangrijke stap in de richting van een duurzame samenleving.
- **Verduurzaming van economie en samenleving:** de coronacrisis biedt een opportuniteit om versneld te investeren in een duurzame toekomst voor Vlaanderen. We zetten volop in op de transitie naar een **groenere economie en samenleving**. Dit gebeurt o.a. door een grootschalige renovatie van onze gebouwen, O&O-investeringen, de Blue Deal, investeringen in duurzame ruimtelijke ordening en groene mobiliteit. Deze publieke investeringen zijn goed voor het klimaat, voor onze economie en werkgelegenheid, en dus ook toekomstige Vlaamse welvaart. De Oekraïne-crisis bevestigt onze overtuiging dat die inspanningen noodzaak blijven.
- **Vlaanderen digitaal transformeren:** de coronacrisis biedt een opportuniteit om versneld te investeren in een **digitale transformatie**. Dit gebeurt zowel binnen de lokale en regionale besturen, maar even zeer in de zorg, de media- en cultuursectoren. We investeren verder in de digitale omkadering, vaardigheden en de 'digitale identiteit' van de Vlamingen. Deze investeringen dragen bij tot de efficiëntie van beleid, onze economie en werkgelegenheid, en creëren garanties voor de toekomstige welvaart.
- **De overheid efficiënter maken:** de Vlaamse overheid maakt van deze crisis gebruik om zichzelf te herdenken en te **hervormen**. Ze werkt aan snellere vergunnings- en beroepsprocedures, administratieve vereenvoudiging, een Vlaamse kennisoverheid, decentralisatie van Vlaamse bevoegdheden naar de lokale besturen en uitgaventoetsingen.

De Vlaamse Regering investeert **4.3 miljard euro** aan **eenmalige relancemiddelen** in deze zeven speerpunten, naast de investeringen via reguliere middelen.

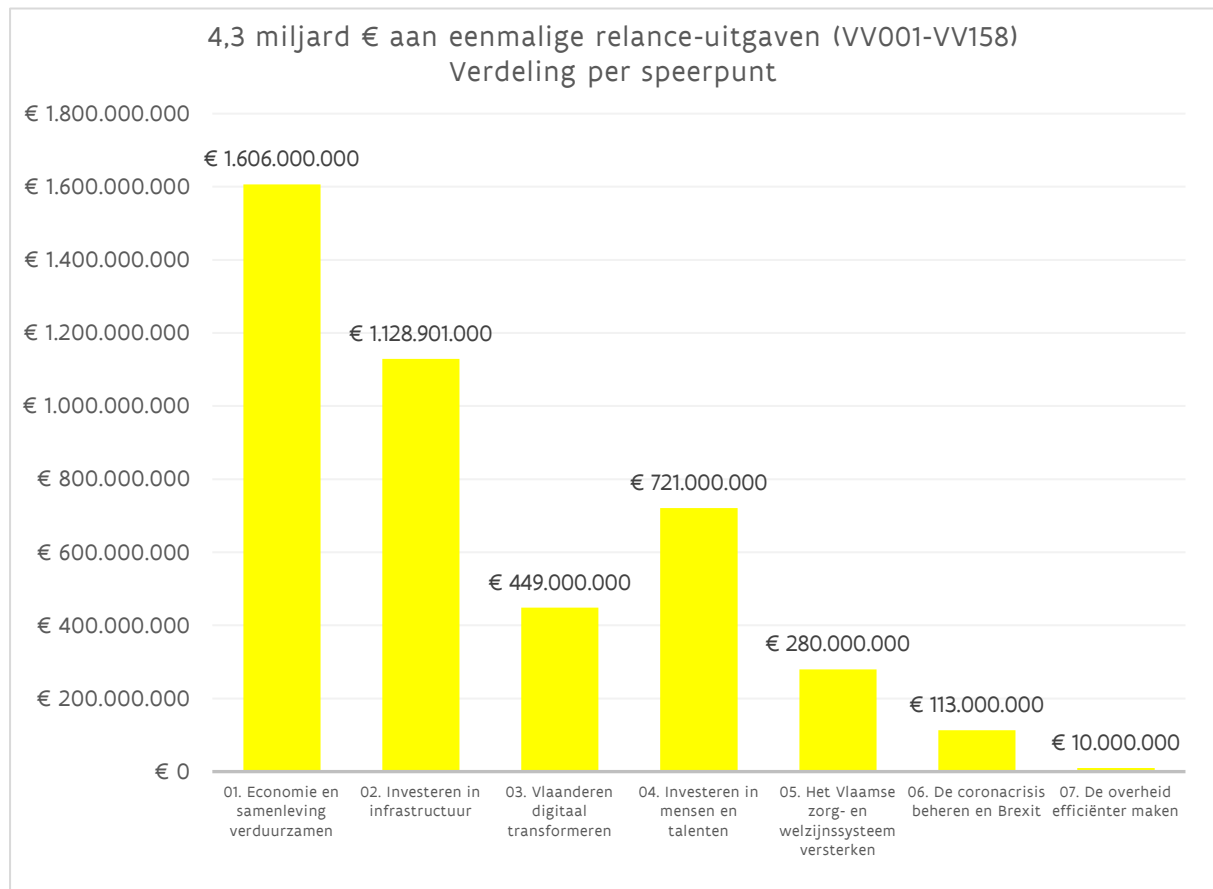

Het relanceplan is niet alleen verdeeld in zeven speerpunten, het is ook opgebouwd volgens 35 clusters. De verdeling van de middelen over deze clusters kan men hieronder terugvinden.

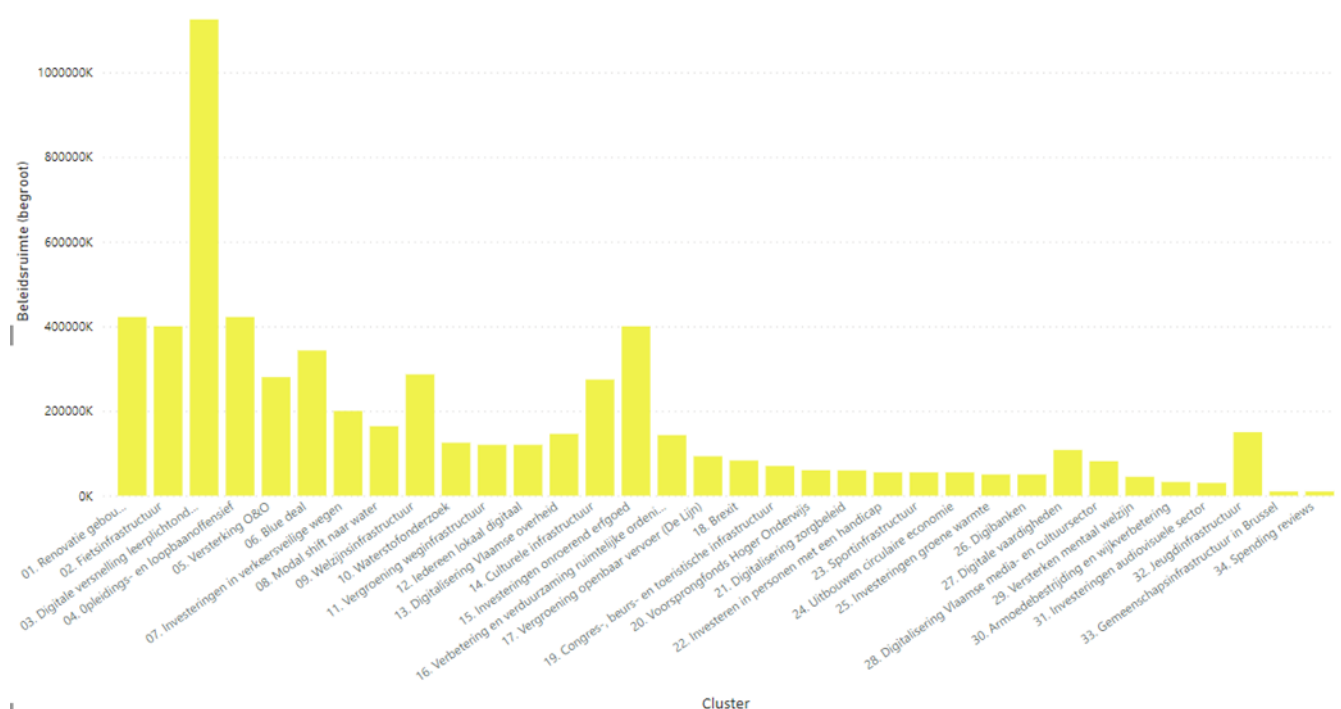

2.3 GOVERNANCE VAN HET RELANCEPLAN

De Vlaamse Regering legde in een [Mededeling aan de Vlaamse Regering](#) vast hoe de monitoring van het Vlaams Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' zal verlopen. Om dit omvangrijk relanceplan professioneel te kunnen monitoren, zijn een **duidelijke governancestructuur en periodieke meetmomenten** voorzien. In 2021 waren er drie meetmomenten (maart 2021, september 2021 en december 2021). In 2022 zijn er twee meetmomenten (juni 2022 en december 2022). Deze rapporten worden telkens als Mededeling aan de Vlaamse Regering geagendeerd.

Een **Directiecomité** volgt de uitvoering van de projecten uit het uitgewerkte relanceplan Vlaamse Veerkracht op. Dit comité bestaat uit een kabinetsadviseur per minister en de elf leden van het Voorzitterscollege (tien voorzitters van de managementcomités van de Vlaamse overheid en de voorzitter van het Voorzitterscollege). Het Directiecomité bereidt de Taskforce voor en waakt over een optimale uitvoering van het relanceplan en een correcte monitoring. Voorafgaand aan elke Taskforce bespreken het Maatschappelijk en het Economisch Relancecomité, het Klimaatexpertenpanel en het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité de voortgangsrapporten.

De **Taskforce Vlaamse Veerkracht** bestaat uit de ministers van de Vlaamse Regering, de voorzitters van de twee Relancecomités, de voorzitter en ondervoorzitter van de SERV, de voorzitter van het Klimaatexpertenpanel en een vertegenwoordiging vanuit het Voorzitterscollege, met de voorzitter en de secretaris-generaal van het Departement Financiën en Begroting als vaste leden. In functie van de agenda kan de minister-president oordelen over de opportuniteit om eventueel bijkomend andere leidende ambtenaren uit te nodigen. De Taskforce is het overleg- en supervisieorgaan en waakt over de uitvoering van het plan. De Taskforce komt bij elk meetmoment samen, evalueert de monitoring en de bereikte resultaten en stuurt, waar nodig, bij.

De administratie staat in voor de concrete uitvoering. Het **Voorzitterscollege** zorgt voor voldoende afstemming en informatiedeling tussen de entiteiten.

Het **Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken** en het **Departement Financiën & Begroting** coördineren de oefening. Ze bundelen hun krachten in een gemengde projectgroep, waarin de betrokken beleidsdomeinen vertegenwoordigd zijn.

2.4 COMMUNICATIE

2.4.1 **Open en transparante communicatie over monitoring**

De Vlaamse Regering communiceert actief over de doelstellingen en de uitvoering van het plan:

- Ze hanteert een [apart label 'Vlaamse Veerkracht'](#) voor alle regeringsbeslissingen die er verband mee houden. Zo is het voor elke belanghebbende eenvoudig om beslissingen terug te vinden.
- Bij externe communicatie over de voortgang van individuele projecten onderstreept de regeringscommunicatie de betekenis van het hele relanceplan.
- De Vlaamse Regering voorziet de nodige persmomenten over uitvoering en vooruitgang van het plan.

- Ook tussen de meetmomenten communiceert de Vlaamse Regering over het plan. Zo was er in de zomer van 2021 een [communicatiecampagne](#) naar het brede publiek.
- De Vlaamse Regering voorziet bij elk meetmoment een Mededeling van de Vlaamse Regering. Het volledige rapport wordt telkens op de website van de Vlaamse regeringsbeslissingen en de [website Vlaamse Veerkracht](#) gepubliceerd.
- De Vlaamse Regering ontsluit de hele dataset van de monitoring van Vlaamse Veerkracht op het [Opendataportaal](#) van de Vlaamse overheid.

2.4.2 Communicatie-initiatieven in 2022

In het voorjaar van 2022 werd geïnvesteerd in de **internationale communicatie** over het Vlaams relanceplan. Er bestaat intussen een [Engelstalige versie van de website Vlaamse Veerkracht](#). En er zijn [Engelstalige leaflets](#) en meertalige e-mailbanners voorzien. Zo communiceren we de voortgang van het herstelbeleid ook internationaal. Bij buitenlandse zendingen van de Vlaamse Regering en de minister-president is het herstelplan Vlaamse Veerkracht opgenomen in de besprekpunten. Ook in de tweede helft van 2022 investeren we verder in internationale communicatie.

Bij meetmoment 4 van juni 2022 krijgt de **website Vlaamse Veerkracht een omvangrijke update**: het hersteldashboard is uitgebreid en we zetten nieuwe projecten in de kijker. De uitbreiding van het hersteldashboard houdt rekening met de nieuwe context van de Oekraïne crisis.

In het **najaar van 2022 voorzien we een communicatiecampagne** toegespitst op de doelgroepen en de belanghebbenden van het relanceplan. We focussen minder op het herstel na covid, en meer op de investeringen die Vlaanderen crisisbestendig maken, ook in het licht van de Oekraïne crisis. Om Vlaamse Veerkracht concreet te maken, vertellen we niet alleen over de output maar ook over de outcome van de projecten en de globale impact van de investeringen. 4 verhalen over Vlaamse Veerkracht: 'duurzaamheid', 'duurzame tewerkstelling', 'digitale transformatie' en 'de maatschappij weerbaarder maken' krijgen een centrale plaats in deze communicatiecampagne.

3 VOORBEREIDING METING 4

3.1 FEEDBACK UIT BEGELEIDINGSORGANEN BIJ METING 3

De leden van het Directiecomité, de Relancecomités, het Klimaatexpertenpanel, het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, en de Taskforce, spraken tijdens de bespreking van de voortgang bij **het derde meetmoment van 31/12/2021** hun waardering uit voor de monitoring en de voortgang van de uitvoering.

Daarnaast wees men op **enkele aandachtspunten**:

- Alle begeleidende organen toonden appreciatie voor inhoud en aanpak van de voortgangsrapportering. De meting biedt een transparante kijk, zowel op project- als op geaggregeerd niveau. Nauwgezette monitoring maakt het mogelijk om de geplande realisatiegraad van het plan op te volgen en snel eventuele knipperlichten te detecteren. Met het oog op de volgende rapporteringen is gevraagd om **extra aandacht te besteden aan de duiding van eventuele vertragingen of (verwachte) uitvoeringsproblemen**: de oorzaken, eventueel ook de verwachte impact en de remediërings- of bijsturingplannen.
- Het plan bestaat uit 180 projecten, verdeeld over 35 inhoudelijke clusters. Clusters 1 t.e.m. 34 worden gefinancierd met 4,3 miljard aan eenmalige relancemiddelen. De besteding van deze middelen is in de voortgangsrapportering zorgvuldig gemonitord. Daarnaast bestaat het relanceplan uit **hervormingsprojecten**, zoals het project rond administratieve vereenvoudiging en snellere vergunnings- en beroepsprocedures. Die projecten zijn opgenomen in cluster 35. Zij zijn met reguliere middelen gefinancierd. De Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT) regelt de opvolging van die bestedingen. De Taskforce suggereert om de voortgang van deze projecten in de relancerapportering **scherper in beeld te brengen**.
- Vijfenvijftig projecten uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht krijgen middelen uit de Europese **Recovery and Resilience Facility**. De Europese Commissie koppelt hier substantiële voorwaarden aan. De rechtstreekse periodieke rapportering aan de Europese Commissie is uitgebreid. Omdat het behalen van afgesproken en welomlijnde mijlpalen en streefdoelen een voorwaarde van de financiering is, stellen de begeleidingsorganen voor om in de covernota een aparte **focus op de 55 RRF-projecten te voorzien**.
- De begeleidingsorganen willen naast een opvolging op projectniveau uiteraard ook een meting op een hoger liggend niveau. Daarvoor wordt gesuggereerd te werken met **een stabiele set van impactindicatoren**. Een lijst die niet te lang wordt, maar wel de overkoepelende doelstellingen van het plan afdekt.
- De begeleidingsorganen hebben veel waardering voor het **hersteldashboard**. Ze bepleiten en steunen de verdere uitwerking, bijvoorbeeld met bijkomende meetbare kenmerken van het herstel.
- De begeleidingsorganen juichen de **communicatie over het plan en zijn projecten** toe. Ze sporen de Vlaamse Regering aan haar inspanningen terzake vooral verder te zetten. Het is belangrijk dat burgers, ondernemingen en verenigingen over het relanceplan geïnformeerd blijven, en begrijpen welke concrete realisaties er uit voortvloeien.

3.2 AANBEVELINGEN REKENHOF BIJ METING 3

Het Rekenhof voerde een [audit m.b.t. de informatiekwaliteit van de derde voortgangsrapportering](#) en een [specifieke audit op de projecten van 20 miljoen euro en meer](#) uit. Het Rekenhof publiceerde de bevindingen en aanbevelingen in maart 2022.

De Vlaamse Regering formuleerde [een beleidsreplik](#) en zette, met het oog op meting 4, waar mogelijk, de aanbevelingen om.

Minister-president Jambon en minister van Begroting Diependaele stelden de resultaten van de derde meting en hun beleidsreplik m.b.t. de audits van het Rekenhof voor in de [Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie](#).

3.3 NIEUWIGHEDEN BIJ METING 4

Op basis van de aanbevelingen van de Taskforce, het Rekenhof en de bespreking in de Commissie van het Vlaams Parlement verhoogden we verder de kwaliteit van de monitoring van Vlaamse Veerkracht.

- In mei organiseerden we over de nieuwigheden **drie infosessies voor de projectverantwoordelijken**. We stelden een **leidraad** op met voorbeeldprojectfiches en met richtlijnen voor een **verbetering van de informatiekwaliteit** van de projectomschrijving, de output en outcome, de link naar de documenten van de Vlaamse Regering, de financiële informatie en de mijlpalen.
- Een nieuw veld in de monitoringstool kan duiding bevatten over **eventuele vertragingen of uitvoeringsproblemen bij de mijlpalen**. Zo kan men snel vaststellen waar bijsturing noodzakelijk is.
- Op het einde van de invoerperiode is met een gestandaardiseerde checklist een **kwaliteitscontrole uitgevoerd**. De kwaliteitsstandaard van elk project werd getoetst. De projectverantwoordelijken kregen, waar nodig, suggesties om verbeteringen en duiding toe te voegen. De projectverantwoordelijken zelf beslisten om al dan niet op dit advies in te gaan.
- Een **stabiele set van kernindicatoren** laat toe om het plan in zijn globaliteit op te volgen. De set is op de website van Vlaamse Veerkracht ontsloten en is zo een uitbreiding van het hersteldashboard. We nemen niet langer impactindicatoren op in de fiches van individuele projecten.
- De **opbouw van de covernota** komt tegemoet aan de vraag om sneller zicht te krijgen op de vertragingen of problemen. Zo geeft de covernota bevattelijk weer waar de uitvoeringsproblemen zich situeren voor 7 speerpunten en de 35 clusters. De covernota voorziet een apart onderdeel voor de analyse van de 55 RRF-projecten.
- Er is ingezet op **internationale communicatie** van het relanceplan en na de zomer van 2022 wordt een nieuwe **communicatiecampagne** voorzien. De focus ligt dan op concrete realisaties.

- We houden de vinger aan de pols van de **uitvoering van herstelplannen in referentielanden en -regio's**. In september 2022 voorziet Statistiek Vlaanderen een **dashboard 'Vlaanderen vergeleken'** waarbij Vlaanderen vergeleken zal worden met referentielanden en -regio's. Dit dashboard zal ons een vergelijkend beeld geven van hoe Vlaanderen herstelt in de verschillende beleidsdomeinen, waar we aan de top staan, en waar we nog een tandje moeten bijsteken.

4 ANALYSE BIJ METING 4

4.1 CONTEXTANALYSE

Sinds de aankondiging van Vlaamse Veerkracht en de eerste meting, is het herstelplan in een andere context terechtgekomen. **Ondertussen hebben we vijf covid-golven achter de rug en is het de oorlog in Oekraïne die zich zowel maatschappelijk als economisch laat voelen.**

De oorspronkelijke oriëntatie van Vlaamse Veerkracht baseerde zich, niet uitsluitend, op de aannames dat **overheidsinvesteringen** de verlangzaming van de binnenlandse besteding konden omkeren en dat de werking van de overheid als ondernemer een significant **multiplicator-effect** heeft. Het oorspronkelijk opzet van Vlaamse Veerkracht was het antwoord op een tijdelijke crisis. De overheid versterkt door een ingehouden inspanning op langere termijn haar impact op de processen van de lokale economie.

De Oekraïne-crisis laat echter zien dat er **risico's bestaan op de langdurige verstoring van bepaalde geopolitieke en macro-economische processen**, dat de controle op die processen op een supranationaal, geopolitiek niveau ligt, waar de Vlaamse overheid minder directe invloed op heeft.

De volgende selectie van meetwaarden, prijzen en indicatoren laat vermoeden welke impact dit kan hebben voor Vlaamse Veerkracht.

Sinds september 2020 – zijn de **energieprijzen** heel sterk gestegen^{1 2}. Voor het totale verbruik aan energie in Vlaanderen noteren we een stijging met 88%. Voor de groep industriële verbruikers van elektriciteit, van middelgrote en grote installaties, steeg de kost met resp. 43,9% en 68,9%. Gas voor residentieel gebruik steeg met tot 377%. De compensatie met een sociaal tarief kon dit gedeeltelijk opvangen. De gasprijs voor industriële installaties steeg onder sommige contracten in voorjaar 2022 tijdelijk tot een piekwaarde van 780% t.o.v. begin 2020. De sterke correlatie tussen onze scheikundige maak- en procesindustrie en de energieprijzen, zal voor langere tijd een aandachtspunt blijven.

Op de internationale markten steeg tussen september 2020 en april 2022 de vastgestelde gemiddelde dag- contractprijs voor aardgas (Dutch TTF) tot een piekwaarde met 575%. Voor LNG noteerden de markten een stijging met 368%.³ Voor ruwe petroleum steeg de prijs sinds sept 2020 met 350%.

Deze prijzen weerspiegelen niet alleen de bevoorradingssituatie sinds de gedeeltelijk boycot van Rusland, maar ook de toegenomen vraag sinds de heropleving van de handel post-corona.

De **Europese import-afhankelijkheid voor fossiele brandstof** bereikte in 2019 een piekwaarde (61% van alle energie werd van buiten de EU geïmporteerd). Dat volume bedroeg voor de EU gemiddeld

1 www.vreg.be

2 PWC rapport: FORBEG – A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers, *download van* www.creg.be-2022-12.pdf

3 www.tradingeconomics.com/commodity/natural-gas

57,5% in september 2020. België importeert beduidend meer dan dit, nl. 78%. De rechtstreekse afhankelijkheid van Russische bronnen is met 25% relatief lager dan elders in de EU.⁴ De diversificatie of vervanging van de bronnen zal tijd vergen en de prijs verder opdrijven, of door gebrek aan infrastructuur-capaciteit (cf. Algerije, Libië), of door grote afstand tot de bron (cf. USA, Nigeria, Qatar).⁵

De gestegen energieprijzen drijven op hun beurt de prijs op van landbouw-inputs, bouwmaterialen en cruciale grondstoffen voor de vernieuwing van industrie en mobiliteit.

Bij landbouw-inputs werden **meststoffen** sinds september 2020 tot drie keer duurder. De toelevering van de drie basis-moleculen waar kunstmest uit worden geproduceerd – stikstof, kalium en fosfaat – is onzeker geworden en de processen worden terzelfdertijd duurder. De conversie via ammoniak correleert ongunstig met de fel gestegen aardgasprijs. Kalium voor de Europese markt kwam hoofdzakelijk uit het inmiddels geboycotte Wit-Rusland. China verhindert de export van fosfaat en bij de grootste bron voor de Europese markt (cf. Marokko) steeg de prijs in twee jaar tijd met 340%.⁶ Naast de prijsevolutie van landbouw-inputs, vormt de situatie in Oekraïne een **risico voor de globale voedselvoorziening**, voor zowel menselijke als dierlijke consumptie.

Bij de meest gangbare **bouwmaterialen**⁷ noteert de sector voor hout, staalproducten en isolatiemateriaal sinds september 2020 stijgingen met minimaal 40%.

Bij de noodzakelijke **grondstoffen voor de energietransitie en industriële vernieuwing** – niet in het minst voor elektrische voertuigen – stegen de prijzen en dreigt een langdurige uitval van bevoorrading door de boycot van Rusland en gestegen vraag. Sinds september 2020 werden lithium met 1060%, cobalt met 217% en nikkel met 105% duurder. De prijzen van de palladium/platinum groep zijn extreem volatiel. Voor een beperkt aantal processen en waardenketens geldt wel dat de gestegen prijs van nieuwe ontginning en aanvoer, het alternatief van lokale recyclage sneller rendabel maakt.

Het **koolstof-emissierecht** onder de actuele Europese uitstootregeling is sinds september 2020 verviervoudigd in prijs.⁸ Deze evolutie leidt ertoe dat voor projecten die uitstoot reduceren het break-even punt dichterbij komt, of zelfs voor het eerst een netto besparing oplevert. De versnelde rentabiliteit heeft echter geen consequenties voor de uitgave van de Vlaamse overheid onder het VV programma.

De prijsontwikkeling van alle opgesomde categorieën voedt de inflatie, die op haar beurt het indexmechanisme activeert. De inflatie in België in mei 2022 bedroeg 9,3%⁹, wat hoger is dan het Europese gemiddelde. De recentste berekening laat zien dat de trend stijgend is en naar 9,9%

4 Eurostat_nrg_ind, Energy mix and energy dependency of the EU

5 www.iea.org/topics/russia-s-war-on-ukraine

6 ycharts.com/indicators/morocco_phosphate_rock_price

7 Commissie van de marktprijzen van materialen, FOD Economie, en tools.agoria.be, www.confederatiebouw.be

8 tradingeconomics.com/commodity/carbon en www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1

9 www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/kerncijfers


tendeert. De inflatie in onze belangrijkste buurlanden stijgt ook maar blijft beneden de waarde in België. De **rente op herfinancieringstransacties** voor de overheid bedroeg in juni 2022 1,93% wat een gevoelige trendbreuk is ten opzichte van 2020 en 21 toen de rentevoet 0% of zelfs licht negatief was.

4.2 KERNINDICATOREN

Als onderdeel van de voortgangsrapportage volgt Vlaanderen het herstel op aan de hand van verschillende **kernindicatoren** die inzicht geven in zowel de macro-economische en budgettaire context als de herstel- en veerkrachtcontext.

Bij de 2^{de} en 3^{de} meting lag de focus bij de indicatoren op de **kwaliteit van de projectfiches**. Naast de mijlpalen en outputindicatoren werden hiervoor extra rapporteringsvelden toegevoegd. Over het algemeen is de consistentie en kwaliteit van de rapportage duidelijk gewaarborgd en hebben de ondersteunende initiatieven vruchten afgeworpen. Een aandachtspunt blijft een (te) indirecte causaliteit tussen de projectvoortgang en de impactindicatoren¹⁰. Dit komt mede door de diversiteit tussen de projecten en de verschillende impactdimensies, variërend van aspecten van sturing tot directe en indirecte beïnvloeding.

In de 4^{de} meting ligt de focus op de **voortgang van de projecten**. Om de voortgang te duiden wordt het dashboard verder uitgebreid en hebben we het nu over 34 kernindicatoren. Deze kernindicatoren zijn onder meer het resultaat van een grondige analyse van de data uit de 3^{de} meting in het kader van een lopende studieopdracht van Idea Consult. Hiertoe is een concept van impactkader op programmaniveau ontwikkeld en toegepast (Figuur). In lijn met de voortgangsrapportage geeft de set van kernindicatoren de context weer waarbinnen de projecten hun voortgang moeten realiseren, met aandacht voor duurzame, inclusieve en gezonde groei.

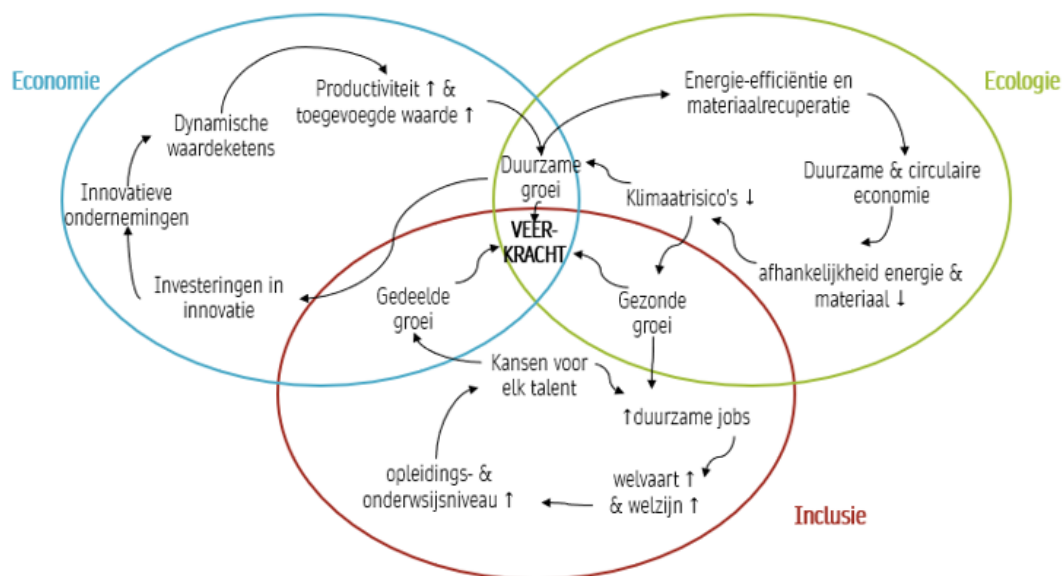

Voor de finale selectie van de kernindicatoren werd, naast het analysewerk door Idea Consult, ook gebruik gemaakt van de al bestaande dashboardindicatoren VV bij meting 3, en suggesties en

¹⁰ Keuzelijst van 84 indicatoren. Als aandachtspunt ook vermeld door het Rekenhof.

aanvullingen op de lijst van impactindicatoren door projectverantwoordelijken en experts van Statistiek Vlaanderen, het Economisch Relancecomité, het Maatschappelijk Relancecomité, het Klimaatexpertenpanel en de sociale partners. Bij de selectie is uiteraard ook rekening gehouden met databeschikbaarheid en -kwaliteit.

Onderstaande indicatoren worden vanaf meting 4 opgevolgd via het [dashboard VV](#). Deze zijn onder te verdelen in twee groepen. Een eerste set van indicatoren beschrijft de macro-economische en budgettaire context waarin de uitvoering van het plan Vlaamse Veerkracht zich ontrolt. Een tweede set van indicatoren zijn indicatoren waar het relanceplan een directe of indirecte impact op beoogt. Deze lijst is uiteraard niet exhaustief.

Macro-economische en budgettaire indicatoren

- Reële economische groei (bbp)
- Ondernemers- en consumentenvertrouwen
- Import en export in Vlaanderen
- Inflatie
- Vorderingsaldo van de Vlaamse overheid

Herstel en veerkracht - indicatoren

Duurzame groei

- O&O-intensiteit
- Oprichting en overlevingsgraad ondernemingen
- Aandeel hernieuwbare energie
- Broeikasgasemissies
- Energie-intensiteit Vlaamse economie
- Verwerking primair bedrijfsafval
- Filezwaarte
- Verkeersongevallen
- Wateroverlast en overstromingsgevaar
- Grondwaterstand

Inclusieve (gedeelde) groei

- Vroegtijdige schoolverlaters (18-24 jaar)
- Scholingsgraad (25-64 jaar)
- Levenslang leren
- Evolutie aantal werknemers en arbeidsvolume
- Werkzaamheidsgraad bij 20- tot 64-jarigen
- Aantal werkzoekenden zonder werk
- Aantal ontvangen vacatures
- Tijdelijke werkloosheid door COVID-19
- Bevolking in armoede of sociale uitsluiting
- Digitale vaardigheden bij burgers
- Digitale overheid
- Doorlooptijd omgevingsvergunningen
- Vertrouwen in de overheid

Gezonde groei

- Levenstevredenheid
- Tevredenheid sociale contacten
- Eenzaamheid
- Angst en depressie

- Digitaal welbevinden
- Levensverwachting

Enkele positieve evoluties

Volgens de regionale economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau, heeft de Vlaamse economie zich **sterk hersteld in 2021** (+5,8%). Het ziet ernaar uit dat de economie **verder zal groeien in 2022** (+2,8%). Uiteraard is voorzichtigheid geboden en heeft de Oekraïne-crisis een grote impact op toekomstige groeivoorzichten.

Vlaanderen versterkt zijn positie als een **innovatiegedreven economie**. Dat blijkt ook uit de European and Regional Innovation Scoreboards 2021. België staat in de rangschikking van innovatieve landen op de vijfde plaats, met een innovatie-index van 143,5. Binnen België scoort Vlaanderen met 149,8 hoger dan het Waals Gewest (130,9), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest scoort het hoogst: 155,2. Sinds 2019 is de **O&O-intensiteit** van Vlaanderen gestegen boven de 3% (3,35% in 2019), Vlaanderen scoort beter dan België (3,2%) en het EU27 gemiddelde (2,2%).

Tussen 2000 en 2020 daalde de **energie-intensiteit** van de economie in het Vlaams Gewest met 27%. In het Vlaams Gewest bedroeg het finaal gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in 2020 23.141 GWh. Daarmee lag het **aandeel van hernieuwbare energie** in het bruto finaal energiegebruik in 2020 op 8,9%. Dat aandeel is de afgelopen jaren gestegen. In 2010 ging het nog om 4,5%.

In Vlaanderen was in 2021 meer dan 75% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Dat is een stijging van 0,6% t.o.v. 2020. De **werkzaamheidsgraad** in Vlaanderen is in 2021 hoger dan het Belgisch (70,6%) en Europees gemiddelde (73,1%). De VDAB ontvangt nog steeds meer vacatures dan vóór de COVID-19-crisis. De voorbije twaalf maanden (februari 2021 – maart 2022) werden 394.849 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 37% meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. In Vlaanderen nam in 2021 11% van de 25- tot 64-jarigen deel aan **opleidingen**. Jongeren, hogeschoolden en werklozen nemen vaker deel aan een opleiding. In 2021 daalde het aandeel vroegtijdige **schoolverlaters** naar het laagste punt ooit (5,3%).

Ongeveer 9 op de 10 Vlamingen beschikten in 2021 over **digitale basisvaardigheden** of meer gevorderde vaardigheden op vlak van informatie en data-geletterdheid (87%), communicatie (93%) of probleemoplossing (89%). Voor informatie en communicatie had minstens 75% meer gevorderde vaardigheden, voor probleemoplossing was dat 59%. De digitale vaardigheden nemen toe met de scholingsgraad en het inkomen en nemen af met de leeftijd.

Na een toenemende **levenstevredenheid** in de zomer en het najaar van 2021, liet de impact van de vierde en vijfde golf zich sterk voelen. De levenstevredenheid in Vlaanderen daalde fors naar het laagste peil sinds de start van de pandemie. In het voorjaar 2022 veert die tevredenheid weer op naar het peil van de maanden vóór de vierde en vijfde golf.

Waar de **tevredenheid met de sociale contacten** in stijgende lijn ging in juni en oktober 2021, lieten de maatregelen naar aanleiding van de vierde COVID-golf zich in december meteen voelen. De tevredenheid daalde met 35% t.o.v. vorige meting. Na de vierde en vijfde golf herstelt die tevredenheid zich (+28,5%) tot boven het niveau van juni 2021.

Na de gezondheidsmeting van Sciensano in maart 2021 daalden de gevoelens van **eenzaamheid** bij de Vlaamse bevolking naar de zomer toe. De vierde en vijfde COVID-golf wakkerden die gevoelens weer aan. 31% van de volwassenen kende ernstige gevoelens van eenzaamheid. In maart

2022 kantelt dat weer. Bijna de helft van de Vlamingen (48,4%) kent geen gevoel van eenzaamheid (meer).

Na de piek in december 2020 daalde het aantal **angst- en depressieve stoornissen** bij de volgende drie gezondheidsmetingen van Sciensano. Bij de vierde COVID-golf in december 2021 zagen we terug een forse stijging. Die herstelt zich in het voorjaar van 2022, maar de cijfers dalen nog niet terug tot op het niveau van vóór de vierde en vijfde golf.

Enkele aandachtspunten of negatieve evoluties

In 2020 lag de **levensverwachting** bij de geboorte in het Vlaamse Gewest voor de hele wettelijke bevolking op 82,0 jaar. In 2020 werd voor het eerst in 20 jaar een duidelijke daling van de levensverwachting vastgesteld. Die hangt samen met het hoge aantal overlijdens tijdens de COVID-19-pandemie. Men verwacht dat dit effect opnieuw zal uitdoven in de komende jaren. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg de levensverwachting 79,6 jaar en in het Waals Gewest 78,9 jaar. In vergelijking met 2019 is in Brussel de levensverwachting het sterkst gedaald met ongeveer 2 jaar, gevolgd door Wallonië met een daling van -1,3 jaar. In Vlaanderen was deze daling het minst sterk met -0,7 jaar.

De **filezwaarte** is de voorbije jaren sterk toegenomen en kende een piek in mei 2018. In de daaropvolgende periode was er een beperkte daling, gevolgd door een zeer sterke daling in 2020. In april 2022 lag de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest op gemiddeld 821 kilometeruren per werkdag. Dat is 85% meer dan in april 2021. In vergelijking met de laatste aprilmaand voor de coronacrisis (april 2019) gaat het om een beperkte daling met 3,4%.

Na een forse terugval in het voorjaar 2020 bij het uitbreken van de COVID-pandemie nam het **vertrouwen van de Vlaamse ondernemers** continu toe tot 6,7 in juni 2021. Sindsdien daalt het vertrouwen opnieuw. Tot december 2021 bleef het vertrouwen licht positief, maar daarna zakte het tot -1,3 in april 2022. Het **vertrouwen van de consument** volgt in grote lijnen dat van de ondernemer. Globaal genomen was hij in 2021 eerder optimistisch. In maart 2021 bereikte het consumentenvertrouwen opnieuw het niveau van voor de gezondheids crisis. Tot februari 2022 bleef het consumentenvertrouwen hoger dan vóór de gezondheids crisis (2,0 in februari 2020). Maar in maart en april 2022 nam het vertrouwen een forse duik naar -8,0. Uiteraard hangt dit nauw samen met de **historisch hoge inflatiecijfers**.

4.3 REALISATIES

Het is eigen aan grote investeringsprojecten dat het even duurt vooraleer de eerste tastbare resultaten zichtbaar zijn. Vaak is er immers nood aan voorbereidende of inleidende stappen die essentieel zijn voor het welslagen van het project, zoals: het zorgen voor een regelgevend kader, het verrichten van studies, het doorlopen van aanbestedingsprocedures, de organisatie van projectoproepen, etc. Dat werk is cruciaal en erg arbeidsintensief, maar weinig zichtbaar voor het grote publiek. Ook in het kader van 'Vlaamse Veerkracht' werden er al veel van dergelijke stappen gezet. Stilaan worden echter ook de eerste resultaten zichtbaar.

De projectfiches verder in dit rapport geven een gedetailleerd overzicht van alle stappen, zowel die in de coulissen als die in de schijnwerpers, en dat voor alle projecten. Wij geven hier alvast een staalkaart aan recente realisaties weer, een niet-exhaustief overzicht dat een inkijk wil geven in de concrete werkzaamheden.

Speerpunt 1: Economie en samenleving verduurzamen

Energie besparen en verduurzamen

De Vlaamse Regering investeert sterk in **energetische renovatie**, zowel van residentiële als van niet-residentiële gebouwen. Er gaat hierbij ook aandacht naar **sociale huurwoningen**. Er werden reeds subsidies toegekend voor energetische investeringen in 2.959 sociale woningen. (VV009 – Renovaties sociale woningen versnellen)

Daarnaast werd sinds medio 2021 reeds een bedrag van 23.876.077 euro aan FS3-financiering (goedkope leningen) toegewezen aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit maakt de nieuwbouw van 929 en de renovatie van 2.300 sociale huurwoningen mogelijk. (VV010 – Sociale woningbouw)

Om optimaal gebruik te maken van hernieuwbare energie, worden gebruikers van zonnepanelen aangemoedigd om **thuisbatterijen** te gebruiken. Met dat doel voor ogen werden reeds 8.460 premies uitgekeerd. (VV007 – Financiering flankerend beleid transitie oude elektrische verwarming en toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet)

Ondertussen wordt vanuit het reguliere beleid sterk gefocust op vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake **CO2-captatie & hergebruik**. (VV172).

Vergroenen van transport

Om de transitie naar elektrisch rijden mogelijk te maken, wordt er versneld werk gemaakt van het **verhogen van de laadinfrastructuur** in Vlaanderen. In het kader van Vlaamse Veerkracht zijn er in onze regio reeds 5.798 CPE ('charging point equivalents') bijgekomen. (VV049 – Laadpalen – versnelde uitrol laadinfrastructuur)

De Lijn plaatste een bestelling voor 60 **e-bussen**: zij worden vanaf het najaar van 2022 gefaseerd geleverd. Daarnaast worden dit jaar 280 hybride bussen omgebouwd tot **plug-in hybride bussen**, en zijn er 44 **gelede e-hybride bussen** besteld. Om die op hun standplaats te kunnen laden, werd een bestelling geplaatst voor 102 laders. In mei 2022 werd een procedure gestart voor **aanpassingswerken aan stelplaatsen**, zodat die tijdig klaar zullen zijn om de eerste e-bussen te kunnen ontvangen. (VV106 – Vergroening openbaar vervoer De Lijn)

Blue Deal

De recente periodes van droogte toonden opnieuw het belang aan van **waterconservering en goed ruimtegebruik**. Met dat doel voor ogen werden projecten opgezet in **landelijke gebieden**, in nauwe samenwerking met gebruikers van dat gebied. Ook werd 150 ha grond aangekocht om 'vernatting' van gebieden mogelijk te maken. (VV024 – Groenblauwe infrastructuur – open ruimte).

Met de oproep '**groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving**' verschuift de focus van landelijke naar bebouwde gebieden. Steden en gemeenten worden ondersteund om projecten te ontwikkelen m.b.t. waterretentie- en infiltratie. De Vlaamse Regering gaf in mei 2022 haar goedkeuring aan de uitvoering van 10 geselecteerde projecten. (VV031 – Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving)

Bedrijven worden gestimuleerd om **investeringen te doen in innovatieve en waterbesparende technologie**. Zij kunnen hiervoor financiële ondersteuning krijgen. 25 dossiers werden reeds goedgekeurd voor een totaalbedrag van 2.337.000 euro. (VV27 – Blue Deal – Economie)

Circulaire economie uitbouwen

Recyclage en hergebruik zijn een belangrijke doelstelling in tijden van grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Vlaanderen heeft de ambitie om een **toonaangevende recyclagehub** te worden in Europa. Met relancemiddelen worden onder meer 6 grote investeringen gepland in nieuwe faciliteiten die lokale recycling en gesloten kringlopen mogelijk maken. In april 2022 keurde de Vlaamse Regering een eerste reeks van 6 innovatieve recyclageprojecten goed, ter waarde van 15 miljoen euro. In mei werd een tweede call georganiseerd voor hetzelfde bedrag. (VV125 – Circulaire economie – Recyclagehub)

Speerpunt 2: Investeren in infrastructuur

Een modal shift naar meer fietsen

De inrichting van een **groter en veiliger fietsnetwerk** maakt van de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel en helpt zo het gebruik van personenwagens te reduceren. De investeringen zijn divers: van de aanleg van **nieuwe fietspaden** en het **verbeteren van bestaande fietspaden**, over het **aanleggen van fietsersbruggen en -tunnels**, tot het **investeren in fietsenstallingen**. Wat de verbeteringswerken betreft, is reeds 74 km fietspad aangepast en is er voor 132 km verbeteringswerken in uitvoering in het kader van Vlaamse Veerkracht. In een volgende fase wordt nog 243 km extra aangepakt. (VV013 - De inrichting van een groter en veiliger fietsnetwerk)

Goederentransport: van weg naar water

De Vlaamse Regering wenst het goederenvervoer over de weg maximaal te wijzigen in **vervoer over water**. Daarom investeert ze onder meer in de **bevaarbaarheid van het Albertkanaal**. Dit omvat in eerste instantie het **verhogen en/of aanpassen van 7 bruggen**. Vijf (deel)projecten zijn in uitvoering, voor een bedrag van 91.853.000 euro, in onder andere Herentals, Genk en Hasselt. (VV041 – Modal shift naar water – Albertkanaal (versneld verhogen van bruggen))

De **'Nieuwe Zeesluis in Zeebrugge'** is een belangrijk initiatief om het goederenvervoer over water maximaal te versterken. Om dit initiatief te kunnen realiseren, dienen meerdere bedrijfssites, gelegen binnen de projectcontouren, te worden verworven. In eerste instantie wordt hierbij maximaal ingezet op een vrijwillige verkoop aan de overheid, gekoppeld aan een begeleidingstraject i.f.v. de herlokalisatie van de bedrijven in kwestie. Hiervoor werden relancemiddelen vrijgemaakt. In januari 2022 werden twee aktes verleden voor een bedrag van 5.650.000 euro. Momenteel liggen er nog twee akkoorden klaar om op korte termijn met relancekredieten te worden afgerond. (VV044 – Minnelijke verwervingen en onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge)

Inzetten op veiligheid

Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen, maakt de Vlaamse Regering werk van de **verkeersveilige (her)inrichting van haar fietspaden, wegen en kruispunten**. Zij hanteert in dat kader een dynamische lijst van **gevaarlijke punten**. Relancemiddelen werden vrijgemaakt om een aantal daarvan aan te pakken. Momenteel staat de teller afgewerkte ingrepen op 17. Daarnaast zijn 32 werken in uitvoering en 5 werken ingepland. (VV038 – Aanpak gevaarlijke punten)

Voorts wordt er werk gemaakt van een versnelde uitrol van de plannen m.b.t. **verkeerslichtenbeïnvloeding**. Zo wil de Vlaamse Regering een **betere en veiligere doorstroom** bewerkstelligen, niet in het minst voor fietsers. Er wordt onder meer geïnvesteerd in 'slimmere' verkeerslichten en in een 'Mobilidata-programma' dat het mogelijk maakt om 'realtime data' te combineren. Op termijn moet de uitrol van die slimme data-infrastructuur ook zelfrijdende voertuigen in Vlaanderen mogelijk maken. In totaal zijn reeds 19 werken gerealiseerd, zijn er 59 in

uitvoering en worden er 213 voorbereid. Ook werd er op 8 gevaarlijke punten via verkeerlichtenbeïnvloeding gezorgd voor een vlottere doorstroom: 7 gevaarlijke punten zijn daardoor geheel en eentje gedeeltelijk conflictvrij gemaakt. Er is voor dit project reeds een bedrag van 15.897.000 euro vastgelegd. (VV040 – Versnelling verkeerslichtenbeïnvloeding voor een betere en veiligere doorstroming voor de fietser en dynamisch verkeersmanagement)

Verder worden relancemiddelen ingezet om een aantal **bruggen en viaducten in slechte staat te herstellen of te vervangen**. Dat moet zowel de verkeersveiligheid als de mobiliteit van personen en goederen vrijwaren. Het viaduct in Gentbrugge werd na ingrijpende werken al eind vorig jaar terug opengesteld. De renovaties van het viaduct in Boorseme en de Wijngaardbrug in Geraardsbergen lopen, net als de herbouw van de Meulestedebrug in Gent en de herstellingen aan de Nieuwe Kalebrug in Evergem. Acht andere werven worden nog in 2022 opgestart. (VV037 – Assetmanagement – aanpakken cat. 4-kunstbouwwerken in slechte staat)

Kunst in de publieke ruimte

Met het oog op de realisatie van 44 **kunstopdrachten in de publieke ruimte** -zowel de stedelijke als de open ruimte- worden twee oproepen georganiseerd. De eerste oproep in 2021 leidde tot zestien kunstopdrachten, voor een budget van 951.000 euro. Veertien projecten zijn momenteel in uitvoering en twee projecten -Murals Zennepark te Brussel en Contemporary Lukasa te Antwerpen- werden al gerealiseerd. Het beoordelingstraject van de tweede oproep loopt momenteel volop. (VV084 – Kunst in opdracht in de publieke ruimte)

Speerpunt 3: Vlaanderen digitaal transformeren

Massaal inzetten op innovatieve dienstverlening

De Vlaamse Regering maakt zich volop **klaar voor de digitale toekomst**: in het kader van het relancebeleid lopen er projecten op het vlak van e-learning, smart cities, e-inclusie, koppeling van databanken (cultuur en onroerend erfgoed), digitalisering van collecties (cultuur), vastgoed (informatieplatform), gezondheidszorg, media, de uitbouw van zowel een digitaal verenigingsloket als een loopbaanplatform, en nog veel meer. Een rode draad is het inzetten op **innovatieve dienstverlening, steeds met aandacht voor het beschermen van de privacy**.

De Vlaamse Regering ondersteunt ook de lokale besturen die hun dienstverlening meer burgergericht, transparant en efficiënt willen inrichten door middel van digitale tools. In het kader van het project '**Gemeente zonder gemeentehuis**' waren 7 oproepen gepland, waarvan er reeds 4 zijn afgehandeld. Dit leidde tot de goedkeuring van 38 aanvragen, voor een vastgelegd bedrag van 11.981.000 euro. Hierbij zijn 160 gemeenten betrokken, oftewel meer dan de helft van de 300 lokale besturen in Vlaanderen. (VV051 – Gemeente zonder gemeentehuis) Daarnaast werden ook 2 oproepen **Smart Cities** gelanceerd met een focus op 'Smart Economy'. Binnen de eerste oproep werden 10 projecten goedgekeurd voor een bedrag van 7.784.148 euro. (VV055 Smart Cities).

Er wordt ook aandacht besteed aan **e-inclusie**: iedereen moet digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarom ontvangen reeds 13 centrumsteden, de VGC en 108 kleine en middelgrote lokale besturen ondersteuning om **vormingen en opleidingen uit te werken met lokale partners, op maat van digitaal kwetsbare doelgroepen**. Er is hiervoor al meer dan 5 miljoen euro vastgelegd. (VV053 Iedereen digitaal - opleiding & vorming)

Ook vanuit de specifieke invalshoek '**activering van digitaal kwetsbare personen en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt**' wordt er extra ingezet op de versterking van digitale vaardigheden en competenties van deze profielen. Via de oprichting van laagdrempelige lokale '**digibanken**' worden drie inhoudelijke doelstellingen complementair

gerealiseerd: (1°) gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context; (2°) via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel op het vlak van persoonlijke als technische vaardigheden; (3°) via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten. Op dit ogenblik zijn -verspreid over Vlaanderen- reeds 7 lokale digibanken operationeel (sinds voorjaar 2022). 38 lokale partnerschappen staan klaar om tegen midden 2022 een digibank te openen (VV127 Digibanken).

'Mijn burgerprofiel' wordt versneld uitgebouwd. Op dit **virtueel, digitaal loket van de overheid** moeten burgers, ondernemers en verenigingen een compleet, officieel en betrouwbaar overzicht vinden van alle dienstverlening van de overheid (premies, vergunningen, belastingen, etc.), van alle gegevens die de overheid over hen heeft (diploma's, attesten, vergunningen, etc.), en moeten zij lopende dossiers kunnen opvolgen, berichten of documenten ontvangen, aanvragen kunnen doen, etc. Relancemiddelen zorgen ervoor dat dit project -waar al enkele jaren aan wordt gebouwd- versneld kan worden uitgerold. De functionaliteiten groeien constant. 'Mijn Burgerprofiel' is sinds kort ook toegankelijk voor minderjarigen. Meer dan de helft van de lokale besturen is ondertussen aangesloten. Er is reeds 6.896.000 euro aan relancemiddelen vastgelegd voor dit project. (VV060 – Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel)

Speerpunt 4: Investeren in mensen en talenten

Een digitale sprong in het onderwijs

De Vlaamse Regering greep de coronacrisis aan voor het doorvoeren van een **digitale versnelling in het onderwijs**. Er werd in 2021 massaal geïnvesteerd in **ICT-materiaal**, er loopt een ondersteuningstraject voor meer teamgerichte ICT-werking op schoolniveau, er wordt ingezet op de ontwikkeling en verspreiding van **digitale leermiddelen** en op **kennisondersteuning**. In dat kader biedt het Kenniscentrum Digisprong ondersteuning aan scholen in de vorm van concrete tips en stappenplannen, onder meer op het vlak van afstandsleren en digitale evaluaties op afstand. Er werden verschillende inspiratiegidsen en adviezen gepubliceerd over o.a. fiscale aspecten van de infrastructuursubsidies, digitale competenties van leerkrachten en de aankoop van mobiele toestellen.

Er werd ook gestart met de ontwikkeling van een **digitale toegangspoort** die de naam LeerID kreeg. Deze LeerID moet onderwijsprofessionals en leerlingen in staat stellen om éénmalig in te loggen, waarna automatisch **toegang wordt verschaft tot allerhande digitale applicaties en leermiddelen**. In 2022 werd een eerste versie getest in scholen en momenteel wordt de lancering verder voorbereid. Er werd in het kader van het globale project reeds meer dan 240.000.000 euro vastgelegd. (VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong))

Levenslang leren en wendbaar werken

Op een arbeidsmarkt die constant en snel evolueert, is het belangrijk om je **competenties op peil te houden en nieuwe competenties te verwerven**. Levenslang leren wordt een opdracht voor ons allen. In het kader van het relancebeleid ontplooit de Vlaamse Regering een brede waaier aan initiatieven. (VV 018 – Opleidingsoffensief arbeidsmarkt)

Een kleine greep uit de acties en de resultaten:

- De **stagebonus** werd eenmalig verruimd en verhoogd. In het schooljaar 2020-2021 werden er 3.308 aanvullende stagebonussen uitgekeerd, goed voor 3.308.000 euro. De maatregel werd intussen verlengd tot en met het schooljaar 2022-2023.
- De VDAB zorgde voor een **online opleidingsaanbod**. In 2021 telde de VDAB 264.492 inschrijvingen voor online opleidingen. In de eerste 3 maanden van 2022 waren dat er 59.075.

- De VDAB werkte een plan van aanpak uit om een passend aanbod gericht te communiceren naar alle **tijdelijk werklozen**. Sinds begin 2021 werd 99% van de tijdelijk werklozen gecontacteerd per mail. 5,9% van de tijdelijk werklozen participeerde tussen maart 2020 en eind april 2022 aan een vorm van **competentieversterking**. Voor de intensief tijdelijk werklozen (minstens 10 dagen tijdelijk werkloos in de laatste 3 maanden) bedroeg dit aandeel 9,7%.
- Sinds april 2021 loopt er een innovatief project m.b.t. mobiliteit binnen en tussen bedrijven. Het project CareerFlow omvat negen concrete bedrijfscases. Hierbij zijn 21 bedrijven betrokken. De inzichten en ervaringen uit deze experimentele cases worden verwerkt in de brede 'oproep voor transitiepunten' die op dit moment wordt voorbereid. Die zal zich richten op **transities van werknemers over ondernemingen en sectoren heen**.
- Er wordt volop ingezet op **zij-instroom vanuit de privésector in de zorg en het onderwijs**. De VDAB neemt in dit kader een belangrijke rol op: voor zowel zorg als onderwijs werd de screening en inschatting van klanten geoptimaliseerd om hen het meest passende traject richting deze knelpuntsectoren/-beroepen aan te bieden. (VV016 – Activering – verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC)
- De **zij-instroom naar het onderwijs** wordt voorts met een Vlaamse Veerkracht-maatregel gestimuleerd die wordt genomen vanuit het reguliere beleid: enerzijds worden een aantal vakken en ambten toegevoegd aan de knelpuntenlijst in het onderwijs, anderzijds wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2021 het maximum aantal jaren dienstanciënniteit dat kan worden meegenomen vanuit de privésector, opgetrokken van 8 naar 10 jaar. Deze maatregel maakt deel uit van het ontwerp van 'besluit tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen' dat de Vlaamse Regering op 11 maart 2022 voor een 2e keer principiële goedkeurde. (VV176 - Zij-instroom vanuit de privésector naar het onderwijs aantrekkelijk maken)

Werken moet lonen

Om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten en tevens de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen, werd een **Vlaamse jobbonus** ingevoerd. Het betreft hier een Vlaamse Veerkracht-project dat wordt gefinancierd met reguliere middelen. Het decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 20 mei 2022. Naast de **jobbonus voor werknemers** zullen ook werknemers met een laag inkomen die ondernemer worden, een 'jobbonus+' of 'starterspremie' ontvangen. Het decreet tot regeling van de toekenning van een **jobbonus+ aan startende zelfstandigen** werd principiële goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 11 maart 2022. De verwachting is dat er in 2022 zo'n 716.600 jobbonussen zullen worden uitbetaald, en dat zo'n 11.250 personen in 2022 recht zullen hebben op een jobbonus+. (VV177 - Implementatie van de Vlaamse jobbonus)

Speerpunt 5: Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

Dringende investeringen in ziekenhuizen

De Vlaamse Regering besliste zowel in juli en november 2021 als in februari 2022 om met de inzet van relancemiddelen een aantal **dringende investeringen in ziekenhuisinfrastructuur** te financieren. In 2021 ging het om een totaal bedrag van meer dan 21.000.000 euro, in 2022 om 14.564.555,8 euro. (VV046 - Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen)

Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap

Door de inzet van relancemiddelen werd een **inhaalbeweging doorgevoerd op het vlak van de ondersteuning van personen met een handicap**. Aan 2.502 erkende personen met een handicap in

prioriteitengroep 1 werd een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld. Het gaat om de personen die een aanvraag hadden ingediend op uiterlijk 31/12/2020. Hiervoor werd 55.000.000 euro aan relancemiddelen voorzien. (VV121 - Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1)

In het kader van Vlaamse Veerkracht, maar met reguliere middelen, zal in 2022 ook een persoonsvolgend budget ter beschikking worden gesteld aan personen die een aanvraag hebben ingediend op uiterlijk 30/6/2021 en die werden ingedeeld in prioriteitengroep 1, plus aan een laatste groep van 284 personen die een aanvraag indienden in 2020. (VV180 - Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 2 wachtlijsten gehandicaptenzorg)

Versterken van het mentaal welzijn

Corona had niet enkel impact op de fysieke gezondheid, maar ook op het **mentaal welbevinden** van veel Vlamingen. In het relanceplan wordt hier dan ook sterk op ingezet. Zo worden een hele set aan **hulplijnen** (1712, Tele-Onthaal, chat Nupraatikerover.be, de Druglijn en de Zelfmoordlijn 1813) voor een meerjarige periode versterkt om bijkomende vragen op te vangen. (VV138 – Opvolgen actieplan mentaal welzijn)

Ook werd beslist tot het nemen van een aantal **eenmalige initiatieven voor mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren** (VV137), bv. extra ondersteuning van de werking van lotgenotengroepen, extra inzet van herstelacademies, tijdelijke versterking van de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen, enz. Die projecten zijn intussen opgestart. Een eerste rapportering wordt in september 2022 verwacht.

Ondertussen werden -speciaal voor jongeren- 33 **OverKophuizen** geopend in Vlaanderen, ondersteund door het agentschap Opgroeien via een lerend netwerk en een ondersteuningstraject. In de loop van de zomer 2022 komt er een eerste projectrapport over hun werking. (VV139 - OverKophuizen)

Zorgzame buurten

Mensen met zorg- en ondersteuningsvragen willen zelf beslissen over de hulp en ondersteuning die ze krijgen. De focus ligt daarbij niet enkel op hun gezondheid, maar op hun brede levenskwaliteit. Of het nu gaat om **ouderen, personen met een handicap, personen met psychische problemen of gezinnen met kinderen of jongeren met een zorg- of ondersteuningsvraag: veel mensen willen graag, maatschappelijk ingebed, in de buurt blijven wonen**. Vanuit die vaststelling financiert de Vlaamse Regering 133 projecten '**Zorgzame Buurten**' in Vlaanderen en Brussel, en dit voor een periode van 2 jaar. De projecten gingen van start op 1 maart 2022. Op 24 maart 2022 volgde een informatieve startdag. De projecten worden ondersteund door een vormingstraject dat sleutelvaardigheden aanreikt om tot een zorgzame buurt te komen (opstellen buurtanalyse, impactgericht werken, samenwerken in een netwerk, enz.). Het is de bedoeling om deze werking verder op te schalen en als goede praktijk internationaal op de kaart te zetten. Er werd reeds meer dan 13.000.000 euro voor dit project vastgelegd. (VV144 - Zorgzame buurten - Versterken van buurtgerichte lokale initiatieven)

Speerpunt 6: De coronacrisis beheren en Brexit

Steun aan bedrijven omwille van Brexit

Meerdere vormen van **ondersteuning aan bedrijven in het kader van Brexit** lopen door. De VR keurde in maart 2022 een nieuwe basisnota goed m.b.t. ondersteuning in het kader van de 'Brexit Adjustment Reserve'. Die nota wordt meteen in de praktijk gezet met een nieuwe oproep voor '**Bijzondere exportsteun BAR**' begin juni 2022. (VV108 - Subsidies aan bedrijven)

Ook het VLAIO-actieplan wordt verdergezet (VV109 - VLAIO Brexit actieplan). Tot nu toe werden **Post Brexit Veerkrachtsubsidies** ten bedrage van 1.189.055 euro toegekend. De **Helpdesk Brexit** ontving tot nu toe 793 vragen, over uiteenlopende onderwerpen zoals bv. Brexit-subsidies/VLAIO, Britse en Belgische invoerformaliteiten, btw, etikettering, exportvergunningen/certificaten, Noord-Ierland, oorsprongregels en vrij verkeer van personen.

Steun aan bedrijven omwille van Covid 19

Om bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis extra ademruimte te geven, voorzag PMV op haar reguliere middelen een pakket van 500 miljoen euro voor **zeer goedkope achtergestelde leningen aan start-ups en scale-ups en aan KMO's**. Van de 665 goedgekeurde leningen voor 214,3 miljoen euro, werden er 589 leningen opgenomen voor een bedrag van 173,9 miljoen euro. (VV163 'PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalparticipaties en waarborgen - Pakket van 500 miljoen euro voor zeer goedkope achtergestelde leningen aan enerzijds start-ups & scale-ups en anderzijds KMO's')

Bij grote financieringsbehoeften -van boven de 1,5 miljoen euro- kan er tot 30 juni 2022 beroep worden gedaan op de **Gigagarant Covid-waarborgen** die PMV eveneens vanuit haar reguliere middelen financiert. Tot en met 31 maart 2022 werden vanuit Gigarant 28 Covid-Waarborgen toegekend voor een totaal waarborgbedrag van 601 miljoen euro (VV164 - PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalparticipaties en waarborgen - Extra capaciteit voor Gigarant en voor PMV-Z-Waarborgen)

Omdat het in de coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk was om alle facturen te blijven betalen, werd de **winwinlening versoepeld**. Ook dit wordt gefinancierd met reguliere middelen van PMV. Sinds de uitbreiding van de winwinlening in Q4 2020, tot eind Q4 2021, werden 9.690 winwinleningen geregistreerd voor een bedrag van 183,6 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2022 kwamen daar 1.087 winwinleningen bij, voor een totaal bedrag van 29,7 miljoen euro. (VV166 'PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalparticipaties en waarborgen - Uitbreiding van de win-win-lening en vriendenaandeel')

Investeerders aantrekken

Het **aantrekken van buitenlandse investeringen** naar Vlaanderen is een opdracht die sterk fluctueert met de staat van de wereldeconomie. Nu de pandemie wereldwijd wat meer onder controle lijkt, zijn er nieuwe uitdagingen: post-corona elementen (bv.: reizen vanuit China en India richting Europa blijven beperkt), de onzekerheid omwille van de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie en tekorten in grondstoffen en materialen zoals erts, staal, etc. Het investeringsklimaat blijft daarom wisselvallig en onstabiel. Reden te meer voor FIT om haar actieve politiek van detectie van potentiële investeerders verder uit te voeren. Dit leverde in mooie resultaten op voor Vlaanderen in 2021: 295 nieuwe investeringsprojecten, goed voor 6.233 directe nieuwe jobs en een investeringsbedrag van 2,86 miljard euro. (VV179 - Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen) Dit relanceproject wordt uitgevoerd met reguliere middelen.

Speerpunt 7: De overheid efficiënter maken

'De Vlaamse Brede Heroverweging' heeft als doel de **kwaliteit van de openbare financiën te verbeteren**. De eindresultaten van deze doorlichting zijn beschikbaar en vonden reeds hun weg in de begroting 2022. Op basis van de resultaten startte de Vlaamse Regering in november 2021 per beleidsdomein met specifieke uitgaventoetsingen ('spending reviews'). Op 20 mei 2022 wijzigde de Vlaamse Regering de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO). Artikel 9 verankert daarbij het gebruik van **brede heroverwegingen en uitgaventoetsingen** en maakt er dus een courante praktijk van. (VV158 'Spending reviews')

5 KERNCIJFERS OVER DE RELANCEPROJECTEN OP MEETMOMENT 1 JUNI 2022

5.1 PROJECTVOORTGANG

5.1.1 Algemene projectvoortgang


Hieronder kan men de projectstatus van de 180 relanceprojecten op meetmoment 1 juni 2022 vinden.

- 173 van de 180 relanceprojecten (96%) zijn in uitvoering en lopen op schema:
 - 9 projecten (5%) hebben de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
 - 162 projecten of (90%) hebben de status ‘in uitvoering na agendering VR’, en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.
 - 2 projecten of (1%) hebben de status ‘gerealiseerd’. Het gaat over VV146 ‘Compensatiebesluit KO (Kinderopvang) – extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)’ en VV139 ‘Overkophuizen’.
- Voor 5 van de 180 relanceprojecten (3%) is bijzondere aandacht nodig (oranje). Dit betreft:
 - VV014 ‘Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen’;
 - VV056 ‘Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamcontract 2022’;
 - VV087 ‘Materniteit de Bijloke – de Creatiecluster (Gent)’;
 - VV120 ‘Verbeteren van de sociale kaart’;
 - VV168 ‘Versnelde uitrol digitale meter’.
- Eén relanceproject krijgt de projectstatus ‘rood’, waarbij bijkomende actie noodzakelijk is. Het gaat over VV078 ‘Cultuurhuis Blankenberge’.
- Eén relanceproject is nog niet gestart (grijs). Het gaat over VV142 ‘Versterking aanpak intrafamiliaal geweld – bewustmakingscampagnes’.

In vergelijking met de metingen in maart, september en december 2021 is er opnieuw duidelijk vooruitgang geboekt.

Voortgang

Projectstatus ● Nog niet opgestart ● Opgestart ● In uitvoering na agendering VR ● Aandacht nodig ● Actie nodig ● Gerealiseerd

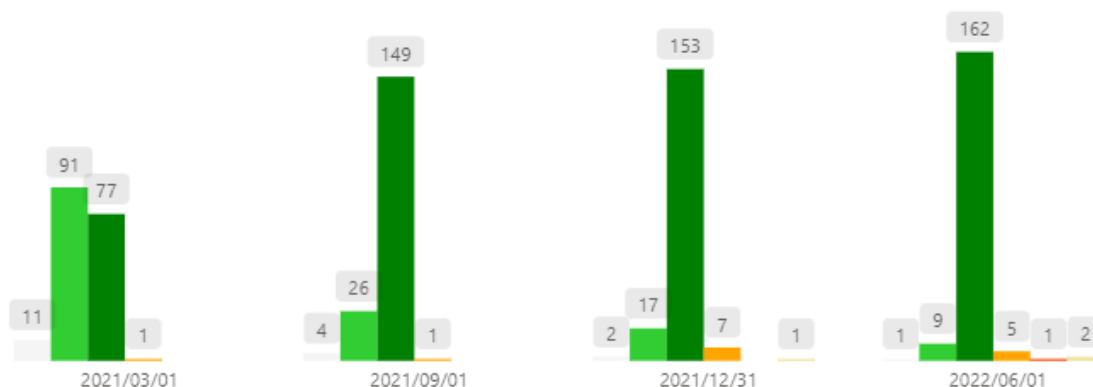

Hieronder staan we kort stil bij de duiding over de nog niet gestarte projecten, de projecten die aandacht vragen, de projecten waar actie nodig is en de gerealiseerde projecten.

Duiding bij nog niet gestarte project

- **VV142 'Versterking aanpak intrafamiliaal geweld – bewustmakingscampagnes'**: Het overleg loopt met het departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving en Opgroeien om de inhoudelijke scope evenwichtig vorm te geven (naar doelgroep, thematiek, format,...) en de afstemming met andere, lopende initiatieven. **Het blijft de bedoeling om de campagne in 2022 te lanceren. De vastlegging zal bijgevolg in 2022 gebeuren.**

Duiding bij projecten waar aandacht nodig is

- **VV014 'Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen'**: We voorzien een enveloppe van 150 miljoen euro voor cofinanciering via trekkingsrechten per gemeente (op basis van het aantal inwoners). Elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor investeringen in fietsinfrastructuur versterken we met 1 euro. Zo realiseren we in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten. De maatregel is positief onthaald en **de aanmeldingen komen binnen, maar volstaan niet om de beoogde doelstellingen te behalen. Op lokaal niveau dienen de nodige middelen te worden voorzien in de meerjarenplanning. De beschikbare lokale personeelscapaciteit speelt ook een rol.** Er loopt een tussentijdse evaluatie met het oog op een bijsturing van het BVR, om de scope van het project uit te breiden en om de modaliteiten aan te passen.
- **VV056 'Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamcontract 2022'**: Dit programma (15 miljoen euro) heeft als doel het aanbod ICT-diensten te vernieuwen, zodat het beter afstemt op de noden van de Vlaamse overheid en maximaal inspelt op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan mature diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Het dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en, in lijn met hun behoeften, een geschikte menukaart bieden. De operationele service integratiediensten, evenals de verschillende ICT-dienstverleningspakketten zijn van start gegaan op 1 februari 2022. **De transitie kon echter nog niet volledig worden afgerond. Er zijn echter geen grote onderbrekingen in de ICT-**

dienstverlening. De verwachting t.o.v. de ICT-Partners is om de dienstverlening uiterlijk eind juni 2022 naar het beoogde peil te brengen.


- **VV087 'Materniteit de Bijloke – de Creatiecluster (Gent)'**: De voormalige 'Materniteit' op de Gentse Bijlokesite wordt gerenoveerd en met een nieuwbouwgedeelte uitgebreid. De creatiecluster zal ruimte geven aan organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen. De infrastructuur zal zorgen voor de nodige kruisbestuivingen tussen de verschillende organisaties die er hun intrek nemen, waaronder Festival van Vlaanderen, Les Ballets C de la B, Muziektheater LOD, Symfonieorkest Vlaanderen en Studio Orka. Er wordt gefocust op gedeeld ruimtegebruik van studio's, flexwerkplekken en ruimtes voor individuele repetities. Het initiatief vergt een investeringssubsidie van 4,98 miljoen euro voor een maximum van 60% van de totale projectkost. **De budgettering van het project is nog niet volledig rond.** In afwachting van bijkomende financiering wordt het dossier nog niet als verzoek bij de Vlaamse Regering voorgelegd.
- **VV120 'Verbeteren van de sociale kaart'**: De sociale kaart is voor de hulp- en dienstverleners, zorgpersoneel, OCMW-medewerkers of de burger een instrument om in de eigen buurt de nodige hulpverleners en instellingen te kunnen terugvinden. De toepassing is voor verbetering vatbaar, door onder meer bijkomende authentieke datasets te koppelen, zodat actuele gegevens automatisch op de kaart komen. Sterke verbeteringen zijn ook nodig aan de zoekfunctie om tot de juiste resultaten te komen. De gebruiksvriendelijkheid kan verbeterd worden. De bijkomende middelen (0,5 miljoen euro) zullen gebruikt worden voor de toevoeging van nieuwe informatie. De externe firma, die in de eerste fase de ontwikkeling van de vernieuwde database en de toepassing doet, loopt **ernstige vertraging** op. Was de toepassing initieel voorzien voor 2021 Q2, zal deze pas in Q3 van 2022 klaar zijn. Hierdoor verschuift alles en dus ook de planning van het uitbreidingsproject met de voorziene relancemiddelen.
- **VV168 'Versnelde uitrol digitale meter'**: In samenwerking met intercommunales en private bedrijven investeren we in een versnelde uitrol van digitale meters (ongeveer 2 miljard euro investering door Fluvius gespreid over 10 jaar, waarvan 80% tegen 2025). Na het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de terugdraaiende teller vernietigde, werd de uitrol achteruit geschoven en is er nog steeds heel wat twijfel om een digitale meter te laten installeren. Door corona ontstaat bijkomende **vertraging** en is de uitrol van 80% tegen 2025 een grote uitdaging. Om het draagvlak voor de energietransitie in het algemeen, en de digitale meter als belangrijke enabler in het bijzonder te versterken, kwam er in samenwerking met Fluvius een brede communicatiecampagne: *Meemetdestroom.be*. De uitgewerkte weigeringsprocedure indien een netgebruiker weigert een digitale meter te plaatsen, zou nu moeten worden geoperationaliseerd en gecommuniceerd.

Duiding bij project waar actie nodig is

- **VV078 'Cultuurhuis Blankenberge'**. Het initiële projectvoorstel voorzag in een nieuw cultuurhuis voor de stad Blankenberge. Het gemeentebestuur communiceerde in het najaar van 2021 dat het de 3 miljoen euro voor een andere (niet-culturele) invulling zou aanwenden. **De toekenningsprocedure van de investeringssubsidie aan gemeente Blankenberge is daarom stopgezet**, nadat was beslist om het initiële projectvoorstel niet uit te voeren. Het gemeentebestuur kon geen alternatief project voorleggen dat aan de bestedingsvoorschriften voldeed. De Vlaamse minister voor Cultuur heeft daarom beslist om de relancemiddelen opnieuw vrij te maken.


5.1.2 Projectvoortgang per speerpunt

Bekijken we de projectvoortgang op het niveau van de zeven speerpunten, dan valt op dat de aandachtspunten zich vooral situeren in speerpunt 02 'Investeren in infrastructuur' en speerpunt 03 'Vlaanderen digitaal transformeren'. Speerpunt 06 'De coronacrisis beheeren en Brexit' kleurt helemaal donkergroen.

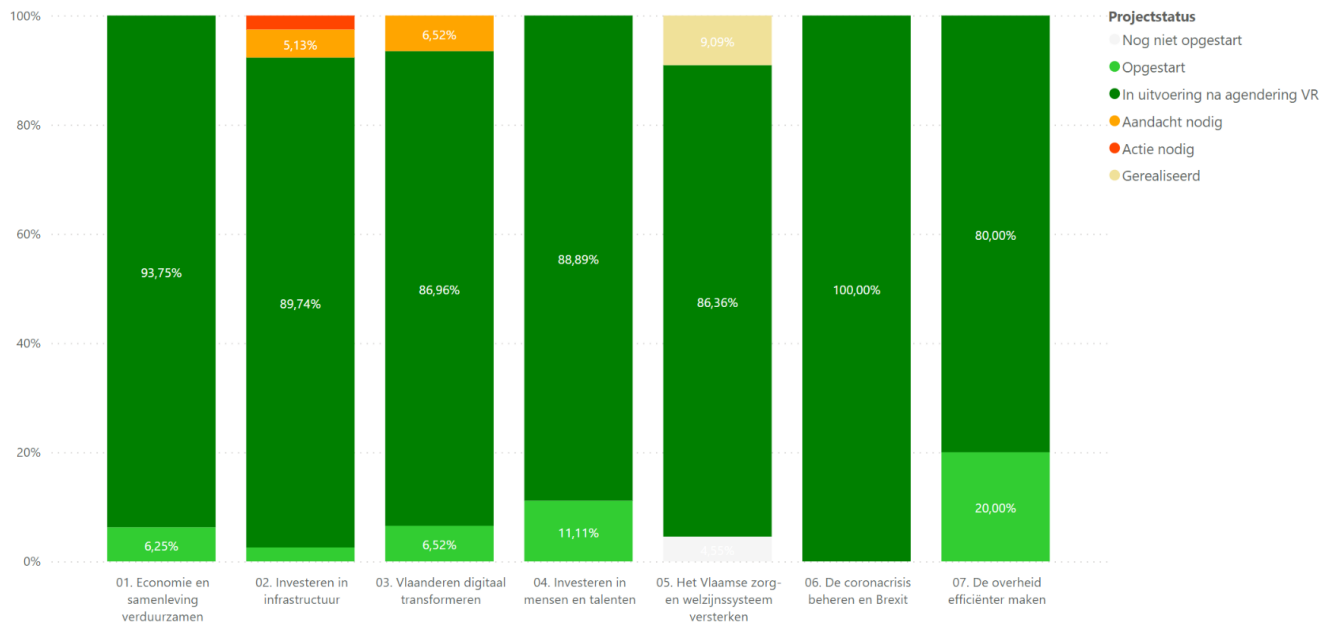

5.1.3 Projectvoortgang per cluster

Bekijken we de projectvoortgang op het niveau van de 35 clusters, dan valt op dat de aandachtspunten zich vooral situeren in cluster 02 'Fietsinfrastructuur', cluster 14 'Culturele infrastructuur', en cluster 21 'Digitalisering zorgbeleid'. Voorts valt ook op dat de cluster 10 'Waterstofonderzoek' nog niet geagendeerd werd op de Vlaamse Regering.

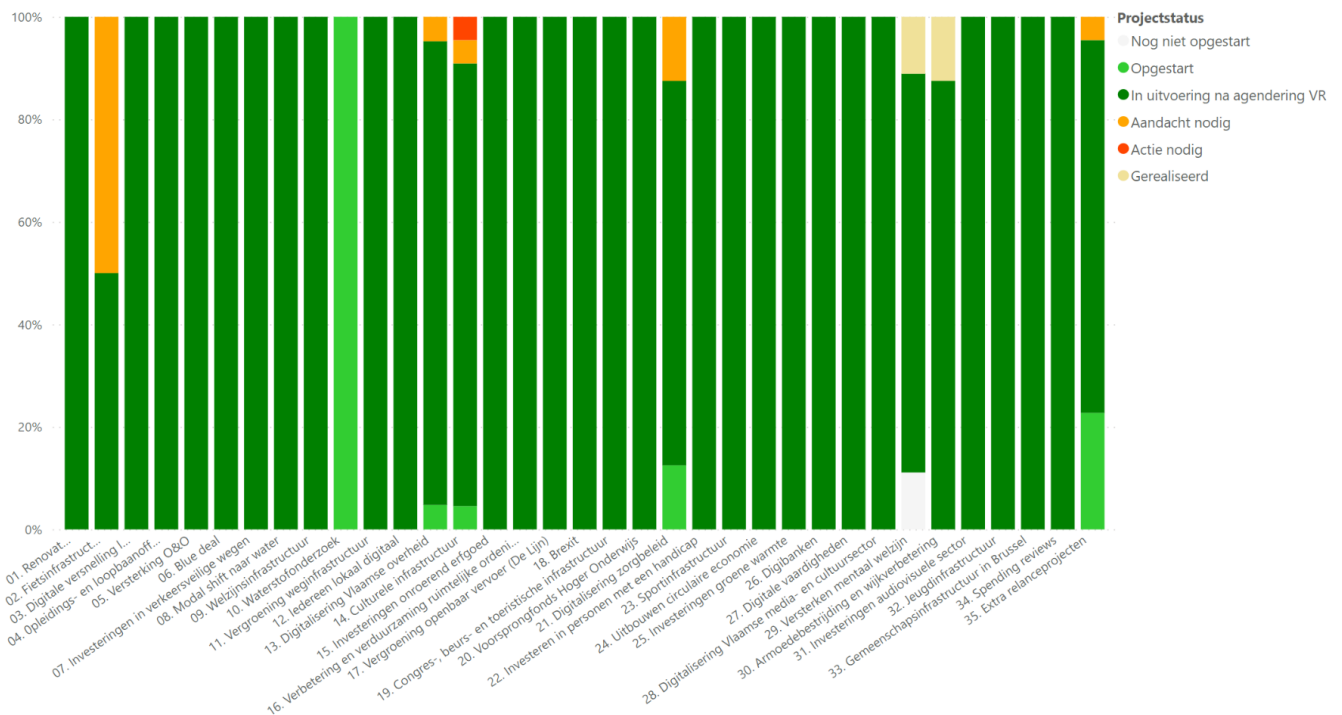

5.2 MIJLPALLEN


5.2.1 Globaal

Naast de algemene statusvoortgang van de 180 projecten, worden voor elk van deze projecten ook de onderliggende mijlpalen opgevolgd. Deze zijn voor meting 4 verder verfijnd t.a.v. de vorige metingen.

Een mijlpaal blijft op 'nog niet gestart' staan, zolang er binnen het project geen relevante activiteit is met betrekking tot deze mijlpaal. Pas wanneer de uitvoering van deze mijlpaal effectief gestart is, wordt bepaald of deze mijlpaal al dan niet 'op schema' is.

Bij de meting in juni 2022 werden bijkomende mijlpalen opgenomen in vergelijking met de meting van december 2021. Het aantal mijlpalen steeg daarbij van 1257 naar 1469 mijlpalen. Deze bijkomende detaillering zal de voortgangsrapportering in de toekomst nog transparanter en fijnmaziger maken.

In een eerste grafiek wordt een overzicht gegeven van de 1022 vastgelegde mijlpalen in 2020, 2021 en 2022 voor de 180 relanceprojecten. Op deze manier wordt achteruit gekeken, maar ook al vooruit, naar het volgende meetmoment op 31/12/2022.

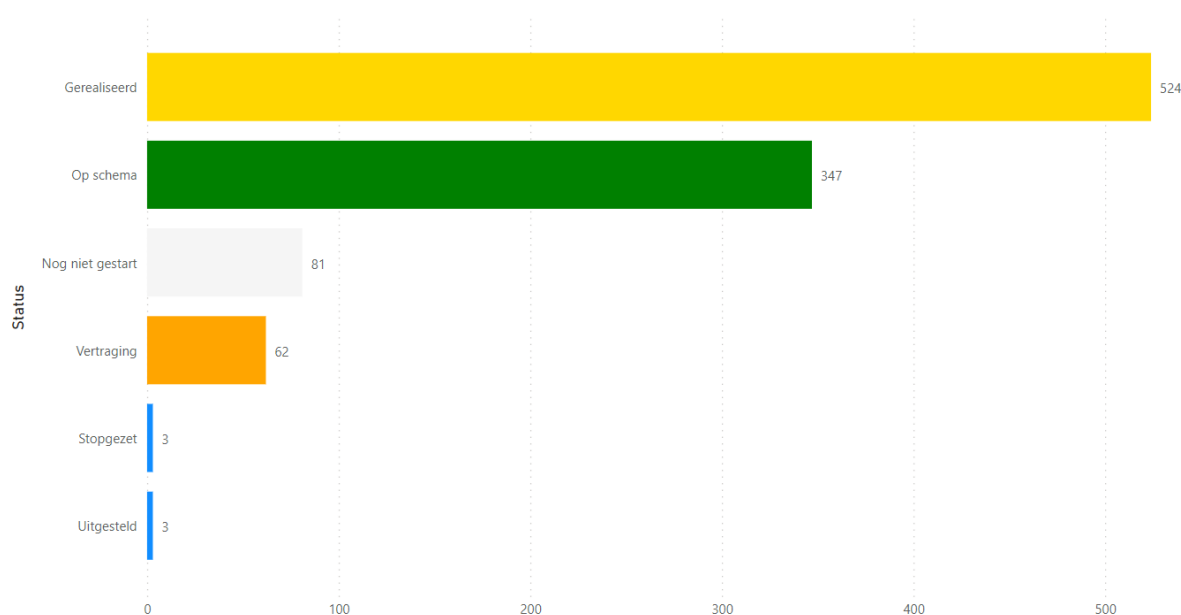


Status alle mijlpalen voorzien in 2020 – 2021 – 2022 voor de 180 projecten

Eerst en vooral kunnen we stellen dat 69,6% (1022/1469) van alle mijlpalen van de 180 projecten zich situeren in de jaren 2020, 2021 of 2022. Meer dan de helft van de mijlpalen (51,3%) voorzien in 2020, 2021 en 2022 werd inmiddels behaald. 347 of 34% van de mijlpalen t.e.m. het einde van dit jaar zijn op schema, 62 of 6% van de mijlpalen kennen vertraging. 81 of 8% van de mijlpalen die tegen het einde van het jaar gerealiseerd moeten worden, dienen nog te worden opgestart. 3 mijlpalen werden stopgezet, 3 mijlpalen werden uitgesteld.

Een volgende grafiek toont de status van alle 1469 mijlpalen van de 180 relanceprojecten, vanaf het begin van de uitvoering van het relanceplan in 2020, tot de datum van de laatste mijlpaal die werd opgenomen in het relanceplan, in het vierde kwartaal van 2030. Dit geeft een mooi overzicht

van de mijlpalen die de komende 8,5 jaar nog gehaald dienen te worden. Tussen 2023 en 2030 staan er nog 447 mijlpalen ingepland, goed voor 30,4% van alle mijlpalen.

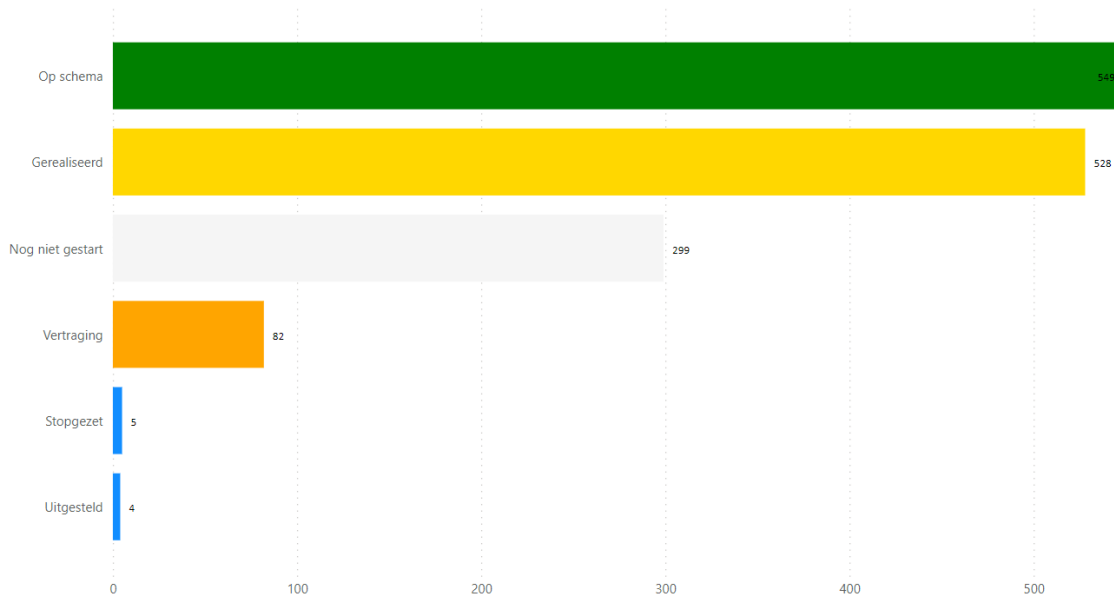

Status alle mijlpalen voorzien van 2020 t.e.m. 2030 voor de 180 projecten

1077 van de 1469 mijlpalen die zich situeren tussen 2020 en 2030, zijn ofwel op schema ofwel gerealiseerd, dit is 73,3% van alle mijlpalen. Als we de verhouding nemen van de mijlpalen op schema en gerealiseerd t.o.v. alle mijlpalen zonder rekening te houden met de verder in de toekomst liggende en dus nog niet opgestarte mijlpalen (299 of 20,4%), dan komen we zelfs aan 92% van de mijlpalen die in juni 2022 op schema staan of al gerealiseerd zijn.


82 (5,6%) mijlpalen hebben vertraging. Dat zijn mijlpalen waar de activiteiten voor het realiseren van de mijlpaal zijn gestart, maar de geplande deadline niet kan worden gehaald. Er worden verschillende redenen aangehaald voor de 82 vertraagde mijlpalen. We geven er enkele mee: gebrek aan interne en externe capaciteit, bijgestelde planning door een groter dan verwachte complexiteit of onvoorziene omstandigheden, men wacht op een beslissing van een andere overheid, interne enveloppeverschuivingen tussen projecten binnen Vlaamse Veerkracht, het financieel plan is nog onvolledig,

4 mijlpalen werden uitgesteld. Uitgestelde mijlpalen zijn mijlpalen waarbij de activiteiten voor het realiseren van de mijlpaal nog niet zijn opgestart, en waar een nieuwe deadline voor een mijlpaal gepland wordt. Er worden verschillende redenen aangehaald voor de uitgestelde mijlpalen: focuswijziging, noodzaak aan bijkomende besluitvorming, uitstel van een publiek event omwille van COVID, en prioritering omwille van de Oekraïne crisis.

5 mijlpalen werden stopgezet. In dat geval worden de activiteiten voor het realiseren van de mijlpaal niet opgestart of verdergezet. Er worden verschillende redenen aangehaald voor de stopgezette mijlpalen: focuswijziging, hogere kostprijs van de projecten, heroriëntering van middelen voor Oekraïne maatregelen, en de vervanging van een initiatief door een ander initiatief dat wel nog kan worden aanbesteed in 2022.


5.2.2 Mijlpalen per speerpunt

Wanneer we de mijlpalen van 2020, 2021 en 2022 bekijken per speerpunt, dan kunnen we vaststellen dat speerpunt 03 'Vlaanderen digitaal transformeren' het meest aantal mijlpalen heeft. Daarnaast valt op dat er voor speerpunt 02 'Investeren in infrastructuur' en speerpunt 03 'Vlaanderen digitaal transformeren' nog een aanzienlijk aantal niet opgestarte mijlpalen zijn. We stellen verder ook aandachtspunten vast in 4 speerpunten m.b.t. het aantal vertraagde mijlpalen. Dat is het geval in speerpunt 01 'Economie en samenleving verduurzamen', speerpunt 02 'Investeren in infrastructuur', speerpunt 03 'Vlaanderen digitaal transformeren' en speerpunt 07 'De overheid efficiënter maken'.

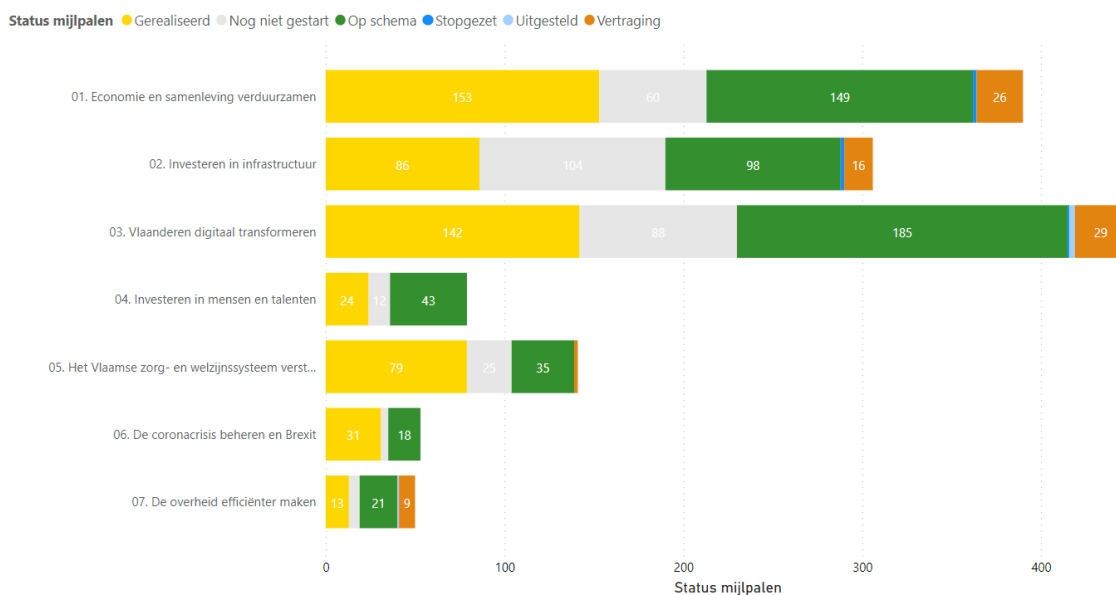


Status alle mijlpalen voorzien in 2020 – 2021 – 2022 voor de 180 projecten per speerpunt

Als we deze zelfde cijfers in verhouding zetten, dan zien we dat speerpunt 05 'Het Vlaams zorg- en welzijnssysteem versterken' in verhouding het meest gerealiseerde mijlpalen heeft en speerpunt 07 'De overheid efficiënter maken' het minst. Dat laatstgenoemde speerpunt heeft dan weer in verhouding het meest aantal vertraagde mijlpalen.

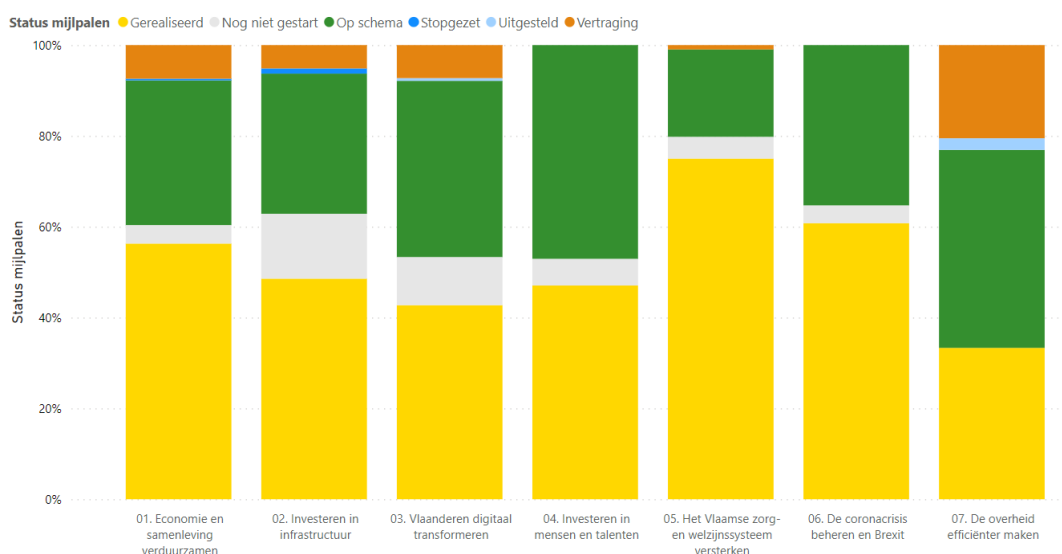


Verhouding status mijlpalen 2020 t.e.m. 2022 verdeeld over de 7 speerpunten

Onderstaande figuur geeft het globale overzicht van alle mijlpalen van 2020 t.e.m. 2030 over de 7 speerpunten. We zien opnieuw een duidelijk verschil in aantal mijlpalen per speerpunt en het grootst aantal mijlpalen bij speerpunt 03 'Vlaanderen digitaal transformeren'.

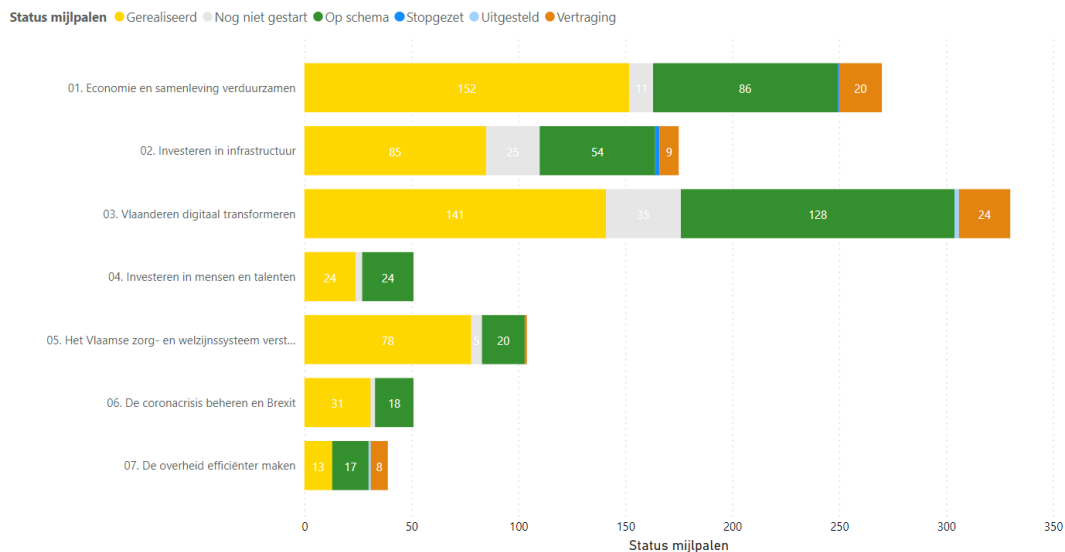

Status alle mijlpalen voorzien in 2020-2030 voor de 180 projecten per speerpunt

Als we dezelfde cijfers in verhouding zetten, dan zien we dat speerpunt 06 'De coronacrisis beheren en Brexit' in verhouding de meeste mijlpalen heeft gerealiseerd en speerpunt 07 'De overheid efficiënter maken' het minst. Dat laatstgenoemde speerpunt heeft dan weer, naar verhouding, het meeste vertraagde mijlpalen.

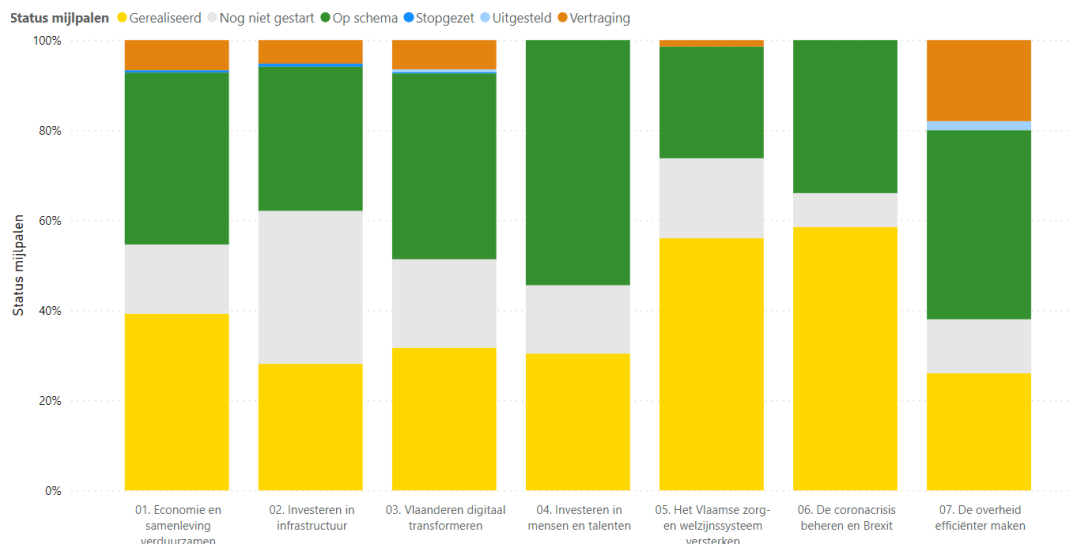

Verhouding status mijlpalen 2020 t.e.m. 2030 verdeeld over de 7 speerpunten

Bij speerpunt 02 'Investeren in infrastructuur' liggen nog relatief veel mijlpalen in de toekomst.


Tot slot van dit algemeen overzicht vestigen we de aandacht op het verschil in aantal mijlpalen per project tussen de speerpunten. Zo vinden we het grootste gemiddeld aantal mijlpalen terug in speerpunt 07 'De overheid efficiënter maken' en het kleinste gemiddeld aantal mijlpalen in speerpunt 6 'De coronacrisis beheren en Brexit'.

Speerpunt	Aantal projecten	Aantal mijlpalen (2020-2030)	Gemiddeld aantal mijlpalen per project
Speerpunt 1	48	391	8,1
Speerpunt 2	39	306	7,8
Speerpunt 3	46	448	9,7
Speerpunt 4	9	79	8,8
Speerpunt 5	22	142	6,5
Speerpunt 6	11	53	4,8
Speerpunt 7	5	50	10

Hieronder bespreken we de details van de mijlpalen per speerpunt (2020 – 2030).

Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (48 projecten)

Speerpunt 1 heeft 391 mijlpalen met volgende status:

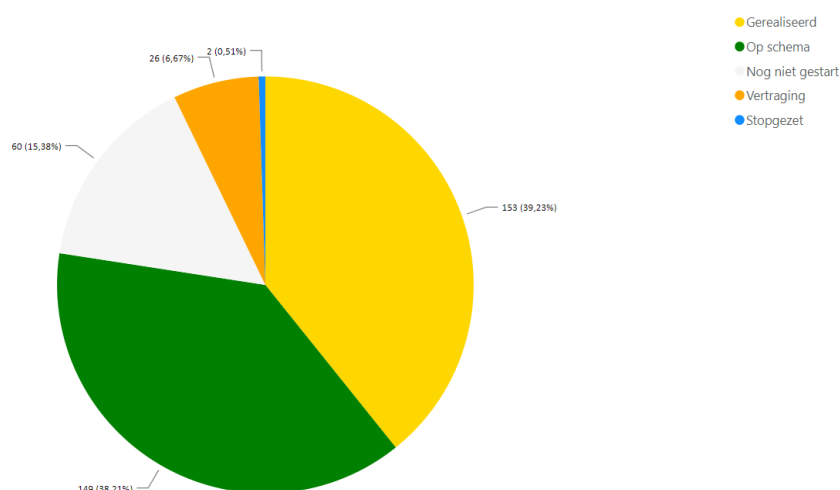

- 153 mijlpalen (39%) zijn gerealiseerd;
- 149 mijlpalen (38%) hebben status 'op schema';
- 26 mijlpalen (7%) hebben status 'vertraging';
- 60 mijlpalen (15%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen);
- 2 mijlpalen (0,5%) werden stopgezet.

Volgende 11 van de 48 projecten hebben één of meer mijlpalen met vertraging:

- VV001 | Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie
- VV002 | Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie
- VV003 | Asbestpremie daken residentieel met isolatie


- VV005 | Circulaire economie - asbest (sectorprotocollen)
- VV008 | EPC-labelpremie residentieel
- VV011 | VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid
- VV020 | Bio-economie
- VV026 | Blue Deal - MOW
- VV036 | Natte natuur
- VV047 | Waterstofonderzoek
- VV147 | Vlaanderen chipland van de wereld

Volgende 2 van de 48 projecten hebben een mijlpaal stopgezet:

- VV026 | Blue Deal – MOW
- VV033 | Sensibilisering, opleiding en advisering

Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (39 projecten)

Speerpunt 2 heeft 306 mijlpalen met volgende status:

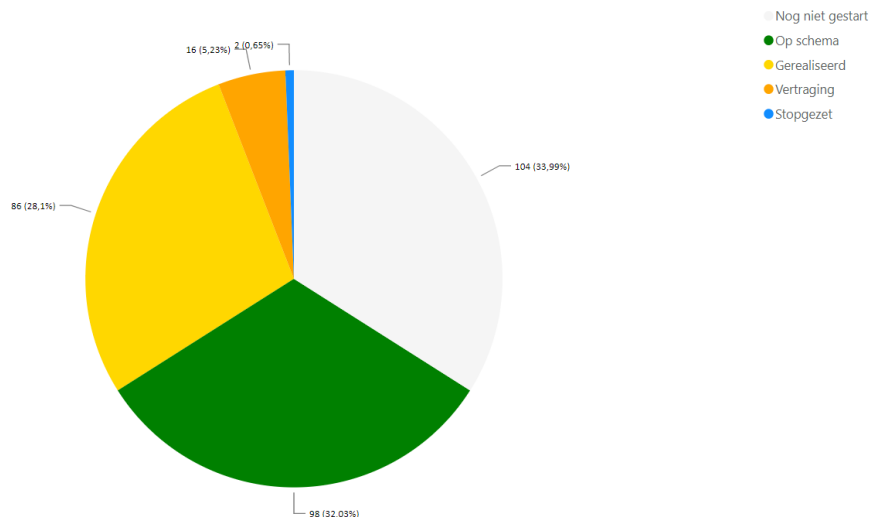

- 86 mijlpalen (28%) zijn gerealiseerd;
- 98 mijlpalen (32%) hebben status 'op schema';
- 16 mijlpalen (5%) hebben status 'vertraging';
- 104 mijlpalen (34%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen);
- 2 mijlpalen (0,7%) werden stopgezet.

Volgende 7 van de 39 projecten hebben één of meer mijlpalen met vertraging:

- VV037 | Assetmanagement - aanpakken cat. 4-kunstbouwwerken in slechte staat
- VV040 | Versnelling verkeerslichtenbeïnvloeding voor een betere en veiligere doorstroming voor de fietser en dynamisch verkeersmanagement
- VV041 | Modal shift naar water - Albertkanaal (versneld verhogen van bruggen)
- VV077 | Belfort Aalst
- VV078 | Cultuurhuis Blankenberge


- VV087 | Materniteit de Bijloke - de Creatiecluster (Gent)
- VV157 | Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

Volgende 2 van de 39 projecten hebben een mijlpaal stopgezet:

- VV037 | Assetmanagement - aanpakken cat. 4-kunstbouwwerken in slechte staat
- VV078 | Cultuurhuis Blankenberge

Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (46 projecten)

Speerpunt 3 heeft 448 mijlpalen met volgende status:

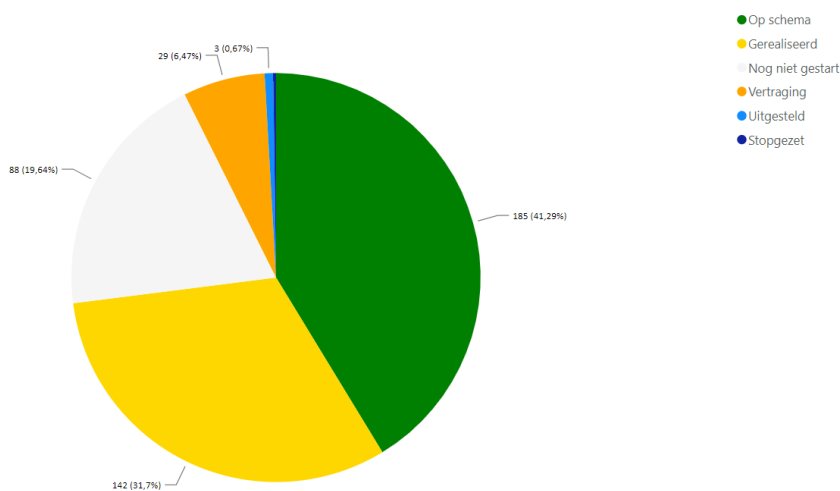

- 142 mijlpalen (32%) zijn gerealiseerd;
- 185 mijlpalen (41%) hebben status 'op schema';
- 29 mijlpalen (6%) hebben status 'vertraging';
- 88 mijlpalen (20%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen);
- 3 mijlpalen (0,7%) werden uitgesteld;
- 1 mijlpaal (0,2%) werd stopgezet.

Volgende 11 van de 46 projecten hebben één of meer mijlpalen met vertraging:

- VV050 | Digitalisering integratie & inburgering
- VV056 | Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022
- VV057 | Ondersteuning Digitale Transformatie
- VV064 | FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening
- VV065 | HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM (Security Information & Event Management)
- VV067 | HFB - Modernisering cloud en netwerkinfrastructuur
- VV068 | Kaleidos – Digitalisering van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering
- VV069 | Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit

- VV075 | VLM - MAP6 en datawarehouse
- VV076 | Zelf beheerde identiteit
- VV118 | Groeipakket - verderzetten digitalisering

Volgende 3 van de 46 projecten hebben één uitgestelde mijlpaal:


- VV068 | Kaleidos – Digitalisering van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering
- VV070 | MATIS, het Vlaamse Materialeninformatiesysteem
- VV130 | Cultuur – digitalisering van collecties

Eén van de 46 projecten heeft één stopgezette mijlpaal:

- VV068 | Kaleidos – Digitalisering van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering

Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (9 projecten)


Speerpunt 4 heeft 79 mijlpalen met volgende status:

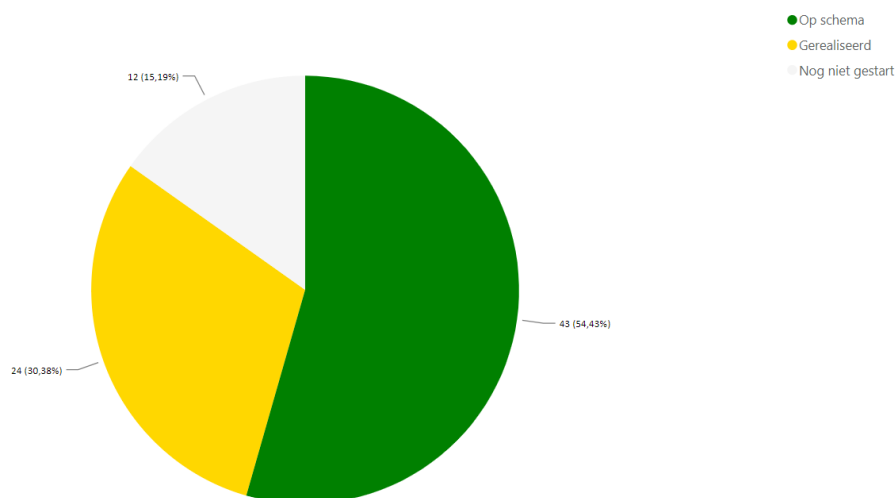

- 24 mijlpalen (30%) zijn gerealiseerd;
- 43 mijlpalen (54%) hebben status 'op schema';
- 12 mijlpalen (15%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen);

Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (22 projecten)

Speerpunt 5 heeft 142 mijlpalen met volgende status:

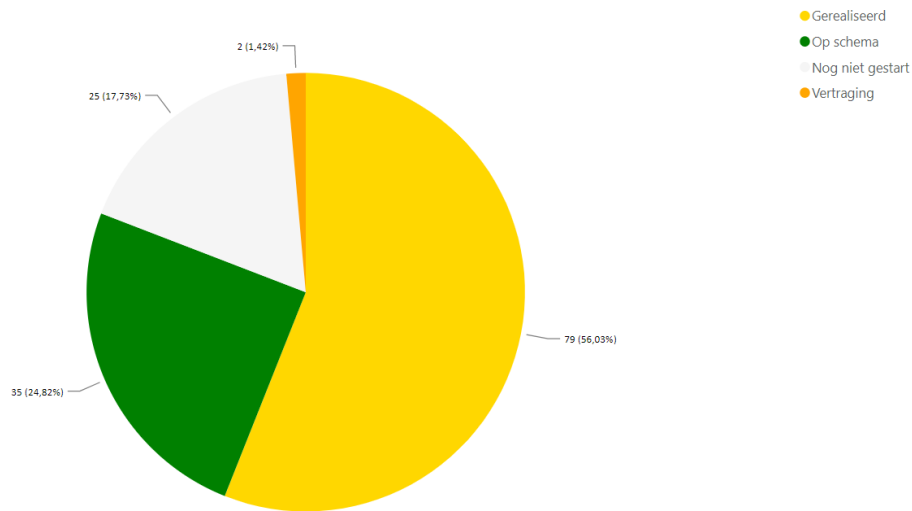


- 79 mijlpalen (56%) zijn gerealiseerd;
- 35 mijlpalen (25%) hebben status 'op schema';
- 2 mijlpalen (1,4%) hebben status 'vertraging';
- 25 mijlpalen (18%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen).

Volgende 2 van de 22 projecten hebben één mijlpaal met vertraging:

- VV137 | Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen
- VV138 | Opvolging actieplan mentaal welzijn

Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (11 projecten)


Speerpunt 6 heeft 53 mijlpalen met volgende status:

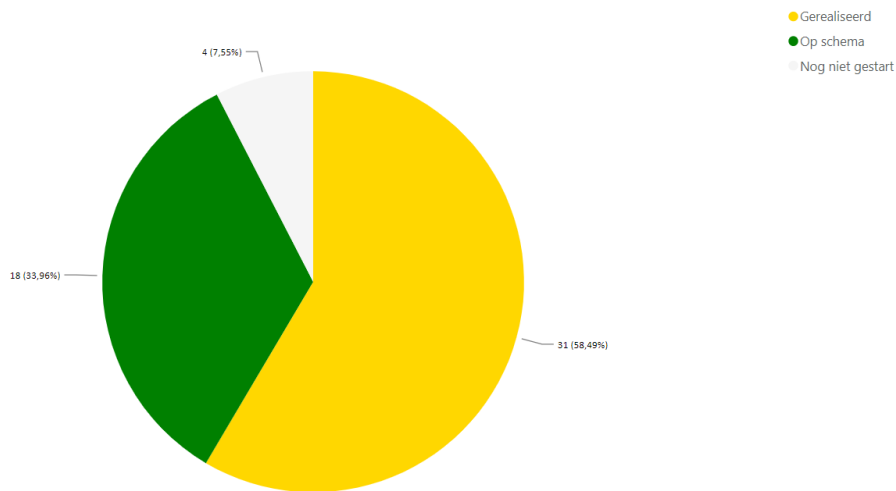

- 31 mijlpalen (58%) zijn gerealiseerd;
- 18 mijlpalen (34%) hebben status 'op schema';
- 4 mijlpalen (7,6%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen).

Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (5 projecten)

Speerpunt 7 heeft 50 mijlpalen met volgende status:

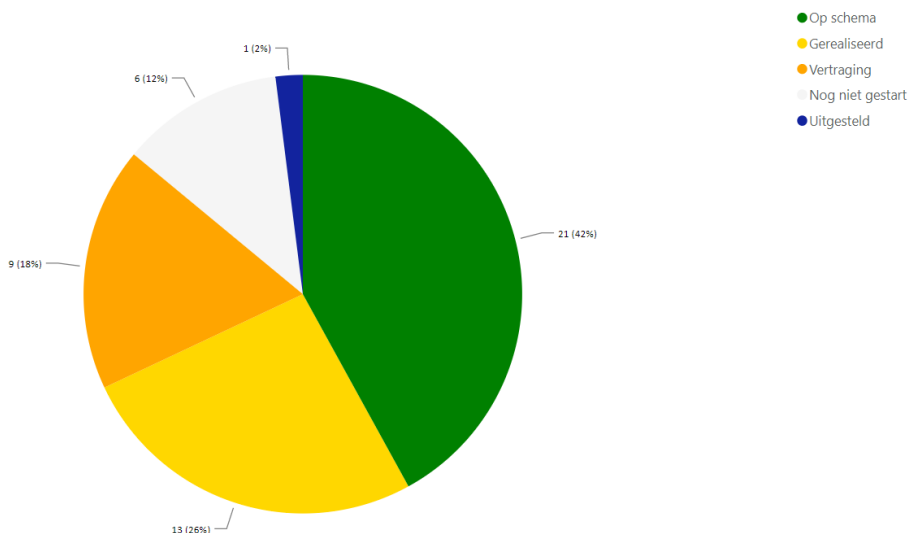

- 13 mijlpalen (26%) zijn gerealiseerd;
- 21 mijlpalen (42%) hebben status 'op schema';
- 9 mijlpalen (18%) hebben status 'vertraging';

- 6 mijlpalen (12%) hebben status ‘nog niet gestart’ (betreft toekomstige mijlpalen);
- 1 mijlpaal (2%) werd uitgesteld.

De 9 mijlpalen met status ‘vertraging’ bevinden zich in volgend project:


- VV162 | Investeren in Vlaamse kennisoverheid

Eén van de 5 projecten heeft één uitgesteld mijlpaal:

- VV161 | Decentralisatieoefening naar lokale besturen

5.2.3 Mijlpalen per cluster

Als we deze cijfers opsplitsen per cluster, dan krijgen we het volgende beeld.

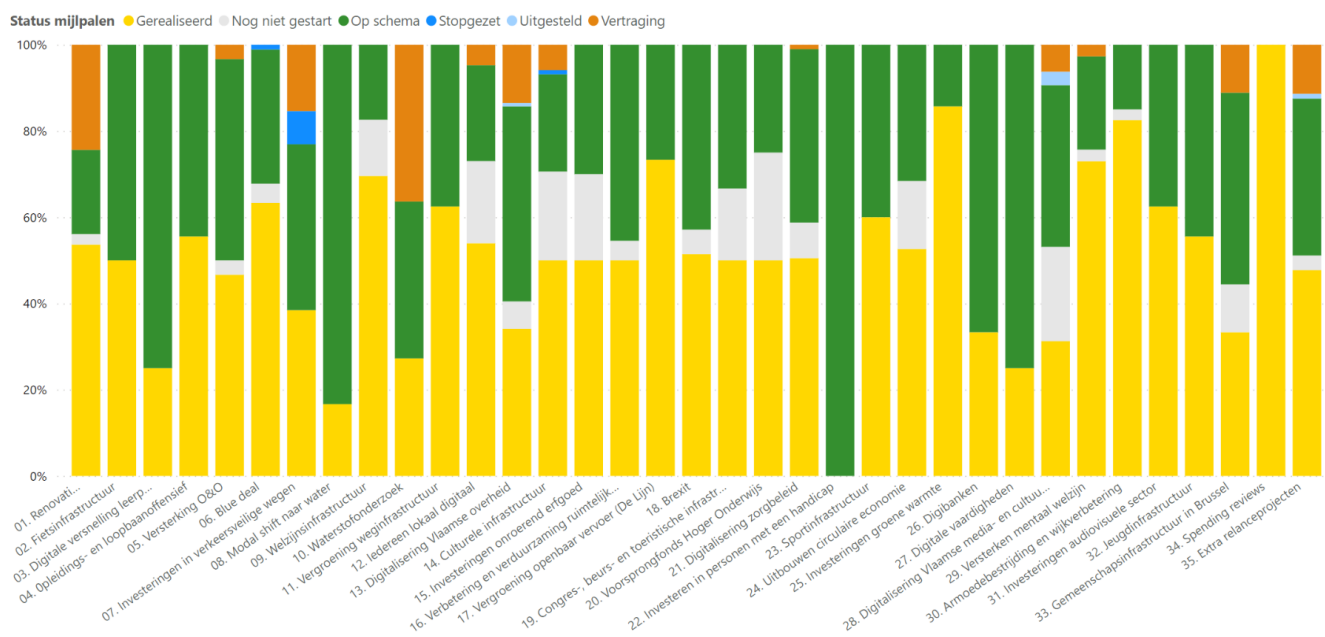

De top 3 van clusters met het grootst aandeel gerealiseerde mijlpalen zijn:

- Cluster 34 ‘Spending reviews’
- Cluster 25 ‘Investerings groene warmte’
- Cluster 30 ‘Armoedebestrijding en wijkverbetering’

De top 3 van clusters met het grootst aandeel vertraagde mijlpalen zijn:

- Cluster 10 ‘Waterstofonderzoek’
- Cluster 1 ‘Renovatie gebouwenpatrimonium’
- Cluster 7 ‘Investerings in verkeersveilige wegen’

5.3 VASTLEGGINGEN EN VEREFFENINGEN

5.3.1 Vastleggingen en vereffeningen voor VV001-VV158


De uitvoeringscijfers van de vastleggingen en vereffeningen zijn een goede indicator voor de voortgang van een project. Projecten VV001-VV158 worden gefinancierd door de voorziene 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen. Projecten VV159-180 worden gefinancierd met bijkomende reguliere middelen. De vastleggingen en vereffeningen voor deze laatstgenoemde projecten worden niet opgenomen in de VV-voortgangsrapportering. Ze kunnen opgevolgd worden via de jaarlijkse Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT). De cijfers hieronder hebben dus alleen betrekking op de vastleggingen en vereffeningen van de projecten VV001-VV158 en de voorziene 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen.

Op 1 juni 2022 was er 2 miljard euro of 46,5% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen vastgelegd. Dat is 476 miljoen euro meer dan bij de vorige meting in december 2021.

446 miljoen euro of 10% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was begin juni vereffend. Dat is een stijging van 227 miljoen euro in vergelijking met de vorige meting.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend



5.3.2 Vastleggingen en vereffeningen per speerpunt voor VV001-VV158

De opsplitsing van de uitvoeringscijfers per speerpunt toont een uiteenlopend beeld. Alleen voor speerpunt 2 (investeren in infrastructuur) is meer dan de helft van de voorziene middelen vastgelegd. Voor de andere speerpunten gaan de vastleggingen van 18% (speerpunt 6, Coronacrisis en Brexit beheren) tot 49% (speerpunt 1, economie en samenleving verduurzamen).


Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (43 projecten)

De vastleggingen voor spoorpunt 1 bedragen 795,54 miljoen euro. Dit is 49,5% van de voorziene relancemiddelen (1,6 miljard euro) voor dit spoorpunt.

De vereffeningen voor spoorpunt 1 bedragen 164,72 miljoen euro. Dit is 10% van de voorziene relancemiddelen voor dit spoorpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (38 projecten)


De vastleggingen voor spoorpunt 2 bedragen 592,66 miljoen euro. Dit is 52,5% van de voorziene relancemiddelen (1,129 miljard euro) voor dit spoorpunt.

De vereffeningen voor spoorpunt 2 bedragen 78,58 miljoen euro. Dit is 7% van de voorziene relancemiddelen voor dit spoorpunt.

● Uitvoering VAK ● Resterend



● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (44 projecten)

De vastleggingen voor spoorpunt 3 bedragen 145,17 miljoen euro. Dit is 33% van de voorziene relancemiddelen (445 miljoen euro) voor dit spoorpunt.

De vereffeningen voor spoorpunt 3 bedragen 85,23 miljoen euro. Dit is 19% van de voorziene relancemiddelen voor dit spoorpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (6 projecten)

De vastleggingen voor spoorpunt 4 bedragen 351,80 miljoen euro. Dit is 49% van de voorziene relancemiddelen (721 miljoen euro) voor dit spoorpunt.

De vereffeningen voor spoorpunt 4 bedragen 38,70 miljoen euro. Dit is 5% van de voorziene relancemiddelen voor dit spoorpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (20 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 5 bedragen 93,05 miljoen euro. Dit is 33% van de voorziene relancemiddelen (280 miljoen euro) voor dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 5 bedragen 61,50 miljoen euro. Dit is 22% van de voorziene relancemiddelen voor dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 6 De coronacrisis beheeren en Brexit (6 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 6 bedragen 20,22 miljoen euro. Dit is 18% van de voorziene relancemiddelen (113 miljoen euro) voor dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 6 bedragen 16,06 miljoen euro. Dit is 14% van de voorziene relancemiddelen voor dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (1 project)

De vastleggingen voor spoorpunt 7 bedragen 2 miljoen euro. Dit is 20% van de voorziene relancemiddelen (10 miljoen euro) voor dit spoorpunt.

De vereffeningen voor spoorpunt 7 bedragen 1,71 miljoen euro. Dit is 17% van de voorziene relancemiddelen voor dit spoorpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend




5.3.3 Globaal overzicht vastleggingen en vereffeningen per spoorpunt voor VV001-VV158

Spoorpunt 02 'Investeren in infrastructuur' kent relatief het grootste aandeel vastleggingen, spoorpunt 06 'De coronacrisis beheren en Brexit' het kleinste aandeel vastleggingen. Bij de vereffeningen zien we dat spoorpunt 05 'Het Vlaams zorg- en welzijnssysteem versterken' het grootste aandeel en spoorpunt 04 'Investeren in mensen en talenten' het kleinste aandeel inzake vereffeningen heeft.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend

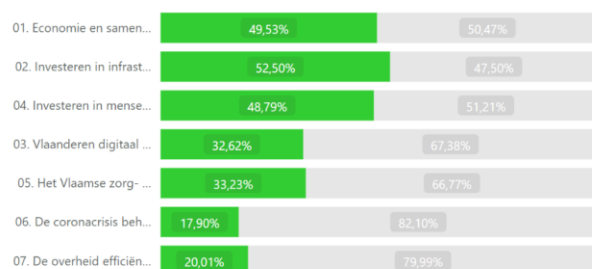

Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

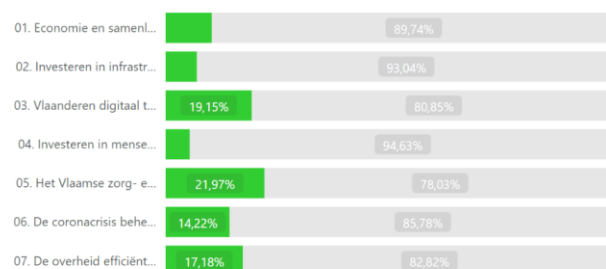

5.3.4 Globaal overzicht vastleggingen en vereffeningen per cluster voor VV001-VV158

De top drie van clusters met het hoogste percentage vastleggingen is:


- Cluster 20: Voorsprongfonds Hoger Onderwijs
- Cluster 30: Armoedebestrijding en wijkverbetering
- Cluster 11: vergroening weginfrastructuur

De top drie van clusters met het laagste percentage vastleggingen is:

- Cluster 10: Waterstofonderzoek
- Cluster 22: Investeren in personen met een handicap
- Cluster 19: Toeristische infrastructuur

Uitvoering VAK %


● Uitvoering VAK ■ Resterend

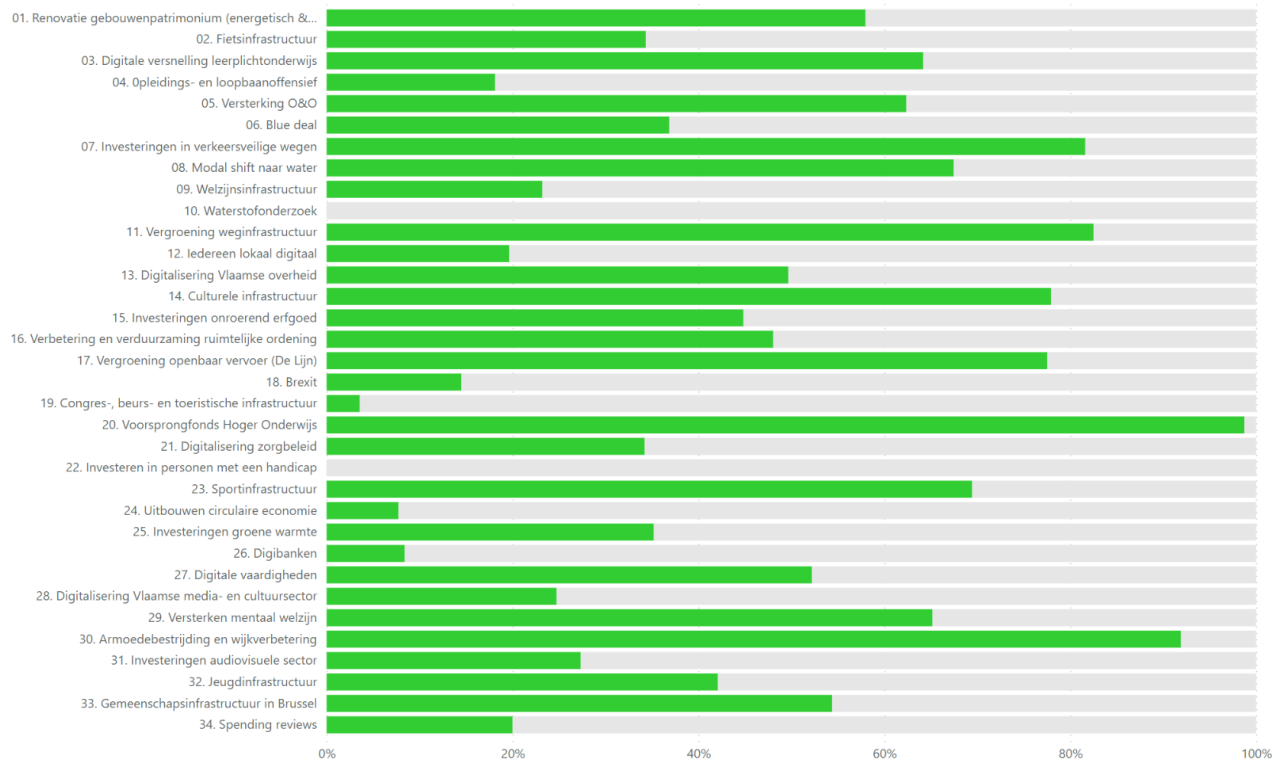

Het hoogste aandeel vereffeningen vinden we terug in cluster 33 'Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel'.

Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

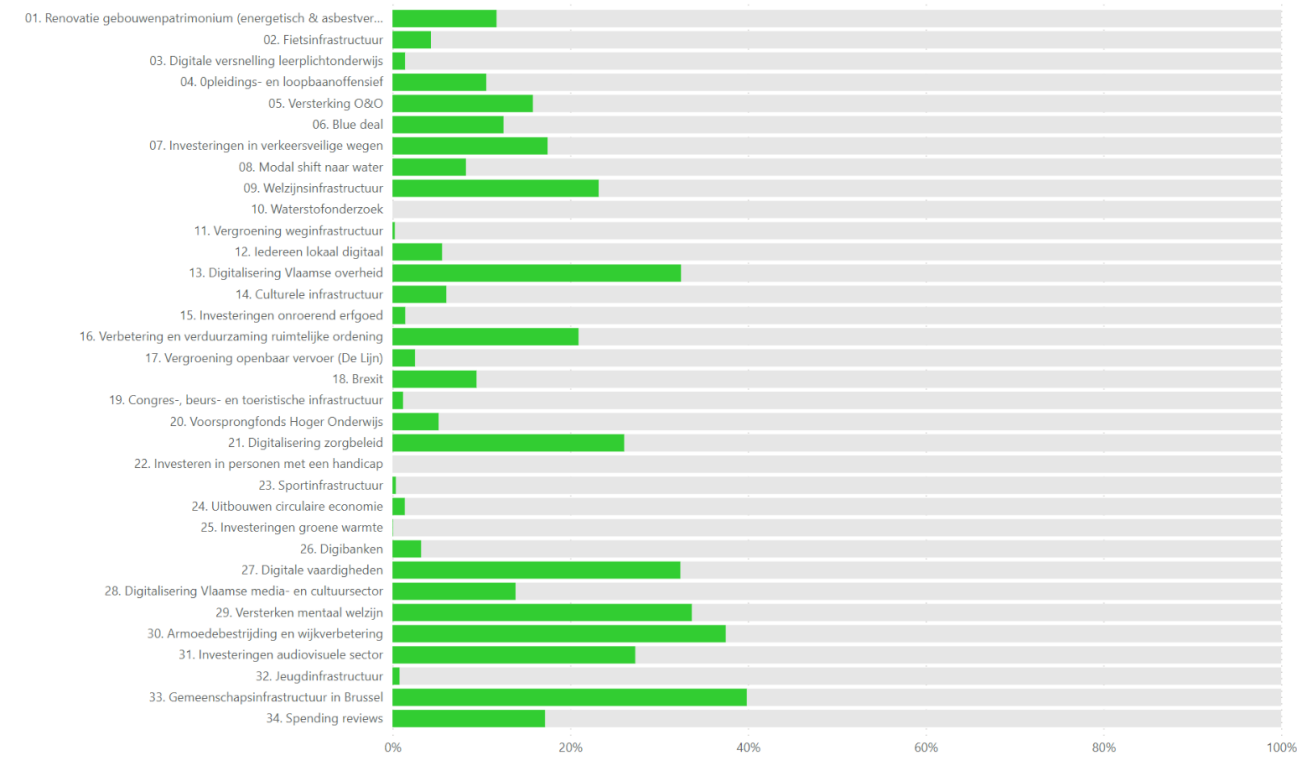

6 RRF-PROJECTEN

Op vraag van de Taskforce Vlaamse Veerkracht voorzien we een aparte analyse over de 55 projecten die ge(co)financierd worden vanuit de Europese Unie, de zogenaamde RRF-projecten (Recovery & Resilience Facility). Zoals eerder aangegeven wordt een maximum voorzien van 2,225 miljard euro. Nog twee hervormingsprojecten worden ook mee opgevolgd door de EU, maar krijgen geen RRF-financiering. We spreken hierna dus over 57 RRF-projecten.

6.1 OVERZICHT VAN DE RRF-PROJECTEN

Volgende 55 projecten krijgen RRF-financiering:

- VV006 | Financiering energieluik woningrenovatiepremie
- VV007 | Batterijpremie
- VV008 | EPC-labelpremie residentieel
- VV009 | Renovaties sociale woningen versnellen
- VV010 | Sociale woningbouw
- VV011 | VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid
- VV012 | Verlenging en uitbreiding sloop- en heropbouwpremie
- VV013 | De inrichting van een groter en veiliger fietsnetwerk (incl. fietstoegang economische poorten en jaagpaden) maakt van de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel en helpt zo het gebruik van personenwagens te reduceren
- VV014 | Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen
- VV015 | Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong)
- VV016 | Activering-verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC
- VV018 | Opleidingsoffensief arbeidsmarkt
- VV020 | Bio-economie
- VV021 | Onderzoeksinfrastructuur (bij Strategische Onderzoekscentra (SOC's), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs)
- VV022 | Versterking O&O bedrijven
- VV023 | Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O
- VV024 | Groenblauwe infrastructuur - open ruimte
- VV025 | Blue Deal - onderzoek
- VV026 | Blue Deal - MOW
- VV027 | Blue Deal - economie
- VV031 | Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving
- VV032 | Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen
- VV034 | Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen
- VV035 | Groenblauwe infrastructuur - waterlopen
- VV036 | Natte natuur
- VV047 | Waterstofonderzoek
- VV049 | Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur
- VV051 | Gemeente zonder gemeentehuis
- VV056 | Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022
- VV057 | Ondersteuning Digitale Transformatie

- VV058 | AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening (inclusief bijdrage subsidieregister)
- VV059 | Digitalisering asset management Aquafin
- VV060 | Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel
- VV061 | Datanutsbedrijf
- VV064 | FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening
- VV065 | HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM (Security Information & Event Management)
- VV066 | HFB - Hybride digitale werkplek
- VV067 | HFB - Modernisering cloud en netwerkinfrastructuur
- VV068 | Kaleidos – Digitalisering van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering
- VV069 | Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit
- VV071 | Poolstokalias
- VV072 | Doelgericht digitaal transformeren
- VV073 | Vlaamse Sensor Data Space
- VV074 | Vastgoedinformatieplatform
- VV076 | Zelf beheerde identiteit
- VV105 | Ontsnippen van Vlaams landschap
- VV106 | Vergroening openbaar vervoer De Lijn
- VV112 | Voorsprongfonds Hoger Onderwijs
- VV123 | Circulair bouwen
- VV124 | Circulaire maakindustrie
- VV125 | Circulaire economie - Recyclagehub
- VV126 | Call groene warmte
- VV127 | Digibanken
- VV128 | Digitale vaardigheden
- VV158 | Spending reviews

Volgende 2 hervormingsprojecten worden mee opgevolgd vanuit de EU maar krijgen geen aparte RRF-financiering:


- VV159 | Snellere vergunnings- en beroepsprocedures
- VV160 | Administratieve vereenvoudiging

6.2 ANALYSE

Globale voortgang

We kunnen over de verschillende meetmomenten een positieve evolutie vaststellen. Zo zijn alle RRF-projecten opgestart en het merendeel is in uitvoering na agendering op de Vlaamse Regering.

Projectstatus ■ Nog niet opgestart ■ Opgestart ■ In uitvoering na agendering VR ■ Aandacht nodig

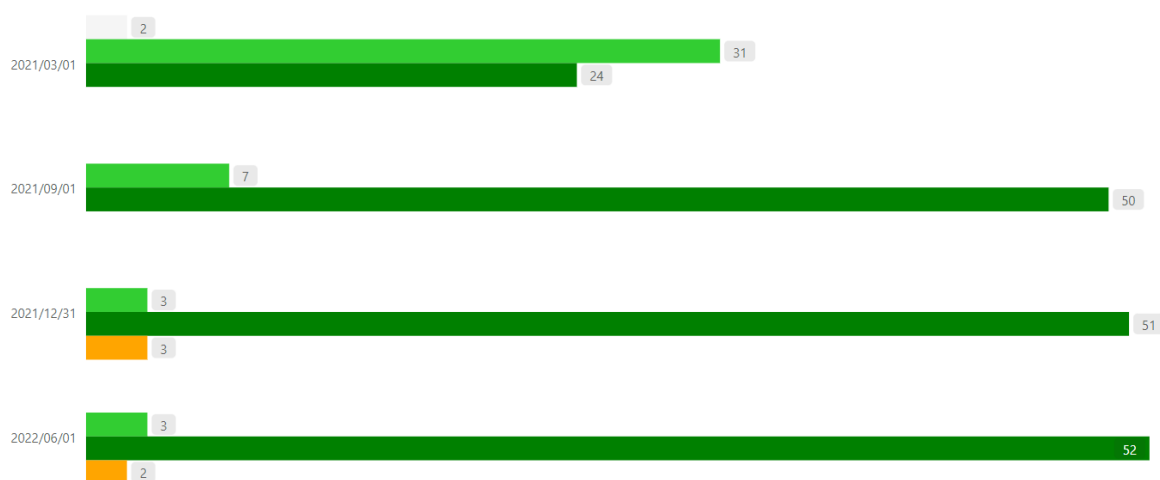


Bij meetmoment 4 verdienen volgende 2 RRF-projecten bijzondere aandacht:

- **VV014 'Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen'**: We voorzien een enveloppe van 150 miljoen euro voor cofinanciering via trekkingsrechten per gemeente (op basis van het aantal inwoners). Elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor investeringen in fietsinfrastructuur versterken we met 1 euro. Zo realiseren we in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten. De maatregel is positief onthaald en de aanmeldingen komen binnen, maar volstaan niet om de beoogde doelstellingen te behalen. Op lokaal niveau dienen de nodige middelen te worden voorzien in de meerjarenplanning. De beschikbare lokale personeelscapaciteit speelt ook een rol. Er loopt een tussentijdse evaluatie met het oog op een bijsturing van het BVR, om de scope van het project uit te breiden en om de modaliteiten aan te passen.
- **VV056 'Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamcontract 2022'**: Dit programma (15 miljoen euro) heeft als doel het aanbod ICT-diensten te vernieuwen, zodat het beter afstemt op de noden van de Vlaamse overheid en maximaal inspeelt op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan mature diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Het dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en, in lijn met hun behoeften, een geschikte menukaart bieden. De operationele service integratiediensten, evenals de verschillende ICT-dienstverleningspakketten zijn van start gegaan op 1 februari 2022. De transitie kon echter nog niet volledig worden afgerond. Er zijn echter geen grote onderbrekingen in de ICT-dienstverlening. De verwachting t.o.v. de ICT-Partners is om de dienstverlening uiterlijk eind juni 2022 naar het beoogde peil te brengen.

RRF-Mijlpalen

Hieronder bespreken we kort de mijlpalen die in het voorgangrapport aangeduid zijn als 'RRF-mijlpaal'; de mijlpalen waarover periodiek naar Europa gerapporteerd wordt. Niet elke RRF-mijlpaal stemt overeen met één VV-mijlpaal. Om meer detail aan te brengen in de VV-rapporteringen werden sommige RRF mijlpalen opgesplitst, of werden er tussenstappen in het behalen van een doel ('RRF-target') als extra mijlpaal meegenomen.

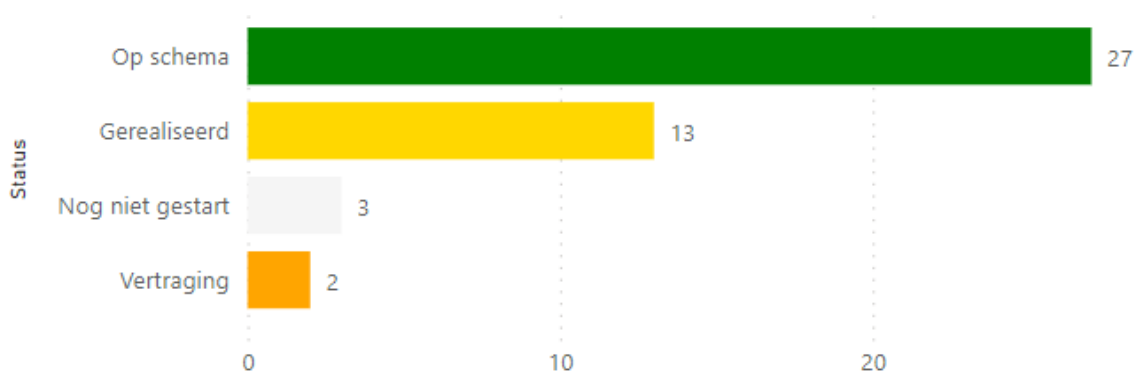

Status RRF-mijlpalen tot en met Q1 2023


Hierboven de mijlpalen tot en met Q1 2023. Er zijn 45 RRF-mijlpalen opgenomen in de monitoring van Vlaamse Veerkracht. 27 zijn op schema, 13 al gerealiseerd en 3 mijlpalen moeten nog worden opgestart.

Er zijn ook 2 RRF-mijlpalen waarvoor vertraging aangegeven wordt. Deze mijlpalen situeren zich in VV011 'VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid'. Het betreft hier mijlpalen die als tussenstap gelden voor een RRF-target, dus niet de target zelf. De reden voor de vertraging is dat het project nog bekendheid moest verwerven. Dit werd ondervangen met enkele op maat gerichte webinars in Q1 van 2022 met 50 inschrijvingen voor de zorg en meer dan 180 inschrijvingen op een webinar gericht op het onderwijs.

Vastleggingen en vereffeningen

Het relancebudget voor de RRF-projecten bedraagt in totaal 2,53 miljard euro. 89% of 2,25 miljard euro komt uit het RRF-fonds. 9% of 222 miljoen euro zijn Vlaamse relancemiddelen. 2% of 57 miljoen euro is afkomstig uit REACT-EU.

Oorsprong middelen voor RRF-projecten

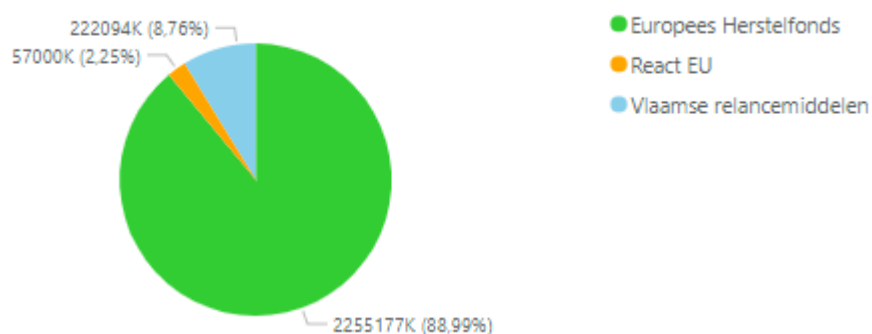


De vastleggingen vertonen een gunstige evolutie. In juni van 2022 is 48% van de middelen vastgelegd.

De vereffeningen verlopen uiteraard trager dan de vastleggingen. Ongeveer 10% van de middelen is in juni 2022 vereffend.

De onderstaande cijfers in de tabel maken geen onderscheid tussen de RRF-middelen en Vlaamse relancemiddelen.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend



Uitvoering VAK en VEK voor de RRF-projecten

7 LEESWIJZER BIJ HET GLOBALE RAPPORT

Het monitoringsrapport bevat een beschrijvend overzicht van de status van alle projecten, gemeten op 1 juni 2022. De projecten zijn geordend volgens cluster.

De projectfiches bevatten de volgende informatie:

- Een overzicht van de **betrokkenen**:
 - De bevoegde minister
 - De trekkende entiteit binnen de Vlaamse overheid
 - Een link naar de webpagina over het project
 - Andere betrokken entiteiten binnen de Vlaamse overheid
 - De belanghebbenden
- **Projectsituering**: geeft aan tot welk speerpunt en welke cluster van het relanceplan het project behoort
 - Speerpunt: er zijn zeven speerpunten, zoals aangekondigd in de [Septembeerklaring](#)
 - Cluster: het relanceplan is ingedeeld in 35 clusters, zoals [meegedeeld op de Vlaamse Regering op 5 februari 2021](#)
- De **projectomschrijving**: beschrijft de inhoud van het project.
 - Voor grote projecten met verschillende subprojecten kan dit vrij uitgebreid zijn. Hier worden ook de doelstellingen van het project weergegeven.
- **Input, output en outcome**:
 - Beschrijft de input, de output en de outcome gelinkt aan het project.
- **Algemene projectvoortgang**: geeft de globale status van het project aan de hand van een projectstatus en toelichtende beschrijving. De projectstatussen hebben een kleurcode. De volgende kleurcodes zijn mogelijk:
 - Grijs: Het project is nog niet opgestart.
 - Lichtgroen: Het project is opgestart, maar bevindt zich in een voorbereidende fase en werd nog niet op de Vlaamse Regering geagendeerd.
 - Donkergroen: De uitvoering van het project is op schema.
 - Oranje: Voor één of meerdere deelaspecten van het project is bijzondere aandacht nodig.
 - Rood: Voor het project is bijkomende actie noodzakelijk.
 - Geel: Het project is gerealiseerd.
- **Gedetailleerde projectvoortgang op basis van de mijlpalen**: beschrijft de voortgang van de verschillende mijlpalen aan de hand van een status en een toelichting bij de status. De volgende statussen zijn mogelijk:
 - Grijs: nog niet gestart: de uitvoering is nog niet gestart en dit is conform het afgesproken tijdsplan
 - Groen: op schema: de uitvoering loopt en volgt het afgesproken tijdsplan
 - Oranje: vertraging: de uitvoering loopt, maar er is een vertraging op het afgesproken tijdsplan
 - Lichtblauw: de uitvoering van de mijlpaal wordt uitgesteld naar een later moment.
 - Donkerblauw: de uitvoering van de mijlpaal is definitief stopgezet.
 - Rood: de mijlpaal moet bijgestuurd worden. Bijkomende actie is noodzakelijk.
 - Geel: de mijlpaal is gerealiseerd

- **Gedetailleerde projectvoortgang op basis van de outputindicatoren:** geeft een overzicht van de streefwaarde, de realisatie en de realisatiegraad.
- **Projectfinanciering:** geeft een overzicht van de beleidsruimte (begroot), de vastgelegde kredieten en de vereffende kredieten.
 - De oorsprong van de middelen (Vlaams of Europees, relancebudgetten of reguliere middelen) wordt per project weergegeven.
 - 55 van de 180 projecten van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ zijn opgenomen in de Vlaamse bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht via een [Mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021](#).
- **Agendering Vlaamse Regering:** geeft aan of een project geagendeerd is op de Vlaamse Regering en legt een link naar de goedgekeurde regeringsdocumenten.
- **Koppeling met andere projecten:** geeft het verband met andere projecten buiten de eigen cluster weer.

8 VOORTGANGSRAPPORT: GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN ALLE PROJECTEN

01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)

VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.• Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.• Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. <p>Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vervuiling van bodem, lucht en water• Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen• Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie• Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken. <p>Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling.</p> <p>Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken en muren van niet-residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudend (onder)dak of asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse (relance)middelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen.

Voor niet-residentiële gebouwen wordt op basis van cijfers van OVAM en VEKA verondersteld dat 25% van de 270.000 gebouwen met risicobouwjaar beschikken over een asbesthoudende gebouwschil (gevel en/of dakbedekking) en 3% over een asbesthoudend onderdak. Dit betekent dat tegen 2034 jaarlijks zo'n 5.400 niet-residentiële gebouwen asbestvrij moet worden gemaakt.

Er is een aanzienlijk aandeel van niet-verwarmde of zeer beperkt verwarmde gebouwen die ook asbest bevatten in de dakbedekking of het onderdak. Het gaat hoofdzakelijk over niet-residentiële gebouwen zoals bijvoorbeeld magazijnen, (landbouw)loodsen, openbare gebouwen, ... Deze doelgroep wordt momenteel niet bereikt met de verhoogde isolatiepremie na asbestverwijdering gezien zij geen nood hebben aan dezelfde energieprestatie-eisen als residentiële gebouwen en doorgedreven isoleren net contraproductief kan werken in sommige gevallen (bv. stallen met dieren). Deze dakoppervlaktes zijn echter wel geschikt voor het plaatsen van een fotovoltaïsche installatie. Op die manier kunnen wij een bijkomend potentieel voor hernieuwbare energie ontsluiten, hetgeen niet alleen goed is voor het bereiken van onze klimaatdoelstelling, maar ook bijdraagt aan de bevoorradingzekerheid en de betaalbaarheid van de energiefactuur. Met de voorgestelde premie wordt gemikt op een versnelling van asbestverwijdering bij grote, niet-complexe daken van onverwarmde niet-residentiële gebouwen.

Het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken is decretaal via het Materialendecreet verboden. Voor asbestdaken waarop de plaatsing van zonnepanelen beoogd wordt, is het dan ook noodzakelijk het volledig dak van asbestmaterialen te ontdoen.

Het uitbreidingsvoorstel bestaat erin om niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen in aanmerking te laten komen voor een premie van 12 euro per vierkante meter verwijderde asbestbedekking en/of onderdak, op voorwaarde dat 'gelijktijdig' een fotovoltaïsche installatie op het dak wordt geplaatst. De plaatsing van de fotovoltaïsche installatie komt afhankelijk van de capaciteit van de installaties eveneens in aanmerking voor de bestaande ondersteuningssystemen voor fotovoltaïsche installatie (de investeringspremie PV, de call groene stroom, de projectspecifieke ondersteuning met groenestroomcertificaten). Om in aanmerking te komen voor deze premie moet de oppervlakte van de fotovoltaïsche zonnepanelen in verhouding tot de totale oppervlakte van het gesaneerde dak minstens 10 procent bedragen.

Uitgaande van de gemiddelde dak- en buitenmuuroppervlaktes van woningen, woongebouwen en niet-woongebouwen, een forfaitaire premie van 8 euro boven de premie voor dak- of muurisolatie enerzijds en de premie van 12 euro per vierkante meter verwijderde asbestbedekking en/of onderdak in combinatie met een fotovoltaïsche installatie anderzijds, is voor de jaarlijkse geschatte aangepakte niet-residentiële gebouwen een budget nodig 15 miljoen euro voor deze maatregel.

Er worden geen reguliere middelen ingezet voor de meerkost van de premie voor isolatie voor wat betreft de verhoging van de isolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering noch voor de premie voor asbestverwijdering in combinatie met PV. De relancemiddelen volstaan hiervoor.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	23.000.000 EUR
Output	5366 uitbetaalde premies voor dak- en/of buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering en voor asbestverwijdering in combinatie met de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie in niet-residentiële gebouwen
Outcome	5366 niet-residentiële gebouwen met dak- en/of buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering of asbestverwijdering in combinatie met de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Premies kunnen worden aangevraagd voor de gelijktijdige asbestverwijdering en isolatie van daken en muren van niet-residentiële gebouwen, met eindfacturen voor beide werken in 2021-2022. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 2 jaar na factuurdatum. Bijgevolg zal het overgrote deel van premieaanvragen en uitbetalingen pas volgen in de loop van 2022, 2023, 2024 en 2025. Vanaf 1 april kan ook een premie worden aangevraagd voor de gelijktijdige investering in het asbestvrij maken van het dak van een niet-residentiële, niet-verwarmd gebouw en de plaatsing van een PV-installatie die minstens 10% bedraagt van de gesaneerde dakoppervlakte. Deze wijziging aan de scope was noodzakelijk, gezien een groot aandeel niet-residentiële gebouwen met asbesthoudende daken niet verwarmd wordt en bijgevolg niet in aanmerking komt voor een (verhoogde) isolatiepremie. Dit is een win-win voor de doelstellingen op het vlak van asbestverwijdering enerzijds en groene stroom anderzijds. Deze nieuwe premie werd ingevoerd via het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022. Gemiddelde oppervlakte per gebouw (premedossier) blijkt hoger dan initieel ingeschat. Het voorziene budget van 30 miljoen euro werd bijgesteld naar 23 miljoen euro na een enveloppeverschuiving naar VV007 (batterijpremie). Mijlpalen en outputindicatoren werden naar verhouding aangepast.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentiële met isolatie - regelgeving	2020 Q4	Gerealiseerd	
Aanvullende premie asbestverwijdering in combinatie met PV - regelgeving	2022 Q1	Gerealiseerd	
983 uitbetaalde premies in 2021	2022 Q1	Vertraging	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving omwille van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premieaanvraag in te dienen en rekening

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			houdend met vertragingen in uitvoering van werken (Corona, beschikbaarheid aannemers, ...)
1700 uitbetaalde premies in 2022	2023 Q1	Vertraging	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving
1700 uitbetaalde premies in 2023	2024 Q1	Nog niet gestart	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving
983 uitbetaalde premies in 2024	2025 Q1	Nog niet gestart	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal m ² asbestvrij gemaakte dak- en/of muuropervlakte met isolatie of PV-panelen	1.650.000	2025 Q1	119.000	7,2 %
uitbetaalde premies	5366	2025 Q1	222	4,1 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	344.000 EUR
Uitvoering VEK	344.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 23.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale openbardienstverplichtingen en REG-openbardienstverplichtingen](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

[Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV002 - Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie](#)

[VV003 - Asbestpremie daken residentieel met isolatie](#)

VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:

- Vervuiling van bodem, lucht en water
- Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen
- Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie
- Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken.

Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling.

Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende muren van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudende gevel en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie. Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies. De meerkost voor het asbestgedeelte van de premie wordt voor premies

PROJECTOMSCHRIJVING

2021 en 2022 volledig vergoed vanuit de relancemiddelen.

Op basis van cijfers van OVAM en VEKA wordt het aantal woningen of woongebouwen met asbesthoudende dakbedekking en/of een asbesthoudend onderdak en/of -gevels ingeschat op 328.000. Daarnaast hebben 511.000 woningen en woongebouwen een asbesthoudend onderdak. Er is een zekere overlap in de aanwezigheid van asbest in meerdere gebouwdelen van eenzelfde gebouw. Het asbestplan streeft naar het asbestveilig maken van Vlaanderen tegen 2034. Dat wil zeggen dat jaarlijkse ruim 40.000 woningen en 1.500 woongebouwen asbestvrij gemaakt moet worden gedurende 14 jaar, en dit op het vlak van asbest aanwezig in dakbedekking en/of onderdak en/of gevelbekleding.

Uitgaande van de gemiddelde buitenmuuroppervlaktes van woningen en woongebouwen, een forfaitaire premie van 8 euro boven de premie voor dak- of muurisolatie en een bereik van 75% van de jaarlijks asbestvrij te maken gebouwen door deze premie, is voor de jaarlijkse geschatte aangepakte residentiële gebouwen een budget nodig 6 miljoen euro voor de meerkost (dit is de bijkomende forfaitaire premie van 8 euro per m²) van de buitenmuurisolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering.

Er worden geen reguliere middelen ingezet voor de financiering van deze meerkost bovenop de isolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering. Het voorziene relancebudget volstaat hiervoor.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	2250 uitbetaalde premies voor buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen
Outcome	2250 residentiële gebouwen met buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Premies kunnen worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021 voor investeringen in isolatie en asbestverwijdering met eindfacturen in 2021 en 2022. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 2 jaar na factuurdatum. Bijgevolg zal het overgrote deel van premieaanvragen en uitbetalingen pas volgen in de loop van 2022, 2023, 2024 en 2025. Gemiddelde oppervlakte per woning (premedossier) blijkt hoger dan initieel ingeschat. Het voorziene budget van 12 miljoen euro werd bijgesteld naar 3 miljoen euro na een enveloppeverschuiving naar VV007 (batterijpremie). Mijlpalen en outputindicatoren werden naar verhouding aangepast.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Asbestpremie buitenmuren residentieel - regelgeving	2020 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
188 uitbetaalde premies in 2021	2022 Q1	Vertraging	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving omwille van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premieaanvraag in te dienen en rekening houdend met vertragingen in uitvoering van werken (Corona, beschikbaarheid aannemers, ...)
844 uitbetaalde premies in 2022	2023 Q1	Vertraging	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving
844 uitbetaalde premies in 2023	2024 Q1	Nog niet gestart	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving
375 uitbetaalde premies in 2024	2025 Q1	Nog niet gestart	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal m ² asbestvrij gemaakte muuropervlakte met isolatie	66.667	2025 Q1	8.927	13,39 %
uitbetaalde premies voor buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen	2250	2025 Q1	148	6,58 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	12.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	74.000 EUR
Uitvoering VEK	74.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

[Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen](#)

VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:

- Vervuiling van bodem, lucht en water
- Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen
- Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie
- Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken.

Gezien de langetermijn doestelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling. Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen. De voorgestelde subsidie is gericht op het bereiken van ongeveer 75% van het jaarlijkse potentieel van de voorraad asbestgebouwen per jaar.

Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur vanaf 2021 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkost die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

PROJECTOMSCHRIJVING

Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies. De meerkost voor het asbestgedeelte van de premie wordt voor premies 2021 en 2022 vergoed vanuit de relancemiddelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.200.000 EUR
Output	19.238 uitbetaalde premies voor dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen
Outcome	19.238 residentiële gebouwen met dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Premies kunnen worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021 voor investeringen in isolatie en asbestverwijdering met eindfacturen in 2021 en 2022. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 2 jaar na factuurdatum. Bijgevolg zal het overgrote deel van premieaanvragen en uitbetalingen pas volgen in de loop van 2022, 2023, 2024 en 2025. Gemiddelde oppervlakte per woning (premie dossier) blijkt hoger dan initieel ingeschat. Het voorziene budget van 12 miljoen euro werd bijgesteld naar 20.200.000 miljoen euro na een enveloppeverschuiving naar VV007 (batterijpremie). Mijlpalen en outputindicatoren werden naar verhouding aangepast.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Asbestpremie daken residentieel - regelgeving	2020 Q4	Gerealiseerd	
1832 uitbetaalde premies in 2021	2022 Q1	Vertraging	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving omwille van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premieaanvraag in te dienen en rekening houdend met vertragingen in uitvoering van werken (Corona, beschikbaarheid aannemers, ...)
6413 uitbetaalde premies in 2022	2023 Q1	Vertraging	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving
6413 uitbetaalde premies in 2023	2024 Q1	Nog niet gestart	vertraagd omwille van enveloppeverschuiving
4581 uitbetaalde premies in 2024	2025 Q1	Nog niet gestart	vertraagd omwille van enveloppeverschuiving

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
uitbetaalde premies voor dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen	19238	2025 Q1	1.835	9,54 %
Aantal m ² asbestvrij gemaakte dakoppervlakte met isolatie	1.442.857 m ²	2025 Q1	242.876	16,83 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	42.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.200.000 EUR
Uitvoering VAK	721.000 EUR
Uitvoering VEK	721.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV001 - Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie VV002 - Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie

VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Belanghebbenden	Vereniging van steden en gemeenten, Interafval

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Het actieplan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen (lokale besturen, zorgvoorzieningen, ...) , landbouw, jeugd (scholen, ...).

Voor de doelgroep lokale besturen en residentiële gebouwen werd een subsidie-instrument voorzien voor de organisatie en coördinatie van lokale asbestafbouwprojecten volgens vastgelegde projectformules.

Doelgroep: particulieren, jeugdverenigingen, lokale besturen

Ondersteuning:

- subsidies voor de lokale projectcoördinatie;
- subsidies voor de cofinanciering van asbestinzameling en verwijdering;
- ontzorging voor aanbesteding door particulier zelf

Gesubsidieerde projectformules:

- o organisatie van ophaling van asbestcement afval aan huis
- o specifieke Calls naar lokale jeugdinfrastructuur om asbest gericht te inventariseren en te verwijderen.
- o gegroepeerde verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding via raamcontracten

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	27.600.000 EUR
Output	Aantal asbestverwijderingen uitgevoerd per doelgroep (particulieren/lokale jeugdinfrastructuur/lokale besturen) Aantal ingezamelde tonnages asbestcement

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome	De realisatie van een asbestveilig Vlaanderen 2040 meet zich af aan het aantal asbestveilige gebouwen met risicobouwjaar tot 2001. De impact van dit project beoogt het toewerken naar een maximaal aantal asbestveilige locaties in Vlaanderen. Dit door de relancebudgetten via asbestprojecten bij lokale besturen in te zetten voor een maximaal aantal verwijderlocaties bij burgers, lokale jeugdinfrastructuur en lokale besturen. Zo wordt op deze locaties toegewerkt naar een asbestveilige leefomgeving.
---------	---

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De lokale asbestprojecten lopen. Bronophaling zal dit jaar in alle Vlaamse gemeenten aangeboden worden. In verschillende regio's lopen gegroepeerde verwijderingsprojecten. De projecten voor lokaal erkende jeugdverenigingen zijn breed gecommuniceerd en voorbereid voor opstart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart operationalisering	2021 Q3	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	27.600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.600.000 EUR
Uitvoering VAK	10.083.000 EUR
Uitvoering VEK	3.390.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Circulaire economie -Asbest lokale besturen](#)

VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Belanghebbenden	Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

- Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
- Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
- Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Het plan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen, landbouw, jeugd (scholen, ...).

Voor de sectoren zorgvoorzieningen, scholen, landbouw en sociale huisvesting wordt onder de vorm van een sectorprotocol een ondersteuningskader met ontzorging, cofinanciering en subsidiëring aangeboden. Het sectorprotocol wordt vormelijk ondertekend door de OVAM, de voogdij minister(s) en de sectorvertegenwoordiging. Het beheer en de operationalisering van de sectorprotocollen gebeurt binnen de werking van de OVAM.

De Relancemiddelen zijn een sterke aanvulling op de reguliere jaarlijkse 3000 keuro. Ze maken het mogelijk om naast het bestaande sectorprotocol voor scholen nieuwe te initiëren voor de doelgroepen zorg, landbouw en sociale huisvesting

Sectorprotocol scholen

Doelgroep: Vlaamse onderwijsinstellingen

Ondersteuning:

- contracten op afroep voor gratis asbestinventaris;
- contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering
- subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: GO!, AGION

Sectorprotocol landbouw

Doelgroep: Vlaamse landbouwondernemingen

PROJECTOMSCHRIJVING

Ondersteuning:

- gratis inzameling van asbestcementafval bij de vervanging van asbestdaken

Partners: Boerenbond, ABS, VAC

Sectorprotocol sociale huisvesting

Doelgroep: Vlaamse sociale woningen

Ondersteuning:

– subsidie per gerealiseerde asbestveilige woning;

– aangepaste procedure extrapolatie van asbestinventarissen voor kostenbesparing

Partners: VMSW, VVH

Sectorprotocol zorgvoorzieningen

Doelgroep: Vlaamse zorgvoorzieningen

Ondersteuning:

– contracten op afroep voor gratis asbestinventaris en asbestexpertise;

– subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: VIPA, VEB, zorgkoepels

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	12.400.000 EUR
Output	Aantal asbestinventarisaties en asbestverwijderingen uitgevoerd.
Outcome	Meer gebouwen geïnventariseerd en asbestveilig gemaakt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De sectorprotocollen landbouw en scholen zijn in uitvoering na agendering VR. Voor de sectorprotocollen zorg en sociale huisvesting loopt de procedure agendering VR: respectievelijk fase advies IF en advies BA.
Noodzakelijke politieke actie	Agendering VR voor sectorprotocol zorg en sociale huisvesting.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Ondertekening protocollen sociale huisvesting en landbouw	2021 Q4	Vertraging	Protocol landbouw op schema. Protocol sociale huisvesting voorzien in Q 3 2022. Geen impact op voorziene besteding provisie VV5.
Operationalisering protocol zorgvoorzieningen	2021 Q4	Vertraging	Vertraging door ongunstig advies IF. Ontwerptekst protocol aangepast en gevalideerd door zorgkoepels. Nieuwe adviesvraag IF loopt.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Operationalisering en/of opschaling protocol scholen, sociale huisvesting en landbouw	2021 Q4	Vertraging	Operationalisering protocol sociale huisvesting na ondertekening in Q3 2022.
Ondertekening protocol zorgvoorzieningen	2022 Q1	Vertraging	Door een ongunstig advies IF herwerkt. Aangepast voorstel opnieuw voorgelegd voor advies. Verwachte ondertekening in Q3.

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	12.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	12.400.000 EUR
Uitvoering VAK	404.000 EUR
Uitvoering VEK	240.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 12.400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Circulaire economie – asbest sectorprotocollen - scholen](#)

[Vervolgprotocol asbestafbouwbeleid scholen \(incl. internaten en clb's\) van het gesubsidieerd onderwijs. Bijlage](#)

[Vervolgprotocol asbestafbouwbeleid van het Go! Gemeenschapsonderwijs. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 20 mei 2022. Uitvoering van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht project VV5 'Circulaire economie – sectorprotocol landbouw'](#)

VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Uit onderzoek blijkt dat 57% van de woningen herstellingen, renovaties of een totaalrenovatie nodig hebben om te voldoen aan de minimale woningkwaliteitseisen. Om de energiedoelstellingen van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie 2050 te behalen, moeten in 96,5 % van de Vlaamse woningen werkzaamheden uitgevoerd worden. Als we zowel woningkwaliteit als energie in rekening brengen, zijn er bijna in alle Vlaamse woningen nog werken nodig. Beide doelstellingen op vlak van woningkwaliteit en energieprestatie, kunnen in de meeste gevallen niet los van elkaar worden gezien.

Bovendien toont onderzoek aan dat problemen inzake woningkwaliteit en slechte energieprestatie zich concentreren in bepaalde segmenten van de woningmarkt en bij bepaalde doelgroepen, nl de meest kwetsbare doelgroep van alleenstaanden, eenoudergezinnen, huishoudens met een beperkt inkomen, en dat precies hier de renovatieactiviteit het laagst is.

Om de renovatiegraad op te krikken bestaan er sinds jaren premies gericht op energie-efficiëntie en het stimuleren van investeringen in hernieuwbare energie installaties enerzijds (energiebeleid) en doelgroepgerichte premies voor de verbetering van de woningkwaliteit anderzijds (woonbeleid). Ter bevordering van de klantvriendelijkheid en de transparantie alsook om de renovatiegraad te verhogen, is een vereenvoudiging van het premielandschap noodzakelijk, met uniforme en versterkte doelgroepgerichte maatregelen en premies. Door zoveel mogelijk premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning in één loket te bundelen, wordt aan deze nood tegemoet gekomen.

Hierbij werd vertrokken van volgende uitgangspunten: (i) het behouden van de aandacht voor woningkwaliteit en (ii) het verhogen van de aantrekkelijkheid van de premies.

De mate van ondersteuning hangt af van financiële draagkracht van de investeerder.

Steun voor energetische investeringen voor iedereen, steun voor investeringen in woningkwaliteit voor lagere inkomens waarbij het steunpercentage afhankelijk is van het inkomen. Dit impliceert voor energieprijzen afstappen van de verhoogde premies voor de doelgroep 'beschermde afnemer' (= federaal bepaalde rechthebbenden op sociale maximumprijzen energie).

De klantgerichtheid wordt bevorderd door een vlotte dossierbehandeling, het voorzien van slechts één indienings- en betaaladres en het vereenvoudigen van de procedures. Maximale aandacht gaat naar de begeleiding en ontzorging van kwetsbare doelgroepen.

PROJECTOMSCHRIJVING

Vereenvoudiging en vergaande afstemming van de in aanmerking komende investeringen en de toekenningsvoorwaarden die worden gehanteerd in de huidige stelsels.

De relancemiddelen worden ingezet voor de financiering van een deel van de energiegerelateerde onderdelen van deze nieuwe, geïntegreerde premie. De premies die niet vergoed kunnen worden vanuit de relancemiddelen, worden vergoed vanuit de nettarieven, tenzij hiervoor expliciet bijkomende middelen voorzien zouden zijn vanuit de Vlaamse uitgavenbegroting of het Energiefonds, zoals bepaald in het Energiebesluit van 19 november 2010.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	180.000.000 EUR
Output	220.000 premie-aanvragen voor energiegerelateerde investeringen over periode 2022-2024.
Outcome	Energiebesparing en hoger aandeel hernieuwbare energie bij minstens 202.000 woningen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het decreet voor de oprichting van het unieke loket voor de aanvraag en behandeling van premie-aanvragen werd een eerste keer principieel goedgekeurd in februari 2021 en na parlementaire behandeling bekrachtigd door de VR op 19 november 2021. Het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering werd definitief goedgekeurd op 4 februari 2022. De Mijn VerbouwPremie zal starten op 1 juli 2022. De premies zullen kunnen aangevraagd worden via het uniek loket vanaf 1 oktober 2022. Via besluiswijziging van de VR van 20 mei 2022 worden de premies voor dak, buitenmuur, ramen en deuren, vloer, binnenrenovatie en elektrische en sanitaire installaties voor de twee laagste inkomensgroepen verhoogd voor premie-aanvragen via de Mijn VerbouwPremie in 2022 en 2023. Ook de premies voor (hybride) warmtepompen en warmtepompboilers worden verhoogd voor investeringen met eindfacturen in 2022 en 2023. Ook de dakisolatiepremie wordt verdubbeld voor investeringen met eindfacturen in 2022 en 2023.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Fase 1 regelgevend traject: Definitieve goedkeuring decreet oprichting uniek loket door Vlaamse regering. Eerste principiële goedkeuring besluit Vlaamse regering. Definitieve goedkeuring besluit vergoedingen elektriciteitsdistributienetbeheerders	2021 Q3	Gerealiseerd	Definitieve goedkeuring VR decreet oprichting uniek loket op 9 juli 2021. Eerste principiële goedkeuring besluit VR uniek loket en definitieve goedkeuring besluit vergoedingen elektriciteitsdistributienetbeheerders op 9 juli 2021.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Fase 2 regelgevend traject. Bekrachtiging Vlaamse Regering decreet oprichting uniek loket. Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering besluit oprichting uniek loket en wijziging van het Energiebesluit en het Besluit Vlaamse Codex Wonen.	2022 Q1	Gerealiseerd	Decreet bekrachtigd 19 november 2021. Besluit goedgekeurd 4 februari 2022.
Go live uniek loket frontoffice en backoffice met basisfunctionaliteiten	2022 Q3	Op schema	Go live voorzien 1 oktober 2022.
Uitbreiding functionaliteiten uniek loket voor premieaanvragen	2023 Q2	Op schema	
Definitieve goedkeuring van de nieuwe regelgeving voor een hervorming van de energie- en woningrenovatiepremies (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning van 60.000 energiepremies voor investeringen uitgevoerd in 2022, resulterend in minstens 54.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)	2023 Q2	Nog niet gestart	
Toekenning van 80.000 energiepremies voor investeringen uitgevoerd in 2023, resulterend in 72.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)	2024 Q2	Nog niet gestart	
Toekenning van 80.000 premies voor energetische investeringen uitgevoerd in 2024, resulterend in 72.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)	2025 Q2	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
premie-aanvragen voor energiegerelateerde investeringen over periode 2022-2024	220000	2025 Q1		
aantal unieke woningen gerenoveerd	202 000	2025 Q2		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	180.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	180.000.000 EUR
Uitvoering VAK	180.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 180.000.000 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[ste principiële goedkeuring decreetwijziging op 5 februari 2021 - memorie](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van vergoedingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter financiering van openbare dienstverplichting en ter bevordering van het rationeel energiegebruik](#)

[Schematisch overzicht geïntegreerde premie. Bijlage](#)

[BIS Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Briefadvies Minaraad. Uniek loket renovatie-en energiepremie](#)

[Advies van de VREG van 3 augustus 2021](#)

[Advies SERV van 13 september 2021. Besluit woon-en energiepremies](#)

[Advies Vlaamse Toezichtcommissie van 20 juli 2021](#)

[Schematisch overzicht Mijn Verbouwpremie. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 4 februari 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Tabel. Bijlage](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Adviesaanvraag van de Raad van State. Adviesaanvraag 70.641/3over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Ongeveer 101.000 prosumenten verliezen in 2021 hun (virtuele) terugdraaiende teller gezien ze al over een digitale meter beschikken. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 heeft een onmiddellijke of uitgestelde impact op alle prosumenten die sinds 2006 een PV-installatie plaatsten. Naast een retroactieve investeringspremie voor de getroffen prosumenten, wordt een flankerend beleid voorgesteld om de impact op deze prosumenten te beperken. Omdat het aangewezen is dat eigenaars van decentrale productie-installaties hun onmiddellijk elektriciteitsverbruik verhogen of hun productie tijdelijk opslaan, wordt een toegenomen interesse verwacht bij dergelijke prosumenten om een thuisbatterij te plaatsen. De batterij kan immers het zelfverbruik en de flexibiliteit verhogen en aldus de investering in PV rendabeler maken. Daarom wordt voorzien in een hogere premie voor thuisbatterijen vanaf 1 april 2021.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	57.850.000 EUR
Output	Toekenning van minstens 35.351 premies voor thuisbatterijen
Outcome	Een flexibeler elektriciteitsverbruik: een verschuiving van de vraag naar elektriciteit wanneer de prijzen laag zijn en (hernieuwbare) energie overvloedig ter beschikking is, een hoger zelfverbruik van eigen geproduceerde elektriciteit bij prosumenten. Dit alles leidt tot minder congestie op het net en de mogelijkheid om meer hernieuwbare energie aan te sluiten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Op 9 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit definitief goed wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt. In dat wijzigingsbesluit werd ook de verhoogde batterijpremie geregeld.</p> <p>Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering om 37,8 miljoen euro relancemiddelen te verschuiven van projecten VV001-VV003 naar VV007.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Regelgeving voor premie thuisbatterij en sturing elektrische warmte definitief goedgekeurd (Vlaamse mijlpaal)	2021 Q3	Gerealiseerd	
Regelgeving voor premie thuisbatterij en sturing elektrische warmte definitief goedgekeurd (EU mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning van 8.460 premies aan huishoudens voor thuisbatterijen vanaf Q2 2021 met RRF middelen	2023 Q2	Gerealiseerd	
Toekenning van 9.500 bijkomende premies aan huishoudens voor thuisbatterijen in 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	In 2021 werden tussen 1 april 2021 en 31 december 2021 in totaal 18.058 premies thuisbatterij aangevraagd
Toekenning van 17391 premies aan huishoudens voor thuisbatterijen in 2022	2023 Q1	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal premies thuisbatterij toegekend sinds Q2-2021 met Vlaamse relancemiddelen	26.891	2023 Q1	4.652	17,3 %
Aantal verhoogde premies thuisbatterij toegekend sinds Q2-2021 met RRF middelen	8460	2023 Q2	8.460	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.050.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	57.850.000 EUR
Uitvoering VAK	25.832.000 EUR
Uitvoering VEK	25.832.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.050.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 37.800.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Definitieve goedkeuring op 09/07/2021 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010](#)

[Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen](#)

VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Volgens de langetermijn renovatiedoelstelling moeten alle bestaande woongebouwen uiterlijk in 2050 een vergelijkbaar energieprestatieniveau halen als nieuwbouwwoningen met vergunningsaanvraag in 2015. Deze langetermijndoelstelling betekent dat tegen 2050 het gemiddelde EPC-kengetal van het volledige woningenpark wordt verlaagd met 75%. Op de gehanteerde EPC-schalen met energielabels (A tot F), komt dit overeen met het label A (EPC-kengetal 100).

Op basis van data uit de EPC-databank wordt vastgesteld dat op dit moment ongeveer 3,5% van het bestaande woningenpark van bijna 3 miljoen woningen (huizen en appartementen) voldoet aan het streefdoel, terwijl 29% een F-label heeft. Er moeten dus nog 2,9 miljoen woningen evolueren naar de doelstelling 2050 (96,5% van het woningenbestand). Dat betekent dat, als de inspanningen uniform worden gespreid, de komende dertig jaar per jaar gemiddeld 3% van het woningenbestand of ruim 95.000 wooneenheden moeten evolueren naar de doelstelling 2050. Gebeurt de renovatie, zoals doorgaans het geval is, in fases, ligt de noodzakelijke renovatiegraad nog hoger.

Om dit te verwezenlijken legt de langetermijnrenovatiestrategie 2050 een sterk accent op grondige renovaties op natuurlijke opportuniteitsmomenten, zoals bijvoorbeeld bij transactiemomenten (verkoop, vererving), start van een nieuwe verhuring en sloop van de slechtste woningen gevolgd door vernieuwbouw. Maar ook buiten deze sleutelmomenten blijft het verhogen van de renovatiegraad en het stimuleren van diepgaande energetische renovaties een permanente noodzaak. Prioriteit gaat naar de slechtst presterende woningen.

Daarom werd vanaf 1 januari 2021 een EPC-labelpremie ingevoerd voor die investeerders in een woning of appartement met een zeer slecht EPC-label, die de woning renoveren tot minstens label C (appartement tot minstens label B). Het premiebedrag varieert in functie van het behaalde label na renovatie en kan in stappen worden verkregen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	25.350.000 EUR
Output	8400 aangevraagde premies over periode 2021-2022
Outcome	Energiebesparing van EPC-label E/F/D naar EPC-label C/B/A in 8400 woningen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Maatregel ingegaan vanaf 2021. Relancemiddelen voorzien voor renovaties in 2021 en 2022 (dus start-EPC's opgemaakt t.e.m. 2022). Op basis van een slecht EPC-voor en een goed EPC-na binnen de 5 jaar na start EPC, kan een premie worden aangevraagd bij de netbeheerder. Wie start met renoveren in 2021, heeft dus tijd t.e.m. 2026 om dat nieuwe EPC te laten opmaken en daarna nog 1 jaar tijd om de premie-aanvraag in te dienen. Bijgevolg kent dit project een trage opstart, wat echter niet representatief is voor het uiteindelijk succes en het uiteindelijk aantal grondig gerenoveerde woningen. Momenteel zijn 642 premies effectief uitbetaald (stand van zaken t.e.m. 30 april 2022, niet gevalideerd cijfer) en ca. 3405 start-EPC's ingediend (stand van zaken t.e.m. 30 april 2022). Dit is een onderschatting van het effectief aantal opgestarte werken in 2021-2022, gezien men ook kan wachten tot na de uitvoering van de werken om het start-EPC en nieuwe EPC samen in te dienen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
1600 gerenoveerde woningen met EPC-labelpremie	2022 Q1	Vertraging	Men heeft 5 jaar tijd na opmaak van start-EPC om de renovatiewerken af te ronden en daarna nog 1 jaar de tijd om premieaanvraag in te dienen. Renovatie en premieaanvragen realiseren zich trager dan initieel ingeschat.
Goedkeuring door Vlaamse Regering van de energielabelpremie (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd	
8400 woningen gerenoveerd met EPC-labelpremie (RRF-mijlpaal)	2023 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Uitbetaalde premies over periode 2021-2022	8400	2023 Q2	642	7,6 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	25.350.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	25.350.000 EUR
Uitvoering VAK	190.000 EUR
Uitvoering VEK	190.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 25.350.000 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds die beroep kunnen doen op deze subsidies voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Het voordeel dat hiermee wordt gecreëerd door een lagere energiefactuur komt ten goede van de sociale huurders.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met het oog op het behalen van de ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050, moet er volop worden ingezet op de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Zo werd door de Vlaamse Regering immers beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Naast grote inspanningen op de private woonmarkt, wordt ook van de sociale huisvestingssector een inhaalbeweging verwacht op dat vlak .</p> <p>Het doel van dit project is om aan de hand van de toekenning van VKF-premies aan sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaamse Woningfonds de energetische renovatie van sociale huurwoningen te stimuleren en te versnellen. Naast de opname van een gesubsidieerde lening bij de renovatie van sociale huurwoningen kunnen initiatiefnemers dan ook gebruik maken van deze subsidie wat voor hen voordeliger is. Op die manier worden initiatiefnemers gestimuleerd om projecten op te starten wat enerzijds een positieve impact zal hebben bij het heropstarten van de bouwsector na de coronamaatregelen en anderzijds zal resulteren in sociale woningen met een laag energieverbruik en bijgevolg een beperkte CO2-impact.</p> <p>Rekening houdend met het gegeven dat er geen subsidie toegekend kan worden voor de plaatsing van een gascondensatie ketel, gaan we uit van een gemiddelde subsidie van 6.734 euro per woning. Met een budget van 30 miljoen euro, afkomstig van het relanceplan 'Vlaamse Veerkacht', zullen op die manier ongeveer 4.455 woningen een energetische renovatie kunnen ondergaan.</p> <p>De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal instaan voor het beheer en de toekenning van deze subsidie aan de initiatiefnemers, zoals ze dat tot nu toe ook al heeft gedaan voor de middelen die vanuit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking werden gesteld voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Er kan dus verder gewerkt worden op een bestaande regeling die al is ingeschreven in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.48 tot en met artikel 5.55). Daarbij kan een initiatiefnemer afhankelijk van de energetische investeringen die worden gedaan in de sociale huurwoning zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een zonneboiler, condensatieketel, warmtepomp, zoldervloerisolatie, de na-isolatie van de bestaande spouwmuur,... een subsidie aanvragen bij de VMSW.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.000.000 EUR
Output	Aan een gemiddelde subsidie van 6.743 euro per woning, zal met een budget van 30 miljoen euro op die manier ongeveer 4.455 woningen een energetische renovatie kunnen ondergaan.
Outcome	Versnelde energetische renovatie van sociale huurwoningen met een daling van het energieverbruik als gevolg, wat op zijn beurt zal resulteren in een daling van de CO2-uitstoot.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project is momenteel in uitvoering. De VMSW heeft al een subsidie toegekend voor de energetische renovatie van 2.959 sociale huurwoningen. Verder was gepland dat de aanvraag voor de tweede herverdeling van de middelen zou gebeuren begin 2022. Dit zal nu iets later gebeuren dan voorzien, namelijk op 15 juli 2022.
Noodzakelijke politieke actie	/

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opmaak nota aan de Vlaamse regering met oog op herverdeling middelen.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opmaak toelagebesluit waarbij het eerste deel van de middelen vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking worden gesteld die instaat voor het beheer en de toekenning van de subsidie.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Tweede herverdeling waarbij de resterende middelen (15 mio euro in VAK en VEK) worden ter beschikking gesteld van het agentschap Wonen-Vlaanderen	2022 Q2	Op schema	
Opmaak toelagebesluit waarbij het tweede deel van de middelen vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking worden gesteld die instaat voor het beheer en de toekenning van de subsidie.	2022 Q3	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal sociale huurwoningen waarvoor een subsidie voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen werd toegekend	4455	2022 Q4	2.959	66,42 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	15.399.000 EUR
Uitvoering VEK	6.967.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 30.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Renovaties sociale woningen versnellen

VV010 - SOCIALE WONINGBOUW

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting - Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen dankzij de verhoogde leningsmachtiging meer leningen opnemen bij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), zodat er sneller bijkomende sociale woningen gebouwd en gerenoveerd kunnen worden. De uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium richt zich bij uitstek tot de meest kwetsbare groepen op de woningmarkt.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De vraag naar sociale huurwoningen in Vlaanderen is groter dan het aanbod. De huidige pandemie zorgt bovendien voor bijkomende uitdagingen op de woningmarkt, voornamelijk in het onderste segment van de huurmarkt.</p> <p>Daarnaast staan we voor ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050. Zo werd door de Vlaamse regering beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Om het patrimonium binnen de sociale huisvestingssector op dit niveau te brengen, moeten nog grote investeringen gebeuren.</p> <p>De doelstelling van dit project is om de sociale woningbouw en de renovatie van sociale woningen te versnellen door éénmalig in het begrotingsjaar 2021 de FS3-machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te verhogen met 250 miljoen euro. Hierdoor kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen goedkope leningen aangaan bij VMSW om hun bouw- en renovatieprojecten te financieren. De VMSW staat in voor het toekennen van deze leningen aan de initiatiefnemers volgens een regeling die is opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.38 tot en met 5.44).</p> <p>Voor de financiering van deze maatregelen zal de VMSW renteloze leningen opnemen bij het Vlaamse Gewest die zich op haar beurt zal financieren op de kapitaalmarkt. Het budget van 5 miljoen euro betreft een compensatie van de rentelasten waarmee Financiën & Begroting zal worden geconfronteerd gedurende een periode van 4 jaar (gerekend aan 0,5% rente).</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.000.000 EUR
Output	Uitgaande van een gemiddelde bouwkost kunnen dankzij de verhoogde FS3-machtiging van 250 miljoen euro ongeveer 1.300 sociale huurwoningen gebouwd worden. Een deel van het budget

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	kan ook naar renovatie gaan. Aangezien de omvang en de complexiteit van renovaties sterk kan variëren, is het niet direct mogelijk om daar op voorhand een exact aantal woningen op te kleven.
Outcome	Eenzijds zal dit leiden tot de bouw van bijkomende sociale huurwoningen wat een positief effect zal hebben op de kandidaat-huurders die momenteel op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Anderzijds zal dit ook voor een versnelling zorgen in de energetische renovatie van sociale huurwoningen met een daling van het energieverbruik als gevolg, wat op zijn beurt zal resulteren in een daling van de CO2-uitstoot.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Na de goedkeuring van dit project op de Vlaamse regering van 25 juni 2021 werd er voorlopig voor een totaal bedrag van 23.876.077 euro aan FS3-financiering toegewezen. Dit bedrag heeft betrekking op 929 nieuwe sociale huurwoningen die zullen worden gerealiseerd en 2.300 sociale huurwoningen die worden gerenoveerd.
Noodzakelijke politieke actie	/

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opmaak nota aan de Vlaamse Regering met oog op herverdeling van de middelen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2021	2022 Q3	Gerealiseerd	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2022	2022 Q3	Op schema	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2022	2022 Q4	Op schema	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2023	2023 Q3	Op schema	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2023	2023 Q4	Op schema	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2024	2024 Q3	Op schema	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2024	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
FS3-financiering die werd toegewezen voor de bouw en renovatie van sociale huurwoningen	250.000.000 euro	2022 Q4	23.876.077	9,55 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 5.000.000 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Sociale Woningbouw](#)

VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energiebedrijf
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Elke Vlaamse entiteit die onderworpen is aan de wetgeving overheidsopdrachten kan gebruik maken van het VEB als aankoopcentrale en/of als opdrachtcentrale. Vanuit haar opdracht concentreert het VEB zich prioritair op overheden in Vlaanderen en in het bijzonder deze die gevat worden door de wetgeving overheidsopdrachten. Met andere woorden: de Vlaamse overheid zelf en entiteiten die werkingsmiddelen, subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse overheid. De entiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit dit relanceplan zijn evenwel beperkt tot deze waarbij de Vlaamse Overheid ook de toezichhoudende entiteit is (institutionele sector 1312), en de aan de wetgeving overheidsopdrachten onderworpen onderwijs- en zorginstellingen in het Vlaams Gewest.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Verbeteren van energieprestatie Vlaamse Overheid door ondersteuning investeringen</p> <p>Voor de overheidsgebouwen wordt vanuit de voorbeeldrol van de overheid 2045 gesteld voor een CO₂-neutrale gebouwvoorraad. De uitdaging is om tegen 2045 geen emissies meer uit gas of stookolie te genereren in gebouwen en technische infrastructuur.</p> <p>De Vlaamse overheid wil haar verantwoordelijkheid opnemen in het behalen van de doelstellingen met behulp van het interne Klimaatplan van de Vlaamse overheid. Elke entiteit moet jaarlijks haar primair energieverbruik met 2,5% verminderen en hiertoe een meerjarenplan opnemen in hun ondernemingsplan (VR 2020 2905 0517/1BIS). Om deze klimaatdoelstellingen te halen, moeten onder andere investeringen gebeuren in een goed onderbouwde vastgoedstrategie en daaraan gekoppeld duurzaam meerjarenonderhoudsplan met implementatie van energiebesparende maatregelen.</p> <p>De projecten die worden weerhouden voor het toekennen van steun, moeten zorgen voor een versnelling van de klimaatinspanningen en moeten helpen om de economie te laten opveren. We opteren hierbij voor projecten die direct of indirect bijdragen tot het verduurzamen van het vastgoed van de Vlaamse overheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projecten die inzicht geven in de energie- en koolstofbesparingsmogelijkheden <p>Daarnaast worden ook maatregelen ondersteund die slechts indirect tot een energie- of koolstofbesparing leiden, maar wel essentieel zijn om tot een koolstofneutraal patrimonium te komen doordat ze leiden tot een kwantitatief en kwalitatief inzicht in besparingsmogelijkheden en verbruik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energiescans of -audits

PROJECTOMSCHRIJVING

- Projecten die leiden tot een directe energie- en koolstofbesparing

Dit zijn meestal projecten waarbij technische aanpassingen en/of gebouwschilmaatregelen worden geïmplementeerd (niet-limitatieve lijst):

- Relighting
- Verwarmen en koelen (HVAC), met bijzondere aandacht voor uitfasering van stookolie-installaties
- Isolatiemaatregelen (muur, dak, vloer)
- Schrijnwerk en beglazing
- Energieprestatiecontracten, zowel bij de facilitatie als bij de uitvoering
- Hernieuwbare energie (opwekking en opslag)

Er zal een procentuele steun toegekend worden op de weerhouden projecten, zodat de subsidie-efficiëntie gewaarborgd wordt. Het percentage steun dat zal worden toegekend, wordt bepaald overeenkomstig de (potentiële) impact van het project of maatregel, zijnde de energie- en CO2-besparing.

Er wordt geopteerd om met een vast steunpercentage te werken per type project of maatregel.

Energiescans of -audits: 20% - 25% (Vlaamse overheid)

EPC-facilitatie en uitvoering: 20% - 25% (Vlaamse overheid)

Groene Warmte: 30% - 37,5% (Vlaamse overheid)

Technische installaties: 30% - 37,5% (Vlaamse overheid)

Gebouwschil 40% - 50% (Vlaamse overheid)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	Kwantitatieve einddoelstelling: 261.428 m ² gerenoveerd vloeroppervlak
Outcome	Een beter inzicht in de energie- en koostofbesparingsmaatregelen en een verbetering van de energieprestaties van de Vlaamse Overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor 82 energie-efficiëntieprojecten ontvingen wij reeds ondertekende offertes. Ten belope van 5,3 miljoen euro werden reeds middelen aangevraagd bij de Vlaamse Regering. Voor 61 projecten werd effectief al een herverdeling van de middelen goedgekeurd (=3,753 miljoen euro). 88 projecten hebben momenteel een voorgelegde offerte gekregen. Indien deze allemaal goedgekeurd worden, dan is dat nog eens 3,3 miljoen euro steun dat kan aangevraagd worden. Momenteel werden reeds 566 aanvragen voor energie-efficiëntieprojecten gecapteerd bij VEB. Volgens onze prognoses op basis van historische slaagpercentages zal het lukken om de voorziene 20 miljoen euro hiermee volledig uit te besteden, indien er tijdig offertes kunnen aangeleverd worden langs aannemerszijde. Nieuwe binnenkomende aanvragen worden op een wachtlijst geplaatst.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Validatie operationeel kader voor toewijzing projecten	2021 Q1	Op schema	
Selectie van weerhouden projecten 2021 (46.764 m ² in deze periode)	2021 Q3	Vertraging	Er diende nog bekendheid te worden verworven. Dit werd ondervangen met enkele op maat gerichte webinars in Q1 van 2022 met 50-inschrijvingen voor de zorg en meer dan 180 inschrijvingen op een webinar gericht op het onderwijs.
Selectie van weerhouden projecten 2021 (70.146 m ² in deze periode, 116.910m ² cumulatief)	2021 Q4	Vertraging	Er diende nog bekendheid te worden verworven. Dit werd ondervangen met enkele op maat gerichte webinars in Q1 van 2022 met 50-inschrijvingen voor de zorg en meer dan 180 inschrijvingen op een webinar gericht op het onderwijs.
Selectie van weerhouden projecten 2022 (57.807 m ² in deze periode, 174.717 m ² cumulatief)	2022 Q2	Op schema	Er werden reeds voor 82 energie-efficiëntie projecten middelen aangevraagd bij de Vlaamse Regering. De uitgevoerde maatregelen beslaan een brutovloeroppervlakte van 200.868m ² . De wezenlijke goedkeuring vindt pas plaats op 3 juni van de laatste aanvraag en die bevat enkele grote oppervlakten. Vandaar dat de huidige outputindicator slechts 126746m ² betreft.
Selectie van weerhouden projecten 2022 (86.711 m ² in deze periode, 261.428 m ² cumulatief)	2022 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Verbeteren van energiestaat Vlaamse Overheid door selectie van projecten voor de renovatie van 261.428 m ² vloeroppervlak (Selectie = energie-efficiëntieprojecten waarvoor erbij de Vlaamse Regering middelen reeds herverdeeld zijn. Voor deze projecten werd reeds een offerte ondertekend bij een aannemer die intekende op het raamcontract van VEB)	261.428 m ²	2022 Q4	126.746	48 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	3.753.000 EUR
Uitvoering VEK	3.753.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Relance budget 11 – VEB energie-efficiëntie Vlaamse overheid

VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Woningeigenaars, sectoren en bedrijven actief in de bouwsector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Sloop en heropbouw is een belangrijke beleidsmaatregel om het verouderd patrimonium, dat vaak minder geschikt is voor een grondige energetische renovatie, versneld te laten slopen en te herbouwen, via een stimulerend beleid. Op die manier komt bebouwde ruimte versneld terug vrij, waarbij deze ruimte opnieuw wordt ingevuld met woongebouwen die aan de actuele energieprestatie-eisen voldoen.</p> <p>De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd ingevoerd vanaf 1 oktober 2018 en liep af op 31/12/2020. Deze premie van 7500 euro was bestemd voor de gebieden waar de 6% btw bij sloop- en heropbouw niet van toepassing was (= buiten de centrumsteden). Vanaf 1 januari 2021 werd de federale maatregel inzake 6% btw gedeeltelijk uitgebreid naar het volledige grondgebied, weliswaar beperkt tot de enige/eigen woning met een bewoonbare oppervlakte tot 200 m² en dit voor een periode van 2 jaar.</p> <p>De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd verlengd voor bouwaanvragen in 2021 en 2022, en is aanvullend bij de federale 6% btw bij sloop en heropbouw voor dezelfde periode. Deze Vlaamse sloop- en heropbouwpremie is enkel bestemd voor wie niet kan genieten van de uitbreiding van de federale maatregel.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	17.600.000 EUR
Output	1760 uitbetaalde sloop- en herbouwpremies
Outcome	Minstens 1760 bijna-energie neutrale nieuwbouwwoningen ter vervanging van energie-inefficiënte woningen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De verlenging van de sloop- en herbouwpremie werd goedgekeurd Q4-2020. De verhoogde premie kan aangevraagd worden voor omgevingsvergunningen aangevraagd

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Aanvraagprocedure sloop- en heropbouw operationeel	2021 Q1	Gerealiseerd		
300 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2021 Q2	Gerealiseerd		
600 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2021 Q4	Gerealiseerd		
Regelgevende aanpassingen: verlenging en verhoging Vlaamse sloop- en heropbouwpremie in 2021 en 2022 (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd		
900 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2022 Q2	Gerealiseerd		
1200 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2022 Q4	Op schema		
1400 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2023 Q2	Op schema		
1600 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2023 Q4	Op schema		
1760 sloop- en herbouwpremies uitbetaald (RRF mijlpaal)	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
uitbetaalde sloop- en herbouwpremies	1760	2024 Q4	969	55 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	17.600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	17.600.000 EUR
Uitvoering VAK	7.903.000 EUR
Uitvoering VEK	7.903.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 17.600.000 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

02. Fietsinfrastructuur

VV013 - DE INRICHTING VAN EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - De Werkvennootschap - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Lantis - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Weggebruikers, Vlaamse havens, lokale besturen en hun inwoners, bedrijven, Vlaamse havens

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Door voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden te voorzien worden zoveel mogelijk mensen gestimuleerd om de fiets te gebruiken, en ondersteunen we een fietsreflex zowel voor recreatieve als functionele verplaatsingen. Zo kunnen we van Vlaanderen een echte fietsregio maken, de modal shift realiseren en bij gevolg het aandeel duurzame transportmodi laten toenemen.

De investeringen die in het licht van deze doelstelling gedaan worden zijn:

- de nieuwe aanleg en het heraanleggen en het herstel van vrijliggende fietspaden,
- het herinrichten van kruispunten,
- uitrusten van knooppunten met fietsinfrastructuur (fietsenstallingen),
- het vervolledigen van fietssnelwegen,
- de aanleg en het herstel van jaagpaden,
- de verlichting van fietspaden en fietsoversteken,
- het realiseren en herstellen van fietsbruggen,
- het aanleggen van fietstunnels en - tunnels.

Alle voorbereidende onderdelen zoals studie, ontwerp en onteigeningen voor deze fietsprojecten worden hier ook op aangerekend.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	250.000.000 EUR
Output	Aanleg van 67km nieuw fietspad, Verbetering van 405km fietspad tegen 2026.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome Aantrekkelijk maken van de fiets als vervoersmiddel, daling gebruik van personenwagens.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus **In uitvoering na agendering VR**

Beschrijving voortgang

De diverse agentschappen zijn actief bezig met de uitvoering of voorbereiding van fietsinvesteringen. Deze investeringen bestaan uit de aanleg van nieuwe fietspaden, het herstel en verbeteren van bestaande fietspaden (bv. jaagpaden), het aanleggen van fietsersbruggen en-tunnels alsook de nodige investeringen in fietsenstallingen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft zo reeds 47,672km fietspad verbeterd. Op dit meetmoment zijn werken in uitvoering voor 5,2 nieuw en 104,97km verbeterd fietspad. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor nog 7,05km nieuw fietspad (waarvan 6,55km reeds vastgelegd) en 213,9km te verbeteren fietspad (waarvan reeds 68,21km vastgelegd). Er wordt naar gestreefd al deze projecten uiterlijk uit te voeren tegen medio 2026.

Lantis is sinds begin 2022 gestart met meerdere projecten voor 6,42km verbeterd en 11,31km nieuw aangelegd fietspad. Op dit moment is één project gerealiseerd (fietsverbinding Ter Borcht) en zijn meerdere projecten in uitvoering (o.a. verbetering van de fietspaden rondom de Groenendaallaan en de fietstunnel Turnhoutsebaan). Daarnaast zijn er ook nog 7 projecten voor het installeren van fietsenstallingen aan de Park & Rides en andere overstappunten (bv. snelbushaltes) in voorbereiding. Er zijn heel wat projecten waar een omgevingsvergunningsaanvraag lopende is en waar de eigenlijke aanleg van de fietsvoorzieningen start vanaf Q3 of Q4 2022.

De Vlaamse Waterweg nv draagt onder meer op basis van relancemiddelen bij aan het in goede staat brengen/houden van de jaagpaden en het optimaliseren van fietsverbindingen naar bedrijfsterreinen. Tot op heden is 26km fietspad verbeterd. De uitvoering van de verbeteringen aan 18km fietspad loopt, alsook de bouw van 2 fietsbruggen (Wielsbeke-Waregem & fietsbrug Menen). De budgetten zijn gereserveerd voor de bouw van werken aan een fietsbrug te Gent t.h.v. Eiland Zwijnaarde, de lokale verbeteringen ter hoogte van de sluisbrug Genk, de renovatie van voetgangersbrug over sluis 9 in Kortrijk, de fietsinfrastructuur t.h.v. het Moleneiland te Harelbeke, 20km te verbeteren en 8km nieuw fietspad. De uitvoering van deze projecten wordt op dit moment ingepland. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor nog 5km te verbeteren fietspad, alsook de studie/renovatie en bouw van diverse fietsersbruggen.

De Werkvennootschap zet in op enkele nieuwe fietssnelwegen, namelijk de F29 tussen Tervuren en Leuven en de F203 tussen Sterrebeek en Bertem. Over deze laatste loopt nog verdere afstemming met de lokale besturen. Ook langs de spoorlijn Oudenaarde – Maarkedal komt er met de F428 een nieuwe fietssnelweg. Deze projecten bevinden zich in de laatste rechte lijn naar omgevingsvergunning en aanbesteding. Samen goed voor meer dan 25 km. Verder is De Werkvennootschap ook gestart met de uitvoering van de fietspaden langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren en zet ze ook nog relancebudgetten in voor studiewerk voor vele andere fietsdossiers in de Vlaamse Rand en in Ronse.

Gecumuleerd betekent dit voor de geambieerde fietspadkilometers dat:

- de werken voor 74,032km verbeterd fietspad uitgevoerd zijn;
- de werken voor 132.16km verbeterd fietspad in uitvoering zijn;
- de werken voor 7,38km nieuw fietspad in uitvoering zijn;
- de werken voor 92,93km te verbeteren fietspad worden ingepland;

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<ul style="list-style-type: none"> • de werken voor 14,46km nieuw fietspad worden ingepland; • er nog voor 150,21km te verbeteren fietspad in voorbereiding is; • er nog voor 35,14km nieuw fietspad in voorbereiding is.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Fietsprojecten Agentschap Wegen en Verkeer	2024 Q4	Op schema	
Fietsprojecten De Werkvennootschap	2024 Q4	Op schema	
Fietsprojecten De Vlaamse Waterweg	2024 Q4	Op schema	
Fietsprojecten Lantis	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal kilometer nieuw fietspad	67	2026 Q2		
aantal kilometer verbeterd fietspad	405	2026 Q2	74,032	18,3 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	250.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	250.000.000 EUR
Uitvoering VAK	136.580.000 EUR
Uitvoering VEK	16.710.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 219.230.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 30.770.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV039 - Versnelling investeringen in veilige schoolroutes](#)

VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers - Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	De Vlaamse gemeenten, inwoners, weggebruikers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

We voorzien een enveloppe van 150 miljoen euro voor cofinanciering via trekkingsrechten per gemeente (op basis van het aantal inwoners). Elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor investeringen in fietsinfrastructuur versterken we met 1 euro. Zo wordt er in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten gerealiseerd. De subsidie kan gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook voor heraanleg of herinrichting van bestaande infrastructuur of het duurzaam en structureel onderhoud ervan. Ook de studie en ontwerp (wanneer resulterend in een effectief uitgevoerd project en niet gebeuren door eigen personeel), de aanleg van kunstwerken (bruggen, tunnels, etc.), en onteigeningen die een onderdeel vormen van de fietsinfrastructuur komen in aanmerking.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	150.000.000 EUR
Output	Gerestoreerde fietspaden en nieuwe fietspaden (aan gemeentewegen)
Outcome	Stijging van het aantal afgelegde fietskilometers

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	aanmeldingen komen binnen, maar volstaan niet om de beoogde doelstellingen te behalen Toelichting bij de realisatiegraad van de outputindicatoren: de maatregel wordt positief benaderd, lokaal dienen evenwel de middelen voorzien te worden binnen de meerjarenplanning. Lokale personeelscapaciteit speelt ook een rol. Tussentijdse evaluatie is lopende met het oog op mogelijke bijsturing en aanpassing van het kader. Verlenging van de vastleggingsperiode vormt een aanvullend element mho verhogen van de doelmatigheid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie	een bijsturing van het BVR is wenselijk om de scope van het project uit te breiden en de modaliteiten aan te passen
-------------------------------	---

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opmaak regelgeving	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lokale dossiers aangemeld voor nieuwe en vernieuwde fietsinfrastructuur	2022 Q4	Op schema	
Subsidies uitbetaald voor nieuwe fietspaden en vernieuwde fietsinfrastructuur	2025 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aangemelde projecten: aantal kilometers vernieuwd	946,1	2022 Q4	63,109	6,67 %
Aangemelde projecten: aantal kilometers nieuw	71,7	2022 Q4	122,708	171,14 %
Nieuwe fietsinfrastructuur aan gemeentewegen	71,7	2025 Q4		
Gerenoveerde fietspaden aan gemeentewegen	946,1	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	150.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	150.000.000 EUR
Uitvoering VAK	749.000 EUR
Uitvoering VEK	599.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 126.230.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 23.770.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs

VV015 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS (DIGISPRONG)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Leerlingen, personeelsleden en onderwijsinstellingen van het leerplichtonderwijs

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING

Vlaanderen wil de coronacrisis aangrijpen voor een duurzame digitale versnelling in het onderwijs. Dit doen we door te investeren in de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren en in ICT-toestellen voor gedeeld gebruik in elke kleuterklas en klas van het eerste tot en met vierde leerjaar in het lager onderwijs. Daarnaast voorzien we middelen voor het ter beschikking stellen van een eigen ICT-toestel voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs en de leerlingen van het secundair onderwijs.

Er wordt ook voorzien in de nodige omkadering voor scholen, onder meer met een sterker statuut voor de ICT-coördinator van de school, de uitbouw van digitale dienstverlening aan scholen en een kennis- en adviescentrum ten dienste van het werkveld. Er komen aangepaste ICT-opleidingen voor leerkrachten en ook in de lerarenopleidingen zal er meer ingezet worden op digitale competenties. Ook de leerkrachten voorzien we van ICT-materiaal.

Digisprong bevat ook verschillende acties om te voorzien in kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal en om creativiteit te stimuleren. De uitbouw van KlasCement als uniek platform voor educatief "open" lesmateriaal en de doorontwikkeling van het Archief voor Onderwijs ter verrijking van de leermiddelen met audiovisueel materiaal. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal in TSO en BSO. Tenslotte zetten we ook in op cybersecurity.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	375.000.000 EUR
Output	IT-infrastructuur in scholen die up to date is, beschikbaarheid van vormingsaanbod rond digitalisering, beter statuut voor ICT-coördinatoren, beschikbaarheid van een kennis- en adviescentrum digisprong.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome Digitale versnelling in het onderwijs realiseren

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus **In uitvoering na agendering VR**

Beschrijving voortgang

Het grootste deel van de voorziene middelen voor ICT-infrastructuur werd reeds in 2021 uitbetaald. Eind december 2021 werd nog een extra impuls van 85 miljoen euro gegeven om ook leraren te voorzien van het nodige ICT-materiaal. Met betrekking tot speerpunt 2 werden sinds 1 september 2021 de vernieuwingen op het vlak van het ambt van ICT-coördinator doorgevoerd. Er werd een jobprofiel voor ICT-coördinatoren opgemaakt en inmiddels loopt ook een ondersteuningsproject voor meer teamgerichte ICT-werking op schoolniveau. Er werd gestart met de ontwikkeling van een Single Sign On die de naam LeerID kreeg. Deze LeerID moet onderwijsprofessionals en leerlingen in staat stellen om éénmalig in te loggen, waarna automatisch toegang wordt verschaft tot allerlei digitale applicaties en leermiddelen. In 2022 werd een eerste versie getest in scholen en momenteel wordt de lancering verder voorbereid. Digitale leermiddelen werden ondersteund via extra subsidies. Bijkomende relancemiddelen werden voorzien om extra functionaliteiten in het "Archief voor Onderwijs" in te bouwen, alsook in het leermiddelenproject Smart Education @Schools om bestaande projecten te verduurzamen. Het Kenniscentrum Digisprong heeft verschillende taken in de uitrol van het actieplan Digisprong. Het Kenniscentrum biedt ondersteuning aan scholen in de vorm van concrete tips en stappenplannen onder meer op vlak van afstandslernen en digitale evaluaties op afstand. Er werden verschillende inspiratiegidsen en adviezen gepubliceerd over o.a. fiscale aspecten van de infrastructuursubsidies, digitale competenties van leerkrachten en een aankoopgids voor mobiele toestellen.

Daarnaast werd, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 april 2021, betreffende het opzetten van een Beheers- Controle en Auditsysteem bij de projecten ingediend in het kader van de Europese Faciliteit voor Veerkracht en Herstel, een beheers- en controlesysteem uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd.

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Speerpunt 1 Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur : monitoring van de middelen toegekend aan de instellingen	2024 Q1	Op schema	De 2de schijf voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de HBO5-opleiding Verpleegkunde is in voorbereiding (BVR). Deze 2de schijf zal rekening houden met de toestellen die de scholen eind 2020 al kregen als noodoplossing om het afstandsonderwijs mogelijk te maken Deze toestellen zullen verrekend worden in het bedrag dat aan de scholen nog uitbetaald wordt.
Speerpunt 2: Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT schoolbeleid, monitoring van de ICT-coördinatoren	2022 Q3	Op schema	De puntenenveloppe voor ICT-coördinatie werd met 22 miljoen euro verhoogd (basiseducatie krijgt ook voor het eerst ICT-middelen) en het ambt van ICT-coördinator en de mogelijkheid tot

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			vaste benoeming werd in het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en de academies voor deeltijds kunstonderwijs ingevoerd.
Speerpunt 3: ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen, monitoring van ICT-coördinatoren en rapportering over werking van het Kenniscentrum (zie speerpunt4)	2022 Q3	Op schema	Bijkomende relancemiddelen werden voorzien om extra functionaliteiten in het "Archief voor Onderwijs" in te bouwen, alsook in het leermiddelenproject Smart Education @Schools om bestaande projecten te verduurzamen.
Speerpunt 4: Een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld, een dienstencatalogus is beschikbaar	2022 Q3	Op schema	Volgende diensten (cfr dienstencatalogus) biedt het kenniscentrum aan (niet exhaustieve lijst) : <ul style="list-style-type: none"> • Verspreiden van kwaliteitsvolle informatie, inspiratiegidsen en adviezen mbt digitalisering in het onderwijs • Uitbesteden van wetenschappelijk onderzoek en delen van wetenschappelijke inzichten • Goede praktijken inventariseren en verspreiden • Ontwikkelen van adviezen en richtlijnen die scholen helpen bij het maken van relevante keuzes • Delen van (open) educatieve leermiddelen • Promoten van open standaarden • Innovatieprojecten opzetten in het domein van edtech
Speerpunt 4: Opstart van een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld	2021 Q4	Gerealiseerd	
Speerpunt 4 Een kennis- en adviescentrum Digisprong ten dienste van het onderwijs: rapportering over de werking	2024 Q2	Op schema	
Voor alle speerpunten: Resultaten van het MICTIVO-onderzoek zijn beschikbaar	2024 Q1	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	375.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	375.000.000 EUR
Uitvoering VAK	240.712.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK	5.378.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 318.160.000 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 56.840.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit aan de Vlaamse Regering van 11 december 2020 en Visienota Digisprong Van Achterstand naar Voorsprong ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde en nota aan de Vlaamse Regering](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 30 april 2021 en besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding verpleegkunde](#)

[Advies Raad van State bij dit besluit](#)

[Plan Vlaamse Veerkracht: Kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld en aangepaste digitale leermiddelen. 25/06/2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie en protocollen van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 24/06/2021 en Bijlage](#)

[BVR van 3/09/2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie](#)

[BVR van 3/09/2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie. Nota](#)

[BVR van 3/09/2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie. Advies Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 12 november 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan "Van kwetsbaar naar weerbaar" en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2 ,de centra voor deeltijds](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan "Van kwetsbaar naar weerbaar" en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging](#)

[Advies van de Raad van State. een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan 'Van kwetsbaar naar weerbaar' en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17juni1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging'](#)

04. Opleidings- en loopbaanoffensief

VV016 - ACTIVERING-VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80 PROCENT VESOC

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Raad van Bestuur VDAB, werkgevers, sectorfondsen, onderwijspartners (CVO's, Hoger Onderwijs), zorgsector, taalcoachingspartners, ATC, SERV

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We versterken de veerkracht van werknemers, ondernemingen en zelfstandige ondernemers en streven naar maximale en duurzame tewerkstelling. Vermits de arbeidsmarkt vandaag verschillende jobkansen biedt, is het van belang om snel te schakelen, om bestaande vacatures maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden.</p> <p>Dit vereist een VDAB die samen met partners klaarstaat om burgers te ondersteunen in het maken van loopbaankeuzes. Wie zijn werk verliest wordt begeleid naar een nieuwe job, maar evenzeer blijft VDAB inzetten op de activering van o.a. langdurig werkzoekenden, anders-actieven en inburgeraars. Het vereist ook ondernemingen die klaar staan om al deze mensen te ontvangen door breder te rekruteren, in te zetten op vorming en opleiding, op werkplekleren en op een inclusief ondernemingsklimaat.</p> <p>Mensen duurzaam aan het werk houden betekent ook meer dan ooit aandacht besteden aan de gevolgen van corona en de digitale transformatie op de werkvloer. Daarom zetten we in op werkbaar werk (en telewerken) in ondernemingen en organisaties. We versterken ondernemingen en organisaties, ook in de sociale economie, om de transitie te maken met aandacht voor werkbaarheid, wendbaarheid, welzijn en het menselijk potentieel in de organisatie. Via de oproep strategische transformatie en innovatie zullen ondernemingen in de sociale economie worden ondersteund in het conceptualiseren, ontwikkelen en uitrollen van strategische bedrijfstransformaties om optimaal en flexibel te kunnen reageren op marktrendensen en samen te werken met de reguliere economie.</p> <p>Tenslotte dragen we zorg voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: niet-beroepsactieven, personen met een migratieachtergrond, personen met een arbeidshandicap of gezondheidsproblemen, mensen met een psychosociale problematiek, ... We ondersteunen hen om hun loopbanen te versterken en werken drempels weg die zij op weg naar (betaald) werk ervaren.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	14.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Sociaal ondernemerschap: oproep innovatiesteun • Sociaal ondernemerschap: oproep opleidingen werknemers • Actieplan zij-instroom in de zorg • Uitbreiding transitiepremie voor werkzoekenden en wijziging van de premie voor ondernemers die de premie aanvragen
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het actieplan Zij-instroom in de Zorg werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van VDAB van 09/06/'21 en wordt uitgerold en geïmplementeerd.</p> <p>Belangrijk voor de zorg is dat de VIA6-akkoorden geland zijn. VDAB volgt de acties rond het verhogen van de zij-instroom verder op en legt de connectie met het bovenstaande actieplan. Voor zowel zorg als onderwijs werd de screening en inschatting van klanten geoptimaliseerd om hen het meest passende traject richting deze knelpuntsectoren/-beroepen aan te bieden. Sinds september 2021 wordt ook volop ingezet op meer (geïntegreerde) opleidingen en het bereiken van talent. Sinds 14/02/'22 is er een nieuw samenwerkingsakkoord tussen VDAB en Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) om de instroom in het onderwijs te verhogen. Mensen die al een diploma hoger onderwijs hebben, komen, na een beoordeling vanuit VDAB, ook in aanmerking om een OKOT-traject te volgen richting een knelpuntberoep o.a. in de zorg of het onderwijs.</p> <p>Wat de oproep 'innovatie en strategische transformatie' binnen de sociale economie en het sociaal ondernemerschap betreft, werden 66 van de 83 ingediende en ontvankelijke projecten eind 2021 definitief goedgekeurd en formeel gegund (62 maatwerkbedrijven, 1 maatwerkafdeling, 3 LDE-organisaties) –De projecten gingen van start in januari 2022. Momenteel zijn deze allemaal in uitvoering bij de specifieke lokale sociale economie ondernemingen.</p> <p>Er werd in het najaar van 2021 een gesloten oproep 'opleidingen binnen collectief maatwerk' gelanceerd op 18/10/'21 en formeel afgesloten op 17/11/'21. Vervolgens zijn beide opleidings- en vormingsprogramma's in collectief maatwerk (vormingsfonds beschutte werkplaatsen en vormingsfonds sociale werkplaatsen) officieel gestart op 1 januari 2022, met een totaalbereik van 123 maatwerkbedrijven. Het gaat hierbij om een drie jaar durend geïntegreerd totaal opleidings- en vormingsprogramma (een voor de beschutte werkplaatsen en een voor de sociale werkplaatsen).</p> <p>Van april 2021 tem. maart 2022 werd de aanvraag voor de transitiepremie goedgekeurd voor 285 -45 jarige ondernemers. Voor de +45 jarige ondernemers trad deze wijziging wat betreft het bedrag van de premie in vanaf 1 juni 2021. Sinds april 2021 werd de aanvraag voor 139 +45 jarige ondernemers goedgekeurd binnen de oorspronkelijke regeling en voor 97 +45 jarige ondernemers binnen de gewijzigde regeling.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sociaal ondernemerschap: opleidingen werknemers en innovatie-oproep	2021 Q4	Gerealiseerd	2 oproepen: Oproep 'innovatie en strategische transformatie' - projecten goedgekeurd en gegund eind 2021 (momenteel in uitvoering) Oproep 'opleidings- en vormingsprogramma' – projecten goedgekeurd en gegund eind 2021 (zullen 3 jaar duren)
Uitbreiding transitiepremie naar doelgroepen	2022 Q1	Gerealiseerd	
(Zij-)instroom in de zorgsector en het onderwijs: goedkeuring actieplan (VDAB)	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
<p>Het aantal ondernemingen dat in een van de volgende categorieën steun genoten heeft in het kader van een maatregel:</p> <p>i) kmo's die met een competentiecheck zijn bereikt;</p> <p>ii) ondernemingen in de sociale economie die ondersteuning in hun innovatieve strategische transformatie ondersteuning hebben gekregen via de "open innovatieoproep strategische investeringssteun" en het "toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie";</p> <p>iii) ondernemingen die een transitiepad aanvatten via de transitieproefopstellingen of transitiepunten (RRF)</p> <p>Categorieën i) en iii) worden opgenomen in project VV018</p> <p>Opgelet, de RRF-indicator wordt op een striktere manier berekend en pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.</p>	600	2024 Q4	66	11 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	14.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	14.000.000 EUR
Uitvoering VAK	12.963.000 EUR
Uitvoering VEK	6.708.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 12.000.000 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 2.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen - advies](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 1 oktober 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings- en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge COVID-19](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings- en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge COVID-19 – definitieve goedkeuring](#)

[Subsidieoproep 2021: open innovatie en strategische transformatie in de sociale economie. Bijlage](#)

[Advies SERV. Strategische investerings- en innovatiesteun aan sociale economie ondernemingen ingevolge COVID-19](#)

[Advies van de Raad van State. Een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings- en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge COVID-19'](#)

[Advies European Commission. Strategic investment and innovation support to social economy companies in the context of the COVID-19 outbreak](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19- nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19 – definitieve goedkeuring](#)

[Handleiding subsidieoproep 2021 : opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge Covid-19](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV017 - Extra aandacht meest kwetsbaren](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

[VV018 - Opleidingsoffensief arbeidsmarkt](#)

VV017 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Leerlingen en scholieren in het leerplichtonderwijs, studenten in het Hoger onderwijs, personeel in het onderwijs (leerplicht en HO), lerarenopleidingen, Centra Voor Leerlingenbegeleiding.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING

De visienota "van kwetsbaar naar weerbaar" – deel 1 "beter leren, beter voelen" Plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs" vormt het vierde luik van de onderwijsplannen in het kader van "Vlaamse veerkracht". Samen met de acties in de Digisprong, de Edusprong én het Voorsprongfonds wordt ervoor gezorgd dat de kwetsbare leerlingen mee deze sprong voorwaarts maken.

Dit plan maakt het volledige Vlaamse onderwijs in twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) toekomstbestendig voor alle leerlingen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren. Om dit te realiseren wordt onder meer ingezet op het terugdringen van de leerachterstand die ten gevolge van de crisis bij de meest kwetsbare leerlingen nog opgelopen is. Daarnaast zetten we in op de mentale gezondheid en het welbevinden van alle lerenden, want de voorbije periode bracht de nodige angst en onzekerheid met zich mee omdat voor velen hun veilige haven wegviel. Deze sprong voorwaarts is enkel mogelijk als de leraren, lerarenopleiders en schoolleiders ook ondersteund en versterkt worden. We weten immers dat sterke leraren en schoolleiders het verschil maken voor weerbare leerlingen.

Concreet vertalen we dit naar drie speerpunten:

1. Van achterstand naar voorsprong: aanpakken leerachterstand.
2. Bevorderen van het mentaal welzijn van leerlingen, scholieren en studenten
3. Versterking van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders

De mijlpalen verwijzen naar acties die gelinkt zijn aan de drie speerpunten.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	90.000.000 EUR
Output	Speerpunt 1: aanpakken leerachterstand door onder meer het organiseren van zomerscholen voor ongeveer 11.000 leerlingen en scholieren en het zorgen voor een ICT-versterking in het buitengewoon onderwijs (OV1 en OV2), het DBSO (arbeidsmarktgerichte finaliteit) en de Leertijd die kwetsbare leerlingen ten goede komt. Speerpunt 2: een integrale aanpak voorzien voor de verbetering van het mentaal welbevinden

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>van alle leerlingen via een investering in de CLB en het zorgen voor een digitaal platform voor een vlotte toegang tot de CLB, het oprichten van een digitale tool voor welbevinden van scholieren (te gebruiken door de scholen), het duurzaam verbeteren van studentenwelzijn door het uitrollen van een breed project in het Hoger Onderwijs</p> <p>Speerpunt 3: specifieke focus op het versterken van lerarenopleidingen via pilootprojecten en het professionaliseren van schoolleiders via specifieke trajecten</p>
Outcome	<p>Deze visienota wordt uitgerold met het oog op het versterken en veerkrachtiger maken van verschillende componenten uit het onderwijsveld (scholen, CLB, ICT-infrastructuur, mentale weerbaarheid,...) en van diverse doelgroepen (studenten, lerarenopleiders, leraren, schoolteams, leerlingen,...)</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De acties die vallen onder de globale visienota 'van kwetsbaar naar wendbaar' (VV017) worden geclusterd in drie speerpunten. Onder speerpunt 1 (terugdringen van de leerachterstand) kunnen de zomerscholen geplaatst worden. In het najaar van 2021 werd een decreet voor de organisatie van de zomerscholen voorbereid dat gestemd zal worden nog voor de zomer van 2022. Op die manier kunnen de zomerscholen jaarlijks plaatsvinden, telkens volgens dezelfde modaliteiten hetgeen de organisatoren (lokale besturen en scholen) meer zekerheid biedt. De oproep voor zomerscholen 2022 werd op 1/4/2022 goedgekeurd en gepubliceerd. De voorbije maanden kwam het actieplan Virtual en Extended Reality (XR) in een stroomversnelling. Dit actieplan bevat 5 deelacties die als mijlpalen werden opgenomen. Wat betreft mentale gezondheid en welbevinden van alle lerenden (speerpunt 2) werd het dossier voorbereid voor de digitale tool die het welbevinden van leerlingen in kaart zal brengen. (voorbereidende fase). Ook met betrekking tot het vierde luik (duurzame versterking van de hogeronderwijsinstellingen) van het beleid rond mentaal welzijn van studenten zijn er voorbereidende stappen gezet.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Concretisering onder speerpunt 2 (bevorderen mentaal welzijn van studenten) Addendum SIHO in verband met studentenwelzijn	2021 Q4	Gerealiseerd	
Tussentijds rapport professionaliseringsprojecten. Concretisering onder speerpunt 3 (versterken van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders) = Professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs, in het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'	2022 Q2	Op schema	
Eindrapport professionaliseringsprojecten. Concretisering onder speerpunt 3 (versterken van	2023 Q3	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
leraren, lerarenopleiders en schoolleiders) = Professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs, in het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'			
Concretisering onder speerpunt 3 = Uitvoering van 12 pilootprojecten ter versterking van de lerarenopleidingen, in nauwe relatie met actoren die instaan voor het verdere professionele continuüm van de leraar voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023	2023 Q3	Op schema	
Concretisering speerpunt 1 = Toekennen van extra ICT-middelen (2021) voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (SYNTRA)	2024 Q1	Op schema	
Concretisering speerpunt 2= Versterking van de CLB's ter ondersteuning van scholen en leerlingen	2023 Q3	Op schema	
Concretisering speerpunt 2= Ter beschikking stellen van een digitale tool die het mogelijk moet maken dat schoolbesturen efficiënt kunnen rapporteren over de aanwending van gekleurde middelen	2023 Q4	Op schema	Dossier werd opgestart
Concretisering onder speerpunt 1 (wegwerken leerachterstand) Administratieve en financiële afhandeling van de Vlaamse zomerscholen die in de zomer van 2021 werden georganiseerd door lokale besturen en scholen om de leerachterstand weg te werken en een goede start van het schooljaar te bewerkstelligen.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Organisatie zomerscholen 2022	2022 Q3	Op schema	Ook in 2022 worden er zomerscholen georganiseerd voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren met een zinvol onderwijs- en vrijetijdsgedeelte. Er is ook een decreet zomerscholen voorbereid dat nog voor de zomer zal gestemd worden.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
ACTIEPLAN XR: Onderzoek XR. Dit is een concretisering van speerpunt 1 (leerachterstand wegwerken, 1.3.3. Virtual Reality in TSO en BSO).	2022 Q4	Op schema	Binnen dit actieplan XR zijn er 5 deelprojecten, die hier als 5 mijlpalen worden aangeduid. De oproep voor het onderzoek wordt momenteel voorbereid en gegund in het najaar 2022.
ACTIEPLAN XR: Uitleendienst XR-materiaal. (concretisering speerpunt 1, 1.3.3. Virtual Reality). Eerste nota hiervoor goedgekeurd VR 1/4/2022	2023 Q3	Op schema	Het opzetten van een uitleendienst met XR-materiaal en software voor alle Vlaamse VET-scholen door de Regionale Technologische Centra.
ACTIEPLAN XR: Opzetten XR Academy (concretisering speerpunt 1. wegwerken leerachterstand. Virtual Reality in TSO en BSO)	2022 Q3	Op schema	Nascholing van onderwijzend personeel dat gebruik wil maken van het materiaal van de uitleendienst.
ACTIEPLAN XR: Lerend netwerk XR (concretisering speerpunt 1. wegwerken leerachterstand. 1.3.3. Virtual Reality in TSO en BSO). nota goedgekeurd VR 1/4/2022	2024 Q4	Op schema	Het verlenen van advies aan de RTC door Thomas More. Het opzetten van een Lerend Netwerk XR met 1-1 begeleiding van 25 scholen en workshops aan 100 scholen.
ACTIEPLAN XR: Innovet XR (concretisering speerpunt 1. wegwerken leerachterstand. 1.3.3. Virtual Reality in TSO en BSO). oproep goedgekeurd door VR 22/4/2022, oproep verschenen 25/04/2022	2023 Q4	Op schema	Opzetten van projecten tussen VET-scholen en partners om te komen tot XR-methodieken en -materiaal die vrij in Vlaanderen gebruikt kunnen worden.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal leerlingen die aan gerealiseerde zomerscholen deelnemen	11.000	2021 Q4	7.720	70 %
Aantal leerlingen dat deelneemt aan de zomerschool 2022	11000	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	90.000.000 EUR
Uitvoering VAK	16.952.000 EUR
Uitvoering VEK	4.647.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 90.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 4 december 2020 - goedkeuring addendum \(tbv 801 KEUR\) aan het convenant met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs \(SIHO\) ivm mentaal welzijn studenten](#)

[Mededeling aan de Vlaamse Regering 15 januari 2021. Projectoproep voor de subsidiëring van projecten ter verbetering van schoolleiderschap](#)

[Mededeling aan de Vlaamse Regering 29 januari 2021. Pilotprojecten lerarenopleiding en Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Visienota Van kwetsbaar naar weerbaar—deel 1 beter leren, beter voelen: plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het relanceplan Vlaamse veerkracht en bijlage BIS](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021](#) tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging en [bijhorend besluit](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 september 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging](#)

[VR 2021 1709 VV DOC.0140/3. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 11 februari 2022. Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen](#)

[Voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen. Samenvatting](#)

[Advies van de VLOR over het voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 1 april 2022. Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen](#)

[Ontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen](#)

[Ontwerp van decreet betreffende de organisaties van zomerscholen. Samenvatting](#)

[Advies van de Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 22 april 2022. Oproepen InnoVET XR 2022-2024 in uitvoering van het XR-actieplan](#)

[Projectoproep INNOVETXR. Handleiding en richtlijnen. Bijlage](#)

[Indienen van een projectvoorstel in het kader van InnoVETXR – deeloproep 1InnoVET NEW. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3 juni 2022. Oproep XR Academy 2022-2024 en algemene opvolging in uitvoering van het XR-actieplan](#)

[Projectoproep XR Academy. Handleiding en richtlijnen. Bijlage](#)

[Indienen van een projectvoorstel in het kader van XR Academy–2022-2024](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

VV018 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Vlaams Partnerschap Duaal Leren, SERV, VLOR, Klankbordgroep sectoren, RvB VDAB, UNIZO/VOKA, transitiepunten, Federgon, Werkplekarchitecten, begeleidingspartners, sectorfondsen, private NT2 opleidingspartners, AGII, sociale partners, Vlaams Partnerschap Levenslang Leren

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Om zowel werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen als ondernemingen en zelfstandig ondernemers meer wendbaar en beter inzetbaar te maken, zetten we versneld in op de omslag naar levenslang leren. We zien de coronacrisis als een opportuniteit voor meer structurele heroriëntering en om een doorbraak te realiseren in het leren tijdens de loopbaan.</p> <p>We nemen initiatieven om competenties op peil te houden en om nieuwe competenties te verwerven. We faciliteren transitie over sectoren en ondernemingen heen. We maken de competenties van werknemers zichtbaar en zorgen ervoor dat ze zich kunnen her- of bijscholen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen.</p> <p>We streven daarbij ook naar een arbeidsmarkt waarin vlottere werk naar werk transitie en meer arbeidsmobiliteit binnen een onderneming, tussen ondernemingen en tussen sectoren mogelijk worden.</p> <p>We doen dit alles vanuit een lange termijnvisie op levenslang leren en binnen een breed partnerschap met onderwijs- en opleidingsverstrekkers gaande van CVO's, CBE's, hogescholen, universiteiten, VDAB, Syntra's, sectoren tot private opleidingsverstrekkers en ondernemingen, ...</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	122.000.000 EUR
Output	<p>Arbeidsmarktgerichte digitale cursussen met een focus op technische en/of soft skills.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het contacteren door VDAB van alle personen die sinds 1 januari 2021 tijdelijk werkloos zijn, met een aanbod voor opleiding, stage, vrijwilligerswerk. • Uitwerken competentiecheck, open innovatieoproep strategische investeringssteun, toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie, uitwerken van transitiepaden en transitiepunten.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)
---------	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus **in uitvoering na agendering VR**

Beschrijving voortgang	<p>De actie rond de eenmalige verruiming en verhoging van de stagebonus werd gerealiseerd: Het definitief resultaat voor de aanvullende stagebonus schooljaar 2020-2021 is dat er finaal 3.308 aanvullende stagebonussen betaald werden, goed voor 3.308.000 euro. De maatregel werd intussen verlengd tot en met schooljaar 2022-2023.</p> <p>Het online (ruim en toegankelijk) opleidingsaanbod van VDAB blijft populair. In 2021 telde VDAB 264.492 inschrijvingen voor online opleidingen (stijging tov 2020). In de eerste 3 maanden van 2022 (jan - maart) telde VDAB 59.075 inschrijvingen voor online opleidingen (daling tov 2021). Op vlak van face-to-face opleidingen werd vooral geïnvesteerd in oriënterende trajecten en werd een nieuwe tender rijbewijs B opgestart, waarbij 1500 trajecten worden voorzien (looptijd van september 2021 tot eind 2023). In 2022 wordt verder geïnvesteerd in oriënterende tools en het mobiele aanbod van VDAB.</p> <p>VDAB werkte een plan van aanpak uit om een passend aanbod (gericht en breed) te communiceren naar alle tijdelijk werklozen. Hoe intensiever de tijdelijke werkloosheid, hoe intensiever en persoonlijker het aanbod van VDAB. Sinds oktober 2021 stapte VDAB af van deze gelaagde aanpak. Er wordt sindsdien een communicatie verstuurd naar alle tijdelijk werklozen, bestaande uit een reeks e-mails die gepersonaliseerd worden o.b.v. de interesse die de tijdelijk werkloze toont. Voor tijdelijk werklozen die zich bij VDAB inschrijven (dit is niet verplicht) doet VDAB bovendien een dienstverleningsaanbod BWRW (begeleiding werknemers met recente werkervaring). Belangrijk is ook dat het volledige opleidingsaanbod van VDAB en partners nog steeds kosteloos is opengesteld voor alle tijdelijk werklozen.</p> <p>Sinds begin 2021 werden 99% van de tijdelijk werklozen bereikt via mailcommunicatie van VDAB. Daarnaast werden tussen de start van de coronacrisis (maart 2020) en eind april 2022 5,9% van de tijdelijk werklozen bereikt met een vorm van competentieversterking. Voor de intensief tijdelijk werklozen (minstens 10 dagen tijdelijk werkloos in de laatste 3 maanden) bedroeg dit aandeel 9,7%. Beide percentages stijgen enigszins. Tot slot bleek uit een bevraging in 2021 o.a. dat 42% van de intensief tijdelijk werklozen een opleiding, vrijwilligerswerk of tijdelijke andere job deed tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.</p> <p>Het tijdelijk gezamenlijk besluitrecht VOV is lopende. Op 17/5/22 zijn 21.555 terugbetalingsaanvragen voor een opleiding op voorstel van de werkgever goedgekeurd. Objectief is 7.500 werknemers meer dan in schooljaar 20-21.</p> <p>Het project rond de competentiechecks, -coaching, en -versterking voor werkenden is gestart:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C1: Competentiechecks voor werkenden: Hier is het plan van aanpak en concept afgestemd met de sociale partners op 24/02/'22. Een interne projectgroep (DWSE + VDAB) coördineert de opmaak van de overheidsopdracht. We zetten in op een piste die vertrekt vanuit beschikbare digitale tools en een gratis adviesgesprek. Het bestek van de overheidsopdracht, de nota aan IF en de nota aan de VR zitten in een feedbackronde en worden de komende maand(en) verstuurd. Daarnaast is de digitale competentiecheck volop in ontwikkeling. De oplevering wordt eind 2022 verwacht (lancering). Tot slot zullen de adviesgesprekken van start gaan in januari 2023.
------------------------	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- C2: Competentiechecks ondernemingen: De overheidsopdracht en de aanstelling van een tijdelijke projectcoördinator werden goedgekeurd door VR op 22/04/2022. De eerste fase van de overheidsopdracht (MPMO) werd gelanceerd waarbij er wordt opgeroepen voor kandidaten en die, obv selectiecriteria, zullen aangeduid worden om in een tweede fase een offerte in te dienen. De deadline voor kandidaatstelling voor de eerste fase is 3 juni 2022. Tijdens deze periode wordt ook het bestek voor de tweede fase voorbereid. De intentie is om minimaal 500 KMO's met de competentiecheck voor ondernemingen te bereiken.

- C3: Transitie naar werk: Sinds april 2021 werken we via het project CareerFlow aan negen concrete bedrijfscases, met als doel om via een proactieve benadering interne en externe mobiliteit tussen werkgevers te stimuleren. Hierbij zijn reeds 21 bedrijven betrokken. De inzichten en ervaringen uit deze experimentele cases nemen we mee naar de brede oproep voor transitiepunten die op dit moment wordt voorbereid. Transitie van werknemers zullen gefaciliteerd worden vanuit (inter)sectorale of regionale transitiepunten die zich bevinden in lokale 'ecosystemen' (bv. luchthaven, KMO-terrein,...) en zullen zich richten op transitie over ondernemingen en sectoren heen.

De actie rond de versterking van werkpleklers is lopende. Sinds begin 2021 telt individuele beroepsopleiding (IBO) mee als een positief uitstroomresultaat waardoor de drempel verlaagd wordt voor partners om in te zetten op deze vorm van werkpleklers. Verder werd een communicatiecampagne gelanceerd gericht op de bekendmaking van IBO bij werkgevers. Daarnaast operationaliseren we in 2022 de werkvorm 'GLOW' (groeien en leren op de werkvloer) . Deze nieuwe vorm komt in de plaats en zal de sterktes combineren van de begeleidingsvormen TWE (traject tijdelijke werkervaring) en GOB (gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst). De opstart van deze werkvorm is voorzien in 2023.

De uitrol van de tenders ter versterking van de begeleidingscapaciteit is gerealiseerd. De uitrol is gefaseerd opgestart sinds begin 2021 : TIBB4, SIF en TAL die al enkele jaren liepen zijn sinds begin 2021 uitgebreid en BWRW (begeleiding werknemers met recente werkervaring) en het voucherproject zijn sinds maart 2021 effectief gestart. De nieuwe tender IB+ (integrale begeleiding plus) is opgestart in december 2021.

De acties ikv het talenplan, die de uitstroom naar werk van anderstalige klanten moeten bevorderen, zijn in uitvoering. Ze worden beschreven in het actieplan "Vijf voor Taal". De periodieke monitoring van het actieplan is momenteel in de maak. Het aanbod werd in 2022 ook verder bekend gemaakt ten aanzien van sectoren en werkgevers. In het kader van het vacaturegericht opleiden gaat VDAB ook verder met de piloten onder de noemer 'taal en tewerkstelling'.

De goedgekeurde projecten (31 ondernemingen) ikv de oproep 'Telewerken – digitale vaardigheden' zijn van start gegaan op 01/09/'21 en eindigen op 30/11/'22. Op uitdrukkelijke aanvraag en mits motivering van de promotor kan men omwille van corona een verlenging bekomen van 3 maanden. In de loop van april 2022 kon men onder voorwaarden nieuwe opleidingen toevoegen aan het opleidingsplan, dit om tegemoet te komen aan gewijzigde opleidingsnoden binnen de organisatie.

De beslissing om de alle uitgaven ikv RRF eind dit jaar vast te leggen is mogelijk problematisch voor dit project (specifiek voor de transitiepunten). Te bekijken via de begrotingsruiter die hiervoor werd opgezet.

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Naar duurzaam telewerken - digitale vaardigheden: De projecten zijn gelanceerd.	2021 Q2	Gerealiseerd		
Versterking begeleidingscapaciteit: De nieuwe begeleidingstenders BWRW (begeleiding voor werknemers met recente werkervaring) en IB+ (Integrale Begeleiding Plus) zijn operationeel. (VDAB)	2021 Q4	Gerealiseerd		
Talenplan: Het Talenplan werd uitgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VDAB. (VDAB)	2021 Q4	Gerealiseerd		
Enmalige verruiming en verhoging van de stagebonus: Alle vergoedingen zijn betaald.	2022 Q1	Gerealiseerd		
Gericht en breed opleidingsaanbod voor tijdelijk werklozen: Een communicatie-aanpak naar tijdelijk werklozen werd uitgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VDAB. (VDAB)	2022 Q4	Gerealiseerd		
Competentiechecks voor werkenden (C1): De overheidsopdracht is gegund.	2022 Q4	Op schema		
Competentiechecks voor ondernemingen (C2): De overheidsopdracht is gegund.	2022 Q4	Op schema		
Transities naar werk (C3): De overheidsopdracht transitiepunten is gelanceerd.	2022 Q4	Op schema		
Ruim en toegankelijk opleidingsaanbod: We realiseren een stijging in het aantal inschrijvingen voor online opleidingen. (VDAB)	2022 Q4	Op schema		
Versterking werkpleklers: De nieuwe werkplekleervorm GLOW (Groeien en Leren op de Werkvloer) is operationeel. (VDAB)	2023 Q1	Op schema		
Tijdelijk gezamenlijk besluitrecht VOV: Alle vergoedingen zijn betaald.	2023 Q2	Op schema		
Steun voor opleidingsverlof en onlineopleidingsaanbod in Vlaanderen (RRF)	2022 Q4	Op schema		
Ondersteuning van tijdelijk werklozen in Vlaanderen (RRF)	2022 Q4	Gerealiseerd		
Steun aan ondernemingen in Vlaanderen via competentiechecks, transitiepunten en oproepen tot het indienen van projecten (RRF)	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uitbetaalde aanvullende stagebonussen	6000	2021 Q4	3.308	55 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aandeel tijdelijk werklozen dat ingaat op opleidingsaanbod VDAB (in procent)	Stijging tov. maart 2020 tem. februari 2021 (3,4%)	2021 Q4	5,9	100 %
Het aantal personen dat sinds 2021 gebruik gemaakt heeft van hun recht op opleidingsverlof of hebben zich ingeschreven voor een onlineopleidingsaanbod, inclusief arbeidsmarktgerichte digitale cursussen met een focus op technische en/of soft skills. (RRF) Opgelet, de RRF-indicator wordt op een striktere manier berekend en pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.	307.500	2022 Q4	343.567	100 %
Alle personen die sinds 1 januari 2021 tijdelijk werkloos zijn, worden door VDAB gecontacteerd met een aanbod (opleiding, stage, vrijwilligerswerk). (RRF)	100%	2022 Q4	99	99 %
Aantal nieuw opgestarte trajecten in de nieuwe begeleidingstender IB+	3930	2022 Q4	640	35,24 %
Het aantal ondernemingen dat in een van de volgende categorieën steun heeft genoten in het kader van de maatregel: i) kmo's die met een competentiecheck zijn bereikt; ii) ondernemingen in de sociale economie die ondersteuning in hun innovatieve strategische transformatie ondersteuning hebben gekregen via de "open innovatieoproep strategische investeringssteun" en het "toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie"; iii) ondernemingen die een transitiepad aanvatten via de transitieproefopstellingen of transitiepunten. (RRF) Categorie ii) wordt opgenomen in project VV016. Opgelet, de RRF-indicator wordt op een striktere manier berekend en pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.	600	2024 Q4	66	11 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	122.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	122.000.000 EUR
Uitvoering VAK	13.202.000 EUR
Uitvoering VEK	13.202.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 63.100.000 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 57.000.000 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 1.900.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering - tijdelijk experiment gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams opleidingsverlof - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering - tijdelijk experiment gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams opleidingsverlof - BVR](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020 -2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020-2021](#)

[Nota VR 09/07 : Alle Hens aan Dek - Acties VDAB binnen de prioriteit 'opleiding- en loopbaanoffensief.](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 11 maart 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Advies van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Advies van de VLOR over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor 2021-2022 en 2022-2023](#)

[Advies van de SERV over de verruimde stagebonus schooljaren 2021-2022 en 2022-2023](#)

[Advies van de Raad van State van 25 februari 2022](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

[VV016 - Activering-verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC](#)

VV019 - VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen - Departement Onderwijs en Vorming
Belanghebbenden	Cursisten, personeelsleden en onderwijsinstellingen van het volwassenenonderwijs

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING

Het Vlaams volwassenenonderwijs is een belangrijke partner voor een samenleving die opstaat uit de crisis. De centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie zijn een sterke schakel binnen een breder veld van vorming, opleiding, werk en sociale ontplooiing. Voor de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs wordt 2021 “Het Jaar van de Opleiding”. Er wordt een groot offensief gelanceerd op vlak van opleiding, zowel voor werkzoekenden, als voor tijdelijk werklozen, als voor inactieven, als voor mensen die een job hebben maar zich wensen (of genoodzaakt zien) te heroriënteren. De ambitie van dit plan om mensen zo snel mogelijk in staat te stellen om toekomstige jobkansen te grijpen, past volledig binnen de ambities van het project Versterken Levenslang Blijven Leren dat zich echter ook tot andere doelgroepen dan de werkenden en werkzoekenden richt.

Het project Versterken Levenslang Blijven Leren wil het volwassenenonderwijs een boost geven om meer dan ooit de speler te worden die de sociale mobiliteit van mensen faciliteert, via omscholing, bijscholing en kwalificering. We mikken daarom op een grotere naamsbekendheid, een toeleiding bij het grote publiek en een sterke verankering in de regionale context. Een vernieuwing en optimalisatie van het studieaanbod en de daaraan gekoppelde leermethodes moeten het volwassenenonderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte focus en een 21ste eeuwse karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en duurzame verankering staan hierin voorop. Een versterking van de noodzakelijke digitale infrastructuur en methodiek moeten bijdragen tot het maximaal realiseren van de beoogde doelstellingen.

Om deze ambitie waar te maken richten we ons op vier inhoudelijke speerpunten waaraan 13 actielijnen worden gekoppeld. De vier speerpunten zijn (1) het volwassenenonderwijs vervult een belangrijke rol in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren, (2) het versterken van arbeidsmarktgerichte kansen via om- en bijscholen, (3) de versterking van digitale competenties en (4) het gericht inzetten op kwalificatie.

Het volwassenenonderwijs wil een belangrijke rol vervullen in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren. Om deze ambitie waar te maken ontwikkelen we een opleidingskompas en voorzien we in een wervende Vlaanderenbrede en gefaseerde promotiecampagne. Aanvullend wordt een lokale doeltreffende informatieverstrekking met aandacht voor kansengroepen in samenwerking met lokale partners en bestaande initiatieven opgezet.

Dit project heeft de ambitie om het aanbod in het volwassenenonderwijs te versterken op het vlak van duurzame arbeidsmarktgerichte kwalificatiemogelijkheden. Het volwassenenonderwijs zal actiever kunnen inspelen op lokale arbeidsmarktbehoefte door het versneld ontwikkelen van toekomstgerichte curricula en infrastructuur, een doorgedreven EVC-beleid, het verruimen van flexibele opleidingsmogelijkheden zoals een vakantieaanbod en het inzetten op geïntegreerde trajecten. Daarnaast worden verschillende vormen van hybride leren ontwikkeld in functie van een flexibel en gedifferentieerd aanbod.

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het speerpunt 'Versterking van digitale competenties' richt dit project zich niet enkel tot een maatgericht aanbod voor het versterken van de algemene digitale geletterdheid maar is er ook expliciet aandacht voor opleidingen voor mensen die plaats- en tijdsafhankelijk werken en het gericht ontwikkelen van hun digitale vaardigheden.

Het behalen van een diploma secundair onderwijs of een duurzame beroepskwalificatie biedt jongeren ook een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Binnen dit project zetten we daarom in op het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom via een outreachende aanpak in samenwerking met partnerorganisaties (o.a.VDAB, Actiris, ...), een aanklampende cursistenbegeleiding tijdens het traject en een doorgedreven samenwerking met de examencommissie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	60.000.000 EUR
Output	Minstens 20 centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) hebben een project uitgevoerd in het kader van Edusprong
Outcome	De visienota Edusprong wordt geoperationaliseerd met het oog op het stimuleren van levenslang leren, het versterken van arbeidsmarktkansen via om- en bijscholen, het versterken van de digitale competenties van Vlamingen en het gericht inzetten op kwalificatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op 1 februari 2022 werden de resultaten van de regioscan via 11 rapporten meegedeeld aan het Departement Onderwijs en Vorming. Deze resultaten werden gebundeld in een generieke samenvatting. De coördinatie van de regioscan werd opgenomen via een tijdelijke detachering, die ook mee ingeschakeld wordt voor andere relance-projecten. In het kader van het relanceplan Edusprong werd ondertussen ook een tweede projectoproep gelanceerd die 20 miljoen verdeelde onder de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs. In de nota aan de Vlaamse Regering van 18 februari 2022 werd het kader uitgewerkt voor de projectoproep waarbij de centra de kans kregen een projectplan in te dienen voor een vooraf bepaald trekkingsrecht. Alle 46 cbe en cvo dienden een projectplan in. Een jury beoordeelt de projectplannen volgens de vastgelegde criteria in twee fases. De eerste fase van beoordeling heeft ondertussen plaatsgevonden. Naast de verdeling van middelen aan de cbe en cvo via projectoproepen worden ook een aantal Edusprong-acties centraal gecoördineerd. Op 22 april 2022 gaf de Vlaamse Regering goedkeuring aan een subsidiebesluit om middelen toe te kennen aan de cvo met het oog op het aanstellen van coördinatoren die het ICT-opleidingsaanbod afstemmen op de noden van het onderwijspersoneel. Een aantal andere centrale acties zijn ondertussen ook opgestart. Zo wordt momenteel volop gewerkt aan het subsidiebesluit om middelen toe te kennen aan de cvo en cbe in functie van de optimalisatie van de cursistenadministratie. Met betrekking tot de ontwikkeling van de promotiecampagne is een communicatiestrategie ontwikkeld en ook de studieopdracht over de begeleiding van EVC-kandidaten is opgestart. De opdracht is gegund en een stuurgroep wordt samengesteld.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt de visienota Edusprong. Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht"	2021 Q1	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering kent middelen toe aan de cvo en cbe ter uitvoering van een regioscan.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Lancering van een eerste projectoproep voor de toekenning van projectmiddelen aan de cvo en cbe	2021 Q3	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan cvo en cbe goed in het kader van de eerste projectoproep.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering van een tweede projectoproep voor de toekenning van projectmiddelen aan de cvo en cbe	2022 Q1	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan de cvo en cbe goed in het kader van de tweede projectoproep	2022 Q3	Op schema	
Opstart van een promotiecampagne voor het volwassenenonderwijs	2022 Q3	Op schema	
Tussentijdse financiële rapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de eerste projectoproep	2023 Q1	Op schema	
Uitvoering studieopdracht over EVC-begeleiding	2023 Q3	Op schema	
De Vlaamse overheid keurt de toekenning van middelen aan cvo en cbe goed in het kader van de optimalisatie van cursistenadministratie	2023 Q3	Op schema	
Inhoudelijke en financiële rapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de eerste projectoproep	2023 Q4	Op schema	
Lancering website 'opleidingskompas' met een overzicht van het actuele aanbod in het volwassenenonderwijs	2023 Q4	Nog niet gestart	
Inhoudelijke en financiële rapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de tweede projectoproep	2024 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal centra die een aanvraag ingediend hebben en van wie de aanvraag goedgekeurd werd in het kader van de eerste projectoproep van Edusprong.	46	2021 Q4	46	100 %
Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een aanvraag ingediend	46	2022 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
hebben en van wie de aanvraag goedgekeurd werd in het kader van de tweede projectoproep Edusprong				
Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een project hebben uitgevoerd in het kader van de eerste projectoproep Edusprong	20	2023 Q4		
Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een project hebben uitgevoerd in het kader van de tweede projectoproep van Edusprong	20	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	8.728.000 EUR
Uitvoering VEK	5.647.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 60.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van maximaal 7.389.175,84 euro aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 augustus 2023 in het kader van de eerste projectoproep Edusprong (BVR goedgekeurd door de Vlaamse regering op 26/11/2021)</p> <p>Oproep voor projectsubsidies in het kader van het relanceplan Edusprong (project VV 19 – Versterken levenslang blijven leren) (Mededeling en bijlage op VR 16/07/2021)</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels om aanvullende punten en werkmiddelen in het volwassenenonderwijs toe te kennen om een regioscan en de regionale afstemming van het opleidingsaanbod op te zetten ter uitvoering van het relanceplan Edusprong</p> <p>Beslissing van de Vlaamse Regering. Visienota "Edusprong, Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht" - nota</p>

[Beslissing van de Vlaamse Regering. Visienota "Edusprong, Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht" - bijlage](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels om aanvullende punten en werkingsmiddelen in het volwassenenonderwijs toe te kennen om een regioscan en de regionale afstemming van het opleidingsaanbod op te zetten ter uitvoering van het relanceplan Edusprong- nota](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 februari 2022. Tweede oproep voor projectsubsidies in het kader van het relanceplan Edusprong](#)

[Visienota Edusprong](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 22 april 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels om subsidies in het volwassenenonderwijs toe te kennen met het oog op de afstemming van het ICT-opleidingsaanbod voor onderwijspersoneel binnen centra voor volwassenenonderwijs met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied informatie-en communicatietechnologie in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 om het relanceplan Edusprong uit te voeren](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels om subsidies in het volwassenenonderwijs toe te kennen met het oog op de afstemming van het ICT-opleidingsaanbod voor onderwijspersoneel binnen centra voor volwassenenonderwijs met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 om het relanceplan Edusprong uit te voeren](#)

05. Versterking O&O

VV020 - BIO-ECONOMIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Landbouw en Visserij
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

De bio-economie omvat zowel de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen als het gebruik van die hulpbronnen en reststromen. Deze worden verwerkt tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en energie.

Vlaanderen heeft een sterke traditie in biogebaseerde activiteiten. Gezien de afwezigheid van grote voorraden natuurlijke hulpbronnen, heeft Vlaanderen expertise opgebouwd in het slim omgaan met grondstoffen voor een circulaire bio-economie.

De strategie en het beleidsplan Bio-economie hebben tot doel het netwerk van innovatieactoren op dit gebied te versterken en nieuwe initiatieven voor het duurzaam gebruik van biogebaseerde oplossingen te stimuleren. Deze acties pakken de huidige uitdagingen van de bio-economie in Vlaanderen aan door:

- meer samenwerking op te bouwen tussen actoren in verschillende economische sectoren;
- innovatie te stimuleren in samenwerking met partners uit de landbouw;
- ondersteuning te bieden aan start-ups en KMO's bij de snelle opschaling en industrialisatie van hun oplossingen;
- de onderzoeksgemeenschap op dit gebied te stroomlijnen en versterken;
- de bestuurlijke capaciteit te versterken om de Vlaamse bio-economie op te volgen en te ondersteunen.

Het eerst impulsprogramma bio-economie werd op 18 december 2020 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hiermee gaat een investering gepaard van 10 miljoen EUR, waarvan 3 miljoen EUR voor wetenschappelijk onderzoek en 7 miljoen EUR voor O&I-projecten in samenwerking met bedrijven.

Een tweede impulsprogramma van 10 miljoen EUR zal in 2021 worden voorgesteld.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	<p>FWO-oproep: minimum 6 tweejarige projecten goedgekeurd tegen eind 2021. Tegen eind 2022 worden nog eens 6 bijkomende projecten goedgekeurd.</p> <p>O&I-projecten met bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actie clusterprojecten: tegen eind 2021 worden een 3-tal (grotere) clusterprojecten bio-economie verwacht. Tegen eind 2022 worden in totaal 7 projecten goedgekeurd onder deze actie. - Actie pilootinfrastructuur: tegen eind 2021 worden een 60-tal 'pilottrajecten bio-gebaseerde toepassingen' verwacht. Met de beslissing van de Vlaamse regering omtrent de verbreding worden voor deze actie in totaal 60 projecten verwacht tegen eind 2022.
Outcome	<p>FWO-oproep: Met de thematische oproep bio-economie wil men excellent vernieuwend strategisch basisonderzoek binnen het thema bio-economie financieren zodat technologische ontwikkelingen met hoog potentieel voor economische of maatschappelijke valorisatie, de grootste kans van slagen krijgen.</p> <p>O&I-projecten met bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actie clusterprojecten: versterking van waardenketens inzake bio-economie passend binnen de (triplehelix) roadmaps van de speerpuntclusters. - Actie pilootinfrastructuur: opschaling van labo-onderzoek inzake bio-economie naar marktrijpe toepassingen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Na evaluatie van de eerste oproepen voor onderzoeksprojecten, clusterprojecten en projecten pilootinfrastructuur werd op 29 april 2022 door de Vlaamse regering het tweede impulsprogramma goedgekeurd.</p> <p>Met deze beslissing werd de tweede schijf van 10 miljoen ter beschikking gesteld en werd voor de O&I-projecten met bedrijven een uitbreiding van inhoud en instrumenten goedgekeurd.</p> <p>FWO-oproep: Er werden in de eerste oproep eind 2021 zes projecten goedgekeurd. De goedgekeurde projecten kunnen geraadpleegd worden op https://www.fwo.be/nl/nieuws/pers/zes-onderzoeksprojecten-binnen-het-domein-bio-economie-toegekend/</p> <p>In 2022 zal het FWO een tweede thematische oproep voor onderzoeksprojecten lanceren. Dit geeft de volgende indicatieve tijdslijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Opening oproep rond begin juni b. Vooraanmelding 15/9 c. Indiening 1/10 d. Beslissing midden december 2022 <p>O&I-projecten met bedrijven:</p> <p>Actie clusterprojecten:</p> <p>Op 17/6/2021 werd een eerste clusterproject bio-economie goedgekeurd: BIOPOL4MOTIVE, dat getrokken wordt door speerpuntcluster Catalisti (VAK: 1.277 kEUR).</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>Dit is een O&O-project. Voor een tweede O&O-project werd positief advies gegeven voor toewijzing op de relancemiddelen bio-economie (VAK: 830 kEUR). Ook 3 LA-trajecten werden toegewezen op de relancemiddelen bio-economie ('HopBel 2.0: Karakterisering, veredeling en vermeerdering van regionale hoprassen' ; 'Vermarketing en productkwaliteit als sleutels voor het succes van de goudbloemteelt' ; 'Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat' ; VAK voor de LA-Trajecten: 1.350 kEUR).</p> <p>Actie pilootinfrastructuur:</p> <p>Elektronische indiening is mogelijk sinds 13/9/2021. Drie projecten werden toegewezen op de relancemiddelen bio-economie (VAK: 300 kEUR). Via zitdagen op 17 mei en 7 juni 2022 wordt ingezet op matchmaking tussen bedrijven en pilootinfrastructuren met het oog op maximale toeleiding naar de oproep.</p> <p>Onderzoeksagenda:</p> <p>Hiervoor werd een studieopdracht toegewezen aan Technopolis Nederland. De oplevering van de resultaten wordt verwacht in de eerste helft van 2023</p>
<p>Noodzakelijke politieke actie</p>	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
oplevering studie Onderzoeksagenda	2023 Q2	Op schema	
Lancering tweede FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	2022 Q2	Gerealiseerd	
Selectie projecten tweede FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	2022 Q4	Op schema	
Toekenning van de steunmiddelen voor O&I-projecten met bedrijven na goedkeuring Vlaamse regering van uitbreiding.	2022 Q4	Op schema	
Start opbouw van onderzoeksagenda voor de Vlaamse Bio-economie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning van de steunmiddelen voor O&I-projecten met bedrijven	2021 Q4	Vertraging	<p>In 2021 werd hier voorzien dat een eerste luik van 7 miljoen zou worden aangewend. Deze acties kwamen echter trager dan verwacht op gang omdat het hier soms over grotere clusterprojecten gaat en ook omwille van de capaciteit van de pilootinfrastructuren. Om deze acties te versnellen</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			werden daarom na evaluatie de verschillende acties van het beleidsplan bio-economie uitgebreid met complementaire steunmaatregelen binnen het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Daarnaast wordt ook het toepassingsgebied van deze maatregelen uitgebreid om een breder scala van initiatieven in de biogebaseerde sectoren en voedingssector te ondersteunen. (zie ook nieuwe mijlpaal)
Tweede impulsprogramma bio-economie	2021 Q4	Gerealiseerd	Het tweede impulsprogramma bio-economie werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 29/04/2022 (VR 2022 2904 VV DOC.0041/1BIS)
Lancering FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	2021 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
FWO-oproep 1: aantal goedgekeurde tweejarige projecten eerste oproep	6	2021 Q4	6	100 %
aantal goedgekeurde 'pilottrajecten bio-gebaseerde toepassingen' na goedkeuring VR uitbreiding	60	2022 Q4	3	5 %
Aantal goedgekeurde clusterprojecten bio-economie na goedkeuring VR uitbreiding	7	2022 Q4	5	71 %
FWO-oproep 2: aantal goedgekeurde tweejarige projecten tweede oproep	6	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.244.000 EUR
Uitvoering VEK	1.002.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 30 april 2021. Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Advies van het FWO volgend op de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 29 april 2022. Volgende stappen en uitbreiding van het Vlaams beleidsplan bio-economie](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 29 april 2022. Vlaams beleidsplan bio-economie. Bijlage](#)

VV021 - ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S), SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Excellente wetenschap en innovatie zijn dé voorwaarden om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De versterking van deze onderzoeks- en innovatie (O&I)-basis kan niet zonder de uitbouw van grootschalige, state-of-the-art (internationale) O&I-infrastructuren. Bovendien zijn deze infrastructuren nodig om de innovatiekloof te kunnen overbruggen en de transfer van kennis en technologie te versnellen naar het industriële en kmo-weefsel. Om onze kennisbasis te versterken, zullen we daarom bijkomend investeren in O&I- en technologische infrastructuur met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg.

Een investeringsagenda werd samengesteld op basis van een bevraging van het veld. Er worden 14 subprojecten gefinancierd, waarvan 7 binnen de pijler 'Duurzaamheid' (39,20 mio €), 3 binnen de pijler 'Digitaal' (36,02 mio €) en 4 binnen de pijler 'Gezondheid' (25,91 mio €) voor een gezamenlijk budget van 101,14 mio €.

Het gaat om de hiernavolgende subprojecten (projectuitvoerder(s) / toegekende middelen Vlaamse Veerkracht).

Pijler Duurzaamheid:

- (VV021/01) Bio Base NextGen Fermentation Platform: acht drukfermentoren met geavanceerde sensoren (Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) / 1,38 mio €);
- (VV021/02) Bio Base Demo: demonstratiefermentor op 50 m³ (BBEPP / 10,61 mio €);
- (VV021/03) Microbiële fermentatiestromen als eiwitbron in voedings- en voedertoepassingen van Vlaamse bedrijven (BBEPP en Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) / 3 mio €);
- (VV021/04) BioCon pilot plant: biomassa-conversieplatform (KU Leuven / 8,20 mio €);
- (VV021/05) Samen bouwen aan een klimaatneutraal Vlaanderen: onderzoeks- en demonstratie-infrastructuur (KU Leuven / 7,96 mio €);
- (VV021/06) Biotope incubator (Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) / 6,50 mio €);
- (VV021/07) Green Hydrogen Lab (UHasselt / 1,56 mio €);

Pijler Digitaal:

- (VV021/08) Acceleratorprogramma met 6 end-to-end digitale pilootproductielijnen voor digitale

PROJECTOMSCHRIJVING

transformatie van High-Mix-Low-Volume (HMLV) productie (Flanders Make / 11 mio €);
 (VV021/09) Uitbreiding Fotonica pilootlijn infrastructuur (VUB Brussels Photonics (B-PHOT) / 5,02 mio €);
 (VV021/10) Miniaturisatie in geavanceerde halfgeleider technologieën: opzet van een Hoge Numerieke Apertuur (NA) Extreme Ultra Violet (EUV)-golflengte Lab (Imec / 20 mio €);

Pijler Gezondheid:

(VV021/11) CESPE Innovatie Accelerator voor (bio)farmaceutische productie (UGent / 9 mio €);
 (VV021/12) Ecosysteem voor pandemiebestrijding: Vaccinopolis (4 mio €) + Flipped TTO (1,3 mio €) (UAntwerpen / 5,3 mio €);
 (VV021/13) Europese translationele motor voor AAV-gentherapie (KU Leuven / 9,17 mio €);
 (VV021/14) Remote Clinical Monitoring Center (RCMC) (UHasselt / 2,44 mio €).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	101.136.087 EUR
Output	De verwachte output per subproject (14 in totaal) werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').
Outcome	De verwachte outcome per subproject (14 in totaal) werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Afgezien van 1 subproject (VV021/11 - CESPE) waarvoor de projectovereenkomst nog moet worden gefinaliseerd, zijn alle subprojecten in uitvoering en zitten ze op schema.
Noodzakelijke politieke actie	Ondertekening door de minister van de projectovereenkomst voor subproject VV021/11 (CESPE).

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bevraging van het veld	2021 Q3	Gerealiseerd	
Alle projecten werden goedgekeurd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Alle overeenkomsten werden opgemaakt	2022 Q1	Op schema	
Alle overeenkomsten werden ondertekend door alle partijen	2022 Q1	Op schema	
Gunning van overheidsopdrachten voor O&O en infrastructuurprojecten	2022 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Alle projecten zijn gestart	2022 Q4	Op schema	
Voortgangsrapportage over werkjaar 2022	2023 Q1	Nog niet gestart	
Voortgangsrapportage over werkjaar 2023	2024 Q1	Nog niet gestart	
Voortgangsrapportage over werkjaar 2024	2025 Q1	Nog niet gestart	
Voortgangsrapportage over werkjaar 2025	2026 Q1	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde projecten van investeringsagenda onderzoeksinfrastructuur	14	2021 Q4	14	100 %
Alle projecten van investeringsagenda onderzoeksinfrastructuur zijn gestart	14	2022 Q4	13	93 %
Voltooiing van de gegunde O&O- en infrastructuurprojecten	14	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	101.135.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	101.136.087 EUR
Uitvoering VAK	91.843.000 EUR
Uitvoering VEK	23.985.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 101.136.087 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

De 14 projecten werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 juli 2021.

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Vlaamse Veerkracht: investeringsimpuls in O&O&I-infrastructuur in Vlaanderen \(project VV021\) \(VR 2021 0907 VV DOC.0099/1BIS\)](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3 juni 2022. Investeringsimpuls in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen in het kader van het Relanceplan](#)

[Ministerieel Besluit tot toekenning van steun voor onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap](#)

[De handleiding. Bijlage 1](#)

[Het aanvraagformulier. Bijlage 2](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV023 - Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O](#)

VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Ondernemingen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Innovatie staat centraal in de aanpak van het herstel in Vlaanderen. In de eerste plaats omdat innovatie nodig is om onze bedrijven competitief en productief te houden, zodat jobs in Vlaanderen behouden en gecreëerd kunnen worden.

Vlaamse bedrijven staan in de voorhoede van innovatie in Europa. Investerings ten belope van 2,16% van het bbp ondersteunen de R&D-intensiteit van de bedrijven en dragen sterk bij tot het feit dat we in Vlaanderen met 2,92% in 2018 dicht bij de 3% O&O-doelstelling zitten. We stellen bovendien vast dat bedrijven in deze crisis blijven inzetten op innovatie en willen hen daarin ondersteunen. Daarom trekken wij 100 miljoen euro extra uit voor subsidies aan O&O-projecten van bedrijven. Deze subsidies zullen worden toegekend onder de voorwaarden van de huidige instrumenten die gericht zijn op O&O-steun aan bedrijven.

Het innovatiebeleid slaagt er steeds beter in om ook kleine(re) bedrijven te bereiken. Toch blijft de spreiding van O&O over meer sectoren en bedrijfstypes een uitdaging voor onze regio. Na de Corona-crisis zal innovatie nog meer dan voorheen bepalend zijn voor de concurrentiekracht van onze bedrijven en de economische groei. Deze investeringen gaan daarom gepaard met een doorlichting van het VLAIO innovatie-instrumentarium. We willen immers meer innoverende ondernemingen en meer innovatie in bedrijven stimuleren. De uitdaging bestaat erin om het aantal innoverende bedrijven in Vlaanderen op te trekken en het instrumentarium dat Vlaanderen inzet om ondernemingen aan te zetten tot innovatie laagdrempeliger te maken, aan te passen aan de mogelijkheden van kmo's en sterker in te zetten op economische valorisatie van de resultaten van innovatie. Bij het opmaken van het Vlaams regeerakkoord werd deze uitdaging verwoord als het verbreden van het O&O-instrumentarium naar kleine bedrijven.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	100.000.000 EUR
Output	Aantal goedgekeurde projecten
Outcome	Meer O&O-investeringen ondernemingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
---------------	--------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Tweede oproep TETRA-projecten zorg gelanceerd op 24/04/22 (twv 2,4 mln). Selectie en vastleggingen O&O-projecten loopt verder. Sinds begin mei 22 werd reeds 3 mln bijkomende O&O-projecten vastgelegd (nieuwe vastleggingen zijn pas gestart nadat middelen naar VLAIO getransfereerd waren).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Selectie COOCK projecten Zorg en Circulaire Economie, Clusterprojecten Zorg	2022 Q4	Op schema	Eerste oproep werd afgehandeld (1.6 mln vastgelegd), iets onder besteding, wordt gecorrigeerd via bijkomende oproep Tweede oproep opengesteld (twv 2.4 mln)
Doorlichting VLAIO-instrumentarium (2 studies: 1. additionaliteit O&O-steun en 2. policy mix).	2021 Q4	Gerealiseerd	Beide evaluatierapporten ikv Vlaamsbrede heroverweging werden opgeleverd en geven een positief beeld van de toegevoegde waarde van de O&O steun.
Selectie van O&O-projecten via reguliere aanpak	2022 Q4	Op schema	De vastleggingen van O&O-projecten verloopt op schema. De beoogde aantallen zijn reeds gehaald.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vastleggingen Relance Middelen O&O	30.000.000,00	2021 Q4	29.981.830	100 %
Gezondheid en zorg - COOCK Gezondheid en zorg - TETRA Gezondheid en zorg - Clusterprojecten (vastleggingen euro)	8.000.000	2022 Q4	1.921.000	25 %
Vastleggen O&O relance middelen deel 2	32000000	2022 Q4	3.000.000	10 %
Aantal O&O-projecten	100	2022 Q4	108	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	34.426.000 EUR
Uitvoering VEK	16.840.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 100.000.000 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 december 2020. Bijkomende middelen voor VLAIO O&O-projecten 2020](#)

[Impulsprogramma - Innovatie in gezondheid en zorg. Nota VR 18/06/2021](#)

[Impulsprogramma - Innovatie in gezondheid en zorg. Kadernota VR 18/06/2021](#)

[Impulsprogramma - Innovatie in gezondheid en zorg. Bijlage. Doelgroepbevraging](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 maart 2022. Overdracht relancemiddelen voor O&O-projecten VLAIO](#)

VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Innovatie is meestal een proces van vele jaren, startend met fundamenteel onderzoek over strategisch basisonderzoek naar meer toegepast onderzoek. Om de innovaties van de toekomst te kunnen voeden, hebben we daarom versterking nodig van onze kennisbasis. Bijkomend zullen we investeren in onderzoeksprojecten met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg.</p> <p>Binnen dit Vlaamse Veerkracht project worden de hiernavolgende subprojecten gefinancierd (projectuitvoerder(s) / toegekende middelen Vlaamse Veerkracht).</p> <p>(I - VV023) Oproepen infrastructuur hogescholen (meerdere / 6 mio €): dit subproject omvat het investeren in onderzoeksinfrastructuren bij de Vlaamse hogescholen. Hiervoor zal een bedrag van ongeveer 2 x 3 mio € worden verdeeld in 2 oproepen (2021 en 2022). De oproep 2021 werd op 23 april 2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en werd opengesteld tussen 23 augustus 2021 en 15 september 2021. Op 7 december 2021 werden 17 projecten goedgekeurd voor financiering. De oproep 2022 zal binnenkort ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd en vervolgens worden opengesteld.</p> <p>(II - VV023) Projecten via VLIR (IOF) (meerdere / 17,96 mio €): in het kader van dit subproject werd een investeringsagenda samengesteld op basis van een bevraging van het veld. Enerzijds wordt binnen dit subproject voorzien in de versterking van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) ten belope van 14 mio €, waarbij via de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) 7 O&O&I-infrastructuurprojecten werden uitgewerkt. Daarnaast worden 2 O&O&I-infrastructuurprojecten van enerzijds het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en anderzijds een consortium imec/VITO ondersteund. Er worden in het kader van dit subproject dus 9 'sub-subprojecten' gefinancierd, waarvan 3 binnen de pijler 'Duurzaamheid' (6,76 mio €), 1 binnen de pijler 'Digitaal' (0,56 mio €) en 5 binnen de pijler 'Gezondheid' (10,65 mio €) voor een gezamenlijk budget van 17,96 mio €. Het gaat meer bepaald om de volgende sub-subprojecten:</p> <p>Pijler Duurzaamheid:</p> <p>(VV023/01) Innovatief ecosysteem voor circulair gebruik en opwaardering van CO₂, stikstof en andere componenten in de lucht ter verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving (BlueApp) (UAntwerpen / 1,86 mio €);</p> <p>(VV023/02) Valorisatie van agro-industriële biomassa & biomassa residuen in een duurzame circulaire bio-economie (TRANSfarm) (KU Leuven / 1,90 mio €);</p> <p>(VV023/03) Nanotechnologie voor efficiëntere productie van Groene Waterstof (Groene</p>	

PROJECTOMSCHRIJVING

Waterstofelektrolyse) (imec en VITO / 3 mio €);

Pijler Digitaal:

(VV023/04) Een schaalbare en flexibele infrastructuur voor de transformatie naar digitaal-fysieke werkomgevingen (MAXVR-INFRA) (UHasselt / 0,56 mio €);

Pijler Gezondheid:

(VV023/05) Een geïntegreerd platform voor de identificatie, isolatie en karakterisatie van humane monoklonale antilichamen (MabMine) (KU Leuven / 1,90 mio €);

(VV023/06) PRecisiegeneeskunde door geïntegreerde Spatiale Multi-Omics (PRISMO) (KU Leuven / 1,89 mio €);

(VV023/07) Geautomatiseerd, geïntegreerd en modulair High Throughput platform voor reactie-optimalisatie en continue flow productie van geneesmiddelen in Vlaanderen (HighTru Lab) (UGent / 4,40 mio €);

(VV023/08) Centre of excellence voor microfabricage van microfluidics in glas (MICROLAB) (VUB / 1,46 mio €);

(VV023/09) Supporting ITM's Scientific Infrastructure to Innovate for the Global Good (ITG / 1 mio €).

(III - VV023) Investeringsprojecten (meerdere / 26 mio €) bij Strategische Onderzoekscentra, speerpuntclusters en Vlaamse onderzoeksinstellingen op basis van een bijkomende bevraging van het veld. Het gaat meer bepaald om de volgende sub-subprojecten:

(VV023/10) Opstart SolidLab Vlaanderen (Imec / 7 mio € waarvan 5 mio € relancemiddelen uit VV023 en 2 mio € reguliere middelen);

(VV023/11) Opstart Testing & Experimentation Facility Hardware for Edge AI (TEFW4AI) Vlaanderen (Imec / 20 mio €);

(VV023/12) Opstart We Are open ecosysteem voor burgerbeheerde persoonlijke gezondheidsdata (VITO / 1 mio €): zal in de loop van 2022 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

(IV - VV023) (VV023/13) Bijkomende financiering achtste FWO-oproep voor Zware Onderzoeksinfrastructuur (oproep 2021-2022) (FWO / 8,98 mio €): zal in de loop van 2022 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	58.935.233 EUR
Output	<p>I - VV023: de verwachte output werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>II - VV023: de verwachte output per sub-subproject werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>III - VV023 (VV023/10 en VV023/11): de verwachte output van de sub-subprojecten VV023/10 (SolidLab Vlaanderen) en VV023/11 (TEFW4AI Vlaanderen) werd opgenomen in de resp. nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie links onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>III - VV023 (VV023/12): de verwachte output van het sub-subproject VV023/12 (We Are) zal worden opgenomen in de nota die aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd.</p> <p>IV - VV023 (VV023/13): de verwachte output van het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering achtste oproep Zware Onderzoeksinfrastructuur) zal worden opgenomen in de nota die aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd.</p> <p>Zie ook info onder projectbeschrijving.</p>
Outcome	I - VV023: de verwachte outcome werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>II - VV023: de verwachte outcome per sub-subproject werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>III - VV023 (VV023/10 en VV023/11): de verwachte outcome van de sub-subprojecten VV023/10 (SolidLab Vlaanderen) en VV023/11 (TEFW4AI Vlaanderen) werd opgenomen in de resp. nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie links onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>III - VV023 (VV023/12): de verwachte outcome van het sub-subproject VV023/12 (We Are) zal worden opgenomen in de nota die aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd.</p> <p>IV - VV023 (VV023/13): de verwachte outcome van het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering achtste oproep Zware Onderzoeksinfrastructuur) zal worden opgenomen in de nota die aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd.</p> <p>Zie ook info onder projectbeschrijving.</p>
--	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>I - VV023: de projecten in het kader van de eerste oproep (2021) infrastructuur hogescholen zijn in uitvoering en zitten op schema. De tweede oproep (2022) infrastructuur hogescholen zal binnenkort ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd en vervolgens worden opengesteld.</p> <p>II - VV023: alle 9 sub-subprojecten zijn in uitvoering en zitten op schema.</p> <p>III - VV023: het sub-subproject VV023/10 (SolidLab Vlaanderen) is in uitvoering en zit op schema; de projectovereenkomst voor het sub-subproject VV023/11 (TEFW4AI Vlaanderen) is in opmaak; het sub-subproject VV023/12 (We Are) wordt in de loop van 2022 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Na goedkeuring door de Vlaamse Regering en/of ondertekening van de projectovereenkomst worden deze sub-subprojecten opgestart.</p> <p>IV - VV023: het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering achtste oproep Zware Onderzoeksinfrastructuur) wordt in de loop van 2022 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Na goedkeuring door de Vlaamse Regering en ondertekening van de projectovereenkomst wordt dit sub-subproject opgestart.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Goedkeuring Vlaamse Regering en/of ondertekening van de projectovereenkomst door de minister.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
(I - VV023) Oproep 1 hogescholen gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
(I - VV023) Projecten oproep 1 hogescholen zijn opgestart	2022 Q2	Op schema	
(I - VV023) Projecten oproep 1 hogescholen zijn afgerond	2025 Q2	Op schema	
(I - VV023) Oproep 2 hogescholen gelanceerd	2022 Q3	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
(I - VV023) Projecten oproep 2 hogescholen zijn opgestart	2023 Q2	Nog niet gestart	
(I - VV023) Projecten oproep 2 hogescholen zijn afgerond	2026 Q2	Nog niet gestart	
(II - VV023) Bevraging van het veld	2021 Q3	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle projecten zijn goedgekeurd	2021 Q3	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle overeenkomsten werden opgemaakt	2022 Q1	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle overeenkomsten werden ondertekend door alle partijen	2022 Q1	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle projecten zijn opgestart	2022 Q4	Gerealiseerd	
(II - VV023) Alle projecten zijn afgerond	2026 Q2	Op schema	
(III - VV023) Bevraging van het veld is afgerond	2022 Q4	Gerealiseerd	
(III - VV023) Alle projecten zijn goedgekeurd	2022 Q4	Op schema	
(III - VV023) Alle projecten zijn opgestart	2022 Q4	Op schema	
(III - VV023) Alle projecten zijn afgerond	2026 Q2	Op schema	
(IV - VV023) Project is goedgekeurd	2022 Q4	Op schema	
(IV - VV023) Project is opgestart	2022 Q4	Nog niet gestart	
(IV - VV023) Project is afgerond	2026 Q2	Nog niet gestart	
(VV023) Gunning van overheidsopdrachten voor O&O en infrastructuurprojecten	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
(III - VV023) Alle projecten zijn opgestart	3	2022 Q4	1	33 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
(IV - VV023) Alle projecten zijn opgestart	1	2022 Q4		
(I - VV023) Alle projecten zijn opgestart	20	2022 Q4	17	85 %
(III - VV023) Aantal goedgekeurde projecten	3	2022 Q4	2	66 %
(II - VV023) Aantal goedgekeurde projecten	9	2022 Q4	9	100 %
(II - VV023) Alle projecten zijn opgestart	9	2022 Q4	9	100 %
(IV - VV023) Aantal goedgekeurde projecten	1	2022 Q4		
(I - VV023) Aantal goedgekeurde projecten	20	2022 Q4	17	85 %
(III - VV023) Alle projecten zijn voltooid	3	2026 Q2		
(IV - VV023) Alle projecten zijn voltooid	1	2026 Q2		
(I - VV023) Alle projecten zijn voltooid	20	2026 Q2		
(II - VV023) Alle projecten zijn voltooid	9	2026 Q2		
(VV023) Voltooiing van de gegunde O&O- en infrastructuurprojecten	33	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	58.865.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	58.935.233 EUR
Uitvoering VAK	45.125.000 EUR
Uitvoering VEK	2.396.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 58.935.233 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

I - VV023: de oproep 2021 voor 3 miljoen euro werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 23 april 2021.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021: investeringen in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen in het kader van het Relanceplan \(VR 2021 2304 VV DOC.0033/1BIS\)](#)

[Ministerieel Besluit tot toekenning van steun voor onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap](#)

[Bijlage 1. Handleiding oproep onderzoeksinfrastructuur hogescholen](#)

[Bijlage 2. Aanvraag onderzoeksinfrastructuur](#)

II - VV023: de 9 sub-subprojecten werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 juli 2021.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Vlaamse Veerkracht: versterking onderzoeksveld en versnelling O&O: onderdeel O&O&I-infrastructuren voor universiteiten en kennisinstellingen \(project VV023\) \(VR 2021 0907 VV DOC.0100/1BIS\)](#)

III - VV023: de sub-subprojecten VV023/10 (SolidLab Vlaanderen) en VV023/11 (TEFW4AI Vlaanderen) werden resp. op 17 december 2021 en op 10 december 2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het project VV023/12 (We Are) zal nog ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 december 2022: Vlaamse Veerkracht: TEFHW4AI Vlaanderen - Testing & Experimentation Facility Hardware for Edge AI \(project VV023\) \(VR 2021 1012 VV DOC.0169/1\)](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021: Vlaamse Veerkracht: opstart SolidLab Vlaanderen \(project VV023\) \(VR 2021 1712 VV DOC.0172/1BIS\)](#)

IV - VV023: het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering voor Zware Onderzoeksinfrastructuur) zal nog ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV021 - Onderzoeksinfrastructuur \(bij Strategische Onderzoekscentra \(SOC's\), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs\)](#)

06. Blue deal

VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Landmaatschappij - Departement Omgeving - Agentschap Natuur en Bos - Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	programmamateam Water-Land-Schap

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project groen-blauwe infrastructuur - open ruimte wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied. Het bestaat uit drie projectonderdelen.

Het project zet versterkt in op waterconservering in de open ruimte om grondwatervoorraden aan te vullen en verdroging van natuur- en landbouwgebieden tegen te gaan. Het is daarbij noodzakelijk dat we beter gebruik maken van de perioden met neerslagoverschot om perioden met neerslagtekorten te overbruggen. Dat kan enkel als we zowel infiltratie als retentie in de bovenstroomse gebieden versterken. Dit heeft ook als gevolg dat bij hevige neerslag water minder snel afvloeit en overstromingsschade in afwaartse gebieden wordt vermeden. Maatregelen om water langer tegen te houden en te laten infiltreren in de open ruimte zijn onder meer erosiemaatregelen, aanleggen van bufferbekkens, het voorzien van peilgestuurde drainages, bovenwaterlopen terug meer laten meanderen, waterpeilen in de valleigebieden terug verhogen door minder water te onttrekken en minder te draineren in polders en wateringen, afwateringskanalen in natuurgebieden zoveel mogelijk dempen.

De realisatie van dergelijke maatregelen is vaak niet eenvoudig gelet op de sterke versnippering van de ruimte in Vlaanderen waarbij natuur-, bos- en landbouwgebieden naast elkaar voorkomen en landgebruik niet altijd in overeenstemming is met de noden van het watersysteem. Daarom is een nauwe samenwerking met de beheerders van de open ruimte essentieel. Het project richt zich dan ook op (1) het mobiliseren van lokale gebiedscoalities voor het nemen van droogtmaatregelen in hun gebied (Water-Land-Schap 2.0) en (2) op het nemen van extra droogtmaatregelen binnen de geïntegreerde gebiedsgerichte projecten waarbij al een structurele samenwerking tussen gebiedspartners is opgezet. Ook toegang tot grond is een cruciale factor om deze maatregelen mogelijk te maken. Daarom voorziet het project ook (3) de oprichting van een grondenbank Blue Deal die inzet op grondmobiliteit en rechtstreekse aankopen om het landgebruik meer in overeenstemming te brengen met de noden van het watersysteem. Tot slot stelt het (4) afsluiten en uitvoeren van lokale gebiedsdeals de lokale coalities in staat om ook de meer complexe maatregelen voor de versterking van het watersysteem te kunnen uitvoeren.

De extra droogtmaatregelen zijn specifieke relance-deelprojecten binnen ruimere inrichtingsprojecten. Deze deelprojecten zijn volledig gefinancierd door relancemiddelen. Een aantal extra droogtmaatregelen

PROJECTOMSCHRIJVING

betreft subsidies aan lokale actoren. Dan worden de relancemiddelen steeds aangevuld door reguliere middelen van deze lokale actoren. Het subsidiepercentage wordt vastgelegd in de specifieke oproepen en overeenkomsten. Water-Land-Schap en Gebiedsdeals betreffen subsidies aan lokale actoren. Ook hier worden de relancemiddelen steeds aangevuld door reguliere middelen van deze lokale actoren. Het subsidiepercentage is vastgelegd in de oproepen. De verwervingen in het kader van de grondenbank Blue Deal zijn deels gefinancierd door relancemiddelen (10 mio euro) en deels gefinancierd door Vlaamse middelen (10 mio euro).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	40.000.000 EUR
Output	8 systeeminnovaties gerealiseerd, 16 gebiedsprogramma's opgemaakt ism coalities, 15 extra droogtmaatregelen gerealiseerd, 10 lokale gebiedsdeals gerealiseerd, 150 ha aangekochte grond ifv vernatting
Outcome	verhoogd inzicht in de werking van maatregelen, bevorderde data- en kennisuitwisseling, vergroten van de waterreserve, verhoogde waterretentie in de bodem, vernatting van gebieden, verbeterde waterkwaliteit, bijkomende groen-blauwe verbindingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>In het kader van Water-Land-Schap 2.0 zijn de middelen voor de 8 geselecteerde systeeminnovaties toegekend. Deze zijn nu volop op terrein in uitvoering. De 16 geselecteerde gebiedscoalities kregen een voorschot op de procesmiddelen zodat zij met het proces in hun gebied van start konden gaan. Ze werden begeleid in de opmaak van hun gebiedsprogramma en eind mei zijn de 16 ontwerp gebiedsprogramma's ingediend. Er zijn momenteel 12 extra anti-droogtmaatregelen in uitvoering binnen de projectenportefeuille van de Vlaamse Landmaatschappij.</p> <p>In het kader van de grondenbank Blue Deal konden we instaan voor de verwerving van 133 ha in functie van versterking van het watersysteem.</p> <p>De Gebiedsfondsen zijn met een oproep 'Lokale Gebiedsdeals Droogte' in februari gelanceerd. De eerste fase is succesvol afgerond met een selectie van 10 kandidaten uit 18 ingediende dossiers. De tien geselecteerde coalities werken hun voorstel Lokale Gebiedsdeal Droogte in de tweede fase verder uit tot een concreet actieprogramma dat minstens drie complexere lokale realisaties omvat om het watersysteem te versterken. Eind september worden deze ter goedkeuring voorgelegd.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
W-L-S: lanceren oproep	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
W-L-S: indienen voorstellen systeeminnovaties en gebiedsprogramma's	2021 Q3	Gerealiseerd	
W-L-S: selectie op basis van de ingediende voorstellen	2021 Q4	Gerealiseerd	
W-L-S: start inhoudelijke studie	2021 Q4	Gerealiseerd	
W-L-S: start begeleidingstraject en procesbegeleiding gebiedsprogramma's	2022 Q1	Gerealiseerd	
W-L-S: start uitvoering systeeminnovaties	2022 Q1	Gerealiseerd	
W-L-S: goedkeuring gebiedsprogramma's door de Vlaamse Regering	2022 Q4	Op schema	
W-L-S: start uitvoering gebiedsprogramma's	2023 Q1	Op schema	
W-L-S: systeeminnovaties uitgevoerd	2024 Q1	Op schema	
W-L-S: gebiedsprogramma's uitgevoerd	2026 Q3	Op schema	
INR: goedkeuring droogtemaatregelen	2021 Q1	Gerealiseerd	
INR: droogtemaatregelen 2021 zijn vastgelegd	2021 Q4	Gerealiseerd	
INR: droogtemaatregelen 2022 zijn vastgelegd	2022 Q4	Op schema	
INR: droogtemaatregelen zijn uitgevoerd	2026 Q3	Op schema	
Grondenbank: goedkeuring grondenbank Blue Deal	2021 Q1	Gerealiseerd	
Grondenbank: oprichten rapporteringsoverleg met VLM, VMM, Agentschap Natuur en Bos en Departement Omgeving	2021 Q1	Gerealiseerd	
Grondenbank : vastleggen middelen grondenbank Blue Deal schijf 1	2021 Q4	Gerealiseerd	
Grondenbank: aankoop gronden tbv vernatting deel 1	2021 Q4	Gerealiseerd	
Grondenbank: vastlegging middelen grondenbank Blue Deal schijf 2	2022 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Grondenbank: aankoop gronden tbv vernatting deel 2	2022 Q4	Op schema	
Grondenbank: aankoop gronden tbv vernatting deel 3	2023 Q4	Nog niet gestart	
Grondenbank: aankoop gronden tbv vernatting deel 4	2024 Q4	Nog niet gestart	
Grondenbank: aankoop gronden tbv vernatting deel 5	2025 Q4	Nog niet gestart	
Grondenbank: grondenbank Blue Deal is uitgevoerd	2026 Q3	Op schema	
gebiedsdeals - selectie lokale gebiedsdeals	2022 Q4	Gerealiseerd	
gebiedsdeals zijn uitgevoerd	2026 Q3	Op schema	
start of Blue Deal projects	2023 Q1	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal systeeminnovaties in uitvoering	8	2022 Q1	8	100 %
aantal opgemaakte gebiedsprogramma's	16	2022 Q4		
aantal geselecteerde gebiedsdeals	10	2022 Q4	10	100 %
aantal extra droogtemaatregelen in uitvoering	15	2023 Q1	12	80 %
aantal gebiedsdeals in uitvoering	10	2023 Q1		
aantal gebiedsprogramma's in uitvoering	16	2023 Q1		
aantal uitgevoerde systeeminnovaties W-L-S	8	2024 Q1		
aantal gerealiseerde gebiedsdeals	10	2026 Q3		
completion of Blue Deal projects	(deel VV024)	2026 Q3		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal gerealiseerde gebiedsprogramma's	16	2026 Q3		
aantal gerealiseerde extra droogtmaatregelen inrichtingsprojecten	15	2026 Q3		
aantal aangekochte ha grond ifv vernatting	150	2026 Q3	133	83 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	40.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	40.000.000 EUR
Uitvoering VAK	11.320.000 EUR
Uitvoering VEK	7.761.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 39.600.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021](#)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Landbouw en Visserij - Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	primaire sector, agro-industriële sector, kennisinstellingen, praktijkcentra landbouw

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

De waterbeschikbaarheid per capita in Vlaanderen is één van de laagste in de OESO. De klimaatverandering en meer specifiek de droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten. De grondwaterreserves slinken zienderogen en droogteperiodes leiden tot uitputting van regenwaterreserves en grote schommelingen in watergebruik met nefaste gevolgen voor natuur en landbouw. De landbouwsector komt in de problemen voor wat betreft het garanderen van voldoende voedselproductie voor de industriële voedingssector. Het inkomen van de landbouwers staat onder druk en is onzeker.

Naast investeringen is innovatie belangrijk om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Bedoeling is op vrij korte termijn innovaties te initiëren die een antwoord bieden aan deze uitdagingen en kostenefficiënt kunnen toegepast worden op bredere schaal. Mogelijke onderzoekspistes zijn circulair watergebruik met aandacht voor de waterkwaliteit (voedselveiligheid, milieuaspecten zoals zoutinrusie), onderzoek naar droogteresistente en nieuwe klimaatrobuuste (eiwit)teelten en teelttechnieken of beheersmaatregelen die een duurzaam antwoord kunnen bieden op de klimaatverandering (zoals peilgestuurde drainage of het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem zodat de bodem het water langer kan vasthouden). Indirect zal ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid gegarandeerd worden en zal de toeleveringssector van de resultaten van dit impulsprogramma kunnen genieten. Specifiek voor de nieuwe droogteresistente en/of eiwitteelten voor Vlaanderen moet er aandacht besteed worden aan zowel teelttechniek, afzetmogelijkheden en verwerkingstechnieken.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt gebruik gemaakt van een bestaand onderzoeksprogramma, met name de landbouwtrajecten. De steuntoekenning in het kader van LA-trajecten betreft niet-staatssteun en is voorbehouden voor Organisaties voor Onderzoek en Kennisverspreiding voor de uitvoering van niet-economische activiteiten zoals onafhankelijke onderzoeksactiviteiten en/of kennisverspreiding.

Dit onderzoeksprogramma is vraagedreven en beoogt reeds tijdens de duur van het project veranderingen teweeg te brengen bij een ruime doelgroep. De projecten worden aan 90% gesteund, met 10% inbreng van leden van de begeleidingscommissie, wat het vraagedreven karakter moet garanderen. Regelmatig worden, naast landbouworganisaties en individuele landbouwers, ook industriële sectororganisatie en toeleveranciers of afnemers van landbouwproducten in de gebruikerscommissies aangetroffen. De finaliteit van het programma is primair economisch met aandacht voor maatschappelijke aspecten. De call 2020 omvat verschillende projecten die reeds aan de gestelde doelstellingen voldoen. Gezien de budgettaire ruimte die voorhanden is, is het slaagpercentage van het programma laag (ca. 27% voor de call 2020) en kwaliteitsvolle projecten kunnen niet altijd gesteund worden. Extra middelen voor dit programma kunnen

PROJECTOMSCHRIJVING

leiden tot een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde.

Het programma Landbouwtrajecten werd in de loop van 2020 hervormd voor wat betreft de evaluatiecriteria, onder meer om tegemoet te komen aan de vraag uit het beleid om sterker in te zetten op maatschappelijke uitdagingen inzake innovatieve, milieu- en klimaatvriendelijke economische productie. Voor de call 2020-2021 werd een nieuw criterium 'maatschappelijke meerwaarde' toegevoegd dat met name de milieu- en sociale aspecten van duurzame landbouw omvat. Milieuaspecten zijn bijvoorbeeld efficiënt water(her)gebruik, circulaire economie, minder gebruik van pesticiden en meststoffen, klimaatmitigatie door minder broeikasgassen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Sociale aspecten zijn bijvoorbeeld arbeidsveiligheid, gezondheid van landbouwer en consument, inkomenszekerheid, (dieren)welzijn, werkbaar werk en landschapsbeleving. De bedoeling is om projecten die in aanzienlijke mate geïnspireerd zijn door aspecten van duurzame landbouw, en een hoog ambitieniveau hebben op dat vlak, een zekere (beleids)prioriteit te kunnen geven.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	6.000.000 EUR
Output	Minstens 6 onderzoeksprojecten gericht op duurzaam watergebruik in de landbouwsector.
Outcome	<ul style="list-style-type: none">• Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen• Duurzamer watergebruik via alternatieve bronnen• Bijkomende waterbesparende technologieën en technieken• Verhoogd aandeel droogteresistente teelten• Bevorderde data- en kennisuitwisseling"

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De selectie van de projecten in de tweede call landbouwonderzoek blue deal is afgerond. Er zijn bijkomend 4 blue deal projecten geselecteerd, waardoor er in totaal 7 blue deal landbouwtrajecten zullen lopen. De opstart van de tweede reeks projecten wordt in het najaar verwacht. De eerste 3 blue deal landbouwtrajecten zijn al gestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
labeling en evaluatie van landbouwtrajecten call 2020-2021 die binnen de blue deal passen	2021 Q1	Gerealiseerd	
Beslissing over de blue deal projecten onderzoek call 2020-2021 landbouwtrajecten	2021 Q2	Gerealiseerd	
Nota Vlaamse regering	2021 Q2	Gerealiseerd	Nota Vlaamse Regering: Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven en steun

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			voor onderzoek in de landbouwsector in het kader van het Relanceplan
Lancering tweede call "bleu deal landbouwtrajecten"	2021 Q3	Gerealiseerd	
Start eerste landbouwtrajecten/blue deal projecten	2021 Q4	Gerealiseerd	
Beslissing over blue deal projecten call 2021-2022	2022 Q2	Gerealiseerd	
Alle blue deal onderzoeksprojecten voor de versterking van de biodiversiteit en/of mitigatie van de gevolgen van de klimaatverandering zijn gestart.	2023 Q1	Op schema	
Voltooiing van blue deal projecten onderzoek	2026 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gesteunde landbouwtrajecten onder de "blue deal"	6	2022 Q2	7	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.417.000 EUR
Uitvoering VEK	98.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 6.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven en steun voor onderzoek in de landbouwsector](#)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Industrie en landbouw gevestigd langs de waterlopen, drinkwatermaatschappijen, binnenvaartondernemers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Voor de voeding van de hoofdassen in het Vlaamse binnenwaterennet bestaat een afhankelijkheid van stroomopwaarts gelegen waterwegen in beheer van andere landen en regio's. Het water dat voor de exploitatie van dit waterwegennet beschikbaar is dient dan ook zo optimaal mogelijk benut te worden. Binnen de "Blue Deal" wordt door de Vlaamse waterwegbeheerder een selectie van projecten opgenomen in volgende domeinen:

1. Voorzien van pompinstallaties op waterwegen die onderhevig zijn aan waterschaarste met als doel de watervoorziening voor scheepvaart, industrie, drinkwaterbedrijven, landbouw maximaal te vrijwaren ook bij periodes van langdurige droogte;
2. Renovatie van sluisdeuren en -mechanismen waardoor lekverliezen worden gereduceerd.

Concrete inhoud van de projecten:

1. Oppompen van schutwater bij sluisen naar het opwaarts pand – pompinstallaties

Het voorzien van vaste pompinstallaties op een aantal vaarassen:

Het netwerk van Albertkanaal en de Kempense kanalen worden uitsluitend gevoed met water dat afkomstig is uit de Maas, waarvan een deel in gemeenschappelijk beheer met Nederland. Dit maakt dat slechts een deel van het Maaswater ter voeding van deze kanalen kan worden aangewend.

Op elk van de 6 sluiscomplexen van het Albertkanaal werd gebouwd/zal worden gebouwd een pompinstallatie waardoor schutverliezen beperkt worden door terugpompen van water van het afwaartse naar het opwaartse kanaalpand... wat resulteert in beperking van waterafname uit de Maas. Deze installaties werden reeds ontworpen. Daarbij is het ontwerp zo opgevat zodat ze, bij voldoende waterbeschikbaarheid, ook in omgekeerde richting als waterkrachtcentrale kunnen werken. In het Blue Deal project wordt de installatie ter hoogte van de sluis in Genk gebouwd.

Het Kanaal naar Charleroi wordt gevoed vanuit Wallonië. De afgelopen zomers werden we telkens geconfronteerd met een ontoereikende toevoer, waardoor in eerste instantie moest overgegaan worden tot gegroepeerd schutten, en in tweede instantie tot het instellen van een diepgangbeperking.

Door de bouw van pompinstallaties op de 4 sluisen van het kanaal kan deze problematiek vermeden worden en kan de scheepvaart ook in periodes met zeer lage waterbeschikbaarheid blijven doorgaan.

Voor de eerstvolgende zomers wordt in afwachting van de bouw van de vaste installaties voorzien in de huur van mobiele pompen.

PROJECTOMSCHRIJVING

In de Durmevallei is de bouw van 2 pompstations voorzien in de verdere realisatie van de Sigmagebieden Groot Broek en Klein Broek. Ze voorzien om het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten naar de Durme gecontroleerd af te voeren, alsook om de waterstand in het Sigmagebied Groot Broek te reguleren. De bouw van deze 2 pompstations biedt zowel een remediëring tegen de wateroverlast in de winterperiode in de Durmevallei (bij hoogtij en piekwaterstanden), als een remediëring tegen verdroging in de zomerperiode (sponswerking en verhoging grondwaterstanden in Groot Broek).

2. Dichting sluisdeuren zodat geen lekverliezen optreden – renovatie sluisdeuren

Uit patrimoniuminspecties blijken de lekverliezen ter hoogte van een reeks sluisdeuren niet verwaarloosbaar. Door een overwogen combinatie van renovatie/vervanging van deuren en modernisering van de bewegingsmechaniek zullen deze lekverliezen tot een minimum beperkt worden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	37.500.000 EUR
Output	7 bijkomende vaste pompinstallaties, aanpak van 3 sluiscomplexen met structurele herstellingswerken ter vermindering van lekverliezen.
Outcome	Verminderd verlies van water, Verbeterde waterallocatieopties, vergroten van de waterreserve, Verhoogde productie duurzame energie, Verbeterde afstemming waterallocatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De werken voor het vervangen van de sluisdeuren te Boezinge werden afgerond.</p> <p>Volgende initiatieven zijn in uitvoering (2 pompinstallaties):</p> <ul style="list-style-type: none">- Het contract voor de huur van mobiele pompen is in 2021 afgesloten, de droogtesituatie van 2019 indachtig. In afwachting van de bouw van vaste pompinstallaties bij de sluisen langs het kanaal naar Charleroi worden via dit contract telkens wanneer nodig mobiele pompen gehuurd. Op die manier kan een stremming van het scheepvaartverkeer in droogteperiodes vermeden worden.- In de Durmevallei is de bouw van 2 pompinstallaties in uitvoering ter hoogte van het Sigmagebied Groot Broek. Deze installaties zullen ervoor zorgen dat het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten te kunnen afvoeren naar de Durme, alsook om de waterstand in het Groot Broek te kunnen reguleren. <p>Volgende initiatieven zijn in voorbereiding (1 sluis en 5 pompinstallaties):</p> <ul style="list-style-type: none">- Voor de herstellingen aan de sluis Ooigem zijn de werken gegund en lopen de voorbereidende werken en onderzoeken.- De aanbestedingsprocedure voor de bouw van 4 pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi werd afgerond. De voorbereidende werken werden opgestart.- Voor de bouw van een pompinstallatie ter hoogte van de sluis te Genk loopt momenteel de procedure voor de omgevingsvergunning. Effectieve start werken is voorzien in Q1 2023. <p>Volgend initiatief is in aanbestedingsfase (2 sluisen):</p> <ul style="list-style-type: none">- De aanbestedingsprocedure voor het vervangen van de sluisdeuren van de sluis te

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	Briegden-Neerharen wordt opgestart in Q2 2022
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Vervangen sluisdeuren Boezinge Dorp	2021 Q4	Gerealiseerd	
Contract huur mobiele pompen in afwachting van ingebruikname effectieve pompen	2022 Q4	Op schema	
Structurele herstelling sluis Ooigem	2023 Q3	Vertraging	De oplevering is uitgesteld van Q4 2022 naar Q3 2023. Voor de renovatiewerken moet de sluis drooggezet worden en kunnen er gedurende een periode geen schepen geschut worden. Intensief overleg met stakeholders is hiervoor lopende. De planning van de werken is i.f.v. dit overleg.
Pompcapaciteit Albertkanaal / Pompcapaciteit Albertkanaal: Wijnegem	2023 Q4	Stopgezet	Wegens de hoge kostprijs van een aantal relanceprojecten wordt dit project verschoven naar 2023 en gefinancierd met reguliere middelen.
Pompinstallaties Durme t.h.v. Groot Broek (2 pompinstallaties)	2023 Q4	Op schema	
Pompcapaciteit Albertkanaal (Genk): Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale ter hoogte van het sluizencomplex (1 pompinstallatie)	2023 Q4	Op schema	
Pompinstallaties Kanaal Brussel-Charleroi (4 pompinstallaties)	2023 Q4	Op schema	
Vervangen sluisdeuren sluizen Briegden en Neerharen	2025 Q4	Vertraging	De studiefase heeft enige vertraging opgelopen maar het project is nog op schema om in 2022 te worden vastgelegd.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Voltooiing van Blue Deal-project: bouw van vaste pompinstallaties	7	2026 Q2		

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Voltooiing van Blue Deal-project: herstelling aan sluizen ter reductie/voorkomen van lekverliezen	4	2026 Q2	1	25 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	37.500.000 EUR
Uitvoering VAK	32.220.000 EUR
Uitvoering VEK	1.601.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 33.900.000 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 3.600.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering - bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Ondernemingen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Uit recente kaarten die gemaakt werden op basis van satellietbeeldenonderzoek blijkt dat België één van de Europese landen is die het zwaarst getroffen worden door de extreme droogte. Ons grondwater staat een pak lager dan normaal en daarmee doen we het slechter dan bijvoorbeeld Spanje en Zuid-Italië. Bijna de helft van onze oppervlakte staat in het diepste rood.

Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering die droogte en waterschaarste aanpakken:

- op een structurele manier;
- met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten;
- met betrokkenheid van de industrie als deel van de oplossing;
- met een duidelijke oproep naar de lokale besturen om ook inspanningen te doen.

Doelstelling van dit project is ondernemingen aan te zetten tot investeringen in innovatieve waterbesparende technologieën precies om zich te wapenen tegen waterschaarste en zich minder waterafhankelijk te maken. Dat doen we door bijkomend 10 miljoen euro te voorzien op de twee ecologiesteunmaatregelen, met name Ecologiepremie Plus (EP Plus) en Strategische Ecologiesteun (STRES), van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, specifiek voor waterbesparende projecten, door oproepen te lanceren voor waterbesparende projecten die niet subsidieerbaar zijn onder EP Plus of STRES, en ten slotte door waterscans aan te bieden aan ondernemingen die hun waterhuishouding en de potentiële winsten daarop in kaart brengen.

1) De EP Plus is een laagdrempelig steuninstrument om innovatieve maar gestandaardiseerde (breed uitrolbare) ecologische technologieën te ondersteunen. Via een applicatie kan een onderneming een steunaanvraag indienen voor een technologie die op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL), de lijst met steunbare technologieën, staat. Deze lijst evolueert en is vraaggestuurd, met andere woorden technologieën komen op de lijst doordat een leverancier of een investerende onderneming een aanvraag doet om een nieuwe technologie op de lijst te laten zetten. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) beoordeelt vervolgens het ecologisch voordeel, de meerkost en het steunpercentage op basis van de kosteneffectiviteit.

Los van de technologieën met betrekking tot waterbesparing die vandaag al op de lijst staan, bevraagt het Agentschap Innoveren & Ondernemen proactief de markt in de zoektocht naar nieuwe technologieën om op de lijst te zetten. Bovendien werd de EP Plus-technologieënlijst aangepast zodat de waterbesparende technologieën meer steun kunnen krijgen. Op die manier stimuleren we nog meer investeringen in relevante technologieën en schakelen we een versnelling hoger in het tegengaan van droogte en waterschaarste.

PROJECTOMSCHRIJVING

2) STRES anderzijds is een steuninstrument voor bedrijfsspecifieke, innovatieve investeringen die, omwille van hun bedrijfsspecifieke karakter, niet standaardiseerbaar of breed uitrolbaar zijn. Ook deze steunmaatregel staat open voor waterbesparende dossiers.

3) De oproepen 'waterbesparende investeringen' (BDEW) staan open voor kmo's die waterbesparende projecten zullen realiseren die omwille van hun niet-innovatieve karakter niet passen onder EP Plus of STRES. Deze oproepen zijn op die manier een brede en laagdrempelige aanvulling op de reguliere ecologiesteun.

4) De waterscans ten slotte brengen de waterhuishouding van een onderneming in kaart alsook waar er winsten behaald kunnen worden, niet alleen door het besparen op de waterafname, maar ook door het anders inzetten van (bijvoorbeeld proces)water. Een basisscan, die al goed beeld geeft en duidelijk maakt of een uitgebreide scan aangewezen is, wordt gratis aangeboden, terwijl de onderneming zelf een deel bijdraagt voor de uitgebreide scan.

Met deze aanpassingen van de ecologiesteun, gericht op het sterker stimuleren van (kleinere) ondernemingen tot investeringen in waterbesparende technologieën, een proactieve benadering van bedrijven via clusterorganisaties en andere overheidsinstellingen die werken rond de waterproblematiek bij bedrijven en het in de markt zetten van nieuwe, watergerichte steuninstrumenten, willen we meer (waterintensieve) bedrijven aanzetten tot waterbesparende investeringen zodat zij op die manier een structurele bijdrage kunnen doen aan de strijd tegen droogte en waterschaarste.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 15 goedgekeurde dossiers voor waterbesparende projecten
Outcome	Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen Duurzamer watergebruik via alternatieve bronnen Verhoogd gebruik van proceswater Nieuwe waterbesparende technieken en technologieën Verhoogde bewustwording duurzaam watergebruik

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle onderdelen van dit project (via vier steunkanalen, met name EP Plus, STRES, oproepen waterbesparende investeringen (BDEW) en waterscans) zijn opgestart. Intussen staat de tweede oproep waterbesparingsprojecten open en is de voorbereiding van de waterscans in finale fase.
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie nodig

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opzetten EP Plus en STRES voor waterbesparingsdossiers	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opzetten eerste oproep waterbesparingsdossiers	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opzetten volgende call(s) waterbesparingsdossiers	2022 Q2	Gerealiseerd	
Aanbieden van waterscans aan ondernemingen	2022 Q3	Op schema	
Tien miljoen euro steunbudget gealloceerd aan kwalitatieve projecten	2022 Q4	Op schema	
Start van projecten voor versterking van biodiversiteit en/of mitigatie van gevolgen van klimaatverandering	2023 Q2	Op schema	
Voltooiing van Blue Deal-projecten	2026 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde dossiers voor waterbesparende projecten	15	2022 Q4	25	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.337.000 EUR
Uitvoering VEK	156.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 10.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven en steun voor onderzoek in de landbouwsector](#)

[Ternota aan de Vlaamse Regering van 22 april 2022. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven in het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht](#)

VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Inzetten op onderzoek en innovatie productie, afzet en verwerking van droogteresistente teelten. Ketenpaanpak voorzien, gaat om nieuwe teelten zoals plantaardige eiwitten.

a) Project : "slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw". De plantaardige praktijkcentra in Vlaanderen zullen zich verenigen om een project uit te voeren gericht op enerzijds een innovatie-gedreven waterefficiëntie in land- en tuinbouw en anderzijds op een aanpassing van de teeltkeuze en/of teeltplan van de landbouwers.

b) Oproep droogteresistente teelten – eiwitten

De projectoproep 'Realisatie Eiwitstrategie' helpt concrete initiatieven i.k.v. de zes doelstellingen van de eiwitstrategie uit te voeren en de huidige knelpunten, zoals afzetontwikkeling, weg te werken. Bij deze initiatieven staat samenwerking tussen diverse partners in de eiwitketen voorop, waardoor duurzame eiwitketens opgezet en uitgebouwd worden. De projecten moeten bijdragen tot de verduurzaming en verbreding van het eiwitaanbod in Vlaanderen.

c) project 'FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer'. Dit project heeft als doel de Vlaamse landbouw weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering door te focussen op adaptatie van gewassen aan droogte en verzilting.

Binnen het project wordt geïnvesteerd in bijkomende gespecialiseerde infrastructuur die moet toelaten om de knowhow in Vlaanderen te versterken rond plantenveredeling met focus op droogtetolerantie en zoutstresstolerantie van bestaande of innovatieve gewassen en cultivars enerzijds en het modelleren van de impact van droogte op gewasopbrengsten anderzijds.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	8.000.000 EUR
Output	<p>a) 12 deelnemende partners aan het samenwerkingsverband Praktijkcentra Plant in kader van het project "slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw"</p> <p>b) 16 projecten die een minimumscore op de beoordelingscriteria behalen en worden geselecteerd</p> <p>c) 1 project FutureAdapt van EV ILVO</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Verminderd gebruik van kwetsbare bronnen - Verhoogd aandeel droogteresistente teelten - Bevorderde data- en kennisuitwisseling - Verhogen bevoorradingszekerheid voedingsnijverheid - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven
---------	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	a) project van samenwerkingsverband 'Praktijkcentra Plant' in uitvoeringb) oproep en selectie projecten oproep eiwitstrategie afgerond. Projecten in uitvoeringc) project 'Future Adapt' in uitvoering vanaf 2022
Noodzakelijke politieke actie	/

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring door VR van project 'slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'	2021 Q2	Gerealiseerd	
het project 'slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw' is gerealiseerd	2023 Q4	Op schema	
de oproep voor projecten 'realisatie eiwitstrategie' is gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
de selectie projecten 'realisatie eiwitstrategie' is afgerond	2022 Q1	Gerealiseerd	De selectie van de projecten is afgehandeld.
de geselecteerde projecten zijn uitgevoerd	2025 Q4	Op schema	Projecten zijn geselecteerd en de uitvoering kan worden gestart overeenkomstig de voorziene uitvoeringsperiode van de respectieve projecten.
Goedkeuring door VR van project 'FutureAdapt' van Eigen Vermogen ILVO	2021 Q2	Gerealiseerd	
het project 'FutureAdapt' is gerealiseerd	2024 Q4	Op schema	Uitvoering zoals voorzien in het project vanaf startdatum 1 januari 2022.

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
a)- deelnemers aan het samenwerkingsverband 'Praktijkcentra Plant' in kader van het project 'Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'	12	2023 Q4		
c)- project 'FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer'	1	2024 Q4		
b)- aantal projecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt geselecteerd	16	2025 Q4	19	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	8.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.291.000 EUR
Uitvoering VEK	1.199.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 8.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021: subsidie praktijkcentra plant (DOC VR2021 1607 VV DOC.0113/1bis)</p> <p>nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021: FutureAdapt (DOC VR2021 1607 VV DOC.0131/1bis)</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Bestedingskader middelen Projectoproep Realisatie Eiwitstrategie</p>

VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

a) pré-ecoregelingen

Er wordt aan landbouwers de kans geboden om een of meerdere nieuwe verbintenissen aan te gaan voor een termijn van 1 jaar.

- de inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel van minimum 30 are
- ecologisch beheer van grasland op een landbouwperceel van minimum 30 are
- de inzaai van milieu-, klimaat-, en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel van minimum 30 are
- toepassing van precisielandbouw per perceelniveau
- het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via het teeltplan

b) groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven

- productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven
- niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven (investerings waar de economische meerwaarde onbestaande is of zeer beperkt is)

Zowel binnen VLIF productieve en niet-productieve investeringen wordt voorrang gegeven aan investeringen die de waterkwantiteit en/of –kwaliteit ten goede komen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	<p>a) pré-ecoregelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - oppervlakte met verbintenis 'inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel' - oppervlakte met verbintenis 'ecologisch beheer van bestaand grasland op een landbouwperceel' - oppervlakte met verbintenis 'inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel' - oppervlakte percelen met toepassing van precisielandbouw per perceelniveau - oppervlakte met verbintenis 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via teeltplan' <p>b) groene investeringen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aantal productieve investeringen in land- en tuinbouwbedrijven - Aantal niet-productieve investeringen in land- en tuinbouwbedrijven

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Verhoogde waterretentie in de bodem - Verhoogde koolstofopslag in de bodem - Verhoogde infiltratie - Stimulans alternatieve verdienmodellen in de landbouw - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven
---------	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	a) pré-ecoregelingen: lopende b) groene investeringen: dossier VR in voorbereiding
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
pré-ecoregelingen: regelgeving goedgekeurd	2021 Q4	Gerealiseerd	
pré-ecoregelingen: aangaan verbintenissen	2022 Q2	Op schema	aanvragen kunnen tot eind mei worden ingediend
pré-ecoregelingen: verbintenissen uitgevoerd	2023 Q2	Nog niet gestart	
pré-ecoregelingen: aanpassing regelgeving goedgekeurd	2022 Q3	Op schema	regelgeving op administratief niveau afgerond, goedkeuringsprocedure moet nog worden doorlopen. Bijkomend budget wordt voorzien
goedkeuring dossiers productieve en niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	2022 Q4	Nog niet gestart	
personeel is aangeworven	2021 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
oppervlakte percelen met toepassing van precisielandbouw per perceelniveau (ha)	25.500	2022 Q4		
oppervlakte met een verbintenis 'inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel' (ha)	3.000	2022 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
oppervlakte met een verbintenis 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via teeltplan' (ha)	50.000	2022 Q4		
oppervlakte met een verbintenis 'ecologisch beheer van bestaand grasland op een landbouwperceel' (ha)	3.940	2022 Q4		
oppervlakte met een verbintenis 'inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel' (ha)	3.380	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	12.000 EUR
Uitvoering VEK	12.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 september 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit
Advies van de Raad van State

VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

De projectoproep “Hergebruik Restwater” wil het hergebruik van restwater in de land- en tuinbouwsector stimuleren. Met deze projectoproep wordt ingespeeld op de uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende waterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. De projecten moeten bijdragen tot het verhoogd aanwenden van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik.

Samenwerkingsverbanden tussen landbouwers met een watervraag enerzijds en aanbieders van restwater anderzijds kan leiden tot een win-win situatie. De landbouwsector verhoogt zo de bevoorradingszekerheid voor water, terwijl hergebruik van restwater ook zorgt voor een afname van de druk op kwetsbare waterbronnen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	- 9 projecten die een minimumscore op de beoordelingscriteria behalen en worden geselecteerd
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Verduurzamen watergebruik via alternatieve bronnen - Vergroten van de waterreserve - Verhogen bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven - Bevorderde data- en kennisuitwisseling

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
oproep voor projecten is gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
de selectie van de projecten is afgerond	2022 Q1	Op schema	jurering gebeurd, goedkeuringsprocedure lopende
geselecteerde projecten zijn uitgevoerd	2025 Q4	Nog niet gestart	
overkoepelende studiedag en brede kennisdeling	2025 Q4	Nog niet gestart	
personeel is aangeworven	2021 Q4	Gerealiseerd	
uitbesteding behandeling dossiers na 2022	2022 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal projecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt gesubsidieerd	9	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	17.000 EUR
Uitvoering VEK	17.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Bestedingskader middelen Projectoproep Hergebruik Restwater](#)

VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR IN DE BEBOUWDE OMGEVING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit relanceproject wil de Vlaamse overheid groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving versneld stimuleren en ondersteunen binnen het Vlaams adaptatiebeleid. Het vanuit het departement Omgeving eerder geïnitieerde programma 'Vlaanderen breekt uit' zal gebruikt worden om de acties en maatregelen van dit project op te zetten.

Met de oproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte' worden maximaal 15 ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen geselecteerd die voorbeeld stellend willen zijn voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie van de Vlaamse regering. De bedoeling is om ter beschikking te staan voor vragen van deze steden en gemeentes en om samen met hen op zoek te gaan naar de projecten met de grootste meerwaarde voor de doelstellingen uit de Blue Deal.

De geselecteerde steden en gemeentes zullen in kader van de oproep enerzijds minstens 3 quick-win projecten realiseren binnen de drie jaar. Met de quick-wins realiseren de gemeentes een significante toename van groen en blauw binnen de bebouwde omgeving. Daarnaast zal de gemeente een concreet uitvoeringsdossier moeten opstellen voor een transformatieproject dat een structurele ruimtelijke transformatie realiseert voor groenblauwe dooradering, klimaatadaptatie, waterretentie en -infiltratie en een grotere meerwaarde biedt voor de lokale leefomgevingskwaliteit. Belangrijk bij al deze projecten is het hefboomeffect dat ze hebben voor de ruimere omgeving.

Door het engagement van lokale besturen voor verankering van een onthardingsvisie in de lokale beleidsplanning en door het opnemen van een ambassadeursrol voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie, wordt een structurele aanpak van deze beleidsvoornemens in de toekomst gegarandeerd. Ze betrekken hierbij doelgroepen en stakeholders met als doel een breed draagvlak te creëren in de regio voor groenblauw en klimaatadaptatie.

Een vervolgooproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0' worden nog meer lokale besturen gestimuleerd om ook een project in te dienen. Ze worden ondersteund om 1 tot 3 quick-wins vergelijkbaar met de eerste oproep uit te voeren.

Om een onthardings- en vergroeningsgolf op gang te brengen, worden bovendien verenigingen en intercommunales ondersteund in de realisatie van projecten die zorgen voor ontharding en vergroening en zo onder meer droogte tegengaan. Dit via de oproep 'groenblauwe parels'. Zo ontstaat een grotere coalitie van actoren die actief de bebouwde omgeving klimaatadaptief willen inrichten.

PROJECTOMSCHRIJVING

Deze oproep richt zich op kleine en middelgrote projecten rond ontharding en vergroening met aandacht voor de droogteproblematiek van de bodem o.a. via een betere waterinfiltratie in de bebouwde omgeving. Er wordt ingezet op zowel private als publieke delen van terreinen. Opdat de projecten een grote voorbeeldfunctie zouden hebben, wordt er gekozen voor terreinen met een grote zichtbaarheid voor verschillende doelgroepen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> • 30 quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 2,5 jaar en maximaal 27 quick-win projecten gerealiseerd binnen de drie jaar. • 10 uitvoeringsdossiers (inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor ruimtelijke transformatieprojecten gericht op groenblauwe dooradering zijn uitgewerkt en klaar voor uitvoering • minstens 45 kleine en middelgrote projecten zijn gerealiseerd • 1 Vlaams-brede campagne en leertraject gelanceerd rond groenblauwe dooradering en ontharding
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Verminderde afvoer van hemelwater • Verhoogde infiltratie • Verhoogde grondwatervoorraad • Temperatuurregulatie • Meer groen en biodiversiteit • Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit • Draagvlakcreatie voor groenblauw en klimaatadaptatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse Regering keurde op 13 mei 2022 de ondersteuning goed van de projecten van tien steden en gemeenten, die geselecteerd werden als resultaat van de eerste projectoproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte'.</p> <p>De oproepen 'groenblauwe parels' en 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0' werden begin april 2022 zijn gelanceerd. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 8 augustus 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Groenblauwe infrastructuur: lancering oproep 2021 naar lokale besturen	2021 Q3	Gerealiseerd	
Lancering oproep naar verenigingen en intercommunales	2022 Q2	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Selectie van 10 steden en gemeenten op basis van de ingediende voorstellen	2022 Q2	Gerealiseerd	
Start begeleidingstraject, inhoudelijke studie en procesbegeleiding gebiedsprogramma's	2022 Q2	Op schema	
10 masterplannen, financiële plannen, en overeenkomsten met partners voor transformatieprojecten zijn uitgewerkt	2024 Q4	Nog niet gestart	
Realisatie van 30 quick-win projecten (2,5 jaar)	2024 Q4	Nog niet gestart	
Realisatie van minstens 45 kleine en middelgrote projecten (3 jaar) rond ontharding en vergroening in de bebouwde omgeving	2026 Q1	Nog niet gestart	
Realisatie van maximaal 27 quick-win projecten (3 jaar) rond ontharding en vergroening in de bebouwde omgeving	2026 Q1	Nog niet gestart	
10 uitvoeringsdossiers voor complexe transformatieprojecten opgestart en in realisatie	2026 Q3	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vlaams-brede campagne gelanceerd rond groenblauwe dooradering en ontharding	1	2023 Q4		
Aantal quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 2,5 jaar	30	2024 Q4		
Realisatie van kleine en middelgrote projecten rond ontharding en vergroening in de bebouwde omgeving	45	2026 Q1		
Quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 3 jaar	27	2026 Q1		
Aantal uitgewerkte uitvoeringsdossiers (inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor ruimtelijke transformatieprojecten gericht op groenblauwe dooradering	10	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	225.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK

0 EUR

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving](#)

Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving: 10 subsidiebesluiten: 13 mei 2022 op voorstel van Vlaams minister Zuhair Demir (niet publiek beschikbaar)

VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	bedrijven, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, rioolbeheerders, drinkwatermaatschappijen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.

Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het inzetten op een meer duurzaam watergebruik onder meer door het aanspreken van alternatieve waterbronnen, een slimme sturing in waternetwerken en buffers.

Dit project bestaat uit onderstaande onderdelen. Het project wordt integraal gerealiseerd met relancemiddelen.

1. Proeftuinen Droogte

Via de proeftuinen droogte worden bedrijven die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, gesubsidieerd bij de concrete uitvoering van hun project. De selectie van de meest innovatieve en effectieve gebeurt na een algemene oproep. Om complementair te zijn aan bestaande ondersteuningsmogelijkheden voor bedrijven en landbouwbedrijven wordt deze subsidie benut voor samenwerkingsverbanden van minstens 3 bedrijven.

Zowel in 2019 als 2020 kregen bedrijven reeds de kans om voorstellen in te dienen en werden resp. voor 4 miljoen en 3,2 miljoen subsidies toegekend.

Via dit nieuwe initiatief zullen ook in 2021 en 2022 soortgelijke oproepen worden gelanceerd en zullen projecten worden gesubsidieerd. Het voorziene subsidiebudget bedraagt 4 miljoen per jaar.

2. Call circulair water: grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van bestaande buffers en optimale benutting van effluent

Via dit initiatief worden in de praktijk projecten ondersteund die:

- zorgen dat hemelwaterbuffers door een slimme sturing optimaler kunnen worden ingezet
- grootschalige collectieve buffers realiseren om zo een oplossing te bieden aan bestaande of potentiële watertekorten of suboptimaal watergebruik
- Effluent op een duurzame manier inzetten om te voldoen aan een lokale watervraag, dus zonder de

PROJECTOMSCHRIJVING

ecologie van de ontvangende waterloop te hypothekeren of aanleiding te geven tot intensief transport over de weg van water.

Een aantal interessante piloten worden geselecteerd en op het terrein geïmplementeerd.

Voor dit initiatief wordt over de periode 2021-2022 een subsidiebudget van 16 miljoen euro uitgetrokken.

3. Automatisatie meetnetten oppervlaktewater en grondwater

Via dit initiatief worden de nodige investeringen uitgevoerd om de bestaande meetnetten performanter te maken door het fijnmaziger te maken en de stap te zetten naar digitale monitoring en datavergaring om in periodes van droogte het nemen van goed onderbouwde (beleids)beslissingen op lokale of regionale schaal te faciliteren. De data-ontsluiting is hierbij ook voorzien.

Het voorgestelde Blue Deal project draagt bij aan het effectiever en efficiënter beheer van de zoetwaterreserves zowel voor grond- als oppervlaktewater bij droogte en waterschaarste, het gericht monitoren van het oppervlaktewater in functie van o.a. waterproductiecentra, het opvolgen van verzilting, het in kaart brengen van milieu-incidenten en het onderbouwen van het waterbeleid.

Het initiatief omvat volgende concrete onderdelen:

- De automatisatie van het kwaliteitsmeetnet oppervlaktewater door de inzet van onder meer multiparametersondes en geautomatiseerde monsternametoestellen; De aankoop van de hardware gebeurt in 2022, het bijbehorende beheer wordt ingezet over een periode van drie jaar vanaf 2022.
- De automatisatie van grondwaterpeilmetingen en de uitbreiding van het grondwatermeetnet: De installatie van de automatische peilmeetsondes wordt gespreid over 2021-2023. De uitbreiding van het meetnet is voorzien voor 2022.
- De uitbreiding van het laagwatermeetnet waterlopen: Hiervoor worden in 2022 de nodige investeringen voorzien.

4. Slimme datasystemen VMM

We investeren in slimme datasystemen voor water waarin we informatie over het watersysteem en de waterketen samenbrengen en toegankelijk maken voor specifieke eindgebruikers: lokale besturen, waterbeheerders, kennisinstellingen, sectorale stakeholders, De watersysteemdata en -informatie worden gebiedsgericht aangeboden via meerdere ingangen, voorstellingswijzen en communicatiekanalen zoals loketten en tools, interactieve indicatoren, dataportalen, Alle data worden aangeboden als 'open data' zodat externe partijen er bijkomende services rond kunnen ontwikkelen. De slimme datasystemen worden gerealiseerd door de bestaande portalen met watergerelateerde data zoals Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), Waterinfo en het Klimaatportaal verder uit te bouwen en met elkaar te koppelen of te integreren. Daarnaast zullen een aantal nieuwe modules opgezet worden rond waterkwaliteit, waterbeleving en drinkwater. De technische uitwerking van de modules zal uit efficiëntie-overwegingen zo veel mogelijk gekoppeld en geïntegreerd verlopen. Op die manier groeien we toe naar één slim waterplatform.

5. Slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin

Met dit project wordt het hoofdnetwerk van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen omgevormd tot een slim net. De infrastructuur wordt uitgebreid met een "digitale laag" die in staat is een nieuwe functie te vervullen in het kader van de klimaatverandering en meer bepaald de strijd tegen droogte. Via het project worden concrete initiatieven genomen omtrent het digitaal meten en regelen van de bovenlokale hemel- en afvalwaterinfrastructuur. We maken werk van het optimaal verzamelen, delen en combineren van data tot kennis, inzichten en slimme sturingen. Het project ambieert de digitalisering van de infrastructuur om via real-time monitoring en simulaties naar predictieve modellering en slimmere sturingen een efficiënt en ecologisch antwoord te bieden op klimaatuitdagingen maar ook tegelijk op energie management reducties, vuilvrachtreductie en veiligheidspreventie van alle betrokkenen die op de infrastructuur toegang nodig hebben.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	45.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - 15 projecten gerealiseerd in het kader van de proeftuinen Droogte - 8 projecten gerealiseerd in het kader van de call circulair water - 14 bijkomende automatische meetpunten oppervlaktewaterkwantiteit beschikbaar - 200 automatische meetpunten grondwater incl dataaansluiting beschikbaar - 180 automatische meetpunten voor oppervlaktekwaliteit gerealiseerd - 2 nieuwe en 2 geoptimaliseerde modules binnen het nieuwe dataportaal water gerealiseerd - nieuwe automatiseringsarchitectuur en het smart data platform bij Aquafin beschikbaar
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering infrastructuur • Verbeterde werking watersysteem via slimme sturing • Bevorderde data- en kennisuitwisseling • Verduurzaamd watergebruik via alternatieve bronnen • Verhoogd gebruik van proceswater • Snellere detectie van calamiteiten • Verbeterde onderbouwing waterbeleid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Half maart werd een nieuwe oproep voor de Proeftuinen Droogte 2022 gelanceerd. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat het circulair watergebruik en de waterbeschikbaarheid verhoogt, konden tot en met 30 mei een beknopt voorstel indienen. Er werden 16 voorstellen ingediend. Na begeleiding moeten op 7 september definitieve projectvoorstellen worden ingediend. De call circulair watergebruik werd half februari afgesloten. Er kwamen 35 aanvragen voor het luik grootschalig hergebruik van hemelwater en 14 voor het luik hergebruik van RWZI-effluent binnen. De beoordeling van de verschillende projectvoorstellen is lopende. Het bestek voor de automatisatie van de laagwatermeetnetten is geopend. Gezien de hoge inschrijvingsprijs werd de opdracht niet gegund, en is een aangepast bestek in voorbereiding. De vooropgestelde timing komt niet in het gedrang. Voor de automatisatie van het grondwatermeetnet is de beoordeling van de offertes lopend, ook voor de automatisering van het oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnet is de aanbesteding gebeurd en is de onderzoek van de offerte(n) gestart. De uitwerking van de slimme datasystemen VMM is opgestart. In de zomer wordt een bestek gepubliceerd om een aantal geselecteerde use cases uit te werken. Vervolgstappen worden voorbereid. Daarnaast is ook de analysefase voor de ontwikkeling van de bemalingstool lopend. Hierbij wordt ook een koppeling van DOV met het omgevingsloket voorzien.</p> <p>De uitwerking van de slimme hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur is van start gegaan. Er is een dataplatform opgezet dat data vanuit verschillende systemen capteert. Er zijn bijbehorende technische guidelines opgesteld.</p>
Noodzakelijke politieke actie	In 2022 zullen een aantal subsidiedossiers in het kader van de oproep "Proeftuinen Droogte 3.0" en de call circulair water ter goedkeuring worden voorgelegd aan minister Zuhair Demir en aan de Vlaamse Regering.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Proeftuinen Droogte: lancering oproep 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opgezet Aquafin dataplatform in the cloud	2021 Q4	Gerealiseerd	
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Herverdeling middelen uit relanceprovisie + opdracht uitvoering aan Aquafin voor het deelproject slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin	2021 Q4	Gerealiseerd	
Call circulair water: lancering oproep	2022 Q1	Gerealiseerd	
Guidelines en catalogustool beschikbaar tbh de data governance bij Aquafin	2022 Q2	Gerealiseerd	
Proeftuinen Droogte lancering oproep 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	
Selectie projecten circulair water	2022 Q4	Op schema	
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2022	2022 Q4	Op schema	
Een cloud gebaseerd IoT-dataplatform in gebruik bij Aquafin	2022 Q4	Op schema	
Uitbreiding volautomatisch meetnet oppervlaktewaterkwantiteit met minstens 14 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2023 Q2	Op schema	
Uitbreiding van het grondwatermeetnet met minstens 10 bijkomende meetplaatsen	2023 Q3	Op schema	
De realisatie van minstens 2 nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal en minstens 2 bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	2023 Q4	Op schema	
Grootschalige connectie van IoT devices met het Aquafin IoT-platform	2023 Q4	Op schema	
Gartner maturiteitsniveau 3 bereikt voor de data governance bij Aquafin	2024 Q4	Op schema	
de automatisatie architectuur voor een toekomstgerichte sturing is klaar om verder te worden uitgerold op de waterzuiveringsinfrastructuur van Aquafin	2024 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Automatische metingen grondwater in minstens 200 putten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2025 Q4	Op schema	
Automatische metingen oppervlaktewaterkwaliteit voor minstens 180 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2025 Q4	Op schema	
Een smart data platform en nieuwe automatiseringsarchitectuur is beschikbaar om intelligente sturing van de Aquafin-infrastructuur toe te laten	2025 Q4	Op schema	
Volledige uitvoering projecten call circulair water	2026 Q3	Op schema	
Volledige uitvoering projecten Proeftuinen Droogte door geselecteerde samenwerkingsverbanden	2026 Q3	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
bijkomende automatische meetpunten oppervlaktewaterkwantiteit	14	2023 Q2		
Aantal bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	2	2023 Q4		
Aantal nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal water	2	2023 Q4		
Aantal bijkomende automatische meetpunten voor oppervlaktekwaliteit	180	2025 Q4		
Aantal nieuwe automatische meetpunten grondwater incl dataontsluiting beschikbaar	200	2025 Q4		
Aantal projecten gerealiseerd in het kader van de Proeftuinen Droogte	15	2026 Q3		
Aantal projecten gerealiseerd in het kader van de call circulair water	8	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	45.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	45.000.000 EUR
Uitvoering VAK	8.976.000 EUR
Uitvoering VEK	6.816.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 43.300.000 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 1.700.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving](#)

VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Sensibilisering, opleiding en advisering van land- en tuinbouwers, onder meer door in te zetten op digitalisering (online tools, bedrijfsdata verzamelen en analyseren, ...)

a) projectoproepen samenwerking

Om de gevolgen van de Covid-19-pandemie op de land- en tuinbouwsector te milderen worden projectoproepen rond samenwerking m.b.t. ondernemerschap, digitalisering en kennisdeling gelanceerd. De samenwerkingsprojecten beogen oplossingen voor water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënter beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook kunnen zij gericht zijn op een digitale transformatie met het oog op het verhogen van veerkracht en ondernemerschap van bedrijven.

b) bodempaspoort

Met het bodempaspoort zal een digitaal en gebruiksvriendelijk instrument ontwikkeld worden en aangeboden worden aan de landbouwer, waarbij bodemdata uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier en op perceelsniveau worden samengebracht. Op die manier wordt de landbouwer gestimuleerd om een data-gedreven, gericht en meer duurzaam bodembeheer uit te voeren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	6.000.000 EUR
Output	<p>a) projectoproepen samenwerking</p> <p>- 15 samenwerkingsprojecten</p> <p>b) bodempaspoort</p> <p>- 1 digitaal instrument</p>
Outcome	<p>- Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen</p> <p>- Toegenomen waterreserve</p> <p>- Digitalisering leer- en adviestrajecten</p> <p>- Positie van de landbouwer in de voedselketen versterkt</p> <p>- Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
de projectoproep samenwerking 2021 is gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
selectie projecten i.k.v. oproep 2021 'samenwerking' is afgerond	2022 Q1	Gerealiseerd	
de projecten oproep 'samenwerking' zijn uitgevoerd	2025 Q4	Op schema	
de projectoproep samenwerking 2022 is gelanceerd	2022 Q4	Stopgezet	oproepen samenwerking wordt beperkt tot 1 oproep in 2021, waarbij 82% van het voorziene budget werd toegekend. Resterend budget wordt aangewend i.k.v. maatregelen rond de gevolgen van de Oekraïne-crisis.
bodempaspoort	2022 Q4	Op schema	
personeel is aangeworven	2021 Q3	Gerealiseerd	
uitbesteding behandeling dossiers na 2022	2022 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bodempaspoort: digitaal instrument	1	2022 Q4		
Oproep samenwerking: aantal samenwerkingsprojecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt gesubsidieerd	15	2023 Q1	14	93 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	2.426.000 EUR
Uitvoering VEK	51.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Sensibilisering, opleiding en advisering](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 september 2021 \(VR 2021 1009 VV DOC.0139/1BIS\). Bodempaspoort](#)

VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Vlaamse Milieumaatschappij - De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Lokale besturen, waterbeheerders, terreinbeherende verenigingen, landbouwers, private eigenaars, ...

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering onder andere inzetten op natuurgebaseerde oplossingen om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving toekomstgericht te herstellen. Met die aanpak beoogt ze integrale oplossingen uit te werken die de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit verhogen, die helpen om de impact van klimaatverandering op te vangen en te milderen, en die bijdragen tot o.a. aanvulling van de grondwatertafel, biodiversiteitsherstel en een verhoogde koolstofopslag. In het kader van de relance-investeringen werden vier gebieden in Vlaanderen geselecteerd als 'vlaggenschip'projecten om deze integrale, natuur-gebaseerde aanpak versneld te ontwikkelen en te realiseren.

Tijdens de periode 2021–2024 wordt in die vier projectgebieden versneld en op grote schaal ingezet op concrete terreinrealisaties. Het betreft het kustduinencomplex (West-Vlaanderen), Rivierherstel Leie (West- en Oost-Vlaanderen), Vallei van de Kleine Nete (Antwerpen) en het brongebied van de Zwarte Beek (Limburg). Gezamenlijk bestrijken die vier projecten een breed spectrum van specifieke wateruitdagingen, waarvoor natuurgebaseerde oplossingen ontwikkeld en gerealiseerd zullen worden. Deze projecten zullen telkens ingebed worden in een brede gebiedswerking met alle betrokken actoren. Voor Rivierherstel Leie en de vallei van de Kleine Nete bestaat er reeds zo'n (langlopende) gebiedswerking. Aan de kust wordt de uitdaging opgenomen als nieuw spoor binnen de gebiedswerking van T.OP Kustzone. Voor de Zwarte beek wordt er een gepaste governance opgezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	23.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m² gesloopte bebouwing, afgegraven terreinen en weggenomen verharding - Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m² verworven woon-, woonuitbreidings- en recreatiegebied i.f.v. realisatie rivier- en valleierstelproject - Kleine Nete: (deelproject 2): Aantal m² verworven project- en/of ruilgronden in functie van realisatie natte natuurdoelen SBZ-H - Zwarte Beek: Aantal ha verworven of ingericht ten bate natte natuur - Duinencomplex: Aantal gerealiseerde projecten ifv versterking watersysteem kustduinen - Rivierherstel Leie: Aantal ha ingerichte of verworven natte natuur

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Opmaak en uitvoering meerjarenprogramma voor gebiedsgerichte projecten rond waterberging, - buffering en infiltratie. Herstel van habitatrichtlijngebieden met structurele verdrogingsproblemen. • Kustduinen: realisatie doelstellingen ambitienota voor de versterking van watersysteem van de kustduinen. • Vernatten van gebieden • Verhoogde infiltratie • Verhoogde waterretentie in de bodem • Verhoogde koolstofopslag in de bodem • Verbeterde hydromorfologie • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Verminderde verzilting • Bijkomende groenblauwe verbindingen
---------	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Vlaggenschip Kleine Nete</p> <p>- Deelproject 1. De Grote Opkuis (trekker VMM). De 13 betrokken Kleine Nete-gemeenten hebben zich in het kader van het strategisch project o.a. geëngageerd om op korte termijn (tegen 2024) elk minstens 1 ha netto ontharding en 13 ha bosuitbreiding te realiseren. Om deze ambitie inzake ontharding waar te maken en te faciliteren wordt vanuit het beleidsdomein Omgeving het initiatief genomen om in één centrale aanbesteding voor werken de concrete sloop van gebouwen en constructies en het wegnemen van verhardingen, ophogingen en verontreinigingen etc. met het oog op valleierherstel en herstel van de infiltratiecapaciteit op te nemen waarbij dergelijke werken op korte termijn effectief uitgevoerd kunnen worden op de terreinen van de betrokken gemeenten of andere partners binnen de gebiedswerking.</p> <p>- Deelproject 2. Grondverweving signaalgebied Olympiadelaan Herentals i.f.v. valleierherstel (trekker ANB). De Vlaamse Regering duidde het woonuitbreidingsgebied Olympiadelaan langs de Kleine Nete in Herentals aan als signaalgebied. Via een samenwerkingsverband tussen stad Herentals, provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid is de afgelopen jaren een ambitieuze ontwikkelingsvisie uitgewerkt voor dit gebied waarbij de Kleine Nete opnieuw ruimte zal krijgen om te meanderen en dit gebied heringericht zal worden valleigebied zodat een groenblauwe ader van formaat doorheen het kleinstedelijk gebied Herentals gerealiseerd wordt. Binnen het beleidsdomein Omgeving engageert VMM zich om de werken voor de herinrichting op korte termijn uit te voeren (via VV035 Groenblauwe infrastructuur – waterlopen), doch om dit te kunnen realiseren is een specifieke grondbeleidsstrategie ontwikkeld waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos deze gronden (bestemd als woonuitbreidingsgebied en woongebied) verwerft (en het latere beheer van het nieuw te ontwikkelen stedelijk natuurgebied op zich neemt) en de stad Herentals instaat voor de herlokalisatie van een aantal bestaande functies (zoals voetbalterreinen en delen van het recreatiepark Netepark) die binnen deze als natte natuur te ontwikkelen zone niet behouden kunnen blijven.</p> <p>- Deelproject 3. Versnellen grondmobiliteit i.f.v. de realisatie van de natte natuurkernen van Natura 2000 (trekker VLM). Binnen de vallei van de Kleine Nete dienen in uitvoering van de door de Vlaamse Regering vastgestelde Europese natuurdoelen (IHD) een aantal grote natte natuurkernen ontwikkeld te worden. Het gaat o.a. om de SBZ-H-gebieden van Graafweide-Schupleer, Olens Broek-Langdonken, De Zegge-Mosselgoren en waar nog een oppervlakte van meer dan 300 ha nieuwe natte natuur te realiseren is. Voor de realisatie</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>van de natte natuur zijn grondverwevingen nodig. Zowel voor de verwerving van projectgronden in SBZ-H als voor ruilgronden voor landbouwers die uitgeruild moeten worden. Grondaankopen kunnen o.a. via een aantal bestaande grondenbanken die daarvoor ingezet kunnen worden, maar verlopen in praktijk moeizaam. Om dit proces te kunnen versnellen wordt voorgesteld om aanvullend het instrument ‘vergoedingen bij lokale grondenbanken’ uit het decreet landinrichting in te zetten. Op 1 april 2022 besliste de Vlaamse Regering op 1 april 2022 over de inzet instrument ‘vergoedingen bij lokale grondenbanken’ voor deelproject 3 binnen vlaggenschipproject Kleine Nete</p> <p>Vlaggenschip kustduinencomplex</p> <p>De resultaten van de eerste subsidieoproep uit september 2021 werden door de Vlaamse Regering op 22 april 2022 goedgekeurd. Er werd een project geselecteerd voor Aquaduin in Koksijde. Een tweede oproep werd gelanceerd in mei 2022. Weerhouden projecten zullen in het najaar van 2022 teer goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.</p> <p>Vlaggenschip Rivierherstel Leie</p> <p>Om de effectieve realisatie van de vooropgestelde watergebonden, terrestrische natuur in het kader van Rivierherstel Leie te versnellen, keurde de Vlaamse Regering op 24 september 2021 een aantal bijsturingen goed op het vlak van projectgebieden, timing en flankerend beleid. Zo breidt ze het projectgebied uit tot alle 15 deelgebieden uit het plan-MER van het geïntegreerde Seine-Schelde project en geeft ze aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht onverwijld alle initiatieven te nemen in functie van de ontwikkeling van de watergebonden terrestrische natuur in de Leievallei tussen Wervik en Deinze. Hiervoor wordt een bedrag van 5,6 miljoen euro gereserveerd uit het plan Vlaamse Veerkracht, aangevuld met reguliere kredieten van ANB en VLM. Het flankerend beleid wordt aangevuld met twee bijkomende vergoedingen voor het zoekgebied, met name eigenaarstoelage en pachtaanvaardingsvergoeding. Om het draagvlak in de regio te garanderen, wordt een intendant aangesteld die in dialoog met de eigenaars en gebruikers van de gronden en de landbouworganisaties op zoek gaat naar instrumenten voor de effectieve realisatie. Het departement Omgeving zal starten met de opmaak van het AGNAS-GRUP Bavikhove – Deinze om de nodige herbestemmingen in functie van rivierherstel Leie door te voeren. Deze beslissing gaf een nieuw elan in de werking rond Rivierherstel Leie : de intendanten zijn gestart in het gebied, het tempo van de grondaankopen is gestegen, de LER’s en inrichtingsplannen zijn ingepland volgens de timing in de nota Vlaamse regering, de oenteigeningsbesluiten zijn in voorbereiding.</p> <p>Vlaggenschip Zwarte Beek</p> <p>Voor Zwarte Beek werd het natuurinrichtingsproject i.s.m. VLM opgestart. Daarnaast lopen de procedures in het kader van mogelijke verwervingsopportuniteiten in het brongebied van de Zwarte Beek.</p>
<p>Noodzakelijke politieke actie</p>	<p>Voorlopige vaststelling ontwerp RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk. Het voorstel van ontwerp-RUP werd in april 2022 overgemaakt aan de bevoegde minister in functie van een voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering. Tot op heden is er géén beslissing genomen. Het RUP voorziet de noodzakelijke herbestemmingen voor o.a. de realisatie van de natte natuurkernen binnen SBZ-H. De uitvoering van de verschillende Bleu Deal-projecten (zowel binnen als buiten het vlaggenschipproject) is afhankelijk van de bestemmingswijzingen in dit RUP. In de Vlaamse Regering medio 2022 géén beslissing neemt over de voorlopige vaststelling van</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

het RUP, kan dat leiden tot vertraging van de uitvoering van deze initiatieven en mogelijk ook tot het niet tijdig kunnen besteden van de beschikbare Blue Deal-budgetten.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Kleine Nete: Goedkeuring rapportering en werkplan gebiedswerking Kleine Nete	2020 Q4	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Selecteren deelprojecten voor financiering binnen Vlaggenschip Kleine Nete	2021 Q2	Gerealiseerd	
Kustduinen: Opmaak ambitienota voor waterfuncties in de kustduinen met relevante stakeholders	2021 Q2	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 2. Opmaak schattingsverslagen te verwerven gronden	2021 Q3	Op schema	
Kleine Nete: Deelproject 3. Voorbereiden ontwerpbeslissing Vlaamse Regering inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2021 Q3	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 1. Uitwerken bestek en selecteren op te nemen locaties en werken	2021 Q3	Gerealiseerd	
Kustduinen: Lanceren projectoproep voor realisatie ambities + selectie projecten ism expertengroep	2021 Q4	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 3. Beslissing Vlaamse Regering inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2021 Q4	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 2. Onderhandelingen met eigenaars i.f.v. opmaak overeenkomst over prijs te verwerven gronden	2021 Q4	Op schema	
Kustduinen: Beslissing Vlaamse Regering over eerste projectoproep + lanceren tweede projectoproep	2022 Q1	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 1. Publiceren bestek	2022 Q3	Op schema	
Kleine Nete: Deelproject 3. Inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2022 Q4	Op schema	
Kustduinen: Beslissing Vlaamse Regering over tweede projectoproep	2022 Q4	Op schema	
Zwarte Beek: Verwerving 150 ha ten bate van natte natuur in het brongebied Zwarte Beek	2022 Q4	Op schema	
Kustduinen: Goedkeuring Vlaamse Regering projecten tweede oproep	2024 Q3	Op schema	
Rivierherstel Leie: Opmaak LER voor vijf bijkomende deelgebieden	2024 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Rivierherstel Leie: Opmaak inrichtingsplannen en uitvoeringsplannen voor 4 deelgebieden rivierherstel Leie	2024 Q4	Op schema	
Rivierherstel Leie: Realisatie 100 ha natte natuur rivierherstel Leie	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Zwarte Beek: Aantal ha verworven of ingericht ten bate natte natuur	150	2022 Q4		
Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m ² gesloopte bebouwing, afgegraven terreinen en weggenomen verharding	50.000 m ² (5 ha)	2022 Q4		
Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m ² verworven woon-, woonuitbreidings- en recreatiegebied i.f.v. realisatie rivier- en valleierherstelproject	70.000 m ² (7 ha)	2022 Q4		
Kleine Nete: (deelproject 2): Aantal m ² verworven project- en/of ruilgronden in functie van realisatie natte natuurdoelen SBZ-H	1.000.000 m ² (100 ha)	2024 Q4		
Rivierherstel Leie: Aantal ha ingerichte of verworven natte natuur	100	2024 Q4		
Duinencomplex: Aantal gerealiseerde projecten ifv versterking watersysteem kustduinen	10	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.519.000 EUR
Uitvoering VEK	5.519.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 19.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020. Tussentijdse beslissing gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020. Voortgangsrapportage gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier. Bijlage](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 1 april 2022. Voortgangsrapportage coördinatieopdracht Kleine Nete en Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – vlaggenschipproject Kleine Nete](#)

[Coördinatie Kleine Nete. Bijlage](#)

VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Grondeigenaars, terreinbeherende organisaties, gemeenten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.

Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het vasthouden van water en het voorzien van meer ruimte voor water door het aanleggen van groenblauwe netwerken, het voorzien van buffers, het hermeanderen van waterlopen, het herstellen van winterbeddingen etc. om zo de waterbeschikbaarheid te verhogen.

Het totaalproject bestaat uit een reeks investeringsprojecten waarmee de VMM als beheerder van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie inzet op het creëren van groenblauwe netwerken en het aanpassen van de beschikbare infrastructuur (wachtbekkens, stuwen) zodat zij kunnen worden ingezet om ook in tijden van droogte tot een optimaal waterlopenbeheer te komen voor mens en natuur.

De investeringsprojecten zijn zeer divers maar alle deelprojecten bezitten steeds een vernattingscomponent of beogen de realisatie van een groenblauwe verbinding. Zo kan door hermeandering meer water gebufferd worden, bieden openleggingsprojecten de mogelijkheid om groenblauwe netwerken te creëren, ..

Via vernieuwing van de kunstwerken worden wachtbekkens, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden zo optimaal mogelijk benut voor infiltratie, met slimme sturing voor berging en lediging.

De doelstelling voor dit project is het uitvoeren van een set van projecten voor het volledig voorziene budget van 30 miljoen euro. Dit budget is integraal afkomstig van relancemiddelen. Een lijst van concrete projecten die hiervoor in aanmerking komen is beschikbaar.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.000.000 EUR
Output	Realiseren van 20 projecten om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Vernatten van gebieden • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Verbeterde werking watersysteem via slimme sturing

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

- Digitalisering van de infrastructuur
- Verbeterde hydromorfologie
- Realiseren van groenblauwe verbindingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Ondertussen zijn 16 projecten vastgelegd, de meeste daarvan ook in uitvoering. Een eerste project nadert de voltooiing en zal eind juni plechtig worden ingehuldigd. Tot slot zijn nog een aantal bestekken in voorbereiding om het resterende saldo optimaal te benutten.
Noodzakelijke politieke actie	niet van toepassing

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
30% van de budgetten vastgelegd	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering van 5 projecten gestart	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering van 10 projecten gestart	2022 Q4	Op schema	
alle dossiers vastgelegd	2022 Q4	Op schema	
5 projecten voltooid	2022 Q4	Op schema	
50% van het VEK-budget benut	2023 Q4	Op schema	
Uitvoering van 15 projecten gestart	2023 Q4	Op schema	
10 projecten voltooid	2024 Q2	Op schema	
Uitvoering van 20 projecten gestart	2024 Q2	Op schema	
75% van het VEK-budget benut	2025 Q4	Op schema	
15 projecten voltooid	2025 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitvoering van minstens 20 projecten groenblauwe netwerken en optimalisatie infrastructuur aan waterlopen voor een totaal bedrag van 30 miljoen euro	2026 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde projecten die waterschaarste op een structurele manier aanpakken	20	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	18.704.000 EUR
Uitvoering VEK	1.960.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 24.800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving](#)

VV036 - NATTE NATUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Agentschap Natuur en Bos
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaamse Milieumaatschappij - Vlaamse Landmaatschappij
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project betreft de opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor valleierherstel en herstel van natte natuur. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het herstel en de bescherming van veengebieden (laagveen, hoogveen, veenbossen) die de grootste hoeveelheid water kunnen vasthouden en ook veel koolstof opslaan.

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 legt sterkt de nadruk op het verhogen van onze weerbaarheid tegen droogte, onder meer via circulair waterbeleid en de actieve inzet van een veerkrachtige ruimte met (extra) natuur om de klimaatverandering te milderen. Bossen, moerassen, meanderende rivieren en graslanden houden immers koolstof vast en bufferen wateroverlast, droogte en hitte-effecten. Daarom kiest de Vlaamse regering ervoor gezonde ecosystemen te herstellen door het versneld realiseren van een sterk samenhangend geheel van natuur-, bos- en valleigebieden, die kwaliteitsvol ingericht worden. Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Als onderdeel van deze Blue Deal wordt ingezet op een groot investeringsprogramma om natte natuur in Vlaanderen te herstellen. De afgelopen decenniajaar verloor Vlaanderen 75 procent van zijn natte natuur. Van de 244.000 hectare natte natuur die er rond de jaren 1950 nog was, blijft nu maar 68.000 hectare over, waarbij de kwaliteit van deze natuur wisselvallig van aard is. Via het investeringsprogramma in wetlands en valleigebieden zal deze natte natuur hersteld en versterkt worden.

Wetlands zijn nuttige gebieden in de strijd tegen overstromingen en droogte. Ze zorgen voor een grotere wateropvangcapaciteit en tragere afvoer waardoor het risico op wateroverlast verkleint. Extra natte natuur creëren is een van de beste manieren om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk meer natuurlijke buffers te hebben tegen hevige regenval. Daarnaast slaan wetlands koolstof op en zorgen ze zo voor de reductie van broeikasgassen. Wetlands zorgen tenslotte ook voor verkoeling.

Het investeringsprogramma bestaat uit het realiseren van verscheidene natuurprojecten door het Agentschap Natuur en Bos via aankopen en inrichtingswerken voor een bedrag van 70 miljoen euro. Daarnaast wordt er voor derden een oproep gelanceerd voor specifieke aankoop- en investeringssubsidies in het kader van natte natuur voor een bedrag van 30 miljoen euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	100.000.000 EUR
-------	-----------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Output	Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Vernatten van gebieden • Verhoogde bescherming van waardevolle bodems • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Realiseren van groenblauwe verbindingen • Verbeterde hydromorfologie • Meer biodiversiteit • Verhoogde koolstofopslag in de bodem • Vertraagde afvoer van water

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het project omvat:</p> <p>1. Het verwerven of inrichtingen van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos op eigen terreinen of kaderend binnen een bestaande samenwerking. Op basis van aantal criteria zullen projecten uitgevoerd worden rond herstel en inrichting van (gedegradeerde) wetlands. De projecten worden geselecteerd op basis van:- Bijdrage aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen;- Opname in stroomgebiedbeheerplan ; - Waterconservering – bijdrage van project aan vasthouden, vertraging afvoer water ; - Bevorderen van infiltratie – wanneer expliciet het bevorderen van infiltratie wordt beoogd;- Verbetering van de waterkwaliteit;- Ecohydrologisch herstel – actieve grondwaterpeilverhoging;- Structuurherstel grachten en waterlopen; Op basis van deze aanpak worden lopende projecten versneld gerealiseerd (bvb. gebiedsgericht projecten in valleien zoals Kleine Nete, IJzervallei, Zennevallei, ...) of wordt de achterstand in uitvoering ingehaald (bvb. Sigmoplan, Demervallei, ...) of waar mogelijk worden opportuniteiten benut met het oog op snelle realisatie. De verschillende in te richten natuurgebieden doorlopen allen dezelfde fasen:- Waar nodig worden gronden verworven of in een aantal gevallen geruimd i.s.m. met de Vlaamse Landmaatschappij;- Diverse studies of al of niet wettelijk verplichte plannen worden opgemaakt om de ecohydrologische toestand en de in te richten werken te bepalen en disproportionele gevolgen voor de omgeving te voorkomen;- De noodzakelijke werken voor effectieve realisatie van natte natuur op terrein, worden aanbesteed. De uitvoering is lopende waarbij de aanbestedingen voor inrichtingswerken stelselmatig worden opgestart. Aandachtspunt in het kader van mogelijke vertraging zijn de beperkingen op de capaciteit bij de administratie en de studie bureaus om de verscheidene projecten gedraaid te krijgen en het doorlopen van de vergunningstrajecten. Verder hangt de realisatie mbt verwerving sterk af van de opportuniteiten die zich voordoen op het terrein en het al dan niet succesvol afsluiten van een onderhandeling binnen de termijn.</p> <p>2. Subsidiëren van derden voor de creatie van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos voor inrichtingswerken en grondverwervingen. Naast de realisatie van projecten in eigen beheer worden ook derden aangemoedigd om bij te dragen aan bijkomende natte natuur in Vlaanderen. Er worden aankoopsubsidies verleend voor de verwerving van gronden van die projecten die voldoen aan het natuurbeheerplan type 4, zijnde de meest ambitieuze typologie met de hoogste ecologische waarden in Vlaanderen. Naast deze aankoopsubsidies worden ook voor inrichtingswerken subsidies verleend aan derden via een oproep die in januari 2021 is gelanceerd en waarvan de projecten zijn ingediend. De selectie is eind 2021 goedgekeurd. Deze oproep werd opnieuw in januari 2022</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	gelanceerd. Het te bepalen subsidiabel bedrag wordt gebenchmarkt aan normkosten voor gelijkaardige inrichtingswerken.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2021	2021 Q1	Gerealiseerd	
Goedkeuring VR wijziging subsidiebesluit inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur (Blue deal)	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2022	2022 Q1	Gerealiseerd	
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2022	2022 Q3	Nog niet gestart	
Alle noodzakelijke verwervingen van gronden zijn gerealiseerd	2022 Q3	Op schema	
Toekenning aankoopsubsidies aan derden voor gronden ter realisatie van projecten natte natuur	2022 Q4	Op schema	
Uitbesteding van de noodzakelijke studies ter voorbereiding van de inrichtingswerken en uitbesteding van de inrichtingswerken	2022 Q4	Op schema	
Uitvoering inrichtingswerken	2024 Q4	Vertraging	Aandachtspunt in het kader van mogelijke vertraging zijn de beperkingen op de capaciteit bij de administratie en de studiebureaus om de verscheidene projecten gedraaid te krijgen en het doorlopen van de vergunningstrajecten.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied		2026 Q2		

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
binnen het kader van Blue deal - projecten derden				
Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal - projecten in regie van ANB		2026 Q2	360	16 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	34.965.000 EUR
Uitvoering VEK	17.667.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 94.400.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 18 december 2020 - Projectsubsidies voor lokale hefboomprojecten 'Natte Natuur' in kader van gebiedsontwikkeling

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur](#)

[Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur](#)

[Advies Minaraad over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 23 april 2021 Plan Vlaamse Veerkracht: projectlijnen die invulling geven aan relanceprojecten Omgeving in het kader van de Blue Deal

[VR 2021 3004 VV DOC.0041-1 Geïntegreerd natuurbeheer - notaBIS](#)

[VR 2021 3004 VV DOC.0041-2 Geïntegreerd natuurbeheer - BVRBIS](#)

VR 16 juli 2021 wijziging subsidiebesluit inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur (Blue deal)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-1 Geïntegreerd Natuurbeheer - nota](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-5 Geïntegreerd Natuurbeheer - advies](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-2 Geïntegreerd Natuurbeheer - BVRBIS](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-6 Geïntegreerd Natuurbeheer - advies](#)

07. Investerings in verkeersveilige wegen

VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer - De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Lokale besturen; Farys; bedrijven; weggebruikers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de aanpak van deze kunstbouwwerken is het doel om de kunstwerken in slechte staat te herstellen/te vervangen en zo de mobiliteit/verkeersveiligheid van personen en goederenvervoer te garanderen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	110.000.000 EUR
Output	Herstelde of vervangen kunstwerken.
Outcome	Verlengen levensduur van het patrimonium kunstwerken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> - Het viaduct in Gentbrugge werd na het uitvoeren van ingrijpende werken in november 2021 terug opengesteld voor het verkeer. Er zijn nog wel werkzaamheden aan de onderzijde van de brug. - De renovatie van het viaduct Boorseme is gestart in januari 2022. Ook de werken voor de renovatie van de Wijngaardbrug (Geraardsbergen), de herbouw van de Meulestedebrug (Gent) en de herstellingen aan de Nieuwe Kalebrug zijn in uitvoering. - De vervanging van de brug van de E40 over de spoorlijn Brussel-Oostende en de brug in de Merestraat over de E40 (Erpe-Mere) werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 maart 2022 en zal in juli 2022 opstarten. Ook voor volgende initiatieven werd de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>aanbestedingsprocedure doorlopen en starten de werken in 2022: bouw van de Verapazbrug (Gent), herbouw Spanjeveerbrug (Mendonk), renovatie van de Moerbruggebrug (Oostkamp), renovatie van de Tolhuisstuwbrug (Gent), renovatie van de Tuchthuisbrug (Vilvoorde) en de voetgangersbrug over sluis 11 (Kortrijk).</p> <p>- Voor de Leiebrug (Kortrijk) wordt met de relancebudgetten louter de studie uitgevoerd. Deze is lopende.</p> <p>- De overige projecten bevinden zich in momenteel in studie- of aanbestedingsfase, cf. planning.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sanering viaduct van Gentbrugge (fase 2)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Herbouw Meulestedebrug Gent	2021 Q4	Vertraging	De werken zijn reeds van start gegaan, maar hebben enige vertraging t.o.v. de initiële planning.
Renovatie Wijngaardbrug te Geraardsbergen	2022 Q2	Gerealiseerd	De timing werd geactualiseerd (vervroegd).
Renovatie Moerbruggebrug te Oostkamp	2022 Q4	Op schema	Aanvullend relance-initiatief.
Renovatie Tolhuisstuwbrug Gent	2022 Q4	Op schema	
Herbouw Waasmunsterbrug (incl. jaagpad & fietstunnel)	2022 Q4	Stopgezet	Dit is niet meer aanbesteedbaar in 2022. Het initiatief zal niet langer op het Relancebudget opgenomen worden. Andere initiatieven werden toegevoegd.
Studie herbouw Leiebrug te Kortrijk	2022 Q4	Op schema	
Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16) te Gent	2022 Q4	Vertraging	De werken zijn reeds van start gegaan, maar hebben enige vertraging t.o.v. de initiële planning.
Renovatie viaduct van Boorseme	2023 Q1	Vertraging	De werken zijn reeds van start gegaan, maar hebben enige vertraging t.o.v. de initiële planning. De timing werd geactualiseerd.
Herbouw Oosthoekbrug St-Laurens	2023 Q2	Op schema	Aanvullend relance-initiatief.
Renovatie voetgangersbrug over sluis 11 te Kortrijk	2023 Q2	Vertraging	Gunning Raad van Bestuur op 15 december 2021. De timing werd geactualiseerd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Renovatie Tuchthuisbrug te Vilvoorde	2023 Q3	Vertraging	De timing van de mijlpaal werd geactualiseerd.
Bouw Verapazbrug te Gent & herbouw kaaimuur	2023 Q3	Vertraging	De werken zijn reeds van start gegaan, maar hebben enige vertraging t.o.v. de initiële planning. De timing werd geactualiseerd. De Vlaamse Waterweg draagt bij aan het project door de herbouw van de kaaimuur ter hoogte van de brug. De oplevering van de brug zelf is voorzien 2025.
Opwaardering kanaal Roeselare-Leie: Lysbrug	2023 Q3	Op schema	De timing werd geactualiseerd (timing oplevering i.p.v. timing vastlegging).
Herbouw Spanjeveerbrug Mendonk	2023 Q3	Op schema	De timing werd geactualiseerd (timing oplevering i.p.v. timing vastlegging).
Vervangen opleggingen Drongenbrug W4 over de Ringvaart te Gent	2023 Q4	Op schema	De timing werd geactualiseerd (timing oplevering i.p.v. timing vastlegging).
Renovatie centrumbrug Izegem	2023 Q4	Op schema	Aanvullend relance-initiatief.
Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai te Gent	2024 Q2	Op schema	De timing werd geactualiseerd (timing oplevering i.p.v. timing vastlegging).
Herbouw Krommewalbrug te Gent	2024 Q2	Op schema	De timing werd geactualiseerd (timing oplevering i.p.v. timing vastlegging).
Herbouw Tolpoortbrug te Deinze	2024 Q4	Op schema	De timing werd geactualiseerd (timing oplevering i.p.v. timing vastlegging).
Herbouw Steenbruggebrug te Brugge	2026 Q3	Op schema	Aanvullend relance-initiatief.
Herbouw Bospoortbrug te Halle	2026 Q3	Op schema	Aanvullend relance-initiatief.

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	110.000.000 EUR
Uitvoering VAK	82.762.000 EUR
Uitvoering VEK	26.333.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 110.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	(zwakke) weggebruikers, politiediensten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investeren in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen zet de Vlaamse Overheid maximaal in op de verkeersveilige (her)inrichting van haar fietspaden, wegen en kruispunten. Sinds 2018 wordt er daarom ingezet op de dynamische lijst van gevaarlijke punten. Bij de berekening van gevaarlijke punten wordt telkens de laatste drie jaar aan beschikbare ongevallendata gebruikt, waarbij een gewicht wordt gegeven aan elke lichtgewonde (1), zwaargewonde (3) en dodelijke gewonde (5) weggebruiker. Bovendien wordt sinds 2019 een extra gewicht gegeven aan elke zwakke weggebruiker (factor 1,7).

Om gevaarlijke punten snel aan te pakken wordt waar mogelijk overgegaan tot het uitvoeren van kleine ingrepen, quick wins. Dit zijn ingrepen die op korte termijn en met beperkte middelen, de verkeersveiligheid ter plaatse kunnen verbeteren. Om zicht te krijgen op de best passende maatregel wordt eerst een grondig onderzoek uitgevoerd, dat voor een deel van de punten door een extern studiebureau wordt uitgevoerd.

Het wegwerken van gevaarlijke punten kan bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van de lichtenregeling, het verbeteren van de markering, het verbeteren van de zichtbaarheid, het plaatsen van handhaving, enz. Op een deel van de punten volstaan deze kleinere ingrepen om de verkeersveiligheidsproblemen weg te werken. Op een ander deel betreft dit een tussentijdse oplossing en zijn meer uitgebreide maatregelen nodig. Deze uitgebreide maatregelen omvatten de herinrichting van (een deel van) het kruispunt.

In de aanpak van de gevaarlijke punten wordt prioritair ingezet op punten in de buurt van een school, lichtengeregelde punten en overige punten waar zwakke weggebruikers betrokken waren.

MIA staat voor Mobiliteit Innovatief aanpakken. Met MIA wil men komaf maken met ingewikkelde procedures en lange doorlooptijden die de aanpak en uitvoering van infrastructurele werken of quick wins verhinderen of vertragen. Daarnaast beoogt MIA een vlotte samenwerking met vervoerregio's, provincies, gemeenten, burgers, wetenschappers en deskundigen.

Op de Vlaamse regering van 3 september 2021 werd het ontwerp van bekrachtigingsdecreet van MIA -in infrastructuurwerken definitief goedgekeurd. Met dit ontwerp van bekrachtigingsdecreet wordt het BVR tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur definitief geregeld. Op die manier wil men zorgen voor snellere uitvoering van tal van verkeersveiligheidsmaatregelen en ingrepen in onze weginfrastructuur. MIA is een ander bestuursproces met nadruk op een proactieve aanpak, eenvoudige procedures en inspraak.

PROJECTOMSCHRIJVING

Voor het aanpakken van een deel van de gevaarlijke punten wordt ondermeer dit relancebudget benut.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	50.000.000 EUR
Output	Het aantal gevaarlijke punten waar een ingreep werd uitgevoerd.
Outcome	Het verhogen van de verkeersveiligheid door het gevaar te verminderen voor de (zwakke) weggebruiker.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De verschillende deelprojecten lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De werken voor de aanleg van een wisselaar met de A19 aan de R8 Kortrijk West werden opgestart. Dit project zal in het najaar van 2023 afgerond zijn. - Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA): Binnen het MIA-project is het de bedoeling dat de aannemer al vanaf de start van een project betrokken wordt. Zodoende werken ze mee de oplossing van een probleem uit. Er lopen momenteel 2 MIA-proefprojecten, 1 in Oost-West Vlaanderen en 1 in Limburg. Binnen deze projecten werden reeds 10 ingrepen uitgevoerd. Via de proefprojecten MIA in Limburg en Oost-West-Vlaanderen werd er inmiddels 1 gevaarlijke punt weggewerkt, 8 punten zijn in uitvoering en 10 bevinden zich in aanbestedingsfase. - Er loopt een studiefase voor het aanpakken van de overige gevaarlijke punten die geselecteerd werden voor Relance-investeringen. De voorziene ingrepen betreffen onder meer: <ul style="list-style-type: none"> - het conflictvrij maken van kruispunten, - infrastructuuringrepen aan kruispunten, - het aanleggen van middeneilanden, - het aanpassen van de lichtenregeling, - het aanpassen van signalisatie, - het voorzien van circulatiemaatregelen, - ... <p>16 ingrepen zijn reeds uitgevoerd. 32 werken zijn op dit moment in uitvoering en voor 5 ingrepen werd de uitvoering ingepland of gebeurt dit op korte termijn. De overige ingrepen worden binnenkort aanbesteed.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
R8 Kortrijk West: aanleg wisselaar met de A19	2023 Q4	Op schema	De timing werd geactualiseerd (vervroegd).

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Proefproject wegen Oost-West Vlaanderen (MIA)	2024 Q4	Op schema	
Proefproject wegen Limburg (MIA)	2024 Q4	Op schema	
Aanpak gevaarlijke punten	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal ingrepen via MIA		2022 Q4	10	
Aantal weggewerkte gevaarlijke punten	+80	2024 Q4	17	21 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	44.243.000 EUR
Uitvoering VEK	1.635.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 50.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[BVR van 28 mei 2021 tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	Lokale besturen, inwoners, weggebruikers, scholen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Een veilige route van huis naar school is essentieel voor schoolgaande kinderen. Wanneer ouders de route niet veilig vinden, kiezen ze vaker voor de auto om hun kinderen naar school te brengen. Via investeringen langs gewestwegen en subsidies voor veilige schoolroutes kunnen ingrepen langs lokale wegen plaatsvinden om de schoolroutes veiliger te maken. Momenteel wordt de helft van het voorziene budget indicatief voorzien voor investeringen langs gewestwegen, de andere helft wordt indicatief via subsidies toegekend aan lokale besturen, voor investeringen op gemeentewegen. Kinderen zijn de ideale fietsambassadeurs om de modal en mental shift naar meer duurzame verplaatsingen mee te realiseren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.000.000 EUR
Output	Aanpassingen aan infrastructuur en signalisatie op schoolroutes
Outcome	Veiligere en vlottere schoolroutes voor fietsers/voetgangers, een stijging in het aantal actieve verplaatsingen naar school met de fiets/te voet.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Gemeentewegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de subsidies Veilige Schoolroutes op gemeentewegen werden de stukken door de Vlaamse Regering goedgekeurd waardoor een subsidiecall voor lokale besturen loopt tot november 2022. Tot op heden dienden 59 gemeenten een aanvraag in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor het aanpassen of inrichten van schoolroutes: 55 aanvragen werden goedgekeurd, 4 waren onontvankelijk o.w.v. reeds uitgevoerd of niet binnen het subsidiedomein. De goedgekeurde aanvragen staan voor meer dan 440 ingrepen verspreid over 139 schoolroutes.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>- De meest aangevraagde werkzaamheden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • werken aan het voetpad of aan het wegdek, • de afbakening van een fietsstraat, • de aanleg van een fietssuggestiestrook, • oversteekplaatsen • een aan- of vrijliggend fietspad. <p>- Voor de uitvoering van de werken hebben de aanvragers 15 maanden de tijd na goedkeuring van hun dossier.</p> <p>Gewestwegen:</p> <p>- Voor de uitvoering van ingrepen langs gewestwegen in functie van het veiliger maken van de schoolroutes werden door het Agentschap Wegen en Verkeer 875 knelpunten langs schoolroutes geïnventariseerd op basis van aanmeldingen door 194 gemeenten. Het specifiek raamcontract voor de aanpak van deze knelpunten is ondertussen in uitvoering.</p> <p>- De vaakst voorkomende gevraagde aanpassingen betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aanpassingen aan oversteekvoorzieningen, • markeringswerken, • kleine infrastructuurwerken, • aanpassingen aan lichtregelingen, • vernieuwing van fietspaden. <p>- Tot op heden werden er 141 projecten op gewestwegen gekoppeld aan het relancebudget, waarvan 8 projecten reeds zijn uitgevoerd. 14 projecten zijn in uitvoering, 16 projecten vastgelegd, 101 in aanbestedingsfase en 2 on hold. Daarnaast zitten er 224 schoolroute-ingrepen in de pipeline die nog aan relancebudget gekoppeld moeten worden, er vervolgens een status toegewezen zullen krijgen. Eind 2022 moeten er 365 schoolroute-ingrepen uitgevoerd of opgestart zijn.</p> <p>- Voor de trajectcontroles op schoolroutes langs gewestwegen werden de nodige budgetten vastgelegd. Er werden reeds 8 bevestigde aanvragen ontvangen. Dit project loopt op schema en zal in het voorjaar van 2023 afgerond zijn.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Communicatie subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen (algemene mailing + persoonlijk contact)	2022 Q3	Op schema	
Opmaak Regelgeving - Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen	2021 Q1	Gerealiseerd	
Bevraging steden en gemeenten over knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekennen Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen aan lokale besturen	2022 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Investeren in het veiliger maken van knelpunten langs gewestwegen op basis van de geïnventariseerde knelpunten van Vlaamse steden en gemeenten.	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal ontvangen afrekeningen voor de goedgekeurde subsidieaanvragen lokale besturen	55	2022 Q4	8	15 %
Aantal goedgekeurde subsidieaanvragen lokale besturen		2022 Q4	55	
Aantal ingrepen op knelpunten op gewestwegen	365	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	20.326.000 EUR
Uitvoering VEK	6.377.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 30.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - nota](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - advies Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Via de versnelling van verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch verkeersmanagement is het doel een betere en veiligere doorstroom te bewerkstelligen. Door de verkeerslichtenbeïnvloeding kan de fietsveiligheid verbeterd worden en wordt het gebruik van de fiets voor zowel functioneel als recreatief gebruik gestimuleerd. Zo draagt dit initiatief bij tot de modal shift en verhoogt het aandeel van duurzame transportmodi in Vlaanderen.

Een deel van het relancebudget wordt ingezet om het actieplan verkeerslichten verder uit te rollen. Via dit actieplan wordt zowel de doorstroming als de veiligheid op de kruispunten verder verhoogd door de kruispunten uit te rusten met 'slimmere' verkeerslichten die dynamischer en flexibeler inspelen op de actuele verkeerssituatie op het betreffende kruispunt. Met het actieplan verkeerslichten wordt geprobeerd om de situatie maximaal conflictvrij te regelen en ervoor te zorgen dat er nooit voor niets voor rood dient gewacht te worden.

Daarnaast wordt een deel van het relancebudget ingezet voor het Mobilidata-programma. Mobilidata realiseert een netwerk van duurzame, slimme en betrouwbare data. Via een signaal dat jouw boordcomputer of smartphone uitstuurt, is het mogelijk te 'communiceren' met onze geconnecteerde systemen. De slimme infrastructuur die Mobilidata voorziet, volgt dat signaal op en combineert dat met andere realtime data. Op die manier kunnen bijvoorbeeld verkeerslichten beter op jouw mobiliteitsbehoefte inspelen. Op termijn vormt de uitrol van die slimme data-infrastructuur de basis voor de infrastructuur die zelfrijdende voertuigen in Vlaanderen mogelijk maakt.

Relancemiddelen worden ook geïnvesteerd in de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) in Antwerpen. De komende jaren zal de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) stapsgewijs de aansturing van 360 verkeerslichten in en om Antwerpen overnemen. De nieuwe lichtenregelingen zullen het verkeer veiliger en efficiënter laten verlopen. Het doel is om de volledige vernieuwingsoperatie rond te hebben tegen eind 2023.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	Realisatie van intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's)
Outcome	Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De diverse initiatieven lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor het dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve) intelligente transportsystemen (Mobilidata) zijn 12 werken uitgevoerd, 39 in uitvoering en worden 172 ingrepen voorbereid. - In het kader van het actieplan verkeerslichten zijn 7 werken uitgevoerd, 20 in uitvoering en worden 41 ingrepen ingepland. - Ten behoeve van een vlottere doorstroom van het openbaar vervoer werden 6 ingrepen aan verkeerslichten met beïnvloeding uitgevoerd. 2 werken zijn in uitvoering. Dit draagt bij tot een verminderd risico voor 8 gevaarlijke punten. 7 gevaarlijke punten worden via deze ingrepen geheel en 1 gedeeltelijk conflictvrij gemaakt. - Het dynamisch verkeersmanagement (verkeerslichtencoördinatie) loopt vertraging op. Het project zal eind 2024 afgerond worden. Het dynamisch verkeersmanagement (structureel onderhoud) langs autosnelwegen) verloopt volgens schema. De uitvoering van de werken is gestart en de werken zullen weldra afgerond worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Dynamisch verkeersmanagement langs autosnelwegen - Structureel onderhoud	2022 Q2	Gerealiseerd	
Dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve) Intelligente Transport Systemen	2023 Q4	Op schema	
Actieplan Verkeerslichten	2023 Q4	Op schema	
Plaatsen van verkeerslichten met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer en/of aanpassen van bestaande installaties met het oog op verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer	2024 Q4	Op schema	
Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie (verkeerslichtencoördinatie Antwerpen)	2024 Q4	Vertraging	De timing werd geactualiseerd. Het project is namelijk sterk afhankelijk van diverse wegenwerken, de installatie van het glasvezelnetwerk maar ook vergunningen of andere initiatieven van lokale besturen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			Aangezien in deze planningen vertragingen ontstaan zijn heeft dit bij gevolg een negatieve impact op de vooropgestelde timing van dit project.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal VRI's aangepast aan actieplan verkeerslichten	68	2023 Q4	7	10 %
Aantal intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's)	150	2023 Q4	12	8 %
Aantal VRI's met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer	8	2024 Q4	6	75 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	15.897.000 EUR
Uitvoering VEK	591.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

08. Modal shift naar water

VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om de steile opgang van het containervervoer blijvend te stimuleren wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal. Zo wordt bijgedragen aan de modal shift en wordt maximaal ingespeeld op het verschuiven van het goederenvervoer over de weg naar vervoer over water.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	102.000.000 EUR
Output	Verhogen en/of aanpassen van 7 bruggen en ondersteunende werken ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal.
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Waterweg voorziet 8 projecten (deels) te realiseren middels deze relancebudgetten: De werken mbt het afvoeren grondoverschotten kanaalverbreding Theunisbrug werden uitgevoerd. Volgende 5 (deel)projecten zijn in uitvoering:

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<ul style="list-style-type: none"> - Voor de herbouw spoorbrug (Herentals) startten in maart 2022 de eerste voorbereidende grond- en betonwerken. In het kader van de brugverhoging vinden er ook voorbereidende werken plaats in de omliggende straten aan de distributienetten. De werken lopen volgens planning. - Voor het verhogen van de wegbrug Kempische poort zijn de werken gestart in maart 2022. De werken verlopen volgens planning. - Heraanleg van het kruispunt N120 met de nieuwe Hoogmolenbrug. - Vernieuwen van de oevers tussen de Hoogmolenbrug en brug van den Azijn. - Herbouw van de spoorbrug (Genk). <p>Voor 2 (deel)projecten is de aanbestedingsprocedure doorlopen. De werven moeten nog opgestart worden. Volgens het afgesproken tijdsplan hebben beide projecten een vertraging opgelopen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De opstart van de Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) loopt vertraging op wegens de vergunningsprocedure voor de omgevingsvergunning. Het oorspronkelijke tijdsplan met een realisatie in Q3 2023 is daardoor niet meer haalbaar. - De verruiming van het Albertkanaal zone Antwerpen, tussen de brug van den Azijn en het Lobroekdok, loopt vertraging op door onteigeningsprocedures.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Herbouw spoorbrug Genk (BR12)	2022 Q3	Op schema	De timing werd geactualiseerd (timing oplevering i.p.v. timing vastlegging).
Vernieuwen oevers tussen Hoogmolenbrug en brug van den Azijn	2022 Q4	Op schema	
Verhogen wegbrug Kempische poort (N74) Hasselt (BR17)	2022 Q4	Op schema	
Heraanleg van het kruispunt N120 met de nieuwe Hoogmolenbrug	2023 Q1	Op schema	De timing werd geactualiseerd (timing oplevering i.p.v. timing vastlegging).
Herbouw wegbrug Kempische poort	2023 Q3	Op schema	De timing werd geactualiseerd (timing oplevering i.p.v. timing vastlegging).
LO - afvoeren grondoverschotten kanaalverbreding Theunisbrug	2023 Q4	Gerealiseerd	
Verruiming Albertkanaal zone Antwerpen - tussen de brug van den Azijn en het Lobroekdok	2024 Q2	Vertraging	Vertraging omwille van onteigeningen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52)	2024 Q2	Vertraging	De timing werd geactualiseerd.
Herbouw spoorbrug Herentals (BR44)	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Verhogen en/of aanpassen van 7 bruggen, alsook het uitvoeren van ondersteunende werken (1 project) ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal	9	2024 Q4	1	11 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	96.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	102.000.000 EUR
Uitvoering VAK	91.853.000 EUR
Uitvoering VEK	7.320.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 102.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Bedrijven, binnenvaartondernemers, verladers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De focus van het investeringsbeleid voor goederenvervoer ligt op het realiseren van een modal shift van de weg naar de binnenvaart. Ondernemingen en logistieke spelers moeten er nog meer van overtuigd worden dat de binnenvaart een volwaardige, complementaire transportmodus is.

Een van de doelstellingen hierin voor de modal shift goederenvervoer is het realiseren van een verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers in het goederenvervoer van de weg naar de alternatieve vervoersmodi waterweg of spoorwegnet.

Watergebonden bedrijventerreinen worden daarom verder uitgerust met, waar mogelijk gemeenschappelijke, kaaimuren. De PPS-formule voor de bouw van kaaimuren wordt blijvend gehanteerd om nieuwe klanten toegang te verlenen tot de waterweg, maar ook om bestaande klanten op het water te houden en hun watergebonden trafieken te kunnen vergroten. Het relanceplan maakt een versnelde realisatie van kaaimuurprojecten mogelijk.

Dit project voorziet in de realisatie van nieuwe kaaimuurprojecten alsook in renovaties van kaaimuren op het Kanaal Roeselare-Leie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	16.000.000 EUR
Output	Realisatie van nieuwe en optimalisatie van bestaande kaaimuren.
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse Waterweg nv voorziet middels deze relanceprojecten in de bouw van 8 kaaimuurprojecten voor overslag en de renovatie van een kaaimuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De uitvoering van het kaaimuurproject Kaneka (Geel) werd afgerond in het najaar van 2021. - De aanbestedingsprocedure voor 3 projecten werd doorlopen: het kaaimuurproject

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>Rumst Recycling (Rumst), Devamix (Harelbeke) en Fingo (Tessenderlo). De uitvoeringsfase is in voorbereiding.</p> <p>- Voor de bouw van de PPS kaaimuur Top Mix te Oostende loopt momenteel de aanbestedingsprocedure.</p> <p>- De studie in aanloop van de aanbesteding van de realisatie is voor 3 projecten nog lopende.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bouw kaaimuur Kaneka	2022 Q4	Gerealiseerd	
Bouw kaaimuren Devamix	2023 Q3	Op schema	
Bouw kaaimuur VARO Energy Group	2023 Q3	Op schema	
Onderdeel scheldekaaien	2023 Q4	Op schema	
Bouw kaaimuur Top-mix	2023 Q4	Op schema	
Bouw kaaimuur Fingo	2023 Q4	Op schema	
Herstellen verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie & Herstellen kaaimuren kanaal Roeselare-Leie	2024 Q1	Op schema	De timing werd geactualiseerd (timing oplevering i.p.v. timing vastlegging).
Bouw kaaimuur Rumst Recycling	2025 Q1	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gebouwde en herstelde laad- en losinstallaties	8	2023 Q4	1	12,5 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	16.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.207.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	518.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 16.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW</p>

VV043 - WATERBEHEERSING DENDER

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De Dender is een bevaarbare waterweg, met als zwaartepunt voor de beroepsvaart het gedeelte tussen Aalst en de tijsluis in Dendermonde. Op heden is dit gedeelte bevaarbaar voor schepen klasse II. Initieel werd met het relancebudget voorzien in een studie en herbouw van de stuw in Denderbelle. Naar aanleiding van de watersnood medio 2021 werd de focus bijgestuurd naar werken aan meerdere stuwen op de Dender.

De initiële projectnaam 'Modal shift naar water - opstart Dender (verhoging watertransportcapaciteit)' werd op 13 mei 2022 aangepast. Cf. beslissing Vlaamse Regering 13/05/2022.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	12.000.000 EUR
Output	Vernieuwing stuwsluiscomplex (Denderbelle)
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water, verbeteren waterbeheersing, optimalisatie vismigratie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Initieel werd met dit budget de studie en herbouw van de stuw te Denderbelle beoogd. Bij de opmaak van het investeringsprogramma 2022 werd – de watersnood medio 2021 indachtig – de focus bijgestuurd naar andere in uitvoering/in voorbereiding zijnde projecten op de Dender. Meer concreet betreft het ook de herbouw van een aantal andere stuwen: - In 2022 wordt de realisatie van de werken in Geraardsbergen en Aalst verdergezet. - De aanbestedingsfase voor de herbouw van de stuw te Denderleeuw loopt. - De studie in voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van de herbouw van de stuw te Pollare is in uitvoering. - De voorbereidende studie voor het uitvoeren van de werken voor de opwaardering van de Dender (afwaarts Aalst) - fase 1 loopt. Hiermee worden de opmaak van het aanbestedingsdossier en de documenten voor de omgevingsvergunningsaanvraag (OVA) van het stuwsluiscomplex in Denderbelle voorbereid.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke
politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Studie opwaardering Dender afwaarts Aalst	2022 Q4	Op schema	
Waterbeheersing Dender	2025 Q1	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	21.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	12.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.929.000 EUR
Uitvoering VEK	50.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 12.000.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW - bijlage](#)

VV044 - MINNELIJKE VERWERVINGEN EN ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	MBZ, havengebonden bedrijven, bewoners, AWW, De Lijn, Stad Brugge

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De verwervingen in Zeebrugge zijn noodzakelijk om te kunnen starten met het realiseren van een 'Nieuwe Zeesluis in Zeebrugge'. Een initiatief om het goederenvervoer over water maximaal te blijven versterken. Het totaalproject waarvoor deze verwervingen dienen plaats te vinden bestaat uit drie delen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. We realiseren een nieuwe zeesluis als volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. 2. Om het lokaal verkeer en het havenverkeer van elkaar te scheiden, komt er een nieuwe verbindingsweg, de 'Nx'. 3. Het project biedt ook kansen voor de leefbaarheid in Zeebrugge. <p>De initiële projectnaam 'Onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge' werd op 13 mei 2022 aangepast. Cf. beslissing Vlaamse Regering van 13/05/2022.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	27.000.000 EUR
Output	Verwerven van een aantal bedrijfsgronden gelegen binnen de projectzone van het project Nieuwe Sluis Zeebrugge.
Outcome	Herlocaliseren bedrijven in functie van de bouw van de nieuwe sluis en tunnel.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor de realisatie van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge dienen meerdere bedrijfssites, gelegen binnen de projectcontour te worden verworven. In eerste instantie wordt hierbij maximaal ingezet op een vrijwillige verwerving door de overheid, gekoppeld aan een begeleidingstraject i.f.v. de herlokalisatie van betreffende bedrijven. In eerste instantie worden de relancekredieten aangewend voor deze verwervingen. Als de relancekredieten opgebruikt zijn worden verder de reguliere kredieten van MOW aangewend.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	In januari 2022 zijn 2 aktes verleden en ondertussen uitbetaald. Momenteel liggen er 2 akkoorden klaar waarvoor de relancekredieten nog aangewend zullen worden. Eén akte wordt nog in juni verleden, de andere zal normaliter in de 2de helft van 2022 verleden worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Verwervingen nieuwe sluis Zeebrugge	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal verwervingen	4	2022 Q4	2	50 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	27.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.650.000 EUR
Uitvoering VEK	5.650.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW - bijlage](#)

09. Welzijnsinfrastructuur

VV045 - INZETTEN OP KWALITEIT EN GOOD GOVERNANCE VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	Woonzorgvoorzieningen erkend door de Vlaamse overheid, personeel in dienst van deze voorzieningen, de gebruikers en bewoners van deze voorzieningen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	09. Welzijnsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het versterken van de zorg en levenskwaliteit voor zorgbehoevende ouderen in de woonzorg. Het project zal bestaan uit verschillende deelprojecten:</p> <p>- Deelproject "VIA6": Om de gestegen zorgzwaarte en werkdruk in de ouderenzorg op te vangen en de kwaliteit van zorg te versterken werd in punt 2. van deel III van het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 afgesproken om maximaal in te zetten op bijkomende tewerkstelling. Er werd 146 miljoen euro beschikbaar gesteld om de gefinancierde personeelsnormen te versterken en/of op te trekken, wat leidt tot bijkomende personeelsinzet. Daarmee wordt ook de ongelijkheid in financiering van bewoners met eenzelfde zorgprofiel opgeheven.</p> <p>Concreet worden m.i.v. 1/7/2021 tot en met 31/12/2022 woonzorgcentra en centra voor kortverblijf bijkomend gefinancierd via specifieke voorziene delen V1 en V2 in de basistegemoetkoming voor zorg (BTZ) die men per dag en per gebruiker mag factureren aan de zorgkassen. Vanaf de BTZ geldig vanaf 1/1/2023 wordt de BTZ berekend op basis van hogere personeelsnormen in de referentieperiode (1/7/2021-30/6/2022). Dat betekent dat deze voorzieningen m.i.v. 1 juli 2021 ook hogere financieringsnormen inzake personeel moeten nastreven om ook vanaf 1 januari 2023 de maximale basistegemoetkoming voor zorg te kunnen factureren.</p> <p>Vanuit de relanceprovisie (vv045) wordt 11.053 keuro ingezet (2021) en 39.514 keuro ingezet (2022) in het totaalbudget van 146 miljoen euro. Daarmee werd een deel van de relancemiddelen toegevoegd aan de reguliere middelen.</p> <p>- Deelproject "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": In het kader van de COVID-19-crisis werd van 1/4/2021-30/9/2021 voorzien in een tijdelijke maatregel waarbij woonzorgcentra, al dan niet met bijhorende centrum voor kortverblijf, extra personeel konden</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

inschakelen om de COVID-19-crisis aan te pakken. De voorzieningen ontvingen daarvoor een specifieke compensatie als ze de gegevens over het extra ingezet personeel meedeelde in het eLoket van Zorg en Gezondheid. 13.377 keuro van de in totaal voorziene 18.471 keuro werd ingezet vanuit de relanceprovisie. Een deel van de relancemiddelen (13.377 keuro) werd hiervoor dus toegevoegd aan andere middelen.

- Deelproject "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": Aan woonzorgcentra die ten gevolge van de COVID-19-crisis een verminderde bezetting kennen ten opzichte van de bezetting pré-COVID-19 crisis wordt een continuïteitsborg betaald voor de maanden in het eerste kwartaal van 2022. De continuïteitsborg betreft een compensatie van de Basistegemoetkoming voor zorg (= de financiering vanuit de VO per dag per gebruiker, grotendeels vergoeding voor de zorgpersoneelskost). De woonzorgcentra moeten om in aanmerking te komen minstens 90% van de préCovid bezetting halen en hun personeel op pijl houden. Vanuit de relancemiddelen (7.348 keuro) wordt hiervoor voorzien o.b.v. een raming. De effectieve nood aan middelen zal pas beschikbaar zijn na gegevensindiening door woonzorgcentra en verwerking.

- Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": De COVID crisis illustreert het belang van goede ventilatie. Dit geldt zeker voor woonzorgcentra, waar kwetsbare personen langdurig verblijven en de gezondheidsrisico's ten gevolge van ontoereikende ventilatie voor hen groter zijn.

Omwille van hun eigenheid (in termen van doelpubliek, zorgconcept, schaalgrootte, gebouwtypologie en -gebruik) verdienen woonzorgcentra een specifieke benadering inzake ventilatie. Zowel op conceptueel als op operationeel vlak zijn er momenteel echter onvoldoende duidelijke richtlijnen of vormen van ondersteuning die specifiek afgestemd zijn op dergelijke zorgvoorzieningen.

Een budget van 660.000 euro (relancemiddelen) zal worden gebruikt om een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra te ontwikkelen, bestaande uit verschillende acties om de kwaliteit van ventilatie te verbeteren:

- Actie 1: uitwerken van een kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra (met uitgewerkte conceptuele en operationele doelstellingen)

- Actie 2: uitvoeren van een ventilatiescan van de aanwezige ventilatievoorzieningen in WZC
Stap 1 Actie 2: (zelf)screening van de CO₂-concentraties in typelokalen van woonzorgcentra als selectieinstrument voor WZC die gratis ventilatiescan krijgen

Stap 2 Actie 2: gratis aanbod ventilatiescan en gedetailleerd analyserapport voor 250 woonzorgcentra

Stap 3 Actie 2: gratis aanbod aanbevelingen voor technische of organisatorische aanpassingen op maat van de voorziening voor 250 woonzorgcentra

Op basis van deze stappen kunnen aanbevelingen naar het beleid worden geformuleerd vb wat de situatie is op vlak van ventilatie en wat nodig is om de ventilatie op niveau te brengen (cf. evalueren verdere subsidiebeslissingen).

- Actie 3: opmaak leidraad (draaiboek) voor een ventilatieplan op maat van het woonzorgcentrum - De aanbevelingen die voortvloeien uit de ventilatiescan, vormen de aanzet voor een woonzorgcentrum voor het uitwerken van een ventilatieplan op maat van het woonzorgcentrum. Het ventilatieplan omvat een stappenplan voor de uitvoering van de technische of organisatorische aanpassingen die nodig zijn om de aanbevelingen van de ventilatiescan te integreren en te verwerken. Om de woonzorgcentra te helpen in het proces van uitwerking en implementatie van hun ventilatieplan zal een leidraad (draaiboek) en een kortstondige begeleiding (bv. door medisch milieukundige) worden aangeboden. Aan de woonzorgcentra zal worden gevraagd om de uitvoering van het ventilatieplan (stappenplan) op te volgen via een periodiek ventilatierapport. Zo'n ventilatierapport kan, naar analogie met bv. het veiligheidsregister of het hitteplan van een voorziening, op termijn ook een element van inspectie worden.

De looptijd van dit deelproject bedraagt 3 jaar (2022-2024).

De acties binnen dit kwaliteitskader ondersteunen de zorgvoorzieningen in de ontwikkeling en integratie van een nieuw, effectief en efficiënt beleid op vlak van ventilatie of om het bestaand ventilatiebeleid te verbeteren. Deze acties steunen op en sluiten in grote mate aan bij reeds bestaande acties voor de

PROJECTOMSCHRIJVING

zorgsector.

- Deelproject "VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra": in administratieve opstart. Budget 1.100 keuro relancemiddelen.

Dit project ondersteunt de woonzorgcentra voor de realisatie van de erkenningsvoorwaarde dat zij de tevredenheid van de zorggebruikers moeten nagaan en afhankelijk daarvan bijsturen. Minstens driejaarlijks moeten zij daartoe een verantwoorde gebruikerstevredenheidsmeting uitvoeren. Aanleiding voor dit project is het VIA6-akkoord waarin de verwachting naar de sector wordt gesteld om via het VIKZ de ervaren kwaliteit van leven, wonen en de zorg per woonzorgcentrum, zoals bevraagd bij de bewoners en hun familie, structureel te meten en transparant te maken.

De Vlaamse Regering erkent en subsidieert het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) als partnerorganisatie om de kwaliteit van de woonzorg transparant te maken en te verbeteren. Naast de beheersovereenkomst met het VIKZ wordt het meten van kwaliteit via bevragingen bij bewoners (en familie) daarom als bijkomende opdracht aan het VIKZ toegewezen.

De looptijd van dit deelproject bedraagt 3 jaar (2022 - 2025).

- Deelproject "BelRAI-opleidingen": Conform het regeerakkoord worden de komende jaren verschillende BelRAI-instrumenten uitgerold in Vlaanderen: BelRAI Screener op 1 juni 2021, Sociaal supplement op 1 juni 2022, BelRAI Home Care op 1 juni 2023 en BelRAI Long-term-Care Facilities op 1 juni 2023. Binnen dit deelproject wordt voorzien in een subsidie om door de opleiding van personeel als BelRAI-trainer en als BelRAI-indicatiesteller binnen de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, dagverzorgingscentra en de verschillende thuiszorgdiensten het kwaliteitsvol gebruik van deze instrumenten mogelijk te maken. Er wordt voorts ook een subsidie toegekend aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek om BelRAI-experten op te leiden om de opleidingscapaciteit op het terrein te verhogen. Het deelproject draagt hierdoor bij aan de doelstelling tot correct leren gebruiken van BelRAI als inschalings- en zorgplanningsinstrument met een positief effect op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de woonzorg.

Budget relance: 10.015 keuro van de in totaal 12.108keuro voor dit deelproject werd ingezet vanuit de relanceprovisie. Een deel van de relancemiddelen (10.015 keuro) werd hiervoor toegevoegd aan andere middelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	138.250.000 EUR
Output	Deelproject "VIA6": Aanwerving extra VTE personeel / verhoging inzet bestaand personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf
	Deelproject "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": Tijdelijk inschakelen extra VTE personeel ikv COVID-19-crisis in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf
	Deelproject "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": De continuïteit in de woonzorgcentra borgen middels een financiële vergoeding voor de door COVID-19-leegstand gederfde inkomsten zodat de voorzieningen hun werking verder kunnen zetten en hun personeelsinzet op pijl kunnen houden en afvloeiingen en lagere kwaliteit van zorg worden vermeden.
	Deelproject "BelRAI-opleidingen": De opleiding van indicatiestellers en trainers binnen de betrokken ouderen- en thuiszorgvoorzieningen.
	Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": - er is een kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra (met uitgewerkte conceptuele en operationele doelstellingen) beschikbaar - 250 WZC kregen een gratis ventilatiescan

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>- een leidraad voor een ventilatieplan op maat is beschikbaar</p> <p>Deelproject ""VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra":</p> <p>1) De door de bewoners en hun vertegenwoordigers ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg;</p> <p>2) Meetmethode voor een duurzame, structurele opvolging van de door bewoners en hun vertegenwoordiger ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg;</p>
Outcome	<p>Deelproject VIA6: Een verhoging van het aantal voltijds equivalenten ingezet personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf</p> <p>Deelproject "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": Een tijdelijke verhoging van het aantal VTE ingezet personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf i.h.k.v. de COVID-19-crisis</p> <p>Deelproject "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": De continuïteit in de woonzorgcentra wordt geborgd. De personeelsinzet blijft op pijl en ontslagen worden vermeden.</p> <p>Deelproject BelRAI-opleidingen: Implementatie van de instrumenten BelRAI Screener, Sociaal Supplement, Home care en LTCF volgens het voorziene tijdsplan (t.e.m. 1/6/2023)</p> <p>Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": kwaliteit van ventilatie in WZC verbeteren-de acties binnen het kwaliteitskader ondersteunen de zorgvoorzieningen in de ontwikkeling en integratie van een nieuw, effectief en efficiënt beleid op vlak van ventilatie of om het bestaand ventilatiebeleid te verbeteren. Dit ten behoeve van de kwetsbare bevolking aanwezig in de WZC.</p> <p>Deelproject ""VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra":</p> <p>1) Resultaten van de meting van door de bewoners ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg;</p> <p>2) Resultaten van de meting van door de vertegenwoordigers van de bewoners ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg;</p> <p>3) Structuren, tools en methodieken om te komen tot een duurzame, structurele opvolging van de door bewoners en hun vertegenwoordiger ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg;</p> <p>4) Transparante communicatie van de resultaten van de meting per woonzorgcentrum.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": dit deelproject zit op schema.- ontwikkeling kwaliteitshandboek:1 er is een overeenkomst met KUL voor de uitwerking van het conceptueel luik van het kwaliteitshandboek; in juni wordt een eerste draftversie van het handboek verwacht 2 er werd een klankbordgroep voor input op het kwaliteitshandboek met verschillende relevante actoren uit de sector opgericht-ontwikkeling ventilatiescan: 1 de resultaten van de zelfscreening van de CO2-concentraties in typelokalen werden verwerkt; op basis van de resultaten werd een selectie gemaakt van de WZC die in aanmerking komen voor een gratis ventilatiescan, 2 er is een samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en het Vlaams Energiebedrijf voor de ontwikkeling van de ventilatiescan, het VEB is gestart met uitvoering van een pilootproject voor de ontwikkeling voor de ventilatiescans</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Inventarisatie bestaande tevredenheidsmetingen en verwachtingen vanuit de sector	2021 Q2	Gerealiseerd	Vaststelling diversiteit van meetinstrumenten. Verwachtingen zijn geëxpliciteerd.
Deelproject VIA6: Uitvoering VIA 6 maatregelen kwaliteit ouderenzorg	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deelproject extra personeelsinzet wzc (covid-19): goedkeuring besluit covid-maatregelen	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deelproject extra personeelsinzet wzc (covid-19): uitbetalen compensaties voor de inzet van extra personeel	2021 Q4	Gerealiseerd	
Resultaten pilootmeting en aangepast meetprotocol voor opstart nulmeting	2023 Q3	Nog niet gestart	
Deelproject BelRAI-opleidingen - subsidie aan voorzieningen voor opleidingsbeleid	2021 Q4	Gerealiseerd	Subsidiebedrag werd uitbetaald. Vormingsbeleid zelf zal een permanent gegeven vormen waarbij tegen 1/6/2023 deze organisaties over voldoende BelRAI-indicatiestellers en -trainers dienen te beschikken om de BelRAI-instrumenten te implementeren. De naleving van deze erkenningsvoorwaarde zal deel uit maken van de inspectiebezoeken van Zorginspectie.
Resultaten nulmeting en meetprotocol bevraging vertegenwoordiger van bewoners	2024 Q3	Nog niet gestart	
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: er is een overeenkomst met KUL Onderzoeksgroep Bouwfysica en Duurzaam Bouwen voor de opmaak van het kwaliteitshandboek	2022 Q1	Gerealiseerd	
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: oprichting WG voor input op kwaliteitshandboek met relevante actoren	2022 Q2	Gerealiseerd	
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor	2022 Q3	Op schema	de opdracht is lopende

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
ventilatie in woonzorgcentra: de KUL heeft zijn opdracht afgerond			
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: opdracht voor copyright en layout van het kwaliteitshandboek is afgerond	2022 Q4	Nog niet gestart	
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: er is een opdracht voor copyright en layout voor het kwaliteitshandboek	2022 Q4	Nog niet gestart	start na wanneer conceptuele en operationele luik kwaliteitshandboek volledig
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: het operationele luik van het kwaliteitshandboek opgeleverd door de KUL werd aangevuld	2022 Q4	Nog niet gestart	kan pas starten na oplevering opdracht KUL
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra werd gepubliceerd op website	2023 Q1	Nog niet gestart	
Resultaten bevraging vertegenwoordigers van bewoners en eindrapport	2025 Q3	Nog niet gestart	
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis aanbod ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: Pilootstudie haalbaarheid CO2 zelfmetingen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis aanbod ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: Ontwikkelen registratietool en dataplatform screening CO2-concentraties	2022 Q1	Gerealiseerd	
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: CO2-screening (zelfmetingen)	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: selectie WZC voor gratis ventilatiescan op basis van hun zelfmetingen	2022 Q2	Op schema	communicatie naar de betreffende WZC moet nog gebeuren
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: er is een overeenkomst met het Vlaams energiebedrijf voor de ontwikkeling van de ventilatiescan	2022 Q2	Gerealiseerd	
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: pilootstudie ventilatiescans	2022 Q3	Op schema	
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: 250 gratis ventilatiescans werden uitgevoerd	2024 Q4	Nog niet gestart	het Vlaams energiebedrijf is gestart met de ontwikkeling van de ventilatiescan het uitvoeren van de gratis ventilatiescan zal starten najaar 2022 en afgerond worden tegen eind 2024
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- leidraad voor een ventilatieplan op maat: er is een opdracht voor de ontwikkeling van de leidraad	2023 Q1	Nog niet gestart	start nadat het handboek is gefinaliseerd
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- leidraad voor een ventilatieplan op maat: de leidraad werd gepubliceerd op website	2023 Q2	Nog niet gestart	
Deelproject "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": opmaak BVR	2022 Q2	Gerealiseerd	Opmaak van regelgeving voor goedkeuring door VR
Deelproject "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": BVR is goedgekeurd en gepubliceerd	2022 Q3	Gerealiseerd	De Vlaamse Regering keurde het BVR goed op 3 juni 2022 waarna de uitvoering van de regeling kan starten.
Deelproject "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": Gegevens zijn opgevraagd en subsidie is uitbetaald	2022 Q3	Op schema	De woonzorgcentra delen alle gegevens mee aan Zorg en Gezondheid waarna het agentschap de continuïteitsborg berekent en uitbetaalt uiterlijk op 31 augustus 2022

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bijkomende tewerkstelling per woonzorgcentrum. De geplande aantallen VTE aanwerving en uitbreiding én de aanwervingsdata van de bijkomende personeelsleden worden doorgegeven tegen eind oktober 2021 via het Vlaams e-loket (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).	2.264 (VIA6-akkoord)	2021 Q4	2.660,4	100 %
Deelproject BelRAI-opleidingen: subsidiebedrag wordt uitbetaald aan alle betrokken ouderen- en thuiszorgorganisaties. Vormingsbeleid zelf zal een permanent gegeven vormen waarbij tegen 1/6/2023 deze organisaties over voldoende BelRAI-indicatiestellers en -trainers dienen te beschikken om de BelRAI-instrumenten te implementeren. Daarnaast dient het vormingsbeleid te worden verankerd in de organisatie om permanente intervisie en bijscholing mogelijk te maken. Deze subsidie is een bijdrage om tegemoet te komen in de opstartkost van deze organisaties.	Volledige toekenning van subsidie 12.132.432,07 euro	2021 Q4	12.132.432,07	100 %
Deelproject "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": aan alle woonzorgcentra met een verminderde bezetting die aan de voorwaarden voldoen wordt een continuïteitsborg betaald		2022 Q3		
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"-kwaliteitshandboek	handboek beschikbaar	2023 Q1		10 %
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- leidraad plan op maat	leidraad beschikbaar	2023 Q2		
Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"-250 gratis ventilatiescans voorzien in oorspronkelijk plan- 218 WZC namen deel aan de CO2-screeningsweek, dus maximaal 218 WZC krijgen gratis ventilatiescan	218	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	138.250.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	138.250.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VAK	34.420.000 EUR
Uitvoering VEK	34.420.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 138.250.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Deelproject "VIA6": [Vlaams intersectoraal akkoord \(VIA6\): wijziging uitvoeringsbesluit Vlaamse sociale bescherming wat VIA6-maatregelen kwaliteit ouderenzorg betreft](#)

Deelproject "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": [Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 april 2021](#)

Deelproject "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": [Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2022 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 januari 2022. Nota en Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2022 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 januari 2022](#)

Deelproject "BelRAI opleidingen": [Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidie opleidingen BelRAI-instrumenten](#)

Deelproject "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra: [Bisnota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC en vooruitschuif nieuw beleid – financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra](#)

Deelproject "VIKZ-tevredenheidsmeting in woonzorgcentra": beslissing nog te nemen door VR

VV046 - OPTREKKEN STRATEGISCHE FORFAITS ZIEKENHUIZEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Zorgnetlcuro en betrokken ziekenhuizen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	09. Welzijnsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Het strategisch forfait is gelinkt aan een infrastructuurinvestering die past binnen een zorgstrategisch kader voor Vlaanderen. Elke investering die raakt aan de zorgstrategische planning dient goedgekeurd te worden door de Vlaamse overheid en moet in overeenstemming zijn met de zorgstrategische planning zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. Het zorgstrategische kader zal dus in principe de basis vormen voor de toekenning van het strategisch forfait. In afwachting van de goedkeuring van de zorgstrategische plannen op regionaal niveau en de individuele zorgstrategische plannen op ziekenhuisniveau kan de Vlaamse Regering echter strategische forfaits toekennen aan dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	Voor de ziekenhuissector worden extra strategische forfaits ingezet/uitbetaald gekoppeld aan de vernieuwing van het bouwpatrimonium. In totaal voor 35,6 mio euro (waarvan 10 mio euro uit het Relanceplan).
Outcome	Op korte termijn kunnen de bouwwerken voor of aan de ziekenhuisinfrastructuur worden opgestart.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In juli en november 2021 en februari 2022 besliste de VR aangaande de toekenning van strategische forfaits aan een aantal dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuisinfrastructuur.
Noodzakelijke politieke actie	Geen verdere actie nodig.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
beslissing VR	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing VR	2021 Q4	Gerealiseerd	
Beslissing VR	2022 Q1	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	16.789.154,90	2021 Q2	16.789.154,9	100 %
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	4.280.729,38	2021 Q4	4.280.729,38	100 %
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	14.564.555,8 euro	2022 Q1	14.564.555,8	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen. Beslissing VR 16/07/2021](#)

[Beslissing van de VR op 26/11/2021 aangaande de goedkeuring van dringende of onafwendbare investeringen in 2 ziekenhuizen](#)

Beslissing van de VR op 04/02/2022 aangaande de goedkeuring van dringende of onafwendbare investeringen in 12 ziekenhuizen

10. Waterstofonderzoek

VV047 - WATERSTOFONDERZOEK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Belanghebbenden	De portfolio richt zich op bedrijven als begunstigden van steun. Dit omvat zowel grote ondernemingen als kmo's. De portfolio beoogt evenwel een ruime impact op het ecosysteem die verder gaat dan individuele bedrijfsvalorisatie. Dit wordt expliciet opgenomen in de criteria, met een voorkeur voor projecten met impact op het ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn. Ook samenwerking met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren wordt hier in rekening genomen. De concrete invulling van impact op het ecosysteem en spill overs kan variëren, per project. Deze zullen later evenwel opgenomen worden als voorwaarden in de subsidietoekenningen zoals ook gebeurd is bij de deelname aan IPCEI-batterijen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	10. Waterstofonderzoek
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Waterstof is een belangrijke component in de transitie naar een klimaatneutrale energie. Waterstof is een energiedrager die kan gebruikt worden voor opslag van energie uit hernieuwbare bronnen maar heeft diverse toepassingen, zoals het gebruik in de industriële processen en aanwending voor transport. Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een cruciale uitdaging. In de waterstofstrategie van de EU wordt uitgegaan van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt de uitbouw van waterstofproductie, maar ook de uitbouw van een waardeketen om transport en gebruik van waterstof en transitie van de industrie in het algemeen mogelijk te maken.</p> <p>Projectdoelstellingen :</p> <p>Met het huidige project beoogt de Vlaamse regering een ondersteuning van de transitie naar een duurzame waterstofindustrie in Vlaanderen via investeringen en projectfinanciering. Met deze portfolio beoogt de Vlaamse regering de uitbouw van een waardeketen in Vlaanderen te stimuleren die ingebed is in een lange termijn doelstelling van vergroening van de industrie en bijdraagt tot de transitie van de industrie waarbij ingespeeld wordt de evolutie naar een meer klimaatneutrale industrie.</p> <p>Het project omvat voor een grootste deel een portfolio die ingebed is in de belangrijke projecten van algemeen Europees belang (Important Projects Common European Interest-IPCEI). Hiermee beoogt de Vlaamse regering aansluiting bij ruimere Europese waardeketens om via die weg de competitiviteit en</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

duurzaamheid van de beoogde transitie te ondersteunen. Waar de IPCEI-portfolio zich vooral richt op de uitbouw van een industriële waardeketen naar productie, transport, stockage en toepassingen van waterstof zal er binnen het project ook aandacht geschonken worden aan import van waterstof. De eigen productie nooit zal immers nooit kunnen voldoen aan de vraag zodat import vereist zal zijn om een stabiel en betaalbaar aanbod te waarborgen om continuïteit in de toepassingen te kunnen garanderen.

Uitvoering van het project:

Het project wordt gerealiseerd door investeringen en projectfinanciering bij bedrijven waarbij aangesloten wordt bij het Europese initiatief over Important Projects of Common European Interest (IPCEI). De focus ligt op projecten met een doorbraakkarakter en duidelijke ambitie met voorrang aan projecten met een bijdrage aan een innovatieve component. Projecten moeten een duidelijke impact hebben op het Vlaamse ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn.

Buiten de IPCEI-portfolio zullen ook additionele projecten met een focus op waterstof beschouwd worden. Dit kunnen O&O&I- of investeringsprojecten zijn die geen nood hebben aan de verruimde staatsteun geboden in IPCEI of projecten m.b.t. import van waterstof.

Voor deelname aan IPCEI werd een portfolio opgebouwd op basis van expressions of interest vanuit de industrie ingediend in een open oproep op 5 juni 2020. Deze gebeurde gezamenlijk met het Brussels hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest met coördinatie door de federale overheid (FOD-economie).

De portfolio beoogt een brede waardeketen met

- (1) productie van groene waterstof uit hernieuwbare energie,
- (2) omzetting naar vloeibare brandstoffen met afgevangen CO₂ voor bewaring en gebruik als brandstof,
- (3) aanwending in industriële processen met het oog op groene transitie,
- (4) aanwending in mobiliteit (zwaar transport),
- (5) ondersteunende producten vereist voor de realisatie van waterstoftransitie,
- (6) infrastructuur voor transport en bewaring van waterstof.

Er zijn 3 types projecten. (1) Projectmatige steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). (2) Eerste industriële toepassing (first industrial deployment-FID): deze moeten steeds de ontwikkeling mogelijk maken van een nieuw product en/of de ontwikkeling van een fundamenteel nieuw productieproces. FID omvat grotendeels investeringen, maar gekoppeld aan de uitrol van de O&O&I resultaten. Zowel OPEX als CAPEX worden aanvaard. (3) Infrastructuur voor milieu en energie. Dit omvat financiering voor investeringen die niet noodzakelijk gekoppeld zijn aan O&O&I. De financiering wordt toegekend op basis van de beoogde milieuwinst. Enkel CAPEX wordt aanvaard.

De opvolging van de projecten gebeurt door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Na notificatie zullen, aanvragen voor finale financiering behandeld worden door het agentschap, waarbij de operationele implementatie grotendeels zal gebeuren door toepassing van de gangbare werkwijze van het agentschap (evaluatie, betaling, opvolging, voorwaarden en mijlpalen...)

Om een coherente samenwerking in de IPCEI-projecten mogelijk te maken werd een evaluatiecomité opgesteld met vertegenwoordigers van de verschillende financierende autoriteiten op regionaal of federaal niveau en coördinatie daar de federale overheid (FOD-economie). Via deze groep is er een nauw overleg tussen Vlaanderen, het Waalse gewest, het Brusselse hoofdstedelijk gewest en de federale overheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	125.000.000 EUR
Output	Aantal gesteunde projecten (vastlegging Vlaamse steunbeslissingen) Aantal gerealiseerde projecten (oplevering resultaten) Betalingen uitgevoerd (90%)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome	Gerealiseerde electrolysecapaciteit voor productie waterstof uit hernieuwbare energie (150 MWatt)
---------	---

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>De prenotificatie gebeurt in verschillende golven. De keuze, evaluatie en indienen van de Vlaamse projecten voor prenotificatie bij de Europese Commissie werd op tijd gerealiseerd. Er zit wel beduidende vertraging op het notificatieproces bij de Europese Commissie. In Vlaanderen werd geopteerd om de beslissing tot steuntoekenning voorwaardelijk te nemen waarbij de uitbetaling afhankelijk blijft van de finale goedkeuring door de Europese Commissie in de notificatie. De bevestiging dat het project kan doorgaan zoals ingediend blijft dan ook afhankelijk van deze goedkeuring door de Europese Commissie die dus een duidelijke impact heeft op het schema van het Vlaamse traject. We voorzien drie lichteningen voor beslissing steuntoekenning, in juli 2022, september 2022 en finaal november/december 2022.</p> <p>Het notificatieproces loopt met vertraging doordat we moeten wachten op de beslissing van de Europese Commissie. Voor de eerste groep waar de prenotificatie gestart werd op 31 augustus maakt de Commissie zich sterk dat de notificatie kan afgerond worden in de zomer 2022. Voor de tweede groep is prenotificatie nog niet gestart, dit wordt verwacht in juni/juli 2022.</p> <p>Enkele bedrijven uit de tweede groep, voor welke de vertraging grote problemen stelt, hebben geopteerd om gebruik te maken van het aanbod van Vlaanderen voor een terugvalpositie waarbij de steun toegekend wordt op basis van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Deze project blijven deel van de IPCEI-portfolio, maar vereisen geen notificatie.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bezorgen van de Vlaamse projectvoorstellen aan de coördinator (Duitsland) voor integratie in het Europese notificatiedossier	2021 Q2	Gerealiseerd	Uitgevoerd in een intensieve workshop in eerste helft van juli 2021
Indienen (door coördinator Duitsland) van het dossier voor prenotificatie bij de Europese Commissie	2021 Q2	Gerealiseerd	Ingediend op 31 augustus 2021
Bezorgen van de projectvoorstellen aan de coördinator (Duitsland) voor	2022 Q1	Vertraging	Dit is proces is volop aan de gang, en wordt verwacht afgerond te zijn tegen juni 2022.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
integratie in het Europese notificatiedossier voor de tweede groep			
Eerste en tweede Q&A met Commissie voor projecten eerste groep (wave 1 en 2)	2022 Q1	Vertraging	Grotendeels afgerond, met mogelijk nog een aantal additionele vragen voor een beperkte groep projecten in juni 2022. Wachten op beslissing Europese Commissie.
Indienen (door coördinator Duitsland) van het dossier voor prenotificatie bij de Europese Commissie voor de tweede groep	2022 Q1	Vertraging	Dit staat momenteel gepland voor juni 2022 maar additionele vertraging wordt verwacht. Wachten op beslissing Europese Commissie.
Start notificatie door Commissie eerste groep	2022 Q1	Vertraging	Voor de eerste groep is de start voorzien voor juni 2022 voor een deel van de projecten (golf 'Technology') en in de daarop volgende maanden voor de resterende projecten (golf 'Industry'). Wachten op beslissing Europese Commissie.
Indienen aanvragen voor Vlaamse steun eerste groep	2022 Q1	Gerealiseerd	Alle aanvragen voor de Vlaamse steun voor de eerste groep zijn ingediend
Goedkeuring EU eerste groep	2022 Q1	Vertraging	De Commissie maakt zich sterk dat de goedkeuring kan gebeuren 'by the summer' 2022. Wachten op beslissing Europese Commissie.
Ontvangst bijkomende projecten (buiten de portfolio ingediend in de expression for interest of IPCEI)	2022 Q2	Gerealiseerd	Een milieustudie voor ArcelorMittal werd ingediend. Dit sluit aan bij het onderwerp en de oproep voor expressions of interest.
Indienen aanvragen Vlaamse steun tweede groep	2022 Q2	Gerealiseerd	Al de aanvragen voor Vlaamse steun voor de projecten van de tweede groep werden ingediend. Afgerond sinds 2 mei 2022.
Eerste en tweede Q&A met de Commissie voor projecten tweede groep	2022 Q3	Vertraging	Wordt momenteel verwacht in 2023 Q1. Wachten op beslissing Europese Commissie.
Start notificatie door Commissie tweede groep	2022 Q3	Vertraging	Wordt momenteel verwacht in 2023 Q2. Wachten op beslissing Europese Commissie.
Steunbeslissing voor O&O&I-projecten eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q3	Op schema	Steunbeslissingen zijn in voorbereiding voor 2022-Q3

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Steunbeslissing voor First Industrial Deployment eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q3	Op schema	Steunbeslissingen zijn in voorbereiding voor 2022-Q3
Steunbeslissing voor investeringen in klimaatacties (EET) eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q3	Op schema	Steunbeslissingen zijn in voorbereiding voor 2022-Q3
Goedkeuring EU tweede groep	2022 Q4	Vertraging	Wordt verwacht 2023-Q2. Wachten op beslissing Europese Commissie.
Steunbeslissing voor bijkomende projecten (ingediend buiten de portfolio projecten ingediend in de expression of interest voor IPCEI)	2022 Q4	Gerealiseerd	Een steuntoekenning voor de milieustudie ingediend door ArcelorMittal werd toegekend in april 2022.
RRF mijlpaal: contract steunbeslissingen non-IPCEI projecten	2022 Q4	Op schema	
Steunbeslissing voor projecten O&O&I voor de tweede groep	2022 Q4	Op schema	
Steunbeslissing voor projecten First Industrial Deployment voor de tweede groep	2022 Q4	Op schema	
Steunbeslissing voor projecten klimaatacties (EET) voor de tweede groep	2022 Q4	Op schema	
RRF mijlpaal: contract steunbeslissingen IPCEI projecten	2022 Q4	Op schema	
RRF mijlpaal: eindresultaat projecten (oplevering)	2026 Q2	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal Vlaamse steunbeslissingen toegekend en vastgelegd	22	2022 Q4		
Aantal (deel)projecten uitgevoerd	22	2026 Q2		
Outcome indicator: gerealiseerde electrolyse capaciteit	150 MWatt	2026 Q2		
Projecten uitbetaald	90% budget	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	125.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	125.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 125.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

11. Vergroening weginfrastructuur

VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers, de burger

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het doel van dit project is om via innovatieve LED-verlichting te investeren in duurzame weginfrastructuur. Het is energiezuiniger en vergt minder onderhoud. Door een beperkte aanpassing kan bovendien de zichtbaarheid op de weg verbeterd worden, wat leidt tot meer verkeersveiligheid en het aanpakken van files. Het uitvoeren van de ombouw van verlichting uitgerust met lampen naar LED-verlichting zal het energieverbruik van het AWV met ten minste 35% doen dalen, met een totale koolstofbesparing van 6.800 à 9.700 ton CO2 per jaar tot gevolg.

Dit project draagt dus significant bij tot de doelstelling van de Vlaamse Regering om een totale reductie in energieverbruik te realiseren van 30% in 2030 t.o.v. het verbruik van 2015, zoals beschreven in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	84.500.000 EUR
Output	Omgebouwde verlichting (naar LED) op gewestwegen, daling van het geïnstalleerd verlichtingsvermogen
Outcome	Optimalisatie van het onderhoudsprogramma van de verlichting, vermindering van het energieverbruik door de overheid (bijdrage aan klimaatplannen).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Voor de ombouw van de verlichting naar LED op gewestwegen, lopen de voorbereidende studies volgens schema en zijn ze bijna afgerond.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>Voor de uitvoering van de werken wordt een lichte vertraging verwacht van 3 maanden omwille van het wereldwijde chiptekort (impact op de leveranciers van verlichtingstoestellen en lokale afstandsbeveiliging).</p> <p>Ondanks een kleine vertraging komt voorlopig de beoogde uitvoeringstermijn niet in het gedrang. De start van het plaatsen van de verlichtingstoestellen wordt voorzien vanaf september 2022. De volledige ombouw zal gerealiseerd zijn in het najaar van 2024.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbestedingsprocedure opstarten	2021 Q1	Gerealiseerd	
Gunning	2021 Q3	Gerealiseerd	
Uitvoering ombouw wegverlichtingsinstallaties voor LED-lampen langs de gewestwegen	2024 Q3	Op schema	Ondanks de kleine vertraging met 3 maanden komt de beoogde uitvoeringstermijn voorlopig niet in het gedrang.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
% minder verbruik	-35%	2024 Q3		
Aantal omgebouwde installaties	1197	2024 Q3		
Aantal omgebouwde masten	69116	2024 Q3		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	84.500.000 EUR
Uitvoering VAK	84.498.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 84.500.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

Nota aan de Vlaamse Regering van 4 juni 2021 - Overheidsopdracht VWT-EW-2020-024: Ombouwen van wegverlichting uitgerust met lampen naar LED langs gewestwegen in het Vlaams Gewest

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	(Toekomstige) eigenaars van elektrische wagens

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

De versnelde uitrol van laadinfrastructuur moet bijdragen tot de vergroening van het transport en de modal shift. Nu het wagenpark aan de vooravond staat van een transitie naar volledig elektrisch rijden, wordt er versneld werk gemaakt van een ambitieuze uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen. Door het aantal laadpunten op te trekken en verder te investeren in snellaadinfrastructuur langs grote verkeersassen en strategische locaties in Vlaanderen wordt het comfort en de gemoedsrust van de EV-rijders over langere afstand gegarandeerd. Zo kan er meer ingezet worden op duurzame verkeersmodi.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.000.000 EUR
Output	Goedkeuren van een beleidskader, realisatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens
Outcome	Stimuleren van emissievrij vervoer

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De nodige initiatieven voor het installeren van laadpaalinfrastructuur lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De strategienota laadinfrastructuur werd in Q4 2020 gerealiseerd. Het vereiste beleidskader voor de uitrol van oplaadinfrastructuur werd opgeleverd met de parlementaire goedkeuring van het decreet in Q3 2021. Ter afronding werd een bijhorend uitvoeringsbesluit goedgekeurd op de Vlaamse Regering in december 2021. - De opmaak van potentieelkaarten voor laadinfrastructuur werd afgerond eind 2021 met de oplevering van het eindrapport. Het verzamelen van de data over laadpunten loopt volgens schema. De data wordt real-time ontsloten. De verdere onderbouwing voor de uitrol van laadpunten verloopt continu en is in studiefase alsook op schema.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- Om semi-publieke laadinfrastructuur op privaat domein te stimuleren, leverde een eerste projectcall 210 goedgekeurde projecten op (subsidiebedrag 8,2 miljoen euro). Deze projecten worden vanaf november 2021 gerealiseerd ten velde en zijn bij volledige uitvoering goed voor 9.798 van de te realiseren CPE (laadpuntequivalenten). Op 10 mei waren er 211 CPE gerealiseerd. De uitvoering zit dan ook in een startfase. Bovendien liepen veel projecten vertraging op door leveringsproblemen van laadpalen en elektriciteitscabines. Alleszins hebben deze projecten een uitvoeringstermijn van maximum 2 jaar.
 - Een tweede dergelijke projectcall wordt voorzien in Q2 2022. De uitvoering van de nieuwe projecten, die hieruit voortvloeien, zal voornamelijk in 2023 en 2024 plaatsvinden.
 - De start van de eerste concessies voor publieke laadpunten op openbaar domein is voorzien in Q3 2022. De plaatsingstermijn hiervan bedraagt 2 jaar. Er wordt geraamd dat in die periode hiermee de plaatsing van ca. 10.000 CPE geïnitieerd zal worden.
 - Voor (ultra)snelladers langs de grote verkeersassen liep een eerste projectcall tot 15 september 2021 waarbij de 49 goedgekeurde projecten goed zijn voor 2195 CPE (laadpuntequivalenten). Nu worden de procedures doorlopen voor het verkrijgen van de verschillende vergunningen (o.a. omgevingsvergunning als vergunning voor de inname van het openbaar domein). Verwacht wordt dat de meeste ultrasnelladers medio 2023 zullen opgeleverd worden. Ook hier volgt een tweede call in Q3 2022.
 - In mei 2022 waren er minstens* 12.266,5 CPE toegankelijk in Vlaanderen. Het oorspronkelijke startpunt was 4926 CPE (laadpuntequivalenten) aan publieke laadpunten. Wanneer de 1636,5 CPE semi-publieke laadinfrastructuur ook wordt meegenomen, ligt het eigenlijke startpunt op 6468 CPE. Dat betekent dat er intussen al minstens* 5798,5 CPE is bijgekomen. Het tussentijds doel voor Q2 2023 is 9000 extra CPE.
- *Omwille van problemen bij de dataleverancier zijn er op dit moment slechts beperkte actuele gegevens. Voor de laders met een normaal vermogen zijn de cijfers voor mei 2022 ter beschikking voor de laadinfrastructuur met een hoger vermogen (>22kW) dateren de laatste cijfers van februari 2022. Met de inschatting werden de 58 Tesla-ultrasnellaadpunten, die recent publiek werden opengesteld, en twee ultrasnellaadpunten uit de projectoproep voor semi-publieke laadinfrastructuur op privaat domein, die geopend werden in april 2022, bijkomend meegeteld. Bij een volgende update VVK zal dit probleem inzake de data verholpen zijn.
- In het kader van de uitrol van publieke laadinfrastructuur spreken we van Charge Point Equivalent (CPE), waarbij een CPE gedefinieerd is in een logisch wegingsysteem. Een laadpaal met een beperkte laadsnelheid/vermogen (3-7 kW) komt overeen met 1 CPE, bij een laadpaal met een normaal vermogen (11-22 kW) zijn dat 2 CPE, bij een AC-snellader (43 kW) zijn het er 4, bij een DC-snellader (50 kW tot minder dan 150 kW) tellen we er 5 en bij een ultrasnellader (150 kW en meer) 10. Dit geldt voor publieke laadpunten (24/7). Laadpunten, die minstens 10u per etmaal voor iedereen toegankelijk zijn, tellen voor de helft. Andere laadpunten worden hierbij niet meegeteld. Op deze manier zorgen we voor een uniform equivalent in de verschillende vermogens en toegankelijkheid van laadinfrastructuur.

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opmaak potentieelkaarten laadinfrastructuur	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lanceren subsidiecall laadinfrastructuur 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lanceren subsidiecall laadinfrastructuur 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	
Onderbouwing uitrol laadpunten in Vlaanderen	2022 Q4	Op schema	Geactualiseerde timing: het betreft een doorlopende actie.
Verzamelen data laadpunten	2022 Q4	Op schema	Geactualiseerde timing: het betreft een doorlopende actie.
Organisatie concessies publieke laadpunten	2022 Q4	Op schema	
Installatie van snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2021)	2024 Q4	Op schema	
Installatie snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2022)	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Goedkeuring beleidskader voor de uitrol van oplaadinfrastructuur. Het beleidskader maakt het mogelijk: - de toekomstige oplaadpunten in kaart te brengen - de concessieopdrachten voor oplaadpunten in het publieke domein te lanceren - de uitrol van (semi-)publieke oplaadpunten op het particuliere domein te stimuleren - de doorlooptijd voor de installatie van oplaadpunten in te korten door de administratieve lasten te verminderen - het opladen in een slim elektriciteitsnet te stimuleren	Goedkeuring van het kader	2021 Q4	1	100 %
Toekenning van concessies voor oplaadinfrastructuur. Het wetgevingskader voor de uitrol van publieke oplaadinfrastructuur wordt verzekerd via door de Vlaamse regering verleende concessies. De uitrol wordt overgelaten aan particuliere exploitanten.	Schriftelijke kennisgeving van gunning van opdracht aan geslaagde kandidaten	2022 Q3		
Oplaadinfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))	9000	2023 Q2	5.798,5	64,4 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Oplaainfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))	22.000	2025 Q2		
Oplaainfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))	30.000	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	14.512.000 EUR
Uitvoering VEK	333.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 29.460.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 540.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
CPT Visie cf. VR 7 september 2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
VR 2021 1607 DEC.0073 Decreet zero-emissievoertuigen en voertuigen alternatieve brandstoffen
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Bijlage
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen - nota

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissie vervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor desubsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissie vervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Advies Raad van State over het een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissie vervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Projectoproep uitrol ultrasnelladers \(≥150kW\) op parkings langs autosnel-en gewestwegen](#)

[Oproep tot kandidaatstelling voor uitrol ultrasnelladers \(≥150 kW\) op parkings langs autosnel-en gewestwegen. Bijlage](#)

[Kandidaatstellingsformulier. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissie vervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven alternatieve brandstof](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissie vervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

12. Iedereen lokaal digitaal

VV050 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Agentschap Integratie en Inburgering, IN-Gent vzw, Atlas vzw, Huis van het Nederlands Brussel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Het programma 'Digitalisering Integratie en Inburgering' geeft uitvoering aan de ambities, vermeld in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 omtrent de hertekening van inburgering en het aanpassen van het integratiebeleid. De inburgeringstrajecten digitaliseren zal ervoor zorgen dat mensen sneller en meer op zelfstandige basis de vaardigheden en kennis kunnen verwerven om het inburgeringstraject te doorlopen. Zo kunnen ze ook sneller actief worden op de arbeidsmarkt, op eigen benen staan en bijdragen aan de welvaart van onze samenleving.

De middelen zullen door het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering, Atlas vzw, IN-Gent vzw en het Huis van het Nederlands Brussel (hierna de agentschappen en het huis) gezamenlijk ingezet worden voor zes werven:

Werk 1: De Kruispuntbank Inburgering (KBI): De KBI is het cliëntvolgsysteem dat door de Vlaamse Regering ter beschikking gesteld wordt aan de agentschappen en het huis om de kerntaken uit het decreet te vervullen. KBI faciliteert ook de elektronische gegevensuitwisseling in kader van inburgeringstrajecten, taalkennis Nederlands en Nederlands als tweede taal-trajecten met de Vlaamse onderwijsadministratie, VDAB, Actiris, lokale besturen en OCMW. Het systeem is verouderd en wordt volledig vernieuwd.

Werk 2: Community building en digital marketing (CRM): De agentschappen en het huis zetten in op klantenbeheer en klantenbinding door de implementatie van een CRM-systeem. Er wordt hierbij niet alleen op de klantgroep van inburgeraars en anderstaligen gefocust (i.f.v. werving), maar voornamelijk op lokale besturen, (overheids)organisaties, voorzieningen en vrijwilligers i.f.v. de andere dienstverleningen van de agentschappen en het huis (sociaal tolken en vertalen, juridische dienstverlening, integratiewerk, taalbeleid,...). Momenteel verloopt dit binnen de agentschappen en het huis zonder centraal ondersteund systeem.

Werk 3: Klantenportaal en -dienstverlening: De agentschappen en het huis willen hun dienstverlening klantgericht, efficiënter en effectiever organiseren. Daarom zetten ze voor hun werking in op digitale

PROJECTOMSCHRIJVING

loketten. Via deze weg kunnen klanten die voldoende digitaal vaardig zijn via een self-service module het stuur in handen nemen van hun traject. We verhogen hiermee de digitale zelfredzaamheid. Zo zal een centraal portaal de klant toegang geven tot de verschillende tools die hij nodig heeft om het inburgeringstraject te doorlopen en tot tools die het doorlopen van dat traject eenvoudiger maken.

Werk 4: Online leren en testen: De agentschappen en het huis zullen verder inzetten op het online leren en testen van hun verschillende klantgroepen (inburgeraars, anderstaligen, lokale besturen, organisaties, (kandidaat)-tolken). Online leren, maakt activerend en tijd- en plaatsafhankelijk leren mogelijk en is bij uitstek geschikt om de deelnemer de mogelijkheid te bieden om de training of opleiding te volgen wanneer en de wijze waarop zij dat willen.

Werk 5: Nederlandse taalverwerving: We optimaliseren de dienstverlening sociaal tolken en vertalen van de verschillende agentschappen. De werking wordt maximaal gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Naast het professioneel aanbod, zitten ook brugfuncties zitten in deze scope (laagdrempelig digitaal intakestelsel om de vraag te verduidelijken en te zorgen voor een automatische matching vraag en aanbod, automatische koppeling registratie- en facturatiesystemen, performant digitaal platform voor afstandstolken (telefoontolken en videotolken),...). Er wordt ook ingezet op de ontwikkeling van een applicatie taalprofielen die de bestaande en toekomstige taalprofielen laagdrempelig ontsluit voor een brede groep gebruikers: o.m. werkgevers, de interim-sector, arbeidsbemiddelaars, opleidingen en overheden.

Werk 6: Digitale wendbaarheid: De digitalisering van de publieke diensten en de samenleving in het algemeen heeft een effect op het leven van de inburgeraar, anderstalige en de medewerkers van de agentschappen en het huis. Concreet zal er ingezet worden op het versterken van digitale vaardigheden van inburgeraars én medewerkers.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	15.000.000 EUR
Output	- aantal vernieuwende acties m.b.t. digitalisering binnen de uitvoering van het inburgeringsbeleid - aantal inburgeraars in het hybride of digitaal traject
Outcome	- klantenwerking te verbeteren: nieuwkomers, inburgeraars, anderstaligen, lokale besturen, andere (overheids)organisaties en iedereen in de samenleving wordt er beter van als de agentschappen en het huis op een meer afgestemde en digitale manier (samen)werken - een sector-overschrijdende vereenvoudiging te realiseren - vereenvoudiging van klantprocessen en datadeling om zo efficiëntiewinst te bereiken - creatie van ruimte voor het personeel bv. op het vlak van dienstverlening die maatwerk vraagt - verhogen digitale vaardigheden

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het projectteam is opgestart in september 2021. Er is nog een openstaande vacature voor een projectleider digitalisering die nog niet ingevuld is. De eerste vooronderzoeken zijn binnen de verschillende werven afgerond. Projecten zijn opgestart en in uitvoering. Binnen de werven zijn gunningsprocessen i.f.v. een technische leverancier opgestart of afgerond. Er is een tweede dossier opgemaakt voor herverdeling relancemiddelen dat in Q2 2022 geagendeerd wordt op de Vlaamse Regering.
Noodzakelijke politieke actie	Goedkeuring tweede relancedossier voor herverdeling relancemiddelen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Op basis van een uitgewerkt plan van het Agentschap Integratie en Inburgering eerste aanvraag aan middelen herverdelen naar het Agentschap.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Werven opgestart	2021 Q4	Op schema	
Op basis van een uitgewerkt plan van het Agentschap Integratie en Inburgering een tweede aanvraag aan middelen herverdelen naar het Agentschap.	2022 Q2	Op schema	
Werk 1: KBI - vooronderzoek (business case o.l.v. Digitaal Vlaanderen)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Werk 1: KBI - bestek en gunning	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werk 2: CRM - Business case technisch platform	2021 Q3	Gerealiseerd	
Werk 2: CRM - bestek en gunning	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werk 2: platform netwerk- en participatietraject - projectplan	2022 Q1	Op schema	
Werk 3: fase 1 betaalmodule	2022 Q1	Gerealiseerd	
Werk 3: vernieuwing vreemdelingenrecht.be - vooronderzoek	2021 Q4	Gerealiseerd	
Werk 2: platform netwerk- en participatietraject - vooronderzoek	2022 Q2	Op schema	
Werk 3: vernieuwing vreemdelingenrecht.be - bestek en gunning	2022 Q1	Vertraging	Omwille van het ontbreken van een projectleider heeft de start van het project vertraging opgelopen.
Werk 2: platform netwerk- en participatietraject - gunning	2022 Q3	Nog niet gestart	
Werk 4: Leerplatform - vooronderzoek	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Werk 4: Leerplatform - gunning	2021 Q4	Gerealiseerd	
Werk 3: Leerplatform - implementatie	2022 Q3	Op schema	
Werk 3: fase 2 betaalmodule	2022 Q4	Op schema	
Werk 5: Nederlandse taalverwerving - projectplan	2022 Q1	Gerealiseerd	
Werk 6: digitale wendbaarheid - vooronderzoek	2021 Q4	Vertraging	Het vooronderzoek loopt vertraging omdat in de verschillende werven keuzes gemaakt zullen worden ifv tools. Op basis van die keuzes, kunnen de juiste opleidingen en ondersteunend materiaal (voor medewerkers en klanten) in kaart gebracht worden en voorzien worden. De vooropgestelde mijlpaal (Q4 2021) was vanuit dat opzicht geen correcte inschatting aangezien vooronderzoeken en gunningen voor de tools nog lopen in 2022.
Projectteam voltallig	2021 Q4	Vertraging	Het projectteam is opgestart in september 2021. Er is nog een openstaande vacature voor een projectleider digitalisering die nog niet ingevuld is.
Werk 5: Nederlandse taalverwerving - vooronderzoek	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werk 6: screeningstool - vooronderzoek	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werk 4: Content Hosting en Analytics Collect en Send - gunning	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werk 5: Nederlandse taalverwerving - gunning	2022 Q3	Nog niet gestart	
Werk 6: screeningstool - gunning	2022 Q4	Nog niet gestart	
Werk 4 - e-learningontwikkeling - gunning	2022 Q4	Nog niet gestart	
Werk 4: Digitale testen - Testplatform - vooronderzoek	2022 Q4	Nog niet gestart	
Werk 5: applicatie taalprofielen - vooronderzoek	2022 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Er is een tool om verplichte inburgeraars die niet werken of niet studeren te matchen in een netwerk- of participatietraject	100%	2022 Q4		
Er is een online betaalmodule via dewelke digitaal vaardige inburgeraars en anderstaligen kunnen betalen	100%	2022 Q4		50 %
Er is een leerplatform waar de leerkrachten maatschappelijke oriëntatie op kunnen werken	100%	2022 Q4		50 %
Er is een vernieuwde website vreemdelingenrecht.be	100%	2023 Q1		
er is een screeningstool om de digitale vaardigheden van inburgeraars en anderstaligen te meten	100%	2023 Q4		
Er is een klantenportaal waar digitaal vaardige inburgeraars informatie kunnen raadplegen	100%	2023 Q4		
er is een platform waar online testen op afgenomen kunnen worden	100%	2024 Q4		
Er is een tool om inburgeraars digitaal te werven	100%	2024 Q4		
Er is een nieuw klantvolgsysteem voor inburgeraars	100%	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.742.000 EUR
Uitvoering VEK	744.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 15.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 september 2021. Vlaamse Veerkracht - digitalisering integratie en inburgering](#)

VV051 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Lokale besturen, VVSG, V-ICT-OR, Exello.net

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Het doel van dit project is het versneld digitaliseren van de processen en dienstverlening van lokale besturen. Op die manier kunnen bedrijven en burgers sneller hun administratieve verplichtingen afwerken, zonder in een fysieke rij te staan. Bovendien moet dit de administratieve rompslomp eenvoudiger maken, de afhandeling sneller en efficiënter. Een "gemeente zonder gemeentehuis" is daarbij de provocerende gedachte, tegelijk met meer telewerkende ambtenaren.

Het project "Gemeente zonder gemeentehuis" zal op basis van een systeem met oproepen resulteren in projectsubsidies voor Lokale Besturen die hun dienstverlening meer burgergericht, transparant en efficiënt willen inrichten door middel van digitale tools. Het project creëert dus ruimte en mogelijkheden voor een transformatieve aanpak van de gemeentelijke dienstverlening en werking. Er wordt hierbij gestreefd naar hergebruik door en delen van de oplossingen tussen lokale besturen om de grootst mogelijke impact te hebben.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	35.000.000 EUR
Output	Uitgevoerde projecten van de diverse oproepen (volgt uit mijlpalen) en een verrijking van de Vlaamse Digitale Architectuur voor lokale besturen.
Outcome	Meerdere lokale besturen hebben samen of zelfstandig een stap gezet (effectieve verbetering van de dienstverlening en een leertraject doorlopen) in het burgergericht inzetten van digitalisering. Hiertoe hebben ze zelfstandig of met partners een aantal digitaliseringsprojecten succesvol doorlopen waarbij ze werkten op innovatieve dienstverlening, digitale democratie en de werkplek van de toekomst.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering V&A
Beschrijving voortgang	Het programma draait op volle toeren. Ondertussen is oproep 5 (van 7) lopend en zijn oproep 1 tem 4 afgehandeld. De projecten voortkomend uit de eerste en tweede oproep zijn dan weer in volle opstart bij de lokale besturen. Het initiële succes zet zich verder

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	met ondertussen meer dan 60 aanvragen waarvan 38 goedgekeurd. Daarbij waren 160 besturen betrokken of meer dan de helft van de lokale besturen. Er is een goede verdeling in de deelname over grote en kleine besturen en een evenwichtige spreiding over de provincies. Het merendeel van de oproepen focust op innovatieve dienstverlening gevolgd door de werkplek van de toekomst. De toegekende subsidies zijn met vier oproepen op de helft van het beschikbare middelen. Alle innovatieve-concept-oproepen zijn achter de rug.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALLEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Visienota Gemeente zonder gemeentehuis goedgekeurd.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Goedkeuring nota Gemeente zonder gemeentehuis op Vlaamse Regering	2021 Q3	Gerealiseerd	
Eerste oproepronde gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oproep 2 gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
Oproep 3 gestart	2021 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 2	2022 Q2	Gerealiseerd	Het voorgelegde advies van de jury werd integraal goedgekeurd door de Vlaamse Regering
subsidieadvies oproep 1 voorgelegd aan de bevoegde minister	2022 Q1	Gerealiseerd	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 3	2022 Q2	Gerealiseerd	Nadat de jury de dossier beoordeelt wordt een advies aan de Vlaamse Regering opgesteld. Dit gebeurt onder de vorm van een besluit te nemen door de Vlaamse Regering. De regering besliste het voorstel van de jury integraal te volgen op de zitting van 13 mei.
Oproep 4 gestart	2021 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 4	2022 Q2	Op schema	Het advies van de jury is voorgelegd aan de Vlaamse Regering
Oproep 5 gestart	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 5	2022 Q3	Nog niet gestart	
Eindrapport met retrospectieve over de gerealiseerde projecten en de mate waarin die bijdroegen tot de realisatie van de opgestelde visie.	2026 Q4	Nog niet gestart	
Oproep 6 gestart	2022 Q1	Nog niet gestart	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 6	2022 Q4	Nog niet gestart	
Oproep 7 gestart	2022 Q2	Nog niet gestart	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 7	2022 Q4	Nog niet gestart	
Alle goedgekeurde projecten zijn opgestart via een formele opstartmeeting	2023 Q2	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal dossiers bij oproep 1	20	2021 Q4	28	100 %
Het aantal gemeenten dat betrokken is of samenwerkt bij de digitalisering van lokale dienstverlening (via GZG)	Eén derde van de gemeenten	2022 Q4	160	
Totaal aantal goedgekeurde dossiers door de VR in het kader van gemeente zonder gemeentehuis.	60	2022 Q4	38	
Aantal diensten(processen) dat deels of volledig gedigitaliseerd is door via GzG	25 % van de diensten op basis van IPDC (Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus)	2025 Q4		
Aantal digitale bouwstenen van Vlaanderen voor lokale besturen dat door het project wordt opgezet of verbeterd.	10	2025 Q4	3	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	35.000.000 EUR
Uitvoering VAK	11.981.000 EUR
Uitvoering VEK	2.656.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 28.926.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.074.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Mededeling VR 26 februari 2021: Gemeente zonder gemeentehuis: oprichting van een programmateam</p> <p>Mededeling VR 26 februari 2021: Gemeente zonder gemeentehuis: oprichting van een programmateam. Bijlage</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Programma Gemeente zonder Gemeentehuis</p> <p>Lokaal digitaal. Visietekst Bijlage. 9 juli 2021</p>

VV052 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Overheidspersoneel
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

We zetten in op de ontwikkeling van een instrumentarium om de lokale besturen, en bij uitbreiding de Vlaamse overheid, te ondersteunen bij hun e-inclusiebeleid. We zetten daarbij in op relanceprojecten zoals digibuddies waarbij gemotiveerde vrijwilligers andere Vlamingen helpen om mee te geraken in de digitale wereld. We zetten experts in die lokale besturen ondersteunen bij het uitrollen van het actieplan "Iedereen Digitaal". We ontwikkelen audiovisuele en andere instrumenten die iedereen helpen om digitaal sterker te worden. We versterken lerende netwerken en bieden de lokale besturen de nodige instrumenten aan om digitale vaardigheden van werknemers te kunnen screenen. Bij uitbreiding voorzien we dergelijk instrumentarium (screening van digitale vaardigheden) ook voor de Vlaamse overheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.710.000 EUR
Output	Aantal lokale besturen die ondersteund worden bij hun e-inclusiebeleid.
Outcome	Lokale besturen voeren een lokaal e-inclusiebeleid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Ondersteuning van lokale besturen door Imec (Mediawijs) en VVSG is lopende. Overheidsopdracht voor screeningstool digitale vaardigheden voor medewerkers VO is gelanceerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Actieplan 'Iedereen Digitaal'	2021 Q1	Gerealiseerd	
Ondersteuning lokale besturen door Imec (Mediawijs) en VVSG van start	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning opdracht screeningstool digitale vaardigheden medewerkers VO	2022 Q4	Op schema	
Ondersteuning lokale besturen voltooid	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen die ondersteund worden.	300	2024 Q4	100	33,3 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.710.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.710.000 EUR
Uitvoering VAK	1.908.000 EUR
Uitvoering VEK	763.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.710.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan 'Iedereen Digitaal' werd op 16 juli 2021 door de VR goedgekeurd.](#)

VV053 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Agentschap Overheidspersoneel
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Iedereen moet digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarom voorzien we in 19,7 miljoen euro die gemeenten kunnen gebruiken om acties rond e-inclusie, waaronder vormingen en opleidingen op maat van digitaal kwetsbare doelgroepen uit te werken met lokale partners.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	19.700.000 EUR
Output	Aantal lokale besturen die financieel ondersteund worden bij het voeren van een lokaal e-inclusiebeleid
Outcome	Lokale besturen hebben een lokaal e-inclusiebeleid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Financiële ondersteuning van 108 kleine en middelgrote lokale besturen via de projectoproep 'uitbouw e-inclusiebeleid'. Financiële ondersteuning van de 13 centrumsteden en de VGC via de City Deal 'E-inclusion by Design'.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Actieplan Iedereen Digitaal	2021 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Oproep 'uitbouw e-inclusiebeleid' gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oproep 'uitbouw e-inclusiebeleid' afgesloten en beoordeling voltooid	2021 Q4	Gerealiseerd	
Oproepen 'uitbouw e-inclusiebeleid' gestart	2022 Q1	Gerealiseerd	
City Deal 'E-inclusion by Design' gestart	2022 Q1	Gerealiseerd	
27 projecten 'uitbouw e-inclusiebeleid' voltooid bij 108 lokale besturen	2024 Q4	Op schema	
City Deal 'E-inclusion by Design' voltooid	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal projecten van lokale besturen rond lokaal e-inclusiebeleid opgestart.	26	2022 Q1	28	100 %
Aantal lokale besturen die financieel ondersteund worden bij het voeren van een lokaal e-inclusiebeleid.	300	2022 Q4	121	40,3 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	19.700.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	19.700.000 EUR
Uitvoering VAK	5.032.000 EUR
Uitvoering VEK	2.470.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 19.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Het actieplan 'Iedereen digitaal' werd op 16 juli 2021 door de VR goedgekeurd.](#)

VV054 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Alle Vlamingen verdienen toegang tot internet. Daarom investeren we 27.590.000 euro in kansengroepen toegang bieden tot internet. Daarbij gaat ook aandacht naar wetenschappelijke ondersteuning van het e-inclusiebeleid. Ook willen we lokale besturen ondersteunen bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	27.590.000 EUR
Output	Wetenschappelijk onderzoek en rapporten over e-inclusie en een e-inclusiebeleid. Aantal lokale besturen die worden ondersteund bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening. Actie rond kansengroepen toegang bieden tot internet.
Outcome	Het e-inclusiebeleid wordt wetenschappelijk ondersteund en lokale besturen worden ondersteund bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening. Kansengroepen hebben toegang tot internet.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Overheidsopdracht wetenschappelijke ondersteuning werd gelanceerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Actieplan 'Iedereen Digitaal'	2021 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gunning overheidsopdracht wetenschappelijke ondersteuning	2022 Q3	Op schema	
Wetenschappelijk onderzoek en rapporten rond e-inclusie en een e-inclusiebeleid opgeleverd	2024 Q4	Nog niet gestart	
Start ondersteuning lokale besturen bij toegankelijk maken van digitale dienstverlening	2022 Q2	Op schema	
Start actie rond kansengroepen toegang bieden tot internet	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal wetenschappelijke rapporten rond e-inclusie en een e-inclusiebeleid.	9	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	27.590.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.590.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.590.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: toewijzing middelen 'Iedereen Digitaal' 16/07/2021](#)

VV055 - SMART CITIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen in de top-5 regio's van het Regionaal Innovatiescorebord. Digitale innovatie zal de sleutel zijn om dit doel te bereiken. Tegelijk worden steden geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen, gaande van economie tot milieu en van mobiliteit tot sociale cohesie. Daarom moedigen we onze steden en gemeenten aan om Smart City-toepassingen te testen en op te schalen. Dit draagt bij tot de kwaliteit van de informatie en de dienstverlening aan bedrijven en burgers, zoals de voorlopers illustreren. Maar daarmee stimuleren en demonstreren we ook onze technologie- en ICT-bedrijven en bieden we kansen voor internationale doorbraken.

We lanceren twee oproepen met focus op zes thema's: Slimme mobiliteit, Slim milieu, Slimme mensen, Slim leven, Slim bestuur en Slimme economie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	Realisatie en implementatie van nieuwe toepassingen voor Smart Cities bij lokale besturen
Outcome	Vlaanderen op de kaart zetten als Slimme Regio

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op 1 april 2022 werden zowel de 10 gunstig gerangschikte projecten uit de oproep 2021 goedgekeurd door de Vlaamse Regering als de oproep 2022 gelanceerd. De 10 goedgekeurde projecten uit de oproep 2021 hebben 6 maanden de tijd om op te starten. Voor de oproep 2022 is het co-creatietraject van start gegaan om meer mature en meer opschaalbare ideeën/projecten te bekomen. Dit co-creatietraject is onder leiding van KPMG (aangesteld door VLAIO via een mini-competitie).
Noodzakelijke politieke actie	Op 1 april 2022 heeft de Vlaamse Regering 10 projecten uit de oproep 2021 goedgekeurd en de oproep 2022 gelanceerd. De Vlaamse Regering zal voor het einde van het jaar de gunstig gerangschikte projecten van de oproep 2022 goedkeuren.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering oproep 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Deadline indiening aanvragen	2021 Q4	Gerealiseerd	Er werden 13 aanvragen ingediend.
Jurering ontvankelijke aanvragen	2022 Q1	Gerealiseerd	Alle 13 aanvragen waren ontvankelijk.
Start goedgekeurde projecten	2022 Q3	Op schema	Op 1 april 2022 werden 10 van de 13 ingediende projecten uit de oproep 2021 goedgekeurd. Vanaf de goedkeuring hebben de projecten 6 maanden de tijd om van start te gaan.
Lancering oproep 2022	2022 Q3	Op schema	Op 1 april 2022 werd de oproep City of Things 2022 gelanceerd. Het is een oproep in 2 fasen. De deadline voor de ideefase (fase 1) is 1 juni 2022 en de deadline voor de indieningsfase (fase 2) is 3 oktober 2022.
Ondersteuning potentiële projecten	2022 Q2	Op schema	VLAIO heeft via een mini-competitie KPMG aangesteld om geïnteresseerde lokale besturen en potentiële indieners te begeleiden en ondersteunen in het vorm en focus geven van hun idee en in het zoeken naar partners.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Kwalitatieve en haalbare projecten City of Things goedgekeurd binnen het beschikbare budget van oproep 2021	10	2022 Q1	10	100 %
Kwalitatieve en haalbare projecten City of Things goedgekeurd binnen het beschikbare budget van oproep 2022	10	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	923.000 EUR
Uitvoering VEK	78.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering tot het openstellen van en het verlenen van steun binnen de oproep City of Things 2021](#)

[Oproep City of Things 2021. Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel. Bijlage 1](#)

[Controlerichtlijnenoproep City of Things 2021. Bijlage 2](#)

[Aanmelding ideeën. Oproep City of Things 2021. Bijlage 3](#)

[Aanvraagformulier. Oproep City of Things 2021. Bijlage 4](#)

[Actieplan. Smart Cities Vlaanderen. Het platform voor de uitbouw van de Slimme Regio Vlaanderen. Bijlage](#)

[KPI's Partnership voor een Slimme Regio. Bijlage](#)

13. Digitalisering Vlaamse overheid

VV056 - ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING – ONBOARDING RAAMOVEREENKOMSTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit programma heeft als doel een vernieuwd aanbod ICT-diensten te realiseren, dat zowel afgestemd is op de noden van de Vlaamse overheid als dat het maximaal inspeelt op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan mature diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Deze dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en een geschikte menukaart vormen in lijn met hun behoeften.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	15.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	De vernieuwde raamcontracten zijn operationeel waardoor de klanten gebruik kunnen maken van het vernieuwd en innovatief aanbod van ICT-diensten ter ondersteuning van hun digitale transformatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	De operationele service integratie diensten , evenals de verschillende ICT-dienstverleningspakketten zijn van start gegaan op 1 februari 2022. De transitie kon echter nog niet volledig worden afgerond. Er zijn echter geen grote onderbrekingen in de ICT-dienstverlening. De verwachting t.o.v. de ICT-Partners is om de dienstverlening uiterlijk eind juni-22 naar het beoogde peil te brengen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema	
Versterking van de interne transitieproject voor de begeleiding van transitie naar het nieuwe model	2021 Q2	Vertraging	Gezien de krapte op de markt verloopt de structurele versterking van de organisatie op een aantal vlakken eerder moeizaam. Voor een aantal van deze profielen is Digitaal Vlaanderen tijdelijk aangewezen op het aantrekken van externe medewerkers.
Inrichten van de operationele service integratie	2022 Q1	Vertraging	<p>De operationele service-integratiediensten zijn van start gegaan op 1-feb-2022. De transitie kon weliswaar nog niet volledig worden afgerond.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Via de basis-integratiediensten is de implementatie en uitvoering van de kritische ITIL processen gewaarborgd. Belangrijkste openstaande punten zijn de implementatie van de rapportering en het invoeren van de tevredenheidsmetingen. • De Service Desk is operationeel en meldingen worden tijdig beantwoord. Aandachtspunt is het verhogen van de oplossingsgraad van de Service Desk. • De belangrijkste Gemeenschappelijk Ondersteunende Systemen (GOS) zijn beschikbaar. Momenteel wordt er nog een verbeterplan uitgevoerd om de klantenportaal-defecten te remediëren. Daarnaast worden de ontbrekende systemen ook nog ingericht (bv. een risicobeheersysteem). • De informatieveiligheidsdiensten zijn operationeel en het Security Operations Center monitort voor potentiële veiligheidsinbreuken en neemt actie waar nodig.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Transitiedienstverleningspakketten (werkplekken, cloud en datacenter, applicatiediensten)	2022 Q1	Vertraging	De nieuwe ICT-Partners hebben de verantwoordelijkheid van de dienstverlening overgenomen op 1-feb-22, echter de transitie kon nog niet volledig afgerond worden. Weliswaar waren er op 1-feb-22 geen grote onderbrekingen in de Vo werking, o.a. doordat de nodige prioriteiten werden gesteld en dankzij de ICT-functiehouders bij de Vo entiteiten die tijdelijk de onafgewerkte transitiepunten hebben gemitigeerd. De verwachting t.o.v. de ICT-Partners is om de dienstverlening uiterlijk eind juni-22 naar het beoogde peil te brengen. De grootste openstaande punten betreffen het oplossen van defecten aan het klantenportaal, het inrichten van de rapportering (financieel & SLAs) en het stroomlijnen van de organisatie & operaties zodat het aantal onbehandelde incidenten en werkaanvragen wordt gereduceerd (met name voor werkplek).
Traject om het instappen in de vernieuwde raamovereenkomsten met betrekking tot de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening te faciliteren	2023 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	14.198.000 EUR
Uitvoering VEK	7.058.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 12.400.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV057 - ONDERSTEUNING DIGITALE TRANSFORMATIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse regering de maatschappij en de economie digitaal transformeren. Eén van de drie horizontale basispijlers van deze ambitie richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Hierdoor wordt de dienstverlening, vanuit het standpunt van de burger, ondernemer of vereniging, als één geheel digitaal getransformeerd.

Dit project omvat de acties die ondernomen worden om deze ondersteuningsstructuur uit te bouwen, verschillende achterliggende gemeenschappelijke digitale bouwstenen te versterken en de ondersteuning bij het gebruik ervan uit te breiden zodat ze efficiënt kunnen worden ingezet in de digitale transformatieprojecten van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Onrechtstreeks zorgt dit project ook voor het bevorderen van de digitale transformatie van economie en maatschappij door meer data als grondstof van de economie en maatschappij aan te bieden en gebruikers te ondersteunen in het gebruik ervan. Daarnaast worden digitale talenten ontwikkeld binnen de Vlaamse entiteiten en lokale besturen door onder andere het uitbouwen van een expertisecentrum digitale transformatie en het voorzien van gerichte ondersteuning en kennisoverdracht bij het gebruik van gemeenschappelijke digitale bouwstenen.

Bureau Digitale Transformatie binnen het nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen

Vooreerst wordt geïnvesteerd in het uitbouwen van een bureau digitale transformatie binnen het nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen als ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Dit bureau zal heel vraaggestuurd inspelen op specifieke noden en behoeften van deze overheidsinstanties en dit niet zozeer voor de technische aspecten van de digitale transformatie, maar vooral voor de organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en/of juridische facetten ervan. Het bureau werkt hiermee complementair aan de ondersteuning die het agentschap Digitaal Vlaanderen reeds voorziet door het aanbieden van gemeenschappelijke digitale bouwstenen en de regierol die zal opgenomen worden bij het vernieuwd raamcontract voor gemeenschappelijke ICT-dienstverlening (VV056).

Het vraaggestuurde karakter van het bureau digitale transformatie wordt gegarandeerd door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid nauw te betrekken bij de werking van het bureau. Jaarlijks wordt een actieplan voor het bureau digitale transformatie ter validatie voorgelegd en zal op regelmatige basis gerapporteerd worden over de voortgang ervan.

Het bureau digitale transformatie wordt georganiseerd rond drie recurrente hoofdopdrachten.

PROJECTOMSCHRIJVING

In de eerste plaats zal het bureau, op vraag, de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen ondersteunen bij hun digitale transformatieprojecten. Dit omvat taken gaande van adviesverlening, over analyse van de dienstverleningsprocessen om aan de hand van een business case de beste digitale oplossing uit te werken, tot begeleiding bij de effectieve uitvoering van de projecten.

Flankerend hieraan ondersteunt het bureau het uitwerken van een coherente interbestuurlijke digitale transformatiestrategie in lijn met het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Het uitwerken van deze strategie door middel van referentiekaders en concrete actieplannen moet aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen richting geven bij de uitvoering van hun respectieve digitale transformatieprojecten.

Op vlak van digitale publieke dienstverlening heeft Vlaanderen de ambitie tegen eind 2024 een top-5 positie in te nemen in de Europese Digital Economy and Society Index (DESI-index). Het bureau zal deze ambitie inwerken in deze coherente interbestuurlijke digitale transformatiestrategie en hiervoor een actieplan opstellen. Om de voortgang op te volgen wordt jaarlijks een regionale DESI-score gemeten, op basis van de door de Europese Commissie gehanteerde methodologie.

Ten derde wordt een expertisecentrum inzake digitale transformatie opgericht met als doel de digitale maturiteit van de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen globaal te verhogen. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de technische aspecten van digitale transformatie, maar ook aan organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en/of juridische facetten.

Gemeenschappelijke digitale bouwstenen

Dit relanceproject voorziet eveneens in gerichte investeringen in cruciale gemeenschappelijke digitale bouwstenen van het agentschap Digitaal Vlaanderen, en het versterken van de ondersteuning bij het gebruik ervan, zodat deze efficiënter door de Vlaamse entiteiten en lokale besturen kunnen worden ingezet in hun digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening aan de burgers, ondernemers en verenigingen.

Digitale bouwstenen voor een performante, datagedreven overheid

De Vlaamse overheid en de lokale besturen beschikken gezamenlijk over een schat aan data. Niet alle databronnen zijn echter even vlot toegankelijk en/of gebruikers weten niet altijd goed hoe deze data het meest efficiënt kunnen worden ingezet. Op aangeven van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen wordt daarom een ondersteuningsaanbod uitgewerkt met betrekking tot het ontsluiten en gebruiken van de beschikbare data. Hierbij zullen zij gericht, en in functie van de eigen noden, door een zogenaamde 'vliegende ploeg' begeleid worden in het ontsluiten van de eigen databronnen en het inzetten van data van derden binnen de eigen processen. Specifiek voor het veilig en rechtmatig gebruiken van persoonsgegevens wordt de nodige juridische en IT-technische expertise ter beschikking gesteld.

Heel wat van deze persoonsgegevens worden vandaag ontsloten via het MAGDA-gegevensdelingsplatform. Om de nodige garanties met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) af te dwingen, moeten voor het gebruik van deze persoonsgegevens ook verschillende technische en juridisch-administratieve stappen doorlopen worden tijdens het aansluitingsproces. Complementair aan de acties die reeds in het programma VRD 2 in 2021 zijn voorzien, wordt verder geïnvesteerd in een gebruiksvriendelijker aansluitingsproces voor het MAGDA-gegevensdelingsplatform zodat persoonsgegevens sneller kunnen ingezet worden, steeds met respect voor de AVG.

Diverse bevragingen hebben daarnaast aangetoond dat vandaag verschillende cruciale databronnen ontbreken in het MAGDA-aanbod. Een deel van de investeringen wordt ingezet om de ontsluiting van de meest prioritaire, ontbrekende databronnen via het MAGDA-gegevensdelingsplatform te versnellen en de raadpleging ervan via de webtoepassing MAGDA-online mogelijk te maken. De belangrijkste ontbrekende databronnen worden samen met de belanghebbenden bepaald in het tweede kwartaal 2021. De prioriteit

PROJECTOMSCHRIJVING

wordt mee bepaald door de visie die in kader van het project Gemeente zonder Gemeentehuis (VV051) wordt uitgewerkt en de in voorbereiding zijnde datastrategie die deel uitmaakt van het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Digitale bouwstenen voor een state-of-the-art digitale dienstverlening aan burger, ondernemer en vereniging

Dit relanceproject versterkt eveneens vijf gemeenschappelijke digitale bouwstenen die cruciaal zijn om vanuit de Vlaamse entiteiten en lokale besturen een state-of-the-art, 'low touch', digitale dienstverlening aan de burger, ondernemer of vereniging aan te bieden, met name (1) de module 'eFormulieren', (2) een professioneel CRM-systeem, (3) het digitaal tekenplatform, (4) de MAGDA-documentendienst en (5) de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus. Een belangrijk kenmerk van een 'low touch' dienstverlening is dat met zo min mogelijk verschillende contactmomenten en loketten de dienstverlening zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt, liefst zelfs zo automatisch mogelijk. Gebruikersgerichtheid staat daarbij centraal, waarbij de dienstverlening uitgedacht is vanuit de werkelijke noden en behoeften van de gebruikers.

1. module 'eFormulieren'

Met de module 'eFormulieren' wordt aan Vlaamse entiteiten en lokale besturen de mogelijkheid geboden op een gebruiksvriendelijke digitale manier gegevens aan burgers, ondernemers of verenigingen op te vragen die (nog) niet in een authentieke bron aanwezig zijn. Deze module vormt ook een belangrijke technische component van de generieke aanvraagmodule die door Digitaal Vlaanderen in het programma VRD 2 wordt vormgegeven. Het relanceproject zorgt voor een impulsinvestering om het technisch platform gebruiksvriendelijker te maken en op te waarderen zodat betere ondersteuning van de Vlaamse entiteit of het lokaal bestuur mogelijk wordt.

2. professioneel CRM-systeem

Om een klantvriendelijke dienstverlening aan de burger, ondernemer of vereniging mogelijk te maken is het essentieel dat contacten met die burger, ondernemer of vereniging op een professionele manier opgevolgd en beheerd worden. Daartoe werd in 2020 een raamcontract uitgewerkt dat Vlaamse entiteiten en lokale besturen toegang biedt tot een professioneel CRM-systeem ("customer relation manager"). Via dit deelproject wordt dit CRM-systeem gekoppeld met het organisatiesregister en twee andere gemeenschappelijke databronnen van de Vlaamse overheid (toegangs- en gebruikersbeheer, mail en kalender). Tevens worden de nodige beveiligingsmaatregelen, in lijn met het informatieveiligheidsbeleid, geïmplementeerd. Met de oprichting van een "CRM-community" wordt een netwerk voor kennisdeling binnen de Vlaamse overheid en lokale besturen gegarandeerd.

3. Digitaal Tekenplatform

Ten derde wordt het Digitaal Tekenplatform versterkt dat het elektronisch ondertekenen van documenten binnen de Vlaamse overheid en bij lokale besturen faciliteert. Het digitaal tekenen van documenten vermindert drastisch de papierstroom en zorgt voor belangrijke tijdswinsten en een efficiënte bedrijfsvoering, zeker in tijden van maximaal plaats- en tijdsafhankelijk werken. Het project zet in op een hoger gebruiksgemak door QR-codes op een (ondertekend) document toe te voegen waardoor de geldigheid van het document ten allen tijde kan geverifieerd worden ten opzicht van het centraal opgeslagen authentieke document. Eveneens zal bij het ondertekenen een gekwalificeerde timestamp toegevoegd worden zodat het tijdstip van ondertekenen juridisch niet weerlegd kan worden.

4. MAGDA-documentendienst

Met de MAGDA-documentendienst, ten vierde, kan een Vlaamse entiteit of lokaal bestuur geautomatiseerd digitale documenten versturen naar een door de ontvanger geactiveerde e-box of e-mailadres of

PROJECTOMSCHRIJVING

(aangetekend) per post indien dit niet het geval is. Binnen het programma VRD 2 wordt deze component uitgebreid met de mogelijkheid voor een ontvanger om digitaal te reageren op een digitaal ontvangen document. Onder aansturing van de gebruikersgroep worden nu bijkomende functionaliteiten op de MAGDA Documentendienst ingevoerd waaronder de mogelijkheid tot digitaal tekenen door de integratie met het Digitaal Tekensplatform en het voorzien van digitale betaalmogelijkheden. Voor Vlaamse entiteiten of lokale besturen die niet over een volwaardig dossieropvolgingssysteem beschikken, worden de functionaliteiten van Magda Online uitgebreid om eenvoudige documenten te versturen en/of te ontvangen.

De MAGDA-documentendienst wordt in 2021 onder meer gebruikt voor het versturen van de brieven aan iedere burger met informatie over hun voorgestelde vaccinatiemomenten. Ook de belastingbrieven van VLABEL en de provincie Antwerpen zullen dit jaar via dit systeem uitgestuurd worden. Hiervoor is het essentieel dat er over de volledige ketting van versturen tot en met ontvangen van het document de nodige garanties kunnen gegeven worden over de technische beschikbaarheid van het systeem en de veiligheid van het verstuurd document. Op vandaag vervult BOSA, de federale dienstenintegrator, de rol als Document Provider naar de verschillende e-Boxen zoals Doccle, Mijn Burgerprofiel of MyeBox. Gezien de hoge te verwachten transactievolumes vanuit Vlaanderen is er in samenspraak met BOSA afgesproken dat het MAGDA-platform deze rol van "document provider" inricht voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen.

5. Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus

De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC), tot slot, staat sinds eind vorig jaar in voor de SDG-informatievoorziening vanuit Vlaanderen. Deze IPDC laat toe dat elke Vlaamse entiteit zelf instaat voor het beheer van informatie over de eigen producten en diensten én dat deze informatie centraal door andere entiteiten of beleidsniveaus kan worden geraadpleegd. Voorbereidingen worden getroffen om deze gemeenschappelijke digitale bouwsteen ook te laten inzetten door de lokale besturen voor het beheer van lokale producten- en dienstencatalogi (IpdC) die dan eveneens centraal ontsloten kunnen worden.

Gestandaardiseerde beschrijvingen van producten en diensten in de IPDC bieden bovendien de mogelijkheid om proactief de beoogde doelgroep van de dienstverlening te benaderen. Het informeren van iedere doelgroep op maat kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Nagegaan wordt welke aanpassingen er hiervoor op korte termijn aan de IPDC kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast wordt de IPDC gekoppeld aan de interfederale productencatalogus die door de federale overheid in kader van SDG wordt uitgewerkt. Op die manier kan via vlaanderen.be of op webportalen van Vlaamse entiteiten en lokale besturen één geconsolideerd overzicht geboden worden van de dienstverlening die voor de burger, ondernemer of vereniging beschikbaar is, onafhankelijk van het beleidsniveau dat instaat voor deze dienstverlening.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	Operationele effecten op korte termijn: - Uitbouw van een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie onder aansturing van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. - Uitbreiding van de ondersteuning bij het gebruik van gemeenschappelijke digitale bouwstenen. - Versterking van verschillende van die digitale bouwstenen (met name: het MAGDA-gegevensdelingsplatform, de module 'eFormulieren', het CRM-systeem, het digitaal tekenplatform, de MAGDA-documentendienst en de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het project heeft in 2021 vertraging opgelopen door prioritering op COVID activiteiten, en daarnaast de beperkte beschikbaarheid van IT profielen op de arbeidsmarkt. Hierdoor was een volledige realisatie in 2021 niet mogelijk. Een herziening van de planning is gebeurd in december 2021 en in mei 2022 (*)</p> <p>Aangepaste planning:</p> <p>Q3 2022: -* VV057.03.01 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'eFormulieren' -* VV057.03.04 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'MAGDA-documentendienst'</p> <p>Q4 2022: -VV057.02.01 - Bijkomend ondersteuningsaanbod bij het gebruiken en/of ontsluiten van data is operationeel via 'vliegende ploeg'. -VV057.02.02 - Het aansluitingsproces op het MAGDA-gegevensdelingsplatform is gebruiksvriendelijker met een kortere doorlooptijd als gevolg -* VV057.03.03 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Digitaal Tekenplatform' -* VV057.03.05 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus'</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	
VV057.01 het bureau digitale transformatie is volledig operationeel en staat ter beschikking van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen.	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV057.02.01 - Bijkomend ondersteuningsaanbod bij het gebruiken en/of ontsluiten van data is operationeel via 'vliegende ploeg'.	2021 Q4	Op schema	
VV057.02.02 - Het aansluitingsproces op het MAGDA-gegevensdelingsplatform is gebruiksvriendelijker met een kortere doorlooptijd als gevolg	2021 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV057.02.03 - De meest prioritaire, ontbrekende databronnen zijn ontsloten via het MAGDA-gegevensdelingsplatform en MAGDA-Online	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV057.03.01 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'eFormulieren'	2021 Q4	Vertraging	
VV057.03.02 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'CRM-systeem'	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV057.03.03 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Digitaal Tekenplatform'	2021 Q4	Vertraging	
VV057.03.04 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'MAGDA-documentendienst'	2021 Q4	Vertraging	
VV057.03.05 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus'	2021 Q4	Vertraging	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	3.635.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 4.100.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 900.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Ondersteuning Digitale Transformatie](#)

VV058 - VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Financiën en Begroting
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse regering de maatschappij en de economie digitaal transformeren. Eén van de drie horizontale basispijlers van deze ambitie richt zich op de digitale transformatie van de overheidsdienstverlening waarbij versneld wordt geïnvesteerd in de achterliggende systemen en processen, als cruciale bouwsteen, om de gemeenschappelijke dienstverlening te faciliteren vanuit een perspectief waarbij de ervaring van de burger, ondernemer of vereniging centraal wordt gezet.

Dit project omvat maatregelen die ondernomen worden om deze versnelde gemeenschappelijke dienstverlening aan Vlaamse entiteiten en lokale besturen te realiseren. Deze maatregelen dragen niet alleen rechtstreeks bij aan de digitale transformatie van de overheidsdienstverlening, maar zijn ook een directe katalysator voor andere projecten uit het relanceplan. Hierdoor kunnen alle Vlaamse entiteiten en lokale besturen evolueren naar datagedreven overheidsinstanties met een state-of-the-art digitale dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen.

Versnelde investering in bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform

Het MAGDA-gegevensdelingsplatform, het deelplatform van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI), zorgt voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van persoonsgegevens binnen en tussen de verschillende beleidsniveaus in Vlaanderen. Dit dienstenaanbod is vandaag een cruciale basisvoorziening waarop heel wat kritische bedrijfsprocessen van Vlaamse en lokale overheden, maar ook private partners, steunen. Bijgevolg verwachten deze doelgroepen afdoende garanties op beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van het platform en de bijhorende diensten. Bovendien moet het platform verder ingericht worden als een schaalbare architectuur die het jaar na jaar sterk stijgend gebruik structureel kan opvangen.

Een verhoogde bedrijfszekerheid draagt ook bij tot de ambitie, zoals beschreven in de Beleidsnota 2019-2024 ICT en Facilitair Management, om van dit deelplatform dé data-draaischijf te maken voor de uitwisseling van unieke gegevens binnen de Vlaamse publieke sector, waaronder de steden en gemeenten, en met de federale dienstenintegratoren, om zo de data-uitwisseling voor alle overheidsactoren te verbeteren en de transitie naar een volledig digitale overheid mogelijk te maken.

Binnen het voorliggende project worden een aantal stappen versneld en in parallel uitgevoerd:

1. de zogenaamde asynchrone diensten, die onder andere bulkbevragingen van authentieke bronnen mogelijk maken of het aanleveren van verschilbestanden om data in systemen van de gebruiker actueel te houden, worden gemoderniseerd en overgezet naar de nieuwe architectuur. Dit zorgt niet alleen voor een lagere toekomstige operationele onderhoudskost per dienst, maar ook voor kortere doorlooptijden (en bijhorende investeringskosten) bij het ontwikkelen van nieuwe diensten voor de datagebruikers.

PROJECTOMSCHRIJVING

2. Voor professionele gebruikers die veel parallelle aansluitingen opzetten, zoals dienstenleveranciers van lokale besturen, wordt het aansluitingsproces sterk vereenvoudigd en geautomatiseerd. Op die manier kan de doorlooptijd sterk ingekort worden zodat data snel in de processen van lokale besturen kunnen worden ingezet.

3. Voor kritische diensten die vandaag reeds gebruikt worden voor het uitrollen van het COVID19-vaccinatieplan werd een herstelplan (Disaster Recovery Plan) opgemaakt dat maximale beschikbaarheid van deze diensten garandeert. Dit herstelplan wordt nu verder uitgerold voor alle kritische diensten en het gegevensdelingsplatform ontdebeld over twee, fysiek gescheiden, datacenters in Vlaanderen.

4. Bij het verwerken van persoonsgegevens op het MAGDA-gegevensdelingsplatform moeten de beveiligingsmaatregelen voortdurend mee evolueren met de laatste stand van zaken op vlak van cybersecurity. Om mogelijk gevoelige plekken te detecteren worden verschillende doorgedreven veiligheidscontroles uitgevoerd en eventueel gedetecteerde pijnpunten onmiddellijk aangepakt.

Op die manier wordt sneller tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de beoogde doelgroepen, aan de nieuwe noden die ontstaan zijn naar aanleiding van de COVID19-crisis en kan deze generieke component optimaal renderen binnen de respectieve digitale transformatieprojecten in het relanceplan.

Doorontwikkeling van het subsidieregister

De data die voor het subsidieregister (departement Financiën en Begroting) nodig zijn, worden uit diverse databronnen verzameld, onder meer uit de dossierbehandelingssystemen van de subsidieverstrekende entiteiten (binnen het ESR-toepassingsgebied 'deelstaatoverheid S.1312'). Op het MAGDA-gegevensdelingsplatform wordt een generieke dienst voorzien voor het ontsluiten van informatie uit deze dossierbehandelingssystemen met maximale aandacht voor informatieveiligheid. Deze data zijn ook voor andere doeleinden interessant. Naast financiële gegevens voor het subsidieregister kunnen zo dossiergegevens over bijvoorbeeld vergunningen of sancties vanuit meerdere systemen samengebracht worden in één entiteitsoverschrijdend register. Om de informatie uit het subsidieregister op een geaggregeerde manier te ontsluiten naar data-analysesystemen wordt eveneens een bevragsingsdienst ontwikkeld die toelaat het subsidieregister op een informatieveilige manier te raadplegen.

Versneld gebruik van de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening'

Met de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening' wordt een nieuw ondersteuningsaanbod uitgewerkt dat maximaal is afgestemd op de noden van de Vlaamse overheid en optimaal inspeelt op het huidige marktaanbod. Ook nieuwe klanten moeten vlot kunnen instappen. Daarom worden voor nieuwe klanten binnen het project "achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamovereenkomsten" (VV056) business cases uitgewerkt die nagaan welke diensten en/of systemen uit de raamovereenkomsten de grootste toegevoegde waarde opleveren voor hun digitale processen.

Vanuit het voorliggend project (VV058) zullen stimulansen worden voorzien om het instappen van nieuwe klanten in deze raamovereenkomsten te versnellen. De precieze aard van deze stimuleringsmaatregelen is afhankelijk van de uitkomst van de business cases en zullen in de tweede helft van 2022 via een bijkomende nota aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	Operationele effecten op korte termijn: - verhogen van de bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform dat uitgroeit tot dé data-draaischijf voor de uitwisseling van unieke gegevens binnen de Vlaamse publieke sector,

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>om zo de data-uitwisseling voor alle overheidsactoren te verbeteren en de transitie naar een volledig digitale overheid mogelijk te maken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisatie van generieke diensten voor het voeren en ontsluiten van het subsidieregister in beheer van het departement Financiën en Begroting. - nieuwe klanten kunnen vlot instappen in de raamcontracten 'gemeenschappelijke dienstverlening' (VV056).
--	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het project heeft in 2021 vertraging opgelopen door prioritering op COVID activiteiten, en daarnaast de beperkte beschikbaarheid van IT profielen op de arbeidsmarkt. Het project is nu op schema volgens de aangepaste mijlpalen van 12/2021</p> <p>Q3 2022: -VV058.01.02 - Sterk vereenvoudigd aansluitingsproces voor professionele gebruikers is gerealiseerd</p> <p>Q4 2022: -VV058.01 Hogere garanties op vlak van bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform zijn gerealiseerd. -VV058.01.01 - Gemoderniseerde asynchrone bevragingdiensten zijn beschikbaar binnen de vernieuwde architectuur</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RRF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	
RRF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	
VV058.01 Hogere garanties op vlak van bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform zijn gerealiseerd.	2021 Q4	Op schema	
VV058.01.01 - Gemoderniseerde asynchrone bevragingdiensten zijn beschikbaar binnen de vernieuwde architectuur	2021 Q4	Op schema	
VV058.01.02 - Sterk vereenvoudigd aansluitingsproces voor professionele gebruikers is gerealiseerd	2021 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV058.01.03 - Uitrol van een herstelplan voor alle bedrijfskritische MAGDA-diensten is doorgevoerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.01.04 - Eventueel gedetecteerde pijnpunten op vlak van cybersecurity zijn aangepakt na het uitvoeren van doorgedreven veiligheidscontroles	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.02 Generieke MAGDA-diensten gerealiseerd voor het voeden en ontsluiten van het subsidieregister.	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.02.01 - Generieke webdiensten voor het ontsluiten van data uit dossierbehandelingssystemen is beschikbaar	2021 Q3	Gerealiseerd	
VV058.02.02 - Webdienst voor het raadplegen van data in het subsidieregister is beschikbaar	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.03. Goedkeuring Nota VR betreffende versneld gebruik van de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening'	2022 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.991.000 EUR
Uitvoering VEK	1.605.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.500.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening](#)

VV059 - DIGITALISERING ASSET MANAGEMENT AQUAFIN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Aquafin
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij - Departement Omgeving
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Een goede werking van de bovengemeentelijke afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen is cruciaal voor de waterkwaliteit in onze beken en rivieren. Een verdere digitalisering van het beheer is noodzakelijk om zowel financieel als functioneel de beste beslissingen te nemen op het vlak van onderhoud en investeringen. Zo houden we de infrastructuur op een efficiënte en duurzame manier in een goede toestand. De digitalisering ondersteunt hierdoor niet alleen het behoud van de verbeterde waterkwaliteit, het draagt ook bij tot het betaalbaar houden van de waterfactuur voor de burger.

Om de bovengemeentelijke afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in het Vlaamse Gewest in optimale toestand te houden zijn onderhoud en investeringen noodzakelijk. De gemiddelde leeftijd van leidingen, pompstations en afvalwaterzuiveringsinstallaties neemt bovendien toe. Om de budgetten die nodig zijn voor dit onderhoud en deze investeringen zo beperkt mogelijk te houden, richt het relanceproject zich op een versnelde digitalisering van het asset management. De data die hiermee gegenereerd worden geven inzicht in de toestand, betrouwbaarheid, kans op falen en verwachte levensduur van de infrastructuur. Dit maakt het mogelijk om slimmere, gerichtere en optimale onderhouds- en investeringsbeslissingen te nemen. Zo beperken we de kosten en kunnen we de waterfactuur de komende jaren betaalbaar te houden. Het digitaliseringsproject is daarnaast ook noodzakelijk om de verbeterde waterkwaliteit te verzekeren en te voldoen aan de Europese eisen voor de sanering van Stedelijk Afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG) .

Het digitaliseringsproject bestaat uit 5 deelprojecten en loopt tot 2030 :

1. Assets – Levenscyclusbeheer & investeringsmanagement voor het maken optimale asset management investeringsbeslissingen
2. Assets - optimalisatie van onderhoud zodat het juiste onderhoud op het juiste moment wordt uitgevoerd en de effectiviteit van onderhoudswerkzaamheden verhoogt door precies op het goede moment in te grijpen, niet te vroeg maar zeker ook niet te laat. Het resultaat is een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de assets en hogere efficiëntie
3. Proces- en performantiemeting & opvolging wat onder meer zorgt voor een naadloze, kwalitatieve en toekomstgerichte data-uitwisseling met andere actoren binnen het volledige watersysteem en zelfs daarbuiten
4. Portfolio planning bestaande infrastructuur incl. GIS-data-uitwisseling om infrastructuurkaarten beschikbaar te kunnen stellen via open data
5. BIM (Bouwwerkinformatiemodel) – Uitwerken van een digitale data flow met studiebureaus & aannemers door samen aan één gemeenschappelijk ontwerp te werken, met kwalitatieve masterdata die naadloos en digitaal doorstromen van ontwerp over As-Built tot onderhoud en beheer

Het project zal ingedeeld worden in enkele grote fasen ('agile' methodologie).

PROJECTOMSCHRIJVING

De kosten van dit project worden deels gedragen door reguliere middelen van Aquafin en deels via bijkomende financiering. Voor de projectdoelstellingen in deze legislatuur wordt de projectkost geraamd op 14,2 miljoen euro waarvan 2.3 miljoen euro met reguliere middelen van Aquafin. Via het relancebudget Vlaamse Veerkracht (VV059) wordt 9 mio EUR voorzien. Deze financiering focust zich voornamelijk op deelprojecten Asset – Levenscyclusbeheer (1), Assets – Optimalisatie Onderhoud (2) en Portfolio planning (4) en is in lijn met de Green Deal en digitale ambities van Europa. De middelen uit het relanceplan zijn hierbij essentieel om de ambities waar te maken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	9.000.000 EUR
Output	De functionaliteiten van het asset management digitaliseringsproject zijn bij Aquafin beschikbaar en worden gebruikt.
Outcome	Snelle en efficiënte beslissingen mogelijk maken met data zodoende de snelheid waarmee de investeringsbudgetten stijgen door ouder wordende zuiveringsinfrastructuur, zo beperkt mogelijk te houden en de waterkwaliteit te verzekeren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Realisatie van de module voor het opmaken van de lange termijn asset plannen in uitvoering. De nodige analyses voor de realisatie van de andere milestones (portfolio management, datauitwisseling analyseresultaten & EPI) zijn eveneens in uitvoering voor het bepalen van de finale oplossingsrichting voor de start van de ontwikkeling.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Inhoudelijke nota voorgelegd aan de Vlaamse Regering	2021 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Opdracht tijdig gestart : opdracht uitvoering + herverdeling middelen uit relanceprovisie	2021 Q4	Gerealiseerd	
Automatische koppeling met GIPOD van innames op openbaar domein bij geplande onderhoudswerken	2021 Q4	Gerealiseerd	
In gebruik name van nieuwe levenscyclusbeheer en onderhoudssoftware waarmee de gezondheidstoestand van de assets kan gemonitord worden; in eerste fase gebeurt dit op een deel van het totale patrimonium	2022 Q1	Gerealiseerd	De berekening van de gezondheidstoestand wordt op deze moment gerealiseerd in Maximo - MAHI, output realisatie via Power BI.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
In kader van de nieuwe zelfcontrole, implementeert Aquafin een toekomstgerichte data uitwisseling voor analyseresultaten tussen de labo's die de analyses uitvoeren en Aquafin, en van Aquafin naar de VMM	2022 Q4	Op schema	Tussentijdse oplevering gerealiseerd, structurele oplossing afhankelijk van nieuwe emissietoepassing VMM dus momenteel in analyse (op schema)
Aquafin neemt een nieuwe beheerstool in gebruik voor de opvolging en rapportering aan VMM van ecologische prestaties (EPI) van zijn operationele transport- en zuiveringsactiviteiten	2023 Q4	Op schema	
Aquafin hanteert een toekomstgerichte manier om gestructureerde data uit te wisselen met externe actoren zoals AWIS, GIPOD, Lokale besturen, ...	2023 Q4	Op schema	
Het Asset Management systeem is gekoppeld aan een digitale planningstool voor field medewerkers waardoor de dagelijkse onderhoudsactiviteiten en de vastgelegde onderhoudsstrategie optimaal op elkaar afgestemd zijn.	2023 Q4	Op schema	
Op basis van de data over de gezondheidstoestand van de assets beschikt Aquafin over een dynamisch Lange Termijn Asset Plan op een uitgebreid patrimonium waarmee de investeringsbehoeftes voor de bestaande assets in kaart gebracht worden.	2024 Q4	Nog niet gestart	
Een portfolio management systeem zorgt voor een optimalisatie van de Asset Management investeringen voor de komende 10 jaar	2024 Q4	Op schema	
RRF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar en bij Aquafin in gebruik	2025 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Realisatie beperkt patrimonium (pompstations) voor de monitoring van de gezondheidstoestand	100%	2022 Q1		100 %
De functionaliteiten van het asset management digitaliseringsproject zijn bij Aquafin beschikbaar en worden gebruikt.	100 %	2025 Q4		10 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.500.000 EUR
Uitvoering VEK	4.500.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 9.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 19 november 2021. Digitalisering Asset Management Aquafin

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten Lokale besturen burgers ondernemers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Wat je bij een bank, Coolblue of Amazon kan, moet je bij de overheid ook kunnen. Een compleet overzicht zien van het aanbod, vlot kunnen zoeken, iets bestellen of aanvragen, je gegevens kunnen raadplegen, opvolgen waar je dossier zit. Alles in één overzicht. Eenvoudiger, duidelijker en sneller voor burgers en ondernemers.

De visie op zo'n virtueel, digitaal loket voor de overheid bevat een compleet, officieel en betrouwbaar overzicht vinden van:

- Alle dienstverlening van de overheid: premies, vergunningen, belastingen, zorgaanbod, ...
- Een overzicht van hun gegevens bij de overheid: woningen, diploma's, attesten, vergunningen, ...
- Het kunnen aanvragen en beheren van dienstverlening, het opvolgen van lopende dossiers en het ontvangen van berichten of documenten, ...

Alles kan zoveel mogelijk digitaal en via selfservice, waar en wanneer je wil.

Die visie is niet nieuw. Nieuw is dat dit voor het eerst binnen een haalbaar bereik ligt omdat er de voorbije jaren een noodzakelijke onderbouw is gemaakt, die daarvoor ontbrak. De komende 2 jaren kunnen we zo'n loket realiseren, en daarmee het labrynt van 800 loketten en sites laten vervellen tot een overzichtelijk en volledig, virtueel loket.

GEÏNTEGREERDE AANPAK

Bestaande loketten en sites worden niet herbouwd maar geïntegreerd en gelinkt tot één virtueel loket voor burgers, ondernemers en verenigingen. Door een aantal gemeenschappelijke componenten te hergebruiken en te werken aan standaardisatie van de data en informatiestromen, creëren we voor burgers, ondernemers en verenigingen de ervaring van een geïntegreerd digitaal loket, met centrale overzichten en toegangen.

Zo'n geïntegreerd loket werkt alleen als het volledig is. Concreet kan dit gebeuren door de gemeenschappelijke componenten van het loket via Informatie Vlaanderen aan te bieden. Overheidsinstanties kunnen voor hun communicatie met de burger deze componenten gebruiken. Zo kunnen instanties sneller loketfunctionaliteiten opzetten, kunnen ze ontzorgd worden en efficiëntie verhogen voor de Vlaamse overheid en lokale besturen.

Aan de voorkant is Mijn Burgerprofiel een inplugbare header die kan toegevoegd worden aan de bestaande sites en loketten. Daarmee geven we gestalte aan het "Be everywhere" principe: of een burger nu bij overheid A of B aanklopt, het is steeds de bedoeling dat hij het overzicht krijgt van "zijn zaken bij de overheid". Mijn Burgerprofiel verhoogt de vindbaarheid van de overheidsdienstverleningen. Bovendien zorgt de multi-kanaalstrategie ervoor dat de burger dat kanaal kan kiezen dat het dichtst bij hem staat. Via

PROJECTOMSCHRIJVING

Mijn Burgerprofiel wordt ook het e-loket voor ondernemers (en in de toekomst verenigingsloket bereikbaar: de globale header wordt gebruikt als aanmeldmethode voor zowel burgers als ondernemers (en in de toekomst verenigingen) als een laagdrempelige en veilige manier voor het aanmelden op de verschillende loketten en het vergemakkelijken van het wisselen van rol/hoedanigheid (een burger, een onderneming, een vereniging).

Aan de achterkant is het belangrijk dat de verschillende loketten gevuld worden met alle gegevens, documenten, berichten en dienstverlening. Daarvoor biedt Informatie Vlaanderen de nodige componenten om Vlaamse en lokale hun dienstverlening aan te sluiten op de centrale oplossingen. Via de modernste API's kunnen entiteiten hun applicatie aansluiten op de gemeenschappelijke "App Store" in Mijn Burgerprofiel en e-loket voor ondernemers.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	Een efficiënte en digitale overheid die op snelle en correcte wijze kan communiceren met haar stakeholders (burgers, ondernemers,...).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het 'no wrong door' principe wordt verder uitgerold. Intussen al bij 196 lokale besturen en 31 entiteiten. Mijn Burgerprofiel is nu ook toegankelijk voor minderjarigen. Daarnaast werd er heel wat nieuwe functionaliteiten toegevoegd: een nieuw detailoverzicht voor lopende dossiers attesten in een zijpaneel, notificaties die maatregelen tegen phishing nemen, en een administratie- en configuratiepaneel voor externe toepassingen. Ook heel wat back-end aansluitingen vanuit Vlaamse en lokale besturen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
50 lokale en 50 Vlaamse aansluitingen langs de proces-kant worden gerealiseerd in Mijn Burgerprofiel in de meest relevante levensgebeurtenissen tegen eind 2021 (wonen, bouwen, energie, fiscaliteit, onderwijs).	2021 Q4	Gerealiseerd	
De helft van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen is aangesloten voor de front-kant van Mijn Burgerprofiel (header-integratie).	2021 Q4	Gerealiseerd	
Er is een dalende doorlooptijd van aansluitingen op Mijn Burgerprofiel.	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Elke Vlaamse entiteit en lokaal bestuur ontsluit Mijn Burgerprofiel via de Global header (front-kant)	2022 Q4	Op schema	
Alle relevante dienstverleningen van de Vlaamse en lokale overheden zijn aangesloten op Mijn Burgerprofiel (proces-kant)	2022 Q4	Op schema	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2022 Q4	Op schema	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
De helft van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen is aangesloten voor de front-kant van Mijn Burgerprofiel (header-integratie).	150 lokale besturen	2021 Q4	154	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.896.000 EUR
Uitvoering VEK	5.176.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 8.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12 maart 2021 - Mijn burgerprofiel - nota](#)

[VR 12 maart 2021 - Mijn burgerprofiel - bijlage](#)

VV061 - DATANUTSBEDRIJF

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle Vlaamse entiteiten, lokale besturen en ondernemingen die gebruik maken van de persoonlijke gegevens alsook de personen in kwestie zelf.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Oprichting van het Datanutsbedrijf Vlaanderen. Het Datanutsbedrijf Vlaanderen is een intelligente verkeerswisselaar van data die ervoor zorgt dat er een gelijk data-speelveld is voor alle publieke en private spelers binnen aangesloten ecosystemen. Het vertrouwen in de data-economie wordt geborgd door een neutrale derde partij – het datanutsbedrijf – op te richten die data-deling binnen verticale sectoren en tussen sectoren binnen bereik kan brengen zonder dat bedrijven, organisaties en overheden in dit ecosysteem de controle over de toegang tot hun data verliezen. Data is de grondstof van de nieuwe maatschappij en economie maar die ruwe grondstof moet verder bewerkt worden, aan kwaliteitsstandaarden beantwoorden en moet binnen GDPR en PSI richtlijnen vlot kunnen stromen, zoals andere nutsvoorzieningen, om maximaal van waarde te zijn in nieuwe business modellen. Een digitaal kluzensysteem, toestemmingsmechanismen en een dataverbruiksvergoeding zijn hiervan de hoekstenen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	23.000.000 EUR
Output	- Het datanutsbedrijf als betrouwbare/centrale/neutrale verkeerswisselaar van data - Implementatie van Datakluzen en diverse initiatieven daaromtrent
Outcome	- Optimaal consulteren/beheren van data, data consent > vertrouwen - Efficiënter gebruik van data over diverse partijen heen > efficiëntere werking - Diverse projecten omtrent datakluzen > specialisatie (kennis) en tewerkstelling

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het Datanutsbedrijf is 'in oprichting'. Na 1st principiële goedkeuring Vlaamse Regering op 26 november 2021 hebben we de adviezen SERV, GBA, VTC en INR gekregen en verwerkt. 2de principiële goedkeuring Vlaamse Regering en advies Raad van Staten zijn gepland. We voorzien de oprichting eind Q4 2022
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste principiële goedkeuring projectdossier op de Vlaamse Regering van 26 november 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Tweede principiële goedkeuring van het projectdossier door de Vlaamse Regering.	2022 Q2	Nog niet gestart	Decreet herwerkt om rekening te houden met adviezen SERV, GBA en VTC. IKW gepland 20/05/2022. Datum 2de goedkeuring VR nog te bevestigen (in mei)
Definitieve goedkeuring van het projectdossier 'Oprichting Datanutsbedrijf' door de Vlaamse Regering.	2022 Q3	Nog niet gestart	Vertraging door herwerken van decreet om rekening te houden met adviezen SERV / GBA / VTC. Gepland end juni, begin juli
Parlementaire bekrachtiging van het projectdossier 'Oprichting Datanutsbedrijf'.	2022 Q4	Nog niet gestart	Vertraging door herwerken van decreet om rekening te houden met adviezen SERV / GBA / VTC. Gepland oct, nov.
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.485.000 EUR
Uitvoering VEK	3.334.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 19.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 29 januari 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 26 november 2021. Voorontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf](#)

[Ontwerp van decreethouden de machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf](#)

[Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf. Samenvatting](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 mei 2022. Oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf. Voorontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vorm gegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap. Tweede principiële goedkeuring met het oog op adviesinwinning van de Raad van State](#)

[Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap](#)

[Memorie](#)

[Advies SERV](#)

[Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/103 van 14 december 2021](#)

[Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/037 van 19 april 2022](#)

[Advies Instituut van de Nationale Rekeningen](#)

VV062 - DIGITALISERING DBRC - TOEGANG TOT DE VLAAMSE BESTUURSRECHTSPRAAK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De beide onderdelen van het digitaliseringsproject zijn gericht op de procespartijen, dit zijn in eerste instantie burgers en ondernemingen (die betrokken zijn in onze procedures), maar eveneens op hun raadsmanen (advocaten, consultants, architecten, ...) en op overheden (bijv. de overheidsinstantie waarvan de beslissing wordt aangevochten of wiens advies niet is gevolgd, ...). Zij vormen de primaire doelgroep. De secundaire doelgroep zijn burgers en ondernemingen in het algemeen. Een digitale, transparante, rechtszekere en snelle Vlaamse bestuursrechtspraak draagt bij aan een beter ondernemings- en investeringsklimaat.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) overkoepelt en ondersteunt drie Vlaamse bestuursrechtscolleges: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het doel van het digitaliseringsproject is (de procedures in het kader van) de Vlaamse bestuursrechtspraak de komende twee jaar verder, extern te digitaliseren, na een eerste, interne digitaliseringsbeweging. Het project kent twee onderdelen: de bouw van een digitaal platform voor de dossierbehandeling en de bouw van een (interne en externe) kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie.</p> <p>Het digitaal platform moet het voor burgers, overheden, advocaten, ... mogelijk maken de volledige, juridische procedure bij de rechtscolleges digitaal te voeren: digitaal indienen en ontvangen van processtukken, onmiddellijke betaling rolrecht, toegang tot een volledig digitaal dossier, termijnberekening, zittingskalender, overzichten van lopende dossiers voor advocatenkantoren, ... Het platform zal tevens gebruik maken van of aansluiten op andere Vlaamse toepassingen zoals o.a. het Vlaams Toegangsbeheer en het Omgevingsloket.</p> <p>De kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie moet zorgen voor een betere ontsluiting van de rechtspraak, zodat procespartijen (burgers, overheden, advocaten, ...) deze makkelijker kunnen consulteren en gebruiken bij de voorbereiding van hun processtukken (extern) en zodat de rechtscolleges vlotter nieuwe arresten kunnen opmaken (intern).</p> <p>Beide onderdelen van het digitaliseringsproject vergen een substantiële investering.</p> <p>Het eerste onderdeel van het project vergt ook een brede hervorming van de regelgeving, meer bepaald van het DBRC-decreet en -procedurebesluit. De hervorming van de regelgeving zal hand in hand gaan met de technische ontwikkeling van het digitaal platform en zal ertoe leiden dat de procedure herwerkt wordt en</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

volledig uitgaat van een digitale procesvoering, met een eventuele, analoge (papieren) stroom als uitzonderingsregime (bijv. voor kwetsbare groepen die onvoldoende toegang hebben tot digitale middelen).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.600.000 EUR
Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De beide onderdelen van het digitaliseringsproject zullen worden uitgevoerd door de DBRC in samenwerking met externe IT partners.</p> <p>De projecten kennen een duidelijke timing en er wordt een datum van oplevering vooropgesteld, die – minstens voor het eerste onderdeel – zal worden afgestemd op de inwerkingtreding van de hervorming van de bijbehorende regelgeving.</p> <p>1) De DBRC werkte in 2021 binnen het Raamcontract 'Raamovereenkomsten voor onafhankelijke strategische ICT-adviesverlening' (2020/HFB/OP/33901) van het Facilitair Bedrijf samen met de firma Gartner. De bestelling is gebeurd op 13 september 2021 voor een totaal bedrag van 156.390,08 euro inclusief BTW.</p> <p>De DBRC heeft aan Gartner ondersteuning en onafhankelijk advies gevraagd om tijdig en "first time right" een contract met daarin de noodzakelijke functionele en technische vereisten voor te bereiden om het digitaal platform te realiseren en erna te onderhouden, in lijn met de bedrijfsprioriteiten van de DBRC en market best practices.</p> <p>2) In 2022 heeft de DBRC het bestek gelanceerd voor het ontwikkelen van het digitaal platform via de Minicompetitie in het kader van de Applicatiediensten (Perceel 5 van de Raamovereenkomst ICT 2022 van Digitaal Vlaanderen). Een volgend verzoek tot herverdeling (VAK), deze keer om de ontwikkeling van het platform te financieren, volgt daarom nog tijdens de vijfde herverdelingsronde van 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Access to Flemish Justice - ontwikkelen digitaal platform voor een volledige juridische procedure	2023 Q3	Op schema	
Access to Flemish Justice - optimaliseren kennisdatabank voor betere ontsluiting rechtspraak	2024 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.600.000 EUR
Uitvoering VAK	156.000 EUR
Uitvoering VEK	156.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 1.600.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit - advies](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021. Digitalisering DBRC](#)

[DBRC Strategische digitaleringsroadmap 2019-2024. Bijlage](#)

VV063 - HET OMGEVINGSLOKET – DIGITALISERING INZAGE-LOKET EN OMGEVINGSCHECK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle actoren betrokken bij de vergunningsprocedures, inclusief de burger en verenigingen in het kader van het inzagerecht

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Zowel in het kader van de coronamaatregelen met moeilijke toegang tot de gemeentehuizen voor inzage in omgevingsprojecten in het kader van openbaar onderzoek of de bekendmaking van een beslissing, als met het oog op een betere inspraakmogelijkheid voor de burger, dient het huidige 'publiek loket' van het Omgevingsloket herwerkt te worden. Dit 'publiek loket' was immers initieel niet bedoeld als platform voor digitale inzage in de omgevingsprojecten zelf, maar om op basis van enkele identificatiegegevens het digitaal indienen van bezwaarschriften of beroepschriften van derden te ondersteunen.

Daarom zal een nieuwe toepassing ontwikkeld worden die de burger een nieuwe gebruikerservaring geeft en een beter inzicht in de aangevraagde omgevingsprojecten.

Naast een betere dienstverlening in het kader van openbare onderzoeken en bekendmakingen is het tevens de bedoeling om de nodige tools aan te reiken aan instanties met inzagerecht op lopende projecten (adviesinstanties, wooninspectie, handhaving, politiediensten, ...) en inzage in het kader van openbaarheid van bestuur.

De complexiteit van vergunningsaanvragen en de bijhorende procedure stellen bijzondere eisen aan de gebruiksvriendelijkheid en visualisatie op beperkte schermen. Daarnaast dienen specifieke oplossingen uitgewerkt te worden om auteursrechtelijk beschermde plannen te kunnen visualiseren met respect voor de intellectuele rechten.

Het is de bedoeling om rechtstreeks inzage te verlenen in het huidige 'burgerloket' zonder dat data nog hoeven 'gekopieerd' te worden naar het 'publiek loket', rekening houdend met de verschillende rechten.

Aansluitend bij de aangepaste 'inzage-tool' is het tevens de intentie om in het kader van een betere dienstverlening ook de 'omgevingscheck' te herwerken.

Deze 'omgevingscheck' was initieel enkel bedoeld om zicht te krijgen op geldende voorschriften en de mogelijke impact van adviesverlening voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. In het kader van de omgevingsvergunning is de 'omgevingscheck' echter ook een essentiële en wettelijk verplichte tool geworden voor MER-screening en de mogelijke impact van handelingen en activiteiten op de omgeving. In dat kader zal de performantie, stabiliteit, configuratie-mogelijkheden en kwaliteit van de 'omgevingscheck' verbeterd worden door een verdere integratie in het Omgevingsloket.

Dit deelproject wordt uitsluitend gefinancierd met de relancemiddelen. Het verdere onderhoud van de

PROJECTOMSCHRIJVING

gerealiseerde toepassingen en eventuele bijkomende functionaliteiten worden opgenomen in de reguliere middelen van het project.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.000.000 EUR
Output	De realisatie van 2 deelt toepassingen bij het Omgevingsloket, met name het 'inzageloket' en de 'omgevingscheck 2.0'
Outcome	Dankzij de twee vernieuwde toepassingen zullen de burgers en bedrijven in de eerste plaats online en 24/7 inzage hebben in de vergunningsaanvragen die in openbaar onderzoek zijn of waarvoor de beroepstermijn van toepassing is, zonder zich nog naar het gemeentehuis te dienen begeven zoals dat vandaag het geval is. Tegelijkertijd zal men beter inzicht krijgen over mogelijke impact van omgevingselementen op de geplande projecten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Ontwikkeling Inzageloket opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Functionele analyse inzageloket	2021 Q3	Gerealiseerd	
Functionele analyse 'omgevingscheck 2.0'	2021 Q3	Gerealiseerd	
herwerkte tool 'Omgevingscheck'	2021 Q4	Gerealiseerd	
implementatie nieuwe toepassing 'inzage loket' in omgevingsprojecten	2022 Q3	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Contact met overheid via internet		2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	999.000 EUR
Uitvoering VEK	831.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Het Omgevingsloket digitalisering inzage-loket en omgevingscheck

VV064 - FIT – DATAGEDREVEN ORGANISATIE EN DIGITALISERING DIENSTVERLENING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	Dit project is bedoeld voor de Vlaamse ondernemer die internationaal wil ondernemen alsook de buitenlandse ondernemer die in Vlaanderen wil investeren.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Meer dan ooit moeten wij de klanten snel en doelgericht helpen. Flanders Investment & Trade (FIT) wil een sterke klantgedreven organisatie zijn die wendbaar is voor de toekomst en robuust kan inspelen op onvoorziene bedreigingen voor Vlaamse bedrijven en de Vlaamse economie, zoals Covid-19, Brexit, en wereldwijd groeiend protectionisme.</p> <p>Beperkingen op het verkeer van mensen, goederen en diensten en inperkingsmaatregelen zorgen regelmatig voor verstoring in productie en vraag. De impact op toeleveringsketens, grondstoffen en een lager vertrouwen door disrupties zoals een pandemie of macro-economische gebeurtenissen is groot.</p> <p>Dit project moet de Vlaamse ondernemer herlanceren op het internationale terrein. FIT wil daarom versneld inzetten op digitalisering om zijn dienstverlening nog toegankelijker en meer gepersonaliseerd te maken, de impact van prospectie te verhogen, matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse zakenpartners te faciliteren enz. Het Agentschap investeert in verdere digitalisering en Artificiële Intelligentie (AI) in zowel business processen als in het faciliteren van contacten met klanten.</p> <p>DG Reform lanceerde in September 2019 een project “Blue Print for artificial intelligence adoption at Flanders Investment & Trade”, dat werd afgerond in juli 2020. Het resultaat was een AI-roadmap om de dienstverlening van FIT te versterken aan de hand van 4 pijlers: digital skills, datagedreven, optimalisatie businessprocessen en vergroten van de klanteninteractie. Dit project, VV064, werkt verder op de verworven inzichten.</p> <p>Dankzij een doorgedreven digitalisering van business processen is de dienstverlening van FIT 24/7 toegankelijk. Met een hoofdzetel in Brussel, kantoren in de vijf Vlaamse provincies en een uitgebreid wereldwijd netwerk neemt FIT in het landschap van Vlaamse overheidsinstellingen een bijzondere plaats in: ‘FIT never sleeps’. Verdere digitalisering kan de kloof tussen Vlaanderen en lokale business communities wereldwijd dichten. Een virtuele wereld waar virtuele matching tussen bedrijven de norm is, verbetert bovendien de ecologische impact: minder fysieke zakenreizen, meer en kortere communicatielijnen tussen binnen- en buitenland. Transparant en snel, gevrijwaard van hinderlijke data-silo’s, en maximaal gebruikmakend van uniforme, in de cloud draaiende business tools. Dat is cruciaal om de Vlaamse export en economie niet te laten ontsporen, en investeringsstromen naar Vlaanderen niet te laten stilvallen. Nu meer dan ooit moet er geïnvesteerd worden om de digitale omslag te maken en voorsprong te realiseren.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.000.000 EUR
Output	<p>Aan de hand van betere data: verrijking van klantenbestand (70% van de accounts) en gebruik van digitale ondernemingsfoto om de klant gericht te bedienen;</p> <p>Aan de hand van meer data: lerende algoritmes om predictieve analyses te maken over de customer journey van een bedrijf;</p> <p>Aan de hand van geconnecteerde data: matchingplatform waarmee de Vlaamse ondernemers sneller connecteren met buitenlandse zakenpartners;</p> <p>Opzet van een digitaal marketingplatform om met de juiste klanten op het juiste moment en op de juiste manier te communiceren;</p> <p>Uitrol intern trainingplatform om de digitale vaardigheden in de organisatie te verbeteren;</p> <p>Lancering van een performant informatiesysteem over internationaal ondernemen.</p>
Outcome	Meer gedigitaliseerde, dynamische, interactieve en doeltreffende dienstverlening op maat van de klant.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project zit in grote lijnen op schema. De verrijking van data over onze klanten, nodig om de dienstverlening te verbeteren, werd gerealiseerd. De ontsluiting ervan zit op schema. De marketing technologie werd aangekocht en wordt uitgetest. De analyse om signalen op te vangen is lopende, maar gebruik maken van bestaande software is moeilijk en heeft vertraging opgelopen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Doelstelling 1a: Ken de klant (Customer Intimacy) via "ACCOUNTMANAGEMENT VOOR SOURCING". Om de (top)bedrijven te identificeren, sourcinglijsten te maken en de matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse spelers te faciliteren, verrijken we de accounts met meer en betere data.	2022 Q4	Op schema	Verrijking ook mogelijk via douane-data. Dit is een belangrijke stap voorwaarts.
Doelstelling 1b: Ken de klant (Customer Intimacy) via "PREDICTIEVE MODELLEN AI". We maken algoritmes om signalen te capteren van potentiële investeerders en van nieuwe Vlaamse exporteurs.	2022 Q4	Vertraging	Het capteren van signalen en het scoren van potentiële leads wordt aangeboden door verschillende oplossingen. We bekijken welke bestaande oplossingen en algoritmes ons kunnen helpen.
Doelstelling 2: Engageer de klant via "MyFIT-PROMOTIETOOL EVENPLATFORM". FIT wil minder fysieke en nog meer online B2B contacten tussen	2022 Q4	Op schema	MijnFIT heeft opnieuw een upgrade achter de rug, die matching moet verbeteren.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Vlaamse bedrijven en potentiële zakenpartners in het buitenland.			
Doelstelling 3: Bereik de klant via “DIGITAL PERSONALIZED & ACCOUNT BASED MARKETING”. Om de klant op maat te bedienen en te bereiken en onze impact te maximaliseren, zetten we in op “next generation” digitale marketing, gebaseerd op customer centric data.	2022 Q4	Op schema	De eerste testen op de marketing technologie zijn gestart.
Doelstelling 4: Werk vlot voor de klant via “TRAINING IN DIGITAL SKILLS”. Efficiënte bediening van de klant veronderstelt een digitale transformatie zodat data ingezet worden om de dienstverlening te verbeteren (“Lead by Example”). Bedrijven moeten digitalisering integreren in hun internationale business modellen, de markt voor digitale export ligt open.	2022 Q4	Op schema	De FIT Business Academy is bijna klaar.
Doelstelling 5: Informeer de klant via “KENNISBEHEER”. Digitale ontsluiting voor de klant van marktkennis via cognitive search	2022 Q4	Vertraging	De analyse over de ontsluiting is nog niet klaar. De projectleider zal FIT bovendien verlaten. Dit zorgt voor vertraging.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
DIGITALE VAARDIGHEDEN - Implementatie van een trainingtool om digitale vaardigheden te verbeteren	In gebruikname van de trainingtool	2022 Q3		100 %
ACCOUNTBEHEER - Creatie van een digitale lijst met Vlaamse bedrijven in een bepaalde sector en in een bepaald land	Digitale zoekmodule om Vlaamse bedrijven te identificeren	2022 Q4		50 %
ACCOUNTBEHEER - Creatie van een digitale Ondernemingsfoto van de actieve FIT-klanten	80% van de klanten hebben een digitale ondernemingsfoto	2022 Q4		100 %
DIGITALE PLATFORMEN - Lancering van een vernieuwd MijnFIT profiel waar de klant zelf zijn promotie kan beheren	Vernieuwd MijnFIT-profiel met maximale opties is gelanceerd	2022 Q4		65 %
DIGITALE VAARDIGHEDEN - Ontwikkeling van een monitoringssysteem van de digitale vaardigheden (nulmeting en tussentijdse metingen) van de personeelsleden	60% van de personeelsleden maakt vooruitgang	2022 Q4		50 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
ACCOUNT BASED MARKETING - Naast brede campagnes maken we meer gebruik van gerichte communicatie, op maat van de klant, via een performante marketing technologie	Meer gerichte marketingtrajecten via de marketing technologie	2022 Q4		10 %
DIGITALE PLATFORMEN - Succesvolle in productiestelling en implementatie van het interactieve promotieplatform	65% van de actieve klanten maakt vlot gebruik van een promotieplatform	2022 Q4		35 %
ACCOUNTBEHEER - Verrijking van accounts uit het klantenbestand met informatie nuttig om op maat te kunnen bedienen (o.a. over exportlanden)	70% van de accounts zijn verrijkt	2022 Q4		50 %
LEAD ONTWIKKELING en SCORING - Creatie van dashboards waar opportuniteiten ("leads") voor Vlaamse bedrijven en potentiële buitenlandse investeerders vatbaar worden weergegeven	Creatie van Dashboard met leads en scoring	2022 Q4		10 %
KENNISBEHEER - Ontwikkeling van een informatiesysteem om informatie op een efficiënte wijze te verzamelen	Lancering van informatiesysteem met performante zoekrobots	2022 Q4		15 %
ACCOUNTBEHEER - Afwerking van de gemeenschappelijke FIT-VLAIO Ondernemingsfoto	VLAIO-FIT Ondernemingsfoto in gebruik	2022 Q4		95 %
ACCOUNT BASED MARKETING - Monitoring van de ontvangst bij de klant van de marketingcampagnes	BI Dashboard om effectiviteit te monitoren	2022 Q4		5 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	316.000 EUR
Uitvoering VEK	147.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 200.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 juni 2021. Visie FIT–Datagedreven organisatie & Digitalisering dienstverlening](#)

VV065 - CYBERSECURITY EN UITROL SIEM

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om te beschikken over een veilig en privacybestendig aanbod van digitale diensten, rekening houdend met de evoluerende bedreigingen en technologische vernieuwingen. We voeren daarom een aantal cruciale initiatieven en verbeteringen door op vlak van informatieveiligheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.500.000 EUR
Output	Zie mijlpalen.
Outcome	Robuuste goed beveiligde en gemonitorde ICT-omgeving die bestand is tegen aanvallen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De meeste activiteiten binnen het project "Cybersecurity en SIEM onboarding" lopen vlot.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALLEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema	
Verdere uitbouw van informatieclassificatie- raamwerk	2022 Q4	Op schema	
Opbouw standaardrapportering en centraal dashboard voor veiligheidsrisico's	2021 Q4	Vertraging	Door personeelsverloop is er een vertraging op het project. De huidige planning voorziet de realisatie van de mijlpaal tegen Q4 2022.
Ontwikkeling instrument voor self-assessment	2022 Q4	Op schema	
Ontwikkeling proces en tooling voor conformiteitstoetsing	2022 Q2	Vertraging	De conformiteitstoetsing is afhankelijk van het uitvoeren van een self assessment. De mijlpaal wordt verplaatst naar Q4 2022.
Communicatie -en bewustmaking campagne met betrekking tot informatieveiligheid	2021 Q4	Gerealiseerd	De dienstverlening inzake "Phishing as a service" en "Responsible disclosure", dat past binnen bewustmaking is operationeel en wordt toegepast. Tevens is er een communicatieplan opgesteld mbt informatieveiligheid.
Uitrol SIEM: koppeling met bedrijfsapplicaties en kritieke infrastructuurcomponenten	2022 Q4	Op schema	
Uitrol SIEM: Activeren, trainen en optimalisatie van de motor voor artificiële intelligentie via log analytics	2022 Q4	Op schema	
Verdere optimalisatie en inrichting van centraal log management conform vereisten i.k.v wetgeving en informatieveiligheid.	2022 Q4	Op schema	
Verdere uitbouw van encryptiebouwstenen zodat de vertrouwelijkheid van gegevens gegarandeerd blijft	2022 Q4	Op schema	
Verdere integratie en uitbouw van PAM zodat er steeds controle is op beheerderstoegangen voor zowel infrastructuur als toepassingen, api's	2022 Q4	Op schema	
Verdere uitbouw Certificatenbeheer	2022 Q2	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitvoering penetratietesten en het koppelen van de veiligheidsbouwstenen aan geïdentificeerde risico's	2022 Q4	Op schema	
Self-service portaal voor klanten: self-assessment, maturiteitsscan, onboarding, opvolging en beheer van risicomatregelen afgestemd op self-assessment en maturiteitsscan	2022 Q4	Op schema	
Levenscyclusbeheer van RPA identiteiten via de veiligheidsbouwstenen.	2022 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.500.000 EUR
Uitvoering VAK	954.000 EUR
Uitvoering VEK	572.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.100.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Cybersecurity en uitrol SIEM](#)

VV066 - HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit relanceproject voorziet in gerichte investeringen in de mogelijkheden om plaats -en tijdsafhankelijke dienstverlening te organiseren, ter ondersteuning van de Vlaamse overheid en lokale besturen in hun digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening naar de burgers, ondernemers en verenigingen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	Na uitvoering van het project wordt het hybride werken maximaal ondersteund en wordt een performante datagedreven overheid op niveau van de werkplekken gefaciliteerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project zit op schema. De resultaten worden verwacht in Q4 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema	
Plaats- en tijdsafhankelijk werken - migratie centrale AD naar de cloud.	2022 Q4	Op schema	Oplevering voorzien voor Q4 2022
Data- gedreven werkplek : VV066.02.01 Ontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Low code en Self-service analytics'	2022 Q4	Op schema	Oplevering voorzien voor Q4 2022
Digitale inkomende post - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Digitale inkomende post'	2022 Q4	Op schema	Project op schema. Momenteel in pilootfase. Uitrol naar eerste gebouw gepland voor 4 juli.

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	373.000 EUR
Uitvoering VEK	232.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Hybride digitale werkplek](#)

VV067 - MODERNISERING CLOUD- EN NETWERKINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om te beschikken over een digitaal platform van modulaire, herbruikbare en aanpasbare infrastructuur en services, rekening houdend met de behoeften van de relanceprojecten. We voeren daarom een aantal cruciale modernisering en verbeteringen door in de digitale infrastructuur van de Vlaamse overheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.500.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	Gemoderniseerde ICT netwerk- en cloudinfrastructuur die maximaal is geconsolideerd zodat een efficiënte, innovatieve en geïntegreerd ICT-basisinfrastructuur is gerealiseerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none">- De migratie van het NMC4 datacenter naar de vernieuwde hybride cloud loopt overeenkomstig planning.- Het zwaartepunt van de migratie van het verouderde VPC datacenter naar de vernieuwde hybride cloud is verschoven naar de tweede helft 2022 en 2023 gezien de werklast inzake de transitie van de ICT-raamcontracten.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema	
De migratie en modernisering van het legacy datacenter NMC4	2022 Q4	Op schema	
De migratie van de virtual private cloud naar een hybride cloud infrastructuur	2022 Q4	Vertraging	Omwille van de drukke activiteiten bij de transitie van de raamcontracten zal de migratie van het VPC pas worden beëindigd in 2023. Daarnaast blijkt dat een aantal entiteiten de nodige tijd moeten krijgen om hun entiteitspecifieke acties betreffende de migratie budgettair af te dekken en de acties effectief te implementeren.

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.500.000 EUR
Uitvoering VAK	1.727.000 EUR
Uitvoering VEK	1.401.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.900.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Modernisering cloud -en netwerkinfrastructuur](#)

VV068 - KALEIDOS – DIGITALISERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE VLAAMSE REGERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Financiën en Begroting - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Direct: Kabinetten van de ministers van de Vlaamse Regering Departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid Inspectie van Financiën Vlaams Parlement Strategische adviesraden Rekenhof & Raad van State Andere overheden Indirect: Ruimere publiek (professionelen, burgers e.a.)

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Kaleidos zet in op het digitaliseren van de administratieve processen bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering en de ontsluiting van de bijhorende data. Het gaat om volgende processen:

- Agendering & opvolging van de ministerraad van de Vlaamse Regering
- Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Digitale ministerraad
- Dossierflow binnen de kabinetten
- Communicatie van de beslissingen van de Vlaamse Regering, inclusief toegang tot de bijhorende publieke documenten
- Dossierflow tussen Vlaamse Regering en Vlaams Parlement (m.b.t. besluitvorming)
- Connectie met KRAB-toepassing voor adviezen van de Inspectie van Financiën
- Adviezen van de Raad van State en wetgevingstechnisch advies
- Koppeling met het Digitaal Archief Vlaanderen

Gezien het belang van de dossierstromen en de data wordt ook geïnvesteerd in de redundantie van de applicatie.

Het nieuwe datamodel is ontwikkeld en de migratie van de data is al grotendeels gebeurd, maar nog niet operationeel. Met de Relancemiddelen worden volgende doelstellingen gerealiseerd:

- Digitalisering van de diverse work flows en documenten
- Ontsluiting van data

Een belangrijk aandachtspunt, gezien de diverse gebruikersgroepen, is de performantie van de applicatie.

Voor de ontwikkeling van de applicatie worden zowel Vlaamse als RRF-middelen gebruikt.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.400.000 EUR
-------	---------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Output	Digitaliseren van de administratieve processen bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering en de ontsluiting van de bijhorende data.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • De administratieve ondersteuning verloopt efficiënter en correcter: de papieren flow verdwijnt waardoor het proces sneller en efficiënter wordt. Werken vanop afstand wordt mogelijk. De ministerraad kan volledig digitaal verlopen wanneer nodig. De documenten worden slechts op één plaats bewaard, waardoor het risico op fouten sterk beperkt wordt. Raadpleging van regeringsdocumenten verloopt veel vlotter. De gebruiksvriendelijkheid wordt groter. • Communicatie over regeringsbeslissingen verloopt sneller en efficiënter door rechtstreekse ontsluiting via diverse overheidstoepassingen. • De transparantie van de besluitvorming verhoogt door de documenten beter toegankelijk te maken. Door te werken met een semantisch verrijkt datamodel kunnen data hergebruikt worden in andere toepassingen. Ze kunnen op die manier vlot ontsloten worden naar andere overheden, burgers e.a.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De optimalisatie van de projectorganisatie werpt zijn vruchten af met enkele belangrijke realisaties als resultaat. De performantie van de applicatie, onder meer cruciaal voor de uitbreiding van het aantal gebruikers, verbeterde aanzienlijk. De module voor publicaties van decreten, besluiten e.d. werd conform de vooropgestelde timing in productie gezet. De werkzaamheden voor de integratie van de digitale handtekening en de voorbereidingen voor het uitbreiden van het aantal gebruikers lopen. Er werd voorrang gegeven aan de optimalisering van enkele bouwstenen en functionaliteiten zodat de fundamenten voor de volledige digitale dossierstroom van de Ministerraad robuuster, efficiënter en betrouwbaarder zijn. Dat heeft enkele andere werkzaamheden vertraagd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Het Relanceproject VV068 - Kaleidos is goedgekeurd door de Vlaamse Regering	2020 Q2	Gerealiseerd	
De data uit het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering die beschikbaar zijn in Kaleidos zijn ontsloten voor hergebruik door andere applicaties (zowel binnen overheid als publiek) via het publieke dataportaal Themis	2021 Q4	Gerealiseerd	De gegevens in Kaleidos zijn beschikbaar als open data op https://themis.vlaanderen.be/

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De toepassing is redundant	2021 Q4	Vertraging	Er werd een demo gegeven en technisch werkt dit. Uitdaging is om dit nu te testen in de testomgeving. De effectieve uitrol hiervan betekent ook de inzet van een bijkomende server en dus een bijkomende kost. Voorziene timing voor de test: juni 2022.
Het publicatieproces voor decreten, besluiten e.d. kan volledig digitaal verlopen	2022 Q1	Gerealiseerd	De workflow voor de publicatie van de beslissingen van de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad verloopt digitaal via Kaleidos.
Historische data kunnen retro-actief ingevoerd worden	2023 Q4	Op schema	Timing mijlpaal is aangepast. De genormaliseerde dataset van alle ministers staat in productie en gaat terug tot de start van de Vlaamse Regering. Dit was de belangrijkste 'to do' en een voorwaarde om retro invoer mogelijk te maken. De werkzaamheden aan dit luik zijn hier voorlopig mee afgerond. Er blijft wel nog een belangrijke to do: - manuele correcties moeten nog mogelijk gemaakt worden (ad hoc aanpassingen) - nog enkele structurele (automatische) aanpassingen Dit is echter minder prioritair, aangezien een disclaimer duidelijk kan maken welke informatie voorlopig wel en niet beschikbaar is.
Documenten kunnen digitaal getekend worden in Kaleidos	2022 Q3	Op schema	De designs zijn uitgewerkt. De ontwikkeling, inclusief de integratie van Kaleidos met de digitale handtekenmap, is bezig.
De dossierstroom voor regelgevende dossiers tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement kan digitaal verlopen	2022 Q3	Vertraging	Het werk voor de technische koppeling is gerealiseerd. De functionele integratie staat on hold tot het Digitaal tekenen is opgeleverd. Dit is een absolute voorwaarde om de authenticiteit van de ondertekende stukken te verzekeren. Tegelijkertijd moeten de analoge werkprocessen hertekend worden in functie van de digitale documentenstroom. De gebruikersinterviews hiervoor starten op in het najaar 2022.
De beslissingen van de Vlaamse Regering kunnen via Kaleidos bekend gemaakt worden	2022 Q4	Gerealiseerd	Alle beslissingen van de Vlaamse Regering zijn raadpleegbaar op: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/ en zijn dus publiek beschikbaar.
Het Team Secretarie kan de voorbereiding en afhandeling van de dossierstroom voor de Ministerraad volledig afhandelen in Kaleidos	2022 Q4	Vertraging	De afgelopen maanden is er geïnvesteerd in de optimalisering van enkele bouwstenen en functionaliteiten in Kaleidos, zodat de fundamenten voor de volledige digitale dossierstroom van de Ministerraad robuuster, efficiënter en betrouwbaarder zijn. Dat heeft enkele andere werkzaamheden vertraagd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Ministerraad kan online verlopen.	2023 Q1	Vertraging	De afgelopen maanden is er geïnvesteerd in de optimalisering van enkele bouwstenen en functionaliteiten in Kaleidos, zodat de fundamenten voor de volledige digitale dossierstroom van de Ministerraad robuuster, efficiënter en betrouwbaarder zijn. Dat heeft enkele andere werkzaamheden vertraagd.
De kabinetten kunnen de dossierstroom voor de Ministerraden digitaal verwerken in Kaleidos	2023 Q1	Vertraging	De afgelopen maanden is er geïnvesteerd in de optimalisering van enkele bouwstenen en functionaliteiten in Kaleidos, zodat de fundamenten voor de volledige digitale dossierstroom van de Ministerraad robuuster, efficiënter en betrouwbaarder zijn. Dat heeft enkele andere werkzaamheden vertraagd.
Een eerste onderdeel van adviesverlening is voorzien in of gekoppeld met Kaleidos	2023 Q1	Stopgezet	Voor deze module moet de voorbereiding nog starten. Als onderdeel van de projectoptimalisatie werd gekozen voor meer focus, d.w.z. aan minder modules tegelijk werken zodat de prioritaire modules goed en meer binnen de vooropgestelde timing afgewerkt worden. Daarnaast gebeurden er performantieverbeteringen en is er geïnvesteerd in de optimalisering van enkele bouwstenen en functionaliteiten in Kaleidos, zodat de fundamenten voor de volledige digitale dossierstroom van de Ministerraad robuuster, efficiënter en betrouwbaarder zijn. Tot slot zullen er ook nog middelen nodig zijn voor de nodige ontwikkelingen voor de gekozen hostingformule. Het is dan ook niet meer realistisch om deze mijlpaal te behouden binnen de huidige planning en voorziene middelen.
De koppeling met het webplatform voor publieke ontsluiting van de beslissingen van de Vlaamse Regering is gerealiseerd	2023 Q3	Uitgesteld	De API is beschikbaar maar er moet nog een zoekrobot ontwikkeld worden zodat de aangeboden informatie beter manipuleerbaar is voor gebruikers. Zo kan deze 'publieke' dataset ook de basis vormen voor de toekomstige ontsluiting van de beslissingen van de Vlaamse Regering via het webplatform van Digitaal Vlaanderen. Aangezien er nu nog een vervangende oplossing is voor de ontsluiting via Digitaal Vlaanderen is deze actie minder dringend. Zie ook vorige mijlpaal m.b.t. adviesverlening. Als onderdeel van de projectoptimalisatie werd gekozen voor meer focus, d.w.z. aan minder modules tegelijk werken zodat de prioritaire modules goed en meer binnen de vooropgestelde timing afgewerkt worden.
Er is een koppeling tussen Kaleidos en het Digitaal Archief Vlaanderen	2023 Q3	Nog niet gestart	Als onderdeel van de projectoptimalisatie werd gekozen voor meer focus, d.w.z. aan minder modules tegelijk werken zodat de prioritaire modules goed en meer binnen de vooropgestelde timing afgewerkt worden. Verder onderzoek is nodig om te bepalen op welke termijn dit moet gebeuren (niet prioritair).

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Kaleidos is toegankelijk voor alle relevante doelgroepen (overheid)	2022 Q3	Op schema	De werkzaamheden op het vlak van design en ontwikkeling lopen voor een integratie van Kaleidos met ACM/IDM, gekoppeld aan een performante zoekinterface.
Er is een formeel goedgekeurd project closure/completion document beschikbaar voor het relanceproject VV068	2025 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Gebruikers van nieuwe en opgewaardeerde diensten, producten en processen		2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.400.000 EUR
Uitvoering VAK	1.760.000 EUR
Uitvoering VEK	821.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Kaleidos. Activiteiten en budget 2021](#)

VV069 - DATA INTEGRATIEDIENSTEN VOOR SLIMME MOBILITEIT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse regering heeft zich op het vlak van mobiliteit ambitieuze doelstellingen gesteld waaronder een modal shift om Vlaanderen en haar steden leefbaar te houden. Hierbij wordt mobiliteit als een dienst (Mobility-as-a-service, MaaS) vooropgesteld waarbij een gebruiker via digitale kanalen, zoals de Mobiliteitscentrale, eenvoudig meerdere types mobiliteitsdiensten kan combineren tot de meest efficiënte oplossing om zich van punt A naar punt B te verplaatsen

Om deze combimobiliteit mogelijk te maken, moet iedere vervoerder en/of MaaS-aanbieder kunnen beschikken over kwalitatieve en integreerbare data over zowel het volledige aanbod, publiek én privaat, als actuele data over bijvoorbeeld de positie van deelfietsen of bussen of filevorming. Met het relanceproject 'Data integratiediensten voor slimme mobiliteit' (VV069) wordt een gestandaardiseerde oplossing voor deze data-uitwisseling tussen alle betrokken partijen mee gerealiseerd. Door deze investering te realiseren in de context van dit relanceproject, zorgt het project voor de kickstart van het data-ecosysteem en de noodzakelijke inspanningen op het vlak van interoperabiliteit en herbruikbaarheid die door de private sector als complex en niet rendabel worden geacht. Hiermee wordt de data-deling voor Mobiliteit zowel voor publieke als private actoren naar een hoger niveau getild en kunnen deze partijen zich naar de toekomst toe richten op meerwaardediensten in het mobiliteitsveld.

Het voorliggend relanceproject maakt hiervoor gebruik van de publicatiestraat en de ecosysteemwerking die het resultaat zijn van het relanceproject 'Vlaamse Sensor Data Space' (VV073). Door de mobiliteitsdatastromen te standaardiseren en via de Vlaamse Sensor Data Space ter beschikking te stellen, moeten aanbieders die in verschillende (vervoers-)regio's actief zijn hun data maar één keer delen waarna de mobiliteitsdata vlot beschikbaar en herbruikbaar worden voor alle aanbieders van oplossingen voor combimobiliteit.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	Binnen het project worden datastromen gerealiseerd ten behoeve van de Mobiliteitscentrale en Hoppin. Tegelijk wordt ingezet op adoptie van de datadiensten bij lokale besturen door hergebruik binnen de eigen toepassingen mogelijk te maken. Dit wordt concreet toegepast bij de

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>Stad Antwerpen. Via de ecosysteemwerking wordt actief gezorgd voor het delen van de geleerde lessen met zowel andere steden en gemeenten, als mobiliteitsaanbieders.</p> <p>Daarnaast zorgt het project voor het ontsluiten van geanonimiseerde verkeersstroomgegevens. Deze datastromen dragen bij aan de beleidsmatige opvolging van de beoogde modal shift. Via de Vlaamse Sensor Data Space zijn deze datastromen bovendien ook voor andere doeleinden te gebruiken.</p> <p>Tot slot wordt de haalbaarheid nagegaan om de burger een meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden door mobiliteitsvoorkeuren te delen via een persoonlijke datakuis die aangeboden wordt door het Vlaams Datanutsbedrijf (VV061).</p>
Outcome	<p>De datastopcontacten ontzorgen de ontwikkelaars van de Mobiliteitscentrale, zodat ze minder energie moeten steken in maatwerkkoppelingen van datastromen. Daardoor is er meer ruimte vrij voor andere prioriteiten, zoals voor slimme toepassingen.</p> <p>Tegelijkertijd dalen de inspanningen van de gehele markt voor het combineren en schaalbaar bevragen Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk verhogen doordat ze ondersteund worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering en interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerkkoppelingen en de bijhorende kosten gereduceerd. Bedrijven en integratoren van mobiliteitsdata kunnen zich toeleggen op het ontwikkelen van waarde creërende toepassingen in plaats van op het telkens opnieuw verzamelen en toegankelijk krijgen van data. van het data aanbod.</p> <p>De referentie implementatie met de Stad Antwerpen effent het pad voor andere steden en gemeentes die op dezelfde standaard manier gebruik willen maken van de datastopcontacten.</p> <p>Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kan dankzij de datastromen beleidsanalyses over de verkeersstromen maken. Door onder meer beroep te doen op geanonimiseerde ANPR-data reflecteren deze analyses immers voor het eerst rechtstreeks de werkelijkheid op het terrein.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	- ICT-dienstenleverancier gegund conform overheidsopdrachten- Governance opgezet- Ontwikkeling gestart van Minimum Viable Product (MVP) basisbouwblokken VSDS publicatiestraat- GIPOD LDES gerealiseerd voor 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit'
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Projectdossier goedgekeur	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
d aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering.			
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	
De mobiliteitscentrale aansluiten op de datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	2022 Q2	Op schema	GIPOD LDES gerealiseerd 2022 Q1. Verbeterde versie in mei 2022.
Realisatie Minimum Viable Product (MVP) inzake ontwikkeling van de basisbouwblokken voor de VSDS publicatiestrategie. (cfr. eerste implementatie van de Vlaamse Sensor Data Space. Deze opstelling realiseert de bouwstenen en standaarden	2022 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 7)			
De Case van de stad Antwerpen aansluiten op de datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	2023 Q4	Op schema	
De geanonimiseerde verkeersstromen met ANPR data (Automatic Number Plate Recognition) zijn beschikbaar zodat er analyses op kunnen worden uitgevoerd	2023 Q2	Vertraging	Gebruik van ANPR data vereist een federale wetswijziging. Stavaza is niet duidelijk maar Wetsvoorstel lijkt niet gestemd te raken. https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1918 Werk mbt deze mijlpaal staat 'on hold' tot dit is uitgeklaard.
De haalbaarheidsstudie om de burger in de toekomst een meer gepersonaliseerde mobiliteitservaring aan te bieden is beschikbaar	2023 Q4	Nog niet gestart	
RFF - Functionaliteiten tijdig	2025 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
en conform beschikbaar voor de doelgroep			

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
KPI.1 De mobiliteitscentrale sluit aan op 1 datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	1	2022 Q2	1	100 %
KPI.3 De geanonimiseerde verkeersstromen met ANPR data (Automatic Number Plate Recognition) zijn beschikbaar zodat er analyses op kunnen worden uitgevoerd	1 (= beschikbaar)	2023 Q2		
KPI.4 De haalbaarheidsstudie om de burger in de toekomst een meer gepersonaliseerde mobiliteitservaring aan te bieden is beschikbaar	1 (= beschikbaar)	2023 Q4		
KPI.2 De Case van de stad Antwerpen sluit aan op 1 datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	1	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.406.000 EUR
Uitvoering VEK	892.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 4.200.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021. Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021. Projectdossier](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV073 - Vlaamse Sensor Data Space](#)

VV070 - MATIS, HET VLAAMSE MATERIALENINFORMATIESYSTEEM

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Departement omgeving, afdeling Handhaving, Denuo (sectorfederatie), VVSG/Interafval, Afvalbeheersorganismen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De herziene kaderrichtlijn afvalstoffen wijzigde de recyclagedoelstellingen en specificeert nu in detail hoe de berekeningen ervan moeten gebeuren. De gerecycleerde hoeveelheid afval moet vanaf productiejaar 2020 (rapportering in 2022) gemeten worden bij de input in de recyclage-handeling. Dat betekent dat het meetpunt voor de recyclage nu achteraan de verwerkingsketen ligt, terwijl dat voorheen vooraan lag. Een belangrijke doelstelling van MATIS is dat de OVAM het afval kan volgen doorheen de diverse voorbehandelingen tot het effectief gerecycleerd wordt. Dit doen we bij voorkeur via digitale gegevensuitwisseling tussen de betrokken bedrijven en de OVAM zodat de administratieve lasten beperkt blijven.

Regelmatig stellen we vast dat er illegale of frauduleuze afvaltransporten plaatsvinden. De OVAM wil hier korter op de bal spelen en de afvalstoffen traceren om de toezichhoudende diensten van accurate informatie voorzien met het oog op een effectieve en efficiënte handhaving.

Daartoe ontwikkelt de OVAM een nieuwe tool (MATIS) voor gegevensinzameling, -validatie en -ontsluiting. De gegevens van de afvalinzamelaars en -verwerkers zullen via volledig digitale processen naar het OVAM-systeem vloeien, waar de gegevens op een geautomatiseerde manier gevalideerd zullen worden. De gevalideerde gegevens zullen via MATIS op het juiste aggregatieniveau ontsloten worden naar belanghebbenden en naar de OVAM-systemen voor het berekenen van de Vlaamse afvalstatistieken. De OVAM stemt hiervoor maximaal af met de betrokken belanghebbenden zodat optimale gegevensuitwisseling mogelijk is.

Een tweede spoor in het project betreft het digitaliseren van de documenten die afvaltransporten moeten begeleiden. We digitaliseren de identificatieformulieren en stemmen hiervoor af met andere transportdocumenten zodat efficiëntiewinsten geboekt worden. Omdat hier mogelijks gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden (vb locatie gegevens) ondernemen we de nodige acties om de toegang en de verwerking van deze gegevens te regelen. Op termijn worden de identificatieformulieren gebruikt om via 'slimme weegbruggen' de effectief gewogen hoeveelheden op een digitale manier naar de OVAM te laten stromen. De koppeling tussen de gedigitaliseerde identificatieformulieren en MATIS is voorzien inna 2023. De verplichting tot digitalisering van de identificatieformulieren is opgenomen in Vlarema 8 en is reeds een eerste keer door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Zowel de gegevens van de digitale identificatieformulieren, als de gegevens in MATIS kunnen gekoppeld

PROJECTOMSCHRIJVING

worden aan vergunningen en registratiegegevens, zodat onregelmatige transporten onmiddellijk zichtbaar worden. Op deze manier kunnen we ook marktschommelingen en afzetproblemen in de afval- en materialenmarkt van kort kunnen opvolgen.

De gegevens zullen niet langer ingezameld worden bij de Vlaamse bedrijven in het algemeen, maar enkel bij bedrijven die professioneel actief zijn in de afvalinzameling en –verwerking. Op deze manier ontstaan schaalvoordelen waarbij de investering in digitalisering kan lonen voor de bedrijven. Daarenboven kunnen we de administratieve lasten van de afvalrapportering voor een groot aantal Vlaamse bedrijven wegnemen.

Voor de ontwikkeling van MATIS werd reeds een deel van de benodigde middelen gevonden in een Europees Life-project (C-MARTLIFE). Vanuit het CMARTLIFE project werd 1.400.000€ projectsubsidie bekomen voor het ontwikkelen van MATIS als een tool die de Vlaamse overheid in staat zal stellen om te voldoen aan de nieuwe Europese rapportageverplichtingen. De personeelsinzet van de OVAM is binnen CMARTLIFE verrekend in de verplichte eigen inbreng. Daarnaast bedraagt de financiering vanuit de middelen van Vlaamse veerkracht 1.950.000€. De middelen die vanuit CMARTLIFE ter beschikking worden gesteld zullen vooral gebruikt ingezet worden voor de gegevensinzameling en -verwerking met het oog op Europese rapportage verplichtingen, terwijl de middelen van Vlaamse veerkracht vooral gebruikt zullen worden voor de gegevensinzameling en -verwerking met het oog op traceren van afvalstromen. Deze invalshoeken zijn wel niet strikt te scheiden en komen samen binnen het MATIS-project.

De concrete acties binnen dit project kunnen opgedeeld worden in:

- Analyse van de benodigde processen en de afstemming met belanghebbenden;
- ICT ontwikkeling van de software voor data-inzameling, -validatie en -verwerking;
- Gebruik van de data voor rapportering en ontsluiting (naar EU, bedrijven, gemeenten, intermediaire organisaties,..);
- Wetgevende initiatieven ikv digitalisering van afvalidentificatieformulieren en de verwerking van persoonsgegevens;
- Datagedreven studies naar de afvalverwerking van uitgevoerde afvalstoffen, om MATIS te verrijken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.950.000 EUR
Output	Er zal software opgeleverd worden voor inzamelaars en verwerkers van afvalstoffen: - om gegevens te rapporteren mbt de hoeveelheden ontvangen en verwerkte afvalstoffen/materialen en de hoeveelheden afgevoerde afvalstoffen/materialen met hun bestemming (rapportering vanuit digitale identificatieformulieren is daarbij een mogelijkheid); - om de gerapporteerde gegevens te valideren (zo veel mogelijk geautomatiseerd); - om gegevens te consulteren door de rapporterende bedrijven en andere bevoegde entiteiten en gericht/geaggregeerd te ontsluiten naar bevoegde entiteiten,vb afdeling handhaving van departement Omgeving.
Outcome	Er zal een systeem ontstaan waarbij afvalstoffen en materialen kunnen gevolgd worden tussen bedrijven. Via dit systeem kunnen we afvalstoffen traceren. De ontsluiting van gegevens uit MATIS naar de afdeling handhaving moet leiden tot een effectievere en efficiëntere handhaving op afvalstoffenbewegingen. Het Vlaamse materialeninformatiesysteem zal toelaten dat de Vlaamse overheid zijn nieuwe wettelijke rapportageverplichtingen met betrekking tot de effectieve recyclage van stedelijk afval kan nakomen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Project zit op schema buiten één uitgestelde mijlpaal zonder verder effect op de projectplanning.
Noodzakelijke politieke actie	Zo snel mogelijke goedkeuring van VLAREMA 9, zodat de wettelijke basis van MATIS in orde is en de nodige Ministeriële besluiten kunnen genomen worden.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Regelgeving betreffende verplichting digitale identificatieformulieren (2023) van kracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
Eerste pilootrapportering van gegevens huishoudelijk afval is afgerond.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Data-sjabloon voor data-uitwisseling met MATIS afgewerkt, gepubliceerd en verwerkt in een Ministerieel besluit	2022 Q1	Uitgesteld	<p>Initieel werd eraan gedacht om deze uitwisselingsformaten op te nemen in een MB betreffende uitwisseling van registergegevens. Bij nader inzien zijn de MATIS_uitwisselingsformaten wel compatibel met de uitwisselingsformaten van registergegevens, maar zijn ze beperkter dan de gegevens in het register.</p> <p>Er is besloten om deze uitwisselingsformaten op te nemen in een MB over MATIS-uitwisselingsformaten. Die kunnen pas genomen worden nadat het besluit van de Vlaamse regering (VLAREMA) is aangepast. De eerste principiële goedkeuring van VLAREMA staat gepland voor het zomerreces.</p> <p>WE vermoeden dus dat deze mijlpaal pas 2023 Q1 gerealiseerd zal worden. De formaten zijn wel al opgesteld, gedeeld met alle betrokkenen en ze worden gebruikt.</p> <p>Dit uitstel heeft dus geen effect op de uitvoering van het project of op de realisatie van andere mijlpalen.</p>
Software voor digitale en semi-automatische gegevensoverdracht van inzameling en verwerking van stedelijke afvalstoffen is gerealiseerd en in werking	2022 Q1	Gerealiseerd	Deze software is in werking en wordt momenteel gebruikt voor rapportage door verwerkers en inzamelaars van huishoudelijke afvalstoffen
Software voor geautomatiseerde validatie van de gegevens over inzameling en verwerking van	2022 Q4	Op schema	De validatie van de gerapporteerde gegevens vindt momenteel plaats op een niet geautomatiseerde manier. op basis van deze ervaringen zal tegen het einde van 2022 werk

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
afvalstoffen is gerealiseerd en in werking.			gemaakt worden van een geautomatiseerde validatie.
Regelgeving betreffende verwerking persoonsgegevens en toegang tot de identificatieformulieren van kracht.	2023 Q1	Op schema	Het materialendecreet is definitief goedgekeurd en ondertussen van kracht. Dit decreet bevatte de nodige bepalingen mbt verwerking van persoonsgegevens, een definitie van MATIS en specifieke bepalingen over identificatieformulieren. Volgende stap is dat in het besluit van de Vlaamse regering nog een aantal aanpassingen worden gemaakt. De eerste principiële goedkeuring van dit besluit is voorzien tegen het zomerreces. De ontwerp teksten zijn klaar en worden nu met de stakeholders gefinaliseerd.
3 Datagedreven onderzoeken voor het in kaart brengen van de recyclage van uitgevoerde afvalstoffen zijn uitbesteed en afgerond	2023 Q4	Nog niet gestart	De Europese regelgeving die deze onderzoeken oplegt heeft vertraging opgelopen waardoor deze mijlpaal mogelijks ook zal moeten uitgesteld worden. Het is de verwachting dat we in de loop van 2022 met deze onderzoeken kunnen starten. Als alles vlot verloopt kunnen we de deadline van 2023 Q4 misschien nog halen. Anders zal deze mijlpaal licht moeten uitgesteld worden.
Instrument voor geautomatiseerde ontsluiting van gegevens gerealiseerd en in werking	2023 Q4	Op schema	Een Data-platform werd opgezet voor MATIS. Gekoppeld aan dit platform zijn reeds een aantal basisrapporten voorzien. Er is reeds een rapport voorzien voor melders van inzamel- en verwerkingsgegevens, waarmee ze de eigen gerapporteerde gegevens kunnen analyseren. Er is reeds een rapport voor toezichthouders beschikbaar waarmee ze de PRTR-rapportageplicht kunnen evalueren. Rapporten voor intercommunales en gemeenten zitten in de laatste fase voor in productiestelling. Verdere ontsluiting en rapportage volgt nog.
Koppeling MATIS aan vergunningen, registraties met oog op tracering en kwalitatieve gegevens voor Handhaving is gerealiseerd en in werking	2023 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Softwaremodule gegevens inzameling Huishoudelijk afval	eerste versie in productie	2021 Q4	1	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Data ontsluiting via powerBI naar melders inzameling HA	eerste versie in gebruik	2022 Q1	1	100 %
Softwaremodule gegevens verwerking van afval	eerste versie in gebruik	2022 Q1	1	100 %
Ontsluiting van gegevens naar melders van verwerkingsgegevens	eerste versie in gebruik	2022 Q2		85 %
Softwaremodule herverdelen van afvalstoffen over gemeenten	eerste versie in gebruik	2022 Q2		75 %
Ontsluiting gegevens naar niet melders	Opgezet en eerste versie in gebruik	2022 Q3		70 %
Validatiemodule ter ondersteuning van inhoudelijke validatie van de ingevoerde gegevens	eerste versie in productie	2022 Q4		20 %
Softwaremodule gegevens inzameling Bedrijfsafval	eerste versie in gebruik	2022 Q4		5 %
Ontsluiting van traceringsgegevens naar afdeling handhaving	eerste versie in productie	2023 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.950.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.950.000 EUR
Uitvoering VAK	1.420.000 EUR
Uitvoering VEK	796.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.950.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem](#)

VV071 - POOLSTOKALIAS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Lokale Besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit project wordt geïnvesteerd in een ondersteuningsstructuur met lokaal aandeelhouderschap om de digitale transformatie van de lokale besturen te versnellen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.000.000 EUR
Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Projectmijlpalen worden aangevuld na goedkeuring dossier door VR
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Nog niet gestart	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Nog niet gestart	
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2022 Q3	Op schema	de voorbereidende gesprekken lopen

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 1.700.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV072 - DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	culturele sector, culturele participanten, markt

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.

Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken.

Het project 'doelgericht digitaal transformeren' wil de brede waaier van het culturele aanbod verbinden met geïnteresseerde cultuurparticipanten om zo de cultuurparticipatie te verhogen en een impuls te geven aan een datagedreven beleid. De focus ligt hierbij op gegevensontsluiting via standaarden. Het project stimuleert op deze manier de digitale innovatie door middel van samenwerking en verbreding. Tevens worden open innovatie en marktbetrokkenheid gestimuleerd. Verschillende organisaties kunnen namelijk in dit uitwisselingsnetwerk verenigd worden: o.a. organisaties die het culturele aanbod kenbaar maken, actoren die zich met publieksonderzoek en participatie bezighouden en de beleidsmonitoring. De culturele beleving wordt op een nieuwe manier georganiseerd waarbij vraag en aanbod worden verbonden. Uitbreiding naar andere sectoren zoals private en toeristische organisaties kan een verdere impuls zijn voor innovatie.

Standaardisering zorgt ervoor dat data kunnen stromen. Door het werken met standaarden voor de digitale gegevensontsluiting wordt de informatie voor alle partijen toegankelijk en wordt het hergebruik van data geoptimaliseerd. Een digitale basisinfrastructuur maakt het mogelijk dat data over verschillende organisaties wordt verbonden met elkaar. Waar mogelijk worden bestaande bouwblokken versterkt en ingezet voor het volledige ecosysteem, waar nodig worden nieuwe bouwblokken toegevoegd. Monopolies zowel voor zowel culturele als marktspelers worden vermeden door het gezamenlijk beheer van de basisinfrastructuur waarop verschillende use cases door verschillende organisaties kunnen ontwikkeld worden.

Middels een verkort business case traject werden de doelstellingen, de scope en de mogelijke oplossingen samen met sector verder uitgewerkt. Dit is van cruciaal belang omdat de sector evolueert naar een open

PROJECTOMSCHRIJVING

ecosysteem waar partijen samen de verantwoordelijkheid dragen.

<https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/digitale-cultuur/onderzoek-en-projecten#doelgericht>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	Gegevensuitwisselingsplatform als basisinfrastructuur waarop data over het cultureel aanbod in verbinding komt met data over de vraag naar deze data vanuit de cultuurparticipant. Dit uitwisselingsplatform bouwt maximaal verder op reeds bestaande bouwstenen in de sector & verbindt de huidige data in gefragmenteerde bronnen via open data standaarden.
Outcome	Verhoging van de relevante cultuurpropositie naar de cultuurparticipant Verhoging van de samenwerking op sectorniveau Verhoging van de interoperabiliteit van data binnen de sector Verlaging van de planlast voor de sectorspelers

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De conceptuele referentie architectuur voor de basisinfrastructuur werd uitgewerkt en gevalideerd door de stuurgroep. De aanbesteding voor de ontwikkeling van het uitwisselingsplatform is gebeurd en de inwerking en ontwikkelingen worden opgestart via externe uitbreiding van het programmteam. Een UX-oefening werd opgestart om de ontsluiting naar enerzijds de aanbieder en anderzijds de cultuurparticipant vorm te geven in functie van een goede gebruikerservaring. Het OSLO-standaardisatietraject met betrekking tot cultuurparticipatie is lopende en de fase van public review werd hier opgestart. Een PIO-projectvoorstel werd opgestart voor dynamisering van de private ticketing markt voor adoptie van de nieuwe OSLO-standaard voor cultuurparticipatie.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitwerken businesscase als voorstudie om tot een actionable projectplan te komen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Goedkeuring door de VR	2021 Q2	Gerealiseerd	
Validatie van het projectplan door de Stuurgroep	2021 Q3	Gerealiseerd	
Uitwerken van een UX track waarbij gebruikerservaring voor de aanbieder en	2022 Q2	Op schema	De lancering van het platform zal na 2023 zijn, voordien zijn we vollop bezig

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
de cultuurparticipant wordt vormgegeven			met ontwikkeling & testing (maar geen productie).
Uitwerken van een MVP (ontwikkeling uitwisselingsplatform met data aan de aanbodzijde)	2022 Q2	Op schema	
Vrijgave van OSLO standaard voor cultuurparticipatie voor public review	2022 Q2	Op schema	
Opstarten van een MVP ontwikkeling met functionaliteit van aanbiederprofiel	2022 Q4	Nog niet gestart	
Opstarten van een MVP ontwikkeling met functionaliteit van cultuurprofiel	2022 Q4	Nog niet gestart	
Opstarten van bijkomende ontwikkelingen (MVP industrialisatie, ontbrekende componenten)	2023 Q1	Nog niet gestart	
Opstarten van een MVP ontwikkeling met integratie van ticketing data	2023 Q1	Nog niet gestart	Deze mijlpaal sluit aan op het ingediende PIO dossier voor dynamisering van de private ticketing markt (zie ook projectvoortgang)
Opstarten van een POC voor basis data analyse	2023 Q3	Nog niet gestart	
Goedkeuring van project closure document	2023 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
-----------	--------------	--------	------------	-----------------

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.314.000 EUR
Uitvoering VEK	518.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 4.200.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 800.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Relance-initiatief in het kader van de digitale transformatie van de cultuursector: doelgericht digitaal transformeren](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Digitale transformatie van de cultuursector: doelgericht digitaal transformeren](#)

[Business Case Doelgericht Digitaal Transformeren. Bijlage](#)

[Budget. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV083 - Inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur](#)

VV073 - VLAAMSE SENSOR DATA SPACE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij - Digitaal Vlaanderen - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Om van Vlaanderen een toonaangevende regio te maken op het vlak van smart cities en internet of things (IoT) kondigt het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' de realisatie aan van een data-platform voor sensordata. Het project "Vlaamse Sensor Data Space" (VV073) geeft hieraan invulling.

De te ontwikkelen nieuwe generieke bouwsteen biedt een antwoord op de uitdagingen die de verwachte vloedgolf aan (real time) data afkomstig van allerhande sensoren stelt, met name wat betreft het kostenefficiënt verdelen van de bijzonder grote volumes aan data, het omgaan met hoge snelheid waarmee data veranderen en de koppelbaarheid van sensordata aan de meer gangbare 'statische' data. Centraal staan de ontwikkeling van een 'publicatiestraat voor sensordata' en het definiëren van open standaarden waarmee werk wordt gemaakt van 'data-stopcontacten' voor sensordata die overheden en bedrijven toelaten om meer van deze nieuwe en innovatieve data in slimme toepassingen vlot te gebruiken aan een lagere kost en doorlooptijd.

Sensordata zullen zonder twijfel een belangrijke stimulans worden voor de Vlaamse data-economie en de lokale en Vlaamse overheid in staat stellen ambitieuze beleidsdoelstellingen zoals Blue Deal, Vlaams Energie en Klimaatplan, Modal Shift of Basisbereikbaarheid te realiseren. Om data in dit netwerk te laten stromen en iedereen toegang tot kwalitatieve data te verzekeren wordt ook ingezet op het implementeren van een ecosysteemwerking met governance-afspraken. Een beslissende factor voor het realiseren van deze strategie is de samenwerking met en de adoptie door de private sector waarvoor het Vlaams Datanutsbedrijf (VV061) een cruciale rol in het ecosysteem zal opnemen.

Tijdens het project worden, gefaseerd, minstens twee concrete toepassingen in verschillende domeinen (mobiliteit, water, ...) uitgewerkt om de publicatiestraat en de ecosysteemwerking in de praktijk te brengen. Een eerste toepassing in het domein mobiliteit wordt gerealiseerd in samenwerking met het relanceproject VV069 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit'. Een tweede toepassing in het domein water zal worden uitgewerkt in samenwerking met het relanceproject VV032 'Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen'.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	8.500.000 EUR
Output	Het project voorziet de ontwikkeling van open standaarden en specificaties om te vermijden dat data opgesloten blijft in geïsoleerde systemen (silos) en dus niet kan stromen. Deze standaarden

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>moeten over verschillende organisaties en systemen werken.</p> <p>Het project realiseert een “publicatiestraat” om sensordata schaalbaar en kostenefficiënt te kunnen publiceren en delen. De open architectuur van de Vlaamse Sensor Data Space bestaat uit herbruikbare bouwstenen die inplugbaar zijn in diverse platformen.</p> <p>De Vlaamse Sensor Data Space Governance. (werkwijze, processen en regels om de interoperabiliteit te laten werken).</p> <p>Een ecosysteemwerking om de productierealisatie, adoptie en integratie iteratief te vergroten. De ecosysteemwerking spint zich uit over de verschillende actoren: de overheden, private sector en onderzoeksinstellingen.</p>
Outcome	<p>Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk verhogen doordat ze ontzorgd worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering en interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerk koppelingen en de bijhorende kosten gereduceerd. Bedrijven en integratoren van sensordata kunnen zich toeleggen op het ontwikkelen van waarde creërende toepassingen in plaats van op het telkens opnieuw verzamelen en toegankelijk krijgen van data.</p> <p>Het project zorgt voor een evenwaardige toegang tot data voor de actoren in het ecosysteem. Vendor lock-in van publieke instellingen wordt verholpen en de data-economie kan verder opengesteld worden voor andere spelers, wat een extra boost voor bedrijven en innovatie in Vlaanderen zal zijn. Dit komt de dienstverlening naar de burger ten goede.</p> <p>Het project realiseert een oplossing die kostenefficiënt en schaalbaar werkt.</p> <p>Het kostenefficiënt ter beschikking stellen en uitwisselen van data, zal nieuwe inhoudelijke datastromen mogelijk maken en zal de (overheids-) dienstverleningen verbeteren. Het zal leiden tot verhoogde investeringen in innovatie en tot verhoogde kennisopbouw omtrent data inzichten, bedrijfsprocessen, ...</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	- ICT-dienstenleverancier gegund conform overheidsopdrachten- Governance opgezet- Ontwikkeling gestart van Minimum Viable Product (MVP) basisbouwblokken VSDS publicatiestraat- GIPOD LDES gerealiseerd voor 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit'
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering.	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten.	2022 Q4	Op schema	
Eerste implementatie van de Vlaamse Sensor Data Space. Realisatie Minimum Viable Product (MVP) inzake ontwikkeling van de basisbouwblokken en standaarden tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 7 voor de VSDS publicatiestraat.	2022 Q4	Op schema	
De doorontwikkeling van de Vlaamse Sensor Data Space. Finaliseren van de MVP bouwstenen nodig voor hergebruik en opschaling tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 9 & ontwikkelen van bijkomende bouwstenen.	2023 Q4	Nog niet gestart	
De Vlaamse Sensor Data Space realiseert iteratief de onboarding van de domein use case 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit' (cfr. VV069).	2024 Q4	Op schema	GIPOD LDES gerealiseerd 2022 Q1. Verbeterde versie in mei 2022.
De Vlaamse Sensor Data Space realiseert de onboarding van een tweede use case in het domein water in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (cfr. VV032).	2024 Q4	Op schema	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
KPI.1 De eerste implementatie van de Vlaamse Sensor DataSpace wordt einde Q4 2022 opgeleverd. Deze opstelling realiseert de bouwstenen en standaard tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 7.	1 (= oplevering)	2022 Q4		
KPI.2 De doorontwikkeling van de Vlaamse Sensor DataSpace wordt gerealiseerd tegen 31 december 2023. Deze opstelling finaliseert de bouwstenen nodig voor hergebruik en opschaling tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 9.	1 (= oplevering)	2023 Q4		
KPI.3 De Vlaamse Sensor Data Space realiseert iteratief de onboarding van de domein use case 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit' (cfr. VV069).	1 (= onboarding)	2024 Q4		
KPI.4 De Vlaamse Sensor Data Space realiseert de onboarding van een tweede use case in het	1 (= onboarding)	2024 Q4		

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
domein water in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (cfr. VV032)				

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	8.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	8.500.000 EUR
Uitvoering VAK	2.458.000 EUR
Uitvoering VEK	1.029.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 7.000.000 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 1.500.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 oktober 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 oktober 2021. Projectdossier](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV069 - Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit](#)

[VV032 - Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen](#)

VV074 - VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fednot (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) en dus de notariskantoren CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) en dus de makelaars VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en dus de steden en gemeenten VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 en het relanceplan Vlaamse Veerkracht dat op 26 september 2020 goedgekeurd werd door de Vlaamse regering kiest duidelijk voor digitalisering als een speerpunt in innovatie.</p> <p>Zo wil de Vlaamse Regering de toegenomen mobiliteit op de Vlaamse vastgoedmarkt verder ondersteunen via doorgedreven digitalisering. Burgers en bedrijven verwerven en verkopen steeds vaker onroerend goed en verwachten daarbij dat de verschillende overheden sneller en laagdrempeliger dan vandaag relevante én correcte informatie over dat vastgoed kunnen verschaffen. Om de baten voor alle actoren binnen bereik te brengen, moet in het domein van vastgoedinformatie een data-snelweg worden aangelegd.</p> <p>Het voorliggend projectvoorstel omvat twee trajecten. Het eerste traject beoogt de ontwikkeling en uitrol en het beheer en de exploitatie van het vastgoedinformatieplatform waarbij een nieuwe informatiesnelweg in het domein van vastgoedinformatie wordt aangelegd. Het tweede traject zet in op het digitaliseren en doelgericht verbeteren van de kwaliteit van de aan het vastgoedinformatieplatform gerelateerde gegevensbronnen. Dit is cruciaal om op termijn alle voordelen van het platform te kunnen realiseren aangezien op heden minder dan 50% van de noodzakelijke gegevensbronnen volledig digitaal centraal beschikbaar zijn.</p> <p>Het projectvoorstel kwam tot stand op basis van een door Informatie Vlaanderen uitgevoerde haalbaarheidsstudie in opdracht van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB), de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en departement Omgeving (dOMG). De conclusies van deze haalbaarheidsstudie en het voorliggend projectvoorstel werd voorgelegd aan het Stuurorgaan Informatie en ICT beleid alsook goedgekeurd door de bestuursorganen van de vermelde partners en maakt deel uit van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.</p> <p>In de investeringsjaren 2021 – 2023 ligt de nadruk op het eerste traject waarbij de voorziene middelen in hoofdzaak worden aangewend voor de ontwikkeling en de uitrol van het platform. Om de meerwaarde van het platform binnen bereik te kunnen brengen wordt ook meteen het tweede traject opgestart waarbij inzake digitalisering van gegevensbronnen focus wordt genomen op het realiseren van een digitaal register met historische milieu- en vergunningsinformatie .</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit resulteert in een eerste versie van het vastgoedinformatieplatform dat volgens planning in productie gaat tegen einde Q3 2022. Tegen eind 2023 worden alle beoogde datadiensten en functionaliteiten via het platform aangeboden aan de partners en start de operationele fase waar de partners die informatie van het platform afhalen een betalende toegang krijgen tot het platform.

Informatie Vlaanderen zal instaan voor de ontwikkeling en uitrol van het vastgoedinformatieplatform. De projectsturing verloopt via een passende governance structuur waar de bovenvermelde partners via de projectstuurgroep kunnen toezien op de vorderingen en eventuele bijstellingen kunnen laten beslissen.

Vanaf 2024 wint het tweede traject duidelijk aan belang. Daarbij wordt ingezet op een versnelde digitalisering en verdere kwaliteitsverbetering van de aan het platform gerelateerde gegevensbronnen. In het eerste traject komt vanaf 2024 de nadruk te liggen op exploitatie, beheer en doorontwikkeling.

De realisatie van het platform en de versnelde digitalisering van de gegevensbronnen brengt significante baten met zich mee voor alle partners. De gebruikers die gegevens afhalen van het platform ondervinden duidelijk meetbare efficiëntiewinsten in termen van kost en doorlooptijd in vergelijking met de huidige situatie. De bronbeheerders en de lokale besturen in het bijzonder zullen dankzij het platform via 1 uniforme en digitale weg benaderd worden voor het verstrekken van vastgoedinlichtingen.

De totale investeringskost van het platform bedraagt 9 954 keuro . Via het relancefonds prefinanciert de Vlaamse Regering 8 590 keuro. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat prefinanciert 954 keuro. In de investeringsfase is er ook al opstart van het tweede traject rond digitalisering en kwaliteitsverbetering van gegevensbronnen voorzien waarbij focus genomen wordt op een optimalisatietraject voor het register van stedenbouwkundige inlichtingen en een referentie register voor milieu informatie. De Vlaamse regering voorziet hiervoor een bijkomende investering 410 keuro aanvullend op de prefinanciering om het register breed inzetbaar te maken voor overheden in Vlaanderen, ook buiten de scope van het vastgoedinformatieplatform.

Het bedrag van de prefinanciering (8 590 keuro vanuit de Vlaamse Regering en 964 keuro vanuit de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat wordt vanaf 2024 en binnen de 5 jaar volledig terugbetaald door de gebruikers van het platform op basis van het financieel plan opgenomen in deze nota. Een passend decretaal kader daartoe wordt tijdig voorgelegd aan het Vlaams parlement en verankert het financieringsmodel en het engagement van alle partners in dit platform.

Van de 8 590 keuro aan middelen die op deze manier tussen 2024 en 2028 terugvloeien naar de Vlaamse overheid wordt 5 900 keuro geherinvesteerd in het tweede traject om op die manier de noodzakelijke digitalisering en de gerichte kwaliteitsverbetering van de betrokken gegevensbronnen te versnellen. De resterende 2 690 keuro vloeit terug naar de algemene middelen en is het resultaat van de directe economische return van het platform.

Het voorliggend project raakt op geen enkele wijze aan de bestaande gemeentelijke retributies voor het verstrekken van vastgoedinlichtingen. Dit blijft de autonome bevoegdheid van de lokale besturen.

Doelstellingen

Het deelplatform vastgoedinformatie is de oplossing voor het vlot en efficiënt digitaal uitwisselen van alle vastgoedinlichtingen tussen overheden en vastgoedmakelaars, notarissen en burgers.

Het deelplatform vastgoedinformatie werkt de onderliggende complexiteit van de huidige manier van werken weg. Aanvragers kunnen via één kanaal en - indien gewenst - vanuit de eigen dossiertoeepassingen authentieke en officiële inlichtingen digitaal opvragen en aangeboden krijgen en de verkregen gestructureerde data rechtstreeks in dossiertoeepassingen verwerken.

PROJECTOMSCHRIJVING

Ook bronhouders hebben hierbij het voordeel dat alle aanvragen via één kanaal ontvangen en beantwoord kunnen worden, waarbij reeds verstrekte inlichtingen hergebruikt kunnen worden voor toekomstige aanvragen.

Het verhogen van datakwaliteit en -interoperabiliteit bij achterliggende gegevensbronnen is een essentiële en noodzakelijke voorwaarde om aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinlichtingen naar de toekomst toe sneller te kunnen afhandelen en beantwoorden. De lange termijn ambitie van het vastgoedplatform bestaat erin om een aanvraag ten laatste “next business day” af te handelen. Om deze doelstelling op termijn binnen bereik te brengen, zijn structurele ingrepen op de onderliggende data vereist. Door in te zetten op Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) en op kwalitatieve koppelingen met de Vlaamse basisregisters (adres, gebouw) en de Vlaamse basiskaart en door gestructureerde data in te winnen in het proces waar ze ontstaan (zoals bijvoorbeeld in lokale besluiten) kunnen manuele tussenkomsten en interpretaties in de afhandeling van aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinlichtingen in de toekomst tot een minimum beperkt worden.

Door het vermijden dat dezelfde informatie meermaals wordt opgevraagd, te onderzoeken welke informatie in welk proces nodig is en het implementeren van automatische dossieropvolging zorgen we voor de verlaging van administratieve lasten en procesoptimalisatie.

De rol van de lokale overheden is in de totstandkoming van het vastgoedinformatieplatform erg belangrijk omdat zij in vele gevallen bronbeheerder zijn en daarnaast ook instaan voor de kwaliteitscontrole op informatiebronnen die een interpretatie van de lokale context behoeven.

Er is een verdere digitalisering en groeipad mogelijk waardoor de administratieve lasten in het kader van de verkoop nog verder dalen, wat zowel de bronhouders als de professionele actoren (makelaars, notarissen) ten goede komt.

Ten slotte is reeds gesteld dat het deelplatform vastgoedinformatie ook de burgers in de mogelijkheid wil brengen om nog meer inzicht en transparantie te krijgen in de gegevens die de overheid heeft over haar of zijn grond of woning. Door het deelplatform vastgoedinformatie te koppelen aan initiatieven zoals de woningpas en Mijn Burgerprofiel, brengen we de burger meer in controle over zijn gegevens.

Algemene baten

Uit de voordelen die het platform oplevert voor de Vlaamse overheid en haar partners volgen enkele algemene baten:

- * Snellere afhandeling van het volledige dossier voor de verkoop, waarbij een daling van 30 % gerealiseerd kan worden door het afleveren van vastgoedinlichtingen op 1 dag.
- * Doorgedreven digitalisatie waardoor geïnteresseerde kopers van vastgoed meer zekerheid hebben over termijnen waarbinnen de verkoop kan geformaliseerd en tegenstelbaar aan derden kan worden gemaakt,
- * Sneller schakelen en aanpassingen zijn mogelijk dankzij dossierautomatisatie
- * Daling van de administratieve lasten
- * Realiseren van procesoptimalisatie
- * Aanbieden en gebruiken van gestructureerde data
- * Kosteneffectiviteit door een gezamenlijke investering
- * Het ter beschikking komen van kwalitatieve basis data i.v.m. grondgebonden gegevens die het mogelijk zal maken een aantal dienstverleningen van de overheid te optimaliseren

Te realiseren kostenbesparing in de dossierbehandeling

- * Een eerste conservatieve schatting leert dat per opvraging van vastgoedinlichtingen minstens 75 euro kan worden bespaard in de behandeling van het dossier door de gebruiker van het platform:
- * Een besparing van 25 € bij de aanvraag (30 min)
- * Een besparing van 50 € bij de verwerking (1 uur)

PROJECTOMSCHRIJVING

* Dit komt neer op minimaal 10 miljoen euro aan kostenbesparing op jaarbasis op basis van 130.000 aanvragen.

Te realiseren kostenbesparing bij de bronhouders en lokale besturen

* Ook bij de bronbeheerder en de lokale overheden kan het platform door de gecoördineerde aanpak zorgen voor een kostenbesparing, met name door het hergebruik van informatie op het platform wat resulteert in het niet meer aanbieden van identieke aanvragen, binnen de geldigheidsduur van de verstrekte informatie. Ook de geautomatiseerde afhandeling van aanvragen inclusief facturatie zorgt voor een efficiëntiewinst. Verderop in de nota wordt dieper ingegaan op de baten voor de lokale besturen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	9.000.000 EUR
Output	Digitaal vastgoedplatform.
Outcome	Snellere aflevering dossiers: Aantal opgeleverde vastgoeddossier via het digitaal platform met 30% van de informatierubrieken binnen 1 dag; efficiënte aflevering dossiers: 75 Euro besparing x 75 Euro per dossier

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De ontwikkeling van het vastgoedinformatieplatform is op schema. De basisversie van het platform wordt in productie gesteld in september 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart van de backend ontwikkeling zomer 2021, vanaf oktober 2021 wordt elke maand een publieke demo van de voortgang voorzien.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Oplossingsarchitectuur is opgesteld in samenwerking met de partners en gevalideerd door het bestuurscomité.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Kandidaat OSLO standaard is gevalideerd door het stuurorgaan voor ICT en informatie, public review periode is gestart.	2021 Q3	Gerealiseerd	
In productiestelling van de basisversie : er worden aanvragen op het platform gedaan, er worden gegevens van centrale bronnen opgehaald en aangevuld vanuit een gemeentelijk systeem. Het antwoord wordt verstuurd naar de aanvrager.	2022 Q3	Op schema	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
In productiestelling van de betalende versie van het platform : De volledige functionaliteit zoals beschreven in de business case is gerealiseerd. De bronnen zijn aangesloten. De gemeentelijke systemen zijn aangesloten. Alle gemeenten beantwoorden de vraag via het platform. Alle aanvragen voor vastgoedinlichtingen verlopen via het platform.	2024 Q1	Nog niet gestart	
Het doel is om binnen het jaar na de betalende toegang – einde 2024 – reeds 30 % van de informatierubrieken binnen de dag afgehandeld te hebben. Het aandeel van de informatierubrieken die binnen de dag afgehandeld wordt, zal jaarlijks stijgen tot er maximaal 10 % van de informatierubrieken niet binnen de dag afgehandeld wordt. Dit omwille van dossiers waar geen informatie over bestaat of complexe interpretaties die terrein onderzoek vragen.	2024 Q4	Nog niet gestart	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vastgoedplatform 100% opgeleverd.	Alle steden en gemeenten aangesloten op het vastgoedplatform	2024 Q1		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.096.000 EUR
Uitvoering VEK	2.364.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 7.400.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

[VR 19 maart 2021 - ontwikkeling, uitrol en beheer en exploitatie van het Vlaams Vastgoed Informatie Platform](#)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	*Mestbankloket : landbouwers, mestvoerders, mest be-/verwerkers, kunstmesthandelaren, veevoederfabrikanten en producenten andere meststoffen *loket landinrichting : eigenaars, bewoners en gebruikers, lokale besturen, leden van projectorganen en de landcommissies

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het project MAP6 en datawarehouse bestaat uit 3 deelprojecten :</p> <p>1. Versnellen van de aanpassingen en ontwikkeling van toepassingen voor de nieuwe processen van MAP6 Met het 6de Mestactieplan ambieert Vlaanderen een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het 6de Mestactieplan (MAP 6) bevat hierbij fundamenteel nieuwe en gewijzigde processen die op IT-vlak belangrijke investeringen vragen, noodzakelijk om de complexe regelgeving te implementeren. De VLM ondersteunt sinds jaren de sector bij de implementatie van de mestactieplannen door steeds maatwerk per bedrijf/perceel te leveren. Landbouwers, mestvoerders, en alle aanverwante bedrijven kunnen hun aangiften/aanvragen volledig digitaal afhandelen en meteen nagaan of ze in regel zijn, en/of aanpassingen noodzakelijk zijn. Een versnelde digitale implementatie van de MAP6 maatregelen bevordert de opvolging en uitvoering van deze maatregelen. Dit zal dan ook een positieve impact hebben op het milieu.</p> <p>2. Nieuw datawarehouse voor de Mestbank Om haar kerntaken te kunnen uitvoeren moet de Mestbank zelf op een vlotte, eenduidige manier aan zo goed als al haar gegevens kunnen. Data en dataverwerking zullen in de toekomst nog meer aan belang winnen voor dossieropvolging, het genereren van risicoanalyses voor gerichte handhaving en doorlichtingen, kwaliteitsbewaking, communicatietrajecten, ... De belangrijkste doelen van het datawarehouse zijn : -een duidelijk gestructureerd datawarehouse waarbij het voor de gebruikers duidelijk is welke data ze waar kunnen terugvinden. -Opvolgbaarheid van het gebruik van de verschillende onderdelen van het datawarehouse -Integratie van andere databronnen dan de Mestbank databank -Integratie met moderne tools voor data-analyse (vb. SharePoint, Power-BI, ...)</p> <p>3. Loket Landinrichting De afdeling 'Landinrichting en Grondenbank' is 1 van de 3 kernafdelingen binnen de Vlaamse Landmaatschappij. De activiteit 'Landinrichting en Grondenbank' focust zich voornamelijk op het inrichten van de open ruimte in Vlaanderen zodat omwonenden en gebruikers er wel bij varen. Tijdens het uitvoeren van de processen met de hierbij horende beschikbare instrumenten gebeurt er veel onderlinge communicatie met de belanghebbenden. Het loket landinrichting zal bestaan uit volgende 3 onderdelen :</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

- Een digitale brievenbus zal er voor zorgen dat alle gerichte onderlinge 'persoons- en/of bedrijfsspecifieke' communicatie digitaal aan onze externe klanten kan bezorgd worden.
- Een interactieve tool en opvolgingssysteem voor projectopvolging. Het aanbieden van een hedendaagse digitale tool voor de belanghebbenden die betrokken zijn in grote herverkavelingsprojecten (projectadministratie) zal de onderlinge communicatie optimaliseren. In deze tool zullen alle procesmatige documenten ter inzage worden gelegd én kan de belanghebbende in interactie gaan met de VLM (bezwaren en wensen toedeling). Bovendien kunnen de belanghebbenden hier het volledige proces (stand van zaken) van het project opvolgen
- Een vergoedingenloket en -databank. Het uitwerken van een vergoedingenloket en een vergoedingendatabank zal er voor zorgen dat de aanvrager van een vergoeding zijn aanvraag digitaal kan indienen (loket) en dat de betrokken VLM'ers, de leden van de landcommissies en andere Vlaamse overheidspartners efficiënt en gestructureerd kunnen werken aan vergoedingendossiers via een goed werkende backoffice (databank).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.450.000 EUR
Output	100% digitale aangifte van kunstmestgegevens en debietmeters aantal afgewerkte IT-projecten in het kader van MAP6 Beschikbaarheid van nieuw datawarehouse aantal digitale communicaties met de betrokkenen ivm inrichtingsprojecten aantal digitale aanvragen voor vergoedingen ikv het instrumentendecreet
Outcome	Betere waterkwaliteit door een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw Betere opvolging en uitvoering van de maatregelen opgelegd door MAP6 Maximale digitale communicatie en online projectopvolging door betrokkenen in het kader van inrichtingsprojecten Digitale loket voor aanvragen van vergoedingen en het opvolgen hiervan.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De ontwikkeling van MAP6 toepassingen loopt. TOMAS en kunstmestregister en debietmeters zijn opgeleverd. De analyse van het nieuw boetprogramma is opgeleverd. De analyse van de bezwaarmodule is lopende. De implementatie van de module handhaving in de TereinOpvolgingsApplicatie is gestart (de module bedrijfsdoorlichting is reeds opgeleverd). De de conceptuele analyse van het nieuw datawarehouse loopt en zal opgeleverd worden Q2 2022. De aanbesteding voor de ontwikkeling van loket landinrichting zal in Q2 2022 toegewezen worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
conceptuele analyse datawarehouse	2021 Q4	Vertraging	Conceptuele analyse is lopende. Timing bijgesteld naar Q2 2022.
MAP6 :oplevering toepassingen maatregelen (TOMAS),kunstmestregister en debietmeters	2021 Q4	Gerealiseerd	
oplevering datawarehouse	2023 Q4	Nog niet gestart	Wordt opgestart na oplevering conceptuele analyse
MAP6 :oplevering toepassingen boetes, bezwaarmodule en uitrijtool	2023 Q4	Op schema	Analyse van boetes afgerond. Analyse van bezwaarmodule loopt
MAP6 :oplevering toepassingen terreinopvolgingsapplicatie (TOA) en staalnames (SNAPP en SMIL)	2023 Q4	Op schema	TOA : module bedrijfsdoorlichting opgeleverd. de ontwikkeling van de module handhaving is gestart.
oplevering loket landinrichting	2024 Q4	Op schema	Toewijzing implementatie voorzien in Q2 2022. Start van implementatie in Q1 2023.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
digitale aangifte van kunstmestgegevens en debietmeter	100%	2022 Q4		100 %
Beschikbaarheid van nieuw datawarehouse	1	2024 Q4		
aantal afgewerkte IT-projecten in het kader van MAP6	8	2024 Q4	3	38 %
Vergoedingsaanvragen verlopen digitaal na inwerkingtreding LOLA		2025 Q4		
Communicatie met belanghebbenden in inrichtingsprojecten verloopt digitaal na inwerkingtreding LOLA		2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.450.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.450.000 EUR
Uitvoering VAK	843.000 EUR
Uitvoering VEK	584.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 2.450.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 5 maart 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 26 november 2021. Versnelde digitalisering MAP6 en ontwikkeling van een datawarehouse - Ontwikkeling Digitaal Loket Landinrichting](#)

VV076 - ZELFBEHEERDE IDENTITEIT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle Vlaamse entiteiten, lokale besturen en ondernemingen die gebruik maken van de persoonlijke gegevens alsook de personen in kwestie zelf.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Vanuit het relanceplan “Vlaamse Veerkracht 2020” wordt ingezet op het versterken van het vertrouwen van de burger in de data-economie waarbij burgers zelf controle hebben over data zodat ze die vlotter en veiliger kunnen delen en zo een zelfbeheerde digitale identiteit kunnen creëren. Het relanceproject VV076 “Zelfbeheerde Identiteit” maakt deze ambitie concreet met de ontwikkeling van een sterke Vlaamse data-economie als uitgangspunt.

Vlaamse burgers worstelen met de data paradox: ze houden enerzijds van het gebruiksgemak die datagedreven diensten hen bieden maar anderzijds is er bij veel Vlamingen weerstand door de intransparantie waarmee ‘big tech’ bedrijven omgaan met hun persoonlijke data. Door het uitbouwen van een innovatief platform voor persoonlijke datakluisen gebaseerd op de wereldwijde Solid-standaard, wordt deze paradox overbrugd.

De persoonlijke datakluis versterkt de privacy van de burger en zal ertoe leiden dat persoonsgegevens digitaal veiliger en met een grotere transparantie en bewustzijn gedeeld kunnen worden terwijl bedrijven kunnen focussen op nieuwe businessmodellen op basis van deze data die in lijn met GDPR beschikbaar komt. Voor de Vlaamse data-economie betekent dit een belangrijke verlaging van drempels op niveau van ondermeer kosten en doorlooptijd.

Hiermee wordt bovendien toekomstgericht ingezet op de Europese digitale identiteit, een kader dat de Europese Commissie uitwerkt om alle burgers, ingezetenen en bedrijven in de EU hun identiteit digitaal te laten bewijzen en elektronische documenten vanuit een persoonlijke datakluis te laten delen. Door gebruik te maken van het platform voor persoonlijke datakluisen kunnen Vlaamse bedrijven zich volop voorbereiden op de komst van deze nieuwe verordening.

Een eerste toepassing van deze persoonlijke datakluisen wordt binnen dit project uitgewerkt en laat een burger toe het domicileeladres en contactgegevens in zijn persoonlijke datakluis op te laden en na toestemming ter beschikbaar te stellen aan derden. Bedrijven die van deze data gebruik willen maken, kunnen de geldigheid en juistheid ervan verifiëren. Het project bepaalt eveneens de regels en afspraken voor de deelnemers aan dit nieuwe data-ecosysteem.

De operationele doelstellingen voor dit project zijn als volgt gedefinieerd:

- 1) Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluisen in een Software-as-a-Service (SAAS) aanbod, inclusief GDPR-compliant infrastructuur, hosting, licenties en servicemanagement (vanaf Q1 2022)
- 2) Derde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis – na toestemming van de

PROJECTOMSCHRIJVING

burger - een manier aanbieden waarbij die partijen de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (vanaf Q2 2022)

3) Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case waarbij de burger data kan opladen in zijn persoonlijke kluis (bv. domicilie adres, contactgegevens) en na toestemming ter beschikbaar kan stellen aan derden (Q4 2022)

4) Opschalen van het Solid ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden door middel van het aansluiten van nieuwe use cases en het hergebruik van de persoonlijke datakluisen (vanaf Q2 2022)

De ontwikkeling en het operationeel beheer van dit platform voor persoonlijke datakluisen wordt opgenomen vanuit het op te richten Vlaams Datanutsbedrijf (relanceproject VV061), verwacht in het tweede kwartaal 2022.

Om deze operationele doelstellingen te realiseren werden een aantal projectonderdelen uitgewerkt.

Deze bevinden zich op verschillende niveau's. Er wordt stelselmatig toegewerkt naar het realiseren van een innovatief platform voor persoonlijke datakluisen. Als eerste stap moet er een GDPR-compliant platform ter beschikking zijn en worden de servicemanagement processen ingericht. Ondertussen lopen er business cases die met een aantal stakeholders de eerste use case definiëren. Deze zijn beschreven in het businessplan van het Vlaamse Datanutsbedrijf. Na een initiële opzet is het de bedoeling om middels implementatie van bijkomende use cases het totale aantal gebruikers tegen einde 2024 op te schalen tot 1 miljoen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.000.000 EUR
Output	Digitaal platform van persoonlijke datakluisen op basis van de SOLID specificatie
Outcome	1) Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluisen in een Software-as-a-Service (SAAS) aanbod, inclusief GDPR-compliant infrastructuur, hosting, licenties en servicemanagement (vanaf Q1 2022) 2) Derde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis – na toestemming van de burger - een manier aanbieden waarbij die partijen de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (vanaf Q2 2022) 3) Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case waarbij de burger data kan opladen in zijn persoonlijke kluis (bv. domicilie adres, contactgegevens) en na toestemming ter beschikbaar kan stellen aan derden (Q4 2022) 4) Opschalen van het Solid ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden door middel van het aansluiten van nieuwe use cases en het hergebruik van de persoonlijke datakluisen (vanaf Q2 2022)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	* SOLID in een SAAS aanbod, inclusief GDPR compliant infrastructuur, hosting, licenties & servicemanagement in voorbereiding * 2 SOLID use cases in ontwikkeling
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Dit project werd goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 26 november 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluisen in een SAAS aanbod.	2022 Q2	Vertraging	Ontwikkeling & exploitatie voor persoonlijke datakluisen in een SAAS aanbod, inclusief GDPR compliant infrastructuur, hosting, licenties & servicemanagement beschikbaar vanaf Juni 2022. Reden vertraging: Vertraging op contractuele en organisatorische maatregelen rond het gebruik van niet EU SaaS conform AVG en met aandacht voor schrems 2 arrest.
Derde partijen een manier aanbieden om geldigheid en correctheid van data te kunnen verifiëren.	2022 Q2	Op schema	Een manier aanbieden waarbij 3rde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (verifiable credential / attestation service topic). Concept & module bestaat, implementatie via use cases.
Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case.	2022 Q4	Op schema	
Opschalen ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden.	2022 Q4	Op schema	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Op schema	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.683.000 EUR
Uitvoering VEK	1.987.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 3.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 700.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 26 november 2021. Zelfbeheerde identiteit](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV061 - Datanutsbedrijf](#)

14. Culturele infrastructuur

VV077 - BELFORT AALST

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatieproject voor het Aalsterse Belfort ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het gebouw en de uitbouw van een permanente museale werking. De totale projectkost wordt geraamd op 2 mio euro. Het Departement CJM subsidieert tot 60% van de voorziene werken met relancemiddelen, tot een maximum van 1,093 mio euro. De toekenning van de investeringssubsidie is voorzien in 2021, de opstart van het beheersplan en restauratiedossier in 2022. De uitvoering van de restauratie zal plaatsvinden in de periode 2023-2025.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.093.000 EUR
Output	Herbestemming van het Aalsterse Belfort tot publiek toegankelijk (stads)museum.
Outcome	Het Belfort wordt omgevormd tot een hedendaags (stads)museum waardoor het Belfort meer bezoekers kan ontvangen in een hedendaagse context. De focus ligt op een verhoging van het aantal bezoekers, een verbeterde aantrekkelijkheid ...

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De investeringssubsidie aan Stad Aalst voor de renovatie en de publieksopenstelling van het Belfort in Aalst werd toegekend na beslissing van de Vlaamse Regering op 14 januari 2022. De opmaak voor het bestek van de ontwerpopdracht is in uitvoering en wordt in de zomer van 2022 gepubliceerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding studiefase ontwerper	2021 Q4	Vertraging	De opmaak voor het bestek van de ontwerporder is in uitvoering en wordt in de zomer van 2022 gepubliceerd.
Gunning studiefase ontwerper	2022 Q1	Vertraging	De opmaak voor het bestek van de ontwerporder is in uitvoering en wordt in de zomer van 2022 gepubliceerd.
Toekenning investeringssubsidie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Opmaak definitief ontwerp	2023 Q2	Nog niet gestart	
Opmaak beheersplan en restauratiedossier	2023 Q4	Op schema	
Aanbesteding werken (fase 1)	2023 Q4	Nog niet gestart	
aanbesteding Renovatiewerken (fase 2)	2025 Q1	Nog niet gestart	
Oplevering van het project (concrete planning onder voorbehoud).	2025 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.093.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.093.000 EUR
Uitvoering VAK	1.092.000 EUR
Uitvoering VEK	252.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.093.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VV078 - CULTUURHUIS BLANKENBERGE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project omvat de bouw van een nieuw cultuurhuis, incl. theaterzaal met een capaciteit voor 400 personen en een polyvalente zaal voor expo's en clubconcerten. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 9 miljoen euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 3 miljoen euro in kader van de relancemaatregelen.

Het initiële projectvoorstel werd eind 2021 door de lokale overheid stopgezet. De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur heeft hierop beslist om de relancemiddelen die voor dit project ter beschikking waren gesteld opnieuw vrij te maken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	De bouw van een nieuw cultuurhuis.
Outcome	Een nieuw cultuurhuis wordt gebouwd om een nieuwe hedendaagse productie- en presentatieplek te realiseren waardoor culturele actoren een plek kunnen krijgen en er producties en evenementen kunnen gehost worden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Actie nodig
Beschrijving voortgang	Het initiële projectvoorstel voorzag in een nieuw cultuurhuis voor de stad Blankenberge. Het gemeentebestuur communiceerde in het najaar van 2021 om de middelen aan te wenden voor een project met een andere (niet-culturele) invulling. De toekenning van de investeringssubsidie aan gemeente Blankenberge werd daarom stopgezet, nadat beslist werd om het initiële projectvoorstel niet verder uit te voeren. Het gemeentebestuur kon geen alternatief project voorleggen dat voldoet aan de bestedingsvoorschriften inzake relancemiddelen. De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur heeft hierop beslist om de relancemiddelen die voor dit project ter beschikking waren gesteld opnieuw vrij te maken. De minister zal weldra beslissen wat er met de vrijgekomen middelen zal gebeuren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanstellen ontwerper	2021 Q4	Vertraging	
Toekennen investeringssubsidie	2022 Q1	Stopgezet	De toekenning van de investeringssubsidie aan gemeente Blankenberge werd stopgezet, nadat beslist werd om het initiële projectvoorstel niet verder uit te voeren. Het gemeentebestuur kon geen alternatief project voorleggen dat voldoet aan de bestedingsvoorschriften inzake relancemiddelen.
Opmaak ontwerp	2022 Q4	Nog niet gestart	
Aanbesteding van de werken is gebeurd	2023 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering project	2026 Q2	Nog niet gestart	
Uitvoering werken is gestart	2026 Q2	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV079 - DESINGEL ANTWERPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	DeSingel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Als eigen cultuurinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap wordt er in het kader van de relance de komende jaren ook extra geïnvesteerd in de verdere renovatie van deSingel. De verbindende wandelgangen bieden een mooi uitzicht op het geheel van de kunstsites en de diverse fases waarin ze gerealiseerd zijn. Wie de blik naar binnen richt, wordt echter geconfronteerd met een interieur dat na veertig jaar een grondige vernieuwing nodig heeft. Een aantal foyerruimtes, concertzalen en wandelgangen zullen dan ook grondig gerenoveerd worden. De studieopdracht start in 2021 en de realisatie van werken start in 2022. De investering vanuit relancemiddelen bedraagt 1,65 miljoen. De totale projectkost wordt geraamd op 3,7 miljoen euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.650.000 EUR
Output	Via een investeringsbudget van 1,65 miljoen worden extra middelen vrijgemaakt voor deze noodzakelijk renovatie: de wandelgangen, aantal foyerruimtes en concertzalen.
Outcome	deSingel wordt opnieuw een toonaangevende hedendaagse kunstsites incl. een hedendaagse productie- en presentatieplek, waardoor het huis aan zowel gebruikers, gezelschappen als bezoekers een hedendaagse kunstervaring kan aanbieden in een grootstedelijke context. Specifiek zullen de gerenoveerde wandelgangen en foyerruimtes van deSingel de bestaande ruimtes opnieuw integraal verbinden..

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De studieopdracht ging eind januari 2022 van start en duurt tien maanden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart aanbesteding studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringsbudget	2021 Q2	Gerealiseerd	
Gunning studieopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opstart studie door studiebureau	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering studie	2022 Q4	Op schema	
Opstart aanbesteding renovatiewerken	2022 Q4	Nog niet gestart	
Gunning renovatiewerken	2023 Q2	Nog niet gestart	
Opstart renovatiewerken door aannemer	2023 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering renovatie	2024 Q2	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.650.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.650.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.650.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De site 'Groeningeabdij' te Kortrijk wordt een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingssite in Kortrijk met beeldende kunst als motor en met identiteit als centraal thema op een historisch uitzonderlijke erfgoedlocatie.

Het wordt een hybride mix van een kunsthall, een museum en een plek voor de hele stad als bruisende ontmoetingsplaats. De studieopdracht is reeds gestart en de werken zullen opstarten in het voorjaar van 2022. Het gebouw zal in gebruik genomen worden vanaf 2024.

De totale projectkost is €12.500.000. Vanuit de relanceprovisie wordt 7.500.000 euro (60%) vrijgemaakt.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	7.500.000 EUR
Output	Door een investering van investeringssubsidie van 7,5 wordt de Groeningeabdij omgevormd tot een innovatieve tentoonstellingssite in Kortrijk
Outcome	De komst van een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingssite in Kortrijk moet zorgen voor een bruisende ontmoetingsplaats in een hedendaagse context.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het ontwerpteam werkt het aanbestedingsdossier verder uit.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gunning studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Start studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering studie	2022 Q2	Op schema	
Aanbesteding werken	2022 Q2	Op schema	
Uitvoering van de werken	2022 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2024 Q1	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	7.500.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

In de periode 2021-2022 is er in totaal 7.000.000 euro uit de relancemiddelen beschikbaar voor het verlenen van investeringssubsidies voor grote cultuurinfrastructuur, met een werking die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer. Het doel is om meervoudig en hedendaags gebruik van performante, veilige en milieuvriendelijke culturele infrastructuur in Vlaanderen voor allerlei makers en gebruikers te stimuleren.

In 2021 en 2022 wordt voor dit reguliere beleidsinstrument bijkomend budget voorzien zodat de uitvoering van een aantal geplande projecten kan versnellen met deze financiële ondersteuning.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	7.000.000 EUR
Output	Via het toekennen van één of meer investeringssubsidies voor grote culturele infrastructuur wordt de grote cultuurinfrastructuur in Vlaanderen gerenoveerd en/of gerestaureerd met het oog op meervoudig en hedendaags gebruik. De precieze output is afhankelijk van ingediende projectvoorstellen die een investeringssubsidie ontvangen.
Outcome	Er wordt geïnvesteerd in performante, veilige en milieuvriendelijke culturele infrastructuur van uitzonderlijke omvang (infrastructuur die zich richt tot de Vlaamse gemeenschap en ruimer); voor alle makers en gebruikers in een hedendaagse context.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De administratie ontving negen projectvoorstellen voor de ronde 2021. Op 14/01/2022 keurde de Vlaamse Regering drie investeringssubsidies grote culturele infrastructuur goed voor volgende projecten: - Predikherenkerk - Culturele Hub (Mechelen), € 2.000.000,00

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<ul style="list-style-type: none"> - Cultuursite Mechelen, € 1.996.634,31 - Design Museum Gent - Vleugel 1992 wordt vleugel 2024, € 1.285.924,02 <p>Op 15 mei werden de aanvragen ingediend voor de ronde 2022, de administratie van het Departement CJM is gestart met het adviesproces voor de ingediende voorstellen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Indienen aanvragen investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Principiële beslissing en advies IF	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidies (BVR) dossiers 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Indienen aanvragen investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	
Uitvoeren werken Design Museum Vleugel 1992	2022 Q3	Nog niet gestart	
Aanbesteding uitvoering werken Predikherenkerk Mechelen	2022 Q3	Op schema	
Aanbesteding studiefase Cultuursite Mechelen	2022 Q3	Op schema	
Principiële beslissing en advies IF Grote culturele infrastructuur 2022	2022 Q3	Nog niet gestart	
Uitvoeren werken Predikherenkerk Mechelen	2022 Q4	Nog niet gestart	
Toekenning investeringssubsidies (BVR) dossiers 2022	2022 Q4	Nog niet gestart	
Aanbesteding uitvoering werken Cultuursite Mechelen	2023 Q1	Nog niet gestart	
Voorlopige oplevering werken Design Museum Gent.	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering werken Predikherenkerk Mechelen	2024 Q1	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG**MIJLPALEN**

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitvoering werken Cultuursite Mechelen: uitvoering 'Cultuursite fase 1'	2024 Q2	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.283.000 EUR
Uitvoering VEK	1.057.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 7.000.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Literatuur Vlaanderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De restauratie en de renovatie van het Hotel Dumont in Antwerpen heeft als doel het realiseren van een semi-publiek 'Huis van de Letteren', waarin zowel Literatuur Vlaanderen als Iedereen Leest hun intrek zullen nemen in het kader van een geïntegreerd letterenbeleid in Vlaanderen. Op het binnenplein zal bijkomend een nieuwbouwpaviljoen worden gerealiseerd. De werken werden ondertussen twee keer aanbesteed, maar de aanbestedingsprijzen blijken hoger te liggen dan oorspronkelijk geraamd, vandaar dat er bijkomend budget wordt gevraagd. Via de relancemaatregelen werd een bijkomende financiering van 750.000 euro toegekend om het project haalbaar te houden. Totale kostprijs van het project: 3.520.000 euro incl. BTW (reeds goedgekeurde investeringsubsidies van FoCI voor een bedrag van 950.000 euro).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	750.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 750.000 euro wordt het renovatiebudget van Hotel Dumont als nieuwe thuishaven voor Literatuur Vlaanderen en Iedereen Leest dicht gereden. Daardoor kan het bouwproject gerealiseerd worden.
Outcome	Realisatie van een semi-publiek 'Huis van de Letteren' door de renovatie van het Hotel Dumont en de bouw van een nieuwbouwpaviljoen met literaire tuin op het binnenplein. Hierdoor ontstaat een nieuwe culturele infrastructuur die literaire activiteiten kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De werken omtrent de restauratie en renovatie van Hotel Dumont en de bouw van het nieuwbouwpaviljoen op het binnenplein zijn opgestart in maart 2021. De voorlopige oplevering van de werken is gepland voor eind 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oplevering renovatie hotel Dumont en nieuwbouw in binnengebied	2022 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	750.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	750.000 EUR
Uitvoering VAK	750.000 EUR
Uitvoering VEK	750.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 750.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV083 - INVENTARIS CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele en jeugdsector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.

Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken

De inventaris brengt de cultuur- en jeugdinfrastructuur in kaart via een omvattende databank, met een uitbreidbare set relevante gegevens. Deze informatie wordt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media aangewend om een overzicht te krijgen over de bestaande infrastructuur. Dit enerzijds voor de toetsing van toekomstige aanvragen voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur. Anderzijds voor analyse en de opmaak van een periodieke landschapstekening van de cultuur- en jeugdinfrastructuur om zicht te krijgen op lacunes, noden en dynamieken met het oog op de ontwikkeling en actualisering van beleid. De dataset wordt volgens de principes van open data door het Departement CJM publiek beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in overleg met de sectoren onderzocht welke noden en/of opportuniteiten er momenteel zijn omtrent infrastructuurgegevens (bijvoorbeeld naar gedeeld gebruik ...) en op welke manieren deze ontsloten kunnen worden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	600.000 EUR
Output	Een omvattende databank van de cultuur- en jeugdinfrastructuur
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - toetsing van aanvraagdossiers voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur - overzicht en data over de bestaande infrastructuur als input voor analyse en beleidsondersteuning - tegemoet komen aan kennis- en informatienoden bij de cultuur- en jeugdsector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het voorbereidend onderzoek voor de inventarisatie liep enige vertraging op, maar werd op 8 april 2022 opgeleverd. Eind Q2 2022 werd een nieuwe projectleider aangesteld. Hij ging ondertussen van start met de opmaak van het bestek en de aanbesteding voor implementatie en dit in samenwerking met de externe functionele analist die bij de voorstudie betrokken werd.</p> <p>In samenwerking met relance-project "VV072 Doelgericht digitaal transformeren" werd in de periode 12/2021-05/2022 een OSLO-traject voor standaardisatie doorlopen. Het hieruit resulterende model gaat bij de start van Q3 2022 in publieke review en zal de basis vormen voor de implementatie van de inventaris.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart voorbereidend onderzoek inventarisatie cultuur- en jeugdinfrastructuur	2021 Q2	Gerealiseerd	
Afronding voorbereidend onderzoek en bepaling van eventuele nodige tussenstappen/mijlpalen voor uitvoering	2022 Q2	Gerealiseerd	Het finale rapport werd opgeleverd op 8 april 2022.
Lancering bestek en afronding aanbestedingsprocedure voor implementatie	2022 Q3	Op schema	De nieuw aangestelde projectleider is eind Q2 2022 van start gegaan met de opmaak van een bestek en aanbesteding voor implementatie. Dit gebeurt in samenwerking met de IT-architect die betrokken was bij het voorbereidende onderzoek.
Start implementatie inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur	2023 Q1	Nog niet gestart	
Oplevering 1 basis databank met set relevante parameters	2023 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	600.000 EUR
Uitvoering VAK	51.000 EUR
Uitvoering VEK	12.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 600.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV072 - Doelgericht digitaal transformeren](#)

VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	kunstenaars, lokale en regionale overheden, organisaties uit diverse sectoren, burgers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit relanceproject gaat over het stimuleringsinstrument voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte als hefboom voor de realisatie van kunstopdrachten zowel in de stedelijke publieke ruimte als de open ruimte in Vlaanderen. Naast een geografische spreiding van de te realiseren projecten over heel Vlaanderen, is het streefdoel tevens projecten met verschillende grootteordes van budget (kleine projecten, middelgrote en grote projecten) te ondersteunen. Inhoudelijk is het uitgangspunt van het stimuleringsinstrument niet de realisatie van een kunstopdracht naar aanleiding van een specifiek bouw- of verbouwproject zoals in het decreet Kunst in Opdracht van 1 maart 2019, maar stimuleert het reglement publieke ruimte met een culturele dimensie en initieert het locatie-specifieke kunstopdrachten waarbij gemikt wordt op nieuwe creaties door hedendaagse kunstenaars met een bovenlokale uitstraling. Een brede waaier aan potentiële opdrachtgevers in Vlaanderen wordt aangespoord om cross-sectorale verbindingen aan te gaan en een subsidieaanvraag in te dienen voor een deel van de voorbereidings-, ontwikkelings- en realisatiekosten voor kunstwerken in de publieke ruimte. Andere actoren dan de aanvrager kunnen initiatiefnemer zijn maar dienen zich te verbinden met een publieke of semi-publieke partner die garant kan staan voor financiering, beschikking van de publieke plek, toelatingen, organisatie en/of professionele ondersteuning op maat opdat het werk effectief gerealiseerd kan worden. Het betreft aanvragen waarbij maximum 50% cofinanciering als principe gehanteerd wordt en het conglomeraat van partners die een project indienen en investeren in de kwaliteit van de publieke ruimte een deel van het kunstproject zelf financieren. Een multi-disciplinair expertenpanel staat voor de twee geplande oproepen (2021 - 2022) in voor selectie, advisering en beoordeling van de projecten.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	De realisatie van 44 kunstopdrachten in de publieke ruimte. Deze kunstopdrachten verschillen qua artistieke verschijningsvorm, vermaterialisatie, realisatietermijn en grootteorde van budget. De realisatiedatum van de kleine projecten met een maximum van 75.000 euro ligt 1,5 jaar na selectie van de projecten. De middelgrote projecten met een realisatiebudget tussen 75.000 euro en 150.000 euro krijgen 2,5 jaar tijd voor realisatie. De grote projecten, waarvan de budgetten hoger zijn dan 150.000 euro krijgen tijd tot de einde looptijd voor realisatie van de

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	relancemiddelen. Verspreid over 2022, 2023, 2024 en 2025 zullen de verschillende projecten gerealiseerd worden.
Outcome	Met de subsidielij van het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte wordt de realisatie van kwaliteitsvolle kunst opdrachten in de publieke ruimte beoogt die een diverse groep van opdrachtgevers uit verschillende maatschappelijke geledingen de weg biedt naar een professionele aanpak om kunst opdrachten te initiëren. Tevens wordt als resultaat beoogt dat de kunstwerken zich door hun openbaar karakter richten tot een diverse groep van burgers die gebruik maken van de publieke ruimte.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De toezegging van de middelen via het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte verloopt in twee oproepen. De eerste oproep in 2021 heeft de toewijzing van subsidies voor zestien kunst opdrachten opgeleverd voor een budget van 951.000 euro. Deze projecten zijn momenteel in uitvoering en twee projecten (Murals Zennepark te Brussel en Contemporary Lukasa te Antwerpen) zijn gerealiseerd. Momenteel is het beoordelingstraject van de tweede oproep 2022 volop bezig. 29 projectaanvragen kregen in een eerste fase een voorlopig positief advies. Eén aanvrager diende in de tweede fase geen dossier in. Het expertenpanel bereidt bijgevolg momenteel de adviezen van de 28 resterende projectaanvragen die in de tweede fase werden ingediend voor en zal hierna de adviezen ter bekrachtiging voorleggen aan de minister.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring reglement stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte	2021 Q2	Gerealiseerd	
Start realisatie van de geselecteerde kunst opdrachten uit de oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Toekennen subsidies oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Toekennen subsidies oproep 2022	2022 Q3	Op schema	
Start van de realisatie van de geselecteerde kunst opdrachten oproep 2022	2022 Q4	Nog niet gestart	
De 44 kunst opdrachten zijn gerealiseerd	2025 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
44 kunst opdrachten starten in 2021 en 2022 het realisatietraject op.	44	2024 Q4	16	36 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	951.000 EUR
Uitvoering VEK	678.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV085 - KURSAAL OOSTENDE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het Kursaal Oostende wordt grondig vernieuwd. Het concept bestaat uit een uniek, mobiel hefsysteem dat de volledige zaal kan ombouwen tot een multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.

Dit innovatief zaalconcept kent verschillende opstellingen:

- zittende opstelling (auditorium): capaciteit van 2.000 zitplaatsen;
- vlakke opstelling voor staande concerten: capaciteit van 2.750 personen op parterre, incl. balkon is dat 3.150;
- foyeropstelling: extra capaciteit van 1.500m² voor beurzen, galadiners, etc.

De werken zorgen verder voor de integrale toegankelijkheid van het gebouw en er gebeuren aanpassingen aan de scène-opening, het HVAC-systeem en de licht- en klankinstallatie.

Het project legt de focus op ontsluiting van erfgoed en wil de link leggen met de evenementensector en het kusttoerisme.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 16.670.358,89 euro excl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 9 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	9.000.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 9.000.000 euro (maximaal 60% van de projectkost) wordt Kursaal Oostende omgevormd tot een innovatieve multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.
Outcome	Realisatie van verbouwing van grote zaal van het Kursaal Oostende tot multifunctionele zaal met grotere zaalcapaciteit waardoor een nieuwe culturele infrastructuur ontstaat op het snijvlak tussen enerzijds cultuur en anderzijds de evenementensector en kusttoerisme.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De architecten en studie bureaus zijn bezig met de opmaak van het definitief ontwerp. Finalisatie van definitief ontwerp is voorzien voor in juni.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke
politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
opstart aanbesteding studieopdracht	2021 Q3	Gerealiseerd	
gunning studieopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
finalisering definitief ontwerp door studiebureau	2022 Q2	Op schema	
opstart aanbesteding werken	2022 Q4	Nog niet gestart	
gunning werken	2023 Q1	Nog niet gestart	
uitvoering werken deel 1: engineering en productie	2023 Q2	Nog niet gestart	
uitvoering werken deel 2: werf	2024 Q1	Nog niet gestart	
oplevering werken	2024 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 9.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

In het masterplan voor de Schouwburg worden de kleedkamers en de bureaus vernieuwd en de foyer omgebouwd tot een cultuurcafé, dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats en als co-working space. Door de nieuwe verbouwingsfase zal het gebouw voldoen aan de hedendaagse normen rond toegankelijkheid en duurzaamheid en wordt het Arenatheater uitgebreid van 120 naar 200 plaatsen met daarboven een vernieuwde dansstudio. De studieopdracht van dit project start in mei 2021, de realisatie van de werken start in 2023 en duurt tot en met 2025.

De totale projectkost is €13.000.000. Vanuit de relanceprovisie wordt 7.800.000 euro (60%) vrijgemaakt.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	7.800.000 EUR
Output	Uitvoering van het masterplan waarbij de schouwburg gerenoveerd en uitgebouwd wordt tot een open meervoudig bruikbaar huis dat toonaangevend is m.b.t. toegankelijkheid en duurzaamheid.
Outcome	Een hedendaagse productie- en presentatieplek waardoor het huis aan meer makers en bezoekers een plek kan bieden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het ontwerpteam werkt het dossier verder uit. De stad Kortrijk signaleert een tekort van middelen door de hoogconjunctuur.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart studie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oplevering studie	2022 Q4	Op schema	
Opstart aanbesteding werken	2023 Q1	Nog niet gestart	
Gunning werken	2024 Q2	Nog niet gestart	
Opstart werken	2024 Q3	Nog niet gestart	
Oplevering werken	2026 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	7.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.800.000 EUR
Uitvoering VAK	7.800.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige 'Materniteit' op de Gentse Bijlokesite wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte om als creatiecluster ruimte te geven aan organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen. De infrastructuur zal zorgen voor de nodige kruisbestuivingen tussen de verschillende organisaties die er hun intrek nemen, waaronder Festival van Vlaanderen, Les Ballets C de la B, Muziektheater LOD, Symfonie orkest Vlaanderen en Studio Orka. Er wordt gefocust op gedeeld ruimtegebruik inzake studio's, flexwerkplekken en ruimtes voor individuele repetities.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.980.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 4.98 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt in de materniteit van de Gentse Bijlokesite ruimte voor een creatiecluster gerealiseerd voor organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen.
Outcome	Via de herbestemming en renovatie van voormalige Gentse Materniteit wordt een hernieuwde culturele infrastructuur gerealiseerd die ruimte biedt voor kruisbestuivingen en meer culturele activiteiten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	De budgettering van het project is nog niet volledig rond. In afwachting van bijkomende financiering wordt het dossier nog niet voorgelegd bij de Vlaamse Regering om de investeringssubsidie definitief toe te kennen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding en gunning stabiliteitsonderzoek zijn gebeurd	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Vertraging	Vertraging aangezien financieel plan onvolledig is. In afwachting daarvan wordt het dossier nog niet voorgelegd bij de Vlaamse Regering om de investeringssubsidie definitief toe te kennen.
Start ontwerpfase	2021 Q4	Vertraging	Vertraging aangezien financieel plan onvolledig is en project aldus nog niet van start kan gaan.
Aanbesteding gegund aan ontwerper	2021 Q4	Vertraging	Vertraging aangezien financieel plan onvolledig is en project aldus nog niet van start kan gaan.
Aanbestedingsdossier en omgevingsvergunning werken zijn klaar	2022 Q4	Nog niet gestart	
Start uitvoering van de werken	2023 Q3	Nog niet gestart	
Gunning werken	2023 Q3	Nog niet gestart	
Voorlopige oplevering van de werken	2025 Q3	Nog niet gestart	
Definitieve oplevering	2027 Q3	Nog niet gestart	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2027 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.980.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.980.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.980.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV088 - MOOOV TURNHOUT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	MOOOV vzw

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Renovatie zalencomplex Den Bond, een presentatieplek voor kunstenaars, i.s.m. De Warande, en art house cinema. De totale projectkost is €3.200.000. Vanuit de relanceprovisie wordt 1.300.000 euro vrijgemaakt. Doel van deze investeringssubsidie is om een hedendaagse art house cinema in Turnhout te creëren voor makers, gebruikers, producties en culturele evenementen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.300.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 1.3 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een hedendaagse presentatieplek voor kunstenaars en art house cinema gecreëerd.
Outcome	Het zalencomplex Den Bond wordt omgevormd tot een hedendaagse art house cinema in Turnhout waardoor een culturele infrastructuur gecreëerd wordt die aan makers en gebruikers nieuwe kansen biedt en meer producties en culturele evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De investeringssubsidie aan MOOOV Turnhout werd toegekend op 14 januari 2022. De uitvoering van het project wordt opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekennen investeringssubsidie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Aanbesteding ontwerper	2022 Q4	Op schema	
Oplevering ontwerp	2023 Q2	Nog niet gestart	
Start van de werken (obv termijn ontwerp)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering van de werken	2025 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.300.000 EUR
Uitvoering VAK	1.300.000 EUR
Uitvoering VEK	459.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Musea Brugge, onderdeel van de Stad Brugge, zal een bruisende museumsite realiseren op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge. De site zal bestaan uit een prestigieuze tentoonstellingshal, een onderzoekscentrum met museumbibliotheek en een nieuw museumpark en een gerenoveerd het Groeningemuseum. De opening van de tentoonstellingshal is voorzien in 2024, vanaf 2025 start het renovatietraject van de Groeningesite en aanliggende gebouwen. Het betreft het versnellen van een gepland investeringsproject uit het Vlaams Regeerakkoord. Vanuit de relanceprovisie wordt 27 mio euro voorzien (maximaal 60% van de totale projectkost).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	27.253.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 27 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een museumsite gerealiseerd in het historisch centrum van Brugge via restauratie en renovatie van de bestaande gebouwen enerzijds en de aanleg van een nieuw museumpark.
Outcome	Op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge wordt een nieuwe museale museumsite gerealiseerd die plek geeft aan nieuwe makers en evenementen enerzijds en nieuwe bezoekers anderzijds.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In het voorjaar 2022 werd de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de site ingediend. In het Groeningemuseum zijn de HVAC-werken opgestart, ter voorbereiding van de geplande renovatie.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Begrotingsakkoord	2020 Q4	Gerealiseerd	
Aanbesteding Design en Build procedure BRUSK	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Finalisering sloopwerken Groeningemuseum	2022 Q3	Nog niet gestart	
Plaatsing HVAC Groeninge	2022 Q3	Op schema	
Finalisering werken deelproject Centrum voor Collectieonderzoek	2023 Q3	Nog niet gestart	
Voorlopige oplevering deelproject BRUSK	2024 Q4	Nog niet gestart	
Finalisering werken verbinding BRUSK-Groeningemuseum	2024 Q4	Nog niet gestart	
Verhuis scenografie en inregelen van technieken BRUSK	2025 Q3	Nog niet gestart	
Finalisering werken Museumpark	2026 Q4	Nog niet gestart	
Finalisering renovatiewerken Groeningemuseum en Groeningekapel	2026 Q4	Nog niet gestart	
Voorlopige oplevering deelproject renovatie Groeningemuseum	2027 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering Museumsite	2027 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	27.253.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.253.000 EUR
Uitvoering VAK	27.253.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 27.253.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Momenteel zit SteM Sint-Niklaas verspreid over drie locaties: het SteM/Zwijgershoek, het Mercatormuseum (museumtuin) en de Salons. De komende jaren beoogt de stad de uitbouw van de site Zwijgershoek als een volwaardige museumsite en culturele hotspot. In 2022 worden de Salons overgebracht naar het gerestaureerde Huis Janssens. Tevens worden de verschillende onderdelen op de site met elkaar verbonden door de aanleg van een museumtuin.

De stad wenst d.m.v. de middelen in het kader van de Relance o.a. ingrepen te doen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid, waardoor een museumsite wordt gecreëerd waar topstukken in een veel betere conditie kunnen getoond en bewaard worden. Voor het SteM zal de stad ook een Energieprestatiecontract afsluiten met een ESCO om op termijn tot een significante energiekostenbesparing te komen. De verschillende werken kennen een gefaseerd verloop, waarbij de laatste fase medio 2023 wordt voltooid.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 1.923.126,77 euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 900.000 euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	900.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 46,8% (op de totale projectkost of 900 keuro) wordt de site Zwijgershoek tot een volwaardige museumsite omgebouwd.
Outcome	Via de realisatie van vier deelprojecten, wordt de site Zwijgershoek tot een volwaardige museumsite en culturele hotspot gevormd waardoor de site aan meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project bestaat uit verschillende deelprojecten. In het Huis Janssens zijn momenteel toegankelijkheidswerken en installatietechnieken aan de gang. Deze worden normaal gezien opgeleverd tegen eind juni. De depotinrichting in de annex van Huis Janssens

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>moeten nog opgestart worden. De planning wordt afgestemd op de klimatisatie van het Mercatormuseum. De uitvoering is gepland voor 2023.</p> <p>De klimatisatie van het Mercatormuseum zit in de fase definitief ontwerp. Het dossier toegang en beveiliging van het Mercatormuseum moet nog opgestart worden.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start van de toegankelijkheidswerken en installatie technieken Huis Janssens	2021 Q1	Gerealiseerd	
Start werken entresolvloer SteM	2021 Q2	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning werken EPC-dossier	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oplevering werken entresolvloer SteM	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning studie Mercator museum klimatisatie	2021 Q4	Gerealiseerd	
Start werken EPC-dossier	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering van het definitief ontwerp Mercator museum klimatisatie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering toegankelijkheidswerken en installatie technieken Huis Janssens	2022 Q3	Op schema	
Start werken Mercator museum toegang en beveiliging	2022 Q3	Nog niet gestart	
Gunning werken depotinrichting Huis Janssens	2022 Q4	Nog niet gestart	
Gunning werken Mercator museum klimatisatie	2022 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering werken Mercator museum toegang en beveiliging	2023 Q2	Nog niet gestart	
Start werken depotinrichting Huis Janssens	2023 Q2	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start werken Mercatormuseum klimatisatie	2023 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering werken depotinrichting Huis Janssens	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering werken Mercator museum klimatisatie	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering werken EPC-dossier	2023 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	900.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	900.000 EUR
Uitvoering VAK	900.000 EUR
Uitvoering VEK	600.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 900.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kopergietery vzw

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Kopergietery is een organisatie voor kinderkunsten in Gent, opgericht door Eva Bal. Kopergietery is eigenaar van het gebouw waarin zich ook de theaterzaal bevindt, en huurde tot voor kort het aanpalende gebouw. Dit aanpalende gebouw werd recent aangekocht, en wil men vervangen door een nieuwbouw waardoor het huis meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten. In deze nieuwbouw zullen de volgende ruimtes worden voorzien: drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers voor de artiesten, transparante en open bureaus voor de medewerkers, een bouw-atelier en twee technische ateliers. Het betreft in totaal een oppervlakte van +- 1.400 m². De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 3.543.464 euro excl. BTW (BTW medecontractant), de Vlaamse overheid investeert hiervan 2,125 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.125.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 2,125 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een nieuwbouw gerealiseerd met drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers, open bureaus, een bouwatelier en twee technische ateliers.
Outcome	Realisatie van Kopergietery STUDIO's, uitbreiding van bestaande culturele infrastructuur met nieuwbouwproject waardoor het huis meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In het najaar van 2021 werd het ontwerpteam aangesteld. In een volgende fase wordt het bestek met programma van eisen opgemaakt voor uitvoering van de werken. Deze ontwerpfase is nog lopende.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie	
-------------------------------	--

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG**MIJLPALEN**

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Aanbesteding ontwerper	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opmaak aanbestedingsdossier	2022 Q2	Op schema	
Gunning en sluiting van de opdracht voor werken	2022 Q3	Nog niet gestart	
Oplevering nieuwbouw repetitiestudio's (timing onder voorbehoud)	2024 Q2	Nog niet gestart	
Uitvoering van de werken	2024 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.125.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.125.000 EUR
Uitvoering VAK	2.125.000 EUR
Uitvoering VEK	1.091.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.125.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De stad Sint-Niklaas wenst een nieuwe bibliotheek te realiseren. De beoogde nieuwbouw zal ook onderdak bieden aan het 'Huis van het Kind'. In het kader van dit bouwproject opteert de stad voor een Design & Build procedure. In de aanloop van deze procedure wordt er in 2021 werk gemaakt van een projectdefinitie en een selectieleidraad. Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd dossier heeft de stad nood aan juridische en technische ondersteuning. Voor een deel van de kosten van dit voorbereidend onderzoek wenst de stad een beroep te doen op de middelen in het kader van de Relance. Tegen november-december 2022 wil de stad een ontwerper/aannemer aanstellen en in januari 2024 starten met de bouw. De hiervoor vrijgemaakte relancemiddelen bedragen ongeveer 2% van de geraamde totale projectkost (15 mio incl. BTW).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	300.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 2% op de totale projectkost wordt een deel van de kosten van het voorbereidend onderzoek gefinancierd. Het gaat over juridische en technische luiken in de aanloop van een Design & Build procedure.
Outcome	Het voorbereidend onderzoek zal leiden tot de realisatie van een nieuwe bibliotheek d.m.v. een Design & Build procedure.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Na goedkeuring van de gunningsleidraad door de gemeenteraad werd de gunningsfase van de aanbestedingsprocedure voor de Design & Build opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG**MIJLPALEN**

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring selectieleidraad Design & Build door gemeenteraad	2021 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring gunningsleidraad Design & Build door gemeenteraad	2022 Q1	Gerealiseerd	
Gunning & contractafsluiting Design & Build	2022 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	300.000 EUR
Uitvoering VAK	300.000 EUR
Uitvoering VEK	300.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	VAI

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De huidige werking van het VAI zit momenteel verspreid over twee locaties (kunstencampus deSingel & depotruimte provincie Antwerpen). Met dit project wil het VAI haar functies onder één dak brengen via de herbestemming van een parochiekerk te Berchem (Antwerpen) en aan meer gebruikers en bezoekers een plek bieden om culturele activiteiten te beleven en te hosten. Het concept van deze herbestemming is een box-in-a-box depot samen met de kantoren en de publiekswerking van het VAI. Het VAI wil zo ook fungeren als ankerpunt in de wijk en zal het project in 2021 lanceren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.800.000 EUR
Output	Een nieuwe huisvesting voor het VAI met alle functies onder één dak.
Outcome	Een nieuwe culturele infrastructuur in een toonaangevend pand nl. de parochiekerk van Berchem waardoor het huis aan meer gebruikers en bezoekers een plek kan bieden en culturele activiteiten kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Na indiening 2022: controle op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF & begrotingsopmaak. Vervolgens goedkeuring door VR na vermelding op naam in U-decreet. We formuleren de mijlpalen indicatief omdat we nog niet ver genoeg zitten in de projectfase.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Indiening subsidieaanvraag door VAI	2022 Q2	Gerealiseerd	Subsidiedossier is ingediend op 13/05. Het project wordt gecontroleerd op volledigheid en er volgt een adviesformulering.
Start opmaak uitvoeringsdossier	2022 Q3	Nog niet gestart	
Toekenning investeringssubsidie (timing onder voorbehoud)	2022 Q4	Op schema	
Afronden uitvoeringsdossier + gunning werken	2022 Q4	Nog niet gestart	
Start uitvoeringswerken	2023 Q1	Nog niet gestart	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2027 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.800.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Hasselt

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Stad Hasselt plant de bouw van een open kunsthuis/kunstenwerkplaats in het centrum van de stad. Op het Groenplein – naast het historische stadhuis – wil de stad Hasselt het voormalig administratief centrum Groenplein verbouwen tot een hybride plek, waar spelers uit het lokale werkveld, diverse disciplines een unieke werking kunnen opbouwen binnen de functies productie, ontwikkeling en presentatie. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 8.564.547,75 euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 5,1 mio euro in kader van de relancemaatregelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.100.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 5.100.000 euro (maximaal 60% van de projectkost) wordt een open kunsthuis/kunstenwerkplaats gerealiseerd. .
Outcome	Realisatie van een kunsthuis/kunstenwerkplaats waar verschillende disciplines een unieke werking kunnen opbouwen en waar meer culturele activiteiten kunnen geproduceerd, ontwikkeld en gepresenteerd worden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De aanbesteding van DBM-opdracht is aan de gang via een tweestapsprocedure (selectie- en gunningsfase BAFO). De selectiefase is afgerond en momenteel wordt de gunningsleidraad gefinaliseerd. In september zullen de geselecteerde kandidaten hun eerste offerte indienen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Voorbereiding aanbesteding DBM	2021 Q4	Gerealiseerd	
Gunning DBM	2022 Q4	Op schema	
Oplevering definitief ontwerp	2023 Q2	Nog niet gestart	
Omgevingsvergunning	2023 Q4	Nog niet gestart	
Start van de werken	2024 Q1	Nog niet gestart	
Oplevering werken	2026 Q1	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.100.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.100.000 EUR
Uitvoering VAK	5.100.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.100.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De voormalige stadsbibliotheek op de parterre van CC De Werf in Aalst wordt met dit project omgevormd tot een polyvalente ruimte met een co-creatieve werking als opzet, met focus op de digitale en multimediale wereld, zowel voor creatie en presentatie van content als voor een educatief programma. Het project kadert binnen de nieuwe visie van CC De Werf en in het kader van de toekomstige programmatie zal de Werf dan ook samenwerking zoeken met andere partners binnen en buiten Aalst. De investering moet toelaten op kleinere schaal culturele voorstellingen te laten doorgaan, en biedt ruimte voor zowel kleine als grotere organisaties voor repetitie en presentatie. De Vlaamse overheid investeert 450.000 euro voor de uitvoering van dit project in het kader van de relancemaatregelen (maximaal 60% van de totale projectkost).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	450.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 450.000 euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt de voormalige stadsbibliotheek in Aalst omgevormd tot een polyvalente ruimte.
Outcome	De realisatie van vernieuwde parterre voor CC De Werf voor een hedendaagse co-creatie met focus op de digitale en multimediale wereld waardoor er meer plek is voor culturele productie en presentatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Uitvoering van het raamcontract branddetectie in de Werf start op 01/06/22. De werken op de verdiepingen, brandcompartimentering liften en aan de brandhaspels vangen aan in januari 2023. De gunning van de studiefase voor het inrichten van de ruimte is voorzien voor 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Aanbesteding Studie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Gunning studie	2022 Q2	Op schema	
Aanbesteding werken	2022 Q3	Op schema	De werken in kader van brandpreventie werden opgestart in het voorjaar 2022, via het raamcontract van de Stad Aalst. Voor de overige werken wordt een aparte overheidsopdracht gepubliceerd.
Start van de werken	2022 Q4	Op schema	
Voorlopige oplevering project (timing onder voorbehoud)	2023 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	450.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	450.000 EUR
Uitvoering VAK	450.000 EUR
Uitvoering VEK	182.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 450.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV096 - SCHOUWBURG BOOM

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Gemeente Boom

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project omvat diverse werken in het kader van de renovatie van de schouwburg van CC De Steiger te Boom in opdracht van de gemeente. Concreet gaat het onder meer over de vernieuwing van de inkom, de renovatie van de artiestenvertrekken, de aanpassing van de laad- en loszone, het vervangen van de podiumvloer en het plaatsen van een nieuwe lichtbrug/trekken. Het doel van de investeringssubsidie is om opnieuw een hedendaagse speelplek voor culturele activiteiten te creëren. De hiervoor vrijgemaakte relancemiddelen bedragen 300K euro, de geraamde totale projectkost bedraagt 705K euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	300.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 300K euro wordt de schouwburg van CC De Steiger in Boom opnieuw een hedendaagse speelplek.
Outcome	De realisatie van een gerenoveerde schouwburg waardoor een hedendaagse werking mogelijk gemaakt wordt en meer culturele activiteiten gehost kunnen worden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op 14 januari 2022 keurde de Vlaamse Regering de toekenning van de investeringssubsidie goed. De administratie van het Departement CJM is gestart met de opvolging van het project.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding projectbegeleiding	2022 Q2	Op schema	
Gunning opdracht projectbegeleiding	2022 Q3	Nog niet gestart	
Opstart projectbegeleiding	2022 Q3	Nog niet gestart	
Opstart aanbesteding renovatiewerken	2022 Q4	Nog niet gestart	
Gunning renovatiewerken	2023 Q2	Nog niet gestart	
Opstart renovatiewerken door aannemer	2023 Q3	Nog niet gestart	
Oplevering renovatiewerken	2024 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	300.000 EUR
Uitvoering VAK	300.000 EUR
Uitvoering VEK	106.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>In de periode 2021-2022 is er extra budget uit de relancemiddelen voor het verlenen van sectorale investeringsubsidies voor bovenlokale culturele infrastructuur. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor het automatiseren van theatertrekken, het nemen van energiezuinige maatregelen of voor het toegankelijker maken van de infrastructuur. Op die manier wil het Departement CJM de culturele infrastructuur verbeteren m.b.t. toegankelijkheid, veiligheid en energiezuinigheid. Voor 2022 worden deze middelen toegekend o.b.v. het nieuwe subsidiereglement. We verlenen € 4.100.000 extra sectorale investeringsubsidies. We voorzien € 900.000 voor personeelsondersteuning, die ook wordt ingezet voor de overige cultuurinfrastructuurprojecten uit het relanceplan.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.000.000 EUR
Output	Via sectorale investeringsubsidies wordt in Vlaanderen de bestaande culturele infrastructuur verbeterd m.b.t. toegankelijkheid, veiligheid en energiezuinigheid.
Outcome	Investeren in toegankelijke, veilige en energiezuinige infrastructuur. Het ondersteunen van projecten met oog op een performante en duurzame infrastructuur die op een kwaliteitsvolle manier plaats moet bieden aan meer gebruikers en bezoekers.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De minister kende op 24 november een investeringssubsidie toe aan 26 infrastructuurprojecten voor bovenlokale culturele infrastructuur voor een totaalbedrag van 5,5 mio euro. Het aandeel relancemiddelen voor deze ronde bedraagt 2,05 mio euro. De aanvraagronde in 2022 werd opgestart, na goedkeuring van het subsidiereglement voor de periode 2022-2026 (beslissing VR 29 april 2022). Het resultaat van de subsidieronde 2021 is beschikbaar op de website van het departement CJM: https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2022-

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	04/Infrastructuur_Instellingen_toegekennde_investeringssubsidies_sectorale_prioriteiten_2021_20220429.pdf
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanvraagperiode 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning sectorale investeringssubsidies ronde 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Aanvraagperiode 2022	2022 Q3	Op schema	
Toekenning investeringssubsidies ronde 2022 (timing onder voorbehoud i.f.v. nieuwe subsidiereglement, van kracht in 2022)	2022 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.700.000 EUR
Uitvoering VEK	580.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV098 - VERSNELLING OPERA GENT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent, Ballet Vlaanderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Met de aankoop van het post-telegraafkantoor en het vredegerrecht zag Opera Ballet Vlaanderen in het kader van haar masterplan voor de Gentse Opera een unieke opportuniteit om het historisch pand niet alleen te restaureren maar ook te herdenken tot een meervoudig bruikbaar open huis. Door de omvorming van productie- naar presentatieplek kan het huis een plek bieden aan meer gezelschappen en ook meer producties en evenementen hosten. Deze 5 mio euro extra uit de relancemiddelen zorgt voor een versnelling van het dossier, waarvoor in 2021 ook 4 mio euro uit de reguliere middelen is voorzien. De financiële impact op de volgende legislatuur wordt hierdoor verkleind. De totale projectkosten bedragen 112.220.000 euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	Een deel van de architectuurstudie voor de renovatie en restauratie van de Gentse Opera tot een open meervoudig bruikbaar huis.
Outcome	De opera wordt omgevormd tot een hedendaagse productie- en presentatieplek, waardoor het huis aan meer gezelschappen een plek kan bieden en meer producties en evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het ontwerpteam werkt verder aan de studie. In de volgende stap maken de architecten een nieuwe financiële berekening. De onderhandelingen over de aankoop van het postkantoor lopen stroef, waardoor de verder timing onder druk komt te staan.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart studie	2021 Q2	Gerealiseerd	
Oplevering studie	2023 Q1	Op schema	
Aanbesteding uitvoering	2023 Q2	Nog niet gestart	
Gunning uitvoering	2024 Q1	Nog niet gestart	
Uitvoering van de werken	2024 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering renovatie	2030 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

15. Investerings onroerend erfgoed

VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Onroerend Erfgoed
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	- alle categorieën 'premiënemers' (initiatiefnemers van erfgoedontwikkelingsprojecten), zowel privé als publiek, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen; - de erfgoedsector (inclusief specialisten, erfgoedverenigingen ...); - de toeristische sector; - de gebruikers van erfgoed.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	15. Investerings onroerend erfgoed
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het investeren van relancemiddelen in Onroerend Erfgoed onderstreept het economisch belang van het beleidsdomein. Het wordt algemeen erkend dat de restauratiesector een bijzonder arbeidsintensieve en gespecialiseerde sector is, het gaat dan om die sectoren die 'hands on' aan het onroerend erfgoed werken zoals restaurateurs, aannemers of archeologen. Ook vormt erfgoed een belangrijke drager van toerisme, onroerend erfgoed is een van de belangrijkste motivatoren om plaatsen te bezoeken, te beleven en te ervaren.</p> <p>In het kader van 'relance' zal in het beleidsveld onroerend erfgoed worden geïnvesteerd in:</p> <p>(1) een reeks gerichte projecten uit de wachtlijst voor erfgoed- en restauratiepremies. Hiervoor zijn in 2 beslissingsrondes 46 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd: 32 miljoen euro is toegezegd op 2 april 2021 (cf. de toenmalige nota aan de Vlaamse Regering), op 3 december 2021 volgde de bijkomende toezegging van 14 miljoen euro (cf. nota aan de Vlaamse Regering op die datum). De middelen worden besteed onder de vorm van restauratie- en erfgoedpremies volgens de onroerendoerfgoedregelgeving. Deze premies bedragen een bepaald percentage van de projectinvesteringen, 40 tot 90% naargelang het soort project en het soort premienemer. De rest is als eigen aandeel door de premienemer op te leggen. De premie is aan strikte uitvoeringsvoorwaarden en -termijnen gebonden. Kandidaat-dossiers worden administratief gekeurd en mits ontvankelijk opgenomen in een wachtlijst. Begin de 2021 omvatte deze wachtlijst 561 dossiers voor een totaal premiebedrag van 304.468.767,32 euro aan aangevraagde premies. Het betreft uitvoeringsklare dossiers met focus op de restauratie van beschermd erfgoed. Uitvoering mag pas van start gaan zodra de premie is toegekend. Dit gebeurt bij jaarlijkse programmatierondes, waarvoor in principe reguliere middelen worden gebruikt. Pro memorie: het jaarlijkse reguliere budget voor alle soorten erfgoedpremies schommelt rond de 80 miljoen euro. De 46 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd voor de 'wachtlijst' zal worden besteed aan een gerichte selectie van dossiers uit de wachtlijst, met name</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

projecten die:

- bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling: projecten die vanuit de beoogde functie of finaliteit bijdragen tot een ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Dit gaat zowel om projecten met een sociale finaliteit (welzijn en schoolgebouwen) als projecten met een meer culturele finaliteit (musea, toeristische ontsluiting), maar ook projecten die bijdragen tot ontwikkeling van de omgeving (bv stedelijke parken, cfr link met vrijetijdsbesteding in Covid-crisis);
- bijdragen aan de groene transitie omdat ze inzetten op een duurzaam hergebruik (herbestemming) van erfgoedsites;
- bijdragen aan de ondersteuning van KMO's: projecten met een directe impact op werkgelegenheid voor kleinere en middelgrote bedrijven. Het gaat hier zowel om kleine bedrijven in de restauratiesector, zoals orgelrestaurateurs, molenbouwers, glas-in-loodateliers of interieurrestaurateurs. Het gaat dan om kleinschalige projecten die werkgelegenheid voorzien voor kleinere bedrijven in onze sector die meer geleden hebben onder de Covid-crisis en dreigen te verdwijnen bij gebrek aan werkgelegenheid. Daarnaast vallen onder deze categorie ook projecten die geïnitieerd worden door andere KMO's: handelspanden die gevestigd zijn in beschermde panden die een premie aanvragen voor de restauratie van dit pand;
- bijdragen aan de groene transitie: projecten die inzetten op verbetering van energieprestaties, zoals de vernieuwing van technische installaties in beschermde gebouwen.

Dossiers die niet aan deze criteria voldoen worden met reguliere middelen gehonoreerd bij toekomstige programmatis.

(2) Enkele gerichte oproepen voor erfgoedpremies in toepassing van de vernieuwde erfgoedpremiëprocedure. Er zal worden ingezet op volgende thema's: economische herinvulling van erfgoed, her- en nevenbestemming van kerken, erfgoed en wonen, erfgoed en toerisme. Voor deze oproepen wordt een totaal van 15 miljoen euro aan relancemiddelen gereserveerd (cf. mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021), aangevuld met telkens 5 miljoen euro aan reguliere middelen vanwege Toerisme en Wonen voor de desbetreffende oproepen. Via oproepen worden kandidaat-premiënemers uitgenodigd te kandideren voor een erfgoedpremie. De oproepen monden dus uit in erfgoedpremies en dekken dus een bepaald percentage van de investeringen (cf. supra).

(3) Enkele voorbeeldprojecten:

- een investering van 10 miljoen euro in de casco-restauratie van het kasteel van Heers (cf. bovenvermelde nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021). De kasteelsite, sinds het voorjaar van 2021 eigendom van de Vlaamse overheid, wordt een erfgoedlabo waarin partners, zowel van overheid als particulier, samen de toekomst van de site veilig stellen. Het toepassen van nieuwe technieken in conservering, restauratie, exploitatie, programmering en communicatie zal van Heers een voorbeeldsite maken over omgang met landgoederen in de 21ste eeuw. Daarin komt naast de historische betekenis, ook de economische en sociale meerwaarde voor de directe omgeving in het centrum van de ontwikkeling te staan. Het klassieke functie- en herbestemmingsdenken wordt verrijkt met een open aanpak die met de aanwezige erfgoedwaarden aan de slag gaat. Een mix aan verdienmodellen kan er getest en geborgd worden. In een eerste fase worden alle kennispartners rond de tafel gebracht, om zo effectief mogelijk de kansen van de site te verbinden aan externe expertise (van kennis rond restauratietechnieken, over gemeenschapsvorming, tot natuurbeheer en beleving inclusief duurzaam toerisme). Belangrijke delen van het kasteel krijgen een casco-restauratie zodat herbestemming en invulling op korte termijn mogelijk is. De uiteindelijke projectkost zal worden bepaald door de keuzes die in de loop van het toekomsttraject worden gemaakt;

- een investering van 10 miljoen in het project Thermae Palace, Oostende (cf. bovenvermelde nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021). Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de 10 miljoen euro louter te besteden aan de restauratie van Thermae Palace en de Koninklijke gaanderijen. Een ruimere omgevingsaanpak door de stad Oostende staat los van de financiële bijdrage vanuit Onroerend Erfgoed. De totaalrestauratie en herbestemming van Thermae Palace is een bijzonder grootschalig en complex gegeven (gaanderijen en hotel). De geplande toekenning van 10 miljoen euro dient gezien te worden als een eerste

PROJECTOMSCHRIJVING

injectie (maar vanuit Onroerend Erfgoed tevens de definitieve) om de meest dringende werken aan te pakken. Aanvullend nog premies aanvragen wordt uitgesloten. De huidige restauratieve werken en de herbesteding van het hotel wordt geraamd op minimum 70 miljoen euro. Voor de restauratie van de gaanderijen is ca. 12 miljoen euro nodig. Indien het huidige consortium niet tot een economisch haalbare én uitvoerbare piste komt, creëert de uitvoering van de meest dringende werken mogelijk extra ruimte om een nieuw verhaal te schrijven, enerzijds qua tijdsdimensie, anderzijds qua stakeholders en participanten, waarbij mogelijks wel een integrale herbesteding mogelijk en haalbaar is. De relancemiddelen kunnen zorgen voor dit verhoopt katalysator-effect. Van zodra het restauratiedossier voor de meest dringende werken volledig is, kan het subsidiedossier gelanceerd worden. Gelet op de decretale basis die nog moet voorzien worden via de begrotingsaanpassing 2022, zal de toekenning pas mogelijk zijn vanaf juli 2022.

- een investering van 4 miljoen euro in de actualisatie van de GGA-kaart (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022). De GGA-kaart (Gebied Geen Archeologie) is een instrument ontwikkeld door het agentschap Onroerend Erfgoed en identificeert zones waarvoor bij het aanvragen van een omgevingsvergunning geen archeologisch traject moet worden doorlopen. De GGA-kaart is met andere woorden een belangrijk hulpinstrument voor ontwikkelaars, en het maximaal up to date houden ervan is dan ook een belangrijke beleidsdoelstelling. Hierdoor kunnen immers onnodige archeologische vooronderzoeken en dus kosten vermeden worden. De Relance-investeringen zullen worden gependend aan een grootschalige actualisatie, enerzijds onder de vorm van GGA-kaarten op gemeentelijke schaal, anderzijds door integratie van gegevens uit de OVAM-databanken;

- een investering van 5 miljoen euro in de restauratie van erfgoed in het polderdorp Doel (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022). Uit het voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering voor het complex project extra containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen (CP ECA), definitief goedgekeurd op 31 januari 2020, vloeit voort dat het polderdorp Doel niet hoeft te verdwijnen voor de aanleg van een nieuw containergetijdendok. Het departement MOW startte daarom een externe studie op om een toekomstperspectief voor Doel uit te werken, in overleg met een begeleidingsgroep van Vlaamse en lokale stakeholders. Er is ook een politieke task force voor Doel opgericht. Op voorwaarde dat het overleg met de betrokken actoren resulteert in een akkoord is de Vlaamse Regering bereid tot inspanningen in onder meer zichtbare realisaties die het polderdorp Doel weer (be)leefbaar moeten maken. Dat betekent ook duurzame investeringen in werken aan het Doels erfgoed (o.m. het Hooghuis.).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	100.000.000 EUR
Output	De onder (1) en (2) vermelde investeringen gebeuren onder vorm van restauratie- en erfgoedpremies en leiden dus tot een aantal premies die in eerste instantie worden vastgelegd, en naargelang de uitvoering volgt effectief uitbetaald. Er is een voorschottenregeling. Over het precieze aantal premies wordt gericht gerapporteerd (dit hangt af van het selectieproces en de omvang van dossiers). De onder (3) vermelde investeringen zullen gebeuren onder de vorm van gerichte subsidies, zodra hiervoor dossiers beschikbaar zijn.
Outcome	<p>- Elke premie en subsidie staat voor een erfgoedontwikkelingsproject, met focus op restauratie. Uitvoering leidt tot gerestaureerde en herbestede erfgoedlocaties. Projecten worden in het kader van relance geselecteerd in functie van de maatschappelijke meerwaarde die ze genereren, bovenop het restaureren (zie hoger). Projecten gaan pas effectief van start na het toekennen van de premies, maar in functie van relance gelden strakke uitvoeringstermijnen (2025).</p> <p>- Ook de projecten 'kasteel van Heers' en 'Thermae Palace' zijn in wezen erfgoedontwikkelingsprojecten met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Het proces is echter even belangrijk als het eindresultaat.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>In de eerste helft van 2022 zijn met betrekking tot de relancedossiers waarvoor investeringen zijn voorzien volgende stappen gezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De gerichte selectie van dossiers uit de wachtlijst voor restauratie- en erfgoedpremies is afgerond. Er zijn uiteindelijk 99 premies vastgelegd voor een totaal van 45.047.646,33 euro. Dit bedrag houdt al rekening met de zogenaamde 'actualisaties' (dit is het bijgestelde premiebedrag op basis van het kostenplaatje na aanbesteding; in sommige gevallen is dat hoger dan de raming en laat de regelgeving een beperkte verhoging van de premie toe). 34 premienemers hebben de werken aanbesteed en zijn hetzij al gestart met de uitvoering, of starten binnenkort. Voor 11 dossiers is al een eerste voorschot uitbetaald conform de bepalingen in de onroerenderfgoedregelgeving; • Voor de 4 relance-oproepen voor erfgoedpremies is de preselectiefase afgerond. Op 11 maart 2022 is hierover een mededeling aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Er konden in totaal 41 preselectiedossiers ter beoordeling worden voorgelegd aan gespecialiseerde jury's. Met het beschikbare budget konden 22 dossiers worden gepreselecteerd, goed voor een totaal aan geraamde premiebedragen van 13.301.895,83 euro, waarvan 7.994.388,88 op conto van het beleidsveld Onroerend Erfgoed. De preselectiedossiers kunnen nu door de initiatiefnemers worden omgezet in volwaardige premiedossiers. Eenmaal het agentschap Onroerend Erfgoed deze dossiers inhoudelijk heeft goedgekeurd, kunnen op basis daarvan de bijhorende erfgoedpremies worden toegekend. Conform de voor relancemiddelen geldende termijnen moeten de premies eind 2022 zijn vastgelegd, en moeten de projecten in 2025 zijn uitgevoerd; • het kasteel van Heers is in erfpacht gegeven aan Herita vzw; • de uitbesteding van de GGA-opdracht wordt voorbereid; • voor de projecten kasteel van Heers, Thermae Palace Oostende en Doel zijn subsidiedossiers in voorbereiding.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremies uit de bestaande wachtlijst	2021 Q2	Gerealiseerd	
Oproepen voor erfgoedpremies in het kader van relance zijn gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Het toekomsttraject voor het kasteel van Heers is opgestart	2021 Q3	Gerealiseerd	
Tweede gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremies uit de wachtlijst	2021 Q4	Gerealiseerd	
Procedure oproepen voor erfgoedpremies, 1ste fase: ontvangen kandidaat-dossiers, jurering en preselectie	2022 Q2	Gerealiseerd	
Goedkeuring subsidiedossier Doel en vastlegging subsidie	2022 Q4	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring subsidiedossier Thermae Palace en vastlegging subsidie	2022 Q4	Op schema	
Procedure oproepen voor erfgoedpremies, 2de fase: ontvangen en beoordelen 'definitieve dossiers', definitieve selectie en toekennen van premies	2022 Q4	Op schema	
De actualisatie van de GGA-kaart is uitbesteed	2022 Q4	Op schema	
Goedkeuring subsidiedossier Heers en vastlegging subsidie	2022 Q4	Nog niet gestart	
Aanbesteding/gunning van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremedossiers en eventueel uitbetaling eerste voorschotten	2023 Q4	Op schema	
Uitvoering van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremedossiers (start werken, opvolging voortgang ...)	2025 Q4	Op schema	
Uitvoering project Doel (aanbesteding/gunning, uitbetaling voorschotten, start werken)	2025 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering project Thermae Palace (realisatie project, uitbetaling saldo)	2025 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering project Heers (realisatie project, uitbetaling saldo)	2025 Q4	Nog niet gestart	
Uitvoering project Heers (aanbesteding/gunning, uitbetaling voorschotten, start werken)	2025 Q4	Nog niet gestart	
De actualisatie van de GGA-kaart is uitgevoerd	2025 Q4	Nog niet gestart	
Oproepen erfgoedpremies: uitvoering van de geselecteerde premedossiers (aanbesteding/gunning, uitbetaling voorschotten, start werken)	2025 Q4	Nog niet gestart	
Uitvoering project Thermae Palace (aanbesteding/gunning, uitbetaling voorschotten, start werken)	2025 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremedossiers (einde werken, realisatie project, uitbetaling saldo)	2025 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering project Doel (realisatie project, uitbetaling saldo)	2025 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal toegekende restauratie- en erfgoedpremies in het kader van relance	99	2022 Q4	99	100 %
Aantal toegekende ad hoc subsidies (Heers, Thermae Palace, Doel)	3	2022 Q4		
Aantal uitgevoerde erfgoedprojecten (restauratie- en erfgoedpremiedossiers, ad hoc projecten Heers, Thermae Palace en Doel)	102	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	44.849.000 EUR
Uitvoering VEK	1.459.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 100.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen - nota
Nota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance
Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance
Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance
Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance
Advies van de Raad van State. Over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance

16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening

VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Omgeving
Belanghebbenden	Aanvragers van de subsidie zoals decretaal bepaald.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het hoofddoel van de Vlaamse subsidie-instrumenten ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is het tegengaan van één van de belangrijkste ruimtelijke problemen die zich reeds jarenlang voordoen, namelijk het stedelijk verval. Dat komt tot uiting in twee fundamentele ontwikkelingen: enerzijds de uitholling en anderzijds het uitdijen van de stad. Bij het fenomeen uitholling wordt men onder meer geconfronteerd met een verlies aan bedrijven, wat een duidelijke ruimtelijke impact heeft op het stedelijk weefsel. Wanneer bedrijven hun activiteit om economische redenen stopzetten of omwille van uitbreidingsproblemen of milieuhygiënische redenen naar nieuwe locaties moeten verhuizen, worden de oude bedrijfsruimten achtergelaten. Naargelang het type van gebouw, de al dan niet resterende bedrijfsinfrastructuur en de aantrekkelijkheid van de onmiddellijke omgeving, wordt door het marktmechanisme bepaald hoe snel deze gebouwen opnieuw in gebruik worden genomen. Leegstaande bedrijfsruimten die niet onmiddellijk worden heropgenomen in het marktaanbod leiden uiteindelijk tot verwaarlozing en verkrotting. Dergelijke panden oefenen bovendien een negatieve invloed uit op de omgeving. Daardoor dreigen de aanpalende buurten of wijken eveneens in een verkrottingsspiraal terecht te komen. Zulke bedrijfsruimten moeten dan ook beschouwd worden als probleemgebieden, zowel vanuit economisch standpunt, als vanuit het streven naar een kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving. Als men deze trend wil tegengaan, moet men / vertrekken van een ruimtelijke ordening die uitgaat van de principes van een duurzame ontwikkeling, waarbij het beheer van de ruimte centraal staat. In stedelijke gebieden betekent dit in de eerste plaats een meer efficiënte organisatie en beheer van de ingenomen ruimte. De leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten nemen in deze stedelijke gebieden immers ruimte in beslag die in principe, via inbreidingsprojecten, een nieuwe aangepaste bestemming kan krijgen. Een efficiënter beheer van de reeds ingenomen ruimte zal bovendien een verder ongecoördineerd aansnijden en versnipperen van de open ruimte helpen vermijden.

De Vlaamse regering zit via het relancebeleid in op een inhaalbeweging op het vlak van de subsidiëring van openbare en private initiatieven om de sanering van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten te versnellen. Hiervoor wordt een extra budget van 15 miljoen euro voorzien via dit project.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	15.000.000 EUR
Output	Aantal toegekende saneringssubsidies leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten
Outcome	Aantal dossiers waarvan de saneringswerken werden gestart

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
14 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie voor de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	2021 Q3	Gerealiseerd		
20 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie van de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving	2021 Q4	Gerealiseerd		
Door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie voor de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	2026 Q2	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal opgestarte saneringsprojecten	100% - Maximale benutting van het beschikbare budget.	2022 Q4	5	25 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	7.861.000 EUR
Uitvoering VEK	1.079.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 15.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12 maart 2021 - nota](#)

VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

We blijven investeren in kwalitatieve ruimte om te ondernemen. We versnellen de transformatie van bestaande, verouderde bedrijventerreinen naar moderne en duurzame terreinen van de 21e eeuw. Bijzondere aandacht gaat naar meer ruimte voor groene en blauwe corridors, benutting van het potentieel van warmtenetten en zonne-energie, de verbetering van waterhuishouding, en aangepaste weginfrastructuur met meer ruimte voor veilig fietsen zodat ook meer werknemers met de fiets naar het werk kunnen komen.

Voor de aanwending van de relancemiddelen zoeken we naar her in te richten terreinen waar er zich knelpunten voordoen waardoor de realisatie geblokkeerd is of vertraagd wordt.

Stand van zaken op datum 31/12/2021: drie dossiers goedgekeurd door de VR voor een totaalbedrag van 4.761.529 euro.

1) Dossier Tybersite te Menen

De realisatie van het brownfieldconvenant Menen – Tybersite is afhankelijk van het omvormen van de rotonde N58xN8 tot een lichtengeregeld kruispunt. Deze omvorming van het kruispunt is conform het RUP Tybersite een voorwaarde voor de volledige realisatie van het brownfieldproject. Ook de realisatie van het regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik is afhankelijk van het omvormen van de rotonde N58xN8 tot een lichtengeregeld kruispunt, eveneens omwille van de verplichtingen uit het RUP. De actuele inschatting van de kostprijs van de werken bedraagt 4,5 miljoen euro excl. de bijkomende fietstunnels. Inclusief de fietstunnels wordt dit op 6,5 miljoen euro geraamd.

Een cofinanciering vanuit de relancemiddelen ten belope van 2 miljoen euro zorgt voor duidelijkheid over de beschikbare kredieten kunnen zorgen zodat het realisatietraject voor deze werken kan opgestart worden.

2) Dossier Wildebeek te Erembodegem/Denderleeuw

Door de besprekingen in het kader van het brownfieldconvenant is er momenteel een dialoog tussen de gemeente Denderleeuw, de stad Aalst, AWV, MOW, VLAIO, SOLVA en de ontwikkelaar Zabra, om tot een oplossing te komen voor het kruispunt Nachtegaalstraat – N405, en bij uitbreiding het vlak bij gelegen kruispunt Industrielaan (Zuid III) met de N405. Dit is nodig om een volledige herontwikkeling van de Dekalpy site op het grondgebied Denderleeuw mogelijk te maken. Maar ook los van die ontwikkeling bleek eerder al dat verkeerstechnische aanpassingen wenselijk zijn. Belangrijkste uitdaging is de financiering, en in bijzonder de verdeling ervan tussen de verschillende partijen (Denderleeuw, Aalst, Zabra, AWV), in het bijzonder ook

PROJECTOMSCHRIJVING

de 6 te verwerven eigendommen om een verkeerstechnisch goede oplossing te bekomen.

Een gedeeltelijke financiering van deze verwervingskosten vanuit de relancemiddelen ten belope van 2 miljoen euro kan een oplossing faciliteren. Vervolgens zullen ook bij AWV de nodige kredieten voor de uitvoering van de werken moeten voorzien worden.

3) Dossier Buke te Zottegem

Herinrichting van de Leeuwrikstraat en de Smalleweg zijn noodzakelijk als ontsluitingsinfrastructuur van het bedrijventerrein. Deze ontsluitingsweg is nu erg smal en onvoldoende uitgerust als ontsluitingsweg van een bedrijventerrein. Het terrein is zo'n 25 ha groot, volledig bezet en een mengeling van diverse soorten bedrijven. Er wordt 761.529 euro voorzien vanuit de relancemiddelen om de verbeterde ontsluitingsweg mogelijk te maken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	Realisatie van de transformatie van een aantal belangrijke en vaak complexe dossiers inzake verouderde bedrijventerreinen tot moderne, duurzame bedrijventerreinen, waarvan reeds 3 concrete dossiers voorwerp zijn van besluitvorming en andere dossiers worden voorbereid.
Outcome	Doel: Knelpunten rond ontsluitingsinfrastructuur helpen oplossen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Dossier Buke (Zottegem) is vastgelegd. Werken nog niet gestart. Voor dossier Wildebeek (Aalst-Denderleeuw) is overeenkomst op basis waarvan de middelen zullen worden vastgelegd in finale fase; ondertekening door de partijen voorzien in juni ek. Voor dossier Tybersite (Menen) is occasioneel samengevoegde overheidsopdracht in voorbereiding. Voor twee extra dossiers wordt een dossier voorbereid.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aantal gedeblokkeerde herinrichtingen van brownfields/verouderde bedrijventerreinen	2022 Q4	Op schema	
Investeringsagenda opmaken	2021 Q2	Gerealiseerd	
VV101 "Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen" --> SVZ (02/09/2021) --> onderzoeksfase ter voorbereiding besluitvorming voor 3 dossiers ten bedrage van ca. 2 miljoen euro/dossier.	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart projecten	2022 Q1	Nog niet gestart	
Aanbesteding werken.	2023 Q1	Nog niet gestart	
Start uitvoering werken.	2023 Q3	Nog niet gestart	
Einde werken.	2024 Q3	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal dossiers	5	2022 Q4	3	60 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	762.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing Vlaamse Regering van 17/12/2021 inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen](#)

VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, handelaars

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Investeren in bedrijvige en bruisende kernen - projectoproepen rond aankoop en transformatie van handelspanden, flankerend beleid op vlak van mobiliteit en parkeren en data-gedreven beleidsvoeren op basis van retaildata

- Oproep 'Aankoop en/of transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten' (eerste schijf van 10 miljoen)
- 'Profploeg' en 'Vitrine' (2 miljoen euro)
- Oproep 'Duurzame bereikbaarheid van de kern"
- Oproep cofinanciering gemeentelijke premies ter verduurzaming en verfraaiing handelspanden
- Oproep subsidies verordeningen en RUP's voor IHB-planconcepten
- Oproep collectieve begeleiding gemeenten door experts

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	25.000.000 EUR
Output	Zorgen voor transformatie van leegstaande of onderbenutte handelspanden/bedrijfspanden tot actieve panden die bijdragen tot de versterking van het lokaal economisch weefsel, en ondersteuning van gemeenten via begeleiding en ervaringsuitwisseling.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Oproep 'Aankoop en/of transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten' --> stimuleren van het lokaal ondernemerschap. - Profploeg --> professionele ondersteuning van steden en gemeenten voor concrete aanpak van uitdagingen handelskernversterking. - Vitrine --> begeleiding van ervaringsuitwisseling tussen gemeenten en het documenteren en verspreiden van goede praktijken. -Oproep Duurzame bereikbaarheid kernen: investeringen openbaar domein en ondersteunend studiewerk -oproep cofinanciering gemeentelijke premies: verduurzaming en verfraaiing handelspanden (gericht op eigenaars en exploitanten handelspanden) -Oproep subsidiëring verordeningen en RUP's: meer toepassing van (plan)concepten integraal handelsvestigingsbeleid -Oproep collectieve begeleiding gemeenten door experts: ondersteuning bij implementatie acties n.a.v. profploeg

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op één na (ondersteuning collectieve begeleiding van gemeenten door experts voor implementatie acties profploeg) zijn alle oproepen gelanceerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lanceren oproepen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Start dienstverlening aan lokale besturen en investeringen door lokale besturen. SVZ: Aankondiging opdracht d.d. 28/04/2021 in het Bulletin der Aanbestedingen, Selectieverslag d.d. 10/06/2021, Gemotiveerde selectiebeslissing d.d. 29/06/2021, Bestek nr. VLAIO-2021-07, Proces-verbaal van de opening van de offertes d.d. 10/08/2021, Gunningsverslag d.d. 27/08/2021 aan 'Idea Consult', tijdens eerste oproep --> 34 aanvragen voor begeleiding ingediend door gemeenten.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Bijkomende oproepen te lanceren	2022 Q1	Gerealiseerd	Dossiers komen binnen op 1 juni en 15 september (oproepen wedstrijdformule); andere oproepen zijn met doorlopende indiening.
Einde oproep	2022 Q4		
Einde fase dienstverlening en investeringen	2025 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal gestarte begeleidingstrajecten om gemeenten te helpen bij het vernieuwen van hun beleid rond bedrijvige kernen	85	2022 Q1	82	96 %
aantal dossiers rond leegstaande bedrijfspanden die getransformeerd gaan worden met het oog op het versterken van het lokaal ondernemerschap	30	2022 Q4	8	27 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	25.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.495.000 EUR
Uitvoering VEK	641.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 25.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 12 maart 2021. Investeren in kernversterking via projectoproepen
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022. Investeren in kernversterking via projectoproepen

VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Lantis
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Lantis
Belanghebbenden	De burger, de volksgezondheid

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit initiatief wordt de PFOS-vervuiling afgeschermd die werd aangetroffen bij de aanleg van Oosterweel.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	23.000.000 EUR
Output	
Outcome	Er wordt grondverzet gerealiseerd volgens het standstillprincipe. Hierbij wordt er enerzijds gewerkt met een specifieke afdekmethode, anderzijds worden voor het grondwater bemalingsbepalende invloeden gerealiseerd zodat er enkel gezuiverd grondwater geloosd wordt. De werken worden uitgevoerd conform de adviezen van de commissie Grondverzet (o.l.v. professor Vrancken).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Als bouwheer van de Oosterweelverbinding is Lantis gebonden aan het standstill-principe. Dat houdt in dat de werken die Lantis uitvoert niet mogen zorgen voor een verdere verspreiding van de PFOS-verontreiniging. Dankzij strenge maatregelen, waar zowel intern als door externe instanties toezicht op wordt gehouden, wordt de verspreiding van PFOS/PFAS maximaal vermeden. De situatie wordt dus onder controle gebracht door de Oosterweelwerf. De Oosterweelwerken zorgen namelijk voor een verbeterde situatie omdat de verontreiniging duidelijk in kaart is gebracht, de meest vervuilde gronden zorgvuldig worden afgedekt en het grondwater wordt gezuiverd tot er geen PFOS meer wordt aangetroffen.</p> <p>Het grondwater dat Lantis tijdens de werken oppompt, wordt gezuiverd alvorens het naar de Schelde wordt afgevoerd of terug in de bodem wordt gepompt. Daartoe werd een speciale waterzuiveringsinstallatie gebouwd binnen de werfzone Linkeroever. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgt deze waterzuivering op. Lantis detecteert geen PFOS meer in het gezuiverde water dat naar de Schelde wordt afgevoerd of dat terug in de</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>bodem wordt gebracht. Dat er in het water dat het waterzuiveringsstation verlaat, geen PFOS boven de detectielimiet meer gevonden wordt, toont aan dat de zuivering zeer secuur en conform de normen gebeurt.</p> <p>Deze waterzuiveringsinstallatie is in exploitatie.</p> <p>Alle verontreinigde gronden blijven op de site waar ze ontgraven werden. Cf. hierboven gesteld is Lantis gebonden aan het standstill-principe, wat betekent dat de werken enkel mogen zorgen voor een verbetering of status quo van de verontreiniging. De Commissie Grondverzet oordeelde in haar advies van 22/2/2022 dat de informatie in de Technische Verslagen aantonen dat de principes van het standstill-principe, zoals omschreven in Vlarebo (hergebruik en traceerbaarheid) en volgens de codes van goede praktijk van OVAM, worden nageleefd.</p> <p>De gronden met de hoogste concentraties (zones met meer dan 47 microgram/kg ds worden zorgvuldig afgedekt. Daardoor zal die verontreiniging zich dus niet meer kunnen verspreiden via de lucht of het grondwater, wat wel het geval is als alles blijft zoals het is.</p> <p>Ook de andere gronden blijven op de werf. Gronden uit zones met een concentratie tussen 3 en 47 microgram/kg ds worden binnen het projectgebied hergebruikt voor bouwkundig bodemgebruik, bijvoorbeeld in bermen. Ook gronden met een lagere concentratie dan 3 microgram blijven op de werf.</p> <p>Deze maatregelen in het kader van grondverzet worden geregeld in Technische Verslagen – dewelke geattesteerd werden door de Expertencommissie Grondverzet.</p> <p>De afronding van dit project loopt samen met de infrastructuurwerken Linkeroever en is voorzien in 2024, onder voorbehoud van voortgang van het grondverzet. Met de toelage uit de Vlaamse relancemiddelen werden noodzakelijke maatregelen getroffen in kader van de aanpak van verontreinigde gronden en grondwater, om de Oosterweelwerken te kunnen continueren.</p> <p>De juridische rechtsgrond is te vinden in de verkoopovereenkomst uit 2004 tussen het Vlaams Gewest en de BAM aangaande de gronden van de Oosterweelverbinding. Onder artikel 9 van de verkoopovereenkomst verbindt het Vlaams Gewest zich ertoe BAM te vrijwaren alle schade aangaande enige bodemverontreiniging op de site. In de beslissing van de Vlaamse Regering over de milderende maatregelen en flankerend beleid Infrastructuurwerken Linkeroever van 22/12/2017 is dit bevestigd.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
----------	--------	--------	---------------------

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK	23.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 23.000.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	13 centrumsteden, 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De oproep "Veerkrachtige steden na Corona" wil de steden bijkomend financieel ondersteunen bij de uitvoering van (in hoofdzaak) investeringsprojecten in een bepaalde wijk of stadsdeel. De focus is driedig, namelijk de sociale, fysieke en economische dimensie van een bepaalde wijk of stadsdeel. De oproep mikt op projecten die vanuit een geïntegreerde aanpak inzetten op vernieuwing en innovatie binnen deze drie focusgebieden. Er is ook ruimte voor de ondersteuning van nieuwe werkingen in een opstartfase.</p> <p>Met de economische dimensie worden werkingen en investeringsprojecten beoogd die bijdragen tot de economische heropleving, het verhogen van de werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, opleidingsmogelijkheden, enzovoort.</p> <p>Met de sociale dimensie wil de oproep bijdragen aan een sociaal inclusieve stad met de steden als plaatsen waar iedereen mee aan boord blijft, met een sterk welbevinden en welzijn bij de bewoners, met een sociale mix, participatie en activering van kwetsbare groepen aan het maatschappelijke leven, het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en waar condities voor sociale mobiliteit worden geschapen.</p> <p>Het derde focusgebied gaat over de kwaliteit van de publieke ruimte en de mate waarin omgevingskenmerken zoals toegang tot groen, goede woonomstandigheden, een mix van woongelegenheden, de aanwezigheid van cultuur en sportinfrastructuur in de buurt, wijk of het stadsdeel bijdragen aan de ontplooiing van de inwoners, de tevredenheid over de buurt, meer ontspanningsmogelijkheden, enzovoort.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Aan de hand van innovatieve en vernieuwende investeringsprojecten bijdragen aan de stadsvernieuwing van de wijk/stadsdeel/stad - Investeringsprojecten die tegemoet komen aan de tekortkomingen die werden en nog steeds worden ervaren tijdens de Coronapandemie: noden aan ontmoetings- en publieke ruimten, aan kwalitatieve en betaalbare woningen, aan groen en water in de stad, aan publieke infrastructuur

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	(bibliotheken, jeugthuizen, cultuurcentra, ...), aan ruimte voor jonge ondernemers en starters, ... -
Outcome	- De investeringen hebben bijgedragen aan de sociale inclusiviteit van de stad in kwestie waar iedereen mee aan boord blijft, de bewoners zich goed voelen, met een sociale mix, participatie en activering van kwetsbare groepen aan het maatschappelijke leven, het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en waar condities voor sociale mobiliteit worden geschapen. - De investeringen dragen bij tot een verhoogde werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, opleidingsmogelijkheden, ondersteuning van starters, ... - De investeringen zorgen voor betere ontmoetingsruimten binnen het stadsdeel, sport- en culturele infrastructuur, betere woonomstandigheden, ontspanningsmogelijkheden, .. -

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De 9 geselecteerde projecten zijn gestart in januari 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering van de oproep	2021 Q2	Gerealiseerd	
Jurering van de ingediende aanvragen naar stadsvernieuwingsprojecten	2021 Q3	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de geselecteerde stadsvernieuwingsprojecten goed	2021 Q4	Gerealiseerd	
Eindrapport van de gerealiseerde stadsvernieuwingsprojecten binnen deze oproep (deadline: 2026)	2026 Q3	Nog niet gestart	
Jaarlijkse voortgangsrapporten van de stadsvernieuwingsprojecten		Nog niet gestart	
Permanente evaluatie door stuurgroepen		Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal subsidieaanvragen	20	2021 Q3	25	100 %
start van de projecten		2022 Q1	9	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
jaarlijkse rapportering		2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	20.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 5 maart 2021 - nota Goedkeuring VR op 17/12/2021 van projectsubsidies in het kader van de oproep 'Veerkrachtige steden na Corona'

VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	VLM, lokale besturen, middenveldorganisaties

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project zet in op de ecologische ontsnippering van bestaande gewestelijke transportinfrastructuur en draagt zo bij aan het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen. Daarvoor werkten de betrokken entiteiten binnen de VO een Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) uit. Het beoogt een structureel georganiseerde, programmatische aanpak van de versnipperingproblematiek zowel binnen de Vlaamse overheid als in samenwerking met diverse externe partners.

Het eerste deel van het VAPEO is gericht op de verwezenlijking van terreinrealisaties (ecoducten, ecotunnels,...) om de voornaamste versnipperingsknelpunten aan gewest- en snelwegen weg te werken. Hiervoor is een eerste vijfjarenprogramma opgemaakt met 15 concrete projecten die tijdens die periode worden uitgevoerd of verder uitgewerkt. Daarnaast kunnen acute knelpunten opduiken die een snelle uitvoering vragen aangezien het een rollend programma betreft. Ondersteunende instrumenten en een gerichte communicatie maken eveneens deel uit van het VAPEO. De afspraken voor de uitvoering van dit project zijn opgenomen in een protocol dat op 23 september 2020 werd ondertekend door de bevoegde Vlaamse ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters. De financiële verdeelsleutel is als volgt bepaald : ½ AWV, ¼ ANB, ¼ DOMG.

Concreet zullen volgende 6 projecten met Relance-middelen uitgevoerd worden:

- E40 (Bertem): ombouw bestaande brug tot bermbrug;
- N75 (Dilsen-Stokkem) : aanleg nieuwe ecobrug (met medegebruik);
- N71 (Lommel): ontwerp ecoduct en mogelijke uitvoering;
- N76 (Oudsbergen / Genk): ontwerp en aanleg ecobrug met medegebruik;
- E17 (Waasmunster): ombouw bestaande brug tot bermbrug;
- R0 (Hallerbos): ontwerp en aanleg ecobrug met medegebruik.

Verder wordt er binnen Relance gewerkt aan 3 ondersteunende acties:

- Communicatie;
- Uitwerken ondersteunende instrumenten;
- Acute knelpunten aanpakken.

De andere VAPEO-projecten en ondersteunde acties worden met reguliere middelen aanbesteed tussen 2021-2024.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	25.000.000 EUR
Output	Realisatie van 6 ontsnipperingsprojecten.
Outcome	Verbetering van de ecologische ontsnippering.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Sommige (deel)projecten zijn al uitgevoerd of in uitvoering. Voor alle (deel)projecten zijn trekkers bij de verschillende entiteiten momenteel bezig met het organiseren van het nodige overleg, opmaak samenwerkingsovereenkomsten, en voorbereiding of uitvoering van aanbestedingen.
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie vereist.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Communicatie - aanbesteding opdracht	2021 Q4	Op schema	Opdracht gegund en gestart.
E17 (Waasmunster): ontwerp en aanbesteding ombouw bestaande brug tot bermbrug	2021 Q4	Op schema	Gunningsverslag in opmaak.
E40 (Bertem): ontwerp en aanbesteding ombouw bestaande brug tot bermbrug	2021 Q4	Op schema	Bestek in opmaak.
Acute knelpunten aanpakken - aanbesteding	2022 Q4	Op schema	Plaatsing wilddetectiesysteem op N76 Oudsbergen gegund en werken voorzien in juni-juli 2022.
N76 (Oudsbergen / Genk): ontwerp en aanbesteding ecobrug met medegebruik	2022 Q4	Op schema	Gunningsverslag in opmaak.
N71 (Lommel): ontwerp en mogelijke aanbesteding ecoduct	2022 Q4	Op schema	Gunningsverslag in opmaak.
R0 (Hallerbos): ontwerp en aanbesteding ecobrug met medegebruik	2022 Q4	Op schema	Omgevingsvergunning ingediend en bestek in opmaak.
N75 (Dilsen-Stokkem): ontwerp en aanbesteding ecobrug (met medegebruik)	2022 Q4	Op schema	Bestek en aanvraag omgevingsvergunning in opmaak.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitwerking ondersteunende instrumenten - aanbesteding	2022 Q4	Op schema	Studie 'Dieren onder de wielen als (beleids)ondersteunend instrument bij registratie en evaluatie van versnipperingsknelpunten aan transportinfrastructuur' gegund en gestart.
N75 (Dilsen-Stokkem): oplevering ecobrug (met medegebruik)	2026 Q4	Nog niet gestart	
Acute knelpunten - oplevering	2026 Q4	Nog niet gestart	
N71 (Lommel): oplevering ecoduct	2026 Q4	Nog niet gestart	
E40 (Bertem): oplevering bermbrug	2026 Q4	Nog niet gestart	
R0 (Hallerbos): oplevering ecobrug met medegebruik	2026 Q4	Nog niet gestart	
Communicatie - oplevering opdracht	2026 Q4	Nog niet gestart	
N76 (Oudsbergen / Genk): oplevering ecobrug met medegebruik	2026 Q4	Nog niet gestart	
Uitwerking ondersteunende instrumenten - oplevering	2026 Q4	Nog niet gestart	
E17 (Waasmunster): oplevering bermbrug	2026 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde ontsnipperingsprojecten	6	2026 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	25.000.000 EUR
Uitvoering VAK	586.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 24.700.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontsnippen Vlaams landschap](#)

[Vlaams actieprogramma ecologische ontsnippering. Deel 1 - wegen. Bijlage](#)

[Protocol in verband met de uitvoering van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering \(VAPEO\) Deel 1 - wegen. Bijlage](#)

[Budget. Bijlage](#)

17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)

VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Lijn
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	De Lijn
Belanghebbenden	Inwoners, weggebruikers, lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

De doelstelling van dit project is een gefaseerde overgang naar een groene en duurzame busvloot van vervoersmaatschappij De Lijn. Naast een bijdrage aan de vergroening van het transport en de modal shift wil men via dit initiatief het economisch herstel te ondersteunen door te investeren in duurzame en openbare mobiliteit.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	93.000.000 EUR
Output	De concrete outputs betreffen het realiseren van een verdere elektrificatie van de busvloot. In functie hiervan worden hybride bussen omgebouwd naar e-hybride bussen en worden e-hybride bussen aangekocht. In functie van het onderhoud van deze bussen worden de stelplaatsen aangepast en wordt voorzien in een raamcontract voor het onderhoud van deze bussen.
Outcome	Verbetering luchtkwaliteit.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>e-hybride bussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De bestelling voor de ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen werd in 2021 geplaatst en de aanpassingen zijn opgestart. De aanpassingen zullen gefaseerd uitgevoerd worden in de periode Q1 tot Q4 2022. - Er werden 44 gelede e-hybride bussen besteld in 2021. De e-hybride gelede bussen zullen gefaseerd instromen in de periode Q3 - Q1 2023. <p>Studies & adviesopdrachten:</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- De bestelling werd in 2021 geplaatst voor de uitvoering van de studies voor de aanpassingen voor de eerste drie stelplaatsen voor elektrische bussen. Voor de uitvoering van de studies voor aanpassingen voor de stelplaatsen is het contract gesloten. De uitvoering van de studies van de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen) is lopende. De ontwerpstudies zullen afgerond zijn in Q2 2022.
- De studie over de brandveiligheid werd in 2021 geplaatst en is lopende. De studies brandveiligheid stelplaatsen zullen afgerond zijn in Q2 2022.

Laadinfrastructuur & werken:

- De eerste bestelling voor de laadinfrastructuur voor de 60 e-bussen en e-hybride bussen werd in 2021 geplaatst bij twee leveranciers. Beide leveranciers zullen elk de helft van de bestelling installeren en in bedrijf stellen van in totaal 102 laders. Deze laadinfrastructuur zal ervoor zorgen dat de eerste e-bussen en e-hybrides op hun stelplaatsen geladen kunnen worden. De volgende bestellingen voor laadinfrastructuur in het gegunde raamcontract zullen in 2022 toegewezen worden via een mini-competitie (cf. infra: tweede bestelling laadinfrastructuur).
- De Lijn heeft op 20 april 2022 goedkeuring gegeven om de aanpassingswerken op de stelplaatsen op te starten om de eerste e-bussen te ontvangen. Deze tijdelijke installaties omvatten onder andere bekabelingswerken, verdeelborden, kabelladderconstructies, overbruggingen....
- De Lijn voert in Q3 en Q4 2022 de aanpassingswerken uit aan de eerste drie stelplaatsen en plaatst de laadinfrastructuur, zodat de eerste e-bussen vanaf het voorjaar van 2023 in de dienst kunnen opgenomen worden.
- Na het doorlopen van de minicompetitie van de raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en (niveaus van) onderhoud van laadinfrastructuur, zal De Lijn in Q2 2022 de tweede bestelling van 252 laders gunnen.
- De Lijn heeft in april 2022 de opstart goedgekeurd van een marktraadpleging via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging voor de levering van laadinfrastructuur. De nieuw op te starten raamovereenkomst betreft de levering van maximaal 1.600 laadpalen. De raamovereenkomst heeft een maximale looptijd van acht jaar. Net zoals in de vorige overeenkomst zal er gewerkt worden met twee deelnemers aan de raamovereenkomst die met elkaar in concurrentie zullen worden gezet via een mini-competitie. De afnames in 2022 worden gefinancierd via de relancemiddelen. De gunning is voorzien eind 2022.
- De Lijn heeft in mei 2022 drie plaatsingsprocedures opgestart voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De selectieleidraden zijn in mei 2022 gepubliceerd op het Belgische en Europese aankondigingsplatform. De Lijn verwacht eind 2022 de eerste opdrachten te kunnen gunnen. Los van deze 3 plaatsingsprocedures voert De Lijn dit jaar kleinere aanpassingen uit aan deze stelplaatsen (cf. supra eerste bestelling laadinfrastructuur en werken), zodat de eerste e-bussen vanaf het voorjaar van 2023 in de dienst kunnen opgenomen worden.

e-bussen:

- Een eerste bestelling voor 60 e-bussen werd geplaatst bij twee leveranciers. Het raamcontract laat een afname toe tot in totaal 350 e-bussen. Uit de 11 kandidaten werden Van Hool en VDL als best geplaatste inschrijvers uit de openbare aanbestedingsprocedure. Ze beantwoordden het best aan de gunningscriteria en boden de beste prijs-kwaliteitsverhouding aan inzake total cost of ownership (TCO), autonomie tussen laadbeurten, technische kwaliteit en look & feel. Als best gerangschikte inschrijver mag Van Hool 60% van de 60 e-bussen of 36 stuks leveren, VDL als tweede gerangschikte levert 40% of 24 stuks.
- De productie werd opgestart. De bussen zullen, afhankelijk van de productie, vanaf Q4 2022 gefaseerd geleverd worden en zullen vervolgens na de testperiode in dienst genomen worden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van de studies voor de aanpassingen voor de stelplaatsen voor elektrische bussen.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Plaatsen van een bestelling voor de ombouw van bestaande hybride naar plug-in e-hybride bussen.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Het plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van adviesopdrachten voor de uitrol van elektrische bussystemen en ondersteuning programmawerking.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Plaatsen van een bestelling voor plug-in hybride gelede bussen binnen het bestaande contract	2021 Q2	Gerealiseerd	
Het plaatsen van een bestelling voor de installatie voor de laadinfrastructuur op de stelplaatsen voor de e-bussen (volelektrische bussen) en de plug-in hybride bussen.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Bestelling voor e-bussen (volelektrische bussen).	2021 Q3	Gerealiseerd	
Afronden van de minicompetitie van de raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en (niveaus van) onderhoud van laadinfrastructuur & gunning en plaatsing van tweede bestelling van 252 laders.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Opstart van drie plaatsingsprocedures voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De selectieleidraden zijn in mei 2022 gepubliceerd op het Belgische en Europese aankondigingsplatform.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Opstart van een nieuwe marktraadpleging via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging voor de levering van laadinfrastructuur. De nieuw op te starten raamovereenkomst betreft de levering van maximaal 1.600 laadpalen.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Realisatie van de ontwerpstudies voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	2022 Q2	Gerealiseerd	
Realisatie van de studie over de brandveiligheid voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	2022 Q2	Gerealiseerd	
Gunning van de raamovereenkomst betreffende de levering van maximaal 1.600 laadpalen.	2022 Q4	Op schema	
Realisatie van de ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen	2022 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start gefaseerde levering van de 60 e bussen.	2022 Q4	Op schema	
Realisatie van de aanpassingswerken en de installatie van de laadinfrastructuur op de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen) om de eerste e-bussen te ontvangen.	2022 Q4	Op schema	
Start gefaseerde indienstname van de 60 e bussen, vanaf 2022/Q4	2023 Q1	Op schema	
Gunning van de opdrachten voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen.	2023 Q1	Op schema	
Levering 44 gelede e-hybride bussen	2023 Q1	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Opstart van drie plaatsingsprocedures voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De selectieleidraden zijn in mei 2022 gepubliceerd op het Belgische en Europese aankondigingsplatform.	Opstart van 3 plaatsingsprocedures	2022 Q2	3	100 %
Afronden van de minicompetitie van de raamovereenkomst voor de levering, indienstelling en (niveaus van) onderhoud van laadinfrastructuur & gunning en plaatsing van tweede bestelling van 252 laders.	252 laders	2022 Q2		
Realisatie van de ontwerpstudies voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	3 studies	2022 Q2	3	100 %
Opstart van een nieuwe marktraadpleging via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging voor de levering van laadinfrastructuur. De nieuw op te starten raamovereenkomst betreft de levering van maximaal 1.600 laadpalen.	1 marktraadpleging	2022 Q2	1	100 %
Realisatie van de studie over de brandveiligheid voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	3 studies	2022 Q2	3	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Realisatie van de ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen	280 plugin e-hybride bussen	2022 Q4		
Gefaseerde levering van de 60 e bussen.	60 e-bussen	2022 Q4		
Gunning van de raamovereenkomst betreffende de levering van maximaal 1.600 laadpalen.	Gunning van 1 raamovereenkomst	2022 Q4		
Realisatie van de aanpassingswerken en de installatie van de laadinfrastructuur op de eerste drie stelplaatsen ((Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen) om de eerste e-bussen te ontvangen.	3 stelplaatsen	2022 Q4		
Gunning van de 3 opdrachten voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen.	Gunning van de 3 opdrachten	2023 Q1		
Gefaseerde indienstname van de 60 e bussen.	60 e-bussen	2023 Q1		
Levering 44 gelede e-hybride	44 gelede e-hybride bussen	2023 Q1		
Formele bestelling van groene bussen en daarmee samenhangende oplaadinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel: - Bestelling geplaatst voor de ombouw van hybride bussen in e-hybride bussen via een wijziging van de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor hybride plug-inbussen binnen de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor vol-elektrische bussen - Bestelling geplaatst voor de installatie van oplaadinfrastructuur in de depots van de (vol-)elektrische bussen en de hybride plug-inbussen	4	2024 Q4	4	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	93.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	93.000.000 EUR
Uitvoering VAK	72.092.000 EUR
Uitvoering VEK	2.371.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 93.000.000 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

18. Brexit

VV107 - INITIATIEVEN VANUIT VLAM VOOR DE PROMOTIE EN AFZET VAN PRODUCTEN, O. A. ALS GEVOLG VAN BREXIT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

VLAM werkt in 2021 en 2022 een relancebeleid uit voor de zwaar getroffen sectoren van de agrovoeding en sierteelt. Volgende maatregelen worden voorgesteld.

1. Bedrijfssubsidies

VLAM lanceert een open oproep naar Vlaamse bedrijven actief in de agrovoeding en sierteelt om een innovatief project in te dienen om de export richting het VK en wereldwijd te ondersteunen. Ook wordt er een mini-incubator gelanceerd op maat van kleinere en startende exporteurs van Vlaamse agrovoeding en sierteelt.

2. Communicatie

Er worden imagocampagnes opgezet om de Vlaamse agrovoeding en sierteeltsector te promoten in het VK en onze marktpositie daarbuiten te versterken.

3. Personeel

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	- Bedrijfssubsidie: minimum 2 incubators Brexit, minimum 2 mini-incubators - Communicatie: 4 imagocampagnes - Personeel: 3 FTE's, waarvan 1 consultant Brexit
Outcome	- Bedrijfssubsidies: innovatieve bedrijven rechtstreeks subsidiëren om de export richting VK en wereldwijd te ondersteunen. - Communicatie: imagocampagnes om de Vlaamse agrovoeding en sierteeltsector te promoten in het VK en onze marktpositie daarbuiten te versterken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	project wordt gefinancierd vanuit BAR (Brexit Adjustment Reserve) inhoudelijk aanpassing is nodig om in overeenstemming te zijn met de BAR-regelgeving. Dossier VR in voorbereiding
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bedrijfssubsidies: de oproep incubator 2021 is gelanceerd	2021 Q1	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering incubator 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: oproep incubator 2022 is gelanceerd	2022 Q1	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering incubator 2022	2022 Q2	Op schema	
Bedrijfssubsidies: oproep mini-incubator 2021 is gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering mini-incubator 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
bedrijfssubsidies: oproep mini-incubator 2022 is gelanceerd	2023 Q3	Nog niet gestart	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering mini-incubator 2022	2022 Q4	Nog niet gestart	
communicatie: imagocampagne VK (mediaplan B2B)	2021 Q2	Gerealiseerd	
communicatie: imagocampagne VK (prinselijke missie)	2022 Q4	Op schema	
communicatie: campagne marktpositie versterken (twee prospecties)	2022 Q4	Op schema	
personeel is aangeworven	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aanwerving personeel in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren	3	2021 Q4	3	100 %
Bedrijfssubsidies in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: oproep incubator	2	2022 Q1	1	100 %
bedrijfssubsidies in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: oproep mini-incubator	2	2022 Q4		
Communicatie in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: imagocampagne	4	2022 Q4	1	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	3.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 3.000.000 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 26 februari 2021

VV108 - SUBSIDIES AAN BEDRIJVEN (FINANCIËLE STEUN VOOR BEDRIJVEN, KOSTENVERLAGING VOOR DEELNAME AAN BEURZEN, ONDERSTEUNING VOOR BREXIT) + INZET VAN CONSULTANTS OM VLAANDEREN IN HET BUITENLAND TE PROMOTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	De belanghebbenden van deze maatregelen zijn de in Vlaanderen actieve bedrijven of buitenlandse bedrijven met plannen voor een investering in Vlaanderen/Europa

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
Ondersteuning van bedrijven die getroffen werden door de gevolgen van Brexit in hun exportgeoriënteerde activiteiten en het versterken van onze inspanningen om investeringen aan te trekken naar Vlaanderen in het kader van de ontwikkelingen met betrekking tot Brexit

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	30.000.000 EUR
Output	De maatregelen uit deze actie hebben in het kader van de relance tot doel: 1.exporterende bedrijven die geïmpacteerd zijn door Brexit te helpen bij ofwel het behouden/heroveren/uitbreiden van hun marktaandeel in het VK ofwel de impact van Brexit op hun handelsactiviteiten te compenseren door actief nieuwe markten en exportbestemmingen te gaan opzoeken buiten het VK. Subsidies, extra steun en bijzondere acties moeten hen helpen om meer te doen dan gebruikelijk en dit sneller en intensiever uit te voeren dan in reguliere omstandigheden. 2.in een aarzelande onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.
Outcome	Behoud en groei van de exportcapaciteit van Vlaanderen Behoud en groei van het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Het project VV108 - gefinancierd door de Brexit Adjustment Reserve- werd begin oktober 2021 (bij de goedkeuring van de BAR door het Europees Parlement) geconfronteerd met een engere en striktere interpretatie door de Commissie van wat onder dit fonds kan gefinancierd worden. De link met het VK werd sterker in de verf gezet wat tot een beperktere toepassing leidde. De Nota die de basis vormde voor deze VV108 moest bijgevolg node aangepast worden aan deze striktere interpretatie door DG Regio. Dit resulteerde in een nieuwe basisnota die op 18 maart 2022 werd voorgelegd en goedgekeurd door de Vlaamse regering. Ondertussen blijft Brexit een jojo van voorziene maar dan weer uitgestelde maatregelen die de nood aan acties en begeleiding van onze Vlaamse bedrijven nog steeds hoog op de agenda zet. De Prinselijke missie naar het VK van 9 tot 12 mei 2022 vormde het startschot voor de vernieuwde actiegedreven en bedrijfsgerichte uitvoering van VV108. Acties en begeleiding van bedrijven in opvolging van de missie zullen actief verder gezet worden in de komende maanden. Alles werd bovendien in stelling gebracht om begin juni 2022 opnieuw een oproep voor Bijzondere exportsteun BAR op te starten. Op deze manier wordt de nieuwe Nota aan de Vlaamse regering van 18 maart 2022 onmiddellijk in de praktijk gezet.
Noodzakelijke politieke actie	De Nota aan de Vlaamse regering werd op 18 maart 2022 goedgekeurd door de Vlaamse regering.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Brexitcall 08/02/2021 tot 31/03/2021	2021 Q1	Gerealiseerd	134 steunaanvragen werden goedgekeurd
Brexitcall 15/06/2021 tot 27/08/2021	2021 Q3	Gerealiseerd	39 dossiers goedgekeurd
Brexitcall 27/09/2021 tot 12/11/2021	2021 Q4	Gerealiseerd	19 dossiers goedgekeurd
Brexitcall januari 2022	2022 Q1	Gerealiseerd	15 dossiers goedgekeurd
Brexitcall juni 2022	2022 Q2	Op schema	
Subsidies: aanwenden van de bijzondere exportsteun en het starterspakket internationalisering	2022 Q4	Op schema	
Extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven mbt brexit	2022 Q4	Op schema	
Lead generation Dwz de prospectie naar en het aanleggen van een database met potentiële buitenlandse investeringen (in dit geval met behulp van derden, de zgn 'lead generators') waar dan verder via begeleiding op ingezet wordt om buitenlandse investeringen in Vlaanderen te realiseren.	2022 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Versterken van de acties tot internationale diversificatie door het toevoegen van een culturele omkadering	2022 Q4	Op schema	
Kostenverlaging voor deelname aan acties van Flanders Investment & Trade	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
<p>De maatregelen uit deze actie hebben in het kader van de relance tot doel:</p> <p>1. exporterende bedrijven die geïmpacteerd zijn door Brexit te helpen bij ofwel het behouden/heroveren/uitbreiden van hun marktaandeel in het VK ofwel de impact van Brexit op hun handelsactiviteiten te compenseren door actief nieuwe markten en exportbestemmingen te gaan opzoeken buiten het VK.</p> <p>Subsidies, extra steun en bijzondere acties moeten hen helpen om meer te doen dan gebruikelijk en dit sneller en intensiever uit te voeren dan in reguliere omstandigheden.</p> <p>2. in een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.</p>		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.006.000 EUR
Uitvoering VEK	2.847.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 30.000.000 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2020: VR 2020 1812 DOC.1581/1BIS](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 maart 2022. Maatregelen met betrekking tot het internationaal ondernemen ten behoeve van de door de Brexit geïmpacteerde bedrijven gefinancierd uit de Brexit Adjustment Reserve](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV179 - Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen](#)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering voorziet 83 miljoen euro extra relancemiddelen voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de Brexit. Daarvan is 30 miljoen euro voorzien voor FIT, 50 miljoen euro voor VLAIO, en 3 miljoen euro voor VLAM.

Volgende gerichte steunmaatregelen voor de betrokken doelgroepen worden binnen het voor VLAIO vooropgestelde budget van 50 miljoen euro gerealiseerd.

1. Post-Brexit Veerkrachsubsidie. Extra relancebudget voor 2021 en 2022 telkens 14,3 miljoen euro.

Deze oproep is gericht op bedrijven die omwille van Brexit hun strategische businessplannen duurzaam moeten omvormen en vervolgens die transformatie implementeren. De doelgroep voor deze oproep zijn dus: Kmo's die getroffen zijn door de gevolgen van de Brexit, hetzij direct in hun export- en importactiviteiten, hetzij indirect omwille van problemen bij outsourcing, insourcing, disruptie in hun waardeketen,

2. Gerichte Transformatie Opleidingen. Extra relancebudget 5 miljoen euro.

SYNTRA gaat opleidingen organiseren die ondernemers in staat stelt om de uitdagingen van BREXIT te counteren.

3. Versterking Brexit Helpdesk

De Helpdesk geeft antwoorden op vragen die ondernemingen hebben aangaande Brexit. Voornamelijk betreffen deze vragen export-gerelateerde thema's.

4. Vlaams Green Lane project. Extra relancebudget 2 miljoen euro

Een project dat de administratieve afhandeling van douanedocumenten voor Vlaamse bedrijven zal moeten faciliteren via een digitaliseringsproject dat in 2022 zal kunnen starten in een pilootfase, met medewerking van de Belgische douane en de Vlaamse zeehavens.

5. Ontwrichte Zone

Er wordt onderzocht of er bijkomende ontwrichte zones in Vlaanderen haalbaar zijn. In een ontwrichte zone is er een tijdelijke vermindering van de loonkost voor bijkomende duurzame tewerkstelling.

PROJECTOMSCHRIJVING

6. Uitbreiding VLAIO Contract Ondernemerschap en DYZO

Voor 2021 en 2022 extra relancebudget van telkens 2.350.000 euro. Voor DYZO 150.000 euro voor 2021 en 2022. VLAIO gaat met de geschikte partners in het contract Ondernemerschap in gesprek om voorstellen – die zich situeren op het niveau van informatieverschaffing, individuele begeleiding, collectieve begeleiding, lerende netwerken op het vlak van bedrijfsvoering voor Brexit-gerelateerde import/exportthema's af te wachten.

Met de middelen voorzien in het Brexit-actieplan van de Vlaamse Regering voor de versterking van de dienstverlening ondernemerschap, zullen - na hierover het advies van de Inspectie van Financiën ingewonnen te hebben - aanvullende diensten besteld worden bij verschillende partners uit het contract.

Met name bij:

- Netwerk Ondernemen;
- Unizo;
- Voka;
- het Industrieconsortium, en met name bij de partners Fevia, Fedustria en Agoria

DYZO vzw - dat ondernemingen in moeilijkheden helpt - krijgt extra middelen voor de aanwerving van twee personeesleden.

7. Versterken van het aantrekken of behoud van investeringen, extra relancebudget 10 miljoen euro

Om nieuwe investeerders te ondersteunen wordt het bestaande budget van Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun versterkt met 10 miljoen euro. De focus ligt op Brexit gerelateerde investeringen.

Er worden ook 8 extra personeesleden voorzien voor een periode van één jaar ter versterking van de Helpdesk en het team Veerkrachtsubsidie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	50.000.000 EUR
Output	<ol style="list-style-type: none">1. Post-Brexit Veerkracht subsidie : er lopen enkele tientallen dossiers.2. Gerichte Transformatie Opleiding : de eerste opleidingen starten medio september3. Versterking Brexit helpdesk. Er zijn drie personeesleden aangeworven. Er werden 478 vragen beantwoord.4. Vlaams Green Lane Project. Een eerste fase van het studieproject door VIL/Deloitte is goedgekeurd.5. Ontwrichte zone. Er wordt permanent gemonitord of er een bijkomende zone mogelijk is.6. Uitbreiding VLAIO Contract Ondernemerschap en VIZO.7. Versterken van het aantrekken of behoud van investeringen. Er zijn nog geen dossiers goedgekeurd.
Outcome	Momenteel beperkt de output zich tot het verstrekken van antwoorden op Brexit gerelateerde vragen van ondernemers, en het geven van veerkracht subsidies. De andere instrumenten (opleidingen, extra subsidies, Green Lane, uitbreiding Contract Ondernemerschap, Ontwrichte Zone) zijn nog in opbouw, of worden nog niet gebruikt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus **In uitvoering na agendering VR**

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	<p>1. Post-Brexit Veerkracht subsidie In totaal werden 64 aanvragen ingediend (tegen 54 in 2021 en 10 in 2022). Positief: 35 Negatief: 2 Onontvankelijk: 12 Teruggetrokken: 3 In behandeling: 12 Het totaal toegekende steunbedrag is € 1.189.055,00.</p> <p>2. Gerichte Transformatie Opleidingen De opleiding 'Brexit-proof maken van KMO's' bestaat uit drie, met in totaal vier cursisten. Deze modules zullen niet meer herhaald worden vanwege achterhaald. Er waren zestien cursisten voor de junior customs consultant opleiding (Syntra Midden Vlaanderen en Syntra Antwerpen -Vlaams Brabant. De bovenbouw naar 'Customs Consultant' werd in januari niet meer opgestart.</p> <p>3. Helpdesk Brexit Aard van de vragen : Algemeen : 89 Brexit Subsidies/VLAIO : 75 Britse invoerformaliteiten : 83 Btw : 40 Contracten : 7 Diensten : 47 Douaneformaliteiten : 206 Etikettering :10 Exportvergunningen/certificaten : 44 Invoer in België/Invoerrechten : 51 Noord-Ierland :12 Oorsprongsregels :54 Paletten : 3 REACH : 1 Standaarden (CE/UKCA) : 33 Vrije verkeer personen : 32 Ierland : 4 Vrijhandelsakkoord : 3 Totaal aantal vragen : 793</p> <p>4. Flanders Green Lane De studie naar de haalbaarheid werd uitgevoerd (VIL & Deloitte), in de lopende fase worden de pilootprojecten gedefinieerd.</p> <p>5. Vlaanderen Ontwrichte Zone Er is geen nieuws te melden over deze doelstelling.</p> <p>6. Contract Ondernemerschap Er werden in totaal reeds twintig acties door de partners opgezet ; Netwerk Ondernemen (één actie), Voka Shared Services (vijf acties) Unizo (twaalf acties), Sirris Agoria (twee acties). Het totaal aanvaarde subsidie bedrag : 290.466 euro.</p> <p>7. Extra middelen Brexit-gerelateerde Investeringssteun Er is geen Strategische Transformatiesteun of Strategische Ecologiesteun toegekend aan Brexit gerelateerde investeringsprojecten.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gerichte Transformatie Opleidingen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Uitbreiding Contract Ondernemersschap & DYZO,	2021 Q2	Gerealiseerd	
Green Lane. Eerste deel studie aangevat	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Versterken/aantrekken/behoud investeringen door extra middelen aan te bieden. Eerste dossier goedgekeurd	2021 Q2	Op schema	
Brexit Helpdesk - aanwerving extra personeel	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opleidingen Syntra. Eerste opleidingen aangevat	2021 Q3	Op schema	
VLAIO Contract Ondernemerschap. Eerste contracten getekend	2021 Q3	Op schema	
Versterking Brexit Helpdesk	2021 Q3	Gerealiseerd	
Post-Brexit Veerkrachtsubsidie.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Brexit Veerkrachtsubsidie	2022 Q2	Gerealiseerd	
Flanders Green Lane	2022 Q4	Op schema	
Versterken (directe en indirecte) STS en STRES Aantrekken of behoud van investeringen	2022 Q4	Gerealiseerd	
West-Vlaanderen Ontwrichte Zone	2022 Q4	Nog niet gestart	
Ontwrichte Zones in Vlaanderen	2022 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.022.000 EUR
Uitvoering VEK	2.018.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 50.000.000 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur

VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Belanghebbenden	Lokale besturen, brede MICE-sector, toeristische logies

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Door de COVID-crisis zijn bestaande trends op vlak van MICE-toerisme in een stroomversnelling terechtgekomen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan hybride events, het belang van belevingstoerisme, ... Om de concurrentiepositie van Vlaanderen als MICE-bestemming te vrijwaren, wil dit project focussen op capaciteits- en kwaliteitsverhoging van bestaande MICE-infrastructuren en nieuwbouw waar nodig. Waar mogelijk wordt ook een culturele nevenbestemming nagestreefd. De deelprojecten zullen als publiek-private samenwerking worden uitgevoerd.

4 x 5 MEUR beschikbaarheidsvergoedingen

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	Met de realisatie van de deelprojecten binnen dit project, wensen we de kwaliteit van de infrastructuur te verhogen. Hierbij wordt specifiek ingespeeld op het gegeven dat meetings en congressen in de toekomst vaak een 'digitale' component zullen hebben. Deze hybride events waar een deel van de bezoekers fysiek aanwezig zullen zijn en een deel via digitale manier aanwezig kunnen zijn, vergen de nodige kwaliteitsvolle infrastructuur. Naast het element van de hybride events, willen we ook de beleving die de bezoeker krijgt te versterken.
Outcome	Het aantrekken van extra bezoekers naar Vlaanderen en (associatie)congressen zorgt voor economische meerwaarde voor Vlaanderen en zorgt op deze manier ook voor extra tewerkstelling.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
---------------	--------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Het eerste deelproject, de Corda Arena, werd op de Vlaamse regering van 6/5 goedgekeurd. Voor de andere deelprojecten lopen de onderhandelingen en die zullen in Q3/2022 aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG**MIJLPALEN**

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opzetten projectgroepen voor de verschillende infrastructuurprojecten	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing Vlaamse regering	2022 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Goedkeuring VR op 6 mei 2022 Corda Campus: subsidie project Corda Arena](#)

VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Toerisme Vlaanderen - Agentschap Onroerend Erfgoed - Departement Cultuur, Jeugd en Media - Agentschap Natuur en Bos
Belanghebbenden	Provinciale en lokale besturen, publieke en private toeristische actoren, erfgoedgemeenschappen, binnen- en buitenlandse bezoekers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project beoogt gerichte investeringen te doen in toeristische infrastructuur. Hierbij wordt enerzijds gemikt op investeringen die op korte termijn leiden tot economisch herstel van onze sector, kwaliteitsverbetering van ons aanbod, aantrekken van binnen- maar vooral ook buitenlandse. Anderzijds wordt ook gekeken naar inspanningen gericht op de langere termijn (bv aanpassen wetgevend kader, oproepen voor meerjarige investeringen in duurzaamheid, opbouw van netwerken van sites maar ook van verhalen en van partners).

Deze middelen worden ingezet op infrastructuurprojecten die het potentieel hebben om op beide vlakken een hefboomeffect te realiseren. Daarbij dient vermeld te worden dat elke euro (overheids)investering in toerisme een multiplicatoreffect heeft voor andere delen van de economie (bvb de bouw, de retail, IT, diensten, de maakindustrie, de landbouw, de creatieve industrie etc). Er bestaat geen onderzoek over de totale impact maar deelstudies over economische return (omzetgroei, jobcreatie etc) geven grofweg een multiplicator van vier (cfr studies return Herdenking WO1 en tussentijdse resultaten Vlaamse Meesters). Dus elke euro geïnvesteerd in toerisme worden er vier in onze ruimere Vlaamse economie. Investeren in het zakentoeisme heeft een aanzienlijk hogere return in spenderingen (x 2,5) dan in vrijetijdstoerisme, maar de tendens is dat de grens tussen beiden vager wordt (impact op spenderingen nog niet gekend). Effecten van investeringen in toerisme zijn bovendien niet enkel economisch, maar ook breed maatschappelijk, cultureel, sociaal,...

Inhoudelijk wordt hierbij in de eerste plaats gekeken naar projecten die aansluiten bij de thematische krachtlijnen uit de beleidsnota toerisme. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden om deze thema's versneld en versterkt uit te rollen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	50.000.000 EUR
Output	Zowel via gerichte investeringen als de oproepen wensen we een kwaliteitsopwaardering te doen van de toeristische infrastructuur. De kwaliteit zal gemeten worden door de tevredenheid van de bezoeker te bevragen over de beleving na realisatie.
Outcome	Kwalitatieve belevingen in toeristische infrastructuur zorgt voor het aantrekken van buitenlandse bezoekers en voor een meerwaarde voor de bewoners. Ook de toeristische ondernemers zullen een meerwaarde ondervinden. In lijn met de visie van Toerisme Vlaanderen zal er gestreefd

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	worden naar een evenwicht tussen de meerwaarde voor de bezoeker, bewoner, ondernemer en de plek zelf.
--	---

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De verschillende subsidieoproepen zijn gelanceerd. In Q2 ligt de deadline voor indienen van projecten. Tegen eind 2022 zijn alle begunstigden gekend. Voor de andere projectsubsidies zijn de onderhandelingen bijna afgerond, zodat de meeste nog voor het zomerreces geagendeerd kunnen worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing Vlaamse regering (diverse beslissingen voor directe investeringen en de subsidieoproepen)	2022 Q3	Op schema	
Beslissing begunstigden subsidieoproepen	2022 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.500.000 EUR
Uitvoering VEK	833.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 50.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van recreatief en sportief fietsen en bierbeleving](#)

[Reizen naar morgen. Mijn beleid Onze relance. Brochure](#)

[De Vlaamse Regering. Relanceplan voor de toeristische sector](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 11 maart 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relance projectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van recreatief- en sportief fietsen en bierbeleving](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van recreatief en sportief fietsen en bierbeleving](#)

[Advies van de Raad van State van 2 maart 2022](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 22 april 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van Vlaamse Meesters, natuur en culinaire belevingen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van Vlaamse Meesters, natuur en culinaire belevingen](#)

[Advies van de Raad van State van 13 april 2022](#)

[Reizen naar morgen. Mijn beleid. Onze relance. Brochure](#)

[Relanceplan voor de toeristische sector](#)

20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs

VV112 - VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Belanghebbenden	Instellingen hoger onderwijs

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING

Het Voorsprongfonds zal ons hoger onderwijs sterker, flexibeler en digitaler maken. In de toekomst zal het digitale immers nog veel meer dan vandaag een rol spelen in onze samenleving. De coronacrisis heeft ons een gouden kans gegeven daarop in te zetten. Bovendien zijn we ons tegelijk ook bewust geworden van het onmisbare belang van het tastbare en het fysieke in ons leven. Het komt er nu op aan daar ons voordeel mee te doen.

We vertrekken vanuit de kansen die zich postcorona voordoen en pakken tegelijkertijd de structurele uitdagingen aan. We mikken op vernieuwingen die het hoger onderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte/maatschappelijke focus, een focus op levenslang leren en een 21ste eeuwse, digitaal karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en verduurzaming staan voorop. Om deze ambitie waar te maken richten we ons op 3 inhoudelijke speerpunten :

1. De uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio dat toekomstbestendig en wendbaar is
Binnen dit speerpunt zullen we inzetten op de implementatie van trajecten die leiden naar een toekomstbestendig en wendbaar opleidingsportfolio in alle hogeronderwijsinstellingen, de heroriëntering van curricula en een breed proces naar een nieuwe profilering van hoger onderwijs in Vlaanderen.
2. Veel meer mogelijkheden aanreiken om levenslang te leren binnen het hoger onderwijs
Binnen dit speerpunt kunnen hogeronderwijsinstellingen concrete initiatieven vormgeven die zich richten op het (her)ontwerpen van hun opleidingsaanbod om het toegankelijk en wendbaar te maken met het oog op levenslang leren. Daarnaast zal er werk gemaakt worden van Vlaamse visie rond levenslang leren in hoger onderwijs.
3. Volop inzetten op digitale onderwijsvormen
Het Voorsprongfonds wil onderwijsinstellingen ondersteunen bij het kwaliteitsvol verduurzamen van nieuwe werkvormen binnen het hoger onderwijs waarbij een ideale mix van fysiek onderwijs op de campus en digitaal onderwijs op afstand wordt nagestreefd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	60.000.000 EUR
Output	7 instellingen voor hoger onderwijs hebben gebruik gemaakt van het Voorsprongfonds Hoger Onderwijs (RFF mijlpaal)
Outcome	Visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs (RFF mijlpaal) Met het Voorsprongfonds wil de Vlaamse Regering instellingen aanzetten om zich anders te organiseren, zodat hun aanbod toekomst gericht en wendbaar is, en klaar voor de uitdagingen die zich de komende jaren nog zullen stellen. Zo wil de Vlaamse Regering, samen met de instellingen voor hoger onderwijs zorgen voor kwaliteitsvol, rationeel aanbod, dat toekomstbestendig, wendbaar, duurzaam en digitaal is.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Met het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ (VV112), zoals gewijzigd op 17 december 2021, heeft de Vlaamse Regering de toekenning van projectmiddelen voor de projecten, uitgevoerd door de instellingen hoger onderwijs opgestart. De projectuitvoering hiervan loopt. Daarnaast werd , conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 april 2021, betreffende het opzetten van een Beheers- Controle en Auditsysteem bij de projecten ingediend in het kader van de Europese Faciliteit voor Veerkracht en Herstel, een beheers- en controlesysteem uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd. Als laatste element werd gestart met de voorbereidingen voor het opstarten van de twee visietrajecten die opgenomen werden als mijlpalen, nl, een visie op levenslang leren in het hoger onderwijs en een visie op een landschap hoger onderwijs.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt de visienota Voorsprongfonds hoger onderwijs goed.	2021 Q1	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering kent de projecttoelages goed, op basis van plannen ingediend door de hogescholen en universiteiten.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Het traject voor de opmaak van een visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs is opgestart.	2022 Q2	Op schema	de voorbereiding voor deze mijlpaal werd opgestart.
Tussentijdse opvolging van de projecten die een toelage ontvangen van het Voorsprongfonds hoger onderwijs.	2022 Q4	Nog niet gestart	
7 instellingen voor hoger onderwijs hebben deelgenomen aan het Voorsprongfonds. (RFF mijlpaal)	2023 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs is beschikbaar en goedgekeurd door de minister, bevoegd voor hoger onderwijs.	2023 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal instellingen die deelnemen aan het VPF	7	2023 Q4		50 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	59.252.000 EUR
Uitvoering VEK	3.125.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 53.800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' (VV112)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' \(VV112\)](#)

Beslissing van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, voor het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds

[Nota aan de Vlaamse Regering van 26 februari 2021. Visienota. Voorsprongfonds hoger onderwijs](#)

[Visienota Voorsprongfonds Hoger Onderwijs. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, tot het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds](#)

[Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, tot het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds. Bijlage](#)

21. Digitalisering zorgbeleid

VV113 - BLENDED-CARE JEUGDHULP - BANDBREEDTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Digitaal Vlaanderen - Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Jongeren, gezinnen, netwerk van een jongere of een gezin Agentschap Opgroeien Private welzijns- en jeugdhulpvoorzieningen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Tijdens Corona hebben de digitale kanalen versneld ingang gevonden in zorg en welzijn. Online-begeleiding staat 'an sich' ook niet meer ter discussie. De oplossingen die men tijdens de eerste Corona-golf koos waren pragmatisch en dienden het hogere belang 'beter op deze manier contact, dan geen contact', maar waren niet informatieveilig, noch privacy-proof en ook niet geïntegreerd in het begeleidingsproces.</p> <p>Met het project Bandbreedte willen we onze ondersteuning binnen de jeugdhulp verbreden en versterken. Dat zorgt letterlijk voor extra bandbreedte. Méér manieren om onze jongeren te ondersteunen en bredere wegen om bij Jeugdhulp terecht te komen, zowel online als offline. We willen blended werken duurzaam ingang laten vinden in de jeugdhulp in Vlaanderen en de jongeren en hun gezin transparantie bieden over eigen gegevens en in hun kracht zetten. Daarmee streven we volgende 4 doelstellingen na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitale vormen van contact zoals chatten en beeldbellen zijn vandaag meer en meer ingeburgerd in het leven van jongeren en ouders. Deze vormen van contact verlagen de drempels en maken contact mogelijk op momenten dat dit omwille van afstand, tijd of andere redenen (bv. een gezondheids crisis) niet mogelijk is. Binnen de hulpverlening blijft er zeker een grote nood aan reële (face to face) nabijheid. Digitale contacten kunnen en mogen deze nabijheid nooit vervangen, maar kunnen wel versterkend werken. Tegelijk moet, wanneer gekozen wordt voor digitale instrumenten, eenzelfde veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Een hulpverleningsgesprek wordt ook niet georganiseerd op plaatsen waar iedereen kan meeluisteren. Daarom investeren we in veilige beeldbeltools en chatfuncties. 2. De digitale transformatie naar blended care staat nog maar aan het begin. Online tools creëren een heel nieuw gamma aan mogelijkheden. Ze verrijken de hulpverlening, ondersteunen de face to face-contacten, vergroten de autonomie van jongeren en hun ouders. Het zijn instrumenten om jongeren en ouders te empoweren, ook op momenten dat de hulpverlener niet aanwezig is. Blended care sluit nauw aan bij de leefwereld van de jongere, versterkt het eigenaarschap en maakt hulpverlening aangenamer en

PROJECTOMSCHRIJVING

doeltreffender. Blended care houdt ook risico's in op versnippering, datalekken, gebrek aan transparantie. Iedere app of website is hopelijk beveiligd op zichzelf, maar voor jongeren betekent dit vooral zich telkens opnieuw aanpassen, aanmelden, een andere gebruikerservaring etc. Dit is een cruciaal aandachtspunt als we blended care echt willen laten slagen. Daarom investeren we in blended care en het opzetten van een changetraject binnen de sector jeugdhulp.

3. Transparantie en toegankelijkheid van eigen gegevens zijn basisrechten. We willen de regie over die gegevens veel meer in eigen handen van jongeren geven. Het zijn immers hun eigen gegevens. Jongeren zullen zelf ook mee kunnen bepalen wie welke gegevens over hen te zien krijgt. We werken aan een schakelbord waarin ze die toegangen zelf kunnen beheren. Daarom investeren we in een "jongerenprofiel" (burgerprofiel) binnen ikgroeioop.be.

4. Gezinnen en jongeren vragen naar geïntegreerde samenwerking tussen hulpverleners, en vragen ook dat dit in alle transparantie en met betrokkenheid van henzelf gebeurt. Deze transparantie en samenwerking moet ook een vertaling krijgen in een digitale gedeelde werkruimte. We maken een grondige analyse samen met de stakeholders over welke tools en kwaliteitseisen er nodig zijn om goed digitaal te kunnen samenwerken. Daarbij zijn snelle en vlotte verbindingen en uitwisseling met onze eigen systemen noodzakelijk. Daarom investeren we in digitale werkruimtes die samenwerking vergemakkelijken.

Bij het bereiken van deze 4 doelstellingen zal maximaal ingezet worden in de integratie in bestaande zorginformatiesystemen en zullen ook de mogelijkheden om het breder in te zetten in het welzijnslandschap in Vlaanderen bekeken worden.

Bij digitale zorginnovatie moet naast de technische ontwikkeling altijd 75% van de middelen geïnvesteerd worden in de sociale adoptie van deze digitale zorginnovatiesystemen. E-inclusie staat hier voorop als belangrijk designprincipe. De 4 belangrijke pijlers (toegang, motivatie, digitale vaardigheden & ondersteuning) van E-inclusie worden dus meegenomen in het plan van aanpak van iedere doelstelling op zich. Project breed investeren we dus in het opzetten van een communicatie en changetraject en zetten we een participatiepool op van jongeren en hun sociaal netwerk.

Waar mogelijk leggen we intersectorale linkjes om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	<p>Tegen eind 2023 kunnen alle jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen veilig online communiceren met elkaar.</p> <p>Tegen eind 2023 hebben minstens 70% van alle gesubsidieerde jeugdhulporganisaties van opgroeien (202 voorzieningen) een trekker of mediacoach die mediawijsheid intern en extern opvolgt</p> <p>Tegen eind 2023 heeft van de 202 gesubsidieerde instellingen jeugdhulp waarin ongeveer 10 000 medewerkers tewerkgesteld zijn heeft minstens 10% van de werknemers één of meerdere modules blended-care competenties gevolgd en binnen minstens 50 % van de gesubsidieerde instellingen heeft één werknemer een train-the-trainer in huis inzake de mix van de verschillende modules blended-care.</p> <p>Tegen eind 2023 is een advies gegeven en heeft het agentschap Opgroeien zijn positie bepaald inzake het gebruik van een gedeelde digitale werkruimte voor jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en de hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen</p> <p>Tegen eind 2023 kunnen alle jongeren in Vlaanderen vanaf 12 jaar inloggen in mijnburgerprofiel en via hun jongerenprofiel hun gegevens inzake de jeugdhulp inkijken</p> <p>Tegen eind 2023 is het duidelijk voor jeugdhulpactoren welke rol het agentschap Opgroeien zal innemen inzake het gebruik van een digitale werkruimte.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome	<p>Veilig online communiceren voor jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen</p> <p>De blended hulp competenties; mediawijsheidscompetenties en e-inclusiecompetenties verhogen binnen de jeugdhulporganisaties in Vlaanderen om zo de digitale transformatie binnen de jeugdhulp verder te realiseren en te implementeren. Het opleiden van een mediacoaches en blended-care coaches binnen jeugdhulporganisaties en het beschikbaar stellen van ondersteunde info en materiaal is hierin cruciaal.</p> <p>Snelle toegang en transparantie tot eigen gegevens in de jeugdhulp realiseren.</p> <p>Hulpverleners en gezinnen kunnen veilig gegevens delen met elkaar en samenwerken</p>
---------	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Momenteel zijn alle acties lopende zoals geagendeerd op de Vlaamse regering.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Vorbereiding: Opmaken van plan van aanpak	2021 Q2	Gerealiseerd	
Algemeen: Schrijven en agenderen eerste nota Vlaamse Regering van het project Bandbreedte	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 1: Gebruikersonderzoek door Ipsos in samenwerking met digitaal Vlaanderen inzake gebruikerservaringen inzake online communiceren	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 1: Rapport Ipsos inzake de gebruikerservaring van jongeren en hun sociaal netwerk inzake online communicatie en beschrijving van de vereisten inzake de communicatieoplossing	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Schrijven van overheidsopdracht "organiseren van mediacoach opleidingen" en publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Schrijven en publiceren van overheidsopdracht voor het oprichten en begeleiden van een adviesgroep om te komen tot een	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
voorstel van visie en positionering van blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid			
Pijler 2: Schrijven van overheidsopdracht en publiceren ervan voor het ontwikkelen van materiaal inzake mediawijsheid en e-inclusie dat de sector jeugdhulp kan gebruiken in de zorgtrajecten van jongeren en ouders	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Schrijven overheidsopdracht "het ontsluiten en implementeren van veilige digitale tools om blended werken binnen de jeugdhulp te versterken" en het publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Schrijven en publiceren van bestek voor het verhogen van digitale competenties bij jeugdhulpmedewerkers in online en blended hulpverlening.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: uitschrijven overheidsopdracht "Ontwikkelen van kaders voor organisaties jeugdhulp" en het publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning van bestek voor het oprichten en begeleiden van een adviesgroep om te komen tot een voorstel van visie en positionering van blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning van bestek ontwikkelen van materiaal inzake mediawijsheid en e-inclusie dat de sector jeugdhulp kan gebruiken in de zorgtrajecten van jongeren en ouders	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning van bestek "Ontwikkelen van kaders voor organisaties jeugdhulp "	2021 Q4	Nog niet gestart	Omwille van langdurige afwezigheid expert werd dit voorlopig uitgesteld en werd de gunning on-hold gezet.
Pijler 2: Gunning bestek "het ontsluiten en implementeren van veilige digitale tools om blended	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
werken binnen de jeugdhulp te versterken"			
Pijler 2: Gunning bestek het verhogen van digitale competenties bij jeugdhulpmedewerkers in online en blended hulpverlening.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning van bestek organiseren van mediacoach opleidingen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Investeren in en implementeren van blended-care jeugdhulp – integratie van zorginformatiesystemen (oplevering haalbaarheidsstudie blended care platform)	2022 Q3	Op schema	De ingeplande workshops werden uitgevoerd en de laatste gesprekken zijn afgewerkt. De haalbaarheidsstudie wordt opgeleverd 30 juni 2022
Pijler 3: Ontsluiting van jeugdhulphistoriek via Mijn Burgerprofiel voor minderjarigen	2021 Q4	Gerealiseerd	Op 14 februari 2022 werd dit gerealiseerd
Pijlers 4: Schrijven en publiceren van bestek voor onderzoek naar behoefteanalyse voor digitale werkruimte	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijlers 4: Gunning van bestek voor onderzoek naar behoefteanalyse voor digitale werkruimte	2021 Q3	Gerealiseerd	
Pijler 4: Oplevering onderzoek behoefteanalyse digitale werkruimte	2022 Q1	Gerealiseerd	
pijler 2: opzet en lanceren portaalpagina bandbreedte	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 14 februari werd de portaal-site www.opgroeien.be/bandbreedte gelanceerd.
Algemeen: kaderovereenkomst afsluiten met Digitaal Vlaanderen voor digitale strategie en roadmap	2022 Q1	Gerealiseerd	
Algemeen: nota vlaamse regering fase 2	2022 Q1	Gerealiseerd	
pijler 2: kick off: bekendmaking bandbreedte voor jeugdhulpsector	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 14 februari was de kick-off Bandbreedte. Meer dan 240 deelnemers waren aanwezig
pijler 4: opmaak roadmap digitale werkruimte	2022 Q2	Op schema	Onderdeel van opmaak digitale strategie + roadmap ism digitaal Vlaanderen en PWC

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
pijler 3: opmaak roadmap portaal minderjarigen (werktitel ikgroeiop)	2022 Q3	Op schema	Onderdeel van opmaak digitale strategie + roadmap die opgemaakt wordt ism digitaal vlaanderen en PWC
pijler 1: opmaak roadmap veilig online communiceren (ism Digitaal Vlaanderen)	2022 Q3	Op schema	
pijler 2: Gunning Extra modules digitale competenties	2022 Q3	Op schema	Naast de bestaande gunning waar men zich focust op chatten, beeldbellen en mailen in de jeugdhulp wordt nu ook werk gemaakt van de implementatie van blended hulpverleners, online informeren en het uitwerken van train-the -trainer pakketten.
pijler 4: digitale werkruimte: proeftuinen	2022 Q3	Op schema	voorbereiding proeftuinen gestart
Pijler 2: in kader van experimenten wordt een experiment en upgrade opgestart van het gebruik van de Live-city app in de jeugdhulp	2022 Q3	Op schema	Binnen de afdeling OSD gaan ze aan de slag met de live-city in hun gesprekken met jongeren en kijken ze hoe de upgrade van het product matched met hun werking
pijler 3: digitaal aanvragen van inzage in dossier via mijn burgerprofiel	2022 Q4	Op schema	Analyse met digitaal vlaanderen gestart
pijler 3: ontsluiten van rekeningnummer, aangemaakt door Opgroeien in MBP	2022 Q4	Op schema	
pijler 4: start uitvoering roadmap digitale werkruimte	2022 Q4	Op schema	Opstart proeftuinen vanaf najaar 2022
pijler 3: start uitvoering roadmap portaal voor eigen inzage minderjarigen	2022 Q4	Nog niet gestart	
pijler 1: start uitvoering roadmap veilig online communiceren	2022 Q4	Op schema	Onderdeel van de digitale strategie + roadmap ism met digitaal Vlaanderen en PWC
Opmaak digitale Strategie + roadmap Opgroeien	2024 Q3	Op schema	Deze oefening is een samenwerking met digitaal Vlaanderen die wordt begeleid door PWC

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
webpagina bandbreedte voor ontsluiten van opgeleverd materiaal: gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand. (ongeveer 10000 jeugdhulpmedewerkers)	2000	2022 Q1	2.139	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
kickoff voor sector jeugdhulp	aantal deelnemers - 150	2022 Q1	247	100 %
een roadmap digitale strategie voor Opgroeien		2022 Q3		
digitale strategie + roadmap	Oplevering document met strategie + roadmap	2022 Q3		
Eerste advies inzake visie blended werken in een geïntegreerd gezins-en jeugdbeleid	1 adviestekst	2023 Q1		
Met hoeveel kinderen zijn consulenten OSD binnen 1 jaar aan de slag gegaan met de live-cityapp	100	2023 Q2		
Hoeveel jeugdhulpmedewerkers volgden de module "Blended Hulpverlening" over één jaar (e-learning/fysiek/online/webinar/lerend netwerk)	100	2023 Q4		
Hoeveel jeugdhulpmedewerkers volgden over een heel jaar de train-the-trainer opleiding -digitale competenties	70	2024 Q4		
Aantal werknemers binnen de sector jeugdhulp die een opleiding mediacoach gevolgd hebben	142	2024 Q4		
Aantal apps voor kinderen en ouders die gescreend zijn om opgenomen te worden of niet op de welzijns-appstore	100	2024 Q4		
Aantal modules blended -care competenties die gevolgd werden door werknemers uit de jeugdhulpsector	1000	2024 Q4		
Beschikbare producten voor jongeren en ouders binnen die jeugdhulp inzake mediawijsheid en e-inclusie	50	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	919.000 EUR
Uitvoering VEK	136.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 18 juni 2021. Blended care jeugdhulp](#)

[Blended care jeugdhulp -indicatieve planning. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 4 februari 2022. Bandbreedte - Blended care jeugdhulp](#)

[Kaderovereenkomst tussen het Agentschap Opgroeien, Digitaal Vlaanderen en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie](#)

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

[VV114 - Digitale hulpverlening - kwaliteitsbevordering](#)

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel](#)

[VV116 - Elektronisch patiëntendossier - Geïntegreerd zorg en ondersteuningsplan](#)

VV114 - DIGITALE HULPVERLENING - KWALITEITSBEVORDERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitale hulp- en dienstverlening nam doorheen de covid-pandemie een groot deel van de fysieke hulpverlening over. Gelukkig kon men rekenen op bepaalde expertise bij een deel van de organisaties en een deel van het personeel. Zo bleken de chat- en telefoondiensten zeer corona-proof. In andere sectoren waren er al voorzichtige experimenten met online-hulp. Vandaag heeft het gros van de hulpverleners kennis gemaakt met onlinehulpverlening. Om de mogelijkheden hiervan te benutten, maar ook om te bewaken dat de kwaliteit van deze hulpverlening ook op een hoog niveau staat, moet de ondersteuning voor opleidingen en vorming of ondersteuning voor nieuwkomers op het terrein opgedreven worden. Als digitaal een echt alternatief wil zijn, ook post corona, moet deze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Aandachtspunt: waar mogelijk leggen we intersectorale linkjes om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	500.000 EUR
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ontwikkeling van een vernieuwd expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen 2) Aantal nieuwe partners die betrokken worden en nieuwe samenwerkingen die worden opgezet in het werkveld, de onderwijs- en onderzoeksector en andere steunpunten en koepels rond online en blended hulp- en dienstverlening in Vlaanderen; 3) Ontwikkeling van een onderzoeks- en ontwikkelingsportaal waardoor vraag en aanbod i.v.m. onderzoek en ontwikkeling rond online en blended hulp- en dienstverlening in Vlaanderen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 4) Het aantal beleidstrajecten dat ondersteund werd omtrent online- en blended hulp- en dienstverlening. 5) Aantal inspirerende praktijken, praktische handreikingen en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek over online- en blended werken die beschikbaar worden gesteld voor het brede werkveld via www.onlinehulp-vlaanderen.be; 6) Aantal personen bereikt met www.onlinehulp-vlaanderen.be en bijhorende communicatie-activiteiten; 7) Aantal gescreende websites en apps voor online en blended hulp voor de burger én voor de sociale, welzijns- en zorgprofessionals via www.onlinehulp-apps.be; 8) Aantal personen bereikt met www.onlinehulp-apps.be en bijhorende communicatie-activiteiten; 9) Aantal nieuwe opleidingen, vormingen, trainingen en procesbegeleidingsvormen rond "blended zorg" ontwikkeld en aangeboden via een vormingsportaal en vormingskalender via

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>www.onlinehulp-vlaanderen.be;</p> <p>10) Het aantal vormingen en begeleidingen gegeven aan organisaties en professionals in zorg en welzijn.</p>
Outcome	<p>1) Organisaties en professionals in zorg en welzijn kennen beter de weg naar het aanbod van Onlinehulp Vlaanderen rond online en blended hulpverlening;</p> <p>2) Organisaties en professionals in zorg en welzijn zijn versterkt in hun competenties op vlak van online en blended hulpverlening en bieden op een kwaliteitsvolle manier online of blended zorg en ondersteuning aan</p> <p>3) Steunpunten, koepels, federaties en belangenverenigingen zijn via een jaarlijks netwerkevenement gestimuleerd om te innoveren op het terrein van online en blended hulp.</p> <p>4) Actoren in zorg en welzijn ervaren een betere matching van hun vragen m.b.t. onderzoek en ontwikkeling voor online en blended hulp en het mogelijke aanbod.</p> <p>5) Betrokkenen bij de ondersteuning van een beleidstraject rond online en blended hulp zijn beter ondersteund in de realisatie van hun traject en bijhorende doelstellingen</p> <p>6) Er zijn meer organisaties, professionals, cliënten en burgers die op basis van hun noden de weg kennen naar een geschikte website of app voor zorg en welzijn en hiervan gebruik kunnen maken</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het project en ontwerpbesluit werd goedgekeurd na agendering VR op vrijdag 22 april 2022. Volgende activiteiten vonden verder plaats:</p> <p>1.1. WP1 - Onlinehulp Vlaanderen coördinatie en regie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teamvergadering op 11/03/2022 • Briefing partners op 26/04 en 29/04 • Eerste afstemming met de opdrachtgever op 2/05/2022 • Voorbereiding communicatieplanning en bespreking daarvan op 30/05/2022 • Voorbereiding eerste kwartaalrapportage • Voorbereiding tweede afstemming met de opdrachtgever, gepland op 1/06/2022 • Voorbereiding interne kick off die gepland staat op 13/06/2022 <p>1.2. WP 2 - Onderzoek en ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29/03/2022 Blender – innovatietafel voor online en blended sociaal welzijnswerk, welzijnswerk en zorg - met 21 deelnemers van steunpunten koepels en belangenverenigingen - er werden 7 onderzoeksthema's geformuleerd en geprioriteerd - er werden 14 ontwikkelingsthema's geformuleerd en geprioriteerd - daarnaast werden 11 nieuwe onderzoeks- of ontwikkelingsthema's geformuleerd - er werd besproken of en hoe onderzoeks- en ontwikkelingsvragen worden gecapteerd en welke rol koepels, steunpunten en Onlinehulp Vlaanderen hieraan kan besteden • de output van Blender wordt verwerkt en eind mei geplaatst op onlinehulp-vlaanderen.be <p>1.3. WP 3 – Leeraanbod</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introductieaanbod blended hulp - Organisatie van de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional". Deze vindt plaats op 22 september 2022 in De Kriekelaar in Schaarbeek. Het programma vindt u hier: https://www.samvzw.be/activiteiten/inspiratiedag-blended-aan-de-slag-als-sociale-professional. Deze dag is gericht op sociale, welzijns- en zorgprofessionals die aan de slag (willen) gaan met blended hulp. We voorzien inschrijvingsmogelijkheden voor 100 deelnemers. - Voorbereiding en opname van een webinar blended hulp op 19/04/2022 - Eerste ontwerp van de basistraining Blended hulp die in het najaar ontwikkeld zal

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>worden. Bepalen van de leerdoelen, inhoud en mogelijkheden verkennen van blended learning en e-learning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beeldbellen - Verbeteren van de draaiboeken voor de beeldbeltrainingen - Finetunen van de leerdoelen - Online workshop via Zoom: medewerkers in welzijnswerk en GGZ (blijven) enthousiasmeren. Een samenwerking tussen SAM en Arteveldehogeschool - Er werd een teaservideo ontwikkeld met getuigenissen van praktijkwerkers. • 05/05/2022 deelname aan de sociaal werk conferentie met twee workshops georganiseerd door Sandra Beelen (SAM, steunpunt Mens en Samenleving), Philippe Bocklandt & Jana Verplancke (Arteveldehogeschool) en Davy Nijs (Mediawijs) <p>1.4. WP 4 - Beleidsondersteuning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding intersectorale stuurgroep die gepland staat op 25/05/2022 • Overleg over ondersteuningsmogelijkheden van Onlinehulp Vlaanderen aan de reva-sector op 19/05/2022 <p>Voorbereidend overleg en feedback bij het uitwerken van een bevraging van professionals over de vormings- en ondersteuningsnoden bij het implementeren van blended hulp binnen de VAPH- sector</p> <p>1.5. WP 5 - Appstore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teambijeenkomst appstore op 25/04 • www.onlinehulp-apps.be is aangevuld met 9 nieuwe gescreende apps, dat brengt de stand op 128 apps • Er werd een rubriek "Uitgelicht: sterk sociaal werk" aangemaakt en gepresenteerd op de sociaal werkconferentie van 5 mei https://www.onlinehulp-apps.be/ • Er werden video's toegevoegd bij 13 apps • Kwaliteitscontrole van apps die een jaar op de appstore staan: <ul style="list-style-type: none"> - 18 app-aanbieders werden aangeschreven op 24 mei - 10 juni worden er 15 app-aanbieders aangeschreven - 22 juni worden er 15 app-aanbieders aangeschreven - Alle updates worden doorgevoerd voor 14 juli. • 5 nieuwe favorietenpagina's • Er werd een video ontwikkeld die gebruikers wegwijs maakt in het gebruik van deze wegwijzer in de praktijk. Deze staat op onlinehulp-apps.be en op YouTube. <p>1.6. WP 6 - Website</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding materiaal uit Blender – start opbouw onderzoeksportaal • Voorbereiding vormingskalender najaar • 15 juni: Lancering website onlinehulp-vlaanderen
<p>Noodzakelijke politieke actie</p>	<p>/</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering hernieuwde website Onlinehulp-Vlaanderen	2022 Q2	Op schema	
Interne kick-off met projectleden	2022 Q2	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal bezoekers op www.onlinehulp-apps.be	50000	2024 Q4		
Er zijn train de trainer opleidingen voor de modules e-mail, beeldbellen en sociale media ontwikkeld.	3	2024 Q4		
Ontwikkeling van een onderzoeks- en ontwikkelingsportaal waardoor vraag en aanbod i.v.m. onderzoek en ontwikkeling rond online en blended hulp- en dienstverlening in Vlaanderen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.	1	2024 Q4		
Het aantal beleidstrajecten dat ondersteund werd omtrent online- en blended hulp- en dienstverlening.	1	2024 Q4		
Aantal gescreende websites en apps voor online en blended hulp voor de burger én voor de sociale, welzijns- en zorgprofessionals via www.onlinehulp-apps.be ;	60	2024 Q4		
Ontwikkeling van een vernieuwd expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen	1	2024 Q4		
Aantal personen bereikt met www.onlinehulp-vlaanderen.be en bijhorende communicatie-activiteiten;	15000	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VV115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Zorgactoren (overgedragen zorgsectoren zesde staatshervorming) Zorgkassen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Agentschap Vlaamse sociale bescherming

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Er zijn een aantal essentiële bouwstenen voor de inkanteling en inbedding van zorgsectoren in de Vlaamse Sociale Bescherming. Deze zijn noodzakelijk om een performant systeem uit te bouwen waarmee de doelstellingen van VSB vanuit administratief oogpunt kunnen gerealiseerd worden.

Deze investering dient o.a. om de voorzieningen te digitaliseren om zo de sectoren die naar Vlaanderen werden overgedragen vanuit het RIZIV bij de 6de staatshervorming op eenzelfde (minimaal) niveau van informatisering te krijgen op het gebied van de basisprocessen en bijhorende applicaties (digitalisering boekhouding, facturatie, gegevensregistratie, elektronisch patiëntendossier, ...).

Zowel de zorgaanbieders als de zorgkassen moeten ook een digitale koppeling maken met het centrale VSB-platform. Via dit platform wordt de verzekeraar binnen VSB getoetst alsook de financiering van het zorgticket en de zorgbudgetten toegekend.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	11.000.000 EUR
Output	De sectoren uit het overnamedecreet zijn eind deze legislatuur gedigitaliseerd. Het gaat om de volgende sectoren: de revalidatieziekenhuizen, de revalidatieconventies, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen. De digitalisering verloopt gefaseerd (niet alle sectoren tegelijk).
Outcome	Geen papieren circuit tussen zorgkassen, voorzieningen en agentschap. Agentschap beschikt centraal over alle relevante data.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Toestand 31/5/2022 Relancebudget: VAK 11.000.000

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>VEK 8.275.000</p> <p>Relance prognose in VAK en VEK: 3.225k is beschikbaar voor vastlegging in 2022 2.725k kan nog aan VEK VV 115 worden opgevraagd in periode 2022 - 2024</p> <p>Relance effectief in VAK en VEK: 1.382k uitbetaald in 2022 op overgedragen kredieten voor ontwikkeling applicaties (Smals) en subsidie aan Zorgnet Icuuro</p> <p>Toestand 31/12/2021 VAK 7.775.000 EUR VEK 6.620.000 EUR</p> <p>1.150k vastgelegd, 92k uitbetaald 500k subsidie consortium voorzieningen overnamedecreet + 650k subsidie investeringen zorgkassen</p> <p>2200k vastgelegd, 2200k uitbetaald subsidie verzekeringsinstellingen</p> <p>2225k vastgelegd, 716k uitbetaald 1475k Centrale Gemeenschappelijke Applicatie revalidatieziekenhuizen + 750k Centrale Gemeenschappelijke Applicatie revalidatieconventies eerste golf</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Digitalisering revalidatieziekenhuizen - functionele analyse	2021 Q3	Gerealiseerd	
Applicatie revalidatieziekenhuizen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Digitalisering revalidatieziekenhuizen - applicatie in productie eind december 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2021 Q3	Gerealiseerd	
Consortium: aanstellen coördinator	2021 Q4	Gerealiseerd	
Consortium: installeren stuurgroep	2021 Q4	Gerealiseerd	
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q1	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Op schema	
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Consortium: Omzetten van ICT-planning naar changemanagement: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Op schema	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q2	Op schema	
VI: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q2	Op schema	
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Op schema	
Consortium: Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q3	Op schema	
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q3	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Consortium : Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q3	Op schema	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Gerealiseerd	
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Op schema	
Applicatie revalidatieconventies - psychische problemen	2022 Q4	Op schema	
VI: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q4	Op schema	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q4	Nog niet gestart	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q4	Op schema	
Consortium: Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q1	Nog niet gestart	
Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q2	Op schema	
VI: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Nog niet gestart	
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Op schema	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Nog niet gestart	
Consortium : Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicaties fysieke problemen	2023 Q3	Op schema	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Nog niet gestart	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Nog niet gestart	
Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Op schema	
VI: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Nog niet gestart	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2024 Q1	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	11.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	11.000.000 EUR
Uitvoering VAK	7.776.000 EUR
Uitvoering VEK	7.040.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 11.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Digitalisering RIZIV – sectoren](#)

[Besluit van de VR van 26/11/2021 subsidie digitalisering RIZIV-sectoren](#)

VV116 - ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER - GEÏNTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De patiënt moet centraal staan in de zorg. Daarom streven we ernaar om de zorg beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren van elke burger. Om deze ambitie in de praktijk mogelijk te maken, is het cruciaal dat ook de gegevensuitwisseling versterkt wordt. We investeren prioritair in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan en een elektronisch patiëntendossier voor de eerste lijn. Door hierbij ook samen te werken met andere betrokken actoren, vergroten we ook het vertrouwen in en het draagvlak voor dit elektronisch patiëntendossier bij de bevolking. Deze investeringen dragen bij tot multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling in het kader van integrale zorg. De zorgnoden en –doelstellingen van de persoon worden als uitgangspunt genomen. Data uit het elektronisch patiëntendossier zullen in een volgende fase gedeeld kunnen worden tussen de zorgverstrekkers onderling én met de patiënt, met respect voor het medische geheim en de privacy.

Bij de opmaak van een zorg- en ondersteuningsplan wordt rekening gehouden met de BelRAI- indicatie maar ook met de persoonlijke herstel- en revalidatiedoelstellingen van de persoon met een zorgnood. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Vitalink als platform om data te delen.

Dit alles moet het mogelijk maken om digitale gedeelde informatie in te zetten voor het bepalen en evalueren van het gezondheidsbeleid, bruikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van de zorg- en hulpverlening. Digitale informatiedoorstroming in een uniforme taal (BELRAI) tussen zorgactoren en overheid is essentieel om tot kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te komen in de hele keten van zorg (eerstelij, tweedelij, derdelij).

De gegevens gekend bij het VAPH omtrent de persoon met een handicap dienen geïntegreerd in het digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Met Zorg & Gezondheid dient bekeken welke informatie een meerwaarde kan bieden en ontsloten worden. Dit biedt ook mogelijkheden naar de persoon met een handicap. Het biedt kansen op een eenvoudig, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk e-loket. We zorgen dat we niet inboeten op toegankelijkheid.

Aandachtspunt: waar mogelijk leggen we intersectorale linkjes om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.000.000 EUR
-------	----------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Output	Aangeboden of ontsloten toepassingen om digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en zorggebruikers en de cliënt te faciliteren
Outcome	Efficiëntieverhoging van de zorg- en welzijnssector en versterking van patiëntveiligheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De aanbestedingsprocedure voor het programmamanagement van DZOP werd opgestart en moet tegen eind juni 2022 een gunning opleveren. Samen met de programmamanager zal een plan van aanpak opgesteld worden. De aanbesteding voor het IT-luik zal eind 2022 uitgeklaard worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Beslissing om te investeren in de verdere ontwikkeling van ZorgAtlas-platform door post COVID-19 klaar te maken en in te zetten als een volwaardige population and health and care omgeving	2021 Q3	Gerealiseerd	
Definiëren van use-cases gelinkt aan de Beleidsnota WVG 2019-2024 en gebaseerd op concrete beleidsmatige noden mho verdere uitbouw van het ZorgAtlas-platform	2021 Q4	Op schema	
Beslissing om te investeren in de verdere ontwikkeling van ZorgAtlas-platform door post COVID-19 klaar te maken en in te zetten als een volwaardige population health and care management omgeving.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Definiëren van use-cases gelinkt aan de Beleidsnota WVG 2019-2024 en gebaseerd op concrete beleidsmatige noden met het oog op de verdere uitbouw van het ZorgAtlas-platform	2021 Q4	Op schema	
Beslissing over platform/toepassing dat elke sector/entiteit wil/zal gebruiken voor digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en de cliënt, met oog voor onderlinge mogelijkheden tot uitwisseling.	2022 Q1	Nog niet gestart	
Aanbesteding Programmamanagement Digitaal Zorg & Ondersteuningsplan	2022 Q2	Op schema	Via mini-competitie loopt momenteel een aanbestedingsprocedure - gunning voorzien voor juni 2022

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.009.000 EUR
Uitvoering VEK	930.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 30.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Verdere ontwikkeling Zorg Atlas en SUM in 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022. Inzit relancemiddelen voor digitalisering binnen Zorg en Gezondheid

VV117 - ENKELBANDEN EN STRAFUITVOERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Agentschap Justitie en Handhaving
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De coronapandemie heeft een significante impact gehad op de uitvoering van de werkstraf en het aanbod aan beschikbare werkplaatsen. De aanhoudende corona maatregelen hadden als gevolg dat veel prestatieplaatsen gedurende een lange tijd gesloten bleven voor werkgestraften of met een lager aantal werkgestraften konden werken. Tegelijkertijd werden er nog evenveel werkstraffen uitgesproken en merken we dit jaar zelfs een stijging gezien er ook veel werkstraffen werden uitgesproken voor overtredingen van coronamaatregelen. In sommige regio's (voornamelijk Antwerpen, Limburg, Brussel en Leuven) vraagt deze bijzondere situatie ten gevolge van de coronapandemie dan ook bijkomende maatregelen :

- Een tijdelijk en bijkomend omkaderingsaanbod bij de Stad Antwerpen:

Voor de regio Antwerpen willen we aan de Stad Antwerpen de mogelijkheid geven om bijkomend 1 VTE werkvloerbegeleider niveau B tijdelijk in te zetten voor de omkadering van de werkstraffen. Het gaat om een tijdelijke periode, nl. van 1 september 2021 tem 31 december 2023. De Antwerpse begeleidingsdienst (dienst Samen Werken) bestaat reeds meer dan 10 jaar en heeft dus al een aanbod dat afgestemd is op de vraag van de partners van de strafrechtsketen.

- Een tijdelijk werkvloerproject bij vzw VOC Neteland:

De afdeling Mechelen van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen signaleert dat er voornamelijk een tekort is in de regio's Heist-op-den-Berg, Berlaar en Nijlen. Met de voorgestelde subsidiemiddelen wordt aan vzw VOC Neteland de mogelijkheid gegeven om bijkomend een halftijds personeelslid in te zetten voor de uitbouw van een tijdelijk werkvloerproject, dit ter omkadering van de werkstraffen en voor een periode van 6 maanden. Er kunnen zowel door de week als in het weekend werkgestraften worden ingeschakeld voor de uitvoering van diverse taken, zoals de verzorging van dieren en ondersteuning bij de aanleg of het onderhoud van de infrastructuur.

- Een tijdelijk werkvloerproject bij vzw Natuurpunt

Voor de regio's Antwerpen, Borgloon, Genk en Leuven wensen we tijdelijk 1 extra VTE niveau B per regio toe te kennen gedurende een periode van 2 jaar. Met Natuurpunt Beheer vzw is er reeds enkele jaren een goede samenwerking en de organisatie beschikt over de kennis en vaardigheden om met het doelpubliek te werken. Via Natuurpunt krijgen justitiabelen de kans om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk belang in de samenleving, namelijk het beschermen van de natuur, open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu in Vlaanderen.

- Mobiele werkvloerprojecten in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Limburg en Brussel

We wensen in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg een mobiel werkvloerproject op te starten. Een mobiel werkvloerproject houdt in dat er met een groep werkgestraften taken worden

PROJECTOMSCHRIJVING

uitgevoerd bij externe organisaties die een nood hebben. De opdracht van het mobiel werkvloerproject is tweeledig. We verwachten dat het mobiel werkvloerproject zelf actief op zoek gaat naar taken/opdrachten bij organisaties en daarnaast zelf een planning opmaakt om deze taken met een groep werkgestraften uit te voeren.

Gezien de bijkomende nood die zich in het gerechtelijk arrondissement Brussel stelt, willen we voor deze regio inzetten op een integratie van een dispatchingsfunctie in een mobiel werkvloerproject. Enerzijds voorziet het luik dispatching in de toeleiding van de werkgestraften naar een prestatieplaats en de verdere opvolging van de werkstraffen, en anderzijds kan het luik mobiele werkvloer ondersteuning aan de andere prestatieplaatsen bieden en inspelen op opportuniteiten die zich bij externe organisaties voordoen.

- Mobiel werkvloerproject in samenwerking met OVAM in het kader van het opruimen van zwerfvuil door werkgestraften.

Verder wordt er ook ingezet op de bouw van het bestuurlijk sanctieregister. Dat is de allereerste IT-toepassing in België die alle bestuurlijke sancties die op basis van Vlaamse regelgeving worden opgelegd op een gecoördineerde wijze ontsluit zodat alle sanctionerende overheden, zowel gerechtelijke als bestuurlijke, met kennis van zaken kunnen handelen. De informatie kan ook worden geraadpleegd in functie van de gerechtelijke of bestuurlijke opsporing en wordt de gegevensbron voor de ontwikkeling van een kruispuntbank bestuurlijke Handhaving, die een preventief en reactief bestuurlijk optreden tegen maatschappelijk ondermijnende activiteiten moet ondersteunen.

De decretale basis is gelegd met het kaderdecreet bestuurlijke handhaving van 22 maart 2019. Er werd in de loop van 2020 en 2021 in samenwerking met Digitaal Vlaanderen een business case uitgevoerd met betrokkenheid van alle handhavingpartners (politie, parket, lokale besturen, Vlaamse handhavingdiensten..). Op 18 juni 2021 besliste de Vlaamse regering op basis van het eindrapport van deze business case dat de informatie met betrekking tot bestuurlijke vervolging en sanctionering voor de gehele Vlaamse regelgeving wordt opgenomen in het te ontwikkelen bestuurlijk sanctieregister en dat alle Vlaamse ministers hier hun medewerking voor verlenen.

Er werd een samenwerkingsovereenkomst (SWO) met Digitaal Vlaanderen onderhandeld om het Vlaams bestuurlijk sanctieregister te ontwikkelen op zodanige wijze dat het tegelijkertijd de digitalisering van de handhavingprocessen ondersteunt, dat het een cruciale bouwsteen wordt en dat de data consulteerbaar worden binnen een kruispuntbank handhaving. Deze SWO wordt in de loop van december 2021 getekend.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.000.000 EUR
Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	- Werkvloerproject vzw VOC Neteland: De periode van het project liep tot en met 31/12/2022, dus het project werd inmiddels afgerond. Er werden gedurende de totale periode van het project (6 maanden) 18 dossiers behandeld, waarbij er 499 uren door de werkgestraften/dienstverleners werden gepresteerd en 367 uren dat de werkvloerbegeleider heeft meegewerkt. Het project voldoet hierbij aan de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

vooropgestelde kwantitatieve criteria bepaald door het Agentschap Justitie & Handhaving, zoals ook opgenomen in het subsidiebesluit. Ook inzake de samenwerking wordt het project kwalitatief hoog beoordeeld. Er werd voorzien in een ruim en variabel aanbod, waardoor verschillende profielen konden worden doorverwezen. Er werd tevens wel degelijk ingezet op een uitbreiding van de reeds gekende vrijwillige samenwerking. Zowel het justitiehuis van Mechelen als Turnhout kon beroep doen op het project, wat als een grote meerwaarde werd gezien.

- Werkvloerprojecten bij vzw Natuurpunt:

- Natuurpunt Leuven: De samenwerking met de organisatie wordt als zeer positief ervaren. Er wordt laagdrempelige zinvolle handenarbeid aangeboden, waardoor het project geschikt is voor een divers doelpubliek. Er wordt motiverend gewerkt met de nodige flexibiliteit en zelfstandigheid, waardoor de meerwaarde van het project wordt benadrukt. Inzake de vooropgestelde kwantitatieve criteria kunnen we concluderen dat het project in 2021 deze heeft behaald. Eind juni zal er opnieuw een tussentijdse evaluatie van de kwantitatieve criteria gebeuren.

- Natuurpunt Genk: Het project kende een moeizaam traject om de vacature van werkvloerbegeleider in te vullen, waardoor het project pas sinds februari operationeel is. Er gebeurde bijgevolg nog geen tussentijdse evaluatie van het project, dit wordt eind juni voorzien. Er werd vanuit de twee justitiehuisen in Limburg wel reeds gesignaleerd dat er een zeer positieve samenwerking is

- Natuurpunt Borgloon: het project is momenteel nog niet operationeel. Er werd in februari een geschikte kandidaat geselecteerd maar deze viel vervolgens uit wegens medische redenen. De vacature staat momenteel nog open, ook hier kent het project een moeizaam traject om deze in te vullen.

- Natuurpunt Ekeren: Ook hier kent het project een moeizaam verloop om de vacature in te vullen. Er werd hierbij wel een tussentijdse oplossing gezocht, waarbij een medewerker van Natuurpunt tijdelijk werd ingeschakeld om het project op te starten. Het project is operationeel sinds februari, waardoor er bijgevolg nog geen tussentijdse evaluatie van het project is gebeurd. Dit wordt eind juni voorzien.

- Mobiel werkvloerproject OVAM: Sinds 1 april werd de coördinator van het project aangeworven, die momenteel inzet op het uitbouwen van samenwerkingen met steden/gemeenten in Vlaanderen waarbij het mobiel werkvloerproject kan worden ingezet. De aanwerving van de werkvloerbegeleiders kende eveneens een moeilijk verloop, maar er werden ondertussen twee kandidaten gevonden.

- Bijkomend omkaderingsaanbod bij het werkvloerproject Samen Werken van de Stad Antwerpen: De opstart van het project wordt voorzien op 7 juni.

- Mobiele werkvloerprojecten:

- Regio Brussel (mobiel werkvloerproject + dispatchingsdienst): Het mobiel werkvloerproject is eind april van start gegaan, alsook gedeeltelijk de dispatchingsdienst. Vanaf juni is het project volledig operationeel. Er zal per kwartaal een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie gebeuren.

- Regio Limburg: Vanaf april is het project operationeel, vanaf juni zal dit met de volledige capaciteit zijn. Er zal per kwartaal een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie gebeuren.

- Regio Antwerpen: Het project is vanaf april operationeel maar nog niet op volledige capaciteit. Er staat momenteel nog één vacature open.

Inzake het Vlaams bestuurlijk sanctieregister:

- Voor het handhavingsplatform werd een bestek opgesteld en uitgestuurd. Onderstaande timings werden daarbij vooropgesteld en tot nader order gerespecteerd.

- o Onze gunningsbeslissing wordt momenteel voorbereid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<ul style="list-style-type: none"> o We verwachten het gunningsverslag op 2/06 aan de Inspectie van Financiën te kunnen overmaken o In de loop van de week van 07/02 zouden we dan de gunningsbeslissing aan de aanbieders willen bekendmaken o We willen daarna meteen starten met het uitwerken en ontwikkelen van het handavingsplatform, samen met de gekozen aanbieder <ul style="list-style-type: none"> - Legale aspecten o Elke twee weken hebben we een overleg met Cranium. Zij bereiden de DPIA voor. o Data classificatie werd bepaald op 11/03 (data classificatie 4) <ul style="list-style-type: none"> - OSLO track rond SanctieRegister opnieuw opgestart o Week van 01/01 seminarie ter validatie van het applicatieprofiel <ul style="list-style-type: none"> - Integratie agentschappen o Gesprekken met agentschap 'Wonen' zijn bezig, rond integratie van data en processen o Gesprekken met het Departement MOW (die het scheepvaartdecreet hebben geschreven) en de Vlaamse Waterweg (die de handhaving ervan effectief gaan doen) worden in komende weken opgestart <ul style="list-style-type: none"> - Budgetverbruik: de ontwikkeling is nog niet gestart, dus tot nader order is het niet zinvol om hierover te rapporteren - Timing: einde september wordt een eerste werkend prototype verwacht, eind december dient alles afgerond te zijn.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
----------	--------	--------	---------------------

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.093.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> o Europees Herstelfonds: 0 EUR o Brexit-fonds: 0 EUR o React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 juni 2021. Vlaams bestuurlijk sanctieregister](#)

VV118 - GROEIPAKKET - VERDERZETTEN DIGITALISERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Uitbetaling Groeipakket
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Uitbetaling Groeipakket - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Burgers met kinderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

VERDERE DIGITALISERING GP

Door verder in te zetten op een verregaande digitalisering van de berekening, gegevensdeling en uitbetaling van het Groeipakket werken we aan een efficiënte overheid en creëren we via automatische rechtentoekenning een solide basis voor de verschillende beleidsdoelstellingen die we met het Groeipakket realiseren.

Begin 2021 werd een scope voor de verdere doorontwikkeling van de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) vastgelegd. Deze applicatie staat in voor de automatische rechtentoekenning en dossieropvolging van de Groeipakketten waaronder bijvoorbeeld de berekening van de correcte GP bedragen. Voor 2021 werden 420 story points (functionaliteiten) vastgelegd voor de doorontwikkeling van CGPA. Deze worden bepaald en geprioriteerd op basis van volgende invalshoeken.

Wettelijk: Is het noodzakelijk om de functionaliteit verder te ontwikkelen om automatisch (zonder menselijke tussenkomst) aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen.
Technisch: Zijn de ontwikkelingen technisch nodig om de garanties op een stabiele en optimale werking van de toepassing te kunnen garanderen.
Burger: Bijkomende functionaliteiten die een directe meerwaarde zullen betekenen voor de burger.
Gebruiksgemak: Ontwikkelingen die het gebruik door de consumenten van de toepassing optimaler/vlotter laten verlopen.

DEELPROJECT ZOË 2.0 (Zorgtoeslag evaluatie - Attestering specifieke ondersteuningsbehoeften)

Bij de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid voor de zorgtoeslag overgedragen van het Federale naar het gewestelijke niveau. Omwille van diverse redenen werd op dat moment het as is proces overgenomen en aan de hand van een minimaal levensvatbare toepassing uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat de zorgtoeslag dienstverlening niet optimaal efficiënt verloopt. Met het ZOË 2.0 project willen we de zorgtoeslag processen optimaal ondersteunen met een geïntegreerd applicatieplatform op basis van een nieuwe technologische visie. Daarenboven maken we zoveel als mogelijk gebruik van de bouwstenen van Digitaal Vlaanderen.

In functie van efficiëntie en transparantie naar de burger toe willen we tevens de Corona-crisis aangrijpen om het proces versneld te digitaliseren naar de burger.

We voorzien 2 fases (releases) waarbij we in release 1 vooral focussen op de digitalisering van de bestaande werking en de opzet van een vernieuwde architectuur klaar voor de toekomst. In fase 2 (release 2) focussen

PROJECTOMSCHRIJVING

we ons op bijkomende optimalisaties, niet-functionele verplichtingen i.h.k.v. bedrijfscontinuïteit en veiligheid en de implementatie van eventuele nieuwe beleidsinzichten.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	7.000.000 EUR
Output	<p>VERDERE DIGITALISERING VAN HET GROEIPAKKET Eén verdere geoptimaliseerde Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA).</p> <ul style="list-style-type: none">- Uitbreiding van de module automatische rechtsbepalingen.- Uitbreiding van de module Ex post controle van gegevens met betrekking op de prestaties.- Uitbreiding van de module controles van de schoolactiviteiten.- Uitbreiding van de module schulden en inningen. <p>DEELPROJECT ZOË 2.0 : Eén nieuwe applicatie voor de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoeften ZOE 2.0</p>
Outcome	<p>VERDERE DIGITALISERING VAN HET GROEIPAKKET</p> <ul style="list-style-type: none">- Snellere toekenning van de GP rechten en de bijbehorende uitbetalingen van de correcte GP bedragen.- Kwaliteitsvollere dienstverlening en transparantie naar de burger.- Bereiken van efficiëntiewinsten (performantie/kosten) in de wijze van GP uitbetalingen <p>DEELPROJECT ZOË 2.0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Snellere & efficiëntere dossiervoorbereiding: verkorting van de 'dossiervoorbereiding' met gemiddeld 1 maand en een substantiële verkorting qua doorlooptijd voor de burger zodra het tekort aan evaluerend artsen is weggewerkt (*)• Transparantie naar de burger: inzage in zijn/haar dossier• Kwaliteitsvollere dienstverlening: lagere foutgevoeligheid van het administratieve proces & een hogere bedrijfscontinuïteit van de toepassing 99% uptime m.u.v. geplande onderbrekingen• Ecologische voetafdruk verkleinen: besparing van jaarlijks ongeveer 325.000 vellen papier (equivalent van 6-7 bomen) wanneer we een optimale digitaliseringsgraad bereiken <p>(*) Het technische project kan geen oplossing bieden voor het tekort aan evaluerend artsen waardoor de algemene doorlooptermijnen vandaag ook oplopen.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Release 1 werd opgeleverd op 8 februari 2022.</p> <p>Concreet betekent dit voor de burger dat alle aanvragen evaluatie ondersteuningsnood sinds die dag digitaal verlopen.</p> <p>De burger heeft toegang tot een portaal waar deze zijn/haar aanvragen kan opvolgen: status, gegevens invullen en bijlagen opladen. Op 18 mei vonden reeds meer dan 10.000 burgers de weg naar het portaal en werden er meer dan 4.000 psychosociale formulieren ingevuld en 8.500 vragenlijsten opgeladen.</p> <p>Maar er zijn ook mensen die de weg helaas niet vinden ondanks de doorverwijzing naar partners die hierin kunnen helpen. Om deze mensen verder te helpen, zullen we in overgangsfase nog een papieren flow voorzien.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>Sinds 8 februari vragen we ook dat de GMD-houder (huisarts; GMD = globaal medisch dossier) of de behandelend arts het medisch formulier aan Opgroeien bezorgt via eHealth.</p> <p>Voor de GMD-houders lijkt deze digitale flow geen probleem te zijn, maar we stellen vast dat deze eHealth-integratie in de ziekenhuizen, multidisciplinaire centra en bij privé artsen nog niet standaard is voorzien in alle elektronische patiëntendossiers. Aangezien dit formulier noodzakelijk is voor de aanvraag, moet er ook hier terug een manuele flow worden voorzien.</p> <p>Dit is echter een probleem naar verdere automatisering. De eHealth-formulieren bevatten gestructureerde data die zodra ze digitaal toekomen bij Opgroeien onmiddellijk verwerkt worden. Momenteel zorgen we er op deze manier voor dat aanvragen voor kinderen die een levensbedreigende prognose hebben, onmiddellijk de hoogste prior krijgen en bovenaan de takenlijst verschijnen van de dossierbeheerder en evaluerend arts.</p> <p>Een volgende stap is een semi-automatisch proces opzetten waardoor evaluaties sneller kunnen verlopen.</p> <p>Wij zijn dus zeer afhankelijk van de medische sector om verdere automatisering mogelijk te maken.</p> <p>De nodige bijsturingen/manuele flows alsook de nieuwe beleidsbeslissingen werden als extra scope toegevoegd.</p> <p>Door het uitvallen van enkele cruciale rollen (juriste, adviserend arts, operationeel verantwoordelijke) alsook het moeilijk ingevuld krijgen van enkele IT-rollen, kunnen we momenteel onvoldoende snelheid maken en moeten we misschien onze ambities qua uitgebreide scope terug wat temperen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitbreidingen aan de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) deel 1 : realisatie van 210 functionele story points binnen CGPA.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Uitbreidingen aan de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) deel 2 : realisatie van de volgende 210 functionele story points binnen CGPA.	2021 Q4	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 1 – Opzetten van de nodige architectuur	2021 Q2	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 2 – Bestaande processen digitaal herdenken en scope release 1 bepalen	2021 Q2	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 3 – Realisatie Salesforce-applicatie ZOE 2.0 & bijhorende integraties	2021 Q4	Vertraging	Reeds gerealiseerde Magda-integraties:

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
met de Magda Documentendienst, het Burgerprofiel (eBox, Dosis, Notificaties en Attesten), de Magda-stromen & KRING (persoonsgegevens, aanvragen, beslissingen), Kariboe (artsgegevens Opgroeien), eHealth (medische formulieren)			<p>* Magda documentendienst voor het versturen van onze communicatie naar de gezinnen (aflevering e-Box of fysieke post via Ipex)</p> <p>* Magda gegevensdeling i.k.v. persoonsgegevens, gegevens m.b.t. het Groeipakket en de evaluatie ondersteuningsnood</p> <p>Nog niet klaar = integratie MijnBurgerProfiel (MBP) Reden: technische incompatibiliteit MBP en Salesforce. Inmiddels is de integratie met de header, Dosis en notificaties voor 80% klaar. Indien de acceptatietesten goed verlopen, dan zal de integratie met MBP beschikbaar zijn voor de gezinnen via ons portaal</p>
ZOE 2.0 Mijlpaal 4 - Migratie van de bestaande dossiers naar het nieuwe platform	2021 Q4	Gerealiseerd	Sinds 8 februari 2022 is de nieuwe applicatie ZOE 2.0 in gebruik en waren ook alle dossiergegevens inclusief de historiek gemigreerd naar dit platform zodat we oude applicatie kunnen uitschakelen en we de continuïteit naar de gezinnen kunnen garanderen.
ZOE 2.0 Mijlpaal 5 - GO LIVE Release 1	2021 Q4	Gerealiseerd	Release 1 werd opgeleverd op 8 februari 2022.
ZOE 2.0 Mijlpaal 6 - Bepalen scope release 2 (optimalisaties en nieuwe beleidsinzichten) en agenderen op VR	2021 Q4	Gerealiseerd	<p>Opgenomen in scope:</p> <ul style="list-style-type: none"> - noodzakelijke bijstellingen en optimalisaties na go-live release 1 - digitalisering evaluatie-instrument van de evaluerend artsen - documentenopslag in de cloud - implementatie nieuwe beleidskeuzes - gegevensdelingen m.b.t. automatische rechtentoekenningen
ZOE 2.0 Mijlpaal 7 - Release 2 uitwerken en implementeren	2022 Q3	Op schema	<p>(Tijdelijk) uitvallen van enkele cruciale personen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - juriste evaluatie ondersteuningsnood - medisch adviserend arts evaluatie ondersteuningsnood - operationeel verantwoordelijke evaluatie ondersteuningsnood <p>Er wordt voor vervanging gezorgd, maar het duurt steeds even voordat mensen volledig zijn ingewerkt.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			<p>IT-profielen geraken moeilijk ingevuld waardoor het team ook niet op volle kracht vooruit kan. Consultancypartner zoekt mee naar oplossingen, zodat we hopelijk vanaf de zomer meer snelheid kunnen maken.</p> <p>Zoals ook eerder vermeld, wordt de scope steeds afgestemd en worden de prioriteiten bijgestuurd naar gelang de (nieuwe) noden.</p>
ZOE 2.0 Mijlpaal 8 - GO LIVE Release 2	2022 Q4	Op schema	<p>Voor release 2 opteren we voor een agile-aanpak met een 2-wekelijkse sprint/release.</p> <p>De scope van deze release wordt bepaald in mijlpaal 7</p>

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Eén verdere geoptimaliseerde Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA).	1	2021 Q4		100 %
Eén nieuwe applicatie voor de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoeften ZOE 2.0.	1	2022 Q4		50 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.485.000 EUR
Uitvoering VEK	6.190.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

[Ontwerpnota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Verder zetten digitalisering Groeipakket](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 11 februari 2022. Digitalisering Groeipakket – ZOË 2.0 Release 2](#)

VV119 - ONTWIKKELEN RECHTENVERKENNER 2.0 MET EEN MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOOL IN STERKE SAMENWERKING MET DE LOKALE BESTUREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Professionele zorg en hulpverleners (Wordt uitgewerkt in een samenwerkingsverband met ABB, Digitaal Vlaanderen, VVSG en Kenniscentrum Kernsteden)

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De rechtenverkenner wordt gebruikt door voornamelijk hulpverleners van OCMW, CAW, lokale besturen, ... om op basis van het profiel van een hulpvrager te bekijken voor welke rechten deze persoon in aanmerking komt. Dit kan gaan over allerlei levensdomeinen en evenzeer over rechten op het niveau het federale, regionale of lokale niveau. De rechtenverkenner is toe aan een grondige update tot rechtenverkenner 2.0. Zo verhoogt het gebruikerscomfort en kan het structurele gebruik toenemen. De nodige aanpassingen moeten leiden tot verbeterde resultaten in rechtentoekenning en eenvoudiger aanpassingen bij veranderende regelgeving. Zo zal de site ook meer gebruiksvriendelijk zijn voor de geïnteresseerde burger en niet enkel voor de hulpverleners

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Een unieke database met informatie over sociale rechten toegekend door de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Overheid en zo mogelijk aangevuld met federale sociale rechten - Organisatie van het decentraal beheer van de database en centrale kwaliteitsbewaking. - Venster op de database ter beschikking stellen voor burgers en professionele hulpverleners via een gebruiksvriendelijke toepassing te consulteren via website - Database wordt via open data ter beschikking gesteld voor hergebruik (Kenniscentrum Vlaamse Steden wil dit hergebruiken voor rechtentoekenning zit niet in scope van dit project)
Outcome	Interbestuurlijke samenwerking rond sociale rechten, werkinstrument voor zorgprofessionals, geactualiseerde basisinformatie over lokale en Vlaamse sociale rechten . Potentieel basisbestand voor eventuele rechtentoekenning.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
---------------	-----------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Business case is afgewerkt, ProjectInitiatieDocument is klaar en wordt samen met de nota voor de Vlaamse Regering bij de stuurgroepleden afgetoetst. Nadien kan dit voorgelegd worden aan IF en Vlaamse Regering. De haalbaarheid wordt afgetoets in een proof of concept, de voorbereiding van de organisatie en de kwaliteitsbewaking is opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Businesscase opstellen en laten goedkeuren	2020 Q4	Gerealiseerd	
Projectinitiatie opstellen met de partners	2021 Q4	Gerealiseerd	
Projectvoorstel voorleggen aan Vlaamse Regering (bekomen relancemiddelen)	2022 Q2	Op schema	Ontwerpnota en ProjectInitiatieDocument zijn ter validatie aan de stuurgroep bezorgd.
Product discovery	2022 Q2	Op schema	Werkgroep Kenniscentrum Vlaamse Kernsteden werken in overleg met Digitaal Vlaanderen een POC uit.
Product fundament	2022 Q4	Nog niet gestart	
Agile Product ontwikkeling opstarten	2023 Q4	Nog niet gestart	
City Deal voorbereiden en afsluiten	2021 Q3	Op schema	City Deal wordt voorbereid
Juridische basis voor Rechtenverkenner onderzoeken en zo nodig voorstellen om aan te passen.	2022 Q3	Op schema	Eerste onderzoek door juridisch team is gestart
Projectorganisatie en inhuren van diensten regelen	2022 Q3	Nog niet gestart	
Methodiek voor de centrale kwaliteitsbewaking uitwerken	2022 Q4	Nog niet gestart	
Gemeenschappelijk beheer van de organisatie uitwerken en voorleggen aan de partners	2023 Q1	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
-------------------------	---------------

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV120 - VERBETEREN VAN DE SOCIALE KAART

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle burgers die informatie zoeken over zorgaanbod of zorgverstrekkers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De sociale kaart is voor de hulp- en dienstverleners, zorgpersoneel, OCMW-medewerkers of de burger zelf een instrument om in de eigen buurt de nodige hulpverleners en instellingen te kunnen terugvinden. Het departement WVG nam dit enkele jaren geleden over van de provincies toen hun welzijnsopdracht werd overgeheveld. De sociale kaart bevat veel gegevens en wordt voortdurend bijgewerkt. Toch blijkt de toepassing vatbaar voor verbetering door onder meer de koppeling te maken met bijkomende authentieke datasets die zo automatisch actuele gegevens op de kaart te zetten. Sterke verbeteringen zijn ook nodig aan de zoekfunctie om tot de juiste resultaten te komen en de gebruiksvriendelijkheid kan verbeterd worden. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden voor de toevoeging van nieuwe informatie. De verbeteringen zijn reeds opgestart met gewone middelen</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	500.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - In de eerste fase: <ul style="list-style-type: none"> o In de achterliggende database worden de gegevens over de zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers overgenomen uit andere authentieke bronnen van Vlaamse en federale diensten o De achterliggende databank wordt als open data ter beschikking gesteld. o Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers kunnen hun gegevens van de overheidsdiensten zelf verrijken met eigen gegevens. (adressen, openingsuren, telefoon, email,...) o Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers worden gesensibiliseerd om hun gegevens aan te vullen. De overheidsdiensten zullen deze gegevens ook hergebruiken. o Het doelpubliek wordt geïnformeerd over de nieuwe sociale kaart - In de tweede fase, (na onderzoek en overleg) : <ul style="list-style-type: none"> o Uitbreiding van de gegevens die relevant kunnen zijn voor de burgers: waar kunnen burgers met hun klacht terecht, inspectieverslagen, kwaliteitsindicatoren,...
Outcome	Betere informatie voor zorgpersoneel en zorggebruikers. Hergebruik van overheidsinformatie van het beleidsdomein WVG en de federale overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	De externe firma die in de eerste fase de ontwikkeling van de vernieuwde database en de ontwikkeling van de toepassing doet heeft verder ernstige vertraging opgelopen. Daar waar de toepassing initieel voorzien was voor 2021 Q2, zal deze pas in Q3 van 2022 klaar zijn. Hierdoor verschuift de hele planning en ook van fase 2, het uitbreidingsproject met relancemiddelen. De planning voor de tweede fase werd bijgestuurd. De opstartfase van de uitbreiding wordt voorbereid.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.1 Verbeteren van de toepassing	2020 Q4	Gerealiseerd	
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.2 Afwerken en in productie nemen van de nieuwe toepassing	2022 Q2	Op schema	
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.3 Toevoegen en actualiseren van gegevens van de gezondheidszorgverstrekkers in de databank.	2022 Q3	Op schema	
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.4 Opmaken en uitvoeren van een communicatiestrategie en -campagne in functie van de nieuwe sociale kaart. Eerste fase:: 1.1	2022 Q3	Op schema	
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.1 Onderzoeken welke bijkomende informatie via de sociale kaart kan ontsloten worden	2022 Q3	Op schema	
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.2 Concept valideren, overleggen met sectoren en laten bekrachtigen door Vlaamse Regering	2021 Q3	Op schema	
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.3 Implementatie van de tweede fase	2023 Q2	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

22. Investeren in personen met een handicap

VV121 - VOORUITSCHUIF UITBREIDINGSBELEID - FASE 1

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	personen met een handicap

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	22. Investeren in personen met een handicap
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Fase 1 van de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid bij personen met een handicap: de in de periode 2020-2024 voorziene extra middelen voor de toekenning van bijkomende budgetten aan personen met een handicap wordt versneld vanaf 2021.

Reguliere middelen: 230.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	55.000.000 EUR
Output	Door de voorziene middelen uit het Relanceplan kon een inhaaloperatie worden uitgevoerd waarbij aan een groep personen met een handicap een persoonsvolgend budget kon worden ter beschikking gesteld. Het gaat om meerderjarige personen met een handicap die een aanvraag voor een PVB hadden ingediend uiterlijk op 31/12/2020 en die werden ingedeeld in prioriteitengroep 1.
Outcome	De versnelling van de terbeschikkingstelling van een PVB is gebeurd voor een eerste groep van 2.700 personen uit prioriteitengroep 1.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Aan een eerste groep personen met een handicap uit prioriteitengroep 1 met een aanvraagdatum uiterlijk op 31/12/2020 werd een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld. Het gaat om 2.502 personen. In 2022 zal nog aan 284 personen uit die groep een persoonsvolgend budget worden ter beschikking gesteld alsook aan de personen die een aanvraag hebben ingediend uiterlijk op 30/6/2021 en ingedeeld in prioriteitengroep 1.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Versnelde terbeschikkingstelling van persoonsvolgende budgetten aan personen met een handicap op de wachtlijst	2022 Q2	Op schema	Aan een eerste groep van personen met een handicap die een aanvraag hadden ingediend voor een PVB uiterlijk op 31/12/2020 werd aan PVB ter beschikking gesteld.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aan 2.502 erkende personen met een handicap in prioriteitengroep 1 hebben werd een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld. het gaat om de personen die een aanvraag hadden ingediend uiterlijk op 31/12/2020. Binnen die groep zullen in de loop van 2022 nog aan 284 personen een PVB ter beschikking gesteld worden.	2.786	2022 Q2	2.502	90 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	55.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 55.000.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Uitrol uitbreidingsbeleid 2021 met het oog op perspectief bieden aan de personen met een handicap met ondersteuningsnoden](#)

23. Sportinfrastructuur

VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Sport Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Sport Vlaanderen
Belanghebbenden	De sporter, sportfederaties, sportclubs, de lokale besturen alsook private investeerders in sportinfrastructuur

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	23. Sportinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Om investeringen in sportinfrastructuur te faciliteren en te versnellen heeft Sport Vlaanderen "Sportsput" in het leven geroepen. Er bestaat de mogelijkheid om via het decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur jaarlijks op een vast tijdstip (31/03/20xx) een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen voor de bouw en/of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur. In het decreet wordt een minimaal budget van 5.000 keuro verankerd dat wordt gebruikt om sportinfrastructuur te cofinancieren tot 30% en een maximaalbedrag van 1.250k euro.

Vanaf 2021 kan Sport Vlaanderen twee projectoproepen organiseren. Subsidieaanvragen kunnen dan uiterlijk 31/03/20xx en 30/09/20xx worden ingediend. Bovendien worden er deze legislatuur extra budgetten bovenop het decretaal minimum vrijgemaakt om te investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. Gezien de grote behoefte en de vraag om een inhaalbeweging inzake sportinfrastructuur te versnellen alsook de positieve effecten van sport en bewegen in tijden van een pandemie wordt de eerste grote impuls in 2021 reeds voorzien.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	55.000.000 EUR
Output	Via deze subsidiepiste worden bestaande bovenlokale sportinfrastructuren verbeterd en wordt nieuwe bovenlokale sportinfrastructuur gerealiseerd. Er wordt een subsidie toegezegd van 22,8 miljoen euro (oproep 2021-mrt) en 15,4 miljoen euro (oproep 2021-sep) voor de realisatie van 73 bouwprojecten. In totaal werden in 2021 93 dossiers ingediend. In 2022 is opnieuw 40 miljoen euro voorzien waarvan het restbudget van 16 miljoen euro afkomstig is van de relance middelen Vlaamse Veerkracht.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome Een substantiële investering wordt gecreëerd voor de sportinfrastructuur in Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De decretale wijzigingen om twee projectoproepen te organiseren zijn reeds doorgevoerd. De organisatie van de eerste projectoproep 2022 is reeds lopende . Het budget voor deze oproep is 35.000k euro. Indien dit budget niet geheel is verdeeld gaat het saldo naar de tweede projectoproep met deadline 30/9/22. Van deze 35.000k euro is 16.000k euro vanuit de relance middelen van de Vlaamse Veerkracht.
Noodzakelijke politieke actie	De minister beslist over de dossiers van deze projectoproep in 2022. Dit zal gebeuren begin juli.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Decretale regeling organiseren twee projectoproepen per jaar.	2021 Q1	Gerealiseerd	
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2021	2021 Q3	Gerealiseerd	
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2022	2022 Q2	Op schema	Deadline is afgelopen en zit nu in beoordelingsfase
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2022	2022 Q4	Op schema	Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal ingediende dossiers 2021 voor bovenlokale sportinfrastructuren	90	2021 Q4	93	100 %
Het aantal ingediende dossiers 2022 voor bovenlokale sportinfrastructuren	90	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	55.000.000 EUR
Uitvoering VAK	38.198.000 EUR
Uitvoering VEK	212.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 55.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR 26/2/2021](#)

[BVR 26/2/2021 - nota](#)

[BVR 26/2/2021 - advies Sportraad](#)

[BVR 26/2/2021 - advies RVS](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Versterken van oproepen bovenlokale sportinfrastructuur](#)

[Belgisch Staatsblad. Bijlage](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur](#)

24. Uitbouwen circulaire economie

VV123 - CIRCULAIR BOUWEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

We willen via innovatie nieuwe Circulaire bouwtechnieken en recyclage tot stand brengen. Tegelijk moet dit aanleiding geven tot nieuwe circulaire businessmodellen in de sector van bouwmaterialen en gebouwen. Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten zoals COOCK-projecten (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding), de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs.

De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.

Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe businessmodellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	projectoproepen gelanceerd
Outcome	Steun toegekend aan 100 projecten voltooid over circulair bouwen, voor kennisverspreiding over circulaire maakindustrie, voor de inkoop van (externe en interne) adviezen over circulaire productie, en voor de oprichting van collectieve living labs door particuliere ondernemingen, en ten minste 500 ondernemingen (kmo's) en organisaties die als rechtstreekse begunstigde of als deelnemer van collectieve projecten subsidies hebben ontvangen voor beide thema's circulair bouwen en circulaire maakindustrie samen (zie ook VV124)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	op schema
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
KMO groeisubsidie eerste oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	2022 Q2	Op schema	
KMO groeisubsidie eerste oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Gerealiseerd	
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Op schema	
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	2022 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.355.000 EUR
Uitvoering VEK	596.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 10.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Steunmaatregelen ten behoeve van Circulair Bouwen](#)

VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Om de omslag te kunnen maken naar een circulaire maakindustrie moet worden ingezet op alle circulaire strategieën van design over hergebruik en delen, herstellen, hermaken tot recycleren. In het algemeen moeten nieuwe circulaire business concepten gepromoot worden in de maakindustrie.

In het kader van de werkagenda 'circulaire maakindustrie' van het transversale programma 'Vlaanderen Circulair' onderzoeken we in de tweede helft van 2021 welke waardeketens in Vlaanderen het meest potentieel hebben om de opschaling van de circulaire economie te realiseren. Die waardeketens zijn breed en divers samengesteld en via het relancebeleid willen we extra inzetten op het behoud en het stimuleren van een nieuwe circulaire maakindustrie.

Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten, in het bijzonder COOCK-projecten, de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs..

De concrete keuze over welke instrumenten wanneer voor welke waardeketen zullen worden ingezet zal worden gemaakt in overleg met de betrokken stakeholders, die samenkomen in de aansturing van de werkagenda's.

De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.

Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe business-modellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	15.000.000 EUR
Output	projectoproepen gelanceerd
Outcome	Steun toegekend aan 100 projecten voltooid over circulair bouwen, voor kennisverspreiding over circulaire maakindustrie, voor de inkoop van (externe en interne) adviezen over circulaire productie, en voor de oprichting van collectieve living labs door particuliere ondernemingen, en

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	ten minste 500 ondernemingen (kmo's) en organisaties die als rechtstreekse begunstigde of als deelnemer van collectieve projecten subsidies hebben ontvangen voor beide thema's circulair bouwen en circulaire maakindustrie samen (zie ook VV123)
--	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	op schema
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
KMO groeisubsidie voor circulair bouwen en circulaire maakindustrie - eerste oproep gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	2022 Q2	Op schema	
KMO groeisubsidie circulair bouwen en circulaire maakindustrie beslissingen eerste oproep	2022 Q2	Op schema	
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire mlaakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Op schema	
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	2022 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.896.000 EUR
Uitvoering VEK	174.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 15.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Steunmaatregelen ten behoeve van Circulaire Maakindustrie](#)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Denuo, sectororganisatie (bv. essenscia, Centexbel, Agoria, ...)

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Algemeen beogen we recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen bv. investeringen in nieuwe voorbehandelingstechnieken, recyclage-installaties of uitbreiding van bestaande installaties; of aanpassingen van productieprocessen om gerecycleerde materialen te kunnen verwerken. We beogen hierbij een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning bv. milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten.

Een marktverkenning werd uitgevoerd waarin we in eerste instantie als scope hanteerden:

- asbest: De sectorprotocollen, de gesubsidieerde asbestafbouwprojecten bij lokale besturen en de nieuwe asbestpremie voor isolatie en asbestverwijdering zorgen voor een sterk stijgend volume aan te storten asbestafval. De extra relance-middelen gaan de komende jaren deze dynamiek nog versterken. Om de druk op de beperkte stortcapaciteit te verlagen, is de nood aan andere verwerkingstechnologie hoog.
- matrassen: De nieuwe aanvaardingsplicht vanaf 1 januari 2020 creëert een aanbod aan selectief ingezamelde afvalstoffen waarvoor nieuwe verwerkingstechnieken mogelijk zijn.
- luiers: Het opzetten van een nieuwe selectieve inzameling voor babyluiers en incontinentiemateriaal, evenals een normenkader voor de gerecycleerde materialen, wordt momenteel onderzocht
- textiel: De voorbije crisis heeft duidelijk gemaakt dat onze economie kwetsbaar is voor deze stroom door het ontbreken van een aantal schakels in de verwerkingsketen in Vlaanderen/Europa.
- kunststoffen (bv. verpakkingen): Enerzijds zetten we beleidsmatig sterk in op de afvalstroom verpakkingen waarbij we een betere sortering en recyclage verwachten, anderzijds stellen we vast dat het de inzet van kunststofrecyclaten sterk onder druk staat (o.a. gelinkt aan de olieprijs).

Deze lijst is echter te beschouwen als niet-limitatief. Elk initiatief dat Vlaanderen op weg zet om een toonaangevende recyclagehub binnen Europa te worden, komt potentieel in aanmerking voor ondersteuning. We streven daarbij naar een instrument dat het materialenbeleid en circulaire economie ondersteunt, en complementair is tov bestaande ondersteuninginstrumenten.

In theorie komen meerdere instrumenten in aanmerking om Vlaamse bedrijven te ondersteunen: subsidies, participaties, leningen, Op basis van de beschikbare juridische en financiële informatie is de voorkeurspiste om een investeringssubsidie uit te werken gezien dit de mogelijkheid om meer projecten te ondersteunen dan bij keuze voor participatie. Indien echter uit de marktverkenning zou blijken dat er ook potentieel is voor een mogelijke participatie, kunnen deze relancemiddelen ook zo worden ingezet of kan worden samengewerkt met PMV, om de beschikbare CE-middelen daar te activeren.

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het recyclinghub-project willen wij ten minste zes grote investeringen in nieuwe recyclingfaciliteiten stimuleren die lokale recycling en gesloten kringlopen mogelijk maken. Hiervoor worden 2 calls georganiseerd.

De financiering van dit project verloopt in hoofdzaak via de extra toegekende relancemiddelen. De verkennende studie van Möbius (2020) werd gefinancierd vanuit de reguliere middelen. Na afronden van de 2e call wordt een evaluatie-opdracht voorzien vanuit de reguliere middelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.000.000 EUR
Output	Aantal toegekende subsidies aan nieuwe recyclage-installaties of recyclage-eenheden: minstens 6 tegen medio 2026
Outcome	Een stijging van de hoeveelheid afval die selectief wordt ingezameld en gerecycleerd. Daling van de hoeveelheid afval die naar verbranding gaat. Alternatief voor het storten van asbestafval beschikbaar.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Call 1 is afgerond. De VR hechtte op 1 april 2022 haar goedkeuring aan de rangschikking: 6 innovatieve recyclageprojecten ontvangen subsidie. Enkel de administratieve afhandeling van de vastleggingen dient nog te gebeuren. Alle bedrijven werd geïnformeerd over het resultaat. Bedrijven die subsidie ontvangen moeten viermaandelijks rapporteren over de voortgang van hun investeringsproject. Call 2 is gelanceerd op 30 mei. Het gaat opnieuw over een call van 15 mio die volgens dezelfde voorwaarden en hetzelfde beoordelingskader zal worden uitgevoerd
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Marktverkenning (uitbesteed aan Möbius)	2021 Q1	Gerealiseerd	
Beoordelingskader (uitbesteed aan Möbius)	2021 Q1	Gerealiseerd	
Implementatie van het beoordelingskader	2021 Q2	Gerealiseerd	
Lanceren 1e call	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste call afgerond	2022 Q2	Op schema	
Lanceren 2e call	2022 Q2	Gerealiseerd	
2e call afgerond	2022 Q4	Nog niet gestart	
MP RRF: Minstens 6 recyclage-installaties zijn gerealiseerd	2026 Q2	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde recyclage-installaties of eenheden	6	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 30.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3/09/2021. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaal kringlopen te sluiten](#)

[Briefadvies Minaraad. BVR ondernemingssteun recyclagehub. Bijlage](#)

[Advies SERV. BVR Recyclagehub. Bijlage](#)

[Advies Raad van State. BVR Recyclagehub. Bijlage](#)

25. Investerings groene warmte

VV126 - CALL GROENE WARMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Investeerders in grootschalige installaties voor de productie van groene warmte, benutting van restwarmte en warmtenetten.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	25. Investerings groene warmte
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen gaat naar de productie van warmte. Er wordt nog steeds massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Grootschalige restwarmtebenuttingsprojecten recupereert warmte die anders verloren zou gaan, groene-warmte-projecten verhogen het aandeel warmteproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Via dit project wordt het budget voor investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie verhoogd. De investeringssteun wordt toegekend via de calls groene warmte, restwarmte en warmtenetten. In 2021 en 2022 worden telkens 2 calls per jaar opengesteld voor projectaanvragen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	50.000.000 EUR
Output	Minstens 100% aangevraagd budget ten opzichte van het opengestelde budget
Outcome	710 kton vermeden CO2-emissies en ca. 3500 GWh warmteproductie in de eerste 10 jaar, waarvan de helft groene warmte.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De eerste en tweede projectoproep werden ondertussen gegund. De gunning voor de derde oproep is lopende. De callregeling werd bij beslissing van de VR van 2 juli 2021 aangepast en geoptimaliseerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke
politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
MB eerste call gepubliceerd	2021 Q1	Gerealiseerd	MB voor organisatie van de eerste call voor het jaar 2021 werd in het BS gepubliceerd op 27 januari 2021
Gunning eerste call	2021 Q2	Gerealiseerd	
Aanpassingen Energiebesluit optimalisering callregeling	2021 Q3	Gerealiseerd	
MB tweede call gepubliceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	MB voor organisatie van de tweede call voor het jaar 2021 werd in het BS gepubliceerd op 8 september 2021
Gunning tweede call	2022 Q1	Gerealiseerd	
MB derde call gepubliceerd	2022 Q1	Gerealiseerd	MB voor organisatie van derde call (eerste call 2022) werd in het BS gepubliceerd op 22 april 2022.
Gunning derde call	2022 Q2	Op schema	
Gunning van opdrachten in het kader van de aanbesteding voor projecten van hernieuwbare energie of afvalwarmte in het kader van de maatregel "Call groene warmte".	2023 Q1	Op schema	
Voltooiing van de projecten die gegund zijn in het kader van de call groene warmte, met 39 870 000 EUR (of 90% van de RRF-steun) uitgevoerd	2026 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Budget uitbetaald voor in 2021 en 2022 ingediende en gegunde projecten voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten	5.700.000 euro (Vlaamse middelen)	2023 Q1	580.898	10,19 %
Budget uitbetaald voor in 2021 en 2022 ingediende en gegunde projecten voor	44.300.000 euro (RRF)	2026 Q2		

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
groene warmte, restwarmte en warmtenetten				

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	17.600.000 EUR
Uitvoering VEK	33.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 44.300.000 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 5.700.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Energiebesluit van 19 november 2010 Titel VII Hoofdstuk IV en V

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Call groene warmte](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Call groene warmte](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan](#)

[Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan. Bijlage](#)

26. Digibanken

VV127 - DIGIBANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	We kiezen er voor om digibanken tot stand te laten komen als een samenwerking tussen diverse (lokale) partners, zoals overheden, reguliere bedrijven, kennisinstellingen, opleidingspartners, sociale economie en het middenveld. Binnen de lokale partnerschappen zal betrokkenheid van sociale economie-ondernemingen en lokale VDAB-actoren sterk gestimuleerd worden, net zoals de samenwerking met reguliere of lokale ondernemingen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	26. Digibanken
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Volgens de 'Barometer Digitale Inclusie' van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een kwetsbare positie (onder meer kortgeschoolden, mensen in armoede en laaggeletterden) in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze kloof is (cumulatief) aanwezig op meerdere facetten.</p> <p>Met de oprichting van 'digibanken' wil de Vlaamse Overheid het risico op digitale uitsluiting verkleinen via drie inhoudelijke doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (vb. uitleendienst).• Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).• Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, enz.) via zogenaamde fysieke knooppunten. <p>De doelgroep als eindgebruiker van de digibanken omvat volwassen personen (+18 jaar) in Vlaanderen met een (risico op) digitale achterstand.</p> <p>Binnen Vlaanderen is een scala aan ondernemingen en organisaties reeds actief op één van bovenstaande doelstellingen en activiteiten. Samenwerking tussen deze partners is momenteel eerder onbestaande of louter ad hoc, en afhankelijk van menselijk en financieel kapitaal. De uitdagingen rond de digitale kloof variëren daarnaast ook regionaal en lokaal.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Het is de ambitie om via dit project deze diverse spelers in lokale samenwerkingsverbanden als 'digibanken' te verenigen en te stroomlijnen in een ketenstructuur met een gezamenlijke doelgerichte strategie en dienstverlening. De digibanken-partnerschappen worden zichtbaar in een laagdrempelige fysieke toegangspoort voor de publieksgroepen naar verschillende (digitale) diensten.

De structuur en samenstelling van elk 'digibank'-project kan lokaal of regionaal verschillen, met voldoende aandacht voor de lokale autonomie en diversiteit, en wordt 'bottom-up' bepaald binnen de kwaliteitsvereisten voorzien in de oproepen. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden liggen binnen de opgezette partnerschappen.

De lokale digibank-projecten zullen worden toegewezen via verschillende (periodieke) open subsidie-oproepen verspreid over meerdere parallelle indieningsrondes in 2021 en 2022.

De oproep 'Digibanken – Voortraject' voorziet de mogelijkheid aan (kandidaat-)partnerschappen om a) de strategie voor de implementatie van het lokale digibank-project en de gedeelde dienstverlening en b) het partnerschap verder concreet vorm te geven. Binnen de strategie is aandacht voor de doelgroep, outreachstrategie, samenwerking met sociale economie, circulariteit, duurzaamheid en opschaalbaarheid van het model, connectiviteit en impactmeting.

De oproep 'Digibanken – Implementatietraject' wil de effectieve uitvoering van lokale digibank-projecten vanuit het geformaliseerde partnerschap en de samenwerkingsstrategie ondersteunen. Tijdens deze uitvoering werken de partnerschappen aan de drie bovenstaande doelstellingen.

We beogen hierbij partnerschappen met een voldoende schaalgrootte en/of bereik te ondersteunen. We beogen eveneens een duurzame impact: de ontwikkeling van leefbare en innovatieve modellen, met voldoende maturiteit, economische rendabiliteit en opschaalbaarheid die na de ondersteuningsperiode operationeel kunnen blijven.

Bovenstaande doelstellingen omvatten ook activiteiten die een breder circulair en sociaal doel kunnen verwezenlijken. Bijvoorbeeld, herstel en recyclage van (ICT-)materiaal, of circulaire aankopen. Via de digibank-projecten willen we bijdragen tot een circulaire economie via vernieuwende antwoorden.

De projecten zullen vrijblijvend beroep kunnen doen op ondersteuning voor de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst- en strategie, om de kwaliteit van samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden te garanderen.

Via de website digibanken.vlaanderen.be wordt iedereen geïnformeerd over het project, en via digibanken.vlaanderen.be/inspiratie/9-nieuwe-voortrajecten-gaan-van-start wordt een (visueel) overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in de Vlaamse gemeentes met een voortraject of implementatietraject.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	50.000.000 EUR
Output	100 gemeenten in Vlaanderen maken deel uit van het werkingsgebied van de digibank-partnerschappen, om 1) gelijke toegang tot digitale technologie te garanderen via de voorwaardelijke terbeschikkingstelling van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (zoals een uitleendienst); 2) de digitale vaardigheden te versterken, zowel persoonlijke als technische vaardigheden (zoals herstelling van IT-uitrusting) via opleiding en kennisdeling;

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	3) digitale toegang te verschaffen tot essentiële diensten (zoals de digitale diensten van de Vlaamse overheid, Tax-on-Web) via zogenoemde fysieke knooppunten. (RRF)
Outcome	Bereikte volwassen personen door de digibank-partnerschappen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het BVR tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken werd ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering op 17 december 2021.</p> <p>Een eerste ronde oproepen werd gelanceerd op 4 oktober 2021. Projectaanvragen konden ingediend worden tot 15 november 2021.</p> <p>Vervolgens was er de formele en inhoudelijke beoordeling van de projectvoorstellen. Er werden in de eerste ronde 29 aanvragen tot de voortrajecten (voor samenstelling en uitwerking van het lokale partnerschap) en 6 aanvragen tot implementatietrajecten (effectieve uitvoering lokale digibank) ingediend. Alle projecten werden goedgekeurd en kregen eind januari 2022 de formele bevestiging hun project verder uit te werken (29 voortrajecten en 6 implementatietrajecten tot de realisatie van een concrete lokale digibank).</p> <p>Begin februari 2022 werd een tweede ronde oproepen gelanceerd (zowel voortrajecten als implementatietrajecten). Projectaanvragen voor deze tweede ronde werden ingediend op 10 maart 2022 (voortrajecten) en 24 maart 2022 (implementatietrajecten). Ondertussen werden 9 voortrajecten goedgekeurd en 1 implementatietraject tot de effectieve realisatie van een lokale digibank.</p> <p>Op dit ogenblik zijn verspreid over Vlaanderen reeds 7 lokale digibanken effectief operationeel (sinds voorjaar 2022) en 38 lokale partnerschappen hebben hun voortraject bijna volledig afgerond om zich vervolgens tot een concrete digibank te kunnen omvormen midden 2022.</p> <p>Een derde oproepronde voor voortrajecten en implementatietrajecten werd eind maart / begin april 2022 gelanceerd en heeft tot 16 juni 2022 gelopen. Binnen deze ronde kunnen voortrajecten uit de eerste oproepronde een aanvraag indienen tot het implementatietraject.</p> <p>Een vierde oproepronde zal nog voor de zomervakantie worden opengesteld. De flankerende acties zijn eveneens lopende. Een nieuwe website werd ontwikkeld. Er worden nog bijkomende communicatietools voor de projecten uitgewerkt.</p> <p>De opdracht voor de procesbegeleiding en de realisatie van lerende netwerken werden gegund, en zijn opgestart in januari 2022.</p> <p>De opdracht i.v.m. de impactmeting wordt voorbereid en zal eind 2022 gegund worden.</p> <p>De beslissing om de uitgaven ikv RRF eind dit jaar volledig vast te leggen is mogelijk problematisch voor dit grote project. Dit wordt verder begrotingstechnisch bekeken.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De kadernota VR is goedgekeurd.	2021 Q2	Gerealiseerd	
De oproepen 'Digibanken - Voortraject' en 'Digibanken - Implementatietraject' zijn gelanceerd.	2022 Q4	Op schema	Oproep ronde 1: indiening van 4/10/2021 tot 15/11/2021 (voortrajecten en implementatietrajecten) Oproep ronde 2: indiening tot 10/03/2022 (voortrajecten) en indiening tot 24/03/2022 (implementatietrajecten) Oproep ronde 3: indiening van 28/03/2022 tot 16/06/2022 (voortrajecten en implementatietrajecten) Oproep ronde 4: indiening van 20/06/2022 tot 8/09/2022 (implementatietrajecten) Oproep ronde 5: indiening van 12/09/2022 tot 27/10/2022 (implementatietrajecten)
Ondertekening van partnerschappen voor de promotie van digitale inclusie (RRF)	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal gemeenten in Vlaanderen dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de digibank-partnerschappen (RRF) Opgelet, de RRF-indicator wordt pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.	100	2022 Q4	166	166 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.196.000 EUR
Uitvoering VEK	1.611.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 50.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Kadernota:

- [VR 2/04/2021 Digibanken - nota](#)

- [VR 2/04/2021 Digibanken - bijlage](#)

Regelgeving projectfinanciering

[Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken – principiële goedkeuring](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken - nota](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 september 2021. Digibanken: Oproepen 'Voortraject' en 'Implementatietraject' - 2021](#)

[Oproep digibanken voortraject 2021. Handleiding - Oproepformulier 04/10/2021](#)

[Oproep digibanken implementatietraject 2021. Handleiding - Oproepformulier. 04/10/2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken – definitieve goedkeuring](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken](#)

[Advies SERV van 5 juli 2021. Digibanken](#)

[Advies van de Raad van State van 16 augustus 2021. Een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken](#)

[Programmadecreet bij de begroting 2022 \(artikel 82\)](#)

- Opname relancemiddelen

[Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021 tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2022 tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

[VV050 - Digitalisering integratie & inburgering](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV051 - Gemeente zonder gemeentehuis](#)

[VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies](#)

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

[VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet](#)

[VV056 - Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022](#)

[VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie](#)

[VV058 - AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening \(inclusief bijdrage subsidierijregister\)](#)

[VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel](#)

[VV063 - Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck](#)

[VV065 - HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM \(Security Information & Event Management\)](#)

[VV076 - Zelf beheerde identiteit](#)

27. Digitale vaardigheden

VV128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Sociale partners, VESOC, (RvB) VDAB, expertisecentrum Innovatieve leerwegen, Departement Onderwijs, opleidingspartners, werkgevers, sectorfondsen, VLABEL, RSZ, FOD FIN, KSZ, AIV

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	27. Digitale vaardigheden
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>We grijpen de mogelijkheden van de huidige crisisperiode aan om de digitale revolutie waar te maken. We bouwen Vlaanderen uit tot een toonaangevende data-economie en -maatschappij en benutten de mogelijkheden die digitalisering aanreikt om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.</p> <p>Door binnen dit akkoord in te zetten op de ontwikkeling van digitale talenten verzekeren we het succes van deze noodzakelijke digitale transformatie. Vlaanderen treedt hier naar voor als pionier en zal in dit kader onder meer een gepersonaliseerd loopbaanplatform en leer- en loopbaanrekening lanceren om mensen te helpen werk te vinden, (online) opleiding te volgen, zich te herscholen en de werkzaamheidsgraad verder te verhogen. Ook ondernemingen en hun werknemers ondersteunen we in de digitale transformatie. Tegelijkertijd hebben we aandacht voor de digitale kloof. We versterken de digitale vaardigheden van alle Vlamingen en ondersteunen initiatieven om kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf.</p> <p>De Vlaamse overheid speelt hier een voorbeeldrol, zowel in de digitalisering van de eigen dienstverlening als wat digitale toegankelijkheid en de ontsluiting en benutting van data betreft.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	54.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> Overeenkomst tussen de sociale partners en de Vlaamse regering over een visienota waarin wordt voorgesteld hoe de leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen zal worden ingevoerd, rekening houdend met de behoefte aan meer transparantie voor burgers, betere inclusie van kwetsbare groepen en in overeenstemming met het digitale leerrekeningsplatform dat op federaal niveau wordt opgezet. (RRF)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<ul style="list-style-type: none"> • 70 e-learningprojecten worden goedgekeurd, gelanceerd en voltooid op basis van een oproep tot het indienen van projecten. (RRF) • Volgende digitale tools en diensten voor burgers, werkgevers en VDAB-partners in Vlaamse Gemeenschap zullen worden ontplooid: <ul style="list-style-type: none"> o Een gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform, gekoppeld aan een gepersonaliseerd aanbod van opleidingskansen en incentives voor burgers is toegankelijk en operationeel. o Het digitaal werkgeversloket van VDAB en het digitaal partnerplatform is operationeel, waardoor VDAB-bemiddelaars alle werkgevers met vacatures in gedeeld beheer actief kunnen contacteren en hen digitaal kunnen ondersteunen bij het opvullen van de vacatures. De follow-up van alle VDAB-partners wordt ook verricht via het digitaal partnerplatform. o De digitale diensten voor werkgevers zijn uitgebreid door middel van een digitaal werkgeversloket van het departement Werk en Sociale Economie, dat openstaat voor alle werkgevers. o Het data-ecosysteem voor partners van het departement Werk en Sociale Economie is operationeel gemaakt: 15 relevante gegevensbanken zijn ter beschikking gesteld op het opendataplatform voor onderzoek en andere doeleinden.
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Rond het actieplan e-leren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - werd het plan voor lancering & communicatie in mei 2022 gefinaliseerd. Momenteel concretiseren we de volgende stappen om verder in te zetten op het infopunt in 2022: additionele nieuwe content, learning journeys, verbeterde user experience en additionele inbound marketing om het informatiepunt kenbaar te maken bij opleidingsverstrekkers. Deze extra initiatieven worden opgezet obv onderzoek naar de noden van opleidingsverstrekkers. - werden 65 van de 83 ingediende projecten ikv. oproep e-leren goedgekeurd en opgestart op 15 oktober '21 met een looptijd van een jaar. Hiervan zijn er 3 ingetrokken, bijgevolg lopen er nu nog 62 projecten e-leren. Om nog tot 70 projecten e-leren te komen die operationeel zijn eind 2022 (met link naar opleiding), wordt er nu via entiteiten AgO en VDAB een 25-tal e-opleidingen voorzien. - moest de overheidsopdracht van het vooronderzoek (noden in kaart brengen) opnieuw gelanceerd worden. Deze is ondertussen gegund en de dienstverlener is gestart. De overheidsopdrachten inzake facilitatie van het lerend netwerk e-leren en coaches/experten inzake usability design zijn sinds februari '22 aan de slag. <p>De eerste versie van het gepersonaliseerd loopbaanplatform is toegankelijk sinds 17/09/'21. 'Mijn Loopbaan' maakte plaats voor (een eerste versie van) het gepersonaliseerd loopbaanplatform vdab.be. De gloednieuwe informatiepagina over de voordelen van een account werd in oktober 2021 10.427 keer bezocht. Mensen hebben dus duidelijk interesse in de voordelen van een account op vdab.be. In april 2022 telden we 39.820 gebruikers van de digitale dienstverlening van VDAB.be zonder inschrijving (de zgn "account-werking", die sinds september 2021 beschikbaar is). In 2022 – 2023 maken we de gepersonaliseerde website interactiever en breiden we het profiel uit.</p> <p>Voor de uitwerking van een digitaal opleidingsplatform is intussen een klantenonderzoek afgerond en zijn de belangrijkste noden in kaart gebracht. In de loop van 2022 wordt verder werk gemaakt van een referentiestructuur voor opleidingsinformatie, gaan we aan</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

de slag om software te maken/kiezen die de processen kan ondersteunen om opleidingsdata in de catalogus te plaatsen en beheren en beginnen we met ontwerpen te maken van hoe we opleidingen via 'vind een opleiding' willen ontsluiten naar de klanten, op basis van de noden uit het onderzoek.

De vernieuwde werkgeversbenadering wordt uitgewerkt in aantal deelprojecten:

- Laagdrempelige toegang voor werkgevers tot een specifieke afdeling binnen de Servicelijn waar de werkgever rechtstreeks (online) vragen kan stellen die meteen bij de juiste afdeling terechtkomen. Dit werd gerealiseerd.
- Uitrol intensieve vacaturewerking: Proeftuin binnen de Sector Industrie met proactieve werking met focus op knelpuntberoepen liep in 2021 en wordt in 2022 uitgebreid naar andere sectoren. Doel is om samen met werkgevers oplossingen te zoeken voor openstaande knelpuntvacatures door maatwerk en het proactief voorstellen van services. Later (eind 2022 – begin 2023) is het ook de bedoeling om via een projectmatige werking en het bundelen per beroep de knelpuntberoepen effectiever aan te pakken. In april 2022 werden 30.627 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het NECzU. Dat is 12,9% meer dan in april 2021. De voorbije twaalf maanden (mei 2021 t/m april 2022) werden 398.338 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 52% meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.

Om te voorzien in een vernieuwd digitaal werkgeversloket werd Op 31/01/'22 de versnelde automatische registratie voor 'Mijn VDAB' gelanceerd. Op 01/02/2022 ging ook de vernieuwde 'Vind een Werknemer', de self-service tool voor de werkgever om zelf gepaste kandidaten te zoeken, live. Hiermee krijgt deze een verbeterde user experience en bijkomende selectiecriteria. In 2022 wordt nog gewerkt aan het verbeteren van het werkgeversplatform 'Mijn VDAB' met o.a. een vernieuwde landingspagina.

In 2021 liepen experimenten in de provincies met als doel digitale jobevents structureel uit te werken. Sinds mei 2021 werden er 9 digitale jobbeurzen georganiseerd, waar 177 bedrijven aan deelnamen. Daarnaast liepen de experimenten met het geselecteerde virtuele platform af na aanpassing aan de bijkomende vereisten van VDAB. Dit project is nu structureel ingebed in de dienstverlening van VDAB als volwaardig alternatief op fysieke events. In de loop van 2022 zullen nog verschillende digitale events plaatsvinden.

We digitaliseren het partnermanagement bij VDAB. Omdat er enige vertraging is opgelopen in het afsluiten van kadercontracten tussen Vlaamse overheid en de geselecteerde CRM-leverancier, verschuift de opstart voor configuratie van het platform. In 2021 werd wel al gewerkt aan het kader voor business architectuur. De gunning van het CRM platform is voorzien in september 2022, waardoor opstart voor configuratie van het platform kan volgen. De oplevering van de eerste versie is voorzien vanaf het tweede kwartaal van '23, daarna volgt finetuning.

Fase 1 van de leer- en loopbaanrekening, de Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives, werd afgerond in 2021. Fase 2, de voorbereiding van het gepersonaliseerd overzicht opleidingsincentives, is ongoing. De samenwerkingsovereenkomst Mijn Burgerprofiel – WSE werd opgesteld en de ontwikkelingen zullen in Q2-Q3 2022 plaatsvinden. Intussen werd ook de visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen' goedgekeurd op de VR van 25/03/'22.

Verschuiven digitaliseringsprojecten naar burgers komen stilaan op koers:

- Innovatie dienstencheques: Het eindrapport van de consultancy-opdracht werd opgeleverd en de volgende stappen worden op basis van de conclusies geformuleerd.
- Verdere digitalisering van aanmoedigingspremies is in uitvoering
- Digitalisering incentives werkplekken dual moet nog opgestart worden: administratieve

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>vereenvoudiging van de incentive aan ondernemingen in duaal leren en andere alternerende opleidingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisering aanvraag jobbonus is in uitvoering. <p>Het WSE digitaal werkgeversloket is in volle opbouw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Productkeuze customer service management is afgerond, de implementatie ervan opgestart en het gebruikersonderzoek ifv. behoeftenanalyse afgerond. De gunning van een geschikt CRM-platform dat integreert met het WSE loket is voltooid. Het implementatietraject wordt opgestart. - De digitale aanvraag voor collectief maatwerk en ondersteuningsdecreet werd reeds gerealiseerd - De lancering WSE-loket beroepskaarten (ikv digitaal nieuw beleid) werd gerealiseerd op 1 februari '22. Het proces omtrent operationalisering digitalisering aanvragen beroepskaart is lopende. Concreet houdt dit overlegmomenten in met betrokken partijen zoals departement cultuur, sport-Vlaanderen, FIT, Vlaio, federatie diamant, ondernemingsloketten, BUZA, VSI, IT. - Het WSE-loket werd gelanceerd op 1 feb '22. Verdere graduele invoering van de digitalisering van aanvragen via mandataris en niet-EU aanvrager via verblijf in het buitenland loopt. <p>De WSE digitaliseringsprojecten naar partners komen stilaan op koers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het gebruikersonderzoek ifv. behoeftenanalyse is afgerond en verdere detailanalyse opgestart. - Eerste implementatie van het digitaal cijferportaal i.s.m. steunpunt is in uitvoering. - Digitalisering duaal leren: operationalisering is voorzien in 2022. De toepassingen m.b.t. duaal leren worden uitgebreid om de introductie van het duaal leren binnen het volwassenonderwijs te kunnen ondersteunen. De ontwikkeling werd opgestart. - De ontwikkeling van het leveranciersplatform beroepskwalificerende trajecten is in afronding. De wetgevende wijziging is uitgevoerd en het protocol is opgemaakt. We bereiden de ingebruikname en uitrol voor. <p>De beslissing om de alle uitgaven ikv. RRF eind dit jaar vast te leggen is mogelijk problematisch voor dit project (specifiek voor de acties rond e-leren, de competentiechecks en de leer- en loopbaanrekening). Voor de eerste twee biedt de begrotingsruiter die hiervoor werd opgezet mogelijk een oplossing.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Actieplan e-leren - centraal informatiepunt: Het nieuwe platform infopunt e-leren is operationeel. (VDAB)	2022 Q4	Op schema	
Actieplan e-leren - oproep e-leren: De oproep e-leren is gefinaliseerd.	2022 Q4	Op schema	
Versnelling uitrol werkgeversbenadering: De vernieuwde intensieve	2023 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
vacaturewerking van VDAB is operationeel. (VDAB)			
Leer- en loopbaanrekening: De gepersonaliseerde portefeuille Vlaamse opleidingsincentives is online beschikbaar	2023 Q4	Op schema	
Digitale dienstverlening WSE naar burgers: Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.	2023 Q4	Op schema	
Digitale dienstverlening naar werkgevers: Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.	2023 Q4	Op schema	
Digitaal werkgeversloket VDAB: Het digitaal werkgeversloket van VDAB is operationeel. (VDAB)	2023 Q4	Op schema	
Digitale jobbeurzen: De organisatie van digitale jobbeurzen is ingebed in de reguliere werking van VDAB. (VDAB)	2023 Q4	Gerealiseerd	
Digitalisering VDAB partnermanagement: Het digitaal partnerplatform van VDAB is operationeel. (VDAB)	2023 Q4	Vertraging	Omdat er enige vertraging is opgelopen in het afsluiten van kadercontracten tussen Vlaamse overheid en de geselecteerde CRM-leverancier, verschuift de opstart voor configuratie van het platform.
Digitaal opleidingsplatform: Het digitaal opleidingsplatform van VDAB is operationeel. (VDAB)	2023 Q4	Op schema	
Gepersonaliseerde burgerwebsite voor de loopbaan: Het gepersonaliseerd loopbaanplatform van VDAB is operationeel. (VDAB)	2023 Q4	Op schema	
Digitale dienstverlening WSE naar partners: Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.	2024 Q4	Op schema	
Actieplan e-leren - overheidsopdrachten: De overheidsopdrachten zijn gelanceerd.	2024 Q4	Op schema	
Visienota over leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen (RRF)	2022 Q2	Gerealiseerd	
Ontwikkeling van een elektronisch leeraanbod in Vlaanderen (RRF)	2022 Q4	Op schema	
Digitale tools en diensten voor burgers, werknemers en partners van de Vlaamse	2023 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Openbare Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), volledig ontplooid in Vlaanderen (RRF)			

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal e-learningprojecten dat wordt goedgekeurd, gelanceerd en voltooid op basis van een oproep tot het indienen van projecten. (RRF) Opgelet, de RRF-indicator wordt op een striktere manier berekend en pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.	70	2022 Q4	62	88,6 %
Aantal jaarlijks gemelde vacatures bij VDAB (periode augustus - juli) Realisatie is een tussentijdse rapportering van mei 2021 tem. april 2022	Stijging tov. augustus 2020 - juli 2021 (297.928)	2023 Q4	398.338	100 %
DWSE digitaliseringsprojecten naar partners: 15 relevante gegevensbanken zijn ter beschikking gesteld op het opendataplatform voor onderzoek en andere doeleinden. (RRF) Opgelet, de RRF-indicator wordt op een striktere manier berekend en pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.	15	2023 Q4		
Aantal gebruikers van digitale dienstverlening van VDAB.be zonder inschrijving ("account-werking", sinds september 2021) Realisatie is een tussentijdse rapportering van april 2022	stijging t.o.v. december 2021 (36.284 unieke gebruikers in de loop van de meetmaand)	2024 Q4	39.820	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	54.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	54.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VAK	28.196.000 EUR
Uitvoering VEK	17.498.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 43.200.000 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 10.800.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Digitaliseringsprojecten VDAB en Departement WSE in kader van AHAD](#)

[Mededeling aan het stuurorgaan Vlaams informatie en ICT-beleid. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 22 oktober 2021. Actieplan E-leren](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 maart 2022. Visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen' + bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

[VV050 - Digitalisering integratie & inburgering](#)

[VV051 - Gemeente zonder gemeentehuis](#)

[VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies](#)

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

[VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet](#)

[VV056 - Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022](#)

[VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie](#)

[VV058 - AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening \(inclusief bijdrage subsidieregister\)](#)

[VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel](#)

[VV063 - Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck](#)

[VV065 - HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM \(Security Information & Event Management\)](#)

[VV076 - Zelf beheerde identiteit](#)

28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector

VV129 - CULTUUR - BETERE INFORMATIEDOORSTROMING EN KOPPELING DATABANKEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het Departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de datagedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.

Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken.

Het Departement CJM maakt eveneens deel uit van dit ecosysteem en wil haar dienstverlening en data zo maximaal mogelijk afstemmen, inrichten en opbouwen dat ze de processen en digitale transformatie in de sectoren cultuur, jeugd en media mee aanjaagt. Het departement ontwikkelt haar datastrategie verder door, ook in lijn met de in 2021 opgemaakte datastrategie van de Vlaamse overheid. Digitalisering van dienstverlening en datastromen zijn hierin de rode draad. Het wil evolueren tot een situatie waarbij data gestandaardiseerd kunnen vloeien, waarbij het Departement CJM unieke databronnen kan aanspreken in functie van haar beleids- en evaluatienoden en deze voor bepaalde processen (subsidieprocessen, gegevensregistratie) ook zelf kan ontwikkelen, waarbij de sector tegelijk ontzorgt wordt en datamogelijkheden beter kan benutten.

De uitwerking van bovenvermelde projecten brengen duidelijke knelpunten mee op vlak van de nodige fundamentele datapraktijken (datamanagement, datagovernance, datakwaliteit ...). De veelheid aan externe en interne projecten onderstreept de nood aan een duidelijk samenwerkingsverband tussen mensen die verantwoordelijkheid opnemen om de bruikbaarheid van data binnen het ecosysteem te garanderen en dit over teams en organisaties heen. Dit onderliggend project zet daarom in de periode 2022-2023 in op de

PROJECTOMSCHRIJVING

verdere ontwikkeling van een duidelijk data strategisch raamwerk om zo de nodige organisatorische bouwstenen te voorzien voor de onderbouwing van de basismonitoring, de data governance en het doorstromen van data doorheen het ecosysteem om de datamogelijkheden optimaler te benutten.

Het Departement CJM start(te) in 2021/2022 volgende OSLO-standaardisatietrajecten op: cultuurparticipatie, cultuur- en jeugdinfrastructuur, financiële data, cultureel erfgoed en tewerkstelling (nog gepland in najaar 2022). Na de validatie (en erkenning) van de uitwisselingsmodellen dient er ook aandacht besteed te worden aan de implementatie in de adoptie door de culturele sector. Dit is noodzakelijk om het digitale ecosysteem uit te bouwen. Binnen dit project lopen er drie aparte deelprojecten namelijk een OSLO-implementatieproject, het uitschrijven en uitvoeren van een PIO-opdracht en een governance project.

Samen met de kernspelers in de culturele sector worden er implementatiemodellen bepaald met inbegrip van het operationaliseren van de relaties tussen de verschillende OSLO-trajecten. Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling voor applicaties die een bepaalde use case vervullen. Het laat toe om naast een gedeelde semantiek ook bijkomende restricties op te leggen, zoals het vastleggen van kardinaliteiten of het gebruik van bepaalde codelijsten. Een implementatiemodel dient als documentatie voor analisten, ontwikkelaars en dataleveranciers.

Daarnaast wordt ook bekeken hoe culturele organisaties gestimuleerd kunnen worden om aanpassingen aan hun systemen te doen zodat ze OSLO compatibele data genereren. Hiervoor wordt er een PIO-opdracht uitgeschreven waarin beken wordt hoe softwareleveranciers overtuigd kunnen worden om OSLO verder te implementeren. Ook systeemtechnische aanpassingen aan de kant van het Departement CJM komen hierbij in beeld net zoals het opzetten van een governancemodel dat enerzijds het toekomstige beheer en onderhoud van de bestaande OSLO-data-elementen mogelijk maakt maar eveneens nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Er wordt een governanceproject opgesteld met als uitgangspunt een beheersproces waarbij duidelijke taken, rollen, verantwoordelijkheden en mandaten kunnen worden vastgelegd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	250.000 EUR
Output	<p>Dit project voorziet volgende output:</p> <ul style="list-style-type: none">- Niet alle ontwikkelingen binnen de digitale transformatie op vlak van datacentrisch denken kunnen gelijktijdig doorgevoerd worden. De implementatie van de datastrategie en datagedreven dienstverlening wordt op volgorde gezet. Dit project voorziet dan ook in de opstart van een datastrategie backlog en beslissingslog die transparant en toegankelijk bestaande knelpunten documenteert en die duidelijke de gestelde prioriteiten communiceert. Dit houdt dus ook in dat er een referentiekader ontwikkeld moet worden op basis waarvan deze prioriteiten gesteld zullen worden.- Verantwoordelijkheden met betrekking tot data en producten die gebruik maken van data worden gekoppeld aan een aantal rollen, zoals data governance lead, data steward of data owner, en werken samen met één doel: vragen, problemen, drempels die het ecosysteem tegenkomt op haar pad naar een data gedreven, digitale toekomst uit de weg ruimen. Waar nodig reactief, waar mogelijk proactief.- Niet iedereen zal onmiddellijk overtuigd zijn van de noodzaak en van de aanpak. Gezien de impact van de digitale transformatie is dit niet verwonderlijk en ook niet per se problematisch; de digitale transformatie brengt organisatorische cultuuruitdagingen mee binnen het ecosysteem. Om datagedreven beleid succesvol te introduceren, is een zekere mate van change management dus cruciaal. Binnen dit project zal expliciet aandacht geschonken worden aan change management en zullen concrete stappen op dit vlak mee opgenomen worden in de roadmap. Dit houdt in dat concrete acties worden vastgelegd die tot doel hebben mensen en organisaties van de nieuwe aanpak binnen het ecosysteem te overtuigen en ook richtlijnen omtrent hoe omgegaan zal worden met diegene die niet onmiddellijk mee aan boord zijn.- Als onderdeel van bovenvermeld change management zal ook concreet gewerkt worden aan

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>een overkoepelend communicatielink. Gebrek aan informatiedoorstroming met betrekking tot initiatieven die lopen of in het verleden liepen, is een grote risicofactor ten aanzien van het draagvlak van de digitale transformatie. Ook mensen die overtuigd zijn van het nut ervan, hebben nood aan een duidelijk overzicht van wat ze kunnen verwachten en waar zij zich bevinden binnen het ecosysteem.</p>
Outcome	<p>De data waarover het ecosysteem beschikt biedt meerwaarde voor het ecosysteem. Dit betekent dat de data waarover het Departement CJM beschikt of het Departement vanuit haar positie de gereede partij is om ze capteren, maximaal ter beschikking en open krijgt voor het ecosysteem. Om de datagedreven dienstverlening te realiseren en de rol binnen het ecosysteem te versterken, beschikt het Departement over een robuuste, programmatorische aanpak voor haar datastrategie.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Project wordt in detail uitgewerkt op basis van de inzichten en de noden die voortkomen uit de lopende OSLO-tracks. Dit zal tot verschillende acties leiden om de implementatie op een efficiënte manier te faciliteren (i.t.t. één opdracht). De mijlpalen zijn indicatief geformuleerd omdat we nog niet ver genoeg zitten in de projectuitvoering. We formuleren de mijlpalen indicatief omdat we nog niet ver genoeg zitten in de projectfase.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opdrachtschrijving afgewerkt en bestek gepubliceerd	2022 Q2	Vertraging	Er werd ervoor geopteerd om de lopende OSLO-tracks eerst af te ronden om op die manier het effect van het implementatietraject te verhogen.
Gunnen van het governanceproject om governance model op te stellen	2022 Q4	Nog niet gestart	
Gunnen van het OSLO- implementatieproject waarbij implementatiemodellen worden opgesteld	2022 Q4	Nog niet gestart	
Opleveren van het governanceproject met governance model	2023 Q4	Nog niet gestart	
Opleveren van het OSLO- implementatie project	2023 Q4	Nog niet gestart	
Opleveren PIO-opdracht	2023 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	250.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 250.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Digitale transformatie van de cultuursector. Koppeling databanken en betere informatiedoorstroming</p> <p>Business Case Doelgericht Digitaal Transformeren. Bijlage</p> <p>Budget. Bijlage</p>

VV130 - CULTUUR - DIGITALISERING VAN COLLECTIES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het Departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt. Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken

Een kritische massa aan digitale content is een voorwaarde om het digitale culturele ecosysteem te optimaliseren. De achterstanden inzake gedigitaliseerde (en gemetadateerde) content zijn nog steeds aanzienlijk, zowel binnen cultureel erfgoed als binnen kunsten, ondanks de huidige werking van meemoo en de mogelijkheden die door het Cultureelerfgoeddecreet en ad-hocreglementen zoals de inhaalbeweging digitale collectieregistratie worden geboden. Dit project beoogt om via coördinatie en schaalvoordelen een belangrijke stap vooruit te zetten inzake de digitalisering, metadatering en duurzame beschikbaarheidsstelling van culturele collecties en wil komen tot een situatie waarbij er een duidelijke stand van zaken is en een stappenplan voor verdere evoluties.

Na afloop van dit project zullen de grootste achterstanden weggewerkt zijn en is het gecreëerde materiaal open - conform de OSLO-uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed - toegankelijk zodat dit verder maatschappelijk gevaloriseerd kan worden.

Het project valt uiteen in volgende vier deelprojecten:

Deelproject 1. Gecoördineerde digitaliseringsactie door een consortium, door meemoo gecoördineerd, dat de organisatorische en technische expertise heeft om dit digitaliseringsproject op een gecoördineerde manier uit te voeren teneinde schaalvoordelen te realiseren. (budget: 2.705.000 EUR).

Deelproject 2. Een versterking van het reglement rond inhaalbeweging op vlak van digitale collectieregistratie. Meemoo voorziet begeleiding tijdens de voorbereidingsfase én tijdens de uitvoering van de projecten. Met dit subsidiereglement worden naast sterker gecoördineerde acties (deelproject 1) ook kansen geboden aan kleinschaliger initiatieven vanuit één of enkele organisaties. Uiteraard wordt er een

PROJECTOMSCHRIJVING

optimale afstemming beoogd tussen beide deelprojecten. Wat de doelstellingen van het subsidiereglement betreft gaat het om een gecontinueerde inzet op het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie, het inzetten van de collectiedata als open data en het zichtbaar maken van de collectie(data) en het sterker reflecteren over de bredere visie van organisaties op het gebruik van digitale technologie in het beheren en zichtbaar maken van de collectie en de collectiedata. (budget: 1.817.500 EUR, waarvan 130.000 EUR voor begeleiding meemoo, en 1.687.500 EUR voor de subsidielijn).

Deelproject 3. Businesscase m.b.t. de randvoorwaarden i.f.v. creatie, duurzame preservatie en ter beschikkingstelling van digitale collecties. Het resultaat is een roadmap voor een optimale organisatorische en technische inrichting van de cultureel-erfgoedsector. (budget: 175.000 EUR).

Deelproject 4. 'Cultuur na corona': In het kader van de relance van de culturele sector werd eind 2020 de Taskforce Relance Cultuur opgericht. Deze Taskforce geeft de opdracht aan een werkgroep korte termijn (WGKT) en een werkgroep middellange termijn (WGMLT) om een aantal voorstellen uit te werken. De WGMLT bestaat onder de naam Toekomsttraject 'Cultuur na corona' uit drie deeltrajecten: kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk. De opdracht wordt in drie (overlappende) fasen gegeven aan Cultuurloket, die voor elk deeltraject samenwerkt met het sectorale steunpunt. Het einddoel is de organisatie van een staten-generaal voor cultuur. Een precieze timing opgeven is momenteel moeilijk. Het evenement moet de kick off zijn van een terugkeer naar een coronavrije samenleving. Het toekomstperspectief is belangrijk: hoe is de sector veranderd, hoe gaat die anders werken in de toekomst en hoe moet het beleid daarop afstemmen? (budget: 70.000 EUR).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	<p>1/ Aantal gerealiseerde projecten - december 2023 (deelproject 2)</p> <p>2/ Realisatie van de roadmap - mei 2022 (deelproject 3)</p> <p>3/ Gecoördineerde actie meemoo - december 2023 (deelproject 1)</p> <ul style="list-style-type: none">- Toename van hoogwaardige digitale content van onder andere kranten, glasplaten en een fotografische productie van Vlaamse Topstukken;- Aanbieden van hulp bij identificatie fotomateriaaltypes;- Metadatacreatie (spraakherkenning en gezichtsdetectie). <p>4/ De Staten-Generaal is een fysieke samenkomst van de cultuursector en zal perspectief bieden op een nieuwe start na corona. Cultuurloket stelt samen met de drie sectorale steunpunten hun rapport voor, daarna zullen drie internationale experts hierover terugkoppelen en vergelijken met de aanpak bij hen. Er wordt een publiek van +/- 500 personen verwacht. (deelproject 4)</p>
Outcome	<ul style="list-style-type: none">- Een aanzienlijke toename van bruikbare digitale content in functie van maatschappelijke valorisatie (deelproject 1 en 2)- Een roadmap voor de optimale inrichting (organisatorisch/technisch) van de cultureel-erfgoedsector i.f.v. digitale collectieprocessen (deelproject 3)- Het rapport van de Taskforce Relance Cultuur zal een aantal perspectieven bieden op de situatie van de sector na de pandemie. Aan bod komen ook best practices vanuit de sector om zich aan te passen aan een veranderde cultuurbeleving. (deelproject 4)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus **In uitvoering na agendering VR**

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	<p>- Deelproject 1: Gecoördineerde acties meemoo: de aanbestedingen zijn ondertussen geschreven. Voor projecten omtrent 3D-digitalisering en manuscripten start binnenkort de onderhandelingsfase. De gunning van deze opdracht wordt normaal op 23/6 goedgekeurd door Raad van bestuur. De digitalisering begint wanneer de opdracht gegund is, en de test-/pilotfase is afgerond. Voor de projecten i.v.m. 2D-digitalisering en gigapixel zijn eind mei de eerste fotografie-opdrachten uitgevoerd. Voor de krantendigitalisering gebeurt het eerste transport half juni. Tot slot zijn de glasplatenopdracht en krantenopdracht reeds gegund, maar zitten deze digitaliseringsprojecten nog in de testfase.</p> <p>- Deelproject 2: Versterking reglement inhaalbeweging: geen updates hieromtrent. De projecten zijn momenteel lopende.</p> <p>- Deelproject 3: Businesscase: de ontwikkeling van de roadmap is nog steeds lopende. In februari was er een focusdag, en sinds enkele weken zijn er workshops rond afgebakende thema's. De informatie die hieruit komt, zal dienen voor de opmaak van de roadmap. Oplevering van de roadmap wordt eind september 2022 verwacht.</p> <p>- Deelproject 4: Cultuur na corona: het netwerkmoment 'Cultuur na corona: aanpassen en innoveren' kon het publieke evenement niet doorgaan zoals gepland vanwege de vierde coronagolf. Er is beslist om de middelen die voorzien waren voor het netwerkmoment te verplaatsen naar de projectoproep inhaalbeweging digitalisering. Mogelijk wordt het netwerkmoment nog opgenomen in een vervolgtraject in het najaar met de SARC, maar het is nog niet duidelijk in welke vorm en of hiervoor middelen moeten voorzien worden.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Deelproject 3: Finetunen opdrachtsomschrijving business case duurzame omgang met digitale collecties en ondertekening samenwerkingsovereenkomst Digitaal Vlaanderen en D CJM	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deelproject 2: Lancering oproep reglement	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deelproject 4: Organisatie Staten-Generaal Cultuur waar het rapport van de werkgroep Middellange Termijn van de Tasforce Relance Cultuur voorgesteld wordt. De taskforce levert dit op 30 september op. Het sector- en netwerkmoment 'Cultuur na corona: aanpassen en innoveren' kan niet doorgaan op 20 december en wordt uitgesteld naar het voorjaar.'	2021 Q4	Uitgesteld	Door corona kon het publieke evenement niet doorgaan zoals gepland. Mogelijk wordt dit nog opgenomen in een vervolgtraject in het najaar met de SARC, maar het is nog niet duidelijk in welke vorm en of hiervoor middelen moeten voorzien worden.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Gunning digitaliseringsopdrachten topstukken/kranten/glasplaten	2022 Q2	Op schema	Op 23/6 wordt gunning door Raad van Bestuur goedgekeurd.	
Deelproject 3: Oplevering roadmap (= resultaat van businesscase) voor de technische en organisatorische inrichting van de cultureel-erfgoedsector i.f.v. de omgang met digitale collecties (doorlooptijd sept 21 - september 22)	2022 Q3	Op schema		
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Oplevering foto gedeelte 'kenjdrager'-tool	2023 Q2	Op schema		
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Oplevering spraakherkenning op 163k bestanden	2023 Q3	Op schema		
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Einde digitalisering glasplaten (170.000 platen) Einde digitalisering topstukken Einde van de digitalisering van de kranten (630.000 pagina's) Oplevering entiteit extractie op tekst (163k bestanden) Oplevering gezichtsdetectie op video (120k bestanden)	2023 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Deelproject 3: Roadmap voor de optimale inrichting (organisatorisch/technisch) van de cultureel-erfgoedsector i.f.v. digitale collectieprocessen	strategische roadmap	2022 Q3		50 %
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Hoogwaardige fotografische reproductie van Vlaamse Topstukken: 2D: ca. 175 schilderijen, etsen, gravures e.d. 3D: collectie-Van Herck en 10 andere sculpturen Ca. 40 à 50 manuscripten Gigapixelopnames: 25 topwerken van de Vlaamse schilderkunst Aangeboden via meemoo platformen en site van content partner.	175	2023 Q4	5	3 %
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Metadatacreatie via machine learning: Spraakherkenning op 163.000 bestanden.	163000	2023 Q4		
Deelproject 2: Aantal gerealiseerde projecten	11	2023 Q4	16	145 %
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:-	630000	2023 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Kranten: creatie van hoogwaardige digitale beelden van 630.000 krantenpagina's van ca. 10 erfgoedinstellingen.				
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Metadatacreatie via machine learning: Gezichtsdetectie-en herkenning op 120.000 bestanden.	120000	2023 Q4		
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Glasplaten: digitalisering van 170000 glasplaten van zo'n 40 cultureelerfgoedinstellingen.	170000	2023 Q4		
Deelproject 1 en 2: Aanzienlijke toename van bruikbare digitale content in functie van maatschappelijke valorisatie		2023 Q4		20 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.890.000 EUR
Uitvoering VEK	2.743.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 5.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: dossier 130. Goedkeuring VR 21/05/2021

VV131 - CULTUUR - INTEGRATIETRAJECT ERFGOEDDATABANKEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	- Collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg als kerntaak hebben - Collectiehoudende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben, inclusief private organisaties - brede publiek / onderwijs / onderzoekers / ...

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het Departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.

Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken.

Sinds 2018 vallen de (vroeger provinciale) erfgoeddatabanken onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. De integratie op organisatorisch en technologisch vlak moet nog worden gerealiseerd. Het project om deze erfgoeddatabanken te integreren is een belangrijke projectstap om de digitale transformatie binnen de culturele sector te stimuleren. Daarenboven is het een belangrijke stap om een goed functionerend ecosysteem op te zetten waarin collectiedata uitwisselbaar wordt. De OSLO-uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed zal in de collectieregistratietool geïmplementeerd worden. Het finale doel van dit project is het duurzaam en kostenefficiënt faciliteren van 'collectieregistratie' en '-beheer' en 'hergebruik van data' voor organisaties die collectiezorg als kerntaak hebben maar ook de vele houders van erfgoed die de zorg ervan niet als kerntaak hebben.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.000.000 EUR
Output	Op het einde van dit project is er één laagdrempelig collectieregistratiesysteem ter beschikking van collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben. Er is ook één

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	collectiebeheersysteem voor collectiebeherende organisaties wiens kerntaak erfgoedzorg is. Daaraan gekoppeld is er een kwalitatieve dienstverlening op maat van de diverse gebruikers.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruikers van de bestaande systemen maken ook gebruik van de nieuwe systemen om collectiedata te registreren en collecties te beheren; - het digitale beheer van erfgoedcollecties bij erfgoedhouders die erfgoedzorg als kerntaak hebben wordt verder geprofessionaliseerd; - samenwerking en uitwisseling tussen erfgoedhouders wordt gestimuleerd; - steeds meer open data beschikbaar; - de OSLO-standaard ontwikkeld voor de registratie van erfgoedcollecties wordt algemeen gebruikt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De projectleider ging van start in februari 2022. Heel wat verkennende gesprekken werden gevoerd, de stuurgroep kwam voor een eerste maal samen. De scope van het project werd opnieuw scherpgesteld. Communicatie-instrumenten werden uitgewerkt en gelanceerd. Voor de functionele analyse van de twee systemen werden analisten aangesteld. Workshops worden georganiseerd om huidige en toekomstige gebruikers actief te betrekken bij het project.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring projectplan VR	2021 Q2	Gerealiseerd	
Officiële start project na aanwerving projectleider	2021 Q3	Gerealiseerd	
Collecties 'collectiehouders die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben' zijn gemigreerd van EIZ naar Erfgoedplus (voorbereidende stap)	2022 Q1	Vertraging	Omwille van de complexiteit van de opdracht en het belang van een correcte datamigratie verloopt dit deelproject iets trager als eerst gepland. Momenteel zit migratie wel op kruissnelheid.
Technische en functionele analyse collectiebeheersysteem en collectieregistratiesysteem	2022 Q2	Op schema	
Start aanbesteding collectieregistratiesysteem	2022 Q3	Nog niet gestart	
Start aanbesteding collectiebeheersysteem	2022 Q4	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start ontwikkeling collectieregistratiesysteem	2023 Q1	Nog niet gestart	
Start configuratie en aanpassingen collectiebeheersysteem	2023 Q2	Nog niet gestart	
Start testfase en migratie pilootklanten collectiebeheersysteem	2023 Q3	Nog niet gestart	
Uitvoeren test en migratieproefsets collectieregistratiesysteem	2023 Q3	Nog niet gestart	
Start uitrol en migratie collectieregistratiesysteem	2023 Q4	Nog niet gestart	
Start migratie en configuratie per klant collectiebeheersysteem	2024 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Er is een performant collectieregistratiesysteem voor collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben	1	2023 Q2		
Er is een performant collectiebeheerssysteem voor collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg wel als kerntaak hebben	1	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.000.000 EUR
Uitvoering VEK	857.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV132 - DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - INVESTERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur - Agentschap Innoveren en Ondernemen - Sport Vlaanderen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	Lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering wenst een digitaal Verenigingsloket op te zetten naar analogie met Mijn Burgerprofiel en het e-Loket voor Ondernemers. Dit unieke loket moet verenigingen (vzw's en feitelijke verenigingen) beter ondersteunen bij hun interacties met overheden en andere dienstverleners op alle niveaus, via een betere digitalisering van (overheids)diensten allerhande. Met dit loket wil de Vlaamse overheid zowel de administratieve last voor verenigingen en dienstverlenende instanties verlagen als het beschikbare dienstverleningsaanbod beter zichtbaar maken.

De relancemiddelen worden gebruikt als extra investering voor het programma dat ook ook over reguliere middelen beschikt: 4.050.000 EUR.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.850.000 EUR
Output	We koppelen dienstverleningsproducten aan het V-loket. We sluiten dienstverlenende (overheids)instanties op alle niveaus aan die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren. We identificeren verenigingen die via het V-loket met de overheid interageren.
Outcome	Door het V-loket wordt het dienstverleningsaanbod van overheden (en andere dienstverleners) aan verenigingen vaker digitaal georganiseerd, en bovendien op een efficiëntere wijze: de administratieve last bij aanvraag en afhandeling neemt af, zowel aan de kant van de verenigingen als van dienstverlenende (overheids)instanties. Daarnaast creëert het V-loket een overkoepelend overzicht van het beschikbare dienstverleningsaanbod, zodat verenigingen sneller en vaker toegeleid worden naar ondersteunende of omkaderende maatregelen die op hen van toepassing zijn.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
---------------	--------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	De voorbije maanden werd aan de verschillende deelprojecten binnen het Verenigingsloketprogramma verder gewerkt in samenwerking met alle strategische partners die vertegenwoordigd zijn in de daartoe ingerichte governance-organen. Op basis van een evolutief ontwikkelende businesscase focussen we nu op het vastklikken van de engagementen van alle partners en leggen een plan van aanpak vast voor de ontwikkeling van het Minimal Viable Product, een eerste prototype van het Verenigingsloket dat dient om de levensvatbaarheid te testen en zo nodig bij te sturen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lanceren interactief ideeën-management en burgerparticipatie platform ('community platform')	2021 Q4	Gerealiseerd	Het participatieplatform is een van de gebruikte methodes om onze doelgroepen te bevragen: knelpunten detecteren, ideeën lanceren en capteren, gebruikerstesten doen, prototypes testen, etc.
Lanceren bètaversie verenigingsloket: architectuurtestversie en eerste informatief overzicht	2022 Q1	Gerealiseerd	Basis-testversie om interne testen en gebruikersbevragingen te doen
Doorlopen OSLO-traject om een datastandaard te bepalen om feitelijke verenigingen uniek te identificeren	2022 Q2	Gerealiseerd	Doorlopen OSLO-traject om een datastandaard te bepalen om feitelijke verenigingen uniek te identificeren, met het oog op het ontwikkelen van een gegevensbron voor (feitelijke) verenigingen (onderdeel van Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 - trekker: Digitaal Vlaanderen)
Selecteren van eerste pilootprojecten	2022 Q4	Op schema	Selecteren van eerste pilootprojecten: zoeken naar en samenwerking opzetten met kandidaat-dienstverlenende instanties die willen meewerken aan Minimal Viable Product (MVP) en Minimal Marketable Product (MMP)
Ontwikkelen van een databron voor (feitelijke) verenigingen	2023 Q1	Op schema	We ontwikkelen een databron voor (feitelijke) verenigingen als belangrijke basisbouwsteen van het Verenigingsloket (onderdeel van Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 - trekker: Digitaal Vlaanderen)
Lanceren Minimal Viable Product (MVP) van het Verenigingsloket	2023 Q1	Op schema	Prototype van het Verenigingsloket om levensvatbaarheid te testen en zo nodig bij te sturen
Lanceren Minimal Marketable Product (MMP) van het Verenigingsloket	2023 Q4	Nog niet gestart	Lanceren van het eerste minimale, ook op de achtergrond werkende, product dat we publiek maken: lancering v1.0.
Uitbreiden groep dienstverlenende instanties	2024 Q2	Nog niet gestart	Uitbreiden groep dienstverlenende instanties: samenwerking opzetten met een bredere groep

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			dienstverlenende instanties die hun diensten willen aanbieden via het Verenigingsloket

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
<p>"We identificeren verenigingen die via het Verenigingsloket met de overheid interageren."--> Het project focust zowel op vzw's als op feitelijke verenigingen. Op dit moment is het niet mogelijk om feitelijke verenigingen uniek te identificeren (een VRD2-project waarin we vanuit het Verenigingsloket meewerken heeft precies tot doel dit mogelijk te maken). Dit heeft tot gevolg dat er momenteel nog geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn over het totale aantal verenigingen dat dienstverlening afneemt van overheden in Vlaanderen. Dit gegeven maakt het onmogelijk om voor deze indicator een realistische target te definiëren. Dit zal bovendien pas mogelijk zijn als een andere indicator (het aantal (overheids)instanties die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren) concreet is vastgelegd, want beide zijn verbonden met elkaar: pas als er een inschatting gemaakt kan worden van welke overheidsinstanties welke onderdelen van hun dienstverlening via het Verenigingsloket willen gaan aanbieden, is het mogelijk om af te leiden hoeveel verenigingen redelijkerwijs aangesloten zullen kunnen worden op het Verenigingsloket.</p>	(zie toelichting)	2024 Q4		
<p>"We koppelen dienstverleningsproducten aan het V-loket." --> Hieraan is nog geen concrete indicatorwaarde toegewezen, omdat in deze fase van het project nog geen duidelijkheid is verkregen over het precieze aantal dienstverleningsproducten die verenigingen als doelgroep hebben. Hierdoor is het op dit ogenblik nog niet mogelijk een concrete target te definiëren. Het in kaart brengen van dienstverlening gericht op verenigingen is onderdeel van het Verenigingsloketprogramma.</p>	(zie toelichting)	2024 Q4		
<p>"We sluiten (overheids)instanties op alle niveaus aan die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren."--> De dienstverleningsproducten die diverse</p>	(zie toelichting)	2024 Q4		

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
overheden (en andere dienstverleners) aanbieden aan verenigingen zijn nog niet in kaart gebracht (zie andere indicator). Daarnaast moeten met de diverse stakeholders nog diepgaander de opportuniteiten en risico's van aansluiting op het V-loket verkend worden. Beide zaken samen maken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om realistische targets in te stellen.				

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.850.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.850.000 EUR
Uitvoering VAK	1.287.000 EUR
Uitvoering VEK	834.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 2.850.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12/3/2021 - nota](#)

[VR 12/3/2021 - bijlage](#)

VV133 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VLAAMSE MEDIASECTOR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De brede Vlaamse mediasector

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. De focus ligt hierbij op samenwerking tussen mediaorganisaties en extra waardecreatie binnen een globale competitieve context, zowel voor de mediaconsument, als voor de Vlaamse mediaspelers. Het programma zal investeren in gedeelde digitale media-infrastructuur en innovatieve diensten en oplossingen rond verschillende thema's (betrouwbare informatie en data / dieper inzicht in het gedrag van de mediaconsument / meer efficiënte en kwaliteitsvolle productie, opslag en distributie van mediacontent / betere vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent).

Het digitaal transformatieprogramma zal uitgevoerd worden via 5 projectwerven:

1) Crossmediaal meetsysteem: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van een geavanceerd en sectorbreed crossmediaal meetsysteem dat een totaalbeeld zal geven van het mediagebruik in Vlaanderen. De scope omvat alle mediacontent die in Vlaanderen bekeken (totaal video), beluisterd (totaal audio) en gelezen (totaal lezen) wordt. De ambitie van dit project is een brug te slaan tussen traditioneel gebruikersonderzoek en de analytics aanpak voor digitale media door een hybride onderzoeksarchitectuur. Daarbij worden socio-demografisch geprofileerde data uit een nieuw representatief panel en grote hoeveelheden gebruikersdata van participerende Vlaamse mediaspelers slim aan elkaar gekoppeld. Dit moet leiden tot nieuwe en rijkere inzichten in cross-platform user life experience, in content keuzes van mediagebruikers en de context en behoeftes die deze keuzes bepalen.

2) Mediahub cloudplatform: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van een gedeeld netwerk en cloudplatform voor de Vlaamse mediasector dat de deelnemende mediamakers in staat moet stellen om veilige verbindingen te leggen tussen verschillende medialocaties. De Mediahub zal toelaten om op hoge snelheid mediastreams en -bestanden te versturen, te ontvangen, op te slaan en te bewerken. Daarnaast zal Mediahub ook een diversiteit van diensten, zoals live-connectiviteit en datatransfer, aanbieden die via een gemeenschappelijk platform kunnen ingekocht worden. Dit moet leiden tot meer efficiëntie voor professionele mediamakers doordat de productiemiddelen gedeeld kunnen worden en makkelijker te schalen zijn.

3) Projectoproep desinformatie: via een open oproep door het Departement CJM wordt financiële steun toegekend aan samenwerkingsprojecten die inzetten op verschillende facetten van de strijd tegen desinformatie. In dit kader worden onderbouwde initiatieven ondersteund van nieuwsmediaspelers (samen met het mediawijsheidsveld en onderzoeksgroepen rond media) in hun opdracht en verantwoordelijkheid

PROJECTOMSCHRIJVING

voor de juistheid van informatie die zij verspreiden. Hierbij zal de focus liggen op vier thema's en aspecten: mediawijsheid van burgers en redacties / nieuwe (academische) inzichten inzake desinformatie / innovatieve tools en technologieën om desinformatie te detecteren en weerleggen / factchecking initiatieven.

4) Digitaal transformatieplan regionale omroepen: financiële steun voor de uitvoering van een digitaal transformatieplan op maat van de regionale omroepen dat inzet op noodzakelijke investeringen en gemeenschappelijke projecten die een meerderheid van de betrokken spelers kunnen implementeren. De focus ligt hierbij op toekomstgerichte projecten en investeringen binnen vijf inhoudelijke werven: 1) data, 2) connectiviteit, 3) distributie, 4) multiplatform redactie- en publicatiesysteem en 5) business modellen van de toekomst.

5) Projectoproep digitale transformatie mediasector: via een open projectoproep door het Departement CJM wordt financiële steun toegekend aan zowel grootschalige als kleinschalige samenwerkingsprojecten inzake media-innovatie en digitale transformatie. Hierbij zal de focus liggen op ontwikkelingsprojecten met een kort implementatietraject (2-3 jaar) die inzetten op een van volgende kernthema's: 1) het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse content, 2) slimme technologieën en digitale tools die de efficiëntie en kwaliteit van mediaproductie, opslag en distributie verhogen en 3) mediaplatformen en tools van de toekomst (kijken, luisteren, lezen).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	27.000.000 EUR
Output	<p>Dit programma heeft als doel digitale transformatie en media-innovatie in de Vlaamse mediasector te stimuleren en accelereren. Het programma omvat meerdere projecten met verschillende outcomes.</p> <p>Ten eerste zal een crossmediaal meetsysteem ontwikkeld en uitgerold worden door het Crossmediaal Consortium, bestaande uit sectorspelers. Dit systeem moet een totaalbeeld kunnen geven van het mediagebruik in Vlaanderen, van alles wat bekeken (totaal video), beluisterd (totaal audio) en gelezen (totaal lezen) wordt. Uit dit systeem zullen verklarende en voorspellende modellen en algoritmes voortkomen die Vlaamse mediaspelers kunnen gebruiken om bv. de media-ervaring van de Vlaamse consument te verbeteren en nieuwe verdienmodellen te versterken.</p> <p>Ten tweede wordt een Mediahub cloudplatform ontwikkeld. Dit gedeeld netwerk en cloudplatform zal zowel connectiviteit in een beveiligde omgeving bieden als een diversiteit aan diensten die via een gemeenschappelijk platform, een Marktplaats, kunnen ingekocht worden door mediamakers.</p> <p>Ten derde wordt er ingezet op de strijd tegen desinformatie. Hiervoor wordt een projectoproep gelanceerd voor samenwerkingsprojecten die hierrond werken. De uiteindelijke projecten zetten in op het verhogen van de mediawijsheid en weerbaarheid van burgers of journalisten/redacties tegen desinformatie, het verwerven van nieuwe inzichten inzake desinformatie, de ontwikkeling van innovatieve tools en technologieën die ingezet kunnen worden om desinformatie te detecteren of te weerleggen en de ontwikkeling van specifieke methoden om data te analyseren en een accuraat antwoord te bieden op vastgestelde desinformatie vanuit een autonome redactionele missie.</p> <p>Ten vierde worden ook de regionale omroepen gestimuleerd om de digitale omslag te maken aan de hand van een transformatieplan. Hierbinnen wordt op volgende lijnen ingezet: 1) het ontwikkelen van een 'real time' data-analyse dashboard, 2a) ontwikkelen en implementeren van een digitaal platform voor de 10 regionale zenders voor</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>de aanlevering van content door burgers, 2b) investeren in nieuwe hardware en software om de connectiviteit tussen regio, journalisten, redactie en zender te verhogen, 3) ontwikkelen van een dynamisch 'roadbook' als basis voor een nieuwe digitale architectuur en distributie van de content van de regionale omroepen, 4) inzetten op een zo uniform mogelijk redactiesysteem voor alle regionale zenders dat gebaseerd is op een meer 'story centric flow' en 5) studiewerk inzake de verdienmodellen van de toekomst voor regionale zenders.</p> <p>Ten vijfde wordt digitale transformatie en media-innovatie binnen de sector gestimuleerd. Hiervoor wordt een projectoproep gelanceerd voor grootschalige en kleinschalige samenwerkingsprojecten binnen de brede mediasector. De uiteindelijke ontwikkelingsprojecten voorzien in het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent (via optimaliseringsprocessen, aanbevelingsstrategieën, algoritmes en tools), de ontwikkeling van slimme technologie en digitale tools om de efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen en de ontwikkeling van mediaplatformen en tools van de toekomst inzake kijken, luisteren en lezen.</p>
Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1. Een rijk en diepgaand totaalbeeld van het on- en offline mediagedrag van de Vlaming over de verschillende platformen heen. 2. Vlaamse mediaorganisaties zijn met elkaar geconnecteerd via een cloudplatform (Mediahub) dat een gedeelde basis vormt voor een gebruiksvriendelijk digitaal ecosysteem voor professionele mediatools en diensten. 3. De Vlaamse mediasector en burgers zijn weerbaarder tegen desinformatie. 4. De regionale omroepen maken de digitale omslag en vullen hun kernopdracht efficiënter en kwaliteitsvoller in. 5. De technologische weerbaarheid en economische leefbaarheid van de Vlaamse sector wordt versterkt via digitale innovatie en transformatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> - Het digitaal transformatieplan voor de regionale omroepen werd op 12/11/2021 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het project is vervolgens van start gegaan en in april 2022 werd een eerste keer gerapporteerd door NORTV over de voortgang van het transformatieplan. De focus lag de voorbije maanden in de eerste plaats op het uitwerken en opstarten van het luik data en het luik connectiviteit. - Het reglement van de projectoproep desinformatie werd op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De projectoproep desinformatie werd op 21/3/2022 gelanceerd en de deadline voor indiening van projecten was op 2/5/2022. In totaal werden er 7 ontvankelijke projecten weerhouden die door een jury zullen beoordeeld worden en waarover vervolgens tegen 12/7/2022 een advies zal worden uitgebracht aan de minister van Media. - Het reglement van de projectoproep digitale transformatie werd op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De projectoproep werd vervolgens inzake staatssteun aangemeld bij de Europese Commissie en kreeg eind mei 2022 formele goedkeuring van de Commissie. Na een tweede goedkeuring van het reglement door de Vlaamse Regering

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>op 3 juni (vanwege enkele kleine materiële aanpassingen als gevolg van de staatssteunprocedure bij de Europese Commissie) zal de projectoproep op 7 juni 2022 gelanceerd worden.</p> <p>- Eind maart 2022 werd het finale projectplan opgeleverd over de gezamenlijke ontwikkeling en uitrol van een crossmediaal meetsysteem. De afspraken hieromtrent werden eind maart 2022 ook vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). Op 22/4/2022 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het project. Vervolgens werd het project inzake staatssteun aangemeld bij de Europese Commissie. Na afronding van de procedure bij de Commissie zal de Vlaamse Regering in het najaar 2022 het project finaal goedkeuren en de middelen (4 miljoen euro) toekennen aan het nog op te richten consortium. De start van het project is voorzien in Q1 2023.</p> <p>- Eind mei 2022 werd het finale projectplan opgeleverd over de gezamenlijke ontwikkeling en uitrol van het Mediahub cloudplatform. De afspraken hieromtrent werden eind mei 2022 ook vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). Het project zal voor het zomerreces 2022 worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering en na goedkeuring worden aangemeld inzake staatssteun bij de Europese Commissie. Na afronding van de procedure bij de Commissie zal de Vlaamse Regering in het najaar 2022 het project finaal goedkeuren en de middelen (4 miljoen euro) toekennen aan het nog op te richten consortium. De start van het project is voorzien in Q1 2023.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start uitvoering digitaal transformatieplan regionale omroepen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering projectoproep desinformatie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Lancering projectoproep digitale transformatie mediasector (kleinschalige en grote projecten)	2022 Q2	Op schema	
Selectie projecten desinformatie	2022 Q3	Op schema	
Selectie projecten digitale transformatie mediasector (kleinschalige en grote projecten)	2022 Q4	Nog niet gestart	
Ontwikkeling crossmediaal meetsysteem	2023 Q1	Op schema	
Ontwikkeling Mediahub cloudplatform	2023 Q1	Op schema	
Afronding digitaal transformatieplan regionale omroepen	2023 Q3	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Oplevering Mediahub cloudplatform	2023 Q4	Nog niet gestart	
Panel crossmediaal meetsysteem in productie	2024 Q1	Nog niet gestart	
Afronding projecten desinformatie	2024 Q2	Nog niet gestart	
Afronding projecten (kleinschalige + grote) in kader van de projectoproepen digitale transformatie	2024 Q4	Nog niet gestart	
Afronding project Mediahub cloudplatform	2026 Q4	Nog niet gestart	
Afronding project crossmediaal meetsysteem	2026 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal projecten die gesteund worden in het kader van de projectoproep desinformatie.	5	2022 Q3		
Aantal projecten die gesteund worden in het kader van de projectoproep digitale transformatie.	15	2022 Q4		
Aantal regionale omroepen die betrokken zijn bij de uitvoering van het digitaal transformatieplan.	10	2023 Q3	10	100 %
Aantal Vlaamse mediaorganisaties die gebruik maken van het crossmediaal meetsysteem.	10	2026 Q4		
Aantal Vlaamse mediaorganisaties en andere relevante mediagerelateerde actoren die gebruik maken van het Mediahub cloudplatform.	10	2026 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	27.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.228.000 EUR
Uitvoering VEK	1.368.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 27.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media - nota](#)

[Beslissing VR van 12/11/2021. NORTV subsidie uitvoering digitaal transformatieplan regionale tv-omroepen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Projectsubsidie digitale transformatie. Reglement](#)

[Projectsubsidie desinformatie. Reglement](#)

[Advies SARC bij de reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in het kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3 juni 2022. Reglement projectoproep digitale transformatie in kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Projectsubsidie digitale transformatie. Reglement. Bijlage](#)

VV134 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. De focus ligt hierbij op samenwerking tussen mediaorganisaties en extra waardecreatie binnen een globale competitieve context, zowel voor de mediaconsument, als voor de Vlaamse mediaspelers. Het programma zal investeren in gedeelde digitale media-infrastructuur en innovatieve (digitale) diensten en oplossingen rond verschillende thema's (betrouwbare informatie en data / dieper inzicht in het gedrag van de mediaconsument / meer efficiënte en kwaliteitsvolle productie, opslag en distributie van mediacontent / betere vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent, ...).

Het digitaal transformatieprogramma zal uitgevoerd worden via 6 projectwerven waarvan F. 'Instrumentarium / projectoproep media-innovatie' onder de coördinatie van minister Crevits valt. Voor deze werf, waarvoor 8 miljoen EUR relancemiddelen beschikbaar zijn, zal onder beheer van VLAIO een mix van acties uitgerold worden:

- Oproep voor media-ICON projecten
- Oproep voor media-TETRA projecten en/of media-proeftuinen
- Ondersteuning van media-acceleratoren

De acties zijn hierbij gericht naar

- (i) de grote en kleine mediabedrijven (VRT, DPG Media, Roularta, Mediahuis, Regionale omroepen...);
- (ii) toeleveranciers op het vlak van technologie aan de mediasector;
- (iii) contentleveranciers/productiehuizen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	8.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - ondersteuning van minstens 3 media-ICON projecten - ondersteuning van minstens 3 of 5 media TETRA projecten en/of maximum 2 proeftuinen voor de media - ondersteuning van minstens 2 media-acceleratoren

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome	De technologische weerbaarheid en economische leefbaarheid van de Vlaamse mediasector (en de toeleveringsbedrijven) wordt versterkt via digitale innovatie en transformatie.
---------	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> - ICON/MEDIA : de oproep staat open. De Volledige projectaanvragen dienen ingediend worden tegen eind juni - TETRA/MEDIA: de oproep is in evaluatie; de beslissing wordt genomen op 16 juni - INCUBATOREN: de gesprekken met zowel de gamehub als de incubator voor de media lopen. De beslissing wordt verwacht in Q3 of Q4 -PROEFTUINEN: de gesprekken lopen 4 consortia. De beslissing wordt verwacht in Q4.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart ICON voor de media	2021 Q4	Op schema	
Opstart media-accelerator(en)	2022 Q1	Op schema	
Opstart TETRA en/of proeftuin voor de media	2022 Q2	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	8.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	8.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 8.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Projectsubsidie digitale transformatie. Reglement](#)

[Projectsubsidie desinformatie](#)

[Advies SARC bij de reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in het kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

VV135 - INVESTEREN IN MEDIAWIJSHEID VAN DE VLAMING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, jongeren in het secundair onderwijs en organisaties die zich richten op kwetsbare doelgroepen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Via twee projecten wordt er bijkomend geïnvesteerd in het versterken van mediawijsheid bij de burger. De ontwikkeling en coördinatie van beide projecten gebeurt door Mediawijs - het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid.</p>	
<p>1. Er wordt een flankerend traject bij het bestaande project Nieuws in de Klas opgezet waarbij ingezet wordt op meer interactie om kinderen en jongeren nog nieuwsvaardiger te maken. Het doel van Nieuws in de Klas is om van kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel nieuws- en informatiewijze burgers te maken. Het flankerende traject voegt een extra dimensie van interactiviteit toe. Er zal specifiek gewerkt worden op drie elementen: 1) een 'Nieuwsmakers' wedstrijd gericht op de 1ste graad van het secundair onderwijs, 2) een initiatief rond factchecking gericht op de 2de graad van het secundair onderwijs en 3) een debatmarathon gericht op de 3de graad van het secundair onderwijs.</p>	
<p>2. De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren en organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren begeleiden in Vlaanderen wordt versneld. Mediawijs zal ondersteuning bieden bij het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen deze sectoren en organisaties. Mediawijs zal goede praktijkvoorbeelden en informatieve of educatieve materialen inzake digitale inclusie en mediawijsheid op maat van deze sectoren verzamelen en opschalen.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.000.000 EUR
Output	De output van dit project is tweeledig. Ten eerste worden klassen uit het secundair onderwijs uitgenodigd om deel te nemen aan het flankerend traject bij Nieuws in de Klas. Ten tweede worden organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren geïnformeerd via vormingen over het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.
Outcome	<p>1. Jongeren uit het secundair onderwijs worden nieuwsvaardiger en gaan op een meer bewuste en kritische manier met digitale media, nieuws en informatie om.</p> <p>2. De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren en</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in Vlaanderen wordt versneld.
--	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Beide projecten (flankerend traject Nieuws in de Klas + bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan) zijn van start gegaan op 1 mei 2021. De middelen vanuit relance werden via twee MB's toegekend aan Mediawijs. In een eerste fase werden in beide projecten voor elke doelgroep partners betrokken om (co)creatief materialen te ontwerpen. Momenteel lopen iteratieve ontwikkelingstrajecten met de partners en feedback van de doelgroep, die moeten toelaten om in september/oktober 2022 de eerste resultaten breed uit te rollen naar de betrokken sectoren.</p> <p>Voor het flankerend traject Nieuws in de Klas kwam Mediawijs via een aanbestedingsprocedure tot een partnerschap met StampMedia, Hujo en Mediaraven. Ook Quindo en De Checkers worden bij het project betrokken. Het basisconcept en de wijze van samenwerken werden in grote lijnen vastgelegd. Met de partners werd het educatief materiaal voor de drie graden in secundair onderwijs iteratief uitgewerkt en sinds de paasvakantie telkens voorgelegd aan verschillende leerkrachten. Dit loopt nog tot midden juni 2022 (eerste en derde graad). Tegen de zomervakantie 2022 zal het lesmateriaal gelay-out zijn.</p> <p>Binnen het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan werd inzake kaders en richtlijnen in de drie sectoren co-creatief gewerkt aan een prototype Beleidstool Digitale Inclusie voor welzijn. Voor mensen met een beperking en senioren werd dat reeds voor de eerste keer getest, voor jeugdhulp is het pas gestart. Wat materialen betreft werd voor de mensen met een beperking geëxperimenteerd met Symbaloo om online materialen te delen met de bedoeling dit ook voor de andere sectoren te doen. Er werd een co-creatietraject gestart rond sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) en online risico's i.s.m. UCLL en 'tRede vzw. Rond vorming en intervisie vond op 31/5/2022 een tweede webinar/intervisie plaats in de jeugdhulp (geflankeerd aan het project Bandbreedte van Agentschap Opgroeien). Voor de twee andere sectoren zijn de tweede webinars gepland in september 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De ontwikkeling van het basisconcept voor het flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt afgerond en de nodige partnerschappen worden aangegaan.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Tijdens een pilootfase wordt het basisconcept van het flankerend traject rond Nieuws in de Klas uitgetest en geëvalueerd.	2022 Q2	Op schema	
Het finaal uitgewerkte flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt uitgerold in het schooljaar 2022-2023.	2022 Q3	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sectoren en organisaties gericht op kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren werden in de periode 05/2021 - 06/2023 door Mediawijs begeleid en ondersteund bij het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen hun sector.	2023 Q2	Op schema	
Het finaal uitgewerkte flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt uitgerold in het schooljaar 2023-2024.	2023 Q3	Op schema	
Het flankerend traject bij Nieuws in de Klas wordt afgerond op het einde van het schooljaar 2023-2024.	2024 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uren vorming georganiseerd in het kader van het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.	100	2023 Q2	28	28 %
Aantal deelnemersuren van personen uit organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in het kader van het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.	1750	2023 Q2	1.380	79 %
Aantal klassen uit het secundair onderwijs die hebben deelgenomen aan het flankerend traject bij Nieuws in de Klas.	1500	2024 Q2		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.000.000 EUR
Uitvoering VEK	587.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

29. Versterken mentaal welzijn

VV136 - VERNIEUWENDE PROJECTEN HUIZEN VAN HET KIND

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Gezinnen met kinderen in Vlaanderen en Brussel. Bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Opgroeien lanceert een oproep voor vierentwintig Huizen van het Kind die binnen hun werkingsgebied innovatief willen zijn en samen met hun partners werk willen maken van een (meer) geïntegreerde dienstverlening naar gezinnen, over beleidsdomeinen heen.</p> <p>Wat wordt bedoeld met vernieuwende projecten? In de Huizen van het Kind kunnen gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders terecht voor ondersteuning op het vlak van preventieve gezondheidszorg, spel en ontmoeting en gezinsondersteuning. Hiernaast hebben sommige gezinnen echter vaak ook behoefte aan ondersteuning op het vlak van opvang, onderwijs, werk, opleiding, integratie, inburgering en armoede ... In realiteit zijn heel wat van deze behoeften met elkaar verstrengeld. Een meer geïntegreerde dienstverlening over de beleidsdomeinen heen zou voor gezinnen écht het verschil kunnen maken.</p> <p>De Vlaamse Regering wil dat Huizen van het Kind, samen met partners uit de verschillende beleidsdomeinen, meer inzetten op geïntegreerde dienstverlening en doet vanuit dat perspectief een oproep voor vernieuwende projecten. De vernieuwende projecten spitsen zich toe op het verwezenlijken van doelstellingen en opdrachten die enkel kunnen worden gerealiseerd via een (meer) geïntegreerde dienstverlening. Het gaat steeds om de doelstellingen op vlak van preventieve gezinsondersteuning in combinatie met minstens één van de volgende doelstellingen: integratie en inburgering; opvang en onderwijs; tewerkstelling en opleiding; armoedebestrijding.</p> <p>De inzet op een combinatie van doelstellingen is ook interessant voor (lokale) partners binnen deze andere beleidsdomeinen. Ze kunnen mee investeren in de dienstverlening om op die manier hun eigen doelstellingen te realiseren. De Huizen van het Kind vormen samen met deze partners een lokaal netwerk.</p> <p>In essentie gaat het over 'de handen in elkaar slaan over beleidsdomeinen heen binnen de context van het lokale Huis van het Kind, om op die manier geïntegreerd werk te maken van de ondersteuning van een gezin'. Zo worden voor het gezin kansen gecreëerd binnen verschillende beleidsdoelstellingen, op het vlak</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

van ondersteuningsbehoeften die voor het gezin in realiteit ook met elkaar verweven zijn. Hierbij maakt het voor een gezin niet uit of het nu door onderwijs, inburgering of welzijn ondersteund wordt: enkel door samen te werken binnen verschillende doelstellingen die met elkaar samenhangen, kan het recht op kansrijk opgroeien uiteindelijk worden gerealiseerd.

Waar het bij geïntegreerde dienstverlening om gaat is dat er, op maat en vertrekkende vanuit het gezin, samengewerkt wordt tussen spelers van verschillende beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein (welzijn, onderwijs, integratie en inburgering, werk, armoedebestrijding) kent zijn eigen doelstellingen, zijn eigen lokale partners en eigen dienstverlening, maar voor een gezin met een ondersteuningsbehoefte maakt het niet uit door welke overheid of subsidiekanaal het uiteindelijk wordt geholpen. Bovendien zien we dat ondersteuningsbehoeften met elkaar samenhangen, en dan kan het echt versterkend werken om ook op lokaal niveau, over beleidsdomeinen heen, de handen in elkaar te slaan. Hierdoor wordt binnen de context van de Huizen van het Kind samen gebouwd aan het kansrijk opgroeien van elk kind. De Huizen van het Kind zijn belangrijk in dit verhaal. Vlaanderen ziet hen als sleutelspeler in het lokaal geïntegreerd gezinsbeleid en wil de Huizen van het Kind deze legislatuur daarom versterken. Deze subsidie aan 24 Huizen van het Kind is een volgende stap in de versterking van de Huizen van het Kind, die vandaag al zeer lokaal een belangrijke meerwaarde vormen als ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en gezinnen, en als plek waar élk gezin terecht kan voor ondersteuning.

Voor de projecten die inzetten op de doelstelling integratie en inburgering is er cofinanciering voorzien vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	Realiseren van een geïntegreerde dienstverlening in het kader van het vernieuwend project (gezinsondersteuning in combinatie met werk en opleiding, integratie en inburgering, onderwijs en opvang, armoedebestrijding) binnen het Huis van het Kind, in samenwerking met de partners binnen deze andere beleidsdomeinen.
Outcome	Binnen elk geselecteerd project: een netwerk van partners opzetten (Huis van het Kind én partners binnen andere beleidsdomeinen) om op die manier een vernieuwende, geïntegreerde dienstverlening voor gezinnen te organiseren binnen het Huis van het Kind.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle vernieuwende projecten zijn ondertussen opgestart en volgen een ondersteuningstraject (EXPOO/Opgroeien en Arteveldehogeschool).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering oproep vernieuwende projecten	2021 Q1	Gerealiseerd	
Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	
Start beoordelingsfase projectaanvragen Huizen van het Kind	2021 Q2	Gerealiseerd	
Kick-Off ondersteuningstraject	2021 Q2	Gerealiseerd	
Alle vernieuwende projecten zijn opgestart	2022 Q1	Op schema	
Verdere uitbouw gezamenlijk ondersteuningstraject en lerend netwerk o.l.v. EXPOO/Opgroeien	2022 Q1		
Verderzetting individueel ondersteuningstraject (impactgericht werken en veranderingstheorie) o.l.v. Arteveldehogeschool	2022 Q1	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
kwantitatieve vernieuwende project opgestart binnen Huis van het Kind	24	2022 Q1	24	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.209.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 5 maart 2021 - BVR](#)

[VR 5 maart 2021 - nota](#)

[VR 5 maart 2021 - advies](#)

VV137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Zorg en Gezondheid - zorgvoorzieningen (psychosociale revalidatievoorzieningen en revalidatievoorzieningen verslavingszorg), netwerken geestelijke gezondheid volwassenen, Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid (nu Psyche), Familieplatform Geestelijke Gezondheid

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
Enmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen: extra ondersteunen van de werking van lotgenotengroepen, versterkte inzet van herstelacademies, tijdelijke versterking van de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen, enz.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.500.000 EUR
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contextgericht werken en verslaving, o.a. door het opzetten van een familiebuddywerking en opleiden van contextexperten 2. Herstelacademie en verslaving: de huidige Herstelacademies worden gecontinueerd en versterkt en er gaat bijzondere aandacht naar het thema verslaving in het opleidingsaanbod. 3. Kwartiermaken: de methodiek van kwartiermaken wordt uitgerold in 5 nieuwe regio's in Vlaanderen 4. Tijdelijke versterking van de verslavingszorgcentra en de psychosociale revalidatiecentra
Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1. BVR tot toekenning van een subsidie aan de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen voor het aanbieden van laagdrempelige zorg met focus op expertisedeling en overbruggingszorg: <ol style="list-style-type: none"> a. Zorgpartners met expertise in herstelgerichte zorg op regionaal niveau samenbrengen en deze expertise uitspreiden zodat het aanbod voor de zorggebruiker en diens context nog toegankelijker wordt; b. Ondersteuning bieden tijdens wachttijd aan zorggebruikers en hun context zodat zij nog beter georiënteerd worden (vermijden dat personen op verschillende wachtlijsten terecht komen) en op een snelle en efficiënte manier beroep kunnen doen op een laagdrempelig aanbod in afwachting van een effectieve opstart. Dit in maximale samenwerking en afstemming met verschillende partners in herstelgerichte zorg; c. Focussen op laagdrempelige en aanklappende zorgvormen (o.m. outreach) zodat tegemoet kan worden gekomen aan de noden van kwetsbare zorggebruikers. De voorzieningen in het

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>netwerk geestelijke gezondheid delen de expertise rond aanklampende zorg;</p> <p>d. Verbinding naar maatschappij bewaken in trajecten met zorggebruikers (participatie);</p> <p>e. Kennisdeling en betrokkenheid partners bevorderen.</p> <p>2.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Familieplatform Geestelijke Gezondheid voor het project 'contextgericht werken en verslaving'</p> <p>a. informatie voor familie i.v.m. alcoholverslaving en suïcidepreventie toegankelijker maken</p> <p>b. het ondersteunen van de familiebuddywerking- mentaalmaatje</p> <p>c. het ondersteunen van contextexperten als ondersteuning naar de zorg door specifiek opgeleide ervaringswerkers in te zetten als lokale experts in het betrekken en ondersteunen van de context in de geestelijke gezondheidsnetwerken voor volwassenen.</p> <p>3.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw voor het project kwartiermaken voor de periode 2022-2023</p> <p>a. door psycho educatie en preventie het lokaal versterken van de geestelijke gezondheid van elke burger;</p> <p>b. identificeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid, inclusief mensen die kampen met verslavingsproblematiek of suïcidedgedachten, om deze toe te leiden naar zorg;</p> <p>c. het begeleiden van wijken voor het opvangen van mensen uit de geestelijke gezondheidszorg;</p> <p>d. het begeleiden van wijken en lokale besturen in geestelijke gezondheidsaspecten en de brug leggen tussen actoren actief in een wijk met actoren uit de geestelijke gezondheidszorg.</p> <p>4.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw voor het project Herstelacademie en verslaving voor de periode 2022-2023</p> <p>a. Continueren en uitbouwen van de partnerschappen in de herstelacademies</p> <p>b. Continueren en uitwerken van nieuwe opleidingen en goede praktijken</p> <p>c. Discovery colleges opstarten</p> <p>d. verslaving is thema binnen de herstelacademies</p> <p>e. uitwerken communicatieplan rond de herstelacademies</p> <p>5. BVR tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten door de revalidatievoorzieningen verslavingszorg</p> <p>a. Aanklampende en outreachende zorgvormen bij zorgwekkende zorgmijders</p> <p>b. Wachtlijstmanagement.</p> <p>c. Doelgroepverruiming met het oog op betere samenwerking en doorstroom vanuit onder andere ziekenhuizen waar veel patiënten met een ernstige alcoholverslaving behandeld worden</p> <p>d. Netwerkgerichte expertisedeling en hulpverlening.</p>
--	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	5 BVR's betreffende project 137 zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13/5/2022. De projecten zijn intussen opgestart. Eerste rapportage van de projecten wordt in september verwacht.
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie noodzakelijk

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring conceptnota besteding projectmiddelen Vlaamse Regering	2022 Q1	Op schema	
Start projecten vanaf 1/1/2022	2022 Q1	Vertraging	Projecten zijn van start gegaan, na goedkeuring subsidies door de Vlaamse Regering (13/5/2022)
De psychosociale revalidatiecentra hebben met de tijdelijke middelen aan expertisedeling gedaan, zorggebruikers tijdens de wachttijd beter ondersteunen, gewerkt met aanklappende en laagdrempelige zorgvormen, kennisdeling en betrokkenheid van partners in de zorg bevorderd	2023 Q3	Op schema	
De verslavingszorgcentra hebben aanklappend en outreachend gewerkt, wachtlijstmanagement uitgewerkt, de doelgroep verruimd en expertise gedeeld binnen het netwerk	2023 Q3	Op schema	
Het Familieplatform heeft informatie voor familie i.v.m. alcoholverslaving en suïcidepreventie toegankelijker gemaakt, uitbouwen van het concept van de familiebuddy en het aanwerven van 13 contextexperten	2024 Q1	Op schema	
De methodiek van kwartiermaken is uitgerold in 5 nieuwe regio's in Vlaanderen	2023 Q4	Op schema	
De herstelacademies in Vlaanderen worden verder versterkt, in de opleidingen is extra aandacht voor het thema verslaving	2023 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Op 13 mei 2022 verleende de Vlaamse Regering zijn goedkeuring aan volgende besluiten: 1. BVR tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten door de revalidatievoorzieningen verslaving, 2. BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid voor het project kwartiermaken, 3. BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid voor het project Herstelacademie en verslaving, 4. BVR tot toekenning van een subsidie aan de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen voor het aanbieden van laagdrempelige zorg met focus op expertisedeling en overbruggingszorg, 5. BVR tot toekenning van een subsidie aan het Familieplatform Geestelijke Gezondheid voor het project contextgericht werken en verslaving.

VV138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Agentschap Opgroeien - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	Brede bevolking; zorgverleners; kinderen, jongeren en gezinnen, mensen met een psychische en/of sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid; naasten van overleden patiënten; intermediairen.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Het coronavirus COVID-19 heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Met het actieplan mentaal welzijn of 'zorgen voor morgen' willen we een sterk signaal geven aan de bevolking dat we de psychosociale gevolgen van de Corona-maatregelen ernstig nemen en er zowel op korte als op middellange termijn adequate oplossingen voor willen implementeren.

De eenmalige maatregelen vanuit het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben tot doel niet alleen de brede bevolking maar ook specifieke doelgroepen zoals zorgverleners; kinderen, jongeren, gezinnen; mensen met een psychische kwetsbaarheid; mensen met een sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid en de naasten van overleden patiënten te ondersteunen en versterken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	6.500.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliseringscampagnes om hulpaanbod bekend te maken • Hulplijnen versterken om bijkomende vragen op te vangen • Werkgevers ondersteunen bij het voeren van een gezondheidsbeleid
Outcome	Meer personen vinden vroegtijdig hun weg naar het laagdrempelige aanbod en een hoger aantal hulpvragen wordt opgevangen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Versterken hulplijnen: Voor de hulplijn 1712 werd een subsidie verstrekt voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2025. De subsidie wordt verleend als financiële tegemoetkoming voor de uitbreiding van de permanentie-uren van de hulplijn,

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>deskundigheidsbevordering van de hulpverleners en externe communicatie over 1712. Concreet gaat het over een subsidie van 2 voltijdse equivalenten, die gelijkmatig over de vijf 1712-teams verdeeld wordt, namelijk CAW Noord-West-Vlaanderen, CAW Oost-Vlaanderen, CAW Antwerpen, CAW Limburg en CAW Oost-Brabant. Aan de centra voor Tele-Onthaal werd voor de versterking van de hulplijn een subsidie verleend voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2024. Hiermee wordt gewerkt aan:- de bekendmaking van het hulpaanbod en de werving van nieuwe vrijwilligers om het hulpaanbod te versterken en coördinatie van een consistent communicatiebeleid;- verder digitaliseren van de ondersteuning van telefoon en chat. Aan Kind in Nood vzw werd voor de financiële ondersteuning van de chat Nupraatikerover.be een subsidie verleend voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Deze subsidie wordt aangewend voor de personeels- en werkingskosten daaraan verbonden. Aan de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen werden een subsidie toegekend om het personeelsbestand van het Druglijnteam te versterken met 0,6 VTE. Hiermee wordt o.a. gewerkt aan:- coaching van de vrijwilligers ter remediëring van de uitval van vrijwilligers;- ontwikkelen van een nieuw concept voor de opleiding van vrijwilligers;- uitvoeren van gerichte data-analyses;- update van de online zelfhulptool DASH. Aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding werd een subsidie toegekend voor een uitbreiding (verdubbeling) van de openingsuren van de chathulp van de Zelfmoordlijn 1813. Hiervoor werd bijkomend personeel ingezet. Tevens werd een campagne gevoerd over suïcidepreventie specifiek gericht op mannen. Gezondheidsbeleid bij telewerk: De subsidie is bestemd om vernieuwende projecten die de gezondheid van telewerkers verbeteren te ondersteunen. Hiervoor werd een oproep gelanceerd door de projecthouder (Vlaams Instituut Gezond Leven) na goedkeuring door de stuurgroep. Er werden 38 voorstellen ingediend. Finaal werden er 14 voorstellen goedgekeurd door de stuurgroep. De termijn werd verlengd met 2 maanden tot 28 februari 2023 omdat project vertraging opliep. Tijdens de voorbereiding van de oproep bleek dat een toestemming van de Europese commissie nodig was, omdat deze oproep beschouwd moest worden als een vorm van staatssteun. Het opstellen van deze aanvraag, de behandeling en goedkeuring door de commissie zorgde ervoor dat de oorspronkelijk tijdslijn niet kon worden aangehouden. De projecten op het terrein zijn dan ook met vertraging gestart. Een tussentijdse evaluatie van de projecten is voorzien eind juni – begin juli 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sensibiliseringscampagnes: over diverse thema's en voor verschillende doelgroepen worden sensibiliseringscampagnes gevoerd in functie van een betere bekendmaking van het hulpaanbod.	2024 Q4	Op schema	Campagnes over jeugdhulp en zelfmoordpreventie zijn gerealiseerd.
Het participatieproject wordt voorbereid via overheidsopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
Er wordt een campagne gevoerd over suïcidepreventie specifiek gericht op mannen.	2021 Q4	Gerealiseerd	De campagne is gerealiseerd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Diverse hulplijnen ontvangen extra middelen	2024 Q4	Op schema	
Versterking hulplijnen: de hulplijnen 1712 (geweld), Tele-Onthaal, de chat Nupraatikerover, de Druglijn en de Zelfmoordlijn ontvangen subsidies om de werking te versterken zodat het stijgend aantal gebruikers kan opgevangen worden.	2021 Q4	Gerealiseerd	De subsidies zijn toegekend.
Werkgevers worden ondersteund bij het voeren van een gezondheidsbeleid.	2023 Q1	Vertraging	De uitvoeringstermijn voor de projecten werd verlengd met 2 maanden tot 28 februari 2023 omdat tijdens de voorbereiding van de oproep bleek dat een toestemming van de Europese commissie nodig was omdat deze oproep beschouwd moest worden als een vorm van staatssteun.
Werkgevers kunnen aanvragen indienen ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid bij telewerk – projecten zijn geselecteerd en kunnen van start gaan	2021 Q4	Gerealiseerd	Er werden 38 voorstellen ingediend waarvan er 14 werden goedgekeurd.

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	6.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.500.000 EUR
Uitvoering VAK	4.736.000 EUR
Uitvoering VEK	3.541.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Versterken mentaal welzijn – Opvolging actieplan mentaal welzijn](#)

VV139 - OVERKOPHUIZEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Jongeren in Vlaanderen en Brussel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Op voorstel van de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, wil de Vlaamse Regering investeren in het welbevinden van jongeren. Opgroeien lanceert daarom een oproep voor de (verdere) ontwikkeling van zestien OverKophuizen. Geselecteerde initiatieven komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro per OverKophuis die wordt toegekend voor een duurtijd van drie jaar. Een OverKophuis is een plek met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en ondersteuning in een omgeving van vertrouwen en geborgenheid. Het gaat om een plek waar je als jongere een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op ondersteuning op vlak van welbevinden zonder een label opgeplakt te krijgen. Een OverKophuis is een toegankelijke ontmoetingsplek waar de doelstellingen van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidsbevordering gecombineerd worden waargemaakt vanuit een sterke participatieve insteek. Deze aanpak sluit ook aan bij een buurtgerichte benadering van de zorg.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.800.000 EUR
Output	Zestien OverKopnetwerken starten binnen hun eigen werkingsgebied minstens één OverKophuis op. In totaal zullen er op 1 januari 2022 in Vlaanderen en Brussel minstens 30 OverKophuizen geopend en werkzaam zijn. De zestien OverKopnetwerken worden vanaf het najaar van 2021 ondersteund vanuit het agentschap Opgroeien via een lerend netwerk en ondersteuningstraject.
Outcome	Tegen 1 januari 2022 zijn in Vlaanderen en Brussel minstens 30 OverKophuizen geopend. Dit zijn 30 toegankelijke ontmoetingsplekken met een geïntegreerde werking voor jongeren, waarbij partners vanuit welzijn, vrije tijd, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, ... de handen in elkaar slaan om de doelstellingen te realiseren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Ondertussen werden 33 OverKophuizen geopend in Vlaanderen, binnen 16 OverKopnetwerken. In het licht van het ondersteuningstraject - lerend netwerk OverKophuizen, dat door Opgroeien georganiseerd wordt om de (startende)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	OverKophuizen te ondersteunen, vonden in 2022 reeds twee fysieke inspiratiemomenten (één rond toegankelijkheid en één rond participatie) en een aantal digitale netwerkbabbels plaats. In de loop van de zomer 2022 zal een eerste projectrapport uitgeschreven worden op basis van de eerste inhoudelijke en financiële rapportage door de OverKopnetwerken (datum 30/06/2022).
Noodzakelijke politieke actie	/

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd		
Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd		
Lancering oproep OverKophuizen: https://www.opgroeien.be/overkop	2021 Q1	Gerealiseerd		
Start beoordelingsfase ingediende projectaanvragen	2021 Q2	Gerealiseerd		
Publieke communicatie nieuwe locaties OverKophuizen	2021 Q2	Gerealiseerd		
Communicatiecampagne (doelgroep jongeren)	2021 Q2	Gerealiseerd		
Opstart ondersteuningstraject OverKophuizenKick-Off lerend netwerk OverKophuizen 30/09/2021	2021 Q3	Gerealiseerd		
Vanaf september 2021 tot en met december 2021: opening nieuwe OverKophuizen in Vlaanderen en Brussel	2021 Q4	Gerealiseerd		
Verdere uitbouw ondersteuningstraject en lerend netwerk	2022 Q1	Gerealiseerd		
Aantal geopende OverKophuizen: 33	2022 Q3	Gerealiseerd	Momenteel zijn 33 OverKophuizen geopend in Vlaanderen.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal geopende OverKophuizen in 2022	30	2022 Q1	33	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.800.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot) update	4.800.000 EUR
Uitvoering VAK	4.800.000 EUR
Uitvoering VEK	1.881.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV140 - SAMENWERKINGSVERBANDEN “ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN”

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Zorg en Gezondheid - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan'

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Met 'één gezin, één plan' investeren we sinds 2018 in samenwerkingsverbanden die laagdrempelige, snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulpverlening bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen met pedagogische ondersteuningsnoden. Een eerstelijnspsychologische functie is in deze samenwerkingsverbanden voorzien zodat een geïntegreerd antwoord geboden kan worden, ook wanneer ze sprake is van combinatie van noden op het vlak van pedagogische vaardigheden met geestelijke gezondheidszorgproblematiek

De samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan' worden tegen eind 2021 op het volledige grondgebied van Vlaanderen en Brussel actief en zullen een doorstart kennen in 2022. Deze implementatie willen we flankeren met een versterking van de crisisnetwerken, actoren in verontrusting en een ondersteunende campagne.

Project VV 140 valt in drie deelprojecten uiteen: 1) de continuering van de uitbreiding van crisisbegeleiding die werd opgestart tijdens de coronacrisis en waarvan stakeholders aangeven dat de nood nog steeds hoog blijft; 2) de uitbreiding van het aantal medewerkers bij de vertrouwenscentra kindermishandeling, ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank, eveneens opgestart in de coronacrisis, met ook hier de vraag om er verder op in te zetten; 3) een ondersteunende campagne om 'één gezin, één plan' beter bekend te maken bij het brede publiek en de connectie met zowel de basisvoorzieningen als de meer gespecialiseerde hulp te versterken zodat we na de relance heel wat vragen rond crisis en verontrusting effectief door deze netwerken kunnen laten opnemen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.200.000 EUR
Output	deelproject 1. uitbreiding van het aanbod crisisbegeleiding met 250 eenheden in 2022 en 150 in 2023. deelproject 2. bijkomende tewerkstelling van 30 medewerkers in vertrouwenscentra kindermishandeling, ondersteuningscentra jeugdhulp en sociale diensten jeugdrechtbank in

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	2022. deelproject 3. bekendmakingscampagne
Outcome	<p>deelproject 1. er worden in 2022 en 2023 respectievelijk 250 en 150 kinderen in acute situaties begeleid zodat crisissen omgebogen worden en minder intensieve ondersteuning vermeden wordt.</p> <p>deelproject 2. we formuleren antwoorden op het toenemende aantal situaties van verontrusting.</p> <p>deelproject 3. de samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan' zijn beter bekend bij de stakeholders.</p> <p>Finaal slagen we erin om gezinnen met (acute) hulpvragen sneller te bereiken en te ondersteunen zodat ze zonder ingrijpende, intensieve hulpverlening verder kunnen.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De initiatieven zijn in volle uitvoering. De uitvoering is geïntegreerd in reguliere werkingen zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Ook kwantitatief zijn de initiatieven betekenisvol: voor crisis wordt ongeveer 20% van de begeleidingen met de relancemiddelen gerealiseerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
de medewerkers in de ondersteuningscentra jeugdzorg, de vertrouwenscentra kindermishandeling en de sociale diensten jeugdrechtbank zijn geworven.	2022 Q1	Op schema	
De middelen voor de versterking van crisisbegeleiding zijn toegekend.	2022 Q1	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
uitbreiding van het aantal gezinnen in crisissituaties dat begeleid wordt.	250	2022 Q4		
uitbreiding van het aantal gezinnen in crisissituaties dat begeleid wordt	150	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.200.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.200.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	750.000 EUR
Uitvoering VEK	750.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021. Versterking mentaal welzijn

VV141 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - CRISISOPVANG EN CRISISBEGELEIDING IN RESIDENTIËLE JEUGDZORG

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit project (nr. 141) zet in op de aanpak van crisissituaties in gezinnen door de jeugdhulp, als reactie op verontrustende opvoedingssituaties. Het project valt uiteen in 2 deelprojecten.

In 2020 werd het aanbod van crisisbegeleiding op advies van experts tijdelijk uitgebreid om te anticiperen op een stijging van verontrustende gezinssituaties omwille van Corona. Aangezien de Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn, zetten we een gedeelte van deze middelen in om deze tijdelijke uitbreiding voor 1 jaar aan te houden.

Daarnaast willen we de relancemiddelen gebruiken om op basis van de adviezen van het maatschappelijk relancecomité een hefboom te creëren om in te zetten op een duurzame verandering rond de aanpak van complexe casussen in de jeugdhulp, die te vaak tot escalaties en crisissen leiden, en waarvoor de crisismeldpunten geen adequate ondersteuning kunnen bieden. We zetten daarvoor proefprojecten 'de ideale wereld' op, waarin we werk maken van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle regionale actoren en de ondersteuningscentra en de sociale diensten van de jeugdrechtsbank (OSD) voor deze casussen.

Tegelijk engageren we de administratie om dit proces mee op te volgen en samen met alle actoren de administratieve en logistieke barrières in kaart te brengen (bv. rol van de toegangspoort, sectorspecifieke regelgeving, onderscheid en combineerbaarheid RTJ/NRTJ, intersectorale schakelmogelijkheden, ...), die samenwerking bemoeilijken of blokkeren en de nodige aanpassingen voor te stellen om de samenwerking op het terrein te faciliteren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	deelproject crisisbegeleidingen: het aantal jongeren bereikt met projectmiddelen voor crisisjeugdhulp deelproject 'ideale wereld': ntb
Outcome	deelproject crisisbegeleidingen: de uitkomst van de crisisbegeleidingen bij afloop: terug naar huis/kan thuis blijven, opvang in de context, vraag naar een langdurig verblijf in een residentiële voorziening in de jeugdhulp.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	deelproject 'ideale wereld': ntb
--	----------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Drie proefprojecten 'ideale wereld' zijn geselecteerd en opgestart	2021 Q3	Gerealiseerd	
400 extra crisisbegeleidingen	2021 Q4	Op schema	
De lerende netwerken zijn opgestart	2021 Q4	Op schema	
De drie proefprojecten 'ideale wereld' hebben een concreet plan, afgetoetst met alle stakeholders, en zijn klaar om dit te implementeren	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal jongeren begeleid met de projectmiddelen in crisisjeugdhulp.	400	2020 Q4	302	77 %
Onderzoek naar duurzame verandering rond de aanpak van complexe casussen in de jeugdhulp + testcases		2023 Q4		
Verbeterd inzicht in de voorwaarden voor het verknopen van expertise in trajecten van kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.418.000 EUR
Uitvoering VEK	1.789.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 5 februari 2021](#)

VV142 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

bewustmakingscampagnes om (potentiële) plegers te bereiken en hen preventief toe te leiden naar hulpverlening

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	300.000 EUR
Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	Het overleg loopt met het departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving en Opgroeien om de inhoudelijke scope evenwichtig vorm te geven (o.a. naar doelgroep, thematiek, format,...) en dit afgestemd met andere lopende initiatieven. Het is de intentie om de campagne in 2022 te lanceren. De vastlegging zal bijgevolg in 2022 gebeuren.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sensibiliseringscampagnes - intrafamiliaal geweld		Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	300.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV143 - ZORGZAME BUURTEN - ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Apothekers Netwerk (VAN vzw), CAW Groep, VVSG

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Dagelijks zien apothekers mensen uit alle lagen van de bevolking met zeer uiteenlopende vragen en behoeftes. Met een gemiddelde van 100 patiëntencontacten per dag, zijn de apothekers de zorgverleners uit de eerste lijn die een groot bereik hebben en lokaal zijn ingebed. Dit biedt enerzijds veel mogelijkheden om patiënten te sensibiliseren en mee te werken aan de preventie van verschillende chronische aandoeningen, en anderzijds kunnen zij een grote rol opnemen inzake detectie en signalering van psychosociale noden en kwetsbaarheden. Met dit project willen we de rol van apothekers als diegenen die psychosociale noden kunnen detecteren en snel kunnen doorverwijzen naar de gepaste hulp versterken. Het Vlaams Apothekers Netwerk vzw (VAN) wil de apothekers in de toekomst een rol geven in de oriëntatie van slachtoffers van geweld en van kwetsbare burgers met psychosociale noden die onder de radar blijven. VAN vzw wil een duurzame samenwerking opzetten met CAW en lokale besturen, en komen tot een goed onderbouwd samenwerkingsakkoord zodat ze elkaars rol kunnen versterken met als effect dat zowel de problematiek van familiaal geweld als de psychosociale noden en behoeften van elke kwetsbare burger gezien wordt, bespreekbaar wordt en gepast wordt aangepakt.

De doelstellingen en acties van fase 1 van het project zijn:

1° Inventariseren welke samenwerkingen op het terrein reeds bestaan, en bevragen wat de noden en behoeften zijn om deze te verduurzamen en nog efficiënter en kwaliteitsvoller aan te pakken.

a. Een onlinebevraging, die wordt verspreid onder de Vlaamse en Brusselse apothekers en de CAW's en de OCMW's (dit kan via VVSG).

b. Bekijken, in het kader van het GBO, op welke manier de toeleiding van cliënten die door de apothekers worden gedetecteerd, kan verlopen naar de CAW's, OCMW's en DMW's. Als leidraad hanteren we hierbij de expertise van deze kernactoren inzake psychosociale begeleiding, met bijzondere aandacht voor de expertise van de CAW's inzake problematiek van relationeel/huiselijk geweld.

2° Materialen (checklist) en een opleiding ontwikkelen voor apotheekmedewerkers in functie van detectie en herkennen van signalen in het kader van familiaal geweld, en het verbergen en niet onderkennen van psychosociale problemen op de verschillende terreinen. Men kijkt eveneens de mogelijkheden op het niveau van de eerstelijnszones.

a. Een checklist die aangeeft hoe apothekers signalen van familiaal geweld kunnen herkennen;

b. Een overzicht van algemene kenmerken van 'zorgmijders';

c. Handvaten en tools (affiches, stickers, flyers ...) die apothekers kunnen gebruiken om problemen bespreekbaar te stellen;

d. Informatie en afspraken over hoe men dient om te gaan met patiënt-/cliëntinformatie;

PROJECTOMSCHRIJVING

- e. Een opleiding om de materialen voor te stellen, de achtergrond ervan mee te geven en toe te lichten hoe ze worden gebruikt;
- f. Ondersteunende instructies voor de vertegenwoordigers in de zorggraden om dit project op te zetten binnen hun eerstelijnszone

3° Taal en tools aanreiken om problemen bespreekbaar te maken, mensen te ondersteunen en te motiveren en ze snel en gemakkelijk toe te leiden naar de hulpverlening. Een onmisbare tool voor het efficiënt doorverwijzen is de sociale kaart.

- a. Een stroomschema met de verschillende stappen die apothekers kunnen zetten bij een vermoeden van familiaal geweld, psychosociale problemen en hoe ze snel kunnen doorverwijzen;
- b. Informatie over de beschikbare hulp en de bereikbaarheid (waar, wanneer en hoe), hoe apothekers kunnen doorverwijzen en aanmelden (aanmeldingstool);
- c. Afspraken in verband met de registratie en verwerking van data op een geaggregeerd niveau, rekening houdend met de GDPR-regelgeving;
- d. Een opleiding/webinar/e-learning die de rol van apothekers in het kader van detectie, signalering en doorverwijzing duidt, concreet maakt en toelichting geeft bij het gebruik van het stroomschema en de afspraken, en handvaten geeft hoe men kan communiceren met slachtoffers en hulpvragers of hulp- en zorgmijders.

Om vanuit de praktijk de link te leggen met het beleidsniveau, zal worden samengewerkt met een academische onderzoeksgroep die de pilootprojecten zal opvolgen, evalueren en bekijkt welke relevante data kunnen gegenereerd worden. Men wil ook nagaan in welke mate de samenwerking met de apothekers de drempel naar de hulpverlening verlaagt.

De doelstellingen en acties van fase 2 van het project zijn:

1° Duurzame competentieontwikkeling bij de apotheker.

-> Verder uitwerken van de materialen (trainingsmateriaal, tools voor de praktijk) zodat ze bijdragen tot een duurzame competentie-ontwikkeling van apothekers. Hierbij wordt o.a. gedacht aan een e-learning met verschillende modules (zowel voor 'startende' apothekers als voor apothekers die al een rol hebben opgenomen in het doorverwijzen van patiënten), intervisiemomenten onder begeleiding van experts, een toolbox,...

-> Ontwikkelen van een trainingspad dat leidt tot een betere detectie en gerichte doorverwijzing van personen met psychosociale noden door de huisapotheker, met verhoogde aandacht voor kwetsbare personen en zorgmijders. Dit gaat van het herkennen, het bespreekbaar maken en het doorverwijzen van personen die kampen met psychosociale problemen.

2° Uitbreiden van het deelnemende apothekersnetwerk.

-> Betrokkenheid van apothekers actief verder uitbouwen (zowel in aantal als geografisch): door de huisapothekers gelegen in een groter geografisch ELZ netwerk te informeren over de werking van het CAW als laagdrempelige en lokaal verankerde hulporganisatie en hen op te leiden en van de nodige handvatten te voorzien;

3° #CAVAsa kenbaar maken bij een breder publiek.

-> Het sensibiliseren van de algemene bevolking; informeren van burgers over de rol van de apotheker als vertrouwenspersoon bij psychosociale problemen;

4° Het installeren van een duurzame samenwerking tussen apothekers en CAW

-> Toolbox ter beschikking van de apothekers up to date houden en uitbreiden naar bijkomende CAW regio's;

-> Website www.cavasa.be voorzien van contactgegevens van het CAW per ELZ en makkelijk toegankelijk maken voor apothekers;

-> Laagdrempelige ontmoetingsmomenten tussen apothekers en CAW-medewerkers organiseren

-> Compenseren van de inzet van de deelnemende apothekers (gedurende het bijkomende

PROJECTOMSCHRIJVING

projectjaar).

Tegelijk zal het bijkomende projectjaar van #CAVAsa benut worden om ook onderstaande onderzoeksdoelstellingen te bereiken:

1° Inzicht verwerven in de ervaring van patiënten die via hun apotheker bij CAW zijn terechtgekomen.

-> Informatie en 'materiaal' verzamelen dat gebruikt kan worden om de nieuwe dienstverlening nog meer patient-centered te maken. Testimonials van patiënten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de e-learning te verrijken, of voor communicatie naar patiënten/andere stakeholders;

2° Onderzoek naar de randvoorwaarden voor een duurzame verankering van de rol van de apotheker in het psychosociale zorglandschap.

-> Basis leggen voor een duurzaam samenwerkingsmodel tussen huisapotheker en CAW, toepasbaar voor alle huisapothekers in Vlaanderen;

3° Wetenschappelijke disseminatie

-> Resultaten van het project (zowel kwantitatieve data als kwalitatieve data) kenbaar maken via papers in wetenschappelijke tijdschriften, congressen GGZ, publicaties en activiteiten beroepsverenigingen, meetings met ELZ kernactoren, ...

-> Resultaten en materialen delen met de verschillende universiteiten in Vlaanderen, zodat het concept opgenomen kan worden in de basisopleiding voor apothekers, en er via masterproeven, PhD projecten,... verder onderzoek gedaan kan worden naar de implementatie.

De finale doelstelling is om na het tweede projectjaar de nodige tools te hebben ontwikkeld om het project breed te integreren in het beleid van zoveel mogelijk ELZ, opdat de lokale apothekers en CAW door de lokale besturen en zorgraden autonoom (middels de beschikbare tools) en actief kunnen worden ingeschakeld in het lokale netwerk van zorgzame buurten ter bevordering van het psychosociaal welbevinden. Het werk van twee projectjaren zal worden gebundeld in een laagdrempelig model waarbij iedere huisapotheker (die deze nieuwe rol in de dagelijkse apothekerspraktijk wil opnemen) de samenwerking met het lokale CAW - binnen een zorgzame buurt- op een eenvoudige manier kan aanvatten. Tegelijk zullen een aantal concrete randvoorwaarden worden geformuleerd opdat een brede implementatie in Vlaanderen succesvol en duurzaam kan zijn.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	250.000 EUR
Output	- Een inventaris van bestaande samenwerkingsverbanden en noden/behoefte om deze samenwerkingsverbanden te verduurzamen, efficiënter en kwaliteitsvoller aan te pakken. - Een aantal materialen/tools en opleidingen voor apothekemedewerkers.
Outcome	Snellere detectie van psychosociale noden en doorverwijzing naar gepaste hulp.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De subsidie aan het Vlaams Apothekers Netwerk vzw voor de uitvoering van de tweede fase van het project is toegekend. Dit werd goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 11/03/2022. Het project is in uitvoering.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Fase 1 van het project is uitgevoerd	2022 Q1	Gerealiseerd	
Subsidie aan VAN vzw voor uitvoering van het project - fase 2 is toegekend	2022 Q1	Gerealiseerd	
Fase 2 van het project is uitgevoerd	2023 Q1	Op schema	
De resultaten van het project zijn breed verspreid	2023 Q4	Nog niet gestart	
Subsidie aan VAN vzw voor uitvoering van het project - fase 1 is toegekend	2021 Q1	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Onlinebevraging van samenwerkingsverbanden en noden/behoefden: inventaris	1 inventaris	2021 Q2	1	100 %
Materialen/tools: - een checklist- een overzicht met kenmerken van 'zorgmijders'- handvaten en tools (affiches, stickers, flyers,...)- informatie en afspraken m.b.t. omgaan met cliëntinformatie- ondersteunende instructies- stroomschema- aanmeldingstool- registratie- en verwerkingsafspraken	8 uitgewerkte materialen / tools	2022 Q1	8	100 %
Opleidingen voor apothekemedewerkers: opleiding voor gebruik van de toolsopleiding omtrent apothekers	2 opleidingen	2022 Q1	2	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	250.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	250.000 EUR
Uitvoering VAK	269.000 EUR
Uitvoering VEK	228.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 250.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 12 maart 2021](#)

[Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie project #CAVAsa 2.Vlaams Apothekers Netwerk, 11/03/2022](#)

VV144 - ZORGZAME BUURTEN - VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Agentschap Zorg en Gezondheid - Agentschap Opgroeien - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	Welzijns- en zorgorganisaties, welzijns- en zorgprofessionals, lokale besturen, patiënten- en cliëntenorganisaties, enz. (Experten zetelend in de Vlaamse Raad WVG)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Vandaag willen mensen met zorg- en ondersteuningsvragen zelf beslissen over de hulp en ondersteuning die ze willen krijgen. Ze zijn niet langer gefocust op gezondheid, maar wel op hun brede levenskwaliteit en willen comfortabel kunnen wonen in hun huis en vertrouwde buurt. Of het nu gaat om ouderen, personen met een handicap, personen met psychische problemen of gezinnen met kinderen of jongeren met een zorg- of ondersteuningsvraag, mensen willen graag, maatschappelijk ingebed, in de buurt blijven wonen.</p> <p>Door het ontwikkelen en stimuleren van zorgzame buurten met aandacht voor buurtgerichte zorg kunnen we die evolutie ondervangen. Met zorgzame buurten zetten we in op zorgzaam samenleven, op ontmoeting, solidariteit en de opbouw van sociaal weefsel. Zorgzame buurten kunnen helpen om vereenzaming te voorkomen. Een zorgzame buurt biedt geborgenheid en ondersteuning in de nabije omgeving. Het draait om “het kleine helpen”. Een zorgzame buurt is er voor iedereen. Daarenboven leggen we de link tussen informele hulp en de professionele zorg zodat complexe hulpvragen sneller, makkelijker een weg vinden naar de professionele hulpverlening en professionele hulpverlening die informele zorg ook beter kan ondersteunen. De betrokkenheid van de professionele zorg in zorgzame buurten moet er voor zorgen dat verschillende welzijns- en zorgorganisaties op dat lokale niveau vanuit eenzelfde focus meer en beter gaan samenwerken en uiteindelijk komen tot het aanbieden van geïntegreerde zorg (vanuit gezondheid én welzijn) met een focus op levenskwaliteit.</p> <p>Daartoe zullen we midden juni 2021 een projectoproep lanceren om tot minstens 95 zorgzame buurtprojecten te komen in het Vlaams Gewest. We zetten een apart traject op om tot minstens 5 projecten te komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.</p> <p>We zullen de minstens 100 zorgzame buurtprojecten een financiële impuls geven gedurende twee jaar. De projecten starten op 1 maart 2022 en lopen tot 29 februari 2024. Ze zullen inhoudelijk begeleid en ondersteund worden door een externe partner, die hiervoor beroep zal doen op de beschikbare expertise op het terrein.</p> <p>In februari 2024 willen we niet enkel tot minstens 100 goedlopende zorgzame buurtprojecten komen, we willen dat deze inspirerend zijn voor andere buurten zodat er zich zorgzame buurten ontwikkelen over heel Vlaanderen en Brussel. Om dat sneeuwbaaleffect te bekomen, zullen we niet enkel een inhoudelijke toolbox uitwerken en ter beschikking stellen van geïnteresseerde buurten in de toekomst, maar ook de projecten en</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

het concept bekend maken zodat het concept leeft op het terrein en andere buurten zin hebben om er zelf mee aan de slag te gaan.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none">- Minstens 100 zorgzame buurtprojecten waarvan minstens 95 in het Nederlandse taalgebied en minstens 5 in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad- Organisatie van 6 inspiratiedagen voor het brede terrein in voorjaar 2023 in kader van opschalen beleid Zorgzame Buurten- Evaluatiekader (met onder meer een long-list van indicatoren)- Toolbox voor welzijns- en zorgorganisaties en lokale besturen met praktische handvaten/methodieken om aan een zorgzame buurt te werken- Beleidsaanbevelingen tav de Vlaamse overheid (WVG)- Organisatie symposium voor brede terrein in maart/april 2024
Outcome	<ul style="list-style-type: none">- Duurzaamheid van de projecten na de projectduur van twee jaar- Het feit dat de trekkers (en netwerkpartners) een leertraject hebben doorlopen mbt participatief en inclusief werken, het opstellen van een buurtprofiel en buurtanalyse en daaruit verder bouwen om beleid te ontwikkelen, het opstellen van een veranderingstheorie en impactgericht werken en het samenwerken in een netwerk (samenwerking tss welzijn en zorg, beleidsdomeinoverschrijdend, en met buurtbewoners) én wat ze geleerd hebben ook ruimer in de eigen werking kunnen inzetten (bvb impactgericht werken).- Ruimere kennis over/bekendheid van "zorgzame buurten", de werking ervan, werkende principes, enz. bij alle lokale besturen en welzijns- en zorgorganisaties (ook diegene die geen lopend project zorgzame buurten hadden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Op 30 april 2021 keurde de VR de strategische lijnen goed van het beleid Zorgzame Buurten. Op 18 maart keurde de VR een vervolgnota goed: via deze laatste nota kende de VR extra middelen goed voor de projecten zodat alle door de jury goedgekeurde projecten konden starten.</p> <p>Op 1 maart startten 119 projecten Zorgzame Buurten in Vlaanderen en Brussel. Na de beslissing van de VR op 18 maart gingen er 13 extra Vlaamse projecten en één extra Brussels project van start.</p> <p>Op 24 maart organiseerden we een informatieve startdag als kick-off voor alle projecten.</p> <p>Het vormingsaanbod van het consortium ging van start: de projecten kunnen deelnemen aan vormingen (live, alsook webinars en podcasts) rond sleutelvaardigheden om tot een zorgzame buurt te komen (opstellen buurtanalyse, impactgericht werken, samenwerken in een netwerk, enz.). De coaches van het consortium gingen eveneens van start.</p> <p>Ook het Steunpuntonderzoek ging van start; er is één stuurgroep achter de rug.</p> <p>Vanuit het Dep WVG werken we parallel verder aan het verspreiden van info en inspiratie met het oog op opschalen van dit beleid.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	We overleggen met de WHO hoe we het Vlaamse beleid én onderzoeksveld inzake Zorgzame Buurten internationaal op de kaart kunnen zetten.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering projectoproep zorgzame buurten	2021 Q2	Gerealiseerd	
Online inspiratie-/studienamiddag zorgzame buurten	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deadline indiening van alle projectaanvragen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Start minstens 100 projecten zorgzame buurten	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 1 maart gingen 119 projecten Zorgzame Buurten van start (114 in het Nederlandse taalgebied en 5 in het tweetalig taalgebied Brussel). Gelet op het animo op het terrein voor dit beleid besliste de Vlaamse Regering op 18 maart om extra middelen toe te kennen voor de projecten waardoor er nu 133 projecten gestart zijn (127 in Vlaanderen en 6 in Brussel).
Ontvangen van gedragen buurtanalyses en veranderingstheorieën van de projecten	2022 Q3	Nog niet gestart	<p>We vragen een eerste gedragen buurtanalyse en veranderingstheorie aan de projecten met verschillende doelstellingen: 1) Voor de projecten zelf zodat ze gestructureerd en met een duidelijke impact voor ogen, het project uitwerken. 2) Zodat we/consortium op basis van wat ingediend wordt, kunnen beslissen welke vormen, coaching er prioritair nodig is. 3) Om de projecten aan te zetten tot voortgang. 4) Als input voor het wetenschappelijk onderzoek.</p> <p>We stellen momenteel sjablonen op als leidraad, samen met het consortium zodat deze ook sporen met de vormen die hierrond gegeven worden en met het Steunpunt zodat de onderzoekers de nodige data ontvangen.</p>
Organisatie 6 provinciale inspiratiedagen	2023 Q2	Nog niet gestart	In maart/april 2023 organiseren we 5 provinciale en één Brusselse inspiratiedag voor het hele terrein om welzijns- en zorgorganisaties en lokale besturen te inspireren, enthousiasmeren, informeren om op een begrijpelijke, toegankelijke manier aan de slag te gaan met Zorgzame Buurten.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
We ontvangen per project eventuele bijgewerkte veranderingstheorie, eerste evaluatieblauwdruk, inhoudelijk en financieel verslag, voortgangsrapport	2023 Q2	Nog niet gestart	
We ontvangen per project een bijgewerkte veranderingstheorie, uitgewerkte evaluatieblauwdruk en eerste dataverzameling, inhoudelijk en financieel verslag, eindrapport	2024 Q2	Nog niet gestart	
Eindsymposium met kennisdeling	2024 Q2	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal startende zorgzame buurtprojecten in Vlaanderen en Brussel	100	2022 Q1	133	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	13.065.000 EUR
Uitvoering VEK	5.613.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Versterking mentaal welzijn – zorgzame buurten](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021: Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake zorgzame buurten](#)

[Beslissing van de VR van 10 december 2021 subsidie Koning Boudewijnstichting voor project 'zorgzame buurten'](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 maart 2022. Versterking mentaal welzijn – zorgzame buurten](#)

30. Armoedebestrijding en wijkverbetering

VV145 - BUITENSCHOOLSE OPVANG ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Lokale besturen, sectoren onderwijs, cultuur, jeugd en sport, gezinnen en kinderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Groeipad vervroegen voor buitenschoolse opvang (vanaf schooljaar 2021-2022).

Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) is in werking getreden in 2021. Hierbij komt de regierol inzake BOA bij de lokale besturen te liggen, inclusief de bevoegdheid om te beslissen over de besteding en verdeling van middelen. Echter, tijdens de overgangstermijn (2021-2026) behouden huidige organisatoren van buitenschoolse opvang hun subsidie via opgroeien. De Vlaamse regering voorziet alvast vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding vanaf 2023 en 2024 respectievelijk 3,3 miljoen en 3 miljoen euro een inzet van middelen, ter ondersteuning van de lokale besturen voor de (verdere) uitbouw van een geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten bij deze opdracht. Met dit project, is het mogelijk dit groeipad voor de lokale besturen te vervroegen naar 1 september 2021. Op die manier kan extra aanbod al worden opgestart vanaf de start van het schooljaar 2021-2022.

Elke gemeente heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd. Door lokaal het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten af te stemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen, werkt men lokaal aan de drie doelstellingen van het decreet:

- kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden bieden, inspelen op interesses en talenten
- voor ouders: de combinatie werk, opleiding en gezin mogelijk te maken
- bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften zich welkom voelt.

Bij de uitwerking van het decreet in 2019-2020, werden relevante stakeholders betrokken (lokale besturen, werkgevers en werknemersorganisaties vanuit welzijn, onderwijs, cultuur, jeugd en sport en vertegenwoordigers van gezinnen en kinderen)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	11.400.000 EUR
Output	<p>43 lokale besturen (goed voor ongeveer. 263.911 inwonende en schoolgaande kinderen) ontvangen vanaf 1 september 2021 een subsidie ter ondersteuning van de uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Lokaal wordt invulling gegeven aan de drie doelstellingen van het decreet. Daarbij:</p> <p>1) Ontwikkelt het lokaal bestuur een lokaal beleid rond BOA op basis van de noden van kinderen en gezinnen, in samenspraak met relevante actoren</p> <p>2) Beslist het lokaal bestuur over de besteding van de middelen, binnen het kader van het lokaal beleid in punt 1</p> <p>3) De middelen worden ingezet voor de organisatie van de buitenschoolse opvang (o.m. kleuteropvang met een kwaliteitslabel) en afstemming met buitenschoolse activiteiten (samenwerking met jeugdwerk, sport...) om te komen tot een geïntegreerd en toegankelijk aanbod.</p>
Outcome	Het voorziene groeipad wordt vervroegd. Lokale besturen met een hoog percentage kwetsbare gezinnen, hoog aantal schoolgaande kinderen en op heden weinig subsidies voor buitenschoolse opvang, kunnen hierdoor vervroegd aan de slag met de doelstellingen van het decreet (zie drie punten bij projectomschrijving)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Sinds 01/09/2021 ontvangen de lokale besturen een BOA-subsidie. De regierol ligt bij het lokaal bestuur, zij zetten deze middelen in conform de doelstellingen van het decreet.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste rapportering Vlaamse beleidsprioriteiten	2022 Q4	Nog niet gestart	<p>Ten laatste 31/07/22 rapporteren de lokale besturen binnen de BBC over de BOA-subsidie. Dit doen ze aan de hand van de 2 Vlaamse beleidsprioriteiten, waaraan codes hangen om te rapporteren over de acties ondernomen met deze subsidie.</p> <p>Op basis van deze informatie, maken we in de periode augustus-november een eerste inhoudelijke analyse over wat er precies gebeurt met de Vlaamse Relancemiddelen.</p>
Eerste principiële goedkeuring besluit Vlaamse Regering over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten en subsidies	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Voor aankondiging subsidies voor lokale besturen			
Lancering oproep BOA-subsidie (zie opgroeien.be/boa/partners/de-boa-subsidie-aan-lokale-besturen)	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning BOA-subsidie	2021 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen dat vanaf september 2021 een BOA-subsidie ontvangt en de eerste financiële middelen krijgt ifv de doelstellingen van het decreet (afhankelijk van ingediende aanvragen en ev. reservelijst)	43	2021 Q4	43	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	11.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	11.400.000 EUR
Uitvoering VAK	11.400.000 EUR
Uitvoering VEK	5.255.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 11.400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR van 7/09/2021 over het lokaal beleid, de samenwerking en de subsidievoor buitenschoolse opvang en activiteiten](#)

VV146 - COMPENSATIEBESLUIT KO - EXTRA TUSSENKOMST IKT (INKOMENSTARIEF)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien
Belanghebbenden	Ouders die kinderopvang gebruiken in een opvang waar men volgens inkomen kan betalen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

In het kader van kinderopvang kunnen gezinnen bij organisatoren die de subsidie voor inkomenstarief ontvangen van het agentschap Opgroeien regie voor de opvang een prijs betalen op basis van hun inkomen. De regelgeving voorziet de mogelijkheid voor gezinnen die zich in bepaalde specifieke situatie bevinden om een individueel verminderd tarief aan te vragen. Naar aanleiding van de COVID-19- pandemie werden heel wat gezinnen geconfronteerd met een inkomensdaling. Om voor die gezinnen de financiële drempel om hun kind naar de opvang te laten gaan, te verlagen, is beslist om een bijkomend specifiek COVID-tarief te voorzien. Om in aanmerking te komen, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

- gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin bedraagt minder dan 44.493,57 euro
- bruto maandinkomen van het gezin van de maand voor de aanvraag van het COVID-tarief is 10% lager dan 1/12 van het gezamenlijk belastbaar inkomen

In dat geval ontvangt een ouder een korting van 25% op zijn berekend inkomenstarief, met een minimum van het standaard minimumtarief.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	975.000 EUR
Output	Bij de bepaling van het benodigde budget voor deze maatregel hebben we ons gebaseerd op het aantal attesten die er zijn tussen de inkomensgrenzen. Om de maximale mogelijke financiële impact hebben we ons gericht op de attesten inkomenstarieven met de hoogste tarieven met de inschatting dat 1 op 3 ouders binnen de aangehaalde financiële grenzen vallen en effectief een covid-tarief zouden kunnen aanvragen. Dit gaat over circa 14.600 attesten inkomenstarief.
Outcome	kinderen die voorheen omwille van de coronacrisis niet meer naar de kinderopvang kwamen, worden terug opgevangen in de kinderopvang kinderen die voorheen omwille van de coronacrisis minder naar de kinderopvang kwamen, worden terug opgevangen in de kinderopvang volgens het initiële opvangplan

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
---------------	--------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Voor de komende periode wordt er een evaluatie voorzien en wordt er nagegaan of een verlenging van de maatregel aangewezen is.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Voor de komende periode wordt er een evaluatie voorzien & wordt er nagegaan of een verlenging en/of bijsturing van de maatregel aangewezen is om dezelfde doelstellingen te realiseren en/of hetzelfde doelpubliek te bereiken.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slechts beperkt werd gebruikt (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slechts beperkt werd gebruikt (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.	2022 Q1	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Diverse maatregelen compensatie Corona – initiatieven kinderopvang	860.840 EUR	2021 Q4	860.840	100 %
Aantal aangevraagde attesten inkomenstarief met covid-tarief In het kader van kinderopvang	14.600	2021 Q4	1.015	6 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	975.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	975.000 EUR
Uitvoering VAK	975.000 EUR
Uitvoering VEK	975.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 975.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV147 - DOORGAANDE LIJN KINDEROPVANG – ONDERWIJS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Basisgedachte van dit project is de doorgaande lijn in de ontwikkeling van baby's en peuters tot het einde van de kleutertijd, van nul tot zes jaar, tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kinderopvang, in verbinding met thuis en met de buurt en over beleidsdomeinen heen.

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Kinderen en alle betrokkenen hebben baat bij zoveel mogelijk continuïteit. Zowel kind als ouder voelen zich veilig en gekend, omdat ze omringd worden door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving

Vanaf het schooljaar 2021-2022 bieden we ruimte aan initiatiefnemers en pioniers die zich in de willen inzetten op een doorgaande lijn van kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kinderopvang. Daarbij bekijken we hoe verbinding kan worden gemaakt met thuis en de buurt, o.a. de Huizen van het Kind. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de taalontwikkeling en de verwerving van de Nederlandse taal.

Daarvoor zetten we een projectoproep op voor 12 pioniers, ondersteund door externe projectbegeleiding en opgevolgd door een begeleidingscomité, samengesteld uit diverse stakeholders uit beleid, praktijk en onderzoek. De expertise die de pioniers opbouwen wordt gedeeld in het lerend netwerk en moet toelaten om goede praktijken in kaart te brengen, (verder) te ontwikkelen en te dissemineren, om noodzakelijke voorwaarden aan te pakken en om, op basis van een grondige evaluatie, te komen tot beleidsaanbevelingen met het oog op reguliere verankering.

Dit project sluit aan bij de aanbeveling van het Maatschappelijk Relancecomité om proeftuinen op te zetten rond geïntegreerde projecten kinderopvang/(kleuter)onderwijs waarbij ook buitenschoolse activiteiten worden betrokken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.800.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - 12 pioniers (samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal 3 kernpartners met name organisator kinderopvang, kleuterschool en buitenschoolse opvang en activiteiten) ontvangen 45.000€/jaar subsidies om gedurende drie jaar (jan 2022 - dec 2024) te groeien naar een meer geïntegreerde werking - 12 pioniers realiseren de doelstellingen van het individuele project en komen samen (binnen lerend netwerk) tot een gedeeld praktijkmodel

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<ul style="list-style-type: none"> - een ondersteuningstraject is opgezet (o.a. individuele ondersteuning van de pioniers en opzet van een lerend netwerk) - een stuurgroep (samengesteld uit diverse relevante partners uit praktijk, onderzoek en beleid) is samengesteld en volgt de voortgang van het project
Outcome	Ontwikkeling van een concept en praktijkmodel(len) voor het verwezenlijken van een doorgaande lijn tussen kinderopvang, kleuteronderwijs en kleuteropvang. Het gaat hier om een pedagogisch concept waarin leren, zorg, opvoeding en spelen met elkaar zijn verbonden, in samenwerking met alle betrokken partners in het lokaal samenwerkingsverband en met een diverse groep van ouders met kinderen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De 12 pioniers zijn gestart in januari 2022. Elke pionier heeft een kernteam samengesteld, dat deelneemt aan het lerend netwerk en de voortgang en implementatie van het lokale ondernemingsplan vormgeeft en opvolgt. De ondersteuning van de projecten is opgestart: de opdrachten en krijtlijnen zijn gezet, de projecten hebben zich voorgesteld en eerste denkoefeningen en uitwisseling m.b.t. het concretiseren van het geïntegreerd aanbod in een bijgewerkt ondernemingsplan zijn opgenomen, onder begeleiding van de leer-en kennispartner (tijdens lerend netwerk dagen en individuele begeleidingsgesprekken).</p> <p>De stuurgroep is intussen tweemaal samengekomen. Met grote betrokkenheid van leden (in aanwezigheid en inbreng) zijn de verwachtingen m.b.t. de opdracht en de procesmatige aanpak geconcretiseerd. Het laat ruimte om samen inhoudelijk uit te wisselen en de nodige input van de (eigen) organisatie voor te bereiden.</p> <p>Een eerste inventarisatie van de knelpunten en drempels (in de regelgeving) is gebeurd. Deze wordt verder doorgesproken met experts in de regelgeving, het lerend netwerk en de stuurgroep opdat we tegen eind september een duidelijk en gestructureerd overzicht kunnen voorleggen aan en doorspreken met de betrokken kabinetten om het proces van regelluwte op te starten.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang	2021 Q1	Gerealiseerd	
Uitwerking, lancering, jurering Bestek 'leerpartner' voor het begeleiden van het ondersteuningstraject (ondersteuning 12 pioniers binnen een lerend netwerk).	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Toekenning opdracht leerpartner.	2021 Q3	Gerealiseerd		
Lancering Oproep Pioniers Doorgaande Lijn	2021 Q3	Gerealiseerd		
Jurering en toekenning 12 projecten	2021 Q4	Gerealiseerd		
Opstart 1e fase van het traject (jan 2022 - aug 2023)	2022 Q1	Op schema		
Stuurgroep samenstellen, opdracht en mandaat verduidelijken en procesmatige aanpak en planning goedkeuren.	2021 Q4	Gerealiseerd		
Uitvoeren van een verdiepende analyse met o.a. eerste inventarisatie van drempels en knelpunten (in functie van opstarten proces regelluwte) en het bijsturen van het ondernemingsplan (door de pioniers).	2022 Q3	Op schema		
Opstart experimenteren en implementeren van een vernieuwde geïntegreerde werking binnen huidige regelgevende kader (pioniers).	2022 Q3	Op schema		
Co-creëren van een gedeeld inhoudelijk kader voor de pilootprojecten (lerend netwerk)	2022 Q4	Op schema		
Uitwerken en uitvoeren zelfevaluatie en (financiële) rapportering 1e projectjaar (pioniers)	2023 Q1	Op schema		
Vorm geven aan regelluw kader voor de 2e fase (project- en stuurgroep i.s.m. de betrokken kabinetten - periode juni 2022 - juni 2023).	2023 Q2	Op schema		
Opstart experimenteren en implementeren van een vernieuwde geïntegreerde werking binnen het ontwikkelde regelluw kader (pioniers)	2023 Q3	Nog niet gestart		
Uitvoeren zelfevaluatie en (financiële) rapportering 2 projectjaar (pioniers)	2024 Q1	Nog niet gestart		
Beschrijven van de ontwikkeling praktijk en documenteren van praktijkmodellen; formuleren van beleidsaanbevelingen (lerend netwerk, project- en stuurgroep)	2024 Q4	Nog niet gestart		
Uitvoeren van de eindevaluatie en (financiële) eindrapportage project (pioniers)	2025 Q1	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Tussentijdse evaluatie van de 12 pioniers: 12 uitgewerkte ondernemingsplannen met		2022 Q3		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
concrete doelstellingen en aanpak en met voorstellen tot afwijking van de bestaande sectorale regelgeving				
Eindrapport met o.a. de ontwikkeling van een praktijkmodel Doorgaande Lijn, geïllustreerd vanuit de 12 pioniers en met concrete beleidsaanbevelingen.		2024 Q4		
12 gerealiseerde projecten Doorgaande Lijn		2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.800.000 EUR
Uitvoering VAK	1.625.000 EUR
Uitvoering VEK	275.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang</p> <p>Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang. Bijlage</p>

VV148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Herw!n vzw, sociale distributieplatformen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

De COVID-19 crisis heeft het belang van voedselbedeling voor een belangrijke kwetsbare doelgroep van mensen in armoede bevestigd. Op dit ogenblik zijn in Vlaanderen een aantal sociale distributieplatformen actief die een cruciale rol opnemen in de verdeling van voedsel(overschotten) naar organisaties die het voedsel lokaal bezorgen aan mensen in armoede die hier nood aan hebben. Vaak zetten deze platformen ook doelgroepmedewerkers in voor de uitvoering van hun activiteiten.

Vlaanderen subsidieert momenteel op projectmatige basis enkele van deze distributieplatformen. Deze subsidies lopen af midden 2021. Gelet op het bewezen nut van deze platformen, zal werk gemaakt worden van een structurele verankering van dergelijke distributieplatformen.

In afwachting van dit structureel kader dat er ten vroegste in 2024 zal zijn, is het belangrijk de huidige distributieplatformen te blijven ondersteunen.

Het project betreft daarom concreet in eerste instantie het uitwerken van een financieringskader voor de periode 2021-2025 waarbij er zowel oog is voor de leefbaarheid van de huidige platformen als voor het vergroten van het werkingsgebied waarbinnen de platformen actief zijn, dit door uitbreiding van hun bestaande werkingsgebieden of waar nodig het opzetten van nieuwe platformen. Want het aanbod is op dit ogenblik niet Vlaanderen-dekkend.

In tweede instantie betreft dit project dan de effectieve financiering van de sociale distributieplatformen, conform het uitgewerkt financieringskader, dit met het oog op een duurzame verderzetting van deze platformen na 2025. Naast 2.400.000 euro Vlaamse relancemiddelen, wordt ook 400.000 euro reguliere middelen ingezet voor dit project.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.400.000 EUR
Output	In elke referentieregio in het Vlaamse Gewest wordt een distributieplatform gesubsidieerd.
Outcome	<p>Elke organisatie in het Vlaamse Gewest die voedsel bedeed aan mensen in armoede, kan een beroep doen op een sociaal distributieplatform. Er zal dus een stijging zijn van het aantal organisaties dat een beroep doet op een sociaal distributieplatform.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daling in ton van voedselverspilling • Stijging in ton van voedseloverschotten dat terecht komt bij mensen in armoede • Stijging van het aantal doelgroepmedewerkers actief in de sectoren actief in de herbestemming van voedseloverschotten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het financieringskader is uitgewerkt en neergeschreven in een projectoproep die op 27 juli 2021 is gelanceerd. Initiatiefnemers konden intekenen op de projectoproep uiterlijk op 30 september 2021. Er werden 14 projectaanvragen ingediend. Toekenning van een subsidie aan 12 projecten i.k.v. projectoproep 'sociale distributieplatformen naar voedselhubs 2021 werd op de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17/12/2021.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uittekenen van het financieringskader voor sociale distributieplatformen voor de periode 2021-2025.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Projectmatige subsidiëring van sociale distributieplatformen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering van de projecten	2025 Q4	Op schema	De projecten zijn opgestart eind 2021 en lopen t.e.m. 30/11/2025.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal referentieregio's (er zijn 17 referentieregio's) betrokken in goedgekeurde projecten	17	2021 Q4	15	80 %
Aantal sociale distributieplatformen (streefwaarde is maximum)	15	2021 Q4	12	80 %
Aantal gemeenten die beroep kunnen doen op de diensten van een sociaal distributieplatform	300	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	2.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.400.000 EUR
Uitvoering VAK	2.401.000 EUR
Uitvoering VEK	650.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 2.400.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidiëring sociale distributieplatformen voedseloverschotten. 16/07/2021](#)

[Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie sociale distributieplatformen voedseloverschotten 2021. 17/12/2021](#)

VV149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Samenwerkingsverbanden GBO bestaande uit OCMW, CAW en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project past in de implementatie van een nieuw beleid en nieuwe regelgeving gericht op 1) drempelverlaging van de Vlaamse hulp- en dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen en 2) bestrijding van onderbescherming bij kwetsbare doelgroepen door proactieve rechtendetectie en -realisatie. Dit nieuw beleid wordt in de praktijk onder meer vorm gegeven door de oprichting van samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), bestaande uit OCMW's, het centrum algemeen welzijnswerk actief in het werkingsgebied en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Vanaf 2020 wordt de opstart en uitbouw van een beperkt aantal samenwerkingsverbanden GBO financieel ondersteund. Er is ook een divers ondersteuningsaanbod ontwikkeld.

Met het project wordt de uitrol van het Geïntegreerd Breed Onthaal in Vlaanderen gerealiseerd. Dit behelst concreet de financiële ondersteuning van de samenwerkingsverbanden GBO waar dit nu nog niet het geval is, zodat uiterlijk eind 2022 overal in Vlaanderen samenwerkingsverbanden GBO kunnen worden opgestart en eind 2025 overal in Vlaanderen deze samenwerkingsverbanden operationeel zijn. Voor de berekening van de hoogte van de toe te kennen subsidies, wordt gebruik gemaakt van het kader opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.

Binnen dit project zal het ontwikkelde ondersteuningsaanbod opgeschaald worden, zodat dit aanbod ook beschikbaar en bereikbaar is voor de nieuwe samenwerkingsverbanden GBO.

Tenslotte zal binnen dit project de nodige aandacht gaan naar de uitwerking van regelgeving op het vlak van gegevensdeling naar en binnen GBO-samenwerkingsverbanden, rekening houdend met de doelstellingen van de samenwerkingsverbanden en de geldende regels inzake beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	7.500.000 EUR
Output	Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gesubsidieerd wordt. Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gebruikt maakt van het ondersteuningsaanbod.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Outcome	(1) Snellere detectie van psychosociale noden en toeleiding naar de gepaste hulp en (2) snellere detectie van onderbescherming, en realiseren van rechten
---------	---

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Subsidie is toegekend aan 60 samenwerkingsverbanden GBO voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteit “het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal”, en dit in verschillende fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase 0 (via projectsubsidies Vlaamse beleidsprioriteiten, en dus niet via relancemiddelen, vanaf begin 2020): 27 samenwerkingsverbanden GBO; - Fase 1 (projecten die bij de oorspronkelijke oproep een project indienden dat een score kreeg van minstens 60% maar niet geselecteerd werden voor een subsidie): 16 - Fase 2 (projecten die bij de oorspronkelijke oproep een project indienden dat een score kreeg van minder dan 60% en dus niet beantwoordden aan de subsidiecriteria): 11 - Fase 3 (projecten die bij de oorspronkelijke oproep geen project indienden): 6 <p>Via de relancemiddelen (fase 1, 2 en 3) worden bijgevolg 33 samenwerkingsverbanden GBO gesubsidieerd, en dit tot en met eind 2025.</p> <p>Daarnaast werd een subsidie toegekend aan SAM vzw en VVSG voor de ondersteuning van de samenwerkingsverbanden GBO en aan VGC voor het project “Geïntegreerd Breed Onthaal Brussel 2021-2025: Welzijn op school”.</p> <p>Het SWVG is op 1/07/2021 gestart met een onderzoek, opdat een juridisch conform regelgevend kader om gegevensverwerking binnen een GBO-context te organiseren kan gecreëerd worden. De uitvoeringstermijn voor dit onderzoek betreft 01/07/2021 tot en met 31/12/2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning van subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO begin 2020 en die als voldoende beoordeeld zijn door de jury	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning van subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een aanvullende aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO	2022 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning van subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een nieuwe aanvraag hebben ingediend in	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO begin 2020			
Opschaling en beschikbaar en bereikbaar maken van het ondersteuningsaanbod	2022 Q4	Gerealiseerd	
Regelgevend kader gegevensdeling naar en binnen samenwerkingsverbanden GBO	2022 Q4	Op schema	SWVG voert in dit kader een onderzoek uit opdat een juridisch conform regelgevend kader om gegevensverwerking binnen een GBO-context te organiseren kan gecreëerd worden. De uitvoeringstermijn voor dit onderzoek betreft 01/07/2021 tot en met 31/12/2022.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gesubsidieerd wordt met deze subsidie	34	2022 Q1	33	97 %
Aantal samenwerkingsverbanden dat gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod	60	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	5.072.000 EUR
Uitvoering VEK	1.474.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidiëring en ondersteuning van de lokale besturen in functie van het realiseren van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal in heel Vlaanderen en Brussel. 16/07/2021](#)

[Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidies in het kader van het geïntegreerd breed onthaal. 22/04/2022](#)

VV150 - WIJKVERBETERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Een wijkverbeteringscontract is een engagementsverklaring waarbij de Vlaamse overheid en het lokale bestuur (met lokale partners) de gemeenschappelijke uitdaging aangaan om problematieken in kwetsbare wijken aan te pakken en deze engagementen vervolgens om te zetten in concrete acties. Er wordt in 2021 een oproep gelanceerd die de lokale besturen uitnodigt tot het indienen van voorstellen.

Zowel de betrokken lokale besturen als de Vlaamse entiteiten en agentschappen engageren zich om de problematieken in deze wijken te doorbreken en de aanwezige kansen te benutten dankzij een gezamenlijke aanpak met vernieuwende instrumenten.

Met de subsidie kan het lokale bestuur zich laten ondersteunen met de inzet van expertise, personeel, werking en beperkte investeringen met het oog op concrete realisaties en dit binnen een termijn van maximaal 4 jaar na de start van het wijkverbeteringscontract.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - De engagementen zoals geformuleerd in de besluiten van de Vlaamse Regering worden geconcretiseerd aan de hand van een aantal maatregelen en dit op maat van de betrokken wijk. - De concrete maatregelen worden duidelijk afgebakend en maken deel uit van een geïntegreerde aanpak van de kwetsbare wijk. - Inzet van vernieuwende elementen binnen samenwerkingen, publieke dienstverlening, inzet van technologie, coproductie, ... - Voor elk wijkverbeteringscontract wordt een governance ontplooid die de uitvoering bewaakt en aanstuurt, met o.a. een klankbordgroep en een stuurgroep
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Gaandeweg de doorlooptijd van het wijkverbeteringscontract worden de noodzakelijke acties om de kwetsbaarheid van de betrokken wijken steeds duidelijker en concreter - De (eerste) acties leveren concrete en aantoonbare resultaten op zowel ten aanzien van de wijk als haar kwetsbare bewoners. - Nauwe opvolging van de projecten aan de hand van jaarlijkse voortgangsrapportages en een evaluatierapport op het einde van de rit

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De lokale stuurgroepen van de 11 wijkverbeteringscontracten zijn ondertussen samengesteld en aan de slag. Personeel voor de realisatie van het wijkverbeteringscontracten worden aangeworven.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	2021 Q1	Gerealiseerd	
Jury: selectie van een beperkt aantal wijkverbeteringscontracten	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring door de Vlaamse Regering van de geselecteerde wijkverbeteringscontracten	2021 Q4	Gerealiseerd	
Tweejaarlijks vooruitgangsrapport betreffende de uitvoering van de wijkverbeteringscontracten van de bevoegde minister aan de Vlaamse Regering		Nog niet gestart	
Jaarlijkse vooruitgangsrapport door de stuurgroep van elk wijkverbeteringscontract		Nog niet gestart	
Lancering van de oproep naar wijkverbeteringscontracten		Gerealiseerd	
Evaluatierapporten na het verstrijken van de wijkverbeteringscontracten		Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal subsidieaanvragen	20	2021 Q3	20	100 %
Start van de 11 wijkverbeteringscontracten	11	2022 Q1	11	100 %
Stuurgroepen van de wijkverbeteringscontracten	minstens halfjaarlijks	2022 Q2	11	100 %
jaarlijks voortgangsrapport van de stuurgroep	jaarlijks	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
-------------------------	---------------

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.999.000 EUR
Uitvoering VEK	1.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 26 februari 2021 - Goedkeuring kader oproep Goedkeuring Vlaamse Regering op 17/12/2021 subsidiëring projecten oproep wijkverbeteringscontracten

VV151 - WIJKVERBETERINGSCONTRACTEN - INTEGRALE KETENAANPAK WELZIJN-JUSTITIE-LOKALE BESTUREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Opgroeien, lokale besturen, lokale actoren breed: politie, justitie, jeugd(welzijns-)werk, buurtwerk, hulpverlening.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Buurtgerichte relanceprojecten op kruispunt lokale besturen – welzijn – justitie
Projectsubsidie

- Voorkomen dat jongeren, jongvolwassenen met een risicoprofiel verglijden naar of hervallen in een criminele levensstijl ('veelplegers') en ingesloten geraken in criminele netwerken.
- Bundelen van beschikbare capaciteit in een efficiënt, gestructureerd samenwerkingsverband om systematische, individuele exit-strategieën te bepalen.
- Onveiligheid, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in de buurt verminderen

We bundelen de krachten voor een integrale ketenaanpak. Het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht biedt bijkomende mogelijkheden om snel en constructief te reageren op jeugddelinquentie, ook op het niveau van het openbaar ministerie. In het Vlaams Regeerakkoord schuiven we de lokale, buurtgerichte aanpak justitie-politie-welzijn sterk naar voren voor een geïntegreerd beleid naar jongeren. In het kader van relance – plan Veerkracht en Herstel geven we lokale initiatieven een bijkomende impuls om te innoveren en goede praktijken van integrale ketenaanpak een doorstart te geven. Hieronder worden de contouren beschreven voor een oproep aan de lokale besturen en partners justitie-politie-welzijn.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.125.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - aantal opgestarte projecten in Vlaanderen; - bereik van doelgroep: aantal jongeren conform doelgroepomschrijving bereikt in de projecten; - aantal bereikte situaties jeugddelict binnen de verschillende projecten - output in termen van aantallen vast te leggen (Q 1 2022) - aantal lokale partners: met volledige dekking van de minimale partners; - outputindicatoren nader te definiëren in overleg met de projecten;
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - voortgang op basis van doelstellingen: de mate van opleiding/werk, woon- en leefsituatie, politiecontacten, overgang van min- meerderjarigheid; - outcome-indicatoren verfijnen met de 5 projecten (Q 1 2022);

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Sinds de agendering op de Vlaamse Regering zijn alle processtappen in de voortgang gerealiseerd. Met name de selectie van de projecten, de opstart van de lokale projecten en Vlaams overleg in functie van de voortgang werden gerealiseerd in 2021. De lokale projectopvolging loopt met betrokkenheid van de Vlaamse overheid (Opgroeien) voor opvolging. Momenteel worden de samenwerkingsprotocollen ondertekend en wordt de volgende Vlaamse Stuurgroep van 13 juni 2022 voorbereid.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Mededeling Vlaamse Regering integrale ketenaanpak jongeren op snijvlak welzijn-justitie en lokale besturen naar jongeren en jongvolwassen in samenwerking met Binnenlands Bestuur en Justitie en Handhaving	2021 Q1	Gerealiseerd	
Projectoproep lanceren	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opstart en subsidiebesluit van de 5 geselecteerde projecten: Antwerpen, Genk, Gent, Kortrijk, Mechelen	2021 Q3	Gerealiseerd	
Besluitvorming en selectie van vijf projecten	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart inhoudelijke afstemming van de 5 geselecteerde Vlaamse projecten	2021 Q4	Gerealiseerd	
Werkafspraken en kalender in functie van opvolging van projecten	2022 Q1	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal opgestarte projecten	5	2021 Q3	5	100 %
Aantal jongeren (doelgroep jongvolwassenen) bereikt in de 5 projecten		2022 Q1		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.125.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.125.000 EUR
Uitvoering VAK	1.125.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Uitvoering VEK	443.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 1.125.000 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 12 maart 2021](#)

VV152 - PROJECTOPROEP KWETSBARE KINDEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kinderen en jongeren, (boven)lokale jeugdwerkinitiatieven, (boven)lokale sport-, cultuur- en welzijnsinitiatieven, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” zet in op het versterken van het mentaal welbevinden en de sociale cohesie in de samenleving. Eén van projecten binnen het deelluik “Armoedebestrijding en wijkverbetering” richt zich tot kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.</p> <p>De doelstelling van deze projectoproep is de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te versterken door samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen ruimte en zuurstof biedt om binnen een gevarieerde, zinvolle, creatieve vrijetijdsbeleving jong te zijn. Dit perspectief draagt ertoe bij dat elke kind en elke jongere zijn of haar plaats vindt in de vrije tijd waardoor de sociale cohesie met hun leeftijdsgenoten, buurt en de maatschappij wordt aangehaald en/of versterkt.</p> <p>De focus ligt op het stimuleren van innovatieve vormen van laagdrempelig en vindplaatsgericht werken, waaronder vernieuwende technieken van fysiek en digitaal outreachend werken en out-of-the-box activiteiten, binnen (boven)lokale netwerken die kinderen en jongeren in kwetsbare situaties bereiken en aanspreken.</p> <p>Naast de resultaten van de projecten zelf worden de gehanteerde methodieken gemonitord en geanalyseerd, met het oog op een duurzame bredere aanpak, opschaling en bredere uitrol in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijken, randvoorwaarden oplossingsstrategieën en werkzame methodieken die innovatief, toeleidend en effectief werkzaam zijn, worden inhoudelijk en methodologisch in kaart gebracht en opgevolgd, zowel op niveau van de netwerken zelf als voor Vlaanderen en Brussel.</p> <p>De projectoproep biedt hefboomen aan lokale en bovenlokale netwerken om hun werking inhoudelijk te verdiepen, te innoveren of hun werkingen geografisch of functioneel te verbreden en/of uit te bouwen.</p> <p>De minister heeft beslist om naast de relancemiddelen (3 miljoen euro) ook 801.794 euro reguliere middelen (2021) vrij te maken om deze projectoproep te ondersteunen.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Output	Financiering van 29 projecten ter versterking van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
Outcome	Sterkere lokale en bovenlokale netwerken van organisaties en lokale besturen die de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties versterken door samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen ruimte en zuurstof biedt om binnen een gevarieerde, zinvolle, creatieve vrijetijdsbeleving jong te zijn

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Projecten zijn opgestart. Aanbesteding voor intervisietraject is gebeurd (opstart in 2021).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring projectoproep door Vlaamse Regering	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering van de projectoproep	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beoordeling projectvoorstellen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing goedkeuring projecten	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart projecten door lokale en bovenlokale netwerken	2021 Q4	Gerealiseerd	
Start intervisietraject	2021 Q4	Gerealiseerd	De onderzoeks- en begeleidingsopdracht werd toegekend aan het expertisecentrum "Inclusive Society" van het UCLL
Projecten uitgevoerd	2023 Q3	Op schema	
Einde intervisietraject	2023 Q4	Op schema	Begeleiding van de geselecteerde projecten en het in kaart brengen van de effecten van de projecten voor de kinderen en jongeren, de betrokken organisaties en het beleid (lokaal en Vlaams).

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde projecten per provincie en BHG in het kader van projectoproep kwetsbare kinderen	3	2021 Q4	4	133 %
Aantal gerealiseerde projecten in het kader van projectoproep kwetsbare kinderen	25	2021 Q4	29	116 %
Aantal gerealiseerde projecten	25	2022 Q2	29	116 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	2.001.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 26 februari 2021](#)

31. Investerings audiovisuele sector

VV153 - GARANTIEFONDS VOOR DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle - Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Een belangrijke voorwaarde voor de heropstart van de audiovisuele sector in Vlaanderen is dat er een oplossing komt voor het verzekeren van audiovisuele producties. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het voor producenten immers onmogelijk geworden om schade en annuleringskosten als gevolg van pandemieën te verzekeren. Het risico bestaat dat een productie moet worden stopgezet door besmetting van onvervangbare cast- of crewleden of door overheidsmaatregelen tijdens een besmettingsgolf. Dat kan leiden tot onvoorziene kosten, die nu door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Om onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen te dekken, wordt een garantiefonds gelanceerd voor Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties. Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 200 geregistreerde Vlaamse film- of televisieproducties bij het garantiefonds
Outcome	Het aantal Vlaamse film- en televisieproducties dat dankzij het garantiefonds kan opstarten doordat ze gedekt zijn tegen onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Het aantal producties dat schade ondervonden heeft als gevolg van de COVID-19-maatregelen en waarvoor schadeclaims zijn uitbetaald.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
---------------	--------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse Regering heeft op 5 februari 2021 haar goedkeuring gegeven aan de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds met betrekking tot het garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector. Sinds 9 februari kunnen producenten hun producties registreren bij het VAF, zodat ze in geval van schade door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Tot nu toe werd er met het garantiefonds één schadevergoeding effectief uitbetaald en werden er eind mei 2022 nog twee schadedossiers goedgekeurd, waarvan de schadevergoeding nog moet uitbetaald worden.</p> <p>Gezien de federale beslissing tot overstap naar epidemiologische code geel, werd in samenspraak tussen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging binnen PC227 en PC303.1 beslist om de Covid Sectorgids (PC227) en het Filmprotocol (303.1) vanaf 7 april 2022 op te heffen. Deze specifieke gidsen zijn dus niet langer van kracht. Recent werd ook de Generieke Gids afgeschaft. Bijgevolg is - onder de huidige epidemiologische omstandigheden - art. 7§2 van het Reglement van het Garantiefonds niet langer van kracht.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Oprichting garantiefonds via een overeenkomst met het Vlaams Audiovisueel Fonds	2021 Q1	Gerealiseerd	
Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties worden ondersteund door het garantiefonds bij onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen.	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal geregistreerde Vlaamse film- of televisieproducties bij het garantiefonds	200	2022 Q4	148	74 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	201.000 EUR
Uitvoering VEK	201.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: Overeenkomst garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector](#)

VV154 - IMPULS AAN VAF FILMFONDS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Vlaams Audiovisueel Fonds; audiovisuele sector

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Via een financiële impuls aan het VAF Filmfonds wordt de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse films en de vertoning ervan gestimuleerd om ze te versterken. Tijdens de COVID-19-crisis is immers gebleken dat er in de audiovisuele sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale filmproducties. Ook de bioscoopdistributie- en exploitatiesector ondergaan rechtstreeks de korte en lange termijngevolgen van de COVID-19-maatregelen. De extra middelen voor het VAF Filmfonds worden via een 40%-60% ratio verdeeld over respectievelijk 2021 en 2022.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 70 filmproducties en initiatieven binnen de publiekswerking worden door het VAF ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.
Outcome	Versterking van de Vlaamse audiovisuele sector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Regering heeft op 2/04/2021 haar goedkeuring gegeven aan het addendum bij de beheersovereenkomst 2018-2021 van het VAF - Filmfonds. Een nieuwe beheersovereenkomst m.b.t. het VAF/Filmfonds voor de periode 2022-2025 werd op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hierin werden specifieke bepalingen opgenomen betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Addendum aan de beheersovereenkomst 2018-2021 voor de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2021 i.h.k.v. de relance aan het VAF/Filmfonds.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opname van bepaling betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance aan het VAF/Filmfonds in de nieuwe beheersovereenkomst 2022-2025.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Alle relancemiddelen worden via het VAF/Filmfonds toegekend aan filmproducties en initiatieven binnen de publiekswerking.	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal filmproducties en -organisaties die door het VAF worden ondersteund met de bijkomende relancemiddelen	70	2022 Q4	60	86 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	4.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 2 april 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: Addendum beheersovereenkomsten 2018-2021 met het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw; Beslissing van de Vlaamse Regering van 17 december 2021: Goedkeuring beheersovereenkomst 2022-2025 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds m.b.t. het VAF/Filmfonds](#)

VV155 - IMPULS AAN VAF MEDIAFONDS EN GAMEFONDS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Audiovisueel Fonds en de Vlaamse audiovisuele en gamesector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Via een financiële impuls aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds wordt de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse televisiereeksen en games gestimuleerd om ze te versterken. Tijdens de COVID-19 crisis is immers gebleken dat er in de sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale audiovisuele producties en games.</p> <p>De extra middelen voor het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds zullen via een 40/60 ratio verdeeld worden over respectievelijk 2021 en 2022, om zo met een groter budget te kunnen aansluiten bij de nieuwe beheersovereenkomsten 2022-2025.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 20 audiovisuele producties (televisiereeksen en games) worden door het VAF ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.
Outcome	Versterking van de Vlaamse audiovisuele en gamesector.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Regering heeft op 2/04/2021 haar goedkeuring gegeven aan het addendum bij de beheersovereenkomst 2018-2021 van het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds. Nieuwe beheersovereenkomsten m.b.t. het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor de periode 2022-2025 werden op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hierin werden specifieke bepalingen opgenomen betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	Op 28 april 2022 heeft de Europese Commissie haar formele goedkeuring gegeven (inzake staatssteun) aan de nieuwe beheersovereenkomst van het VAF/Gamefonds.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Addendum aan de beheersovereenkomst VAF 2018-2021 voor de toekenning van de bijkomende financiering vanuit relance aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor het werkjaar 2021.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Bepaling in de nieuwe beheersovereenkomst VAF 2022-2025 voor de toekenning van de bijkomende financiering vanuit relance aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor het werkjaar 2022.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Alle relancemiddelen werden via het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds toegekend aan audiovisuele producties (televisiereeksen en games).	2022 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal audiovisuele producties (televisiereeksen en games) die door het VAF worden ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.	25	2022 Q4	18	72 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	4.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 2 april 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: Addendum beheersovereenkomsten 2018-2021 met het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw](#)

32. Jeugdinfrastructuur

VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Het Vlaams Jeugdwerk en bij uitbreiding Vlaamse jongeren

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	32. Jeugdinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

Specifiek voor de investeringen in jeugdinfrastructuur werd in het plan Vlaamse Veerkracht een totaalbudget van 30 miljoen euro voorzien voor volgende projecten:

A. Investeren in de eigen infrastructuur Hoge Rielen en Destelheide:

In de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gerealiseerd waarmee De Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen, de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen ADJ vzw als bouwheer, Het Facilitair Bedrijf als mandataris en het Departement Cultuur, Jeugd en Media als eigenaar van de infrastructuur en als vertegenwoordiger van de subsidiërende overheid. Het projectbudget wordt geraamd op 8.538.866,10 euro incl BTW.

Met de relancemiddelen kan ook de effectieve realisatie van het Masterplan voor Destelheide, opgesteld in 2014, versneld verder uitgevoerd worden. Voor het nieuwe paviljoen en de vernieuwing van de slaapblokken in Destelheide kan er 6,8 miljoen euro incl. BTW vastgelegd worden in 2021 en 2022. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media treedt op als bouwheer.

B. Optimalisatie aanbod ULDK

Door relancemiddelen toe te voegen aan het recurrente budget kan de stock aan seniortenten verhoogd worden met ca. 155 en de stock aan patrouilletenten vernieuwd en verhoogd worden met ca. 240. Dit laatste is een absolute noodzaak want de meest recente aankoop van binnententen dateert van 2012. Bijkomend kunnen ca. 150 extra buitenzeilen voor patrouilletenten worden aangekocht. Door de verhoging van de stock dient de inrichting van het magazijn te worden geoptimaliseerd. Een klein deel van de middelen wordt daaraan besteed. In 2021 kan er voor de aankoop van tenten en de optimalisatie van het magazijn bijkomend 1.050.000 euro incl. BTW worden vastgelegd.

C. Project gratis energiescans en quick wins voor jeugdwerkinfrastructuur

In samenwerking met Pulse Transitienetwerk Cultuur, Jeugd, Media en het Vlaams Energiebedrijf worden gratis energiescans aangeboden voor organisaties met rechtspersoon zonder commercieel oogmerk, die

PROJECTOMSCHRIJVING

beschikken over eigen jeuginfrastructuur of er een langdurig gebruiksrecht op hebben. Het proefproject in 2020 leverde 26 scans op met hoopvolle resultaten richting maatregelen die bij het begeleidingstraject door VEB worden aangereikt. De geraamde kosten voor de verderzetting van dit project in 2021 en 2022 door Pulse bedragen 445.000 euro (+/- 100 scans en begeleiding), waarvan 312.000 euro relancemiddelen. Voor structurelere maatregelen kunnen de organisaties met bovenlokale jeuginfrastructuur een aanvraag indienen voor de investeringssubsidies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, indien het project voldoet aan de formele en specifieke voorwaarden. Organisaties met infrastructuur die niet in aanmerking komen voor een Energiescan, zullen ondersteund worden voor het nemen van maatregelen met een hoge impact op korte termijn (quick wins). Deze organisaties kunnen subsidie ontvangen tot 80% van de totale geraamde kostprijs van de quick wins (minimaal 20% eigen inbreng). Voor de quick win-maatregelen is een budget van in totaal 1 miljoen euro voorzien, gespreid over 2021 en 2022.

D. Investeren in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeuginfrastructuur

Deze oproep wil de mogelijkheden van ontmoeting in de georganiseerde vrije tijd en daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte versterken en verbreden. Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning worden ondersteund en gestimuleerd tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving. Er wordt ingezet op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting via drie focusgebieden: "kwaliteitsvolle en duurzame basisvoorziening", "veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren" en "jeugd vriendelijke vormgeving van buurten en speelgebieden". In 2021 en 2022 vindt telkens één oproep plaats met een totaal voorzien subsidiebudget van 7,7 miljoen euro.

E. Bijkomende middelen sectorale investeringssubsidies jeuginfrastructuur

In de periode 2021-2022 zal via het relancebudget het budget van de sectorale investeringssubsidies voor jeuginfrastructuur met 1,7 miljoen euro verhoogd worden. In 2021 kunnen organisaties die beschikken over jeuginfrastructuur tot 60% investeringssubsidie ontvangen voor maatregelen ten behoeve van het energiezuiniger of toegankelijker maken van de gebouwen en sites. Vanaf 2022 volgt een nieuwe subsidieregeling na de voorziene periodieke herwerking van het huidige Besluit Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor bovenlokaal belang (2012, gewijzigd in 2017). Organisaties met jeuginfrastructuur zullen opnieuw een aanvraag kunnen indienen voor specifieke investeringslijnen inzake de verbetering van de infrastructuur, volgens de prioriteiten die in het BVR worden vastgelegd.

F. Bijkomende middelen investeringssubsidies grote jeuginfrastructuur

Voor de ronde grote jeuginfrastructuur 2021 werd 2.310.759,06 euro vastgelegd ten behoeve van het infrastructuurproject voor de reconversie van domein Bautershof.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none">- vernieuwing en verdere ontwikkeling van de jeugdsites in beheer van de Vlaamse overheid: Destelheide en Hoge Rielen- uitbreiding en optimalisering van het aanbod tenten door de ULDK- verlenen van 100 gratis Energiescans en 1 miljoen euro quick win maatregelen voor jeuginfrastructuur in Vlaanderen en Brussel- verlenen van 7,7 miljoen euro investeringssubsidies voor basisinfrastructuur en inrichting van jeugdwerkinfrastructuur- verlenen van 4 miljoen euro extra investeringssubsidies voor de sectorale prioriteiten voor jeuginfrastructuur in 2021 en 2022
Outcome	Performantere, veiligere en milieuvriendelijkere jeuginfrastructuur in Vlaanderen en Brussel.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Begin april 2022 voltooide het architectenbureau de voorontwerpfase van de studieopdracht voor het bouwproject van de Hoge Rielen. Uit de bijgevoegde raming blijkt een zeer grote overschrijding van de initieel geraamde uitvoeringskost die onderwerp vormt van de investeringssubsidie. In de fase van het definitief ontwerp worden verschillende voorstellen uitgewerkt om dit probleem op te lossen.</p> <p>Voor het infrastructuurproject Destelheide is de bouwvergunning voor het nieuwe paviljoen afgeleverd en is de offerte gegund aan de aannemer. De werken zullen midden 2022 opstarten. De studie voor de renovatie van de bestaande slaapblokken loopt volgens planning. Budgettaire bijsturing is noodzakelijk gezien de hoge materiaalprijzen.</p> <p>Eind maart kende de minister van Jeugd de eerste 25 investeringssubsidies toe voor projectvoorstellen van de oproep Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur. Ongeveer de helft van het beschikbare budget werd hiermee verleend, de volgende indientermijn loopt tot en met 15 juni. Eind september neemt de minister een beslissing over het resterende subsidiebudget.</p> <p>Het reglement voor de oproep voor het verlenen van gratis Energiescans en het toekennen van gratis energiecoaching en middelen voor het nemen van quick-winmaatregelen om de gebouwen waar jeugdwerk plaatsvindt energiezuiniger te maken, werd goedgekeurd door de minister. Beide instrumenten zullen vervat zitten in één oproep waarvoor jeugdorganisaties zich doorlopend kunnen inschrijven in 2022. De samenwerkingsovereenkomst met VEB, voor de uitvoering van de scans; en de projectsubsidie aan Pulse Transitienetwerk, voor de intake van de jeugdwerkorganisaties; zijn geformaliseerd.</p> <p>In 2021 werd bijkomend budget toegekend voor de sectorale subsidielijnen voor bovenlokale jeugdinfrastructuur, om deze toegankelijker en energiezuiniger te maken. De minister kende op 3 december een investeringssubsidie toe aan 23 infrastructuurprojecten voor bovenlokale jeugdinfrastructuur voor een totaalbedrag van 1,6 mio euro. De Vlaamse Regering kende met het relancebudget voor jeugdinfrastructuur ook een investeringssubsidie Grote Jeugdinfrastructuur toe, voor de reconversie van Domein Boutershof te Sint-Truiden.</p> <p>De aanvraagronde voor sectorale investeringen in 2022 werd opgestart op 1 juni, na goedkeuring van het nieuwe subsidiereglement door de Vlaamse Regering (dd. 29/04/2022).</p> <p>Voor uitbreiding van stock patrouille- en seniortenten in het kader van de optimalisatie van het aanbod van de ULDK wordt de levering van de tenten verwacht in juni 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie Hoge Rielen ADJ vzw. Voor de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gestart	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
waarmee de Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen en de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een investeringssubsidie toegekend aan de Hoge Rielen ten bedrage van 8.538.866,10 euro.			
Opstart aanbesteding infrastructuurproject Hoge Rielen	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning studieopdracht infrastructuurproject Hoge Rielen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opstart studie door studiebureau voor infrastructuurproject Hoge Rielen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering studieopdracht infrastructuurproject Hoge Rielen	2022 Q4	Op schema	
Opstart bouwwerken door aannemer voor infrastructuurproject Hoge Rielen	2023 Q1	Nog niet gestart	
Oplevering bouwwerken infrastructuurproject Hoge Rielen	2024 Q4	Nog niet gestart	
Aanstelling studiebureau Destelheide	2021 Q4	Op schema	
Vastlegging investering Destelheide.	2022 Q4	Op schema	
Opstart uitvoering infrastructuurproject Destelheide	2023 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering van het project Destelheide (concrete planning onder voorbehoud).		Nog niet gestart	
Aankoop tenten en wijzigingen magazijn ULDK.	2022 Q2	Op schema	
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst dep. CJM en VEB inzake Energiescans jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring reglement kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur, eerste subsidieoproep 2021-2022.	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur, tweede subsidieoproep 2021-2022.	2022 Q4	Op schema	
Realisatie infrastructuurprojecten kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur. Concrete timing o.b.v. ingediende projecten.		Nog niet gestart	
Goedkeuring subsidiereglement quick win-investeringen en energiescans jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning van Energiescans en quick-win maatregelen.	2022 Q4	Op schema	
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2022.	2022 Q4	Op schema	
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2021.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2022.	2022 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aankoop van senior- en patrouilletenten voor de uitbreiding van de stock in ULDK	300	2022 Q3	386	129 %
Realisatie toekennen 100 gratis Energiescans voor jeugdinfrastructuur	100	2022 Q4		
Aantal goedgekeurde dossiers kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur	50	2022 Q4	25	50 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	12.631.000 EUR
Uitvoering VEK	241.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 30.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: 30 miljoen euro voor Jeugdinfrastructuur](#)

33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Brusselfonds
Belanghebbenden	Het Nederlandstalige netwerk in Brussel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

In 2021 en 2022 wordt er geïnvesteerd in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt.

De middelen worden ingezet voor infrastructuurinvesteringen aan Vlaamse organisaties en verenigingen in Brussel om hun huisvesting te verbeteren, hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren en verenigingen met een Nederlandstalige dienstverlening die zich inspant voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen.

De bestedingsstrategie voor de relancemiddelen via het Vlaams Brusselfonds omvat twee grote pijlers:

1. Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur:

Vooreerst in de gebouwencomplexen in eigendom van de Vlaamse overheid en die door het Vlaams Brusselfonds wordt beheerd, met name in het gebouwencomplex van het extern verzelfstandigd Agentschap Muntpunt vzw en het Huis van het Nederlands Brussel vzw.

a. Voor Muntpunt gaat het om de vernieuwing van het ICT-omgeving voor de stadsstudiezaal ("zichtbare" hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende "onzichtbare" serveromgeving), de uitbouw van een multimediale leer- en maakplek met aandacht voor kansengroepen: jongeren en (jonge) starters en volwassenen met beperkte digitale skills. en waarbij Muntpunt prioritair inzet op het verbinden van particulieren, scholen, middenveldorganisaties, etc. in het Nederlandstalige netwerk. Tenslotte wordt ook het vernieuwen en optimaliseren van Audio, Video en Livestream in het ganse gebouw vooropgesteld dat Muntpunt ook kan inzetten voor de ontsluiting en promotie van het Vlaams gemeenschapsaanbod.

b. Voor het Huis van het Nederlands Brussel wil men de dienstverlening naar de klanten en gebruikers optimaliseren door de aanschaf van onder meer een digitaal klantenbegeleidingssysteem, de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs en het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audio-technologie)

2. Hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op

a. investeringen en verbouwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de

PROJECTOMSCHRIJVING

Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De geïdentificeerde prioritaire dossiers betreffen het gemeentelijk DKO Sint-Agatha-Berchem, gemeentelijk DKO Sint-Pieters-Woluwe, GO!-DKO F. Chopin en RHoK Etterbeek, gemeentelijk DKO Jette en GO!-DKO Fiocco Schaarbeek. Deze vijf bouw dossiers van de zes academies vertegenwoordigen een geraamd bouwbudget van zo'n 10 miljoen euro

Om een geïntegreerde en efficiënte opvolging tijdens het bouwproces te realiseren zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie de investeringssubsidies toekennen en instaan voor de concrete dossieropvolging. Zij biedt ondersteuning aan de schoolbesturen zonder evenwel zelf de rol van bouwheer op te nemen. In een eerste stap maakt het schoolbestuur (gemeente St-Agatha-Berchem, Sint-Pieters-Woluwe, Jette en het gemeenschapsonderwijs) haar ambitie en engagement aantoonbaar via een principiële akkoord van de gemeenteraad, respectievelijk de Raad van het GO!. Van het schoolbestuur wordt verwacht dat zij het bouwprogramma voor de academie opstelt, het bouwheerschap opneemt én een eigen financiële bijdrage levert.

Volgend op de vraag en het engagement van het schoolbestuur kent de Vlaamse Gemeenschapscommissie een principeakkoord toe. Dat akkoord wordt omgezet in een effectieve subsidie op basis van het gunningsdossier. Om een geïntegreerde en efficiënte opvolging tijdens het bouwproces te realiseren zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie de investeringssubsidies toekennen en instaan voor en bouw dossier. De Vlaamse Overheid-coördinatie Brussel kent de Vlaamse Gemeenschapscommissie een investeringsenveloppe DKO toe zoals omschreven in de nota aan de Vlaamse regering: Plan Vlaamse Veerkracht (project nr. 157) – Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel van 21 mei 2021 (DOC.0059/1TER).

b. een oproep voor projecten 'Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek die aanzetten tot intersectorale samenwerking. en die inzet op matchmaking tussen actoren, initiatieven en de infrastructuur van ons Nederlandstalig netwerk.

c. individuele investeringsaanvragen (welzijn, zorg, jeugd, cultuur en sport..) die voldoen aan het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds Het doel van de infrastructuurinvesteringen is om organisaties de nodige faciliteiten te geven om hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren die zich inspannen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspant. Het richtlijnenkader omvat volgende beleidsdoelstellingen:

- I. de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes;
- II. de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van) de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte;
- III. de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke invulling ervan;
- IV. de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen;
- V. de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve (piloot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen;
- VI. de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop van duurzaam meubilair of materiaal;
- VII. de aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te bouwen of aan te kopen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	Digitalisering: - 2 projecten digitalisering van de werking en infrastructuur in eigendom van de Vlaamse gemeenschap en voor de structurele partners van het Brusselbeleid voor 578.496 euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>Hefboomdossiers Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15-tal investeringsprojecten op basis van het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds voor 4.010.504 euro. De output is afhankelijk van het aantal projectaanvragen. - 5 projecten infrastructuur Deeltijds Kunstonderwijs Brussel voor 3.000.000 euro. - 12 projecten in het kader van de oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" + begeleidingskosten door bureau en experts en vervolgtraject 2.411.000 euro
Outcome	<p>Het realiseren van adequate, duurzame infrastructuur en inrichting van gebouwen zodat de Vlaamse actoren in Brussel een kwalitatieve dienstverlening kunnen garanderen, hun werking kunnen uitbreiden, meer toegankelijk maken of duurzaam optimaliseren.</p> <p>De oproep 'gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel' moet de samenwerking, de verbinding en de uitbouw van het Nederlandstalige gemeenschapsnetwerk in Brussel stimuleren en versterken. Door uitwisseling kunnen organisaties elkaars inhoudelijke werking bevruchten en kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven groeien. Het vervlechten van het weefsel van organisaties kan hun veerkracht versterken.</p> <p>De doelstelling is driedelig: stimuleren van (inter)sectorale samenwerking, faciliteren van meervoudig ruimtegebruik en bijdragen aan een toekomstgerichte aanpak.</p> <p>De focus ligt op (inter)sectorale samenwerking over gemeenschapsbevoegdheden heen of op het snijpunt ervan. Om dat te bereiken, brengen we de infrastructurele noden en opportuniteiten van het Nederlandstalige netwerk in Brussel in kaart en stemmen ze op elkaar af. Organisaties herdenken hun infrastructuur om ze te optimaliseren, te delen en op een duurzamere en toekomstgerichte manier vorm te geven.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De voortgang van de verschillende pijlers in het kader van de relancemiddelen gemeenschapsinfrastructuur in Brussel verloopt grotendeels op schema. Het digitaliseringsproject van de infrastructuur en dienstverlening van Muntpunt is uitgevoerd en operationeel. De digitalisering van de dienstverlening in het Huis van het Nederlands Brussel heeft vertraging opgelopen en zal uitgevoerd zijn in 2022 Q3.</p> <p>Er zijn 9 goedgekeurde hefboomdossiers op basis van het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds. De nieuwe en lopende subsidieaanvragen worden verder behandeld tot 2022 Q4: Indiening, administratief behandeling en toekenning (controleren op volledigheid, gevolgd door adviesformulering, aanvraag advies IF (vanaf 250.000 euro ook aanvraag begrotingsakkoord en goedkeuring van dossier via Besluit Vlaamse Regering).</p> <p>Er waren 18 subsidieaanvragen voor investeringsprojecten in het kader van de oproep "Broedplekken". De selectie en toekenning van investeringssubsidies aan 12 projecten is in behandeling.</p> <p>De uitvoering van 5 projecten Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel verloopt in verschillende tempo's. De Vlaamse Gemeenschap voorziet een budget van 3 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschapscommissie voorziet in haar investeringsplan 2021-2025 een investeringsbudget van 5.150.000 euro voor de infrastructuur DKO.</p> <p>Er zijn 5 principeakkoorden van de inrichtende machten, en de VGC. Vier projecten zitten nog in de studie/ontwerpfase. Bij 1 project zijn de infrastructuurwerken in uitvoering.</p> <p>De realisatie van alle vermelde pijlers draagt bij tot het uitbouwen van een kwalitatief en</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen in Brussel en/of een versterking van een (inter)sectorale werking en dienstverlening.
Noodzakelijke politieke actie	nee

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekennen van subsidies ten belope van 4.010.504 euro aan hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op 15tal individuele aanvragen i.k.v. het richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds is gerealiseerd	2022 Q4	Op schema	In 2021 zijn er 7 investeringsprojecten (Studio Globo vzw, Passelrelle vzw, Chez Nous/Bij Ons vzw, Vives LDC, De Schakel vzw , Art To Work vzw en Atelier Groot eiland vzw) goedgekeurd, waarvan 2 aankoopdossiers en 5 verbouwings- of herinrichtingsdossiers in uitvoering zijn. In 2022 zijn er 2 investeringsprojecten (Kenniscentrum WZZ, Habbekrats vzw) goedgekeurd.
Projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" gunning van de opdracht aan begeleidingsbureau en lancering van de oproep	2021 Q3	Gerealiseerd	'Architecture Workroom Brussels', een culturele denk-en-doe-tank voor innovatie binnen de architectuur werd aangesteld voor de begeleiding van de geselecteerde organisaties bij het opstellen van een subsidiedossier voor de verbouwing, inrichting of aankoop van materiaal. de oproep werd gelanceerd op 3 september 2021
projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek indiening kandidaatstellingen van organisaties als aanbieder van infra of als zoeker, koppeling van samenwerkende kandidaten-organisaties starttraject geselecteerde kandidaten met experts	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 18 oktober 2021 stelden 73 organisaties zich kandidaat . Uit de inzendingen bleven er 67 kandidaten over. Via een matchmaking event werden organisaties aan elkaar gekoppeld en ging het traject van start.
Aantal ingediende subsidieaanvragen voor de oproep Broedplekken	2022 Q2	Op schema	Op 30 april 2022 werden er 18 subsidieaanvragen voor investeringsprojecten ingediend.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectoproep 'gemeenschapsinfrastructuur als broedplek' - aantal projecten toegekende investeringssubsidies, inclusief administratieve afhandeling	2022 Q3	Op schema	Er werden 12 projecten goedgekeurd, de toekenning van de investeringssubsidies, inclusief administratieve afhandeling is lopende.
projectoproep "Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" - opstart van de uitvoering van de investeringswerken	2022 Q4	Nog niet gestart	
Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur in de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel is gerealiseerd	2021 Q4	Vertraging	De digitalisering in het Huis van het Nederlands Brussel zal pas volledig gerealiseerd zijn 2022 Q3
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie- opstart uitvoering infrastructuurplan DKO	2021 Q2	Gerealiseerd	VGC heeft 4 collegebesluiten voorgelegd houdende de principe akkoorden van 4 infrastructuurdossiers voor de projecten van respectievelijk de kunstacademies van St-Agatha Berchem, St-Pieters-Woluwe, Schaarbeek Fiocco en Go muziekschool Etterbeek
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie- voorbereiding en opstart van de infrastructuurwerken.	2022 Q4	Op schema	<p>1. Voor DKO Sint-Agatha-Berchem kende de VGC een investeringssubsidie goed. De bouwvergunningsprocedure loopt</p> <p>2. DKO Sint-Pieters-Woluwe: april 2022: beslissing van het college Sint-Pieters-Woluwe tot aanstelling van een ontwerpteam;</p> <p>3. DKO GO! Muziekacademie 'Chopin' en GO! Academie Beeldende kunsten RHoK in Etterbeek Raad van GO! heeft een portfoliobudget 4.100.000 euro excl. bodemsanering. Het dossier wordt herberekend ifv de stijgende bouwkosten;</p> <p>4. DKO Gemeentelijke Academie Muziek-Woord-Dans in Jette Dec 2021: oplevering onderzoek volumestudie + raming</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			<p>bouwbudget; mei 2022 collegebeslissing van de VGC - principeakkoord. Bestek aanstelling ontwerpteam in voorbereiding door gemeente Jette</p> <p>5. DKO GO! Muziekacademie 'Fiocco' in Schaarbeek april 2022: start van de restauratie van de gevelwerken</p>
projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur broedplekken" realisatie van de 12 goedgekeurde projecten	2023 Q4	Nog niet gestart	
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie - financiële en functionele verantwoording van de gerealiseerde projecten van het infrastructuurplan DKO	2026 Q3	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur in de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel	2	2021 Q4	1	50 %
Bereikte organisaties via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek"	50	2021 Q4	67	100 %
aantal ingediende projecten via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek"	20	2022 Q2	18	90 %
aantal weerhouden projecten via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek"	18	2022 Q3	12	66 %
aantal gesubsidieerde, individuele hefboomdossiers	15	2022 Q4	9	60 %
Uitvoeren gesubsidieerde infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel	5	2024 Q4		
aantal gerealiseerde individuele hefboomdossiers	15	2024 Q4	2	13 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.438.000 EUR
Uitvoering VEK	3.987.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Beslissing Vlareg investeringssubsidie aan Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg vzw
Beslissing Vlareg investeringen in het Deeltijds Kunstonderwijs Brussel
Beslissing Vlareg investeringssubsidie aan Cosmos vzw
Beslissing Vlareg subsidie voor digitalisering Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel
Beslissing Vlareg algemeen bestedingskader gemeenschapsinfrastructuur Brusselen oproep broedplekken

34. Spending reviews

VV158 - SPENDING REVIEWS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	34. Spending reviews
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse brede heroverweging betreft een doorlichting in het voorjaar 2021 van de 10 beleidsdomeinen alsook van de sociale toeslagen en kortingen.

De bedoeling van de doorlichting is:

- 1) om aan de hand van een aantal voor de beleidsdomeinen gemeenschappelijke onderzoeksvragen (doelmatigheid huidige regelgeving, is bevoegdheidsverdeling tussen de diverse overheden en versus de (social) profit sector voor verbetering vatbaar, wat zijn de mogelijke besparingsvarianten) tot onderbouwde aanbevelingen te komen in het kader van evidence based policy,
- 2) tot een structurele verankering van beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen in het beleids- en begrotingsproces te komen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	Concrete uitgaventoetsingen per beleidsdomein en verankering van het proces van uitgaventoetsingen in het budgettair proces, met het oog op gezondere overheidsfinanciën en het afremmen van de toename van de overheidsschuld.
Outcome	De uitgaventoetsingen zijn bedoeld om de kwaliteit en samenstelling van de overheidsfinanciën in het land te verbeteren. Door een beter inzicht te verschaffen in hoe overheidsmiddelen worden en zouden moeten worden besteed, helpen uitgaventoetsingen regeringen om een aantal problemen aan te pakken. Ze kunnen de samenstelling van de overheidsuitgaven verbeteren, door de efficiëntie en effectiviteit van de uitgaven te beoordelen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen om de uitgaven te richten op groeivriendelijke items of items die duurzaamheid op lange termijn bevorderen, ook voor het milieu.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

In uitvoering na agendering VR

Beschrijving voortgang

Begin 2021 jaar startte de administratie van de Vlaamse overheid met de Vlaamse Brede Heroverweging als opvolger van het pilootproject spending reviews rond dienstencheques. De Vlaamse Brede Heroverweging beoogde een grondige doorlichting van alle uitgavenposten en waar relevant kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse begroting. Dat heeft tot doel om de kwaliteit van de openbare financiën te verbeteren op het vlak van (beheers)efficiëntie en (beleids)effectiviteit. De eindresultaten zijn hier beschikbaar, zowel op algemeen vlak als op het niveau van de beleidsdomeinen. De beleidsaanbevelingen uit die rapporten vonden reeds hun weg in de begroting 2022 en zullen ook impact hebben op de begrotingsopmaak van 2023 en 2024.

Op basis van de resultaten van de Vlaamse Brede Heroverweging worden nu per beleidsdomein ook specifieke uitgaventoetsingen opgestart, de mededeling daarover werd op 19 november goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Specifiek worden voor volgende onderwerpen, uitgaventoetsingen uitgeschreven:

- De bovenbouw boven de subsidies van departement CJM
- Het hoger onderwijs
- Duurzaam watergebruik en de organisatie van het waterlandschap
- Instrumenten van het woonbeleid
- Organisatiestructuur van de Vlaamse overheid
- Modal shift in Vlaanderen
- Het Vlaams beleid i.k.v. productiviteit
- Integreren van de drie zorgbudgetten

Elk thema wordt uitgewerkt in een bestek (plan van aanpak) voor de uitvoering van de uitgaventoetsing. Hierin wordt het benodigde budget geraamd, de budgettaire scope van het onderzoek, een exactere omschrijving invulling gegeven aan het thema, de timing, wie er betrokken wordt in het proces naast de inspectie van Financiën en het departement Financiën en Begroting, etc. De onderzoeksvragen van de VBH kunnen grotendeels worden hergebruikt in deze uitgaventoetsingen. Evenwel is het uitgangspunt van de uitgaventoetsing niet het vinden van besparingen. Zodra een thema is uitgewerkt wordt het bestek (plan van aanpak) op de Vlaamse Regering besproken. Na de lancering van de bestekken wordt de uitgaventoetsing door de betrokken administraties uitgevoerd.

Daarnaast kunnen beleidsdomeinen nog bijkomende onderwerpen voorstellen voor gelijkaardige uitgaventoetsinge/beleidsonderzoeken die eveneens worden besproken in de Vlaamse Regering. Om te kunnen genieten van de relancemiddelen moet er steeds een bestek in de markt worden geplaatst waarbij externen worden betrokken bij de uitgaventoetsing / het beleidsonderzoek.

Uiteraard zullen, van zodra de werkgroep leesbare begroting een kader of aanbevelingen heeft uitgewerkt, de nog goed te keuren plannen van aanpak zich hieraan conformeren.

Alle analyses worden opgestart tegen het einde van 2022. Doel van de uitgaventoetsingen is om het resultaat ten laatste te kunnen meenemen bij de volgende regeringsvorming. Het resultaat van de uitgaventoetsing dient dus ten laatste beschikbaar te zijn voor de onderhandelende partijen. Om de 6 maanden bij de rapportering over de RRF wordt de voortgang van de opgestarte uitgaventoetsingen toegelicht.

Op 20 mei 2022 wijzigde de Vlaamse Regering na advies van de Raad van State definitief de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO). Artikel 9 verankert daarbij het gebruik van brede heroverwegingen en uitgaventoetsingen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gunning raamovereenkomst Vlaamse brede heroverweging	2021 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering eindrapporten van de Vlaamse brede heroverweging	2021 Q3	Gerealiseerd	
Integratie van de uitgaventoetsingen in het begrotingsproces: Regeringsbesluiten die bepalen hoe uitgavenherzieningen (of een soortgelijke aanpak) in het begrotingsproces worden geïntegreerd.	2021 Q4	Gerealiseerd	Q3 2022: goedkeuring van aangepast decreet VCO waarin uitgaventoetsingen nu expliciet zijn voorzien bij een begrotingsopmaak ; ontwerp van decreet aangepast VCO is goedgekeurd door VR op 20 mei 2022
Input spending reviews bij begrotingsopmaak	2024 Q3	Op schema	Bij BO2022 is ook al gebruik gemaakt van resultaten VBH
Integratie van de uitgaventoetsingen in het begrotingsproces: Systematische opname van de resultaten van de uitgaventoetsingen in de jaarlijkse en meerjarige begrotingsplanning vanaf de opstelling van de begrotingswet voor 2024.	2023 Q3	Op schema	opgenomen in de update van de VCO: gebruik van prestatieinformatie bij BO: ontwerp van decreet goedgekeurd op de VR van 20 mei 2022 ; goedkeuring decreet in VP verwacht voor zomerreces
Analyse achteraf van de uitgaventoetsingen: Publicatie van beoordelingsverslag.	2024 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.001.000 EUR
Uitvoering VEK	1.718.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 8.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling aan de Vlaamse Regering van 4 december 2020. Vlaamse Brede Heroverweging](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Vlaamse Brede Heroverweging](#)

35. Extra relanceprojecten

VV159 - SNELLERE VERGUNNINGS- EN BEROEPSPROCEDURES

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING

Project “sneller en beter” met 5 werven:

1. Snelle en correcte rechtsbescherming: snellere beroepsprocedures en wegwerken achterstand. Door dit initiatief zal de gemiddelde doorlooptijd van behandeling verkorten met 6 tot 9 maanden.

2. Optimaliseren van de Omgevingsvergunning: het omgevingsvergunningsdecreet wordt geëvalueerd. De belangrijkste opzet is om na te gaan of de doelstellingen van de Unieke Omgevingsvergunning – sneller en beter – gehaald werden en of de beslissingen op het juiste bestuursniveau genomen worden. Dit evaluatietraject zal leiden tot verbeteringen aan de regelgeving.

Daarnaast worden technische verbeterpunten verder onderzocht die de behandeling van vergunningsaanvragen meer oplossingsgericht en vlotter moeten maken. De VIP-cel bij het Departement Omgeving wordt versterkt, zodat aan een groter aantal projecten een begeleiding op maat kan geboden worden. Ook het decreet Complexe Projecten wordt aan een eerste evaluatie en optimalisatie onderworpen.

3. Omgevingsbesluit: afstappen van een afwijkingsregelgeving maar werken op maat. Een groot deel van onze regelgeving richt zich op uitzondering- en afwijkingsbepalingen. Dit vormt echter vaak de grond voor juridische geschillen en aanvechtingen in beroep. Het omgevingsbesluit moet bijdragen tot het op een adequate manier en op maat laten activeren van de juiste maatregelen en instrumenten nodig op een bepaald moment in het proces. Er wordt onderzocht op welke manier het Omgevingsbesluit kan geïntroduceerd worden.

4. Hervorming milieueffectenrapportage tot een slank en efficiënt instrument dat de besluitvorming beter en krachtiger maakt en onze leefomgeving voldoende beschermt. De MEB (Milieueffectenbeoordeling) moet de besluitvorming en het primaat van de politiek zo gericht en efficiënt mogelijk ondersteunen.

5. Digitale werf: Het omgevingsloket wordt uitgebreid met een publiek loket zodat ook publieke raadplegingen en openbare onderzoeken maximaal digitaal kunnen verlopen. (zie VV 063) Het loket van DBRC wordt gedigitaliseerd (zie VV 062). Ook wordt de BIM datastandaard als informatiedrager voor een efficiëntere en beter geïnformeerde beleidsuitvoering geïntroduceerd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
-------	--

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Omgevingsbesluit	2021 Q4	Op schema	
Snelle en correcte rechtsbescherming	2022 Q1	Op schema	
Digitale werf	2022 Q4	Op schema	
Optimaliseren van de Omgevingsvergunning	2022 Q4	Op schema	
Hervorming milieueffectenrapportage	2022 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV160 - ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit project willen we regeldruk en administratieve lasten reduceren om belangrijke kostenbesparingen én een grotere tevredenheid bij burgers, ondernemingen en overheidspersoneel te realiseren. In de verschillende bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid willen we vereenvoudigingsprojecten realiseren waar regelgeving en de bijhorende administratieve procedures de efficiënte werking van de overheid of de vlotte interacties van burgers en bedrijven met die overheid in de weg staan.

We werken daarbij enerzijds "remediërend" door screening van de bestaande regelgeving via zogenaamde "schrapsessies" per beleidsdomein en "citizen journeys" voor een tweetal concrete levensgebeurtenissen, en anderzijds werken we "preventief" en nemen we maatregelen om efficiënte toekomstige regelgeving te verzekeren.

Voor de financiering van dit project wordt er 250.000 euro gehaald uit het budget van 10 miljoen euro voor de spending reviews (VV158).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	<ol style="list-style-type: none">1. Gedetecteerde vereenvoudigingsopportuniteiten (vereenvoudigingsagenda)2. Monitoring van de uitvoering van de vereenvoudigingsagenda3. Uitwerking van 10 disruptieve projecten ("vlaggenscheppen")4. Uitwerking ex ante screeningsmechanisme regeldruk
Outcome	<ol style="list-style-type: none">1. Verminderen bestaande regeldruk en bestaande administratieve lasten t.a.v. ondernemingen/burgers2. Beheersen toekomstige regeldruk en administratieve lasten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Na de goedkeuring van een eerste vereenvoudigingsagenda met 214 vereenvoudigingsprojecten die voorgesteld werden door de Vlaamse administratie, werden tijdens de eerste helft van 2022 bedrijven en welzijnsorganisaties bevroegd over regeldruk in hun sector. De resultaten van deze bedrijvenpanels, worden momenteel,

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>samen met de resultaten van de citizen journeys, besproken met de vakkabinetten en -administraties, ter voorbereiding van de tweede vereenvoudigingsagenda die voor het zomerreces aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd.</p> <p>Daarnaast werd een monitoringssysteem opgezet dat de voortgang van de projecten in de regelgevingsagenda's periodiek zal opvolgen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste (voorlopige) vereenvoudigingsagenda vastgelegd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Definitieve vereenvoudigingsagenda vastgelegd	2022 Q3	Op schema	
beslissing over ex ante screeningsmechanisme (regeldruktoets)	2022 Q3	Op schema	
Uitvoering van de beslissing over regeldruktoets	2023 Q1	Nog niet gestart	
Opstart van project met uitwerking van 10 disruptieve vereenvoudigingsprojecten ("vlaggenschepen")	2022 Q2	Op schema	
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2022 Q2	Op schema	
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2023 Q1	Nog niet gestart	
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2023 Q3	Nog niet gestart	
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2024 Q1	Nog niet gestart	
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2024 Q3	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gedetecteerde vereenvoudigingsopportuniteiten	250	2022 Q3	214	85 %
Aantal ondersteunde disruptieve vereenvoudigingsprojecten ("vlaggenschipprojecten")	10	2024 Q1		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uitgevoerde vereenvoudigingsprojecten	250	2024 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
.Mededeling aan de Vlaamse Regering van 10 december 2021
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister-President Jan Jambon. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Hilde Crevits. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Bart Somers. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Ben Weyts. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Zuhail Demir. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Wouter Beke. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Matthias Diependaele. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Lydia Peeters. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Benjamin Dalle. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Regeringsbreed. Bijlage

VV161 - DECENTRALISATIEOEFENING NAAR LOKALE BESTUREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 stelt dat de Vlaamse Regering in een commissie decentralisatie samen met de lokale besturen komt tot voorstellen tot decentralisatie. Daarom werd door de Vlaamse administraties een analyse uitgevoerd omtrent mogelijke taken/bevoegdheden die vanuit de Vlaamse overheid kunnen gedecentraliseerd worden naar de lokale besturen. Vertrekkende vanuit deze resultaten wordt een zogenaamde long-list opmaakt die door de Vlaamse Regering wordt gevalideerd en dit met het oog op verdere bespreking met de lokale besturen in functie van de implementatie. In een commissie Decentralisatie overlegt de Vlaamse Regering samen met de lokale besturen op welke terreinen, bovenop de in dit regeerakkoord gemaakte afspraken, en door aanpassing van welke regelgeving en binnen welke termijn, zij de autonomie voor de lokale besturen verhoogt door, o.a. de afschaffing van Vlaamse sturing; minder of soepelere normering of de aanpassing van administratieve praktijken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	De commissie decentralisatie geeft aan op welke wijze vorm zal gegeven worden aan de decentralisatie ambities van de Vlaamse Regering, binnen een afgelijnde agenda. Dit gebeurt door middel van een programma waarin concreet wordt aangegeven welke regelgeving, administratieve praktijken en/of interbestuurlijke processen deze regeerperiode zullen aangepakt worden om de vooropgestelde beleidsdoelstelling uit het regeerakkoord te realiseren. Tevens wordt van de commissie verwacht dat ze in haar programma voorstellen doet voor de vervolgfase: de (timing van de) implementatie van de voorstellen en de opvolging ervan.
Outcome	Duidelijkere en meer evenwichtige verhoudingen tussen de Vlaamse Regering en de lokale besturen wat betreft autonomie, doorzettingsmacht en instrumenten voor de aanpak van enkele belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Omwille van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende humanitaire crisis werden de werkzaamheden van de commissie decentralisatie tijdelijk on hold gezet. Een aangepaste timing werd voorgesteld, de doelstellingen opgenomen in de startnota

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	blijven behouden. De startvergadering waarbij de commissie de decentralisatie-agenda vastlegt is voorzien voor 17 juni 2022.
Noodzakelijke politieke actie	geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Nota VR - voorstel tot oprichting van de commissie decentralisatie	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 4 februari 2022 keurde de Vlaamse Regering de startnota goed.
Startvergadering commissie decentralisatie.	2022 Q1	Uitgesteld	Omwille van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende humanitaire crisis werden de werkzaamheden van de commissie decentralisatie tijdelijk on hold gezet en werd een aangepaste timing voorgesteld.
Startvergadering commissie decentralisatie	2022 Q2	Op schema	Omwille van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende humanitaire crisis werden de werkzaamheden van de commissie decentralisatie tijdelijk on hold gezet. Een aangepaste timing werd voorgesteld. De startvergadering waarbij de commissie de decentralisatie-agenda vastlegt is voorzien voor 17 juni 2022.
Finale rapportering	2022 Q4	Op schema	De finale rapportering vanuit de inhoudelijke werkgroepen aan de commissie is voorzien voor Q4 2022.
Eindrapport	2023 Q1	Op schema	Bespreking van het eindrapport van de commissie en beëindiging van de opdracht van de commissie (tenzij in het eindrapport een verdere rol wordt gedefinieerd).

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Eindrapport en implementatieplan decentralisatie		2023 Q1		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	132.846.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Startnota](#)

[Bijlage 1](#)

[Bijlage 2](#)

VV162 - INVESTEREN IN VLAAMSE KENNISOVERHEID

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Belanghebbenden	Netwerk Statistiek Vlaanderen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING

Investeren in Vlaamse kennisoverheid: 1 miljoen euro recurrente middelen (nieuw beleid in 2021 maar niet in relanceprovisie) voor VSA en SIA vanaf 2021.

Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA)

In het kader van een snelle en flexibele informatieverzorging naar statistiekgebruikers zetten we in op de data-capaciteit van de Vlaamse Statistische Autoriteit met aandacht voor de verschillende types van databronnen: survey-data, administratieve data en organische (big) data. Dit om veranderingen in de maatschappij en de economie sneller te kunnen duiden. De capaciteit van het VSA Statistisch Datawarehouse wordt uitgebreid om statistische informatie-invoer en verwerking te versnellen en op een overzichtelijke manier weer te geven via innovatieve visualisaties en dashboards met de belangrijkste statistische indicatoren. We breiden eveneens onze survey-capaciteit uit door internet-gebaseerde bevragingen van de Vlaamse bevolking om de enquêtedruk te verminderen. Er wordt hiertoe ook extra geïnvesteerd in een online probability panel survey in samenwerking met Vlaamse universiteiten via de VLIR.

De concrete doelstellingen voor dit deel van het project zijn:

1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverzorging
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV-dataverzameling
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR

Strategische Inzichten en Analyses (SIA)

Om geïnformeerde en toekomstgerichte beleidskeuzes te kunnen maken, richten we ons op macro-economische en statistische analyses. Daartoe wordt geïnvesteerd in het opstarten en verder ontwikkelen van Strategische Inzichten en Analyse (SIA). Naast het beter benutten van statistische data, richten we ons ook op analyses van internationale indicatoren, trends en relevante toekomst studies. Dit als onderdeel van het verder optimaliseren van bestaande kenniscapaciteiten en beleidsonderzoek.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.000.000 EUR
-------	---------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Output	De VSA en SIA realiseren in het kader van dit projecten meerdere doelstellingen. De VSA versterkt haar statistisch datawarehouse, ontwikkelt een dashboard met Vlaamse kerncijfers en bouwt surveycapaciteit en online probability panel survey uit. SIA analyseert COVID-19 data, bouwt een relance dashboard, zet haar schouders onder een kennisnetwerk en werkt aan een netwerkmodel kennisoverheid.
Outcome	Eenzijds wordt via een versterkte data-capaciteit van de Vlaamse Statistische Autoriteit gestreefd naar een snelle en flexibele informatieverschaffing naar statistiekgebruikers. Anderzijds wordt er ingezet op een verdere optimalisatie van de bestaande kenniscapaciteiten en beleidsonderzoek.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De pilootfase van de integratie van surveydata in het Statistisch data warehouse is afgerond.</p> <p>Het pilootproject om de twitter-sentiment analyse pipeline te integreren in het Statistisch Datawarehouse werd eind december 2022 afgerond.</p> <p>Een POC rond de integratie van R en Python in SAS Viya via Jupiter Hub werd opgezet en moet nog geëvalueerd worden.</p> <p>Op de website van Statistiek Vlaanderen worden momenteel webpagina's per statistiek en interactieve data aangeboden. Het dashboard zal een online overzicht van de belangrijkste statistieken over Vlaanderen aanbieden. De selectie van statistieken gebeurt op basis van de brochure 'Vlaanderen in cijfers'. Naar vormgeving zal in juli 2022 voor een aantal grote thema's een dashboard met 6 tot 8 dynamische evolutiefiguren beschikbaar komen. In september 2022 volgt een dashboard met een vergelijking van Vlaanderen met EU-regio's. De technische uitwerking gebeurt in overleg met Digitaal Vlaanderen.</p> <p>De geplande rapportering over de SV2- en SV3-bevraging vond plaats in het voorjaar 2022. De COVID-vervolgbevraging en de nieuwe editie van de SV-bevraging (herhaling editie 1 voor update Vlaamse openbare statistieken – SV4) zijn gestart en het veldwerk wordt afgerond tegen begin juli. De rapportering over de SV-bevraging is voorzien voor september 2022, de rapportering over de COVID-vervolgbevraging voor het najaar 2022.</p> <p>De procedure om de data uit zowel de SV-bevragingen als de COVID-bevraging te bekomen voor statistische en wetenschappelijke doeleinden is klaar. Informatie over deze procedure is te vinden op https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/aanvragen-van-microdata-voor-onderzoek.</p> <p>Gesprekken met het consortium van universiteiten die het IGOOP voorbereiden en uitvoeren blijven lopen, met inbegrip over een structurele financiering door en deelname van de VSA in de uitbouw van het opzet. De VSA neemt deel aan de taskforces ter voorbereiding van de panelrekrutering, de steekproefsamenstelling en de vragenlijsten. Binnen de schoot van het Coördinatiecomité Vlaamse openbare statistieken wordt een werkgroep surveyonderzoek opgericht die onder meer zal optreden als 'vraagkanaal' voor beleidsvragen voor het online panel. De opstart van de rekruteringsfase van het panel met een eerste inhoudelijke bevraging heeft opnieuw vertraging opgelopen, en discussies omtrent de exacte governance en de betrokkenheid van VSA hierin blijven gaande.</p> <p>De uitbouw van SIA geeft gradueel invulling aan een netwerkmodel beleidsanalyse- en</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	onderzoek met een duidelijke focus op de relancedoelstellingen. Nu het herstel is ingezet, gaat er bijzondere aandacht naar economische veerkracht. Bijhorende kernindicatoren worden ontwikkeld en zullen opgenomen worden in het dashboard Vlaamse Veerkracht.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: a. Versterking van het proces van integratie en verwerking van surveydata en ondernemingsdata tot statistische informatie	2022 Q2	Vertraging	Omwille van vertraging in het beschikbaar hebben van de omgeving in ATOS DataCenter zal dit eerder begin Q4 (oktober) worden.
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: b. Analyse van de mogelijkheid tot integratie van organische data in het VSA statistisch datawarehouse	2022 Q4	Op schema	
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: c. Versneld beschikbaar stellen van interactieve data	2022 Q2	Vertraging	Omwille van vertraging in het beschikbaar hebben van de omgeving in ATOS DataCenter zal dit eerder begin Q4 (oktober) worden.
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: d. Haalbaarheidsanalyse van een remote access facility voor verwerking van atomaire statistische data in het kader van statistisch en wetenschappelijk onderzoek door entiteiten van de Vlaamse overheid en kennisinstellingen.	2022 Q4	Op schema	
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen a. Scoping dashboard	2021 Q3	Gerealiseerd	
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen b. Ontwerp- en ontwikkelingsfase visualisaties	2021 Q4	Vertraging	Momenteel in overleg met Digitaal Vlaanderen (aanpassingen aan website Statistiek Vlaanderen nodig), oplevering voorzien voor Q3 2022.
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen c. Testing beta versie	2022 Q1	Vertraging	Volgt op 2.b. => Q3 2022
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen d. Launch	2022 Q2	Vertraging	Volgt op 2.b. => Q3 2022

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen a. Rapportering Covid-bevraging	2021 Q2	Gerealiseerd	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen b. Scoping verdere surveyplanning/uitbesteding	2021 Q2	Gerealiseerd	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen c. Fit data-infrastructuur	2021 Q4	Gerealiseerd	Gestabiliseerde mixed-mode aanpak (mobile first / postaal) met aanbesteding veldwerk via extern bureau.
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen d. Uitbesteding veldwerk	2021 Q3	Gerealiseerd	Gestabiliseerde mixed-mode aanpak (mobile first / postaal) met aanbesteding veldwerk via extern bureau.
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen e. Rapportering SV 2021/2 en 2021/3	2021 Q4	Gerealiseerd	De geplande rapportering over de SV2- en SV3-bevraging vond plaats in het voorjaar 2022.
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen f. Rapportering Covid-ervolgbevraging	2022 Q2	Vertraging	COVID-ervolgbevraging veldwerk gestart in 2022 Q2 met voorziene rapportering in 2022 Q3.
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen g. Ter beschikking stellen van de atomaire data Covid-ervolgbevraging aan partners binnen het netwerk Statistiek Vlaanderen en de wetenschappelijke wereld	2022 Q3	Op schema	Procedure aanvraag van microdata SV-bevragingen beschikbaar op website Statistiek Vlaanderen.
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR a. Pilotstudie	2022 Q3	Vertraging	De opstart van de rekruteringsfase van het panel met een eerste inhoudelijke bevraging heeft opnieuw vertraging opgelopen, en discussies omtrent de exacte governance en de betrokkenheid van VSA hierin blijven gaande.
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR b. Eerste bevragingen	2022 Q4	Vertraging	Volgt op 4.a.
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR c. Rapportering	2023 Q1	Vertraging	Volgt op 4.a.
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA): opvolgen Covid-19 survey VSA	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA): versterken onderbouwd afwegingskader relance (dashboard)	2021 Q3	Gerealiseerd	
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid: Inzetten op thematische kennisnetwerken	2022 Q2	Op schema	
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid: Graduele implementatie netwerkmodel Kennisoverheid (2022-2024)	2022 Q4	Op schema	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen h. Rapportering SV 2022/4	2022 Q3	Op schema	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen i. Rapportering SV 2022/5 en SV 2022/6	2023 Q1	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	874.000 EUR
Uitvoering VEK	123.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beleids- en begrotingstoelichting naar aanleiding van de begrotingsuitvoering 2021](#)

VV163 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - PAKKET VAN 500 MILJOEN EURO VOOR ZEER GOEDKOPE ACHTERGESTELDE LENINGEN AAN ENERZIJD'S START-UPS & SCALE-UPS EN ANDERZIJD'S KMO'S

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven, voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep. Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 oktober 2021.

Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	500.000.000 EUR
Output	Aantal door PMV verstrekte coronaleningen aan start-ups en scale-ups (doelgroep 1) en kmo's (doelgroep 2)
Outcome	De liquiditeitsbehoefte van Vlaamse bedrijven op middellange termijn, veroorzaakt door de coronacrisis, mee opvangen. Doelgroepen zijn enerzijds start-up-bedrijven en scale-ups en anderzijds mature kmo's die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle aanvragen werden verwerkt (beslissing investeringscomité) tegen 31/12/2021. Uitbetaling van goedgekeurde leningen die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen en nog een uitbetaling wensen werd gerealiseerd. Van de 665 goedgekeurde leningen voor 214,3 mln. euro, werden er 589 leningen opgenomen voor een bedrag van 173,9 mln. euro. De focus verlegt zich nu naar de opvolging van de leningenportefeuille (en in die zin blijft dit project verder 'in uitvoering'), waarbij ook de mogelijkheid geboden werd en wordt

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	om de terugbetalingstermijn van de lening te verlengen, mits een verhoging van de interestvergoeding.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Kapitaalsverhoging PMV	2020 Q2	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uitbetaalde leningen KMO's (doelgroep 2)	500	2022 Q1	390	78 %
Aantal uitbetaalde dossiers (bedrag uitbetaald)	250000000	2022 Q2	167.400.000	67 %
Aantal uitbetaalde leningen start-ups / scale-ups (doelgroep 1)	200	2022 Q2	157	79 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	500.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	500.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 500.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 15 mei 2020 - COVID-19: Kapitaalsverhoging voor programma achtergestelde leningen](#)

[Nota aan de VR van 17/12/2021 over het besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een overbruggingslening voor ondernemingen](#)

VV164 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - EXTRA CAPACITEIT VOOR GIGARANT (3 MILJARD EURO) EN VOOR PMV-Z-WAARBORGEN (400 MILJOEN EURO) - HEFBOOM VOOR MAXIMALE BANCAIRE FINANCIERING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Gigarant (3 miljard euro)

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot 15 oktober 2021, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

PMV/Z-Waarborgen (400 miljoen euro)

De bestaande waarborgregeling bij PMV/z (Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) werd tijdelijk uitgebreid met de Waarborg coronacrisis. Deze uitbreiding liep tot eind 2020 en wordt niet verlengd.

Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.400.000.000 EUR
Output	Aantal dossiers met door een waarborg ondersteunde bankfinanciering gerealiseerd waarborgbedrag
Outcome	Oplossen van liquiditeitsnoden (vnl. voor werkkapitaal of investeringen) van Vlaamse ondernemingen via behoud of uitbreiding van bankfinanciering, teneinde op termijn groei van die ondernemingen te bewerkstelligen met bijhorend behoud of uitbreiding van de tewerkstelling in Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
---------------	--------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Gezien de verlenging van het Temporary Framework door de Europese Commissie kunnen Gigarant Covid-Waarborgen toch nog worden toegekend tot 30/6/2022. Tot en met 31/3/2022 werden vanuit Gigarant 28 Covid-Waarborgen toegekend voor een totaal waarborgbedrag van 601 mln. euro.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG**MIJLPALEN**

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
----------	--------	--------	---------------------

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Gerealiseerd Covid-19 waarborgbedrag	1500000000	2022 Q2	515.000.000	34 %
Aantal gerealiseerde Gigarant Covid19-waarborgen	50	2022 Q2	26	52 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.400.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.400.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 3.400.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 0405 DOC.0423 - decreet](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - nota](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - memorie](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - advies SERV](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - advies RVS](#)

VV165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS-PUBLIEK EN REST PRIVAAT)

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse overheid gaat een Welvaartfonds oprichten dat zal beleggen in kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen bij Vlaamse ondernemingen. De overheid zal op termijn een minderheidsparticipatie aanhouden in dat fonds, maar kan bij de opstart wel de meerderheid hebben. Er wordt bij PMV een kapitaalsverhoging van € 240 miljoen voorzien om dit fonds op te starten. Het is de bedoeling om hiermee een fonds ter waarde van € 500 miljoen op te zetten.

Belangrijkste kenmerken:

- Het fonds zal zich focussen op kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen met een looptijd van 4 jaar en meer, steeds in cofinanciering met private investeerders.
- Naast institutionele beleggers zullen ook particulieren in het fonds kunnen investeren en daar een dubbel voordeel genieten:
 - Ze krijgen een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar (de eerste drie jaar) met een maximum van € 1.000 per belastingplichtige.
 - Bij erfenis zullen de aandelen overgaan mits een recht van 3% en niet meegerekend worden in de globalisatie van het vermogen.
- Het fonds zal worden beheerd samen met private spelers.
- Het fonds zal investeren in bedrijven die voldoen aan een ethisch kader. De doelgroepen zijn:
 - start-ups en scale-ups die een financieringsnood hebben van meer dan € 800.000 door de coronacrisis:
 - door een tijdelijke negatieve impact op de business;
 - omdat kapitaalmarkten gesloten zijn;
 - start-ups en scale-ups die een opportuniteit zien in de huidige crisis en bijkomende middelen nodig hebben om een versnelling hoger te kunnen schakelen;
 - waardevolle innovatiegedreven bedrijven die het doelwit kunnen worden van buitenlandse overnemers; bedrijven met een buy-out problematiek waar verankering en stabilisatie kan geboden worden
 - Vlaamse dochterondernemingen van internationale groepen die bijvoorbeeld via een buy-out zelfstandig een toekomst kunnen hebben;
 - alle innovatieve bedrijven (product, technologie, businessmodellen, diensten, enz...).
- PMV zal vanaf het 6e jaar de liquiditeit van het fonds verzekeren aan boekwaarde voor de particuliere inschrijvers die willen uittreden.

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit fonds wordt in verschillende fasen gelanceerd:

- In een eerste fase verzamelt het Welvaartsfonds een consortium van sterke partners die zich engageren om samen te werken om de solvabiliteit te versterken van Vlaamse bedrijven die geïmpacteerd zijn door de coronacrisis. Aan de hand van een samenwerkingscharter scharen de partners zich zo achter het gezamenlijke doel om de welvaart voor Vlaanderen op lange termijn te verzekeren.
- In een tweede en derde fase – vanaf het tweede kwartaal van 2021 – wordt het fonds juridisch opgericht en verder opgeschaald. Vanaf dan zal het voor de institutionele investeerders (fase 2) en de particuliere spaarder (fase 3) ook mogelijk zijn om mee te investeren in Vlaamse bedrijven.

Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	240.000.000 EUR
Output	Aantal dossiers gesloten door het Welvaartsfonds
Outcome	De solvabiliteit van Vlaamse bedrijven die positief (versnelde groeimogelijkheden) of negatief (bijkomende financieringsnoden) geïmpacteerd zijn door de coronacrisis versterken: via kapitaalparticipaties, achtergestelde leningen en quasi-kapitaal

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Nog geen investeringen gerealiseerd. 10-tal dossiers momenteel in analyse + 1 dossier finaal goedgekeurd, met verwachte realisatie in juni. 1 eind 2021 goedgekeurd dossier niet gerealiseerd wegens niet vervullen van de gestelde voorwaarden. Per 31/3/2022 werden 98 dossiers geanalyseerd, voor een aangevraagd bedrag van 607 mln. euro. Uitbreiding scope Welvaartsfonds naar impact van diverse externe crisissen (niet louter Corona-crisis) in uitwerking.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Samenstellen consortium	2020 Q4	Gerealiseerd	
Kapitaalverhoging PMV en LRM	2021 Q1	Gerealiseerd	
oprichting fonds en eerste closing	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opschalen fonds met institutionele investeerders	2021 Q3	Gerealiseerd	Voorlopig gerealiseerd. Een eventuele toekomstige nood aan verdere opschaling zou op dat moment bekeken worden i.f.v. de marktomstandigheden.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Juridische oprichting fonds	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opschalen fonds met private investeerders	Nog te bepalen	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Opgehaalde investeringsmiddelen (privé en publiek)	500000000	2021 Q4	205.000.000	41 %
aantal gerealiseerde investeringsdossiers vanuit het Welvaartsfonds	25	2024 Q4		
gerealiseerd investeringsbedrag vanuit het Welvaartsfonds	180000000	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	240.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	240.000.000 EUR
Uitvoering VAK	245.000.000 EUR
Uitvoering VEK	85.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 240.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 29 januari 2021 - Kapitaalverhoging bij PMV nv en bij LRM nv

VV166 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - UITBREIDING VAN DE WIN-WIN-LENING EN VRIENDENAANDEEL

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Winwinlening

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven.

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, werd deze lening versoepeld.

Vriendenaandeel

Met het Vriendenaandeel moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), gevestigd in het Vlaamse Gewest. De particuliere investeerder (vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot € 300.000 extra kapitaal ophalen.

Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	Aantal geregistreerde Winwinleningen en Vriendenaandelen
Outcome	De solvabiliteit van Vlaamse kmo's versterken via achtergestelde leningen en kapitaalparticipaties door particulieren, en zo hun toegang tot (bancaire) financiering faciliteren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
---------------	--------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	<p>In het 1e kwartaal van 2022 werden 1087 Winwinleningen geregistreerd, voor een totaal bedrag van 29,7 mln. euro (t.o.v. 2169 voor 41,7 mln. euro in het 4e kwartaal van 2021)</p> <p>In het 1e kwartaal van 2022 werden 23 Vriendenaandelen geregistreerd, voor een totaal bedrag van 58.099 euro. (t.o.v. 318 Vriendenaandelen voor 794.043 euro in het 4e kwartaal van 2021)</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitbreiding winwinlening	2020 Q4	Gerealiseerd	
Vriendenaandeel operationeel	2021 Q1	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Geregistreerde winwinleningen (in bedrag) sinds uitbreiding	150.000.000	2021 Q4	183.600.000	100 %
Aantal geregistreerde winwinleningen sinds uitbreiding van het instrument	6000	2021 Q4	9.690	100 %
Bedrag aan geregistreerde vriendenaandelen sinds creatie van het instrument	10000000	2024 Q4	310.000	3 %
Aantal geregistreerde vriendenaandelen sinds creatie van het instrument	1000	2024 Q4	37	4 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - BVR](#)

[VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - nota](#)

[VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - advies](#)

VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOUW 2

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Onderwijs en Vorming
Belanghebbenden	schoolbesturen, leerlingen, onderwijspersoneel

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering wil deze regeerperiode voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe investeringen in schoolinfrastructuur goedkeuren. De inhaalbeweging van de vorige regeerperiode wordt zo exponentieel doorgezet met een extra investeringsimpuls van 500 miljoen euro. Deze investeringsgolf biedt perspectief voor ruim 1.000 nieuwe of gerenoveerde scholen.

Ten eerste wordt fors geïnvesteerd in de vervanging van de bestaande schoolinfrastructuur gezien het schoolpatrimonium verouderd is (actiepunt 167/1 Vervangingsinvesteringen).

Ten tweede wordt extra capaciteit gecreëerd. Bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen wordt vooral gefocust op het secundair onderwijs, maar ook voor het eerst specifiek voor buitengewoon onderwijs, waar de noden het hoogste zullen zijn in de komende jaren (actiepunt 167/2 Extra capaciteit).

Daarnaast wordt een derde DBFM-programma, Scholen van Vlaanderen, opgestart waardoor verder wordt ingezet op alternatieve financiering (actiepunt 167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen).

Tot slot gebeuren er ook investeringen via huursubsidies met een jaarlijkse oproep (actiepunt 167/4 huursubsidies).

Deze vier actiepunten m.b.t. de investeringsbeleid maken deel uit van het Masterplan Scholenbouw 2.0.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.078.000.000 EUR
Output	Via de verschillende actiepunten en subsidieposten worden de bestaande schoolgebouwen verbeterd en wordt nieuwe schoolinfrastructuur gebouwd.
Outcome	Een substantiële investering wordt gecreëerd voor het schoolgebouwenpatrimonium.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
---------------	--------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	Momenteel worden de actiepunten, zoals vermeld in de projectomschrijving en de projectvoortgang, verder uitgevoerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
167/2 Extra capaciteit: goedkeuring door de Vlaamse Regering van extra capaciteitsprojecten voor in totaal 35,5 miljoen aan capaciteitsmiddelen.	2021 Q1	Gerealiseerd	
167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen: goedkeuring decretaal kader.	2021 Q4	Gerealiseerd	
167/2 Extra capaciteit: goedkeuring Vlaamse Regering van geografische verdeling capaciteitsmiddelen scholenbouw 2022-2024	2022 Q2	Gerealiseerd	
167/2 Extra capaciteit: goedkeuring selectie door de Vlaamse Regering.	2022 Q4	Op schema	
167/1 Jaarlijkse vervangingsinvesteringen; 167/4 Jaarlijkse huursubsidie	2024 Q2	Op schema	
167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen: verdere uitrol van het DBFM-programma	2024 Q2	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	3.078.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.078.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 3.078.000.000 EUR

[Conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0. Bijlage](#)

[Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 5 maart 2021 van extra capaciteitsprojecten voor in totaal 35,5 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen.](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2 -voorontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Memorie van toelichting. Bijlage](#)

[Evaluatie scholen van morgen. Bijlage](#)

[DBFM-scholen van Vlaanderen. Verslag alternatieven en meest passende uitvoeringsvorm. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2 - voorontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Memorie. Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Advies van Vlor over het voorontwerp van decreet over DBFM-scholen van Vlaanderen. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 1 oktober 2021 - ontwerp van Decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen - Definitieve goedkeuring](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen - Vlaamse Regering 1 oktober 2021 - Definitieve goedkeuring](#)

[Memorie van Toelichting van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen - Vlaamse Regering 1 oktober 2021 - Definitieve goedkeuring](#)

[Advies van de Raad van State. Over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap 'over DBFM-Scholen van Vlaanderen'](#)

VV168 - VERSNELDE UITROL DIGITALE METERS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

In samenwerking met intercommunales en private bedrijven investeren we ook in een versnelde uitrol van digitale meters (ongeveer 2 miljard euro investering door Fluvius gespreid over 10 jaar, waarvan 80% tegen 2025).

Dit kadert in de uitvoering van het Regeerakkoord en is in lijn met de Europese Richtlijn 2019/944 waarin de uitrol van digitale meters wordt bepaald. Uit een kostenbatenanalyse van 16 april 2020 uitgevoerd door VREG blijkt deze versnelde uitrol tot een hogere maatschappelijke winst te leiden. Bovendien wenst de Vlaamse Regering de baten van een digitale meter en de digitalisering van het energiesysteem zo snel mogelijk aan alle Vlamingen aan te bieden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	Aantal geplaatste digitale meters
Outcome	Zoveel mogelijk netgebruikers maken actief gebruik van de mogelijkheden van de digitale meter. In de eerste plaats gaat het dan om een verbeterd inzicht in het energieverbruik via het webportaal van Fluvius of de lokale gebruikerspoorten. In een volgende stap kan het ook gaan over de mate van actieve sturing van het energiegebruik in functie van eigen productie of de noden van het net.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	Eind april 2022 waren 1 601 032 digitale meters voor elektriciteit en aardgas geïnstalleerd. Dit komt overeen met 26% van de toegangspunten die beschikken over een kleinverbruiksmeterinrichting. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de terugdraaiende teller vernietigde, werd de uitrol bij bestaande prosumenten achteruit geschoven en is er nog steeds heel wat twijfel om een digitale meter te laten installeren. Omwille van corona is een vertraging opgelopen. Hierdoor is een uitrol van 80% eind 2024 uitdagend. 89% van de budgetmeters is omgebouwd naar een digitale meter. 29% van de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>elektriciteitsmeters bij prosumanten is een digitale meter. Er werden 17 710 digitale meters geplaatst op vraag van de netgebruiker. Volgens het Energiebesluit zouden eind 2021 alle meters uit de proefprojecten en de budgetmeters vervangen moeten zijn door digitale meters. Omdat Fluvius zeer veel moeilijkheden ondervindt om bij de doelgroep van budgetmeters binnen te geraken voor de plaatsing van een digitale meter, is dit niet gelukt. Ondanks alle inspanningen: twee brieven, twee belpogingen en sms'en (indien gegevens beschikbaar), twee mails (indien gegevens beschikbaar) en twee huisbezoeken. Daarom is een aangepaste procedure via de LAC uitgewerkt. Doelstelling is om een afspraak te maken voor de plaatsing van een digitale meter. Indien dit niet lukt, vragen we toelating aan de LAC voor de plaatsing van een oplaadblokkade.</p>
Noodzakelijke politieke actie	<p>Om het draagvlak voor de energietransitie in het algemeen, en de digitale meter in het bijzonder die hiervoor een belangrijke 'enabler' is, te versterken is in samenwerking met Fluvius een brede communicatiecampagne Meemetdestroom.be opgezet. In het voorjaar 2022 werd in detail ingegaan op de digitale meter. De uitgewerkte weigeringsprocedure indien een netgebruiker weigert een digitale meter te plaatsen zou nu moeten worden geoperationaliseerd en gecommuniceerd.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bestaande actieve budgetmeters zijn vervangen door een digitale meter.	2021 Q4	Vertraging	<p>Volgens het Energiebesluit zouden einde 2021 alle meters uit de proefprojecten en de budgetmeters vervangen moeten zijn door digitale meters. Omdat Fluvius zeer veel moeilijkheden ondervindt om bij de doelgroep van budgetmeters binnen te geraken voor de plaatsing van een digitale meter, is dit niet gelukt. Ondanks alle inspanningen: twee brieven, twee belpogingen en sms'en (indien gegevens beschikbaar), twee mails (indien gegevens beschikbaar) en twee huisbezoeken.</p> <p>Daarom is een aangepaste procedure via de LAC uitgewerkt. Doelstelling is om een afspraak te maken voor de plaatsing van een digitale meter. Indien dit niet lukt, vragen we toelating aan de LAC voor de plaatsing van een oplaadblokkade.</p>
De meters die geplaatst of geactiveerd werden in het proefproject slimme meters en in het proefproject digitale budgetmeter van de distributienetbeheerders zijn vervangen door een digitale meter.	2021 Q4	Gerealiseerd	
80% van de toegangspunten met een kleinverbruiksmeterinrichting beschikt over een digitale meter	2024 Q4	Vertraging	Gezien het arrest van het Grondwettelijk hof dat de virtueel terugdraaiende teller vernietigde bij digitale meters, werd de

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			uitrol bij bestaande prosumenten achteruit geschoven en is er nog steeds heel wat twijfel om een digitale meter te laten installeren waardoor een uitrol van 80% eind 2024 uitdagend is.
100% van de toegangspunten met een kleinverbruiksmeterinrichting beschikt over een digitale meter	2029 Q3	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
% kleinverbruiksmeterinrichtingen met een bestaande actieve budgetemeter die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	100%	2021 Q4	76.313	89 %
% kleinverbruiksmeterinrichtingen die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	80%	2024 Q4	1.601.032	26 %
% kleinverbruiksmeterinrichtingen die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	100%	2029 Q3	1.601.032	26 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV169 - VERSNELDE UITROL GLASVEZELNETWERK EN 5G

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Belanghebbenden	Telecomoperatoren, intercommunales

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering streeft naar één open netwerk voor 5G. We onderzoeken hiervoor het concept van een tower company. Dit houdt in dat diverse aanbieders hun infrastructuur aanbrengen op een gezamenlijke basisinfrastructuur (bv. elke aanbieder plaatst antennes op een gezamenlijke mast). Op deze manier streven we in samenwerking met de mobiele operatoren in een versnelde uitrol van een glasvezelnetwerk en 5G. Voorwaarde is evenwel een snelle spectrumveiling op federaal niveau, zodat de betrokken operatoren zekerheid hebben over de frequenties waarover ze beschikken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	n.v.t. (binaire output)
Outcome	Versnelde en brede uitrol van 5G en een glasvezelnetwerk (doormiddel van meer samenwerking tussen mobiele operatoren)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De veiling van 5G in België loopt momenteel en eind juni 2022 zijn de resultaten bekend. Dan weten we welke telecombedrijven 5G in België zullen uitrollen en kunnen verkennende gesprekken tussen deze telecomoperatoren, het nutsbedrijf Fluvius, de Vlaamse Participatiemaatschappij (die voor de financiële middelen zal instaan), imec (die het projectvoorstel heeft afgeleverd) en het kabinet van de minister voor innovatie van start gaan.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Tweede versie concept paper voor oprichting 5G TowerCo voor Vlaanderen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Goedkeuring veiling 5G in België	2021 Q2	Gerealiseerd	
Overleg tussen telecomoperatoren en algemeen nutsbedrijf Fluvius over oprichten TowerCo	2022 Q3	Op schema	
Oprichting van een tower company	2024 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Onderzoek van het concept van een tower company en oprichting van een tower company		2022 Q4	1	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV170 - FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAK VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

PMV beheert tevens het Flanders Future Techfund, dat in 2019 werd opgericht met een beschikbaar kapitaal van 75 miljoen euro. Dit kapitaal willen we aanwenden voor investeringen in innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) platformtechnologie.

Het gaat hier dus om een injectie vanuit de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	75.000.000 EUR
Output	Aantal gerealiseerde dossiers en geïnvesteerd bedrag
Outcome	Investeringen in beloftevolle technologieplatformen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Geen dossiers gesloten. 1 dossier goedgekeurd voor 4 mln. euro in het eerste kwartaal 2022. Advies-vraag bij INR inzake ESR-neutraliteit is lopende. Verder nog 3 actieve dossiers in analyse op 14 aangemelde dossiers in totaal sinds de start van dit instrument.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
----------	--------	--------	---------------------

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Gerealiseerd investeringsbedrag vanuit FFTF	65000000	2024 Q4		
Aantal gerealiseerde projecten vanuit FFTF	5	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	75.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	75.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none">• Europese middelen<ul style="list-style-type: none">○ Europees Herstelfonds: 0 EUR○ Brexit-fonds: 0 EUR○ React EU: 0 EUR• Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR• Reguliere Vlaamse middelen: 75.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 29 maart 2019 - oprichting Flanders Future Techfund](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 12/11/2021 over de herpositionering van het Flanders Future Techfund](#)

VV171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	IMEC

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Imec (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) ontstaat in 1984 als onafhankelijk onderzoekscentrum voor micro- en later nano-elektronica. Het doel is om alle academische kennis rond chiptechnologie in Vlaanderen te bundelen. Sinds 2016 is ook iMinds (voorheen IBBT), het strategische onderzoekscentrum van Vlaanderen op het gebied van digitale innovatie, onderdeel van imec. Daardoor vind je bij imec vandaag zowel soft- als hardware onderzoek & ontwikkeling onder één dak.

De onderzoekscleanroom van imec is het strategische fundament van de unieke positie van imec als wereldleidend onderzoekscentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Zonder de cleanroom infrastructuur kan imec zijn brugrol tussen de academische wereld en de industrie niet spelen aangezien de cleanroom essentieel is om de industriële toepasbaarheid van de innovatieve concepten aan te tonen in een relevante productieomgeving. Tegen eind 2022 botst imec op de grenzen van de huidige cleanroom capaciteit. Dit resulteert in de nood tot ingebruikname van de "casco" cleanroom extensie die beschikbaar is binnen de huidige infrastructuur.

Sinds zijn oprichting heeft imec zich ook als doelstelling gezet om spinoffs op te richten. Het creëren van startups, waarbij unieke hardware het verschil maakt, is echter zeer kapitaalintensief en risicovol. Om de oprichting van dergelijke kapitaalintensieve hardware spin-offs voldoende te kunnen ondersteunen, heeft imec samen met de Vlaamse Overheid in 2017 het Imec.xpand fonds gelanceerd, een onafhankelijk investeringsfonds dat intussen 117 miljoen euro kapitaal heeft opgehaald. De middelen komen voor meer dan 60% van privé-investeerders, waaronder verschillende buitenlandse investeerders. Imec.xpand werd opgezet als een traditioneel fonds met een investeringsperiode van 5 jaar en een totale looptijd van 10 jaar die 2 keer met een jaar verlengd kan worden. De investeringsperiode loopt binnenkort ten einde. Daarom is er beslist om een nieuw Imec.xpand fonds op te zetten, met het doel om 120 miljoen op te halen bij investeerders verdeeld over overheids- en overheidsgerelateerde entiteiten, universiteiten en internationaal gereputeerde technologiebedrijven. Het is de bedoeling om van start te gaan met een eerste closing van € 60 miljoen euro ten laatste in Q1 2022 en in 2022 de rest van het fonds te closen.

Zowel de kapitaalsverhoging van Finlab als die van Fidimec worden gefinancierd via esr8 kapitaal, dat voorzien wordt bij begrotingsaanpassing 2021.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	70.000.000 EUR
-------	----------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Output	1. ingebruikname van de casco cleanroom extensie 2. opstart imec.xpand II fonds
Outcome	1. het verrichten van grensverleggend strategisch onderzoek inzake nanotechnologie en digitale technologie, om de industriële toepasbaarheid van de innovatieve concepten aan te tonen in een relevante productieomgeving 2. start-ups in een vroeg stadium van voldoende financiële middelen voorzien: investeren in een aantal start-ups

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	1.1 mededeling VR actualisering van de aandeelhoudersovereenkomst van Finlab nv (VR2021 1012 VV MED0019) 1.2. aandeelhoudersovereenkomst Finlab nv werd ondertekend op 13 december 2021 1.3. storting eerste schijf van het kapitaal Finlab op 23 december 2021 1.4. start met opmaak voorontwerp FAB3 cleanroom 2.1 oprichting imec.xpand 2 fonds: eerste closing op 23 maart 2022 met een toegezegd kapitaal van 138.660.000 euro.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
1.1 kapitaalverhoging Finlab nv van 40 miljoen euro	2021 Q2	Gerealiseerd	
1.2 goedkeuring aandeelhoudersovereenkomst Finlab nv	2021 Q4	Gerealiseerd	
1.3 voorontwerp cleanroom indienen	2022 Q2	Vertraging	Het voorontwerp wordt verwacht eind juli 2022. Er zijn meerdere redenen voor deze vertraging. Mede getriggerd door Covid is er een ernstig tekort ontstaan aan halfgeleider chips. Dat heeft dan weer ook in Europa een significante uitbreiding van de productie-capaciteit van chips getriggerd (Bosch, Infineon, ST, ...). Hierdoor zijn de partners voor Engineering/Procurement/Construction overvraagd, waardoor de aanstelling en start later werd aangevat dan gepland. De partner, die door Imec werd geselecteerd, plande een belangrijke inzet van expertise vanuit de UK. De combinatie Brexit en Covid, is een tweede belangrijke reden van vertraging. Engineering/ontwerp van de FAB3 uitbreiding vereist in een initiële fase een zeer sterke

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			<p>interactie tussen engineering-team en opdrachtgever. Onder normale omstandigheden gebeurt dat in team on site, wat onder de Covid omstandigheden een stuk moeilijker liep. Het projectteam werd dan ook in de loop van deze fase in belangrijke mate aangepast met een veel sterkere lokale betrokkenheid/expertise, om het risico voor de vervolgfases te minimaliseren. Het engineering team is in de looptijd van het project in belangrijke mate versterkt met een veel ruimere lokale aanwezigheid. Gelukkig liggen de Covid-maatregelen nu achter ons en loopt ook het voorontwerp naar het einde.</p> <p>In alle transparantie moeten we ons realiseren dat de markt op heden nog steeds erg overhit is, met aanzienlijk langere leadtimes dan normaal. Het projectplan werd geüpdatet, rekening houdend met de reeds opgelopen vertraging en huidige geldende lead times en blijft binnen de eerder aangegeven mijlpalen.</p>
1.4 oplevering van alle werken	2023 Q4	Nog niet gestart	
1.5 ingebruikname van de cleanroom	2023 Q4	Nog niet gestart	
2.1 kapitaalverhoging Fidimec nv van 30 miljoen euro	2021 Q2	Gerealiseerd	
2.2 goedkeuring aandeelhoudersovereenkomst Fidimec nv	2021 Q3	Gerealiseerd	
2.3 eerste closing van het imec.xpand 2	2022 Q2	Gerealiseerd	De closing vond plaats op 23 maart 2022 met een toegezegd kapitaal van EUR 138.660.000.

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	70.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	70.000.000 EUR
Uitvoering VAK	70.000.000 EUR
Uitvoering VEK	36.822.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 70.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

1. Kapitaalsverhoging van Finlab nv in het kader van de uitbreiding van de 'casco' Imec cleanroom extensie (VR 2021 2105 VV DOC.0057) en actualisering van de aandeelhoudersovereenkomst van Finlab nv naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Finlab nv, bestemd voor de ingebruikname van de 'casco' Imec cleanroom extensie (VR 2021 1012 VV MED.0019)

2. Kapitaalsverhoging van FIDIMEC nv in het kader van de participatie in het Imec.xpand II investeringsfonds (VR 2021 0705 VV DOC.0046) en actualisering van de aandeelhoudersovereenkomst van Fidimec nv naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Fidimec nv, bestemd voor de participatie in het Imec.xpand II investeringsfonds (VR 2021 1510 VV MED.0016)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Kapitaalsverhoging van FIDIMEC nv in het kader van de participatie in het Imec.xpand II investeringsfonds](#)

VV172 - INVESTERINGEN IN VLAGGENSCHIPRELANCEPROJECTEN VAN DE VLAAMSE HAVENS INZAKE CO² CAPTATIE & HERGEBRUIK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaamse havens, bedrijven

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Investerings in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO₂ captatie & hergebruik => zitten deels in de enveloppe O&O en moet op specifiek projectniveau opgevolgd worden door Vlaio. Zij werken met open calls die bottom up worden ingevuld.

De klimaatdoelstellingen hebben tot doel de netto uitstoot van CO₂ te beperken, wat kan bereikt worden door de energie efficiëntie op te drijven, processen te veranderen of andere producten aan te maken. Niettemin is het niet altijd mogelijk de aanmaak van CO₂ te vermijden. In deze gevallen bestaat er een mogelijkheid om de aangemaakte CO₂ af te vangen en ofwel na conditionering te transporteren voor opslag (CCS) ofwel om ze aan te wenden mits de inzet van hernieuwbare energie (CCU).

De Vlaamse zeehavens, in het bijzonder de haven van Antwerpen en Northseaport zijn een uitermate geschikte locatie om de uitstoot aan CO₂ te reduceren door deze af te vangen en op te slaan. De haven van Antwerpen huisvest de grootste Europese geïntegreerde energie- en chemiecluster en in Northseaport is er een belangrijke concentratie aan zware industrie, waaronder het geïntegreerde staalbedrijf ArcelorMittal. Verschillende belangrijke industriële processen van deze basisindustrie genereren inherent CO₂ en de piste CCS/CCU kan in deze gevallen een oplossing aanreiken.

De beoogde toepassingen van CCU noodzaken de aanmaak van groene waterstof aan de hand van hernieuwbare energie, de captatie en de verwerking van CO₂ en de synthese van beide tot een bruikbare grondstof, bv methanol. In het kader van de IPCEI Waterstof (zie fiche VV047) zijn er mogelijkheden om innovatieve projecten, waaronder zogenaamde First Industrial Deployments te steunen, die tot doel hebben groene waterstof te genereren of die de synthese van bv groene methanol aan de hand van afgevangen CO₂ en groene waterstof tot doel hebben. Er is echter een lacune voor de steun aan (innovatieve) projecten, die de captatie en verwerking van CO₂ tot doel hebben. Dit is het onderwerp van het voorliggende project. De mogelijkheden om de bedoelde Vlaamse projecten te steunen zijn: Vlaamse steun, al dan niet via de reguliere kanalen, en Europese steun, op de eerste plaats via het ETS Innovatiefonds. Voor minstens twee belangrijke projecten in deze context werd een Letter of Intent (LOI) tot Vlaamse ondersteuning, ondertekend door de Vlaamse minister bevoegd voor innovatie, aangeleverd ter ondersteuning van de aanvraag bij het ETS Innovatiefonds. Vlaamse cofinanciering met als doel het verhogen van de slaagkans bij de evaluatie door het ETS Innovatiefonds behoort immers tot de mogelijkheden. Het is voor alle duidelijkheid mogelijk dat er zich bijkomende bedrijfsprojecten met het oog op de captatie en de verwerking van CO₂ uit de zeehavens aanbieden voor ondersteuning.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	De voorziene middelen worden onder de vorm van een subsidie toegekend als Vlaamse cofinanciering voor één of meerdere investeringen in CCUS.
Outcome	De toe te kennen subsidie is een essentieel element om de CCUS investering te (kunnen) laten doorgaan. Uiteindelijke outcome is een beschikbare, operationele CCUS installatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	Goedkeuring CCUS project door Europees steuninstrument. Vraag naar goedkeuring Vlaamse cofinanciering aangemeld bij EC. (Vertrouwelijke informatie.)
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Steunbeslissing EC of Vlaamse overheid betreffende Vlaamse projecten CO2-captatie en/of -verwerking.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Aanvang projectuitvoering Vlaamse projecten CO2-captatie en -verwerking	2030 Q4	Nog niet gestart	
Definitieve Investeringsbeslissing Vlaamse projecten CO2-captatie en/of -verwerking	2030 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Beslissing VR toekenning Vlaamse subsidie	1	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

● Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR

● Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV173 - AD HOC INVESTERINGSMIDDELEN ALS COFINANCIERING VOOR EUROPESE STEUN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

We volgen de Europese subsidie- en financieringsmogelijkheden op met het oog op het realiseren van projecten in Vlaanderen op het vlak van innovatie, klimaat en duurzaamheid. Waar nuttig en mogelijk voorzien we aanvullende Vlaamse cofinancieringsmiddelen die inspelen op Europese financieringsmogelijkheden op het vlak van innovatie en duurzaamheid. In de context van projecten voor het ETS-innovatiefonds, kan het gaan om Vlaamse cofinanciering vanuit de reguliere enveloppes O&O en ecologische steun in het Fonds Innoveren & Ondernemen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De permanente monitoring van subsidiemogelijkheden via Europese kanalen voor projecten op het vlak van innovatie en duurzaamheid is een continu proces dat deel uitmaakt van de recurrente werking binnen het beleidsdomein EWI.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Permanente monitoring Europese opportuniteiten	2021 Q1	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start toekenning Vlaamse cofinanciering voor projecten met Europese steun	2021 Q2	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV174 - NOODKOOPLINGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	OCMW's, energiehuizen en noodkopers

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het Noodkoopfonds is er op gericht om via projecten van OCMW's renteloze leningen te verstrekken aan noodkopers voor de renovatie van hun woning. Noodkopers zijn eigenaars van kwalitatief en energetisch slecht scorende woningen, die door een gebrek aan financiële middelen hieraan niet kunnen remediëren.

OCMW's die deelnemen aan de projectoproep kunnen een renteloze kredietlijn bekomen van maximaal 1.800.000 euro, waarmee noodkoopleningen kunnen verstrekt worden van maximaal 30.000 euro (voor de nieuwe projectoproep in 2022 zal dit bedrag worden opgetrokken tot maximaal 50.000 euro). Deze noodkooplening dient pas te worden terugbetaald bij vervreemding van de woning, of uiterlijk na 20 jaar (voor de nieuwe projectoproep in 2022 zal dit worden opgetrokken tot 25 jaar), gespreid over een periode van 20 jaar.

Dit project wordt volledig gefinancierd met reguliere middelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	40.000.000 EUR
Output	Minimaal 850 gerenoveerde noodkoopwoningen die voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, vermeld in artikel 3.1 van de Vlaamse codex Wonen.
Outcome	Energiebesparing bij de minimaal 850 gerenoveerde noodkoopwoningen en overeenkomstige broeikasgasemissiereductie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er werd een nieuwe evaluatie uitgevoerd op basis van de laatste call in 2021. Momenteel loopt een besluitwijziging om het maximale ontleningsbedrag te verhogen tot 50.000 euro en de terugbetalingstermijn te verlengen van 20 tot 25 jaar.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Noodzakelijke
politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Evaluatie NKF + formuleren optimalisatievoorstellen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Lancering projectoproep 2021	2021 Q3	Gerealiseerd	
Projectoproep 2021 gegund	2021 Q4	Gerealiseerd	
Evaluatie call 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	
Goedkeuring VR optimalisatievoorstellen	2022 Q2	Op schema	Besluitwijziging lopende
Lancering projectoproep 2022	2022 Q3	Op schema	
Projectoproep 2022 gegund	2022 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
gerenoveerde noodkoopwoningen	125	2026 Q4		
Gerenoveerde noodkoopwoningen	725	2027 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	40.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	40.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 40.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - BVR](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - nota](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - bijlage](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - advies](#)

[VR 16 juli 2021 - nota](#)

[VR 16 juli 2021 - BVR](#)

VV175 - UITBREIDINGSBUDGET VOOR WELZIJN EN ZORG

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De inzet van de bijkomende middelen wordt tripartite afgesproken in het kader van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025, waarbij zowel werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties betrokken zijn. De middelen worden ingezet ten behoeve van het personeel en de gebruikers in de betrokken sectoren. Het uitbreidingsbeleid welzijn en zorg kent een ruimer spectrum aan belanghebbenden en richt zich op de bredere Vlaamse bevolking, in de eerste plaats mensen met een zorgnood of vraag naar andere ondersteuning.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

De Vlaamse Regering voorziet naast het VIA-budget van 577 miljoen euro ook 562,5 miljoen extra middelen voor uitbreidingsbudget voor Welzijn en zet deze versneld in. In totaal wordt zo in het relanceplan "Vlaamse Veerkracht" 1,1 miljard euro voorzien voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector.

Deze middelen worden ingezet voor:

- Betere verloning van het zorgpersoneel en aantrekkelijker maken van beroep (o.m. via positieve beeldvorming, werken op zijinstroom, extra omscholing tot verpleegkundigen, enz.);
- Capaciteit: extra uitbreiding van het zorgaanbod in allerlei sectoren;
- Kwalitatieve verbeteringen, verlichting van de werkdruk enz.;
- Hervormingen: IFIC, ontschotting enz.

Via het uitbreidingsbeleid wordt bijkomend geïnvesteerd in personen met een handicap, de ouderenzorg (meer personeel en betaalbaarheid), jeugdhulp, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, gezondheidsbeleid en preventie.

Uitbreidingsbeleid (opstap 2020 + op kruissnelheid in 2024):

- Personen met een handicap: 270 mio euro;
 - Ouderenzorg: 140 mio euro;
 - Jeugdhulp: 61,4 mio euro;
 - Kinderopvang: 58 mio euro;
 - Geestelijke gezondheidszorg: 18,6 mio euro;
 - Preventie en gezondheidsbeleid: 14,5 mio euro;
- Totaal: 562,5 mio euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.139.500.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Betere loonvoorwaarden: naar een gefaseerde invoering of uitrol van IF.IC (nieuwe functieclassificatie met bijhorend loonhuis); - Betere arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijker maken van beroep: o.m. via thuiswerk, verlaging werkdruk, opleiding, positieve beeldvorming, werken op (zij-)instroom, extra omscholing tot verpleegkundigen, ... - Extra personeel, los van het uitbreidingsbeleid: ca. 3.000 VTE; - Extra uitbreiding van het zorgaanbod in allerlei sectoren: zie uitbreidingskalender.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Betere verloning van het zorgpersoneel. - Aantrekkelijker maken van het zorgberoep. - Extra uitbreiding van het zorgaanbod in verschillende sectoren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De middelen voor VIA 6 en het uitbreidingsbeleid 2022 zijn in de begroting 2022 voorzien, de verdere uitrol van het uitbreidingsbeleid is voorzien in de meerjarenraming.</p> <p>Het voorakkoord VIA 6 werd gesloten op 24/11/2020. Er werd op 30/03/2021 een akkoord bereikt over het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025.</p> <p>Een BVR over de eerste fase van de verdeling van de VIA-middelen voor 2022 is in voorbereiding.</p> <p>Het uitbreidingsbeleid wordt stapsgewijs ingevuld volgens de in de Vlaamse Regering bepaalde prioriteiten en de ter beschikking gestelde budgetten.</p> <p>Een aantal engagementen uit het uitbreidingsbeleid worden versneld uitgevoerd. Over de belangrijkste componenten hierin wordt apart gerapporteerd in de projecten VV045 (ouderenzorg) en de projecten VV121 en VV180 (personen met een handicap).</p>
Noodzakelijke politieke actie	De Vlaamse Regering dient nog herverdelingsbesluiten goed te keuren voor het verdelen van de middelen voor 2022-2025.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Van voorakkoord naar akkoord	2021 Q3	Gerealiseerd	
Verdeling middelen 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering door sociale partners via CAO's en protocollen 2021-2025	2025 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Verdeling middelen 2022-2025	2025 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.139.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.139.500.000 EUR
Uitvoering VAK	358.638.562 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 1.139.500.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 2711 MED.0378: Voorakkoord zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 24/11/2020 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025](#)

[VR 2020 2711 MED.0378: Voorakkoord zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 24/11/2020 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025 - bijlage](#)

[VR 2020 1812 DOC.0075: Decreet uitgavenbegroting voor begrotingsjaar 2021](#)

[VR 2021 0204 MED.0131/1: Definitief akkoord VIA6 goedkeuring - mededeling](#)

[VR 2021 0204 MED.0131/1: Definitief akkoord VIA6](#)

[VR 2021 1607 DOC.0967-1: Verdeling budget VIA6 private WVG, WSE en publ. PVT voor het jaar 2021](#)

[VR 2021 1607 DOC.0967-2: Verdeling budget VIA6 private WVG, WSE en publ. PVT voor het jaar 2021 - BVR](#)

[VR 2021 1211 DOC.1272-1 socioQ publiek Herverdeling - nota](#)

[VR 2021 1211 DOC.1272-2 SocioQ publiek Herverdeling - BVR](#)

VV176 - ZIJNSTROOM VANUIT DE PRIVÉSECTOR NAAR HET ONDERWIJS AANTREKKELIJK MAKEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Toekomstige zijinstromers, scholen en schoolteams

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING

We maken vanaf 1/9/'20 zijnstroom vanuit de privésector naar het onderwijs aantrekkelijker voor een aantal knelpuntvakken- en ambten in het basis- en secundair onderwijs door de in de privésector opgebouwde geldelijke anciënniteit voor nieuwe zijinstromers te honoreren voor maximum 8 jaar. We willen met deze maatregel extra zijinstromers aantrekken en zo het lerarentekort mee helpen wegwerken. Met terugwerkende kracht - vanaf 1/12/'21 - breiden we deze maatregel uit. Enerzijds door een aantal vakken en ambten toe te voegen aan de knelpuntenlijst, anderzijds door het maximum aantal jaren anciënniteit dat kan worden meegenomen vanuit de privésector op te trekken van 8 naar 10 jaar.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.000.000 EUR
Output	Na het eerste jaar was er 2.000.000 Euro reeds aangewend budget
Outcome	Door de uitbreidingen enerzijds en door de aandacht voor deze maatregel in de media zien we een stijging van het aantal aanvragen. De voorbije twee schooljaren konden al minstens 1.100 zijinstromers die de overstap maakten van de privésector naar één van de opgenomen knelpuntvakken en -ambten genieten van deze maatregel.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De maatregel wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2021 uitgebreid: enerzijds worden een aantal vakken en ambten toegevoegd aan de knelpuntenlijst, anderzijds wordt vanaf 1 december 2021 het maximum aantal jaren dienstanciënniteit dat kan worden meegenomen vanuit de privésector opgetrokken van 8 naar 10 jaar.</p> <p>De Vlaamse regering keurde op 11 maart 2022 het ontwerp van besluit tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen een 2e keer principieel goed met het oog op de adviesaanvraag bij de Raad</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	van State en gaf daarbij de toestemming om over een aantal wijzigingen reeds te communiceren, o.a. over deze uitbreiding van de zijinstroom.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALLEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Basisonderwijs: 383 FTE - 455 stamnummers Secundair onderwijs: 292 FTE – 495 stamnummers	2021 Q2	Gerealiseerd	
Monitoring van de maatregel in 2021	2021 Q3	Gerealiseerd	
Uitbreiding lijst knelpuntvakken- en ambten	2022 Q3	Op schema	Het ontwerp van besluit werd een 2e keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op de adviesaanvraag bij de Raad van State. Bij die goedkeuring gaf de regering toestemming om reeds te communiceren over de uitbreidingen.
Monitoring van de maatregel in 2022	2022 Q3	Op schema	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 4.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 11/03/2022 tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis-en secundair onderwijs te herwaarderen](#)

VV177 - IMPLEMENTATIE VAN DE VLAAMSE JOBBONUS

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Werkende Vlamingen en Vlamingen die aan het werk willen gaan, sociale partners, nog andere te bepalen stakeholders

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING

Werken moet lonen. Om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten en tevens de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen, wordt er vanaf 2021 een Vlaamse jobbonus ingevoerd. Die bedraagt netto maximaal 600 euro op jaarbasis voor mensen die voltijds werken en hierbij tot maximaal 1.800 euro bruto per maand verdienen. Het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt vervolgens uitgefaseerd richting een bruto maandloon bij voltijdse prestatie van 2.500 euro. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt rekening gehouden met het werkelijk aantal gepresteerde uren.

De jobbonus heeft de dubbele doelstelling om mensen enerzijds te activeren en anderzijds werken te belonen. De maatregel is bedoeld om meer mensen aan de slag te krijgen en te houden; in het bijzonder voor mensen met lage inkomens is het verschil tussen werken en niet werken vaak te klein om aan de slag te gaan of aan de slag te blijven.

Naast de jobbonus voor loontrekkenden komt er ook een jobbonus + voor zelfstandigen. De jobbonus + richt zich op werknemers met een laag inkomen (< 2.500 bruto per maand, afgestemd op de bovengrens van de jobbonus) die de transitie maken van werknemer naar ondernemer in hoofdberoep. De jobbonus+ is voor de laatste groep een stimulus om de transitie naar ondernemerschap in hoofdberoep te maken. In die zin wordt de jobbonus verlengd voor wie de overstap maakt naar ondernemer in hoofdberoep door een premie van €600 euro bij opstart als zelfstandige in hoofdberoep (mits men voldoet aan de voorwaarden) en een bijkomende premie van €600 wanneer men na 1 jaar nog steeds zelfstandige in hoofdberoep is.

De jobbonus en de jobbonus plus zijn dus sterk met elkaar gecorreleerd en als één geheel te beschouwen. De jobbonus richt zich tot de loontrekkenden waar de jobbonus wordt berekend op basis van het loon en het tewerkstellingspercentage. Voor de zelfstandigen is er geen tewerkstellingspercentage beschikbaar en spreken we niet van een loon maar een inkomen. Voor de zelfstandigen werd er aldus geopteerd om te werken met een vaste premie gekoppeld aan de start als zelfstandige in hoofdberoep en het blijven uitoefenen van deze activiteit, de jobbonus plus voor startende zelfstandigen.

Er wordt eveneens een toepassing ontwikkeld om het uit te betalen bedrag te kunnen bepalen op basis van input uit authentieke bronnen waar beschikbaar en manuele invoer waar niet beschikbaar. De ontwikkeling van deze toepassing is opgenomen in VV128.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	197.000.000 EUR
Output	Aantal uitbetaalde jobbonussen en jobbonus+
Outcome	Aanmoedigen van mensen met lage inkomens om aan de slag te gaan of aan het werk te blijven. Aanmoedigen om als werknemer met een laag inkomen de stap te zetten naar zelfstandige in hoofdberoep.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De jobbonus is een nieuwe beleidsmaatregel waarmee de Vlaamse Regering wil tegemoet komen aan de landenspecifieke aanbevelingen vanuit de Europese Commissie om werkenden een bijkomende positieve financiële prikkel te geven om aan het werk te gaan of te blijven. De doelgroep van de jobbonus bestaat uit personen met een laag beroepsinkomen. Er wordt gekozen voor een premie die toegekend wordt op basis van het loon op jaarbasis. Het decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 20 mei 2022. Het BVR tot uitvoering van het decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 april 2022. Naast de jobbonus voor werknemers zullen ook werknemers met een laag inkomen die ondernemer worden een jobbonus+ of starterspremie ontvangen. Die premie moet het ondernemerschap stimuleren door in de jobbonus nog voor twee jaar te verlengen (twee maal een schijf van 600 euro). Het decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus aan startende zelfstandigen werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 11 maart 2022. Het wetgevend traject voor het BVR is opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	De fiscale vrijstelling van de jobbonus is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen starten met de uitbetaling van de maatregel. De fiscale vrijstelling wordt gevraagd aan de Federale overheid voor de jobbonus, en de jobbonus+. Aan Federaal Minister Lalieux wordt gevraagd om de jobbonus vrij te stellen als een bestaansmiddel bij het toekennen van het leefloon.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Definitieve goedkeuring decreet jobbonus	2022 Q2	Gerealiseerd	
Definitieve goedkeuring decreet jobbonus+	2022 Q3	Op schema	
Definitieve goedkeuring BVR jobbonus	2022 Q2	Op schema	
Definitieve goedkeuring BVR jobbonus+	2022 Q3	Op schema	
Eerste betaling loontrekkenden	2022 Q4	Nog niet gestart	
Eerste betaling ondernemers	2022 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uitbetaalde jobbonussen	716.601 voor het referentiejaar 2021	2022 Q4		
Aantal uitbetaalde jobbonus+ (timing afhankelijk van afbakening doelgroep in decreet/BVR)	Geraamd wordt dat er 11.258 personen recht zouden hebben op de eerste schijf in het opstartjaar 2022	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	329.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	197.000.000 EUR
Uitvoering VAK	181.641.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 197.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Voorontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus principieel goedgekeurd op de VR van 19 november 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6196B673364ED9000800028E • Ontwerp van decreet: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6196B67F364ED90008000290 • Memorie van toelichting: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6196B68F364ED90008000292 <p>Voorontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus voor de tweede keer principieel goedgekeurd op de VR van 23 december 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61C479DE364ED900080006B8 • Ontwerp van decreet : https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61C479DE364ED900080006B7 • Memorie van toelichting: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61C479DE364ED900080006B6 • Advies SERV: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61C479DE364ED900080006B5

AGENDERING VLAAMSE REGERING

- Advies VTC: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61C479DE364ED900080006B5>

Voorontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus definitief goedgekeurd op de VR van 11 maart 2022

- Nota Vlaamse Regering: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62270E8D6BB7B593CFC182A3>
- Ontwerp van decreet: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62270E8D6BB7B593CFC182A4>
- Memorie van toelichting: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62270E8D6BB7B593CFC182A2>
- Advies Raad van State: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62270E8D6BB7B593CFC182A1>

Bekrachtiging ontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus op de Vlaamse Regering van 20 mei 2022: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6286053E479218B0ED55BCEC>

Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus principieel goedgekeurd op de VR van 1 april 2022: [BVR](#) + [nota Vlaamse Regering](#)

[Mededeling aan de Vlaamse Regering betreffende conceptnota Jobbonus+ en transitiepremie voor startende zelfstandigen goedgekeurd op de VR van 19 november](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV128 - Digitale vaardigheden](#)

VV178 - EXTRA ZUURSTOF VOOR INDIVIDUEEL CREATIEF TALENT - MEESTERSCHAP

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Subsidieaanvragers Circusdecreet, Kunstendecreet, Reglement doorgeven vakmanschap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Via het Kunstendecreet, het Circusdecreet en het reglement 'beurzen voor het doorgeven van vakmanschap' geeft de Vlaamse overheid extra zuurstof aan individueel creatief talent en meesterschap, onder de vorm van beurzen en projectsubsidies, waarbij via bijkomende middelen ook extra beleidsimpulsen worden gegeven. Deze subsidies geven een brede waaier aan creatievelingen groeikansen en ademruimte om hun talent verder te ontwikkelen, van kunstenaars tot ambachtslieden en zij die bij hen in de leer willen gaan.</p> <p>In het Kunstendecreet gaat het om (professionele) kunstenaars, die een beurs (kortlopend of meerjarig) kunnen aanvragen, of een projectsubsidie (met een maximumlooptijd van drie jaar). Een beurs dient als financiële ondersteuning voor kunstenaars die nieuwe ideeën willen ontwikkelen of andere wegen willen verkennen. Een projectsubsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van artistieke initiatieven die beperkt zijn in tijd en doelstelling.</p> <p>De ontwikkelingsbeurzen binnen het Circusdecreet maken uitzonderlijke inspanningen of een professioneel traject voor circusartiesten mogelijk, voor maximum een jaar. Het proces, het onderzoek en het artistieke experiment primeren op een concrete productie. Het groeipotentieel en concrete verwachtingspatroon van de kunstenaar zijn cruciaal. Het begrip circusartiest krijgt een brede invulling waarmee ook technische, pedagogische en dramaturgische opleidingen aan bod kunnen komen.</p> <p>De beurzen voor het doorgeven van vakmanschap situeren zich binnen het beleid rond 'immaterieel cultureel erfgoed'. Vakmanschap met wortels in traditie kan worden doorgegeven in zogenaamde 'meester-leerling-trajecten'; een meester en één of meerdere leerling (en) gaan samen een traject aan van maximum twee jaar, waarbij kennis en vaardigheden worden doorgegeven, in diverse domeinen (bv ambachten, muziek-en podiumkunsten, agrarische technieken, culinair erfgoed, etc).</p> <p>Naast andere subsidies, die eerder gericht zijn op de ondersteuning van organisaties, investeert de Vlaamse overheid met deze instrumenten rechtstreeks in het menselijk kapitaal binnen de cultuursector, met een focus op de ontwikkeling van mensen. Door creatievelingen te stimuleren, ontstaat later ook weer nieuw werk, waar het brede publiek op haar beurt weer volop kan van genieten.</p> <p>De voorziene budgetten voor deze subsidielijnen kunnen worden geraadpleegd via de BBT Cultuur.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	Aantal toegekende subsidies en beurzen is afhankelijk van aantal aanvragen en beschikbaar budget
Outcome	-kansen geven aan individuele kunstenaars om de eigen praktijk te ontwikkelen/parcours uit te stippelen -kansen geven aan vaklieden/ambachtlieden om vakmanschap door te geven en te verwerven, opdat dit immaterieel erfgoed niet verloren gaat, en om het in nieuwe toepassingen te gebruiken -goed opgeleide circusdocenten voor de markt hebben

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	-Wat betreft beurzen binnen het Kunstendecreet: Voor de eerste aanvraagronde beurzen binnen het nieuwe Kunstendecreet, met uiterste indiendatum op 15 mei 2022, voor initiatieven die van start gaan in de periode september tot december 2022, werden 249 aanvragen ingediend: 125 aanvragen voor een beurs opkomend talent en 124 voor een beurs bewezen talent. Er zijn drie rondes voor residentiebeurzen afgewerkt, waarbij er in totaal 17 beurzen zijn aangevraagd waarvan er 8 beurzen werden toegekend. -Wat betreft beurzen binnen het Circusdecreet: Bij de oproep van 15/2/2022 werd 1 ontwikkelingsgerichte beurs toegekend van 3.600 euro voor het volgen van een pedagogische circusopleiding in Brussel. Dat was ook de enige aanvraag. Volgende oproep is 15/6/2022. -Voor de beurzen voor het doorgeven van vakmanschap werd begin april de indienronde 2022 gelanceerd, met een indiendatum op 15/9/2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering oproepen beurzen Circusdecreet 2021 (15/10, 15/2/15/6)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering oproep beurzen vakmanschap 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering oproepen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet 2021 (15/3 en 15/9)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Oproepen beurzen Circusdecreet 2022 (15/10, 15/2, 15/6)	2022 Q4	Op schema	
Oproep beurzen vakmanschap 2022	2022 Q4	Op schema	
Oproepen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet 2022 (indiendata 15/5 en 15/9)	2022 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Oproepen beurzen circusdecreet 2023 (15/10, 15/2, 15/6)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Toekenningen beurzen circusdecreet (3 aanvraagrondes per jaar: 15/10, 15/2 en 15/6)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Toekenningen beurzen doorgeven vakmanschap (jaarlijks een indienronde 15/9)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Toekenningen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet (twee oproepen per jaar, 15/3 en 15/9, zowel voor beurzen als projecten)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oproepen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet 2023 (indiendata 15/3 en 15/9)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oproep beurzen vakmanschap 2023	2023 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	8.087.000 EUR
Uitvoering VEK	7.881.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV179 - INSPANNINGEN OM INVESTERINGEN AAN TE TREKKEN VERHOGEN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	De belanghebbenden zijn buitenlandse investeerders met investeringsplannen die potentieel in Vlaanderen kunnen landen.

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING

Tevens versterken we onze inspanningen om investeringen aan te trekken, o. a. door Vlaanderen te promoten bij investeerders als innovatieve kennisregio met behulp van gespecialiseerde consultants in 15 toplanden en virtuele site visits met behulp van verbeterde technologie; de Brexit is ook een opportuniteit om bepaalde logistieke activiteiten aan te trekken (Vlaanderen als “gateway to Europe”)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	<p>De maatregelen uit deze actie zijn een aanvulling op VV108. VV108 wordt gefinancierd via de Brexit Adjustment Reserve waarbij (op aangeven van de Commissie van de EU) steeds een directe link met het VK aangetoond moet worden. De maatregelen uit de actie VV179 hebben in het kader van de relance een zelfde doel als deze onder VV108 maar zijn wereldwijde acties die zich niet beperken tot het VK. De output van VV179 is identiek aan deze van VV108, nl:</p> <p>In een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders willen we snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.</p>
Outcome	Behoud en groei van het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Vlaanderen is een bijzonder opdracht die sterk fluctueert met de staat van de wereldeconomie. Na de Corona pandemie die wereldwijd wat meer onder controle lijkt te zijn, wordt de mondiale economie momenteel gekenmerkt door een moeilijke conjuncturele situatie ten gevolge van de post-corona elementen (oa reizen vanuit China en India richting Europa blijft

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	beperkt), de onzekerheid omwille van de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie en tekorten in grondstoffen en materialen zoals ertsen, staal, Het investeringsklimaat blijft daarom wisselvallig en onstabiel. Reden te meer voor FIT om haar actieve politiek van detectie van potentiële investeerders verder uit te voeren en aan te vullen met de extra maatregelen die onder VV108 voorzien worden. Dit leverde in ieder geval mooie resultaten op voor Vlaanderen in 2021: 295 nieuwe investeringsprojecten, goed voor 6233 directe nieuwe jobs en 2,86 Mia euro investeringsbedrag.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALLEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
----------	--------	--------	---------------------

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
<p>De maatregelen uit deze actie zijn een aanvulling op VV108.</p> <p>VV108 wordt gefinancierd via de Brexit Adjustment Reserve waarbij (op aangeven van de Commissie van de EU) steeds een directe link met het VK aangetoond moet worden.</p> <p>De maatregelen uit de actie VV179 hebben in het kader van de relance een zelfde doel als deze onder VV108 maar zijn wereldwijde acties die zich niet beperken tot het VK.</p> <p>De output van VV179 is identiek aan deze van VV108, nl:</p> <p>In een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders willen we snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.</p>		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 1812 DOC.1581/1BIS](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV108 - Subsidies aan bedrijven \(financiële steun voor bedrijven, kostenverlaging voor deelname aan beurzen, ondersteuning voor Brexit\) + inzet van consultants om Vlaanderen in het buitenland te promoten](#)

VV180 - WACHTLIJSTEN GEHANDICAPTENZORG

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	personen met een handicap

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING

Fase 2 van de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid voor het wegwerken van de wachtlijsten: Door de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid wordt een perspectief geboden aan personen met een handicap om sneller een budget te verkrijgen zodat ze de nodige zorg kunnen inkopen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	130.000.000 EUR
Output	In fase 1 van de vooruitschuif werd aan 2.502 erkende personen met een handicap in prioriteitengroep 1 een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld waarmee ze hun zorgbehoefte kunnen invullen (zie VV121). In fase 2 wordt verder ingezet op deze weg en wordt de termijn waarbinnen een PVB wordt ter beschikking gesteld na het indienen van een aanvraag beperkt gehouden, met een richtlijn van maximaal 18 maanden.
Outcome	Personen met handicap met een ondersteuningsvraag in prioriteitengroep 1 zullen binnen een beperkte tijdspanne een terbeschikkingstelling van een PVB ontvangen. waarmee ze zorg kunnen inkopen. (zie ook VV121)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Aan een eerste groep personen met een handicap uit prioriteitengroep 1 met een aanvraagdatum uiterlijk op 31/12/2020 werd een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld. Het gaat om 2.502 personen. In 2022 zal ook een persoonsvolgend budget worden ter beschikking gesteld aan personen die een aanvraag hebben ingediend uiterlijk op 30/6/2021 en ingedeeld in prioriteitengroep 1 en aan een laatste groep van 284 personen die een aanvraag hadden ingediend in 2020.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Fase 2 toekenning bijkomende budgetten aan personen met een handicap	2022 Q2	Op schema	Aan een eerste groep van personen met een handicap die een aanvraag hadden ingediend voor een PVB uiterlijk op 31/12/2020 werd aan PVB ter beschikking gesteld. In 2022 wordt aan de personen die en aanvraag hebben ingediend in de eerste jaarhelft van 2021 een PVB ter beschikking gesteld.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aan 2.502 erkende personen met een handicap in prioriteitengroep 1 hebben werd een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld. het gaat om de personen die een aanvraag hadden ingediend uiterlijk op 31/12/2020.	2.786	2022 Q2	2.502	90 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	130.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	130.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 130.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Uitrol uitbreidingsbeleid 2021 met het oog op perspectief bieden aan de personen met een handicap met ondersteuningsnoden](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV121 - Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1](#)



DEPARTEMENT
**KANSELARIJ &
BUITENLANDSE ZAKEN**

Havenlaan 88 bus 100
1000 Brussel
www.vlaanderen.be
