

Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Factsheet

Meetmoment december 2024

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	3
2	Kerncijfers meetmoment 31 december 2024	4
2.1	Projectvoortgang	4
2.2	Projectvoortgang per speerpunt	5
2.3	Vastleggingen en vereffeningen	6
3	Status van de VV-Projecten	8

1 INLEIDING

In 2020 trof de COVID-19-pandemie Vlaanderen en de wereld hard. De vorige Vlaamse Regering besliste in september 2020 om **4,3 miljard euro extra** te investeren om het economische en maatschappelijke weefsel te herstellen, en ze deed dit ook met reguliere middelen in zorg (bv. uitbreidingsbudget), werk (bv. jobbonus) en onderwijs (scholenbouw). Het Relanceplan '[Vlaamse Veerkracht](#)' was daarmee het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers zette.

Om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te verzachten, creëerde de Europese Unie een herstellfonds - [NextGenerationEU](#). Het biedt de lidstaten rechtstreekse steun en leningen - de **Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV)**. Voor België was er aanvankelijk een maximum van 5,9 miljard euro steun voorzien. Eind juni 2022 stelde de Europese Commissie dit totaalbedrag voor België bij naar beneden, naar 4,52 miljard euro, waarvan 1,72 miljard euro naar Vlaanderen gaat. Op 8 december 2023 heeft de ECOFIN-raad het aangepaste Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) goedgekeurd. De verminderde Europese financiering heeft echter **geen invloed** op de volledige uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.


Sinds 2022 veranderde de context waarin het Vlaams herstelbeleid zich afspeelt drastisch. De **inval van Rusland in Oekraïne** heeft wereldwijde gevolgen waar ons herstelbeleid niet aan ontsnapt. Ook de mondiale **handelstarievenstrijd** stelt Vlaanderen sinds kort voor bijzonder uitdagingen. Omdat veel van de maatregelen uit Vlaamse Veerkracht een antwoord op de vraagstukken die uit deze crisissen naar voren komen, wil ook deze Vlaamse Regering de **monitoring** van de uitvoering van Vlaamse Veerkracht verderzetten. Zo is ook de continuïteit van de informatie over deze investeringen richting het parlement en de burger gegarandeerd.

Zoals het Rekenhof ook aanbeveelt, wordt deze monitoring vanaf de huidige legislatuur een stuk **compact**er opgevat, met deze factsheet die het voortgangsrapport begeleidt. In dat voortgangsrapport kreeg elke projectfiche van de projecten VV001 tot en met VV158, en VV181, een update. Dit zijn de projecten gefinancierd via het Relancebudget van 4,3 miljard euro. De projecten VV159-180 worden op reguliere middelen uitgevoerd en zijn niet langer in de monitoring meegenomen.

Deze factsheet geeft de kerncijfers van **het zevende meetmoment van 31 december 2024** met een blik op de voortgang van het volledige programma en een detailoverzicht over de voortgang van de RRF-projecten. We staan ook kort stil bij de budgettaire situatie en de wijze waarop omgegaan wordt met niet aangewende kredieten. Anders dan bij vorige metingen zijn bij deze meting de gegevens over de financiële situatie bij sluiting van het boekjaar op 31/03 weergegeven, waardoor deze als definitief kunnen beschouwd worden.

2 KERNCIJFERS MEETMOMENT 31 DECEMBER 2024

2.1 PROJECTVOORTGANG

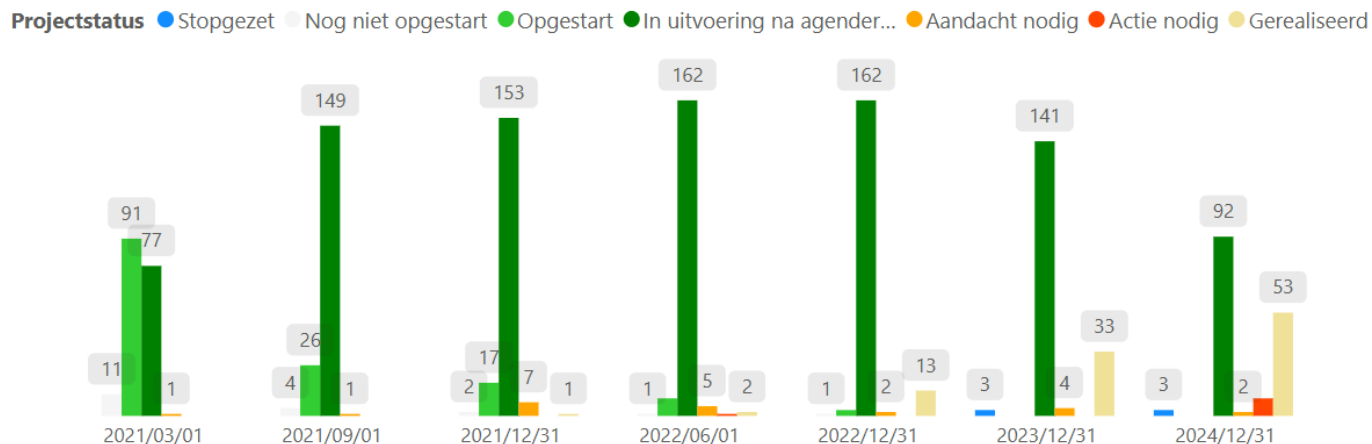

Bovenstaande figuur geeft de status van de 159 projecten op relancemiddelen weer over de voorbije meetmomenten. Men kan vaststellen dat een steeds groter aandeel van de projecten de status 'gerealiseerd' krijgt. Sinds vorige meting is dat aantal quasi verdubbeld. 53 projecten worden nu als volledig voltooid beschouwd. Drie projecten werden ook stopgezet. Dit zijn de projecten:

- VV093 | Nieuwe huisvesting en depotruimte voor het Vlaams Architectuur Instituut, wat omwille van de disruptief gestegen meerkosten niet langer financieel haalbaar was.
- VV100 | Achterstand bij subsidies tegen leegstand verminderen, waar financiële ondersteuning voor de sanering van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten de facto is stopgezet met ingang van 1 januari 2025..
- VV010 | Sociale woningbouw, wat op reguliere middelen werd gerealiseerd.

Van de 103 projecten die nog in uitvoering zijn er 92 op schema, 2 hebben er aandacht nodig, en voor 9 is er een actie vereist:

- Aandacht is nodig voor VV098 | Versnelling Opera Gent en VV085 | Kursaal Oostende; voor beide projecten is de timing een aandachtspunt.
- Actie is nodig voor projecten VV077 | Belfort Aalst, VV086 | Masterplan Schouwburg Kortrijk, VV088 | MOOOV Turnhout, VV090 | Museumsite De Zwijgershoek Sint-Niklaas, VV091 | Nieuwbouw de


¹ De status 'gerealiseerd' wordt gegeven aan projecten op basis van hun inhoudelijke voortgang (projectstatus en/of status van de onderliggende mijlpalen en outputindicatoren). Er moet hier dan ook een onderscheid gemaakt worden met de status van de vereffeningen. Het is mogelijk dat om technische redenen nog aanrekeningen volgen nadat een project als 'gerealiseerd' wordt aangeduid. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een project reeds volledig vereffend is, maar nog niet 'gerealiseerd' indien extra (reguliere) kredieten werden aangewend om de doelstelling van het project te behalen.

Kopergietery Gent, VV094 | Kunstenwerkplaats 'KC Groenplein' Hasselt, VV096 | Schouwburg Boom, VV104 | Veerkrachtige steden na Corona (extra oproep Stadsvernieuwing) en VV156 | Jeugdinfrastructuur.

Het betreft hier bouwprojecten of projectoproepen die vertraging oplopen, wat vaak inherent is aan dit type investeringen. Redenen die opgegeven worden zijn budgettaire of juridische obstakels die opduiken, een vergunningsproblematiek, of wijzigen qua programma of scope van het project. Dit leidt in bepaalde gevallen tot het tijdelijk stopzetten of hernemen van projectfasen. Meer algemeen zijn vertraging of budgetoverschrijdingen ook te wijten aan economische en geopolitieke ontwikkelingen die nog niet duidelijk waren bij de subsidieaanvraag (stijging materialenkost, langere leveringstijden, enz. naar aanleiding van de Oekraïne- en energiecrisis).

Voor VV104 | Veerkrachtige Steden na Corona, heeft de VR op 4 april 2025 reeds een [verlenging](#) van de projecten goedgekeurd (zonder bijkomende middelen). Ook voor de culturele infrastructuur werd intussen op 7 februari 2025 een wijziging van de [subsidiebesluiten](#) door de VR goedgekeurd.


2.2 PROJECTVOORTGANG PER SPEERPUNT

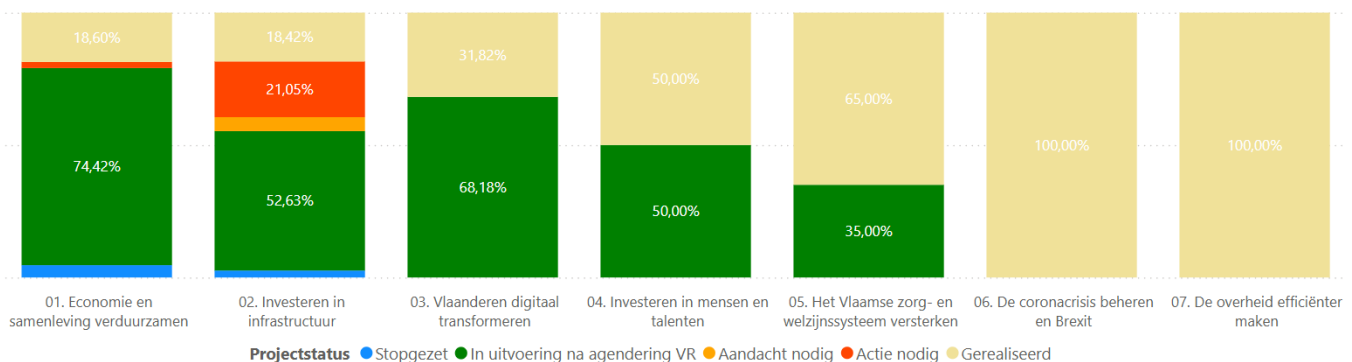

Hierboven wordt de projectvoortgang per speerpunt weergegeven. De speerpunten 06 (de coronacrisis beheren en Brexit) en 07 (de overheid efficiënter maken) worden als **gerealiseerd** beschouwd. In speerpunten 04 (investeren in mensen en talenten) en 05 (het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken) is het aandeel gerealiseerde projecten al gevorderd tot de helft of meer van de projecten. De speerpunten waar nog het grootste aandeel projecten **in de fase van uitvoering zit**, zijn de eerste drie, namelijk 01 (economie en samenleving verduurzamen), 02 (investeren in infrastructuur) en 03 (Vlaanderen digitaal transformeren). Dit is niet onlogisch, gezien het grotere aandeel investeringsprojecten met een langere doorlooptijd in deze speerpunten. Binnen speerpunt 02 valt ook op dat voor een vrij groot aandeel van de projecten aandacht of actie vereist is.


2.3 VASTLEGGINGEN EN VEREFFENINGEN

Uitvoering VAK %

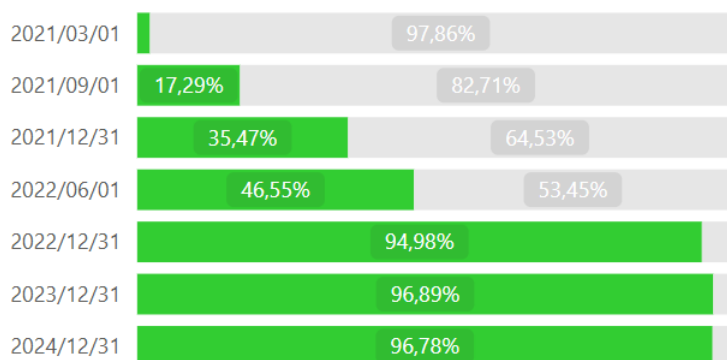

Op het vlak van vastlegging is sinds vorige metingen uiteraard weinig veranderd. Dit heeft te maken met de **vastleggingsdeadline** op 31/12/22 die voor de projecten op relancemiddelen van toepassing was. Zoals toegelicht bij meting 6 zijn er in 2023 nog een aantal bijstellingen geweest n.a.v. definitieve uitvoeringsgegevens uit de jaarrekening, correcties voor fout gerapporteerde interne stromen, reguliere instroom en annuleringen. Vanaf 2024 zijn de correcties op de VAK uitvoering nagenoeg volledig te verklaren door annuleringen, m.a.w. vastleggingen die niet meer zullen worden vereffend.

Uitvoering VEK %

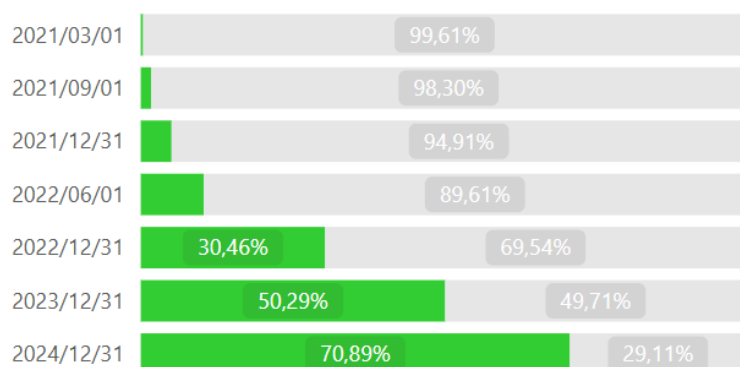

Bovenstaande grafiek geeft de stand van de vereffeningen weer ten opzichte van de oorspronkelijke beleidsruimte.

De vereffeningen stijgen mee met de uitvoering van de projecten. Daar zien we dat de trend van vorige metingen zich doorzet, met opnieuw een stijging van het vereffeningenkrediet (VEK) met 20% ten opzichte van de vorige meting. 71% van de middelen was op 31/12 van vorig jaar uitgegeven. Ten opzichte van de VAK uitvoering is dit een vereffeningpercentage van 73%.

Zoals aangegeven in meting 5 (2022) fungeert de VAK uitvoering als nieuwe noemer voor de rapportering aangezien er (behoudens voor de BAR-projecten) geen nieuwe vastleggingskredieten werden ingeschreven in 2023 en 2024.

Beleidsruimte	Uitvoering VAK	Uitvoering VEK
4302795K	4164175K	3050074K

De totale beleidsruimte van 4,3 miljard euro is hiermee voor 4,16 miljard euro vastgelegd en voor 3 miljard euro ook effectief vereffend.

3 STATUS VAN DE VV-PROJECTEN

.Hieronder volgt een overzichtstabel met de 160 projecten gefinancierd via de Relanceprovisie en hun projectstatus / VAK / VEK / VEK% ten opzichte van het VAK.

Projectnr.	Projecttitel	Projectstatus	VAK (k euro)	VEK (k euro)	VEK t.o.v. VAK
VV001	Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie	In uitvoering na agendering VR	23.000	8.816	38,33%
VV002	Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie	In uitvoering na agendering VR	3.000	1.066	35,53%
VV003	Asbestpremie daken residentieel met isolatie	In uitvoering na agendering VR	20.200	13.326	65,97%
VV004	Circulaire economie - asbest (lokale besturen)	In uitvoering na agendering VR	27.600	19.246	69,73%
VV005	Circulaire economie - asbest (sectorprotocollen)	In uitvoering na agendering VR	12.218	6.586	53,90%
VV006	Mijn Verbouwpremie	In uitvoering na agendering VR	180.000	179.188	99,55%
VV007	Batterijpremie	Gerealiseerd	57.847	57.848	100,00%
VV008	EPC-labelpremie residentieel	In uitvoering na agendering VR	25.350	24.816	97,89%
VV009	Renovaties sociale woningen versnellen	Gerealiseerd	25.000	22.089	88,36%
VV010	Sociale woningbouw	Stopgezet	0	0	
VV011	VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid	In uitvoering na agendering VR	19.999	19.775	98,88%
VV012	Verlenging en uitbreiding sloop- en heropbouwpremie	In uitvoering na agendering VR	14.415	12.564	87,16%
VV013	De inrichting van een groter en veiliger fietsnetwerk (incl. fietstoegang economische poorten en jaagpaden) maakt van de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel en helpt zo het gebruik van personenwagens te reduceren	Gerealiseerd	252.053	159.465	63,27%
VV014	Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen	In uitvoering na agendering VR	156.677	25.698	16,40%
VV015	Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong)	Gerealiseerd	374.816	373.807	99,73%
VV016	Activering-verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC	Gerealiseerd	14.000	13.845	98,89%
VV017	Extra aandacht meest kwetsbaren	In uitvoering na agendering VR	89.954	87.425	97,19%
VV018	Opleidingsoffensief arbeidsmarkt	In uitvoering na agendering VR	114.661	101.297	88,34%
VV019	Versterken Levenslang Blijven Leren	In uitvoering na agendering VR	55.727	52.751	94,66%
VV020	Bio-economie	Gerealiseerd	19.722	13.518	68,54%

VV021	Onderzoeksinfrastructuur (bij Strategische Onderzoekscenaren (SOC's), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs)	In uitvoering na agendering VR	101.135	59.271	58,61%
VV022	Versterking O&O bedrijven	Gerealiseerd	99.907	76.010	76,08%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	In uitvoering na agendering VR	58.865	28.071	47,69%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	In uitvoering na agendering VR	39.971	22.183	55,50%
VV025	Blue Deal - onderzoek	In uitvoering na agendering VR	6.053	4.073	67,29%
VV026	Blue Deal - MOW	In uitvoering na agendering VR	36.740	36.730	99,97%
VV027	Blue Deal - economie	In uitvoering na agendering VR	9.942	5.234	52,65%
VV028	Droogteresistente teelten	In uitvoering na agendering VR	7.503	4.948	65,95%
VV029	Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	In uitvoering na agendering VR	13.622	9.663	70,94%
VV030	Hergebruik van restwater	In uitvoering na agendering VR	9.151	6.957	76,02%
VV031	Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving	In uitvoering na agendering VR	19.523	11.901	60,96%
VV032	Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen	In uitvoering na agendering VR	44.053	33.143	75,23%
VV033	Sensibilisering, opleiding en advisering	In uitvoering na agendering VR	4.009	1.369	34,15%
VV034	Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen	In uitvoering na agendering VR	21.280	19.035	89,45%
VV035	Groenblauwe infrastructuur - waterlopen	In uitvoering na agendering VR	30.951	19.756	63,83%
VV036	Natte natuur	In uitvoering na agendering VR	100.000	72.867	72,87%
VV037	Assetmanagement - aanpakken cat. 4-kunstabouwwerken in slechte staat	In uitvoering na agendering VR	105.833	93.058	87,93%
VV038	Aanpak gevaarlijke punten	In uitvoering na agendering VR	51.354	48.189	93,84%
VV039	Versnelling investeringen in veilige schoolroutes	In uitvoering na agendering VR	32.152	27.104	84,30%
VV040	Versnelling verkeerslichtenbeïnvloeding voor een betere en veiligere doorstroming voor de fietser en dynamisch verkeersmanagement	In uitvoering na agendering VR	20.461	15.313	74,84%
VV041	Modal shift naar water - Albertkanaal (versneld verhogen van bruggen)	Gerealiseerd	99.533	95.148	95,59%
VV042	Modal shift naar water - extra kaaimuren	In uitvoering na agendering VR	17.415	12.125	69,62%
VV043	Waterbeheersing Dender	In uitvoering na agendering VR	13.176	7.249	55,02%
VV044	Minnelijke verwervingen en onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge	Gerealiseerd	27.000	27.000	100,00%
VV045	Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid	In uitvoering na agendering VR	117.114	107.554	91,84%
VV046	Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen	Gerealiseerd	0	0	

VV047	Waterstofonderzoek	In uitvoering na agendering VR	124.998	19.864	15,89%
VV048	Investering LED-verlichting gewestwegen (VEKP)	In uitvoering na agendering VR	84.498	40.998	48,52%
VV049	Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur	Gerealiseerd	28.762	17.130	59,56%
VV050	Digitalisering integratie & inburgering	In uitvoering na agendering VR	15.000	13.800	92,00%
VV051	Gemeentehuis van de toekomst	In uitvoering na agendering VR	34.434	26.790	77,80%
VV052	Iedereen digitaal - digibuddies	In uitvoering na agendering VR	2.707	2.383	88,03%
VV053	Iedereen digitaal - opleiding & vorming	In uitvoering na agendering VR	11.643	10.703	91,93%
VV054	Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet	In uitvoering na agendering VR	29.066	28.922	99,50%
VV055	Smart Cities	In uitvoering na agendering VR	19.375	9.360	48,31%
VV056	Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022	In uitvoering na agendering VR	15.000	14.908	99,39%
VV057	Ondersteuning Digitale Transformatie	In uitvoering na agendering VR	5.000	4.842	96,84%
VV058	AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening (inclusief bijdrage subsidieregister)	In uitvoering na agendering VR	3.000	2.970	99,00%
VV059	Digitalisering asset management Aquafin	In uitvoering na agendering VR	9.000	9.000	100,00%
VV060	Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel	Gerealiseerd	10.000	9.990	99,90%
VV061	Datanutsbedrijf	Gerealiseerd	23.000	22.955	99,80%
VV062	Digitalisering DBRC - toegang tot de Vlaamse bestuursrechtspraak	In uitvoering na agendering VR	1.600	1.593	99,56%
VV063	Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck	Gerealiseerd	1.864	1.859	99,73%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	Gerealiseerd	1.000	1.000	100,00%
VV065	HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM (Security Information & Event Management)	Gerealiseerd	2.500	2.482	99,28%
VV066	HFB - Hybride digitale werkplek	In uitvoering na agendering VR	999	926	92,69%
VV067	HFB - Modernisering cloud en netwerkinfrastructuur	In uitvoering na agendering VR	3.500	3.400	97,14%
VV068	Kaleidos – Digitalisering van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering	In uitvoering na agendering VR	2.400	2.382	99,25%
VV069	Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit	In uitvoering na agendering VR	5.000	4.570	91,40%
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem	Gerealiseerd	1.950	1.951	100,05%
VV071	Aanbod Lokaal Digitaal	In uitvoering na agendering VR	2.000	1.697	84,85%
VV072	Doelgericht digitaal transformeren	In uitvoering na agendering VR	5.000	4.991	99,82%

VV073	Vlaamse Sensor Data Space	In uitvoering na agendering VR	8.500	7.453	87,68%
VV074	Vastgoedinformatieplatform	Gerealiseerd	9.000	8.979	99,77%
VV075	VLM - MAP6 en datawarehouse	Gerealiseerd	2.450	2.431	99,22%
VV076	Zelf beheerde identiteit	Gerealiseerd	4.000	3.958	98,95%
VV077	Belfort Aalst	Actie nodig	1.092	756	69,23%
VV078	Ondersteuning culturele infrastructuur	In uitvoering na agendering VR	2.695	1.668	61,89%
VV079	deSingel Antwerpen	In uitvoering na agendering VR	1.649	1.509	91,51%
VV080	Groeningeabdij Kortrijk	In uitvoering na agendering VR	7.500	7.500	100,00%
VV081	Grote culturele infrastructuur	In uitvoering na agendering VR	7.179	4.345	60,52%
VV082	Hotel Dumont Antwerpen	Gerealiseerd	750	750	100,00%
VV083	Inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur	Gerealiseerd	600	461	76,83%
VV084	Kunst in opdracht in de publieke ruimte	In uitvoering na agendering VR	3.000	2.809	93,63%
VV085	Kursaal Oostende	Aandacht nodig	9.000	919	10,21%
VV086	Masterplan Schouwburg Kortrijk	Actie nodig	7.800	2.221	28,47%
VV087	Materniteit de Bijloke - de Creatiecluster (Gent)	In uitvoering na agendering VR	4.980	1.012	20,32%
VV088	MOOOV Turnhout	Actie nodig	1.300	1.300	100,00%
VV089	Musea Brugge nieuwe Museumsite	In uitvoering na agendering VR	27.253	21.689	79,58%
VV090	Museumsite De Zwijgershoek Sint-Niklaas	Actie nodig	900	900	100,00%
VV091	Nieuwbouw de Kopergietery Gent	Actie nodig	2.125	2.125	100,00%
VV092	Nieuwe bibliotheek Sint-Niklaas	Gerealiseerd	300	300	100,00%
VV093	Nieuwe huisvesting en depotruimte voor het Vlaams Architectuur Instituut	Stopgezet	1.020	1.020	100,00%
VV094	Kunstenwerkplaats 'KC Groenplein' Hasselt	Actie nodig	5.100	687	13,47%
VV095	Parterre CC De Werf Aalst	In uitvoering na agendering VR	450	450	100,00%
VV096	Schouwburg Boom	Actie nodig	300	300	100,00%
VV097	Sectorale investeringssubsidies	In uitvoering na agendering VR	5.125	2.588	50,50%
VV098	Versnelling Opera Gent	Aandacht nodig	5.000	4.341	86,82%
VV099	Investerings in de ontwikkeling en promotie van onroerend erfgoed	In uitvoering na agendering VR	99.663	31.372	31,48%
VV100	Achterstand bij subsidies tegen leegstand verminderen	Stopgezet	14.126	11.795	83,50%

VV101	Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen	In uitvoering na agendering VR	6.000	591	9,85%
VV102	Investeren in kernversterking via projectoproepen	In uitvoering na agendering VR	20.746	8.542	41,17%
VV103	Lantis - PFAS-vervuiling	Gerealiseerd	23.000	23.000	100,00%
VV104	Veerkrachtige steden na Corona (extra oproep Stadsvernieuwing)	Actie nodig	20.000	4.127	20,64%
VV105	Ontsnippen van Vlaams landschap	In uitvoering na agendering VR	25.000	22.515	90,06%
VV106	Vergroening openbaar vervoer De Lijn	In uitvoering na agendering VR	92.979	77.999	83,89%
VV107	Initiatieven vanuit VLAM voor de promotie en afzet van producten, o. a. als gevolg van Brexit	Gerealiseerd	1.894	1.894	100,00%
VV108	Subsidies aan bedrijven (financiële steun voor bedrijven, kostenverlaging voor deelname aan beurzen, ondersteuning voor Brexit) + inzet van consultants om Vlaanderen in het buitenland te promoten	Gerealiseerd	23.744	22.994	96,84%
VV109	VLAIO Brexit actieplan	Gerealiseerd	6.472	4.903	75,76%
VV110	Congres (5 MEUR BBV)	In uitvoering na agendering VR	70.457	12.940	18,37%
VV111	Hefboomrelanceprojecten	In uitvoering na agendering VR	51.500	25.188	48,91%
VV112	Voorsprongfonds Hoger Onderwijs	Gerealiseerd	59.265	55.448	93,56%
VV113	Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte	In uitvoering na agendering VR	5.000	4.262	85,24%
VV114	Digitale hulpverlening - kwaliteitsbevordering	In uitvoering na agendering VR	500	473	94,60%
VV115	Digitalisering RIZIV-sectoren	Gerealiseerd	16.511	16.100	97,51%
VV116	Elektronisch patiëntendossier - Geïntegreerd zorg en ondersteuningsplan	In uitvoering na agendering VR	33.441	20.424	61,07%
VV117	Enkelbanden en strafuitvoering	In uitvoering na agendering VR	4.000	3.980	99,50%
VV118	Groeipakket - verderzetten digitalisering	Gerealiseerd	7.000	7.000	100,00%
VV119	Ontwikkelen rechtenverkenner 2.0 met een meer gebruiksvriendelijke tool in sterke samenwerking met de lokale besturen	In uitvoering na agendering VR	1.000	661	66,10%
VV120	Verbeteren van de sociale kaart	In uitvoering na agendering VR	500	205	41,00%
VV121	Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1	Gerealiseerd	0	0	
VV122	Versterken oproepen bovenlokale sportinfrastructuur	Gerealiseerd	54.968	53.098	96,60%
VV123	Circulair bouwen	Gerealiseerd	9.703	5.974	61,57%
VV124	Circulaire maakindustrie	Gerealiseerd	15.000	9.879	65,86%

VV125	Circulaire economie - Recyclagehub	In uitvoering na agendering VR	30.000	4.525	15,08%
VV126	Call groene warmte	In uitvoering na agendering VR	44.204	5.908	13,37%
VV127	Digibanken	Gerealiseerd	49.957	27.365	54,78%
VV128	Digitale vaardigheden	In uitvoering na agendering VR	44.047	41.638	94,53%
VV129	Cultuur - betere informatiedoorstroming en koppeling databanken	In uitvoering na agendering VR	250	179	71,60%
VV130	Cultuur - digitalisering van collecties	Gerealiseerd	4.980	4.980	100,00%
VV131	Cultuur - integratietraject erfgoeddatabanken	In uitvoering na agendering VR	2.000	1.999	99,95%
VV132	Digitaal Verenigingsloket - investering	In uitvoering na agendering VR	2.849	2.818	98,91%
VV133	Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector	In uitvoering na agendering VR	27.955	22.159	79,27%
VV134	Digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector	In uitvoering na agendering VR	7.220	2.699	37,38%
VV135	Investeren in mediawijsheid van de Vlaming	Gerealiseerd	1.000	959	95,90%
VV136	Vernieuwende projecten Huizen van het Kind	Gerealiseerd	3.000	2.995	99,83%
VV137	Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen	Gerealiseerd	3.500	3.500	100,00%
VV138	Opvolging actieplan mentaal welzijn	In uitvoering na agendering VR	11.494	9.912	86,24%
VV139	OverKophuizen	Gerealiseerd	4.800	4.800	100,00%
VV140	Samenwerkingsverbanden "één gezin, één plan"	Gerealiseerd	3.200	3.200	100,00%
VV141	Versterking aanpak intra-familiaal geweld - crisisopvang en crisisbegeleiding in residentiële jeugdzorg	Gerealiseerd	2.560	2.591	101,21%
VV142	Versterking aanpak intra-familiaal geweld - bewustmakingscampagnes	Gerealiseerd	300	292	97,33%
VV143	Zorgzame buurten - Rol van apothekers als aanspreekpunt welzijnsvragen in de buurt	Gerealiseerd	250	250	100,00%
VV144	Zorgzame buurten - Versterken van buurtgerichte lokale initiatieven	In uitvoering na agendering VR	14.592	14.312	98,08%
VV145	Buitenschoolse opvang ondersteunen	Gerealiseerd	11.400	11.400	100,00%
VV146	Compensatiebesluit KO - extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)	Gerealiseerd	975	975	100,00%
VV147	Doorgaande lijn kinderopvang – onderwijs	Gerealiseerd	1.800	1.800	100,00%
VV148	Lokale armoede initiatieven ondersteunen	In uitvoering na agendering VR	2.400	1.847	76,96%
VV149	Ondersteuning buurtwerk	In uitvoering na agendering VR	7.472	5.896	78,91%
VV150	Wijkverbetering	In uitvoering na agendering VR	3.999	3.000	75,02%

VV151	Wijkverbeteringscontracten - integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen	In uitvoering na agendering VR	1.125	1.123	99,82%
VV152	Projectoproep kwetsbare kinderen	Gerealiseerd	3.000	3.001	100,03%
VV153	Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector	Gerealiseerd	2.394	2.394	100,00%
VV154	Impuls aan VAF Filmfonds	Gerealiseerd	9.972	9.972	100,00%
VV155	Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds	Gerealiseerd	10.000	10.000	100,00%
VV156	Jeugdinfrastructuur	Actie nodig	34.110	16.388	48,04%
VV157	Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	In uitvoering na agendering VR	10.623	9.985	93,99%
VV158	Spending reviews	Gerealiseerd	2.932	2.834	96,66%
VV181	Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij	Gerealiseerd	6.000	6.000	100,00%

4.164.175 3.050.074
