

Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Voortgangsrapport en covernota

Meetmoment december 2022



Vlaanderen
verbeelding werkt



**Gefinancierd door
de Europese Unie**
NextGenerationEU

**Vlaamse
Regering**



MONITORING
RELANCEPLAN
VLAAMSE
VEERKRACHT

Voortgangsrapport en covernota
Meetmoment december 2022



INHOUD

MANAGEMENTSAMENVATTING	8
1 INLEIDING	12
2 AANLOOP, DOELSTELLINGEN, GOVERNANCE EN COMMUNICATIE VAN HET RELANCEPLAN	14
2.1 AANLOOP NAAR HET RELANCEPLAN	14
2.2 DOELSTELLINGEN VAN HET RELANCEPLAN	14
2.3 GOVERNANCE VAN HET RELANCEPLAN	18
2.4 COMMUNICATIE	18
2.4.1 <i>Open en transparante communicatie over monitoring</i>	18
2.4.2 <i>Communicatie-initiatieven in 2023</i>	19
3 VOORBEREIDING METING 5	21
3.1 FEEDBACK UIT BEGELEIDINGSORGANEN BIJ METING 4	21
3.2 AANBEVELINGEN REKENHOF	21
3.3 NIEUWIGHEDEN BIJ METING 5	22
4 ANALYSE BIJ METING 5	24
4.1 CONTEXTANALYSE	24
4.2 KERNINDICATOREN	26
4.3 REALISATIES	29
5 KERNCIJFERS OVER DE RELANCEPROJECTEN OP MEETMOMENT 31 DECEMBER 2022	33
5.1 PROJECTVOORTGANG	33
5.1.1 <i>Algemene projectvoortgang</i>	33
5.1.2 <i>Projectvoortgang per speerpunt</i>	36
5.1.3 <i>Projectvoortgang per cluster</i>	37
5.2 MIJLPALLEN	38
5.2.1 <i>Globaal</i>	38
5.2.2 <i>Mijlpalen per speerpunt</i>	40
5.2.3 <i>Mijlpalen per cluster</i>	50
5.3 VASTLEGGINGEN EN VEREFFENINGEN	51
5.3.1 <i>Budgetverschuivingen</i>	51
5.3.2 <i>Vastleggingen en vereffeningen voor VV001-VV158 en VV181</i>	53
5.3.3 <i>Vastleggingen en vereffeningen per speerpunt voor VV001-VV158 en VV181</i>	55
5.3.4 <i>Globaal overzicht vastleggingen en vereffeningen per cluster voor VV001-VV158 en VV181</i>	59
6 RRF-PROJECTEN	62
6.1 OVERZICHT VAN DE RRF-PROJECTEN	62
6.2 ANALYSE	64
7 LEESWIJZER BIJ HET GLOBALE RAPPORT	67
8 VOORTGANGSRAPPORT: GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN ALLE PROJECTEN	69
01. RENOVATIE GEBOUWENPATRIMONIUM (ENERGETISCH & ASBESTVERWIJDERING)	69
VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE	69

VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE	74
VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE	78
VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)	82
VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)	85
VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE	89
VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET	94
VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL	97
VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN	100
VV010 - SOCIALE WONINGBOUW	103
VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID	106
VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE	110
02. FIETSINFRASTRUCTUUR	113
VV013 - DE INRICHTING VAN EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN	113
VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN	117
03. DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS	120
VV015 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS (DIGISPRONG)	120
04. OPLEIDINGS- EN LOOPBAANOFFENSIEF	126
VV016 - ACTIVERING-VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80 PROCENT VESOC	126
VV017 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAAREN	131
VV018 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT	140
VV019 - VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN	148
05. VERSTERKING O&O	157
VV020 - BIO-ECONOMIE	157
VV021 - ONDERZOEKINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S), SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS)	162
VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN	166
VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O	169
06. BLUE DEAL	175
VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE	175
VV025 - BLUE DEAL - ONDERZOEK	180
VV026 - BLUE DEAL - MOW	184
VV027 - BLUE DEAL - ECONOMIE	188
VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN	192
VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN	195
VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER	199
VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR IN DE BEBOUWDE OMGEVING	202
VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN	206
VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING	213
VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN	216

VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN	222
VV036 - NATTE NATUUR	226
07. INVESTERINGEN IN VERKEERSVEILIGE WEGEN	231
VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWWERKEN IN SLECHTE STAAT	231
VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN	235
VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES	239
VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT	243
08. MODAL SHIFT NAAR WATER	247
VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)	247
VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN	250
VV043 - WATERBEHEERSING DENDER	253
VV044 - MINNELIJKE VERWERVINGEN EN ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE	256
09. WELZIJSINFRASTRUCTUUR	258
VV045 - INZETTEN OP KWALITEIT EN GOOD GOVERNANCE VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID	258
VV046 - OPTREKKEN STRATEGISCHE FORFAITS ZIEKENHUIZEN	285
10. WATERSTOFONDERZOEK	287
VV047 - WATERSTOFONDERZOEK	287
11. VERGROENING WEGINFRASTRUCTUUR	294
VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP)	294
VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR	297
12. IEDEREEN LOKAAL DIGITAAL	302
VV050 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING	302
VV051 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS	309
VV052 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES	314
VV053 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING	317
VV054 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET	320
VV055 - SMART CITIES	323
13. DIGITALISERING VLAAMSE OVERHEID	326
VV056 - ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING – ONBOARDING RAAMOVEREENKOMSTEN	326
VV057 - ONDERSTEUNING DIGITALE TRANSFORMATIE	329
VV058 - VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING	336
VV059 - DIGITALISERING ASSET MANAGEMENT AQUAFIN	341
VV060 - VERSNELLING EN VERDERE UITBOUW VAN MIJN BURGERPROFIEL	345
VV061 - DATANUTSBEDRIJF	349
VV062 - DIGITALISERING DBRC - TOEGANG TOT DE VLAAMSE BESTUURSRECHTSpraak	352
VV063 - HET OMGEVINGSLOKET – DIGITALISERING INZAGE-LOKET EN OMGEVINGSCHECK	355
VV064 - FIT – DATAGEDREVEN ORGANISATIE EN DIGITALISERING DIENSTVERLENING	358
VV065 - CYBERSECURITY EN UITROL SIEM	363

VV066 - HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK	367
VV067 - MODERNISERING CLOUD- EN NETWERKINFRASTRUCTUUR	370
VV068 - KALEIDOS – DIGITALISERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE VLAAMSE REGERING	373
VV069 - DATA INTEGRATIEDIENSTEN VOOR SLIMME MOBILITEIT	378
VV070 - MATIS, HET VLAAMSE MATERIALENINFORMATIESYSTEEM	384
VV071 - AANBOD LOKAAL DIGITAAL	390
VV072 - DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN	393
VV073 - VLAAMSE SENSOR DATA SPACE	398
VV074 - VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM	403
VV075 - VLM - MAP6 EN DATAWAREHOUSE	409
VV076 - ZELFBEHEERDE IDENTITEIT	413
14. CULTURELE INFRASTRUCTUUR	417
VV077 - BELFORT AALST	417
VV078 - ONDERSTEUNING CULTURELE INFRASTRUCTUUR	420
VV079 - DESINGEL ANTWERPEN	424
VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK	427
VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR	430
VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN	433
VV083 - INVENTARIS CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR	435
VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE	438
VV085 - KURSAAL OOSTENDE	441
VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK	444
VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)	446
VV088 - MOOOV TURNHOUT	449
VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE	452
VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS	455
VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT	458
VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS	461
VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT	464
VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT	466
VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST	469
VV096 - SCHOUWBURG BOOM	471
VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES	473
VV098 - VERSNELLING OPERA GENT	476
15. INVESTERINGEN ONROEREND ERFGOED	478
VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED	478
16. VERBETERING EN VERDUURZAMING RUIMTELIJKE ORDENING	487
VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN	487
VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN	490
VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN	494
VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING	498
VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING)	501
VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP	504

17. VERGROENING OPENBAAR VERVOER (DE LIJN)	508
VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN	508
18. BREXIT	514
VV107 - INITIATIEVEN VANUIT VLAM VOOR DE PROMOTIE EN AFZET VAN PRODUCTEN, O. A. ALS GEVOLG VAN BREXIT	514
VV108 - SUBSIDIES AAN BEDRIJVEN (FINANCIËLE STEUN VOOR BEDRIJVEN, KOSTENVERLAGING VOOR DEELNAME AAN BEURZEN, ONDERSTEUNING VOOR BREXIT) + INZET VAN CONSULTANTS OM VLAANDEREN IN HET BUITENLAND TE PROMOTEN	517
VV109 - VLAIO BREXIT ACTIEPLAN	521
19. CONGRES-, BEURS- EN TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR	527
VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)	527
VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN	530
20. VOORSPONGFONDS HOGER ONDERWIJS	534
VV112 - VOORSPONGFONDS HOGER ONDERWIJS	534
21. DIGITALISERING ZORGBELEID	538
VV113 - BLENDED-CARE JEUGDHULP - BANDBREEDTE	538
VV114 - DIGITALE HULPVERLENING - KWALITEITSBEVORDERING	547
VV115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN	555
VV116 - ELEKTRONISCH PATIËTENDOSSIER - GEÏNTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN	562
VV117 - ENKELBANDEN EN STRAFUITVOERING	567
VV118 - GROEIPAKKET - VERDERZETTEN DIGITALISERING	572
VV119 - ONTWIKKELEN RECHTENVERKENNER 2. 0 MET EEN MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOOL IN STERKE SAMENWERKING MET DE LOKALE BESTUREN	577
VV120 - VERBETEREN VAN DE SOCIALE KAART	580
22. INVESTEREN IN PERSONEN MET EEN HANDICAP	583
VV121 - VOORUITSCHUIF UITBREIDINGSBELEID - FASE 1	583
23. SPORTINFRASTRUCTUUR	586
VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR	586
24. UITBOUWEN CIRCULAIRE ECONOMIE	589
VV123 - CIRCULAIR BOUWEN	589
VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE	592
VV125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB	595
25. INVESTERINGEN GROENE WARMTE	599
VV126 - CALL GROENE WARMTE	599
26. DIGIBANKEN	603
VV127 - DIGIBANKEN	603
27. DIGITALE VAARDIGHEDEN	609

VV128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN	609
28. DIGITALISERING VLAAMSE MEDIA- EN CULTUURSECTOR	617
VV129 - CULTUUR - BETERE INFORMATIEDOORSTROMING EN KOPPELING DATABANKEN	617
VV130 - CULTUUR - DIGITALISERING VAN COLLECTIES	622
VV131 - CULTUUR - INTEGRATIETRAJECT ERFGOEDDATABANKEN	627
VV132 - DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - INVESTERING	631
VV133 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VLAAMSE MEDIASECTOR	635
VV134 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR	643
VV135 - INVESTEREN IN MEDIAWIJSHEID VAN DE VLAMING	646
29. VERSTERKEN MENTAAL WELZIJN	650
VV136 - VERNIEUWENDE PROJECTEN HUIZEN VAN HET KIND	650
VV137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN	654
VV138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN	659
VV139 - OVERKOPHUIZEN	665
VV140 - SAMENWERKINGSVERBANDEN "ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN"	669
VV141 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - CRISISOPVANG EN CRISISBEGELEIDING IN RESIDENTIËLE JEUGDZORG	672
VV142 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES	675
VV143 - ZORGZAME BUURTEN - ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT	677
VV144 - ZORGZAME BUURTEN - VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN	682
30. ARMOEDEBESTRIJDING EN WIJKVERBETERING	687
VV145 - BUITENSCHOOLSE OPVANG ONDERSTEUNEN	687
VV146 - COMPENSATIEBESLUIT KO - EXTRA TUSSENKOMST IKT (INKOMENSTARIEF)	691
VV147 - DOORGAANDE LIJN KINDEROPVANG – ONDERWIJS	694
VV148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN	698
VV149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK	701
VV150 - WIJKVERBETERING	705
VV151 - WIJKVERBETERINGSCONTRACTEN - INTEGRALE KETENAANPAK WELZIJN-JUSTITIE-LOKALE BESTUREN	708
VV152 - PROJECTOPROEP KWETSBARE KINDEREN	711
31. INVESTERINGEN AUDIOVISUELE SECTOR	714
VV153 - GARANTIEFONDS VOOR DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR	714
VV154 - IMPULS AAN VAF FILMFONDS	717
VV155 - IMPULS AAN VAF MEDIAFONDS EN GAMEFONDS	720
32. JEUGDINFRASTRUCTUUR	723
VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR	723
33. GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL	730
VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL	730
34. SPENDING REVIEWS	739
VV158 - SPENDING REVIEWS	739
35. EXTRA RELANCEPROJECTEN	742

VV159 - SNELLERE VERGUNNINGS- EN BEROEPSPROCEDURES	742
VV160 - ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING	745
VV161 - DECENTRALISATIEOEFENING NAAR LOKALE BESTUREN	749
VV162 - INVESTEREN IN VLAAMSE KENNISOVERHEID	752
VV163 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - PAKKET VAN 500 MILJOEN EURO VOOR ZEER GOEDKOPE ACHTERGESTELDE LENINGEN AAN ENERZIJD'S START-UPS & SCALE-UPS EN ANDERZIJD'S KMO'S	759
VV164 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - EXTRA CAPACITEIT VOOR GIGARANT (3 MILJARD EURO) EN VOOR PMV-Z-WAARBORGEN (400 MILJOEN EURO) - HEFBOOM VOOR MAXIMALE BANCAIRE FINANCIERING	761
VV165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS- PUBLIEK EN REST PRIVAAT)	764
VV166 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - UITBREIDING VAN DE WIN-WIN-LENING EN VRIENDENAANDEEL	768
VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOW 2	771
VV168 - VERSNELDE UITROL DIGITALE METERS	774
VV169 - VERSNELDE UITROL GLASVEZELNETWERK EN 5G	777
VV170 - FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAK VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE	779
VV171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD	781
VV172 - INVESTERINGEN IN VLAGGENSCHIPRELANCEPROJECTEN VAN DE VLAAMSE HAVENS INZAKE CO2 CAPTATIE & HERGEBRUIK	784
VV173 - AD HOC INVESTERINGSMIDDELEN ALS COFINANCIERING VOOR EUROPESE STEUN	787
VV174 - NOODKOOPLINGEN	789
VV175 - UITBREIDINGSBUDGET VOOR WELZIJN EN ZORG	792
VV176 - ZIJNSTROOM VANUIT DE PRIVÉSECTOR NAAR HET ONDERWIJS AANTREKKELIJK MAKEN	796
VV177 - IMPLEMENTATIE VAN DE VLAAMSE JOBBONUS	799
VV178 - EXTRA ZUURSTOF VOOR INDIVIDUEEL CREATIEF TALENT - MEESTERSCHAP	805
VV179 - INSPANNINGEN OM INVESTERINGEN AAN TE TREKKEN VERHOGEN	809
VV180 - WACHTLIJSTEN GEHANDICAPTENZORG	812
36. ONDERSTEUNING OEKRAÏNE LANDBOUW EN VISSERIJ	815
VV181 - ONDERSTEUNING OEKRAÏNE LANDBOUW EN VISSERIJ	815

MANAGEMENTSAMENVATTING


Vlaamse Veerkracht grotendeels op schema

Ondanks de vele covid-golven en de Oekraïne crisis verloopt de uitvoering van het plan Vlaamse Veerkracht grotendeels op schema. 91% van de projecten (162 + 3) verloopt volgens schema (lichtgroen en donkergroen). 7% van de projecten (13) is zelfs al gerealiseerd. Ook bij de vastleggingen zien we een substantiële sprong naar 95% van de relancemiddelen.

97% van de projecten in uitvoering na agendering Vlaamse Regering of gerealiseerd


In vergelijking met de vorige metingen is er opnieuw duidelijk vooruitgang geboekt, en is de omslag gemaakt van een groot peloton met projecten die 'op schema en in uitvoering' zijn naar een kopgroep van gerealiseerde projecten.

Projectstatus ■ Nog niet opgestart ■ Opgestart ■ In uitvoering na agendering VR ■ Aandacht nodig ■ Actie nodig ■ Gerealiseerd

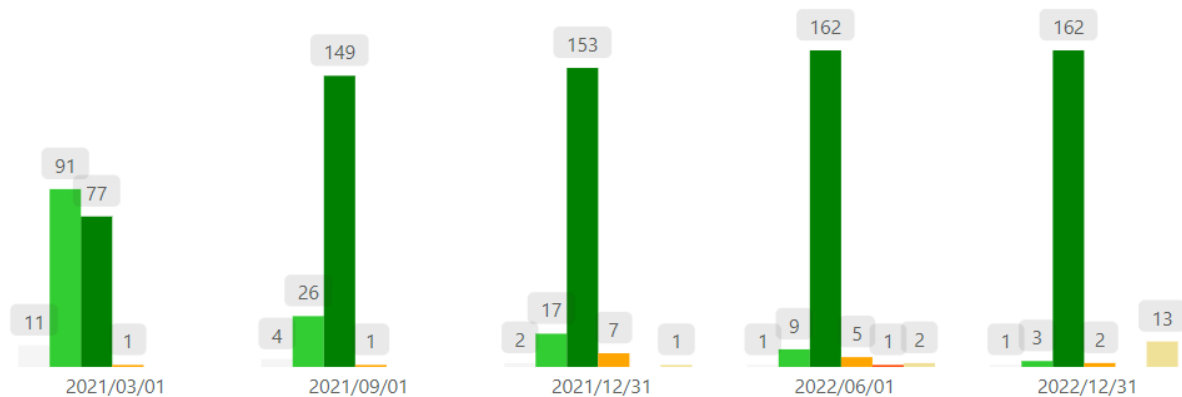

Hieronder vindt men de projectstatus van de 181 relanceprojecten op meetmoment 31 december 2022. Een 181^{ste} project werd toegevoegd tussen meting 4 en 5. Het project VV181 ondersteunt de visserij- en landbouwsector n.a.v. de Oekraïne crisis. De financiering van dit project (6 miljoen euro) komt voort uit een verschuiving van middelen uit VV028, VV033 en VV101.

Projectstatus ● Nog niet opgestart ● Opgestart ● In uitvoering na agendering VR ● Aandacht nodig ● Gerealiseerd

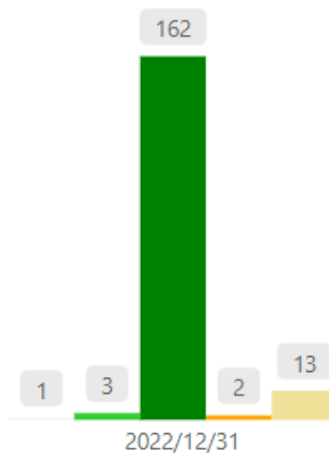


- 162 van de 181 relanceprojecten (90%) zijn in uitvoering na agendering op de Vlaamse Regering en lopen op schema (deze krijgen de kleur donkergroen), 13 van de projecten (7%) zijn gerealiseerd (geel). Het gaat over volgende projecten:
 - VV044 | Minnelijke verwervingen en onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge
 - VV046 | Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen
 - VV064 | FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening
 - VV118 | Groeipakket – verderzetten digitalisering
 - VV121 | Vooruitschuif uitbreidingsbeleid – fase 1
 - VV140 | Samenwerkingsverbanden “één gezin, één plan”
 - VV146 | Compensatiebesluit KO – extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)
 - VV153 | Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector
 - VV154 | Impuls aan VAF Filmfonds
 - VV155 | Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds
 - VV176 | Zijinstroom vanuit de privésector naar het onderwijs aantrekkelijk maken
 - VV179 | Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen
 - VV181 | Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij
- 1 project heeft de status ‘nog niet opgestart’ (lichtgrijs). Het betreft volgende project: ‘VV169 | Versnelde uitrol glasvezelnetwerk en 5G’.
- 3 projecten kregen de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Het betreft volgende projecten: ‘VV159 | Snellere vergunnings- en beroepsprocedures’, ‘VV172 | Investerings in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens

inzake CO2 captatie & hergebruik' en 'VV173 | Ad hoc investeringsmiddelen als cofinanciering voor Europese steun'.

- 2 projecten hebben de status 'aandacht nodig' (oranje). Het betreft het project 'VV085 | Kursaal Oostende' en het project 'VV168 | Versnelde uitrol digitale meters'.

90% van de opgestarte mijlpalen op schema of gerealiseerd

Een volgende grafiek toont de status van alle 1682 mijlpalen van de 181 relanceprojecten, vanaf het begin van de uitvoering van het relanceplan in 2020, tot de datum van de laatste mijlpaal die werd opgenomen in het relanceplan, in het vierde kwartaal van 2030. Dit geeft een mooi overzicht van de mijlpalen die de komende 8 jaar nog gehaald dienen te worden. Tussen 2023 en 2030 staan er nog 622 mijlpalen ingepland, goed voor 37% van alle mijlpalen.

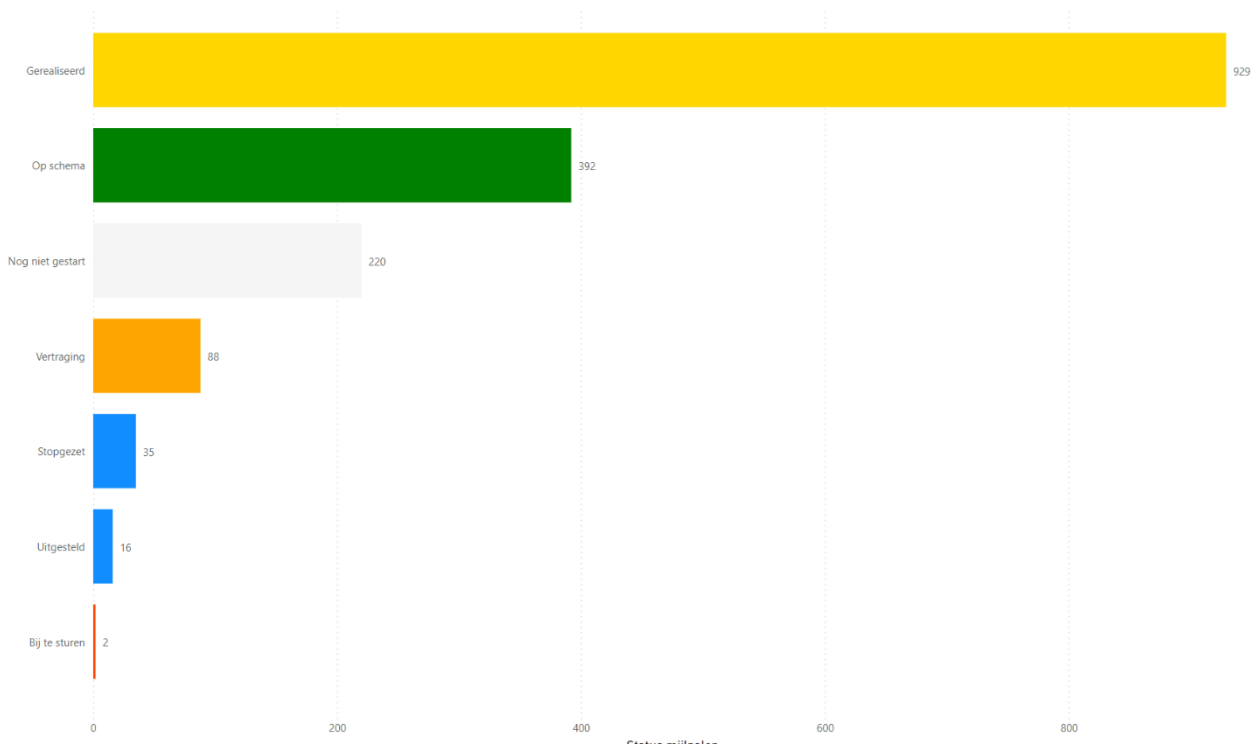

Status alle mijlpalen voorzien van 2020 t.e.m. 2030 voor de 181 projecten

1321 van de 1682 mijlpalen die zich situeren tussen 2020 en 2030, zijn ofwel op schema ofwel gerealiseerd, dit is 78% van alle mijlpalen. Als we de verhouding nemen van de mijlpalen op schema en gerealiseerd t.o.v. alle mijlpalen zonder rekening te houden met de verder in de toekomst liggende en dus nog niet opgestarte mijlpalen (220 of 13,1%), dan komen we zelfs aan 90% van de mijlpalen die eind december 2022 op schema staan of al gerealiseerd zijn.


Enorme sprong in vastleggingen naar 95% van de relancemiddelen

Op 1 juni 2022 was er 2 miljard euro of 46,5% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen vastgelegd. Op 31 december 2022 is 4,08 miljard euro of 95% van de 4,3 miljard euro vastgelegd.

1,31 miljard euro of 30,4% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was eind december 2022 vereffend. Dat is een stijging van 864 miljoen euro in vergelijking met de vorige meting.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● FinUitvoeringVAKResterend

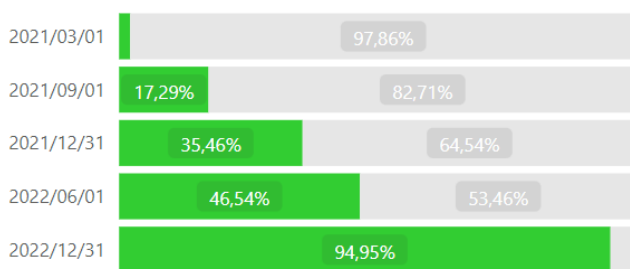

Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

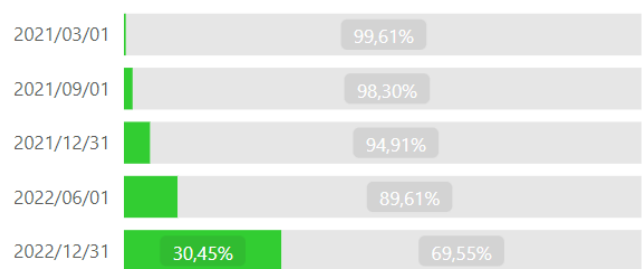

1 INLEIDING

COVID-19 trof Vlaanderen en de wereld hard. Daarom investeert de Vlaamse Regering **4,3 miljard euro extra** om het economische en maatschappelijke weefsel te herstellen. De Vlaamse regering investeert bijkomend ook met reguliere middelen in zorg (bv. uitbreidingsbudget), werk (bv. jobbonus) en onderwijs (scholenbouw). Het Relanceplan '[Vlaamse Veerkracht](#)' is daarmee het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers zette.

Om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te verzachten, creëerde de Europese Unie een herstelfonds - [NextGenerationEU](#). Het biedt de lidstaten rechtstreekse steun en leningen - de **Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV)**. Voor België was er aanvankelijk een maximum van 5,9 miljard euro steun voorzien. Daarvan had Vlaanderen voor zijn relanceplan oorspronkelijk recht op een maximum van 2,255 miljard euro. Vijfenvijftig van de Vlaamse Veerkracht projecten worden met deze middelen gefinancierd. Intussen is duidelijk geworden dat België minder middelen uit het Herstelfonds zal ontvangen. Vlaanderen gaat ervan uit dat bij deze 'downsize' de intra-Belgische verdeelsleutel zoals aanvankelijk vastgelegd behouden blijft, en het Vlaamse aandeel verlaagd zou worden tot 1,72 miljard euro.

De eerste betaalaanvraag om de middelen uit het fonds te verkrijgen is momenteel door het kabinet Dermine 'on hold' gezet, omdat twee van de twintig mijlpalen nog ontbreken: de federale pensioenhervorming en een mijlpaal waarvoor de toegang tot het federale register van eindbegunstigden geregeld moet worden. **Vlaanderen doet intussen maximale inspanningen om aan alle voorwaarden van de Europese Commissie te voldoen.** De goedkeuring van de betaalaanvragen is uiteraard van groot belang om de budgettaire ruimte voor het relancebeleid intact te houden.

De concrete impact van de budgetverlaging op het plan, en welke maatregelen vanuit de FHV gefinancierd zullen blijven is op dit ogenblik nog niet bepaald, en dus ook nog niet verwerkt in deze meting. Wat niet Europees gefinancierd wordt, zal de Vlaamse overheid zelf financieren. **De verminderde Europese financiering heeft dus geen invloed op de uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.**

Sinds vorig jaar veranderde de context waarin het Vlaams herstelbeleid zich afspeelt drastisch. De **inval van Rusland in Oekraïne** heeft wereldwijde gevolgen waar ons herstelbeleid niet aan ontsnapt. Het **belang van het relanceplan neemt toe**, want veel van de maatregelen uit Vlaamse Veerkracht bieden een antwoord op de vraagstukken die uit deze crisis naar voren komen. Vlaanderen wil schok- en crisisbestendiger worden en besteedt daarom meer aandacht aan isolatie van gebouwen, groene mobiliteit, circulaire economie, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, snellere vergunningen en ondersteunend PMV-instrumentarium. De Vlaamse overheid realiseert, om de economie aan te zwengelen, grote publieke investeringen in, onder meer, infrastructuur.

Bij deze meting 5, maar ook tussentijds, houden we via ons **dashboard met kernindicatoren** de vinger aan de pols. Dit zijn enerzijds macro-economische indicatoren over de context van het plan, zoals de hoge inflatie, waar het plan zelf geen invloed op heeft. Anderzijds volgen we ook kernindicatoren op, die kenmerkend zijn voor (clusters van) projecten, waarvan we voorzichtig aannemen, dat er een positieve bijdrage kan worden verwacht. Voorzichtig, omdat uiteraard nog veel andere zaken een invloed hebben, zoals het reguliere beleid, maar ook contextfactoren waar de Vlaamse overheid geen vat op heeft.

De vijfde meting houdt ook rekening met de aanbevelingen van het **Rekenhof**. Het formuleerde eerder in 2022 verbeterpunten voor de aanpak en de kwaliteit van de monitoring. In dat verband verwijzen we naar de uitgebreide, gezamenlijke presentatie van minister-president Jambon en collega-minister Diependaele van 22 maart 2022 in de parlementscommissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie. Op hun voortgangsrapport, volgde een uitgebreide gedachtewisseling. Het **Vlaams Parlement** wordt goed geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering, zowel globaal in deze commissie, als op projectniveau in de specifieke commissies. We blijven inzetten op de kwaliteitsverbetering van de gegevens en houden rekening met de aanbevelingen van het Rekenhof en de suggesties vanuit het Vlaams Parlement. De bevattelijke voorstelling van de monitoringsgegevens is een permanent aandachtspunt.

Deze nota houdt verder ook rekening met de aandachtspunten aangebracht vanuit **het Directiecomité Vlaamse Veerkracht, het Economisch Relancecomité, het Maatschappelijk Relancecomité, het Klimaatexpertenpanel, het Vlaamse Economisch Sociaal Overlegcomité en de Taskforce Vlaamse Veerkracht**. Deze organen steunen met hun inzichten en advies de uitvoering van het plan.

Hierna behandelen we eerst de aanloop, de doelstellingen, de governance en de communicatie van het relanceplan. Vervolgens blikt de covernota kort terug op de aanbevelingen bij de vierde meting en de voorbereidingen voor meting 5. De hoofdbrok van deze covernota gaat over de kerncijfers van **het vijfde meetmoment van december 2022** met een analysehoofdstuk, een hoofdstuk met de kerncijfers over alle projecten en een hoofdstuk over de voortgang van de RRF-projecten. We eindigen de covernota met een leeswijzer bij het monitoringsrapport als geheel.

2 AANLOOP, DOELSTELLINGEN, GOVERNANCE EN COMMUNICATIE VAN HET RELANCEPLAN

2.1 AANLOOP NAAR HET RELANCEPLAN

Op 30 april 2020 besliste de Vlaamse Regering om een **Economisch Relancecomité** op te richten, om aanbevelingen voor een snel en krachtig economisch herstel uit te werken. De regering was even zeer bezorgd over de impact van de coronacrisis en de begeleidende overheidsmaatregelen op het maatschappelijke leven. Daarom richtte de Vlaamse Regering, op 16 mei 2020, naast een adviesorgaan voor economie, het **Maatschappelijk Relancecomité** op.

Het Economisch Relancecomité bestaat uit onafhankelijke experts, die elk in hun vakgebied een prominente rol spelen, en afgevaardigden van de Vlaamse ministers.

Het Maatschappelijk Relancecomité bestaat uit onafhankelijke experts, die in hun werkdomein evenzeer vooraanstaande deskundigen zijn, en afgevaardigden van de Vlaamse ministers.

Beide Relancecomités bundelden hun aanbevelingen in [rapporten](#). Ze werden op 14 juli 2020 bekend gemaakt. De Vlaamse Regering ging met deze rapporten aan de slag en stelde eind september 2020 haar Relanceplan '[Vlaamse Veerkracht](#)' voor. In de [Septembeerklaring van 2020](#) ging de minister-president uitvoerig op de inhoud van het plan in.

2.2 DOELSTELLINGEN VAN HET RELANCEPLAN

Het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' dient verschillende doelen:

- Het plan bevat maatregelen om de **acute crisissen** van de covid-golven te bestrijden.
- Daarnaast bevat het plan **herstelmaatregelen** om de maatschappij en economie terug op adem te laten komen en te blijven.
- Voorts maakt de Vlaamse Regering van de verschrikkelijke crisis een opportuniteit. Ze doet **substantiële publieke investeringen** in zorg en welzijn, in mensen en talenten, in infrastructuur, maar ook in de transitie naar een duurzame en digitale economie en samenleving.
- Tot slot maakt de Vlaamse Regering van de gelegenheid gebruik om, met het oog op een grotere efficiëntie en effectiviteit, de organisatie en de werking van de **Vlaamse overheid te heroverwegen**.


De **zeven speerpunten** van het relanceplan reflecteren deze doelstellingen. Het zijn:

- **De coronacrisis en Brexit beheersen:** een wereldwijde pandemie en een drastische shift in de handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk zet ons economisch weefsel onder druk. De Vlaamse Regering levert heel grote inspanningen om de **Vlaamse economie en bedrijven te ondersteunen** door hun **financiële slagkracht** maximaal intact te houden. Daarnaast neemt de Vlaamse Regering


maatregelen die de **impact van Brexit** moeten verzachten, en tegelijk de economische mogelijkheden met het VK maximaal kansen geven. Uiteraard dragen deze maatregelen ook bij tot het mitigeren van de gevolgen van de Oekraïne-crisis en de economische schade die eruit voortvloeit.

- **Versterking van het Vlaams Zorg- en Welzijnssysteem:** de Vlaamse economie kende een stevige terugval, maar ook onze samenleving ging door een zware crisis. COVID-19 plaatste een enorme druk op onze **ziekenhuizen**, onze **woonzorgcentra**, onze **zorgvoorzieningen** in de sector van **personen met een handicap**, onze **kinderopvang en jeugdhulp**, en onze **scholen**. Zowel fysiek als mentaal blijft het voor veel Vlamingen een moeilijke periode. De Vlaamse Regering spendeert daarom extra middelen voor het zorgpersoneel, voor het fysiek en mentaal welzijn van de Vlaming, voor armoedebestrijding en wijkverbetering.
- **Investeren in mensen en talenten:** actieve handen en hoofden blijven vandaag en morgen de basis voor de Vlaamse welvaart. Onze arbeidsmarkt kende een stevige dreun, maar is er intussen al bovenop. De Vlaamse Regering blijft, om zo veel mogelijk Vlamingen naar **werkbaar werk** te leiden en een **werkzaamheidsgraad van 80%** te bereiken, investeren in **opleiding en begeleiding**. De **jobbonus** maakt werken beter lonend.
- **Investeren in infrastructuur:** ondersteunen door investeringen in onze infrastructuur te versnellen. We gebruiken de crisis om fors in te zetten op **veiliger en groener verkeer**: van meer fietspaden, over verkeersveilige wegen tot een 'modal shift' naar duurzame mobiliteit en transport. We zorgen voor **kwaliteitsvolle ontmoetingsplekken** voor vrijetijdsbeleving, zelfontplooiing en gemeenschapsvorming in alle domeinen, van cultuur en onroerend erfgoed, over sport tot toerisme. Tot slot versnellen we de bouw van **schoolinfrastructuur**. Deze investeringen zorgen voor werkgelegenheid, voor hogere welvaart, meer levenskwaliteit van de Vlaming en zetten een belangrijke stap in de richting van een duurzame samenleving.
- **Verduurzaming van economie en samenleving:** de coronacrisis bood een opportuniteit om sneller in een duurzame toekomst te investeren. We zetten volop in op de transitie naar een **groenere economie en samenleving**. Dit gebeurt o.a. door een grootschalige renovatie van onze gebouwen, O&O-investeringen, de Blue Deal, investeringen in duurzame ruimtelijke ordening en groene mobiliteit. Deze publieke investeringen zijn goed voor het klimaat, voor onze economie en werkgelegenheid, en dus ook toekomstige Vlaamse welvaart. De Oekraïne-crisis bevestigt onze overtuiging dat die inspanningen noodzaak blijven.
- **Vlaanderen digitaal transformeren:** de coronacrisis bood een opportuniteit om de **digitale transformatie te versnellen**. Dit gebeurt zowel binnen de lokale en regionale besturen, maar evenzeer in de zorg, de media- en cultuursectoren. We investeren verder in de digitale omkadering, vaardigheden en de 'digitale identiteit' van de Vlamingen. Deze investeringen dragen bij tot de efficiëntie van beleid, onze economie en werkgelegenheid, en creëren garanties voor de toekomstige welvaart.
- **De overheid efficiënter maken:** de Vlaamse overheid maakte van deze crisis gebruik om zichzelf te herdenken en te **hervormen**. Ze werkt aan snellere vergunnings- en beroepsprocedures, administratieve vereenvoudiging, een Vlaamse kennisoverheid, decentralisatie van Vlaamse bevoegdheden naar de lokale besturen en uitgaventoetsingen.

De Vlaamse Regering investeert **4.3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen** in deze zeven speerpunten, naast de investeringen via reguliere middelen.

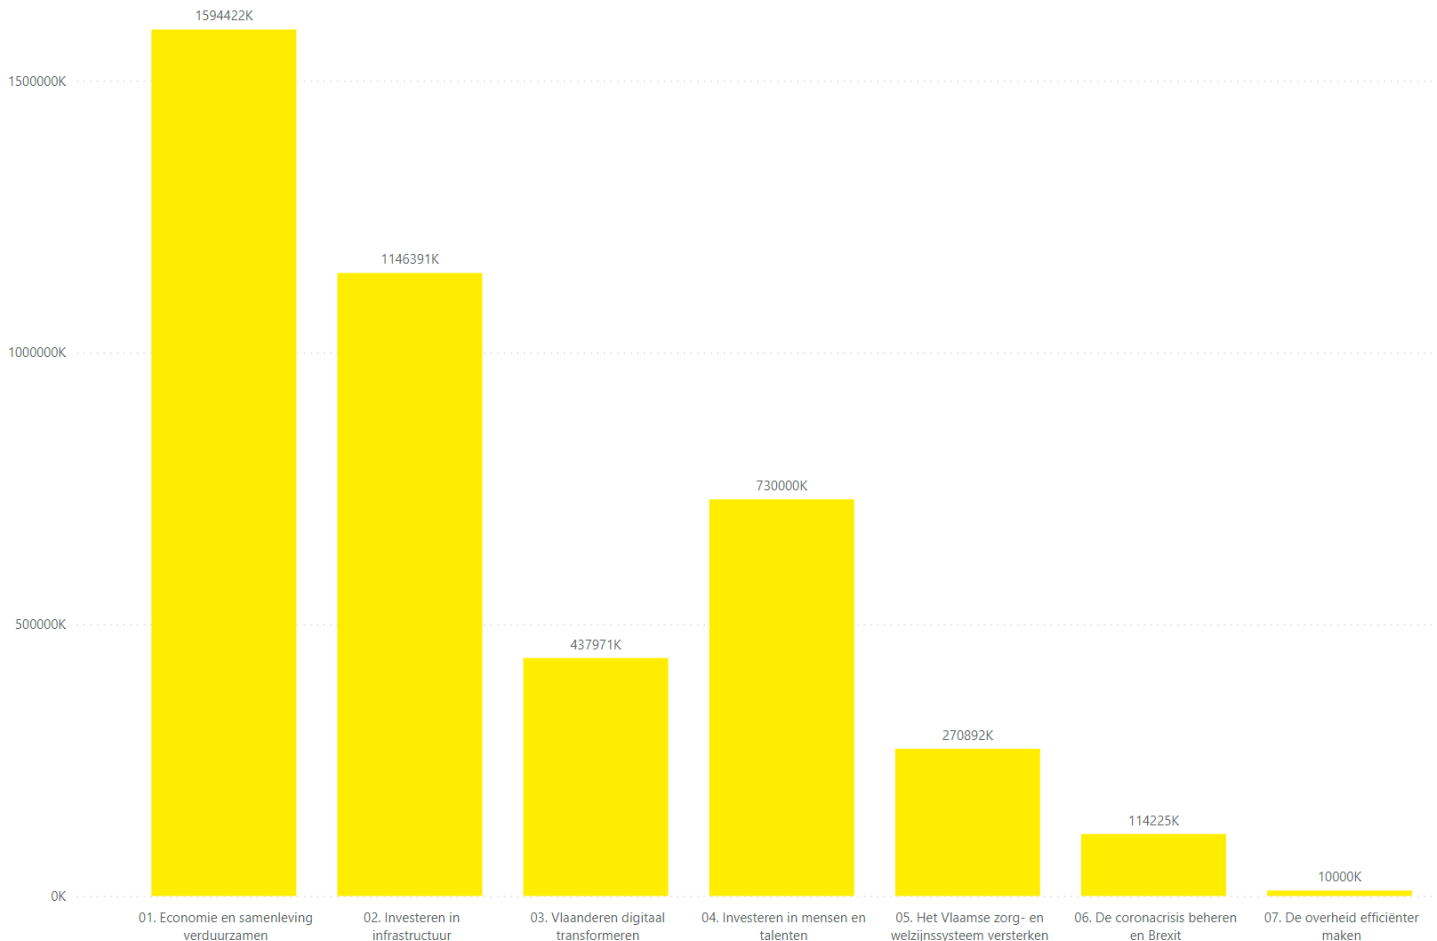

Het relanceplan is inhoudelijk verder opgebouwd volgens **36 clusters**. De verdeling van de middelen over deze clusters kan men hieronder terugvinden. Een nieuwe cluster 36 zag het levenslicht tussen meting 4 en 5. Een cluster 36 en bijhorende project VV181 werd opgericht m.b.t. de ondersteuning van de landbouw- en visserijsector n.a.v. de Oekraïne crisis. 6 miljoen euro werd hiervoor vrijgemaakt afkomstig uit drie andere VV-projecten (VV028, VV033 en VV101).

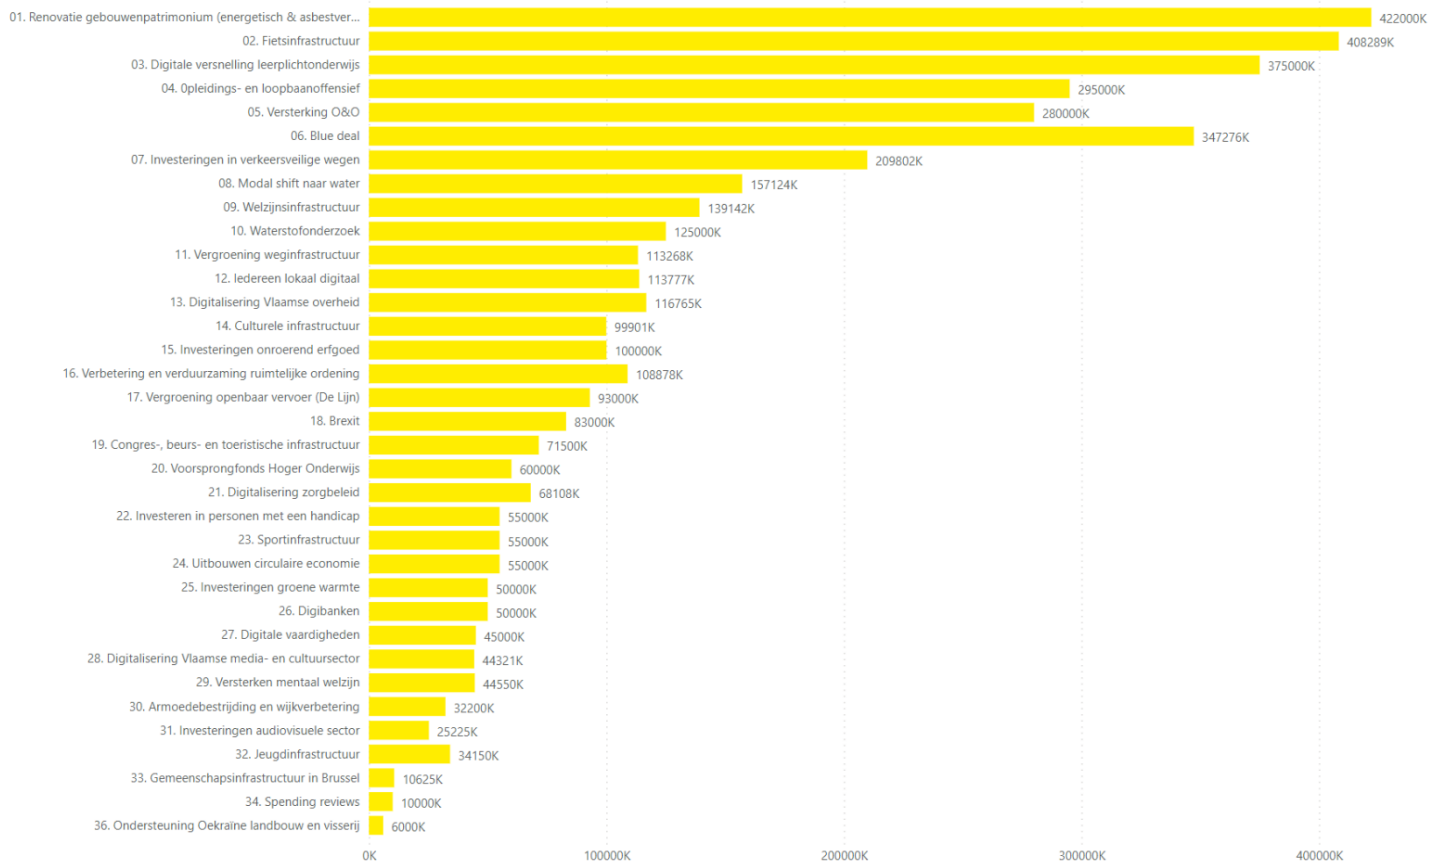

2.3 GOVERNANCE VAN HET RELANCEPLAN

De Vlaamse Regering legde in een [Mededeling aan de Vlaamse Regering](#) vast hoe de monitoring van het Vlaams Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' zal verlopen. Om dit omvangrijk relanceplan professioneel te kunnen monitoren, zijn een **duidelijke governancestructuur en periodieke meetmomenten** voorzien. In 2021 waren er drie meetmomenten (maart 2021, september 2021 en december 2021). In 2022 zijn er twee meetmomenten (juni 2022 en december 2022). Deze rapporten worden telkens als Mededeling aan de Vlaamse Regering geagendeerd.

Een **Directiecomité** volgt de uitvoering van de projecten uit het uitgewerkte relanceplan Vlaamse Veerkracht op. Dit Directiecomité bestaat uit een kabinetsadviseur per minister en de elf leden van het Voorzitterscollege (tien voorzitters van de managementcomités van de Vlaamse overheid en de voorzitter van het Voorzitterscollege). Het Directiecomité bereidt de Taskforce voor en waakt over een optimale uitvoering van het relanceplan en een correcte monitoring. Voorafgaand aan elke Taskforce bespreken het Maatschappelijk en het Economisch Relancecomité, het Klimaatexpertenpanel en het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité de voortgangsrapporten.

De **Taskforce Vlaamse Veerkracht** bestaat uit de ministers van de Vlaamse Regering, de voorzitters van de twee Relancecomités, de voorzitter en ondervoorzitter van de SERV, de voorzitter van het Klimaatexpertenpanel en een vertegenwoordiging vanuit het Voorzitterscollege, met de voorzitter en de secretaris-generaal van het Departement Financiën en Begroting als vaste leden. In functie van de agenda kan de minister-president oordelen over de opportuniteit om eventueel bijkomend andere leidende ambtenaren uit te nodigen. De Taskforce is het overleg- en supervisieorgaan en waakt over de uitvoering van het plan. De Taskforce komt bij elk meetmoment samen, evalueert de monitoring en de bereikte resultaten en stuurt, waar nodig, bij.

De administratie staat in voor de concrete uitvoering. Het **Voorzitterscollege** zorgt voor voldoende afstemming en informatiedeling tussen de entiteiten.

Het **Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken** en het **Departement Financiën & Begroting** coördineren de oefening. Een gemengde projectgroep, waarin de betrokken beleidsdomeinen vertegenwoordigd zijn, bundelt de krachten.

2.4 COMMUNICATIE

2.4.1 **Open en transparante communicatie over monitoring**

De Vlaamse Regering communiceert actief over de doelstellingen en de uitvoering van het plan:

- Ze hanteert een [apart label 'Vlaamse Veerkracht'](#) voor alle regeringsbeslissingen die er verband mee houden. Zo is het voor elke belanghebbende eenvoudig om beslissingen terug te vinden.
- Bij externe communicatie over de voortgang van individuele projecten onderstreept de regeringscommunicatie de betekenis van het hele relanceplan.

- De Vlaamse Regering voorziet de nodige persmomenten over uitvoering en vooruitgang van het plan.
- Ook tussen de meetmomenten communiceert de Vlaamse Regering over het plan. Zo was er in de zomer van 2021 een [communicatiecampagne](#) naar het brede publiek.
- De Vlaamse Regering voorziet bij elk meetmoment een Mededeling van de Vlaamse Regering. Het volledige rapport wordt telkens op de website van de Vlaamse regeringsbeslissingen en de [website Vlaamse Veerkracht](#) gepubliceerd.
- De Vlaamse Regering ontsluit de hele dataset van de monitoring van Vlaamse Veerkracht op het [Opendataportaal](#) van de Vlaamse overheid. Voorts is het vanaf meting 5 ook mogelijk om analyses te doen via een publieke POWER BI

2.4.2 Communicatie-initiatieven in 2023

De communicatie over Vlaamse Veerkracht vertrekt vanuit de 4 grote verhaallijnen die sinds de rapportering van juni 2022 belicht staan op de website Vlaamse veerkracht:

- Energie en duurzaamheid
- Welzijn
- Digitalisering
- Duurzame tewerkstelling

De **website** gaat dieper in op een selectie van VV-projecten uit deze vier grote verhaallijnen zoals MijnVerbouwPremie, Digibuddies, Digitale Vaardigheden en OverKopHuizen. De projecten en wat erover gecommuniceerd wordt, wordt afgestemd met de betrokken entiteiten.

Deze projecten worden extra in de verf gezet met **push communicatie** naar **specifieke doelgroepen voor elke verhaallijn**:

- **Energie en duurzaamheid:** o.m. renoveerders, lagere/hogere inkomens (VerbouwLening en -Premie, noodkoopleningen/hernieuwbare energie)
- **Welzijn:** o.m. Kinderen en jongeren, (boven)lokale jeugdwerkinitiatieven, Welzijns- en zorgorganisaties, welzijns- en zorgprofessionals (OverKopHuizen, Zorgzame Buurten)
- **Digitalisering:** o.m. maatschappelijk kwetsbaren (Digibudies), alle Vlamingen-contextueel: studenten/studietoelagen, 65+/pensioen (Mijn Burgerprofiel)
- **Duurzame tewerkstelling:** Werkzoekenden, lagere inkomens (Jobbonus, Digibanken)

De communicatie bereikt hen via **kanalen** zoals intermediairen, sociale media, gespecialiseerde magazines (verbouwtitels, publicaties van verenigingen en federaties), belangenorganisaties, steden en gemeenten. De actualiteit en de periode van het jaar zijn daarbij het uitgangspunt.

VV-website

De homepagina van VV-website wordt geactualiseerd met een nieuwe baseline en intro. Daar komen ook de 4 verhaallijnen, Energie en duurzaamheid, Welzijn, Digitalisering en Duurzame tewerkstelling die

verwijzen naar projecten zoals Digibuddies, Mijn Burgerprofiel, Jobbonus, Digibanken, Zorgzame buurten, Mijn Verbouwen en -Premie, Noodkopeningen. De rubrieken voortgangsrapporing, dashboard, publicaties krijgen een update naar aanleiding van het nieuwe monitoringsrapport.

Timing

- De vernieuwde website staat online op 3 februari 2023.
- De eerste verhaallijn in januari-februari is **Energie en duurzaamheid**.
- In de loop van 2023 volgen de andere verhaallijnen.

3 VOORBEREIDING METING 5

3.1 FEEDBACK UIT BEGELEIDINGSORGANEN BIJ METING 4

De leden van het Directiecomité, de Relancecomités, het Klimaatexpertenpanel, het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, en de Taskforce, spraken tijdens de bespreking van de voortgang bij **het vierde meetmoment van 01/06/2022** hun waardering uit voor de monitoring en de voortgang van de uitvoering.

Daarnaast wees men op **enkele aandachtspunten**:

- Het blijvend belang van **communicatie** rond dit plan.
- Het belang van het verder investeren in **de kwaliteit van de fiches**.
- Het belang van het in kaart brengen van **output, outcome en impact** en het studiewerk dat gebeurt rond de impact van Vlaamse Veerkracht door ECOOM/STORE en IDEA Consult.
- Het belang van het in kaart brengen van **mogelijke uitvoeringsproblemen** gelinkt aan de Oekraïne-crisis en de andere crisissen die hieruit zijn voortgevloeid.
- Het belang van de afstemming van deze projecten met **andere grote regeringsprojecten** zoals Flanders Technology & Innovation.
- Het belang van het vergelijken van het herstel van Vlaanderen met referentielanden en -regio's door **internationale benchmarking**.
- Het belang om al na te denken of er **vervolgfinanciering en -plannen** nodig zijn die Vlaanderen verder klaar maken voor de toekomst.

3.2 AANBEVELINGEN REKENHOF

Het Rekenhof voerde een [audit m.b.t. de informatiekwaliteit van de derde voortgangsrapportering](#) en een [specifieke audit op de projecten van 20 miljoen euro en meer](#) uit. Het Rekenhof publiceerde de bevindingen en aanbevelingen in maart 2022.

De Vlaamse Regering formuleerde [een beleidsreplik](#) en zette, met het oog op de volgende metingen, waar mogelijk, de aanbevelingen om.

Minister-president Jambon en minister van Begroting Diependaele stelden de resultaten van de derde meting en hun beleidsreplik m.b.t. de audits van het Rekenhof voor in de [Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie](#).

Ook bij meting 5 hielden we rekening met de aanbevelingen van het Rekenhof.

3.3 NIEUWIGHEDEN BIJ METING 5

Op basis van de aanbevelingen van de Taskforce, het Rekenhof en de bespreking in de Commissie van het Vlaams Parlement verhoogden we verder de kwaliteit van de monitoring van Vlaamse Veerkracht.

- In november 2022 organiseerden we, zoals steeds bij elke meting, **een infosessie voor de projectverantwoordelijken en een infosessie voor de SPOC's binnen de beleidsdomeinen**. We stelden een actualisatie van de **leidraad** ter beschikking met voorbeeldprojectfiches en met richtlijnen voor een verdere **verbetering van de informatiekwaliteit**. Extra aandacht werd gevraagd voor:
 - Een concreet en correct beeld van de **status van het project** met een overzicht van eventuele obstakels/problemen en mogelijke gevolgen;
 - Concrete **mijlpalen** met correcte status en duiding;
 - Concrete **realisaties** en **outputindicatoren**;
 - De **vastleggingen** gezien 2022 het laatste jaar is waarbij vastleggingen uit de relanceprovisie mogelijk waren;
 - Transparantie over **budgettaire wijzigingen** binnen projecten en **budgettaire verschuivingen** tussen projecten.
 - De mogelijkheid om **verantwoordingsstukken** op te laden;
 - De **aanbevelingen van het Rekenhof**.
- Op het einde van de invoerperiode is een **kwaliteitscontrole uitgevoerd**. De kwaliteitsstandaard van elk project werd getoetst. De projectverantwoordelijken kregen, waar nodig, suggesties om verbeteringen en duiding toe te voegen. De projectverantwoordelijken beslisten zelf om al dan niet op dit advies in te gaan.
- Er werd verder geïnvesteerd in de **actualisatie van het [hersteldashboard](#) Vlaamse Veerkracht**.
- In het najaar van 2022 verschenen de resultaten van de **grootschalige COVID-19-vervolgbevraging van Statistiek Vlaanderen**. De resultaten werden ontsloten in drie rapporten. Een [eerste rapport](#) handelde over de evolutie van gezondheid, welzijn en sociale contacten tussen 2021 en 2022, een [tweede rapport](#) over werk, inkomen, levenslang leren en digitalisering tussen 2021 en 2022, en een [derde rapport](#) over wonen, mobiliteit, welzijn kinderen en aanpak crisis tussen 2021 en 2022.
- We vergelijken Vlaanderen met **referentielanden en -regio's**. Sinds september 2022 voorziet **Statistiek Vlaanderen** een [dashboard 'Vlaanderen vergeleken'](#). Dit dashboard stelt ons in staat een vergelijkend beeld te geven van hoe Vlaanderen herstelt in de verschillende beleidsdomeinen, waar we aan de top staan, en waar we nog een tandje moeten bijsteken. Er is daarnaast ook een opdracht lopende i.s.m. KU Leuven over de **benchmarking van Vlaanderen**.

- Alle data zijn sinds meting 3 opgenomen in het **opendataportaal** van de Vlaamse overheid. Vanaf meting 5 gaan we nog een stap verder in de transparantie en gebruiksvriendelijkheid van de monitoringsdata van Vlaamse Veerkracht. Vanaf meting 5 maken we de brondata in Power BI publiek beschikbaar, waardoor op eenvoudige wijze analyses kunnen worden gemaakt
- In 2022 werden de voorbereidingen getroffen voor de **communicatie-acties** waarvan sprake in 2.4.2.
- Vanuit de administratie en het politieke niveau wordt de **link tussen Vlaamse Veerkracht**, het **reguliere beleid** en andere grote regeringsprojecten zoals **Flanders Technology & Innovation** verzorgd.

4 ANALYSE BIJ METING 5

4.1 CONTEXTANALYSE

De oorspronkelijke oriëntatie van Vlaamse Veerkracht baseerde zich in hoofdzaak op de aanname dat **overheidsinvesteringen** de verlangzaming van de binnenlandse besteding konden omkeren en dat de werking van de overheid als ondernemer een significant **multiplicator-effect** heeft. Voor een sterk internationaal geïntegreerde economie als in Vlaanderen, hangen die effecten samen met de economische context in Europa en elders in de wereld. De aanhoudende inspanning naar impact op de processen van de lokale economie hangt af van omgevingsfactoren met een internationale werking, waar de Vlaamse overheid minder directe invloed op heeft.

Algemeen geldt dat ernstige **verstoring van geopolitieke en macro-economische processen** door de Oekraïne-oorlog en de nog nawerkende coronacrisis nog steeds voelbaar zijn, maar dat de **evolutie van een aantal kerngetallen, prijzen en indicatoren zich op een en minder volatiel prijsniveau lijken te hebben gestabiliseerd. Een aantal indicatoren vergt verder aandacht en waakzaamheid.**

Eind 2022 noteerden de **energieprijzen** op het niveau van voor één jaar. Bij gas (Dutch TTF) ligt de prijs tussen 60% en 80% onder de extreme piekwaarden van resp. maart en september 2022. Bij petroleum ligt de prijs 25% onder piekwaarden van voorjaar 2022. In zijn jaarbericht en prognoses¹ voor de energiemarkten in 2023 merkt het Internationaal Energie-agentschap (IEA) op, dat de gasmarkt weliswaar door de diversificatie van de bronnen weg van Rusland, een gevoelig aangepast consumentengedrag en corrigerende ingrepen in de prijsvorming door de overheden, gestabiliseerd is. De ongewoon milde temperaturen in het laatste kwartaal van 2022, de versnelde overschakeling op hernieuwbare energie werkten ook door. Maar bij het volledig wegvallen van Russische import en een heropleving van de export naar China, zou in Europa eind 2023 opnieuw een gastekort kunnen ontstaan. De omvang van de niet te dekken vraag zou eind 2023 tot 15% van het totale Europese gasverbruik kunnen bedragen.

Door het stijgende aandeel van gas in de elektriciteitsvoorziening en de mogelijke heropstart van steenkoolcentrales blijft de prijs van **koolstof-emissierechten** op het hoogste niveau sinds tien jaar en steeg in het laatste kwartaal van 2022 nog eens met bijna 20%.²

Bij **grondstoffen voor energietransitie en industrie** houdt de langdurige uitval van bevoorrading door de boycot van Rusland en gestegen vraag door de elektrificatie van transport aan. Diversificatie van de productie en tijdelijke verlangzaming van de maakindustrie in China zorgen voor een daling. Voor lithium zette de prijs eind 2022 een daling met 15% in, maar noteert nog steeds historisch hoog. Andere metalen – kobalt, nikkel, zink – laten eenzelfde beeld zien.³ Voor 2023 wordt bij licht toenemend aanbod een prijsdaling van bijna 10% verwacht. Bij de meest gangbare **bouwmaterialen** – staal, aluminium, cement - noteert de bouwsector een mildering en stabilisering van het prijsniveau op pre-coronaniveau, maar blijven de

¹ www.iea.org/reports/how-to-avoid-gas-shortages-in-the-european-union-in-2023

² www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1

³ Economist Intelligence Unit – World commodities forecast, www.theassay.com, www.bloomberg.com

onzekerheid over de toelevering, de beschikbaarheid van arbeidskrachten en het gedaalde consumentenvertrouwen het sentiment negatief beïnvloeden.⁴

Voor de hele eurozone laat de analyse van het consumentenvertrouwen van de Europese centrale bank, de laagste waarden sinds 2019 optekenen, met voor december 2022 waarden beneden het vorige, historisch laagste peil van maart 2020 bij het begin van de coronacrisis.⁵

De prijsontwikkelingen voeden de inflatie, die op haar beurt het indexmechanisme activeert. De inflatie in België zou in 2023 naar 6,2% dalen, wat nog steeds hoger is dan het Europese gemiddelde. De daling ligt in lijn met de waarde in de ons omringende, economisch relevante buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland, met resp. 7,5%, 4,4% en 4,3%.⁶

De **rente op herfinancieringstransacties** voor de Belgische overheid bedroeg in juni 2022 1,93% en steeg eind 2022 tot 2,53%. De Europese centrale bank⁷ en de Europese commissie⁸ beoordelen het economisch vooruitzicht voor België in 2023 als stagnerend of gematigd krimpemd, wat in lijn ligt met de verwachtingen voor de hele eurozone. De Europese commissie deelt België wel in, in de groep van negen lidstaten waar de stabiliteit van de overheidsfinanciën een risico op lange termijn vormt.⁹

Uit de geopolitieke context isoleren we twee elementen.

In het foresight rapport van het World Economic Forum¹⁰ van januari 2023 zijn de gepercipieerde globale risicofactoren op korte en middellange termijn geanalyseerd. De bevraging van beleidsmakers in 121 landen leert dat de stijgende levensduurte de volgende twee jaren de hoofdbekommernis blijft, maar dat klimaatsverandering, falende adaptatie, energierisico's en natuurrampen de vaakst geciteerde risico's zijn.

De vluchtelingen crisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne blijft een zorg. De VN vluchtelingenorganisatie ziet¹¹ geen redenen om op korte termijn een verbetering of vertraging van de uitstroom te verwachten. In januari 2023 waren 7,9 miljoen Oekraïners het land ontvlucht. Meer dan 25% van dat aantal bevinden zich in twee Europese lidstaten – Polen en Duitsland. In België werden tot nu toe 65.670 gevluchte Oekraïense burgers opgevangen.

⁴ www.bouwunie.be/nl/theme/Bouwsector-in-cijfers/Bouwbarometer/bouwbarometer-2022-Q4

⁵ ecb.europa.eu – The euro area economic outlook.

⁶ economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies

⁷ www.ecb.europa.eu/pub/projections – Macroeconomic projections.

⁸ economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies

⁹ economy-finance.ec.europa.eu – Fiscal sustainability report (data 2021) pag.87-96

¹⁰ www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023


¹¹ data.unhcr.org/en/documents/details/98163

4.2 KERNINDICATOREN

Als onderdeel van de voortgangsrapportage volgt Vlaanderen het herstel op aan de hand van verschillende **kernindicatoren** die inzicht geven in zowel de macro-economische en budgettaire context als de herstel- en veerkrachtcontext.

Bij de 2^{de} en 3^{de} meting lag de focus bij de indicatoren op de **kwaliteit van de projectfiches**. Naast de mijlpalen en outputindicatoren werden hiervoor extra rapporteringsvelden toegevoegd. Over het algemeen is de consistentie en kwaliteit van de rapportage duidelijk gewaarborgd en hebben de ondersteunende initiatieven vruchten afgeworpen. Een aandachtspunt blijft een (te) indirecte causaliteit tussen de projectvoortgang en de impactindicatoren¹⁰. Dit komt mede door de diversiteit tussen de projecten en de verschillende impactdimensies, variërend van aspecten van sturing tot directe en indirecte beïnvloeding.

In de 4^{de} en 5^{de} meting ligt de focus op de **voortgang van de projecten**. Om de voortgang te duiden wordt het dashboard verder uitgebreid en hebben we het nu over 36 kernindicatoren. Deze kernindicatoren zijn onder meer het resultaat van een grondige analyse van de data uit de 3^{de} meting in het kader van een studieopdracht van IDEA Consult. Hiertoe is een concept van impactkader op programmaniveau ontwikkeld en toegepast (Figuur). In lijn met de voortgangsrapportage geeft de set van kernindicatoren de context weer waarbinnen de projecten hun voortgang moeten realiseren, met aandacht voor duurzame, inclusieve en gezonde groei.



Vor der finale selectie van de kernindicatoren werd, naast het analysewerk door IDEA Consult, ook gebruikgemaakt van de al bestaande dashboardindicatoren VV bij meting 3, en suggesties en aanvullingen op de lijst van impactindicatoren door projectverantwoordelijken en experts van Statistiek Vlaanderen, het Economisch Relancecomité, het Maatschappelijk Relancecomité, het Klimaatexpertenpanel en de sociale partners. Bij de selectie is uiteraard ook rekening gehouden met databeschikbaarheid en -kwaliteit.

Onderstaande indicatoren werden vanaf meting 4 opgevolgd via het [dashboard VV](#). Deze zijn onder te verdelen in twee groepen. Een eerste set van indicatoren beschrijft de macro-economische en budgettaire context waarin de uitvoering van het plan Vlaamse Veerkracht zich ontrolt. Een tweede set van indicatoren zijn indicatoren waar het relanceplan een directe of indirecte impact op beoogt. Deze lijst is uiteraard niet exhaustief.

Macro-economische en budgettaire indicatoren

1. Reële economische groei (bbp)
2. Import en export in Vlaanderen
3. Ondernemers- en consumentenvertrouwen
4. Inflatie
5. Vorderingensaldo van de Vlaamse overheid

Herstel en veerkracht - indicatoren

Duurzame groei

6. O&O-intensiteit
7. Oprichting en overlevingsgraad ondernemingen
8. Aandeel hernieuwbare energie
9. Broeikasgasemissies
10. Energie-intensiteit Vlaamse economie
11. Verwerking primair bedrijfsafval
12. Filezwaarte
13. Verkeersongevallen
14. Wateroverlast en overstromingsgevaar
15. Grondwaterstand

Inclusieve (gedeelde) groei

16. Vroegtijdige schoolverlaters (18-24 jaar)
17. Scholingsgraad (25-64 jaar)
18. Levenslang leren
19. Evolutie aantal werknemers en arbeidsvolume
20. Werkzaamheidsgraad bij 20- tot 64-jarigen
21. Aantal werkzoekenden zonder werk
22. Aantal ontvangen en openstaande vacatures
23. Tijdelijke werkloosheid door COVID-19
24. Tijdelijke werkloosheid (globale cijfers)
25. Bevolking in armoede of sociale uitsluiting
26. Digitale vaardigheden bij burgers
27. Digitale overheid
28. Doorlooptijd omgevingsvergunningen
29. Vertrouwen in de overheid
30. Werkbaar werk

Gezonde groei

31. Levenstevredenheid
32. Tevredenheid sociale contacten

33. Eenzaamheid
34. Angst en depressie
35. Levensverwachting
36. (Vanaf februari 2023: digitaal welbevinden)

Enkele positieve evoluties

Ondanks de verslechterde economische situatie door de oorlog in Oekraïne en de nasleep daarvan, blijven de **goederenimport en -export** van Vlaanderen in 2022 toenemen. De goederenimport in het Vlaamse gewest lag in het tweede kwartaal van 2022 43% hoger dan in het tweede kwartaal van 2021. Dat is vooral een gevolg van de gestegen invoerwaarde van aardolie en aardgas, en in mindere mate van farmaceutische en chemische producten. De goederenexport stijgt iets minder sterk. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 stijgt die in 2022 met 23%.

Ook op vlak van inclusieve groei zijn er positieve evoluties te bemerken. **Het aantal werkzoekenden zonder werk** in Vlaanderen daalt verder in 2022 en blijft ook met een lichte stijging in de zomer een stuk lager dan voor de pandemie. Daarnaast is 76,2% van de Vlamingen tussen 20 en 64 jaar in 2022 aan het werk. Dat is een stijging van 1,5% op jaarbasis. Hiermee ligt de Vlaamse **werkzaamheidsgraad** hoger dan het Belgische gemiddelde (71,6%) en dan het Europese gemiddelde (74,2%).

Het aantal tijdelijke werklozen omwille van overmacht (bv. door corona) kent in 2022 ook een sterke daling. Terwijl er in november 2020 nog 287.651 Vlamingen tijdelijk werkloos waren door overmacht, waren dat er in november 2022 nog maar 1.225. In de algemene cijfers over tijdelijke werkloosheid is er vanaf september wel een lichte stijging in het aantal te bemerken. Het aantal tijdelijke werklozen omwille van economische redenen (bv. door impact energiecrisis) is in 2022 dan ook opvallend gestegen. Terwijl er in november 2020 slechts 1.663 Vlamingen tijdelijk werkloos waren omwille van dit motief, waren dat er in november 2022 51.477.

Vlaanderen doet het voorts goed op vlak van gezonde groei. Door de versoepelingen herstelt de **tevredenheid van de Vlaming met zijn sociale contacten**. In oktober 2022 bedraagt deze 83,1%. Oktober 2021 niet meegerekend, is dit het hoogste cijfer sinds de start van de pandemie. Vanaf het voorjaar 2022 dalen ook de cijfers van het aantal Vlamingen dat zich **eenzaam, angstig of depressief** voelt tot op het laagste niveau sinds het begin van de pandemie.

Enkele aandachtspunten of negatieve evoluties

De **Vlaamse economie** groeit verder in 2022 (+2,8%) maar die groei zal volgens het Federaal Planbureau vertragen in 2023 (+1,3%), als gevolg van een vertraging van de consumptie en een minder rooskleurige uitvoer. De groei is ook aanzienlijk vertraagd in vergelijking met 2021 (+7%). Net nu de coronacrisis onder controle leek, hypothekeren nieuwe mondiale uitdagingen zoals de Russische inval in Oekraïne het economisch herstel van Vlaanderen. De impact ervan vertaalt zich in een forse stijging van de energie- en grondstoffenprijzen en een zeer **snel oplopende inflatie**. De Belgische inflatie bereikt een recordhoogte van 13,1% in oktober 2022, maar neemt vanaf november 2022 opnieuw af. In december 2022 bedraagt ze 10,2%. De huidige onzekere situatie heeft ook een invloed op het **ondernemers- en het consumentenvertrouwen**. Sinds maart 2022 staan beide indicatoren onder nul. Het vertrouwen van de consument daalt bovendien naar zijn laagste punt ooit in september 2022 (-22).

Wat duurzame groei betreft zijn er twee aandachtspunten. Een eerste indicator is **de grondwaterstand**. Begin januari 2023 waren er meer lage tot zeer lage grondwaterstanden (58%) ten opzichte van het begin van januari 2022 (7%). In 2021 was de relatieve situatie dan weer wat droger met ongeveer 69% lage tot zeer lage standen begin januari 2021.

Het jaargemiddelde van de **filezwaarte** blijft ook in 2022 toenemen. In december 2022 bedroeg het jaargemiddelde op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest 726 kilometeruren per werkdag. Een jaar eerder, in december 2021, bedroeg dit slechts 555 kilometeruren per werkdag. Met 726 kilometeruren per werkdag blijft de filezwaarte wel onder het jaargemiddelde van voor de pandemie in december 2019, dat op 772 kilometeruren per werkdag lag.

Ten slotte is er sprake van een negatieve evolutie binnen de Vlaamse arbeidsmarkt. De voorbije twaalf maanden was er een recordaantal ontvangen **vacatures** bij VDAB, maar ook van het aandeel vacatures daarvan dat blijft openstaan. Het aantal vacatures dat blijft openstaan groeit daarbij sneller dan de ontvangen vacatures. Deze trend wijst op een sterke toename van de krapte op de arbeidsmarkt. In juni 2022 bereikt het een piekmoment met 87.130 openstaande vacatures t.o.v. 35.046 in juni 2020. Het aantal ontvangen vacatures bedraagt in juni 2022 34.908 tegenover 21.355 in juni 2020. Vanaf juli 2022 nemen echter zowel het aantal ontvangen als openstaande vacatures langzaam af. In december 2022 is er sprake van 69.343 openstaande en 24.679 ontvangen vacatures.

4.3 REALISATIES

Het is eigen aan grote investeringsprojecten dat het even duurt vooraleer de eerste tastbare resultaten zichtbaar zijn. Vaak is er immers nood aan voorbereidende of inleidende stappen die essentieel zijn voor het welslagen van het project, zoals: het zorgen voor een regelgevend kader, het verrichten van studies, het doorlopen van aanbestedingsprocedures, de organisatie van projectoproepen, etc. Dat werk is cruciaal en erg arbeidsintensief, maar weinig zichtbaar voor het grote publiek. Ook in het kader van 'Vlaamse Veerkracht' werden er al veel van dergelijke stappen gezet. Stilaan worden echter ook de eerste resultaten zichtbaar.

De projectfiches verder in dit rapport geven een gedetailleerd overzicht van alle stappen, zowel die in de coulissen als die in de schijnwerpers, en dat voor alle projecten.

Ter illustratie geven wij alvast een aantal voorbeelden: een niet-exhaustief overzicht dat een inzicht geeft in de concrete voortgang en enthousiasmeert om de projectfiches te raadplegen.

Speerpunt 1: Economie en samenleving verduurzamen

Wat de **renovatie van het gebouwenpatrimonium** betreft, is 'Mijn VerbouwPremie' gelanceerd, zodat particulieren en bedrijven sinds 1 oktober 2022 via een uniek online loket een premie kunnen aanvragen voor renovatie en energiebesparende investeringen (VV006). Er zijn reeds 1.116 premies effectief uitbetaald voor EPC-verbeterende investeringen in woningen, en 5.800 aanvragen ingediend voor verbeteringen die binnenkort zullen gebeuren (VV008). Er werd voorts 25 miljoen euro vrijgemaakt voor de energetische renovatie van 4.286 sociale huurwoningen (VV009). Dankzij Vlaamse Veerkracht kan het Vlaams Energiebedrijf 339 energie-efficiëntieprojecten realiseren in gebouwen uit de publieke sector in Vlaanderen: 75 daarvan zijn reeds opgeleverd.

In het kader van de **Blue Deal**, zijn er o.a. 188 ha aan gronden verworven met het oog op de versterking van het watersysteem (VV024), werd er 10 miljoen euro besteed aan meer dan 100 waterbesparende projecten bij bedrijven (VV027) en lopen er 7 onderzoeken gericht op duurzaam watergebruik in de landbouwsector. Het gaat onder meer over onderzoek m.b.t. nieuwe teelttechnieken waarbij water wordt vastgehouden in de akkers, droogteresistente teelten, efficiëntie van watergebruik, circulair watergebruik en inzet van alternatieve waterbronnen (VV025).

Met het oog op de **vergroening van het openbaar vervoer**, deed De Lijn in de tweede helft van 2022 aanpassingswerken in een eerste reeks van drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen). Dit omvatte de plaatsing van laadinfrastructuur, zodat de eerste e-bussen vanaf het voorjaar van 2023 in dienst kunnen worden opgenomen.

Speerpunt 2: Investeren in infrastructuur

Op het vlak van **fietsinfrastructuur** werd er reeds 154,14 km fietspad verbeterd, en zijn er momenteel 132,5 km aan werken in uitvoering. Er werd ook een start gemaakt met de aanleg van nieuwe fietspaden: er kwam tot nu toe bijna 2 km bij (VV013).

Met het oog op het **verhogen van de verkeersveiligheid** werden via innovatieve proefprojecten in Limburg en West-Vlaanderen reeds 11 gevaarlijke punten aangepakt en wordt er momenteel aan 10 punten gewerkt. Daarnaast werden op 26 plaatsen via relatief kleine ingrepen (bv. aanpassen van de lichtenregeling, aanleggen van middeneilanden, verbeteren van zichtbaarheid of de signalisatie, etc.) gevaarlijke punten aangepakt, en zijn er momenteel 41 werken in uitvoering (VV038).

In het kader van de subsidielijn **Veilige Schoolroutes** ontvingen lokale besturen middelen voor het uitvoeren van 1017 ingrepen verspreid over 331 schoolroutes. 16% van die projecten zijn ook al effectief gerealiseerd, de rest volgt over maximum 15 maanden. Ook op gewestwegen worden 874 punten langs schoolroutes aangepakt. Daarvan is reeds 26,5% voltooid (VV039).

Om het **goederenvervoer over water** te versterken, moesten er o.m. 4 bedrijfsgronden worden verworven voor de realisatie van een nieuwe zeesluis in Zeebrugge, wat ook effectief gebeurde (VV044).

Op het vlak van **culturele infrastructuur** werden in de tweede helft van 2022 3 projecten in het kader van 'kunst in opdracht in de publieke ruimte' gerealiseerd: in Wintam, Gent en Neerpelt (VV084).

Speerpunt 3: Vlaanderen digitaal transformeren

In het kader van het project Gemeente zonder gemeentehuis zijn momenteel 178 **lokale besturen** met relancemiddelen aan de slag die zorgen voor een **versnelde digitalisering van hun processen en dienstverlening** (VV051). Uiteraard is er tegelijk ook aandacht nodig voor **e-inclusie**: zowel voor het voorzien van vorming, als voor toegang tot computers en internet. Wat dat laatste betreft, ontvingen 160 lokale besturen een subsidie voor de (verdere) uitrol van hun e-inclusiebeleid, met als eerste actie het ondersteunen van kwetsbare burgers bij het verwerven van een internetverbinding in de eigen woning (VV054).

Ook op het vlak van de **digitalisering van de Vlaamse overheid** worden in het kader van Vlaamse Veerkracht stappen gezet. Zo zag bv. de FIT Business Academy het licht, een intern leerplatform dat toelaat dat de posten van Flanders Investment & Trade in het buitenland en in Vlaanderen hun klanten juist, gestroomlijnd en wereldwijd bedienen (VV064).

Speerpunt 4: Investeren in mensen en talenten

Op het vlak van het **versterken van de vaardigheden** van jongeren en volwassenen, werden met relancemiddelen onder andere zomerscholen georganiseerd om leerachterstand terug te dringen. Vorige zomer namen zo'n 8.500 jongeren deel, verspreid over Vlaanderen (VV017).

Daarnaast gingen op 1 september 2022 12 projecten van start in het kader van 'XR Innovet' (toepassing extended reality) voor het technisch en arbeidsmarktgericht onderwijs, met het oog op de ontwikkeling van XR-applicaties en software, en het testen ervan in concrete samenwerkingsverbanden. Zowel scholen die beginnen met XR als scholen met ervaring, zijn betrokken (VV017).

Ook werd in augustus 2022 de 'LeerID' gelanceerd: die zorgt ervoor dat **onderwijsprofessionals en leerlingen** na een éénmalige inlog, automatisch toegang krijgen tot allerhande digitale applicaties en leermiddelen (VV015).

De VDAB werkte begin 2021 een aanpak uit met als doel alle **tijdelijk werklozen** te benaderen met een passend aanbod: hoe intensiever de tijdelijke werkloosheid, hoe intensiever en persoonlijker het aanbod van de VDAB. Sindsdien werd meer dan 99% van de tijdelijk werklozen bereikt via mailcommunicatie. Tussen de start van de coronacrisis en eind oktober 2022 werd 7% van de tijdelijk werklozen bereikt met een vorm van competentieversterking. Voor de intensief tijdelijk werklozen (minstens 10 dagen tijdelijk werkloos in de laatste 3 maanden) bedroeg dit aandeel 11%. Beide percentages gaan nog steeds in stijgende lijn (VV021).

Speerpunt 5: Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

Om de directe gevolgen van corona op te vangen ontvingen **woonzorgcentra** een compensatie voor de door COVID-19-leegstand gederfde inkomsten. Hierdoor konden voorzieningen hun werking continueren en werden **afvloeiingen en lagere kwaliteit van zorg vermeden**. De woonzorgcentra deelden alle gegevens mee aan het Agentschap Zorg en Gezondheid dat vervolgens de continuïteitsborg berekende. Alle subsidies - voor een totaalbedrag van 6.671.000 euro - waren eind september 2022 uitbetaald (VV045).

Speerpunt 6: De coronacrisis beheren en Brexit

Met het uitbreken van de coronapandemie werd het voor producenten van audiovisuele producties onmogelijk om schade en annuleringskosten te verzekeren, terwijl het risico uiteraard reëel was dat een productie zou moeten worden stopgezet door besmetting van onvervangbare cast- of crewleden of door overheidsmaatregelen tijdens een besmettingsgolf. Om zulke onvoorziene kosten op te vangen, werden relancemiddelen ingezet voor de oprichting van een **garantiefonds**. Zo werd vermeden dat de sector zou stilvallen omdat het te risicovol was voor producenten om producties op te starten. De werking van het 'Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector' liep tot 31 oktober 2022. Er werden tijdens de looptijd 155 dossiers geregistreerd, die samen een totale Belgische productiekost

vertegenwoordigden van 131.838.275 euro. Uiteindelijk werden er 6 schadeclaims toegekend, verspreid over 4 producties, voor een totaalbedrag van 279.889 euro (VV153).

In het kader van **Brexit-gerelateerde maatregelen**, kunnen we o.a. stellen dat de Helpdesk Brexit tussen 1 januari 2021 en 29 november 2022 979 Brexit-gerelateerde vragen ontving (VV109).

Speerpunt 7: De overheid efficiënter maken

Op 20 mei 2022 wijzigde de Vlaamse Regering de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO): met artikel 9 wordt het gebruik van **brede heroverwegingen** en **uitgaventoetsingen** verankerd in het begrotingsproces. Verder werden er in 2022 zes nieuwe uitgaventoetsingen opgestart ter voorbereiding van de volgende regeringsvorming: Vlaamse sociale bescherming, Modal Shift Goederenvervoer, Duurzaam watergebruik en de organisatie van het waterlandschap, Gezinsfiscaliteit en gezinsbijslag, Culturele Bovenbouw, Organisatiestructuur van de Vlaamse overheid (VV158).


5 KERNCIJFERS OVER DE RELANCEPROJECTEN OP MEETMOMENT 31 DECEMBER 2022

5.1 PROJECTVOORTGANG

5.1.1 Algemene projectvoortgang


In vergelijking met de vorige metingen is er opnieuw duidelijk vooruitgang geboekt, en is de omslag gemaakt van een groot peloton met projecten die 'op schema en in uitvoering' zijn naar een kopgroep van gerealiseerde projecten.

Projectstatus ● Nog niet opgestart ● Opgestart ● In uitvoering na agendering VR ● Aandacht nodig ● Actie nodig ● Gerealiseerd

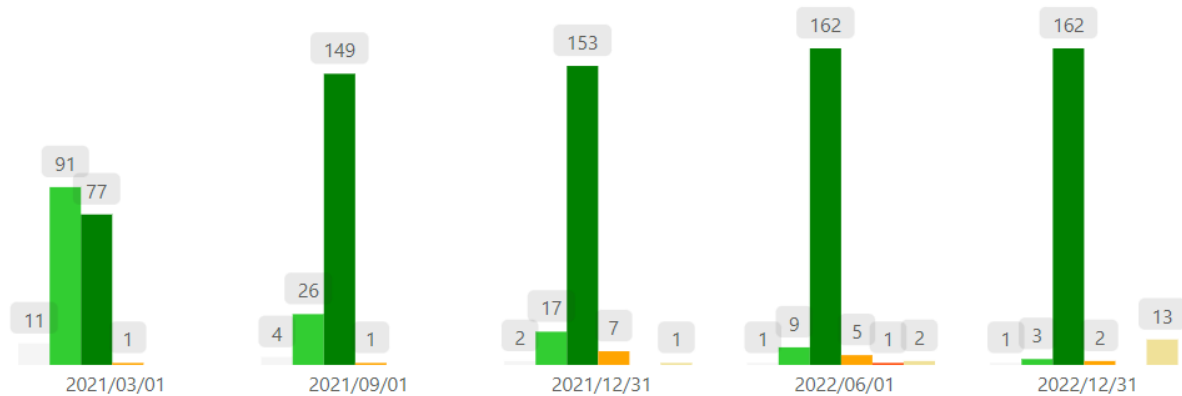

Hieronder vindt men de projectstatus van de 181 relanceprojecten op meetmoment 31 december 2022. Een 181^{ste} project werd toegevoegd tussen meting 4 en 5. Het project VV181 ondersteunt de visserij- en landbouwsector n.a.v. de Oekraïne-crisis. De financiering van dit project (6 miljoen euro) komt voort uit een verschuiving van middelen uit VV028, VV033 en VV101.

Projectstatus ● Nog niet opgestart ● Opgestart ● In uitvoering na agendering VR ● Aandacht nodig ● Gerealiseerd

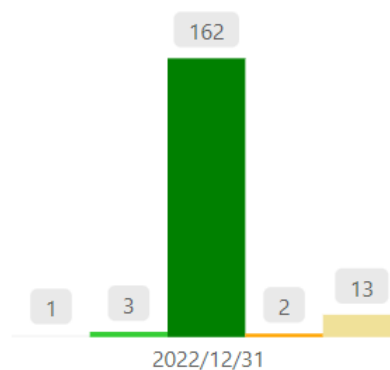


- 162 van de 181 relanceprojecten (90%) zijn in uitvoering en lopen op schema na agendering op de Vlaamse Regering (deze krijgen de kleur donkergroen), 13 van de projecten (7%) zijn gerealiseerd (geel). Het gaat over volgende projecten:
 - VV044 | Minnelijke verwervingen en onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge
 - VV046 | Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen
 - VV064 | FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening
 - VV118 | Groeipakket - verderzetten digitalisering
 - VV121 | Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1
 - VV140 | Samenwerkingsverbanden “één gezin, één plan”
 - VV146 | Compensatiebesluit KO - extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)
 - VV153 | Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector
 - VV154 | Impuls aan VAF Filmfonds
 - VV155 | Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds
 - VV176 | Zijinstroom vanuit de privésector naar het onderwijs aantrekkelijk maken
 - VV179 | Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen
 - VV181 | Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij
- 1 project heeft de status ‘nog niet opgestart’ (lichtgrijs). Het betreft volgende project:
 - ‘VV169 | Versnelde uitrol glasvezelnetwerk en 5G’: De plannen om 5G-uitrol via de oprichting van een TowerCo zijn even on hold gezet. Towerco’s zijn ondernemingen waarvan de activiteit eruit bestaat om antennesites te beheren en te verhuren. Er lopen ondertussen gesprekken met enkele Telecomoperatoren om te verkennen wat er mogelijk is.
- 3 projecten kregen de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Het betreft volgende projecten:
 - ‘VV159 | Snellere vergunnings- en beroepsprocedures’: de wetgevende initiatieven zijn opgestart, maar het project werd nog niet geagendeerd op de Vlaamse Regering.
 - ‘VV172 | Investerings in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO2 captatie & hergebruik’: Het project is besproken op Vlaamse regering maar nog niet geformaliseerd, omdat het een project is met Europese financiering en er wordt gewacht op een akkoord van de EU in verband met de staatssteun.
 - ‘VV173 | Ad hoc investeringsmiddelen als cofinanciering voor Europese steun’: De permanente monitoring van subsidiemogelijkheden via Europese kanalen voor projecten op het vlak van innovatie en duurzaamheid is een continu proces dat deel uitmaakt van de recurrente werking binnen het beleidsdomein EWI.

- 2 projecten hebben de status 'aandacht nodig' (oranje). Het betreft het project 'VV085 | Kursaal Oostende', waar de stijgende materiaalprijzen een herziening van de projectambities noodzakelijk maken, en het project 'VV168 | Versnelde uitrol digitale meters', waar er vertraging opgelopen is omwille van twijfel bij de netgebruikers en achterstand door de covidcrisis.
 - VV085: EKO nv meldde dat de raming van het definitieve ontwerp hoger is dan het voorziene budget omwille van stijgende materiaalprijzen. EKO nv polste naar bijkomende financiering en bezorgde de administratie een aangepaste raming. Het is inmiddels duidelijk dat vanuit de Vlaamse overheid geen bijkomende financiering kan toegekend worden. De opmaak van het aanbestedingsdossier werd in tussentijd verdergezet maar de ambities van het project zullen aangepast worden in functie van beschikbare budgetten. Het basisidee van het ombouwen van de zaal tot een multifunctionele zaal blijft behouden binnen het project.
 - VV168: Eind oktober 2022 waren 2.014.513 digitale meters voor elektriciteit en aardgas geïnstalleerd. Dit komt overeen met 32% van de toegangspunten die beschikken over een kleinverbruiksmeterinrichting. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de terugdraaiende teller vernietigde, werd de uitrol bij bestaande prosumenten achteruitgeschoven en is er bij heel wat netgebruikers nog steeds heel wat twijfel om een digitale meter te laten installeren. Ook omwille van de covidcrisis werd een vertraging opgelopen. Hierdoor is een uitrol van 80% eind 2024 uitdagend.


5.1.2 Projectvoortgang per speerpunt

Bekijken we de projectvoortgang op het niveau van de zeven speerpunten op basis van percentages, dan zien we een duidelijke vooruitgang met relatief veel gerealiseerde projecten in speerpunt 6 'De coronacrisis beheren en Brexit', waar 5 van de 12 projecten reeds gerealiseerd zijn. In speerpunt 5 'Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken' zijn 4 van de 22 projecten gerealiseerd.

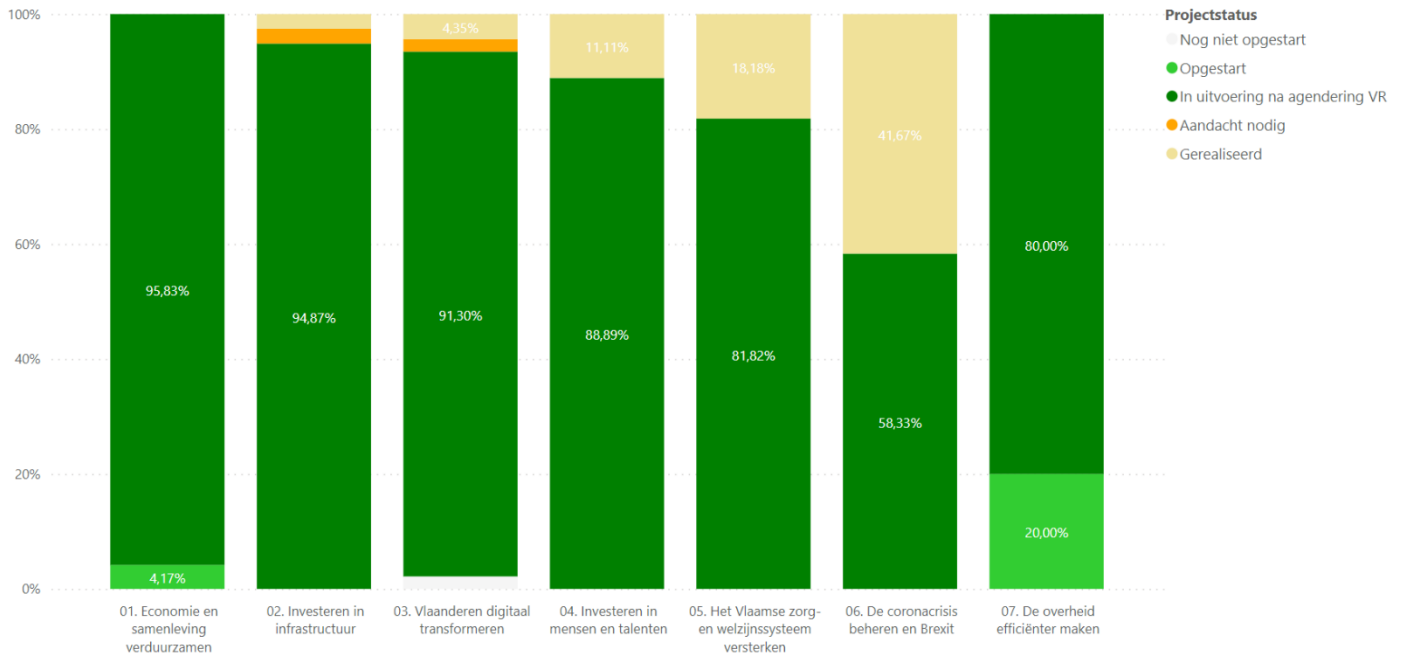

5.1.3 Projectvoortgang per cluster

Bekijken we de projectvoortgang op het niveau van de 36 clusters, dan zien we dat cluster 36 'Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij' aangegeven is als volledig gerealiseerd, net zoals cluster 22, 'Investeren in personen met een handicap' en cluster 31 'Audiovisuele Infrastructuur'. In Cluster 35 zijn er nog projecten aangegeven als niet opgestart, of nog niet geagendeerd op de VR. De projecten waar aandacht voor nodig is, situeren zich in cluster 14 en 35.

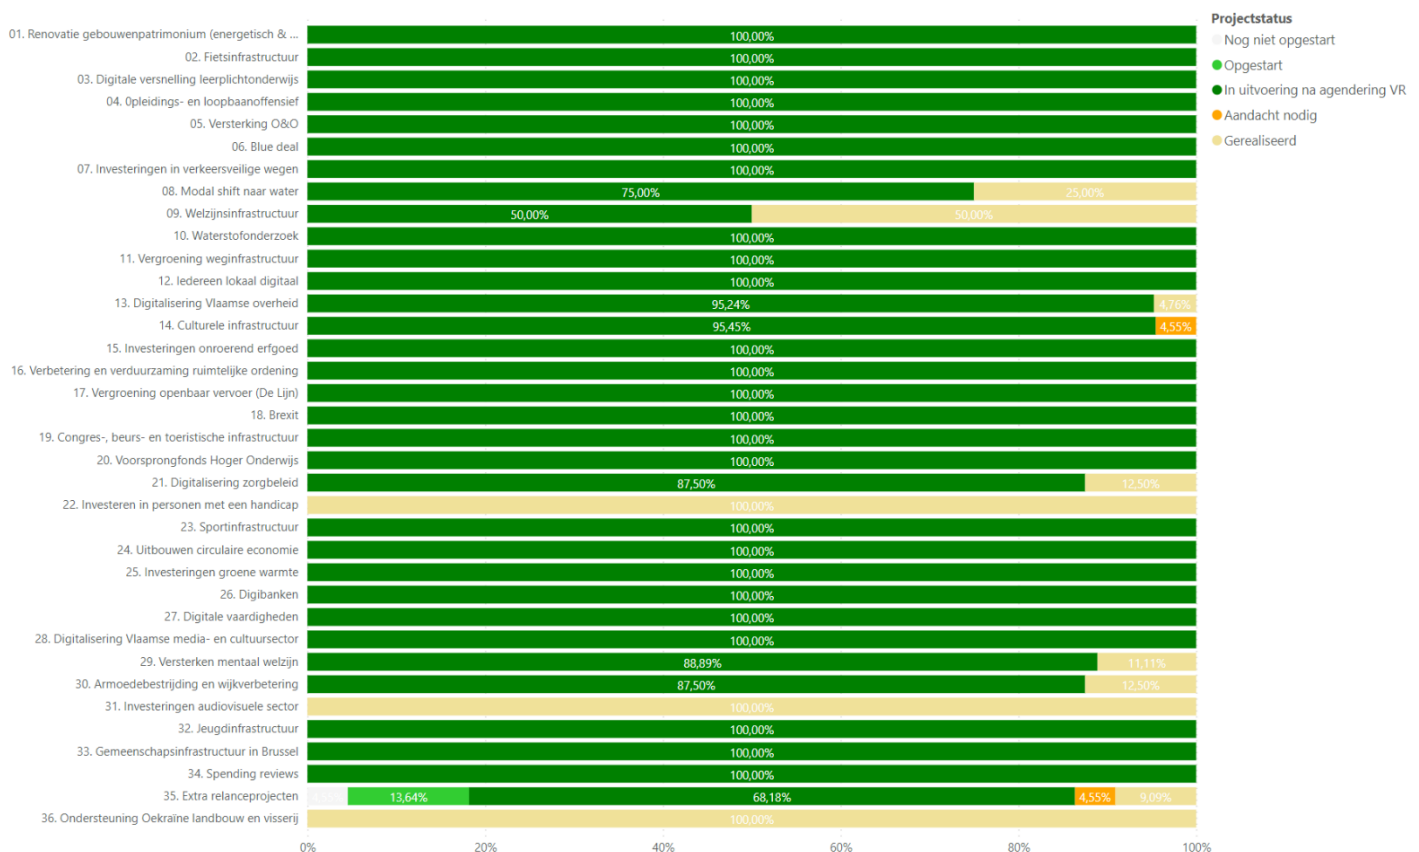

5.2 MIJLPALLEN


5.2.1 Globaal

Naast de algemene statusvoortgang van de 181 projecten worden voor alle projecten ook de onderliggende mijlpalen opgevolgd.

Een mijlpaal blijft op 'nog niet gestart' staan, zolang er binnen het project geen relevante activiteit is met betrekking tot deze mijlpaal. Pas wanneer de uitvoering van deze mijlpaal effectief gestart is, wordt bepaald of deze mijlpaal al dan niet 'op schema' is.

Bij de meting in december 2022 werden bijkomende mijlpalen opgenomen in vergelijking met de meting van juni 2022. Het aantal mijlpalen steeg daarbij van 1469 naar 1682 mijlpalen.

In een eerste grafiek wordt een overzicht gegeven van de 1197 vastgelegde mijlpalen van Q1 2020 tot en met Q2 2023 voor de 181 relanceprojecten. Op deze manier wordt achteruitgekeken, maar ook al vooruit, naar het volgende meetmoment op 1/06/2023.

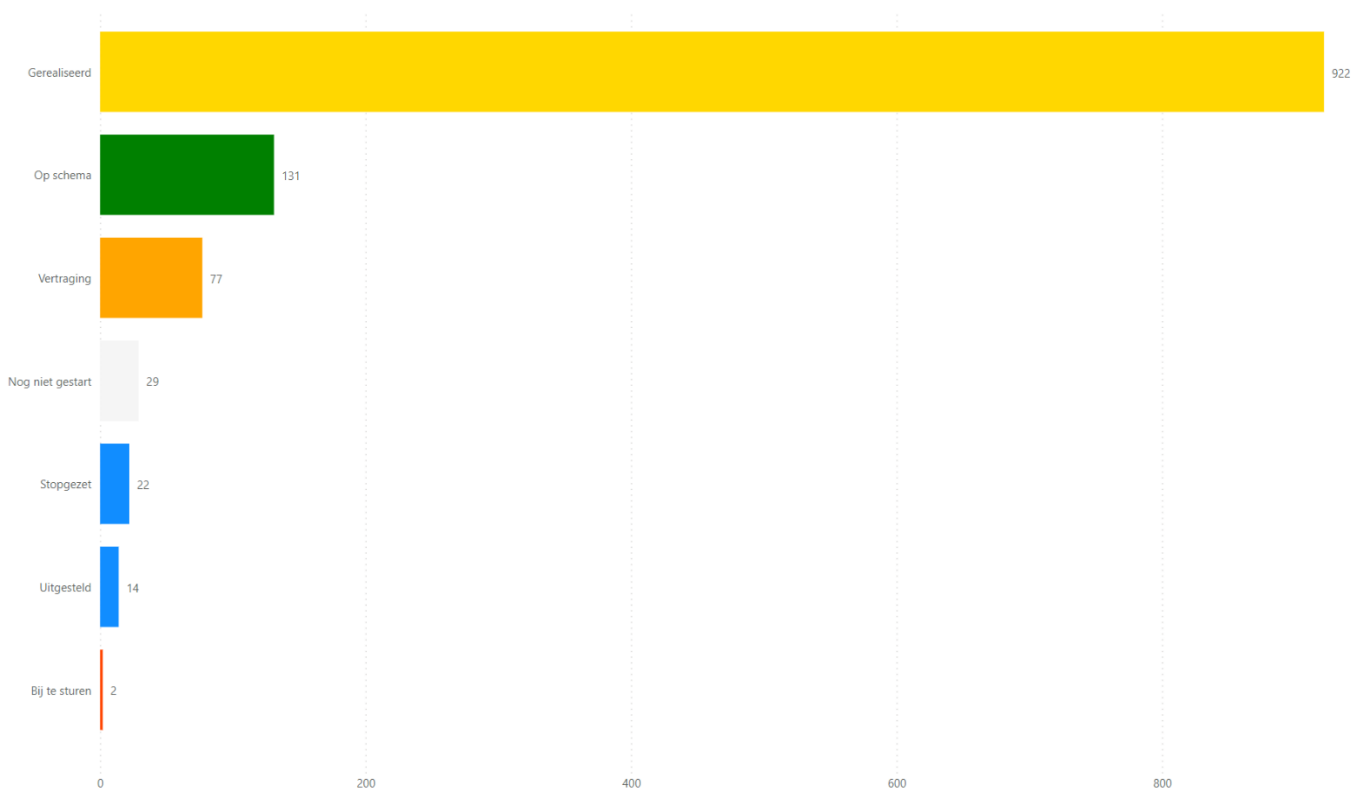


Status alle mijlpalen van Q1 2020 tot en met Q2 2023 voor de 181 projecten

Eerst en vooral kunnen we stellen dat 71,2% van alle mijlpalen van de 181 projecten zich situeren in de periode tot en met Q2 2023. Meer dan driekwart van de mijlpalen (77%) voorzien in die periode werd inmiddels behaald. Bij vorige meting was dit nog de helft, wat aangeeft dat de projecten met deze meting op snelheid komen. 131 of 11% van de mijlpalen zijn op schema, 77 of 6% van de mijlpalen kennen vertraging.

29 of 2,5% van de mijlpalen die gepland staan voor het volgende meetmoment dienen nog te worden opgestart. 22 mijlpalen werden stopgezet, 14 mijlpalen werden uitgesteld, 2 mijlpalen zijn bij te sturen.

Een volgende grafiek toont de status van alle 1682 mijlpalen van de 181 relanceprojecten, vanaf het begin van de uitvoering van het relanceplan in 2020, tot de datum van de laatste mijlpaal die werd opgenomen in het relanceplan, in het vierde kwartaal van 2030. Dit geeft een mooi overzicht van de mijlpalen die de komende 8 jaar nog gehaald dienen te worden. Tussen 2023 en 2030 staan er nog 622 mijlpalen ingepland, goed voor 37% van alle mijlpalen.

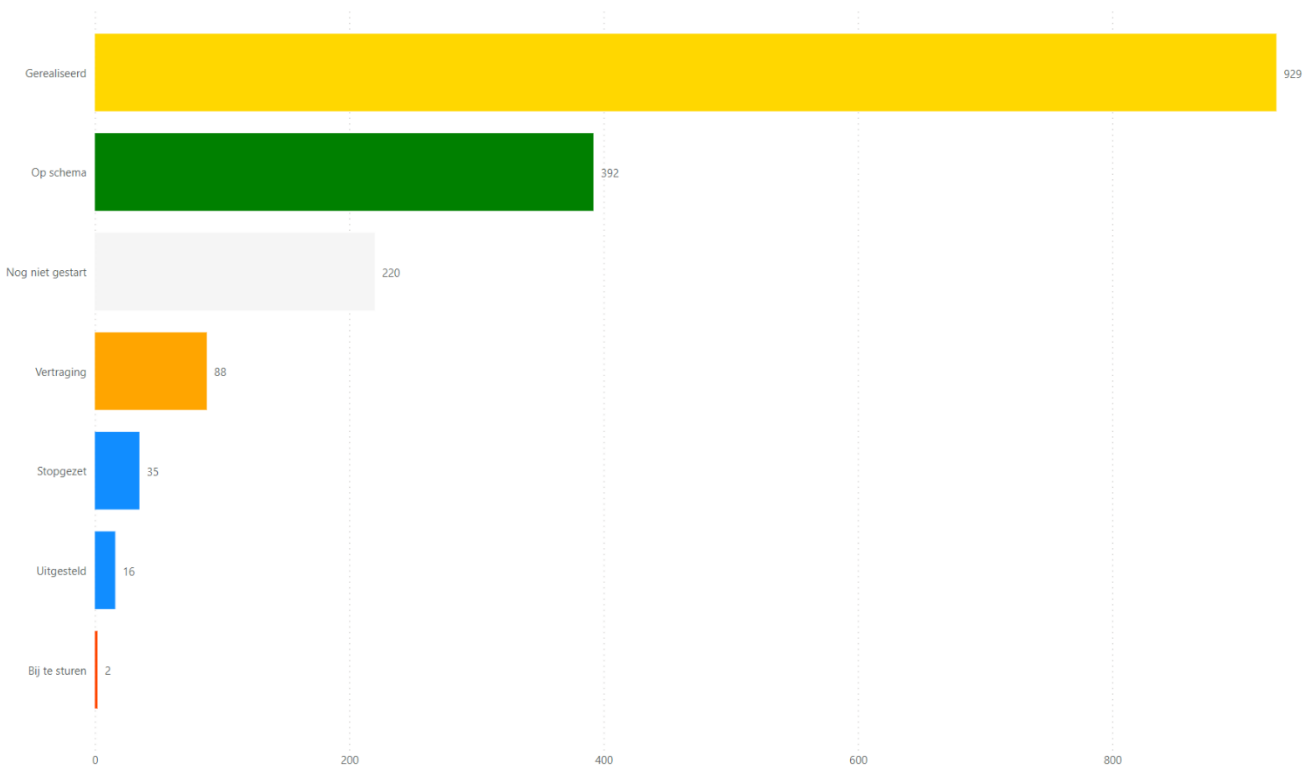

Status alle mijlpalen voorzien van 2020 t.e.m. 2030 voor de 181 projecten

1321 van de 1682 mijlpalen die zich situeren tussen 2020 en 2030, zijn ofwel op schema ofwel gerealiseerd, dit is 78% van alle mijlpalen. Als we de verhouding nemen van de mijlpalen op schema en gerealiseerd t.o.v. alle mijlpalen zonder rekening te houden met de verder in de toekomst liggende en dus nog niet opgestarte mijlpalen (220 of 13%), dan komen we zelfs aan 90% van de mijlpalen die eind december 2022 op schema staan of al gerealiseerd zijn.

88 (5,2%) mijlpalen hebben vertraging. Dat zijn mijlpalen waarvan de realisatie is gestart, maar de geplande deadline niet kan worden gehaald. Er worden verschillende redenen aangehaald voor de 88 vertraagde mijlpalen. We geven er enkele mee: gebrek aan interne en externe capaciteit (o.m. de beschikbaarheid van aannemers), bevoorradingsproblemen, bijgestelde planning door een groter dan verwachte complexiteit of onvoorziene omstandigheden, men wacht op een beslissing van een andere overheid, interne enveloppeverschuivingen tussen projecten binnen Vlaamse Veerkracht, het financieel plan is nog onvolledig,


... . De meeste redenen voor vertragingen zijn terug te brengen tot een onvoorziene verhoogde complexiteit en een daaruit volgende bijsturing van het projectproces.

16 (0,9%) mijlpalen werden uitgesteld. Uitgestelde mijlpalen zijn mijlpalen waarbij de activiteiten voor het realiseren van de mijlpaal nog niet zijn opgestart, en waar een nieuwe deadline voor een mijlpaal gepland wordt. Er worden verschillende redenen aangehaald voor de uitgestelde mijlpalen: focuswijziging, noodzaak aan bijkomende procedures bij de Europese Commissie.

35 (2%) mijlpalen werden stopgezet. In dat geval worden de activiteiten voor het realiseren van de mijlpaal niet opgestart of verdergezet. Er worden verschillende redenen aangehaald voor de stopgezette mijlpalen: focuswijziging of grondige heroverweging van het traject, de keuze voor een andere procedure, hogere kostprijs van de projecten, heroriëntering van middelen voor Oekraïenmaatregelen en overschakeling naar reguliere middelen. Het aantal stopgezette mijlpalen ligt merkkelijk hoger dan bij vorige meting, wat, zoals ook uit de duiding blijkt, voor een groot stuk te maken heeft met de ‘vastleggingsdeadline’ eind 2022. Deze heeft ervoor gezorgd dat mijlpalen waar onzekerheid was over de realisatie uit Vlaamse Veerkracht gehaald zijn en vervangen door acties waarvan men wel zeker was over de besteding van middelen.


5.2.2 Mijlpalen per speerpunt

Wanneer we de mijlpalen tot en met Q2 2023 bekijken per speerpunt, dan kunnen we vaststellen dat speerpunt 03 ‘Vlaanderen digitaal transformeren’ het meest aantal gerealiseerde mijlpalen heeft. Daarnaast valt op dat er voor speerpunt 02 ‘Investeren in infrastructuur’ en speerpunt 03 ‘Vlaanderen digitaal transformeren’ zoals bij vorige meting nog een aanzienlijk aantal niet opgestarte mijlpalen zijn. We stellen verder ook aandachtspunten vast in 5 van de 7 speerpunten m.b.t. het aantal vertraagde mijlpalen. Dat is het geval in speerpunt 01 ‘Economie en samenleving verduurzamen’, speerpunt 02 ‘Investeren in infrastructuur’, speerpunt 03 ‘Vlaanderen digitaal transformeren’, speerpunt 5 ‘Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken en speerpunt 07 ‘De overheid efficiënter maken’.

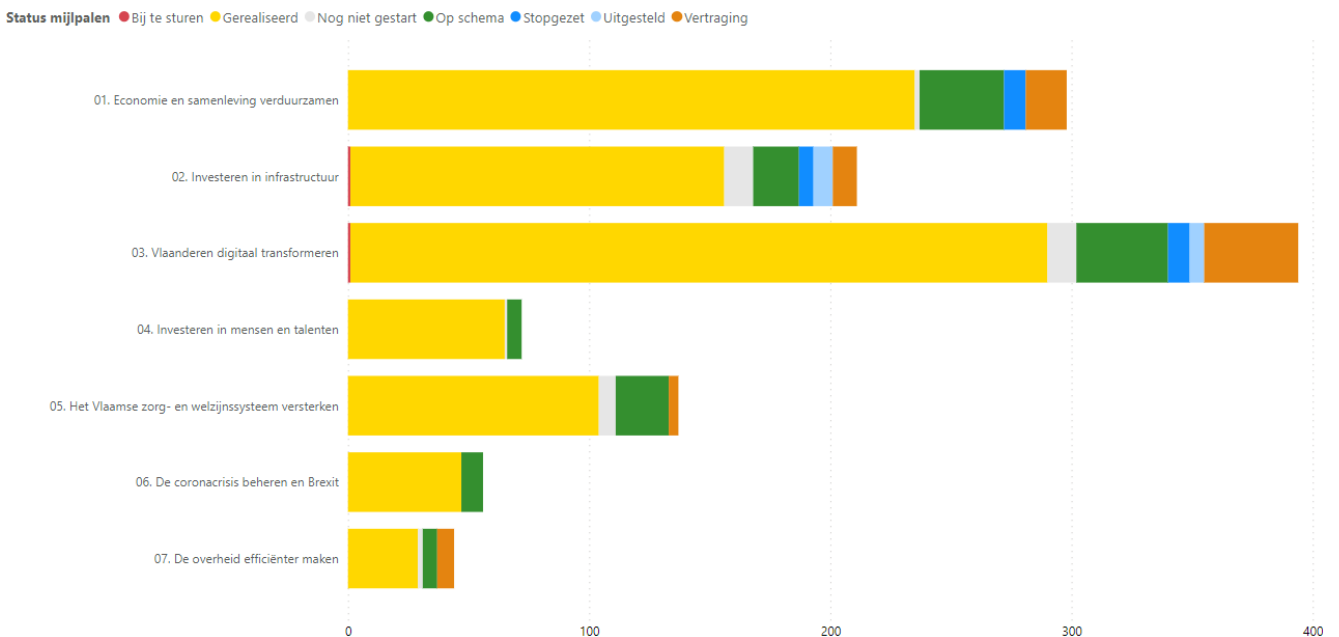


Status alle mijlpalen voorzien tot en met Q2 2023 voor de 181 projecten per speerpunt

Als we dezelfde cijfers in verhouding zetten, dan zien we dat speerpunt 04 'Investeren in mensen en talenten' in verhouding het meest gerealiseerde mijlpalen heeft en speerpunt 07 'De overheid efficiënter maken' het minst. Dat laatstgenoemde speerpunt heeft dan weer in verhouding het grootste aantal vertraagde mijlpalen.

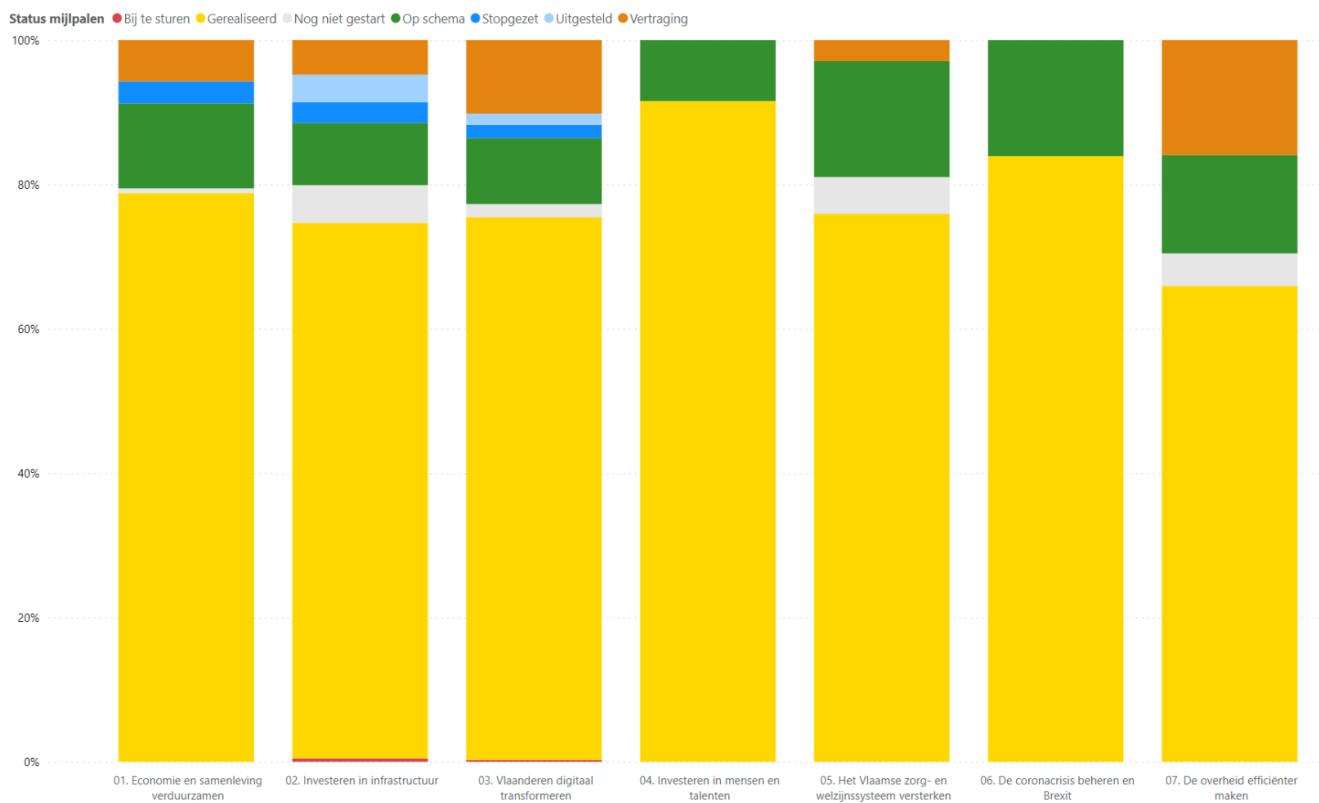


Verhouding status mijlpalen t.e.m. Q2 2023 verdeeld over de 7 speerpunten

Onderstaande figuur geeft het globale overzicht van alle mijlpalen van 2020 t.e.m. 2030 over de 7 speerpunten. We zien opnieuw een duidelijk verschil in aantal mijlpalen per speerpunt en het grootst aantal mijlpalen bij speerpunt 03 'Vlaanderen digitaal transformeren'.

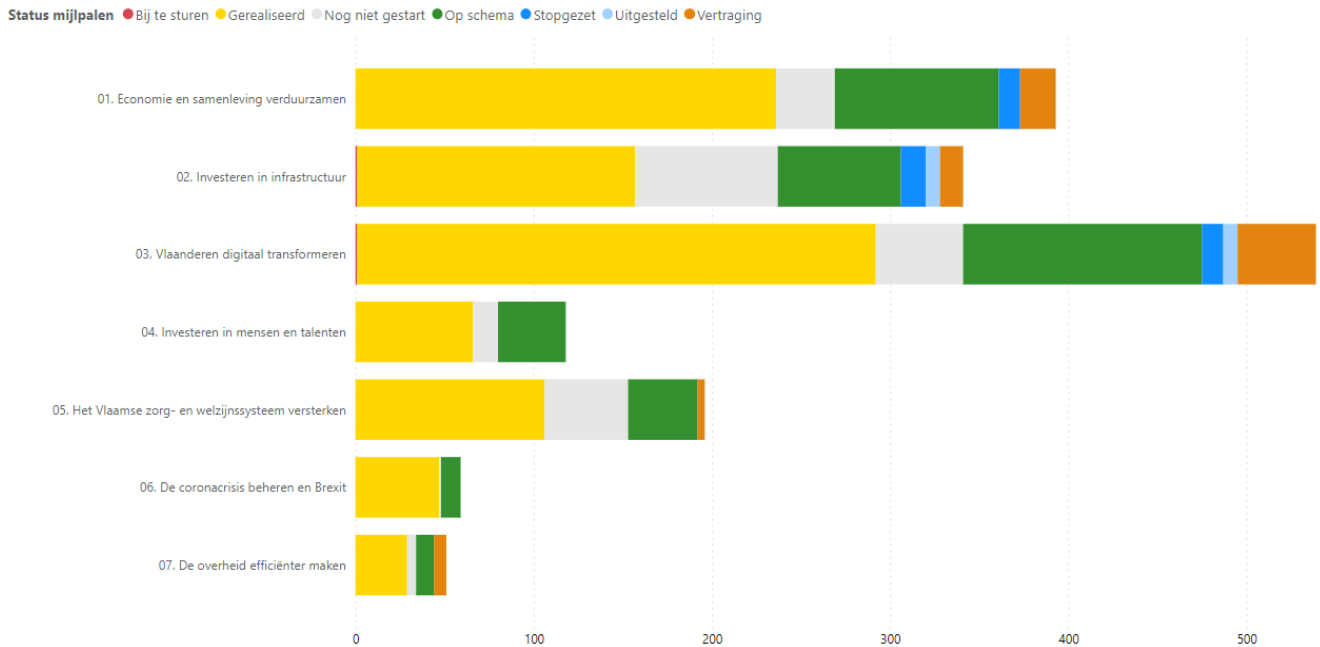

Status alle mijlpalen voorzien in 2020-2030 voor de 181 projecten per speerpunt

Als we dezelfde cijfers in verhouding zetten, dan zien we dat speerpunt 06 'De coronacrisis beheren en Brexit' in verhouding de meeste mijlpalen heeft gerealiseerd en speerpunt 02 'Investeren in infrastructuur' het minst. Speerpunt 07, 'De overheid efficiënter maken' heeft, naar verhouding, het meeste vertraagde mijlpalen. Tegenover vorige meting is het duidelijk dat alle speerpunten erop vooruitgegaan zijn op het vlak van de gerealiseerde mijlpalen, en dat de 'gap' van de nog niet gestarte mijlpalen voor speerpunten 02 en 05 het grootst blijven, maar dat die voor speerpunten 01, 03, en 06, verder gedicht is.

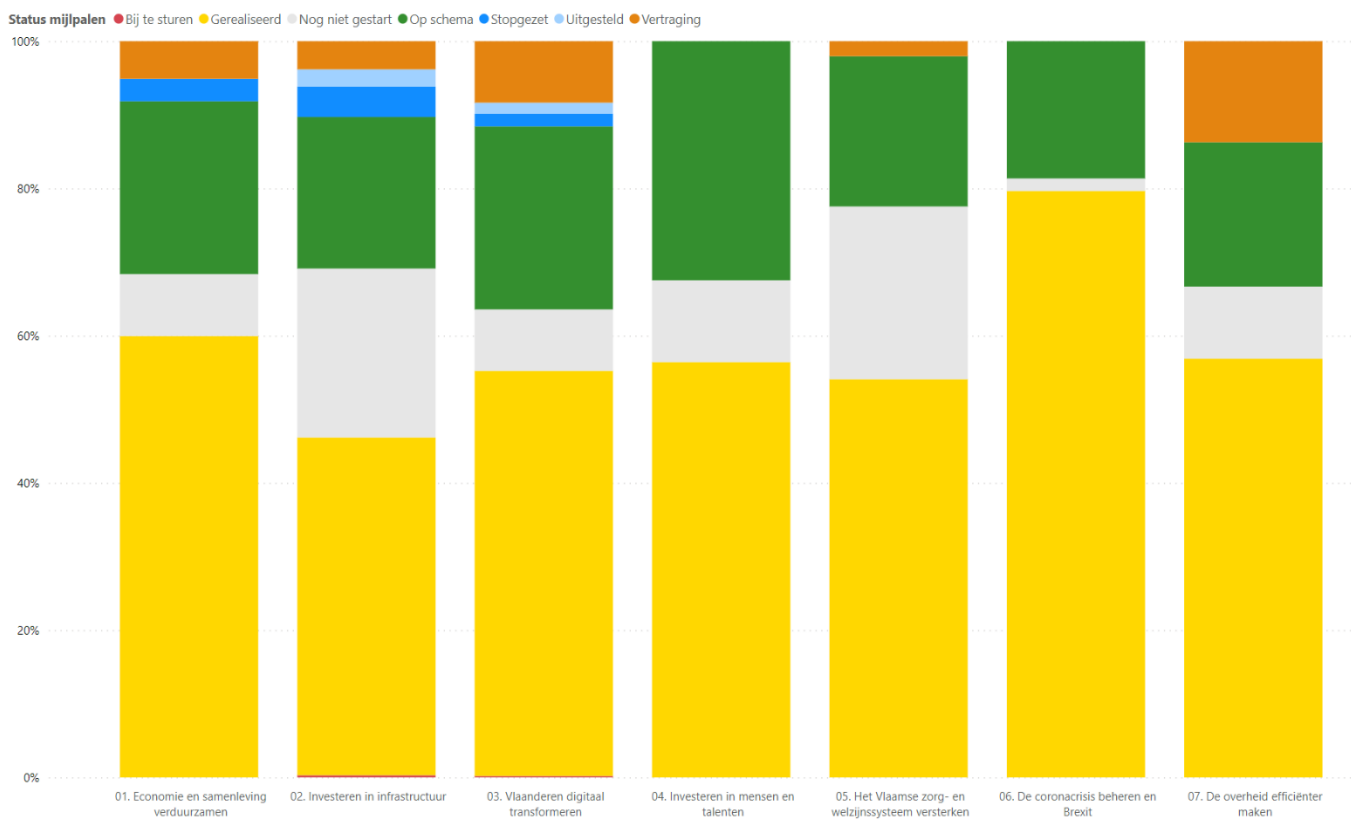


Verhouding status mijlpalen 2020 t.e.m. 2030 verdeeld over de 7 speerpunten

Hieronder bespreken we de details van de mijlpalen per speerpunt (2020–2030).

Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (48 projecten)

Speerpunt 1 heeft 392 mijlpalen met volgende status:

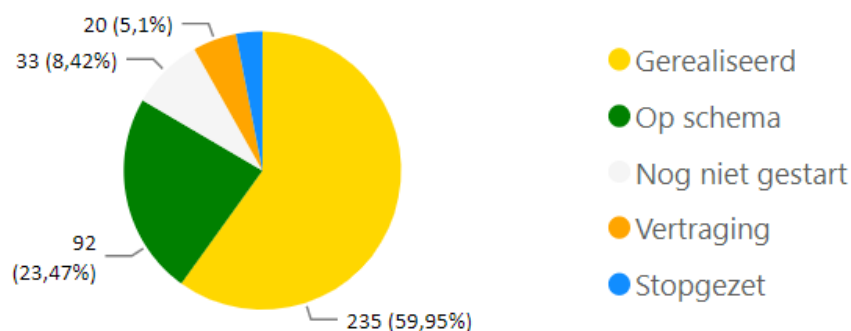

- 235 mijlpalen (60%) zijn gerealiseerd;
- 92 mijlpalen (23%) hebben status 'op schema';
- 20 mijlpalen (5%) hebben status 'vertraging';
- 33 mijlpalen (9%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen);
- 12 mijlpalen (3%) werden stopgezet.

Volgende 15 van de 48 projecten hebben één of meer mijlpalen met vertraging:

- VV001 | Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie
- VV002 | Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie
- VV003 | Asbestpremie daken residentieel met isolatie
- VV006 | Financiering energieluik woningrenovatiepremie
- VV007 | Batterijpremie
- VV008 | EPC-labelpremie residentieel
- VV011 | VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid
- VV023 | Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O
- VV026 | Blue Deal - MOW
- VV035 | Groenblauwe infrastructuur – waterlopen
- VV047 | Waterstofonderzoek
- VV106 | Vergroening openbaar vervoer De Lijn
- VV126 | Call groene warmte


Volgende 5 van de 48 projecten hebben een mijlpaal stopgezet:

- VV026 | Blue Deal – MOW
- VV030 | Hergebruik van restwater

- VV033 | Sensibilisering, opleiding en advisering
- VV047 | Waterstofonderzoek
- VV106 | Vergroening openbaar vervoer De Lijn

Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (39 projecten)

Speerpunt 2 heeft 340 mijlpalen met volgende status:

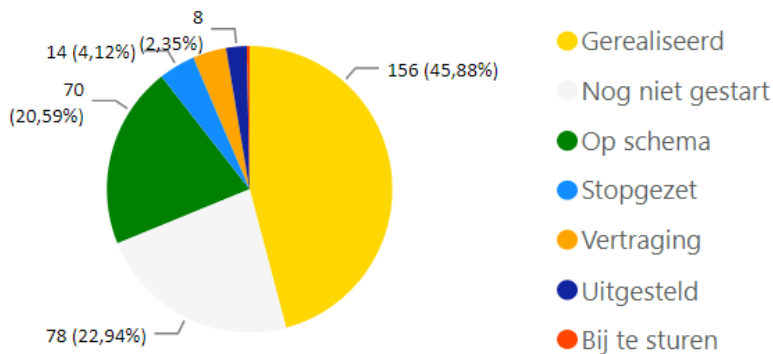

- 156 mijlpalen (46%) zijn gerealiseerd;
- 70 mijlpalen (20%) hebben status 'op schema';
- 14 mijlpalen (4%) hebben status 'vertraging';
- 78 mijlpalen (23%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen);
- 14 mijlpalen (4%) werden stopgezet.
- 8 (2%) mijlpalen werden uitgesteld
- 1 mijlpaal is bij te sturen

Volgende 7 van de 39 projecten hebben één of meer mijlpalen met vertraging:

- VV037 | Assetmanagement - aanpakken cat. 4-kunstbouwwerken in slechte staat
- VV040 | Versnelling verkeerslichtenbeïnvloeding voor een betere en veiligere doorstroming voor de fietser en dynamisch verkeersmanagement
- VV041 | Modal shift naar water - Albertkanaal (versneld verhogen van bruggen)
- VV085 | Kursaal Oostende
- VV087 | Materniteit de Bijloke - de Creatiecluster (Gent)
- VV091 | Nieuwbouw de Kopergietery Gent
- VV156 | Jeugdinfrastructuur

Volgende 3 van de 39 projecten hebben een mijlpaal stopgezet:

- VV037 | Assetmanagement - aanpakken cat. 4-kunstabouwwerken in slechte staat
- VV042 | Modal shift naar water - extra kaaimuren
- VV078 | Ondersteuning culturele infrastructuur

Volgende 5 van de 39 projecten hebben een uitgestelde mijlpaal:


- VV079 | deSingel Antwerpen
- VV081 | Grote culturele infrastructuur
- VV082 | Hotel Dumont Antwerpen
- VV090 | Museumsite De Zwijgershoek Sint-Niklaas
- VV094 | Kunstenwerkplaats 'KC Groenplein' Hasselt

Volgend project heeft een bij te sturen mijlpaal:

- VV092 | Nieuwe bibliotheek Sint-Niklaas

Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (46 projecten)

Speerpunt 3 heeft 527 mijlpalen met volgende status:

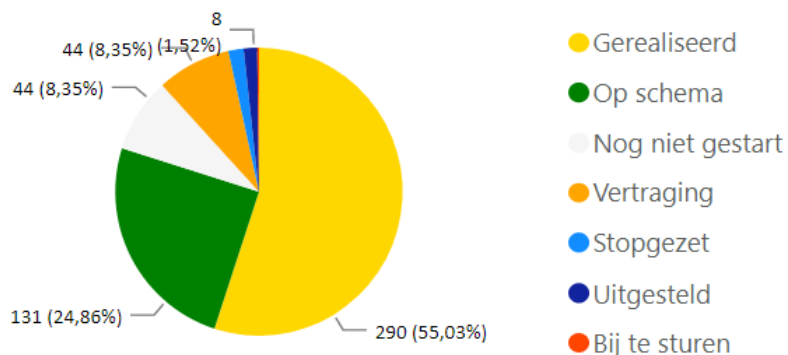

- 290 mijlpalen (54%) zijn gerealiseerd;
- 131 mijlpalen (25%) hebben status 'op schema';
- 44 mijlpalen (8%) hebben status 'vertraging';
- 44 mijlpalen (9%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen);
- 8 mijlpalen (1%) werden uitgesteld;
- 9 mijlpalen (2%) werden stopgezet;
- 1 mijlpaal is bij te sturen

Volgende 21 van de 46 projecten hebben één of meer mijlpalen met vertraging:

- VV050 | Digitalisering integratie & inburgering
- VV056 | Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022
- VV057 | Ondersteuning Digitale Transformatie
- VV059 | Digitalisering asset management Aquafin
- VV060 | Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel
- VV063 | Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck
- VV064 | FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening
- VV065 | HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM (Security Information & Event Management)
- VV066 | HFB - Hybride digitale werkplek
- VV067 | HFB - Modernisering cloud en netwerkinfrastructuur
- VV068 | Kaleidos – Digitalisering van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering
- VV069 | Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit
- VV070 | MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem
- VV072 | Doelgericht digitaal transformeren
- VV075 | VLM - MAP6 en datawarehouse
- VV076 | Zelf beheerde identiteit
- VV115 | Digitalisering RIZIV-sectoren
- VV117 | Enkelbanden en strafuitvoering
- VV118 | Groeipakket - verderzetten digitalisering
- VV131 | Cultuur - integratietraject erfgoeddatabanken
- VV168 | Versnelde uitrol digitale meters

Volgende 4 van de 46 projecten hebben één of meer uitgestelde mijlpalen:

- VV068 | Kaleidos – Digitalisering van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering
- VV070 | MATIS, het Vlaamse Materialeninformatiesysteem
- VV072 | Doelgericht digitaal transformeren
- VV133 | Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector

Zes van de 46 projecten hebben één of meer stopgezette mijlpalen:


- VV050 | Digitalisering integratie & inburgering
- VV064 | FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening
- VV068 | Kaleidos – Digitalisering van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering
- VV113 | Blended-care jeugdhulp – Bandbreedte
- VV129 | Cultuur - betere informatiedoorstroming en koppeling databanken
- VV130 | Cultuur - digitalisering van collecties

Eén project heeft een bij te sturen mijlpaal:

- VV072 | Doelgericht digitaal transformeren

Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (9 projecten)


Speerpunt 4 heeft 117 mijlpalen met volgende status:

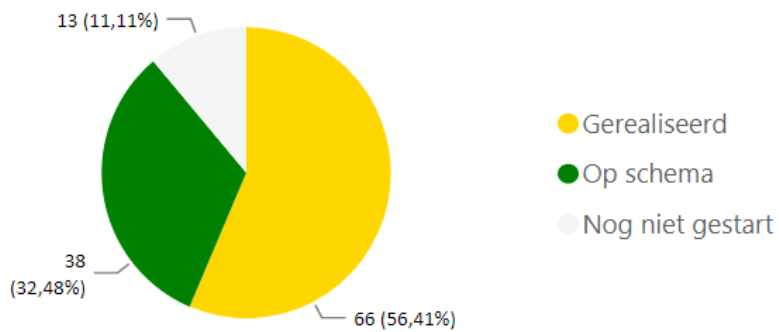

- 66 mijlpalen (56%) zijn gerealiseerd;
- 38 mijlpalen (32%) hebben status 'op schema';
- 13 mijlpalen (12%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen);

Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (22 projecten)

Speerpunt 5 heeft 196 mijlpalen met volgende status:

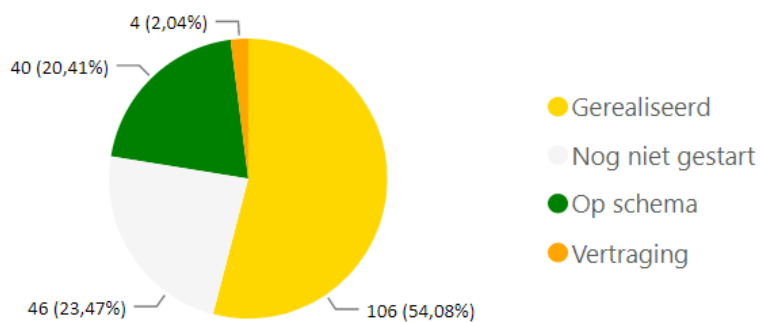


- 106 mijlpalen (54%) zijn gerealiseerd;
- 46 mijlpalen (24%) hebben status 'op schema';
- 4 mijlpalen (2%) hebben status 'vertraging';
- 40 mijlpalen (20%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen).

Volgende projecten hebben mijlpalen met vertraging:

- VV137 | Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen
- VV140 | Samenwerkingsverbanden “één gezin, één plan”

Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (12 projecten)


Speerpunt 6 heeft 59 mijlpalen met volgende status:

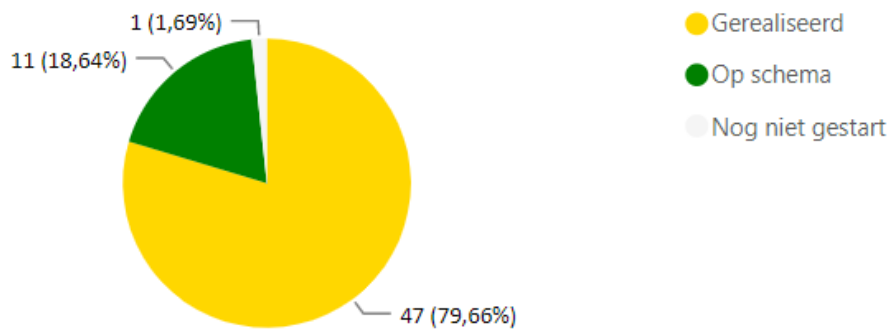

- 47 mijlpalen (80%) zijn gerealiseerd;
- 11 mijlpalen (19%) hebben status ‘op schema’;
- 1 mijlpaal (2%) heeft de status ‘nog niet gestart’ (betreft een toekomstige mijlpaal).

Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (5 projecten)

Speerpunt 7 heeft 51 mijlpalen met volgende status:

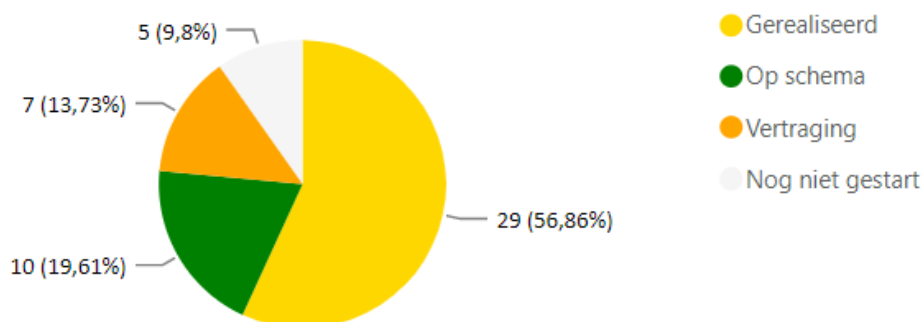

- 29 mijlpalen (55%) zijn gerealiseerd;
- 10 mijlpalen (22%) hebben status ‘op schema’;
- 7 mijlpalen (14%) hebben status ‘vertraging’;


- 5 mijlpalen (10%) hebben status 'nog niet gestart' (betreft toekomstige mijlpalen);

De 7 mijlpalen met status 'vertraging' bevinden zich in volgende projecten:

- VV160 | Administratieve vereenvoudiging
- VV162 | Investeren in Vlaamse kennisoverheid

5.2.3 Mijlpalen per cluster

Als we deze cijfers opsplitsen per cluster, dan krijgen we het volgende beeld.

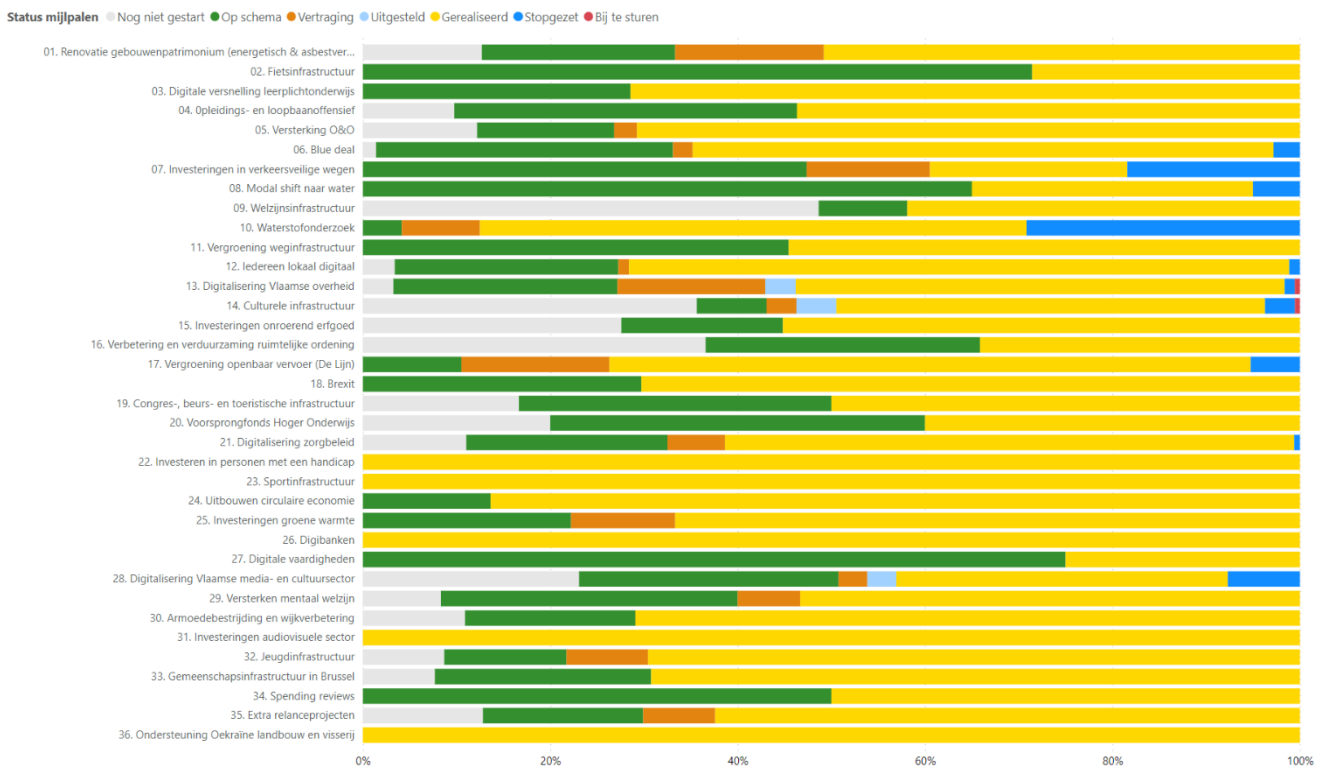

Er zijn 5 clusters met volledig gerealiseerde mijlpalen:

- Cluster 22 'Investeren in personen met een handicap'
- Cluster 23 'Sportinfrastructuur'
- Cluster 26 'Digibanken'
- Cluster 31 'Investeren in audiovisuele sector'
- Cluster 36 'Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij'

De 4 clusters met het grootste aandeel vertraagde mijlpalen zijn:

- Cluster 1 'Renovatie gebouwenpatrimonium'
- Cluster 7 'Investerings in verkeersveilige wegen'
- Cluster 13 'Digitalisering Vlaamse Overheid'
- Cluster 17 'Vergroening Openbaar Vervoer'

5.3 VASTLEGGINGEN EN VEREFFENINGEN

5.3.1 Budgetverschuivingen

Vooraleer een overzicht te geven van de vastleggingen en de vereffeningen, is het belangrijk de budgettaire verschuivingen tussen de VV-projecten weer te geven. Hieronder kan een overzicht worden gevonden van deze budgetneutrale verschuivingen tussen meting 4 en 5.

Van project	Naar project	Bedrag
VV028 Droogteresistente teelten	VV181 Ondersteuning Oekraïne Landbouw en Visserij	496.000 euro
VV032 Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen	VV035 Groenblauwe infrastructuur – waterlopen	951.000 euro
VV033 Sensibilisering, opleiding en advisering	VV181 Ondersteuning Oekraïne Landbouw en Visserij	1.504.000 euro
VV045 Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC en vooruitschuif nieuw beleid	VV115 Digitalisering RIZIV-sectoren	5.511.000 euro
VV045 Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC en vooruitschuif nieuw beleid	VV116 Elektronisch patiëntendossier – Geïntegreerd zorg- en ondersteuningsplan	3.597.000 euro
VV053 Iedereen digitaal – opleiding en vorming	VV014 Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen	6.223.000 euro
VV053 Iedereen digitaal – opleiding en vorming	VV054 Iedereen digitaal – toegang tot computers en internet	1.601.000 euro
VV078 Ondersteuning culturele infrastructuur	VV081 Grote culturele infrastructuur	179.013,87 euro
VV078 Ondersteuning culturele infrastructuur	VV097 Sectorale investeringssubsidies	125.986,13 euro

VV100 Achterstand bij subsidies tegen leegstand verminderen	VV063 Het omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck	865.000 euro
VV101 Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen	VV181 Ondersteuning Oekraïne Landbouw en Visserij	4.000.000 euro
VV102 Investeren in kernversterking via projectoproepen	VV029 Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	4.536.000 euro
VV102 Investeren in kernversterking via projectoproepen	VV111 Hefboomrelanceprojecten	1.500.000 euro
VV128 Digitale vaardigheden	VV018 Opleidingsoffensief arbeidsmarkt	9.000.000 euro
VV134 Digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector	VV102 Investeren in kernversterking via projectoproepen	1.779.000 euro
VV153 Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector	VV156 Jeugdinfrastructuur	4.150.000 euro
VV153 Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector	VV157 Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	625.000 euro

Binnen de MOW-projectmiddelen werd intern in groep budgetneutraal herverdeeld tussen volgende projecten.

Project	Budgetwijziging
VV013 Een groter en veiliger fietsnetwerk (incl. fietstoegang economische poorten en jaagpaden) maakt de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel en helpt zo het gebruik van personenwagens te reduceren	+2,066 mio euro
VV026 Blue deal MOW	+1,74 mio euro
VV037 Asset management - aanpakken catg. 4 kunstbouwwerken in slechte staat (o.a. bruggen)	+5,833 mio euro
VV038 Aanpak gevaarlijke punten	+1,355 mio euro
VV039 Versnelling investeringen in veilige schoolroutes	+2,152 mio euro
VV040 Versnelling verkeerslichtenbeïnvloeding m.h.o.o. betere en veiligere doorstroming voor de fietser en dynamische verkeersmanagement	+0,462 mio euro

VV041 Modal shift naar water - Albertkanaal (versneld verhogen van bruggen en verruiming vak Wijnegem-Antwerpen)	+3,533 mio euro
VV042 Modal shift naar water – extra kaaimuren	-2,585 mio euro
VV043 Modal shift naar water - opstart Dender (verhoging watertransportcapaciteit)	-7,824 mio euro
VV048 Investering LED-verlichting gewestwegen (VEKP)	-5,5 mio euro
VV049 Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur	-1,232 mio euro

5.3.2 Vastleggingen en vereffeningen voor VV001-VV158 en VV181

De uitvoeringscijfers van de vastleggingen en vereffeningen zijn een goede indicator voor de voortgang van een project. Projecten VV001-VV158 en het (sinds meting 5) nieuwe project VV181 worden gefinancierd door de voorziene 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen. Projecten VV159-180 worden gefinancierd met bijkomende reguliere middelen. De vastleggingen en vereffeningen voor deze laatstgenoemde projecten worden niet opgenomen in de VV-voortgangsrapportering. Ze kunnen opgevolgd worden via de jaarlijkse Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT). De cijfers hieronder hebben dus alleen betrekking op de vastleggingen en vereffeningen van de projecten VV001-VV158 en VV181 en de voorziene 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen.

Voor bepaalde projecten werden in uitvoering meer vastleggingen gedaan dan voorzien bij de herverdelingen vanuit de relanceprovisie. Conform de afspraken worden de bijkomende vastleggingen met reguliere middelen gefinancierd. In deze fase kan echter de beperkte zijinstroom van reguliere middelen nog niet met absolute zekerheid worden afgezonderd van de relancemiddelen. Wanneer de vastleggingen in uitvoering het herverdeelde VAK overstijgt, kan dit er wel met zekerheid worden uitgezuiverd. Bij de instructies voor de volgende voortgangsrapportering zal aan de entiteiten gevraagd worden om de vastleggingen die gedaan werden met reguliere middelen uit te zuiveren. Samengevat wordt in deze voortgangsrapportering de VAK-uitvoering afgetopt op het herverdeelde VAK om al ten dele de vastleggingen met reguliere middelen eruit te zuiveren. Concreet heeft dit betrekking op reguliere middelen ten belope van 4,738 miljoen euro die worden afgetopt¹². Op basis van de info die op dit moment beschikbaar is, komt dit neer op een voorlopig totaal van 4,086 miljard euro vastleggingen op middelen die herverdeeld werden uit de relanceprovisie. Het definitieve VAK in uitvoering zal mogelijks nog beperkt dalen ten gevolge van de resterende reguliere middelen die eruit zullen worden gefilterd en beperkt stijgen ten gevolge van de definitieve cijfers op basis van de jaarrekening(en).


¹² Er werd voor 4.117.211 k€ VAK herverdeeld en 4.129.255 k€ VAK in uitvoering vastgelegd. De uitvoering op het luik van VV018 dat met middelen uit React EU wordt gefinancierd, wordt om technische redenen buiten de relanceprovisie gehouden. Als er van die uitvoering abstractie wordt gemaakt, dan resteert 4.738 k€ VAK uitvoering die er wordt afgetopt.

De status op 31/12/2022 is belangrijk want vastleggingen op de relanceprovisie zijn niet langer mogelijk vanaf 2023. Op 31/12/2022 komen we uit op een vastgelegd budget van 4,086 miljard euro van de oorspronkelijk voorziene 4,3 miljard euro. Dat is 95% van de begrote middelen, een stijging van 2,086 miljard in vergelijking met de vorige meting met meetmoment 1 juni 2022. Dat is meer dan een verdubbeling van de vastleggingen in zeven maanden tijd (1 juni 2022 – 31 december 2022). 136 van de 159 projecten die middelen uit de relancepot krijgen, haalden vastleggingspercentages van meer dan 95%. 13 projecten haalden vastleggingspercentages tussen 75 en 95%, 3 projecten tussen 50 en 75%. 7 projecten legden minder dan 50% van de middelen vast.

1,31 miljard euro of 30,4% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was op 31/12/2022 vereffend. Dat is een stijging van 864 miljoen euro in vergelijking met de vorige meting van 1 juni 2022. Procentueel is dit een stijging van 10,4% van de vereffeningen in juni 2022 naar 30% van de vereffeningen in december 2022.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend



Vanaf meting 6 van 1 juni 2023 wordt de financiële monitoring gehouden op een nieuwe noemer. Er wordt dan niet langer gerapporteerd over een relancebudget van 4,3 miljard euro, maar wel over het bedrag dat werd vastgelegd op de relanceprovisie, nl. over de 4,086 miljard euro die behoudens het eerder vermelde caveat niet meer zal wijzigen.

Door een globale onderbenutting op de relanceprovisie was het mogelijk om overbenutting toe te staan voor VV10 Congresinfrastructuur met een overbenutting van 50,457 miljoen euro. Project VV10 werd initieel geraamd op 100 miljoen euro investeringen voor Congresinfrastructuur gespreid over een looptijd van 20 jaar, waaronder 20 miljoen euro aan relancemiddelen. Dit zou worden bewerkstelligd via een publiek-private samenwerking waarbij een terbeschikkingstellingsvergoeding van 5 miljoen euro per jaar zou worden ingeschreven. Deze PPS-formule bleek niet opportuun en werd verlaten voor een aanbesteding. Als gevolg werd het gehele bedrag verminderd met 29 miljoen euro maar werd de vastlegging wel naar voren getrokken ten belope van 70,457 miljoen euro. Gegeven de onderbenutting op andere relanceprojecten werd afgesproken dat dit met relancemiddelen kon worden vastgelegd en werd een overbenutting van 50,457 miljoen euro toegestaan bij de herverdeling.


De resterende overbenutting op een beperkt aantal projecten betreft compensaties tussen projecten die tijdens de herverdelingen werden goedgekeurd.

5.3.3 Vastleggingen en vereffeningen per speerpunt voor VV001-VV158 en VV181

Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (43 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 1 bedragen 1,55 miljard euro. Dit is 97% van de voorziene relancemiddelen (1,59 miljard euro) voor dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 1 bedragen 355,89 miljoen euro. Dit is 22% van de voorziene relancemiddelen voor dit speerpunt.

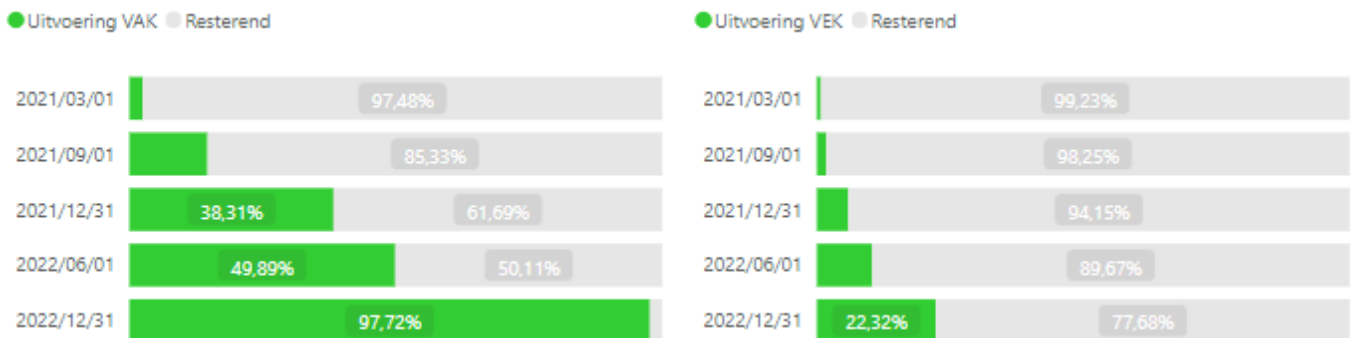


Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (38 projecten)


De vastleggingen voor speerpunt 2 bedragen 1,196 miljard euro. Dit is 104% van de voorziene relancemiddelen (1,146 miljard euro) voor dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 2 bedragen 264 miljoen euro. Dit is 23% van de voorziene relancemiddelen voor dit speerpunt.

Uitvoering VAK %

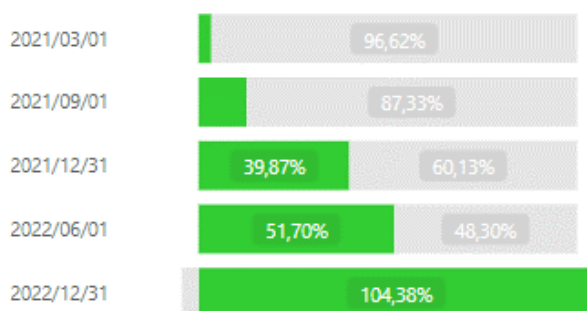

Uitvoering VEK %

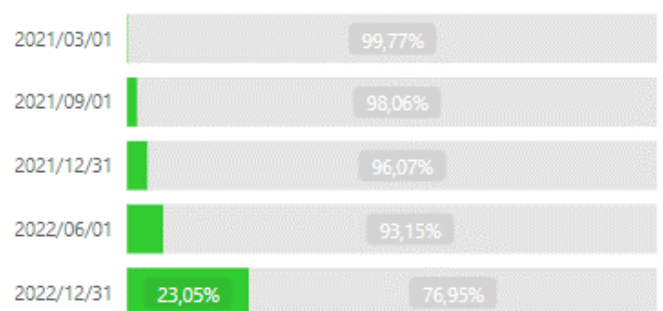


Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (44 projecten)

De vastleggingen voor spoorpunt 3 bedragen 432,90 miljoen euro. Dit is 99% van de voorziene relancemiddelen (438 miljoen euro) voor dit spoorpunt.

De vereffeningen voor spoorpunt 3 bedragen 144,5 miljoen euro. Dit is 33% van de voorziene relancemiddelen voor dit spoorpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend

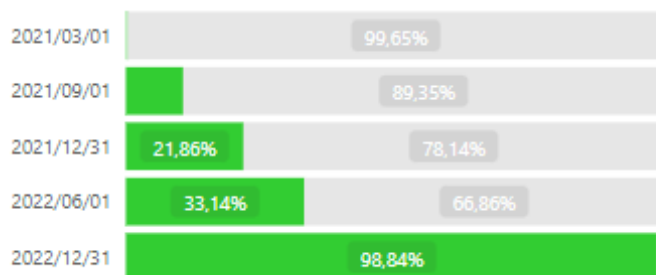

Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

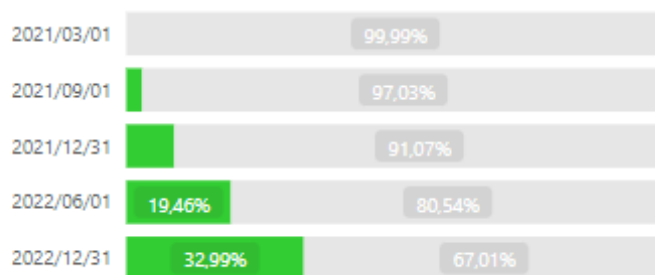


Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (6 projecten)

De vastleggingen voor spoorpunt 4 bedragen 659,2 miljoen euro. Dit is 90% van de voorziene relancemiddelen (730 miljoen euro) voor dit spoorpunt.

De vereffeningen voor spoorpunt 4 bedragen 378,3 miljoen euro. Dit is 52% van de voorziene relancemiddelen voor dit spoorpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend

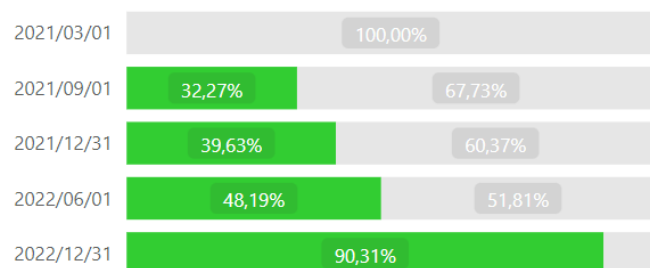

Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

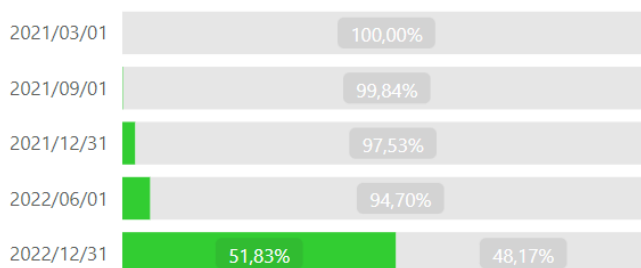

Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (20 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 5 bedragen 192,79 miljoen euro. Dit is 71% van de voorziene relancemiddelen (270,9 miljoen euro) voor dit speerpunt.


De vereffeningen voor speerpunt 5 bedragen 127 miljoen euro. Dit is 47% van de voorziene relancemiddelen voor dit speerpunt.

De lagere vastlegging voor dit speerpunt wordt grotendeels verklaard doordat werd beslist om 2 projecten rechtstreeks op te nemen in de begroting 2021, en dus niet via herverdeling vanuit de relanceprovisie:

- Voor VV 046 – “Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen” – werd een bijkomende machtiging van 10 miljoen euro voor het VIPA ingeschreven in artikel 75 van het uitgavendecreet.
- Voor VV 121 – “vooruitschuif uitbreidingsbeleid” – werd beslist om de voorziene relancemiddelen rechtstreeks bij te schrijven op de beleidskredieten van het VAPH voor de toekenning van persoonsvolgende budgetten aan prioriteitengroep 1 vanaf begroting 2021 ten belope van 55 miljoen euro.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend

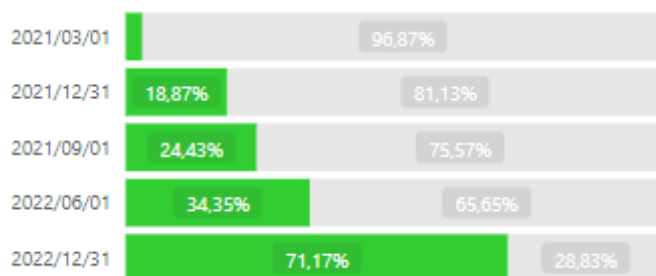

Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

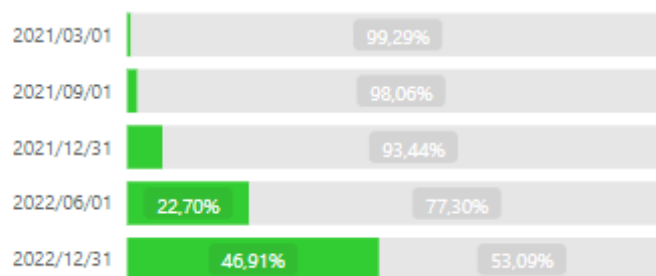


Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (7 projecten)

De vastleggingen voor speerpunt 6 bedragen 44,12 miljoen euro. Dit is 39% van de voorziene relancemiddelen (114,2 miljoen euro) voor dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 6 bedragen 38,64 miljoen euro. Dit is 34% van de voorziene relancemiddelen voor dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend

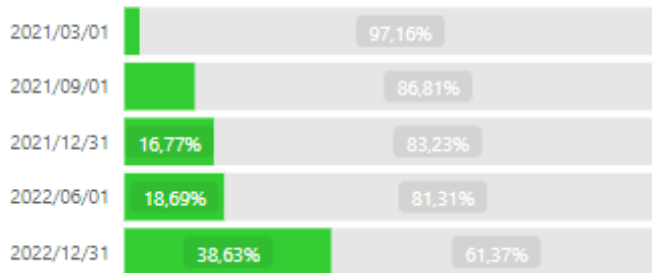

Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

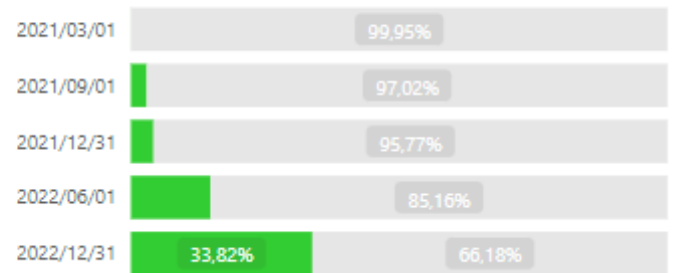


Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (1 project)

De vastleggingen voor speerpunt 7 bedragen 3,01 miljoen euro. Dit is 30% van de voorziene relancemiddelen (10 miljoen euro) voor dit speerpunt.

De vereffeningen voor speerpunt 7 bedragen 2,02 miljoen euro. Dit is 20% van de voorziene relancemiddelen voor dit speerpunt.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend

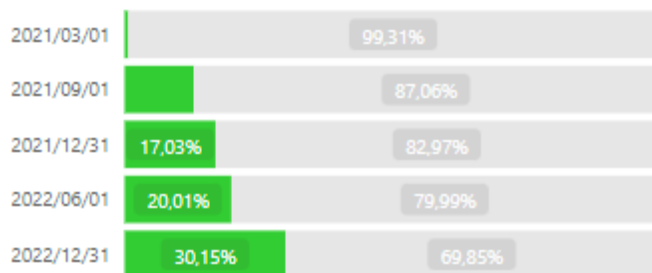


Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

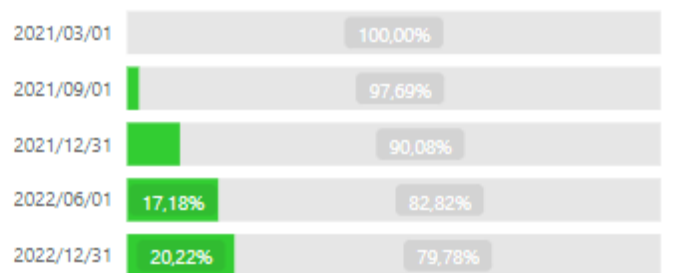


Onderstaande grafiek geeft een samenvatting weer van bovenstaande grafieken op 31/12/2022. We zien heel hoge vastleggingspercentages rond de 100% in speerpunt 1 (98%), 2 (104%), 3 (99%) en 4 (90%), een vastleggingspercentage van 71% in speerpunt 5, en vastleggingspercentages van respectievelijk 39% en 30% in speerpunt 6 en 7. Het hoogst aandeel vereffeningen zien we in speerpunt 4 (52%).

Uitvoering VAK %

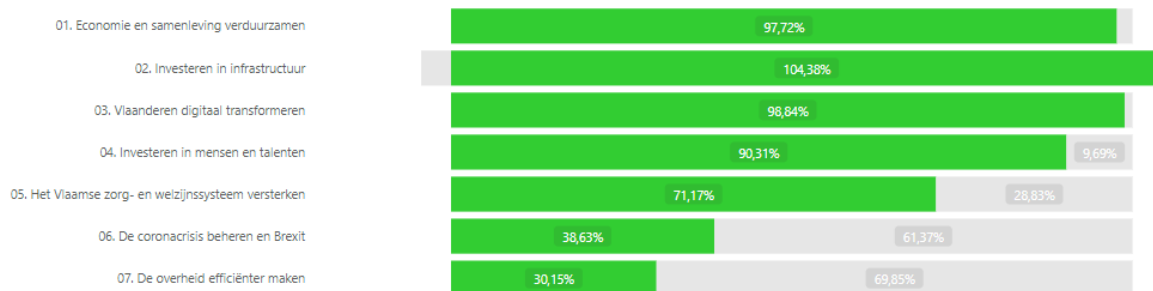

Uitvoering VEK %

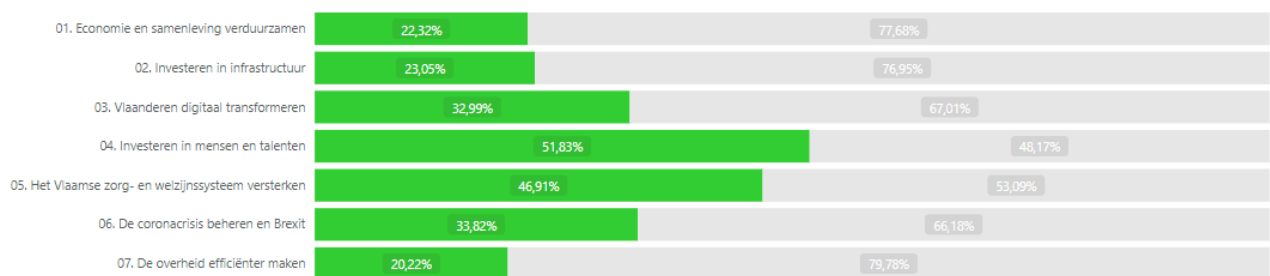

5.3.4 Globaal overzicht vastleggingen en vereffeningen per cluster voor VV001-VV158 en VV181


De meeste clusters kleuren groen.

De volgende clusters hebben een laag aandeel vastleggingen:

- Cluster 18 Brexit (19%)
 - De projecten in cluster 18 worden gefinancierd met middelen uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Omdat de Europese Commissie pas op 21 oktober 2021 een duidelijk kader heeft aangereikt waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor BAR-financiering, werd voor de BAR-projecten de mogelijkheid voorzien om nog in 2023 vastleggingen in te schrijven op de begroting.
- Cluster 22 Investeren in personen met een handicap (0%):
 - Deze cluster bevat één project (VV121 – Vooruitschuif uitbreidingsbeleid – fase 1). Dit project werd volledig gerealiseerd met reguliere middelen.
- Cluster 34 Spending reviews (20%)


Een uitschieter zien we in cluster 19 Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur (170%). De verklaring werd eerder al gegeven in deze covernota.

Uitvoering VAK %

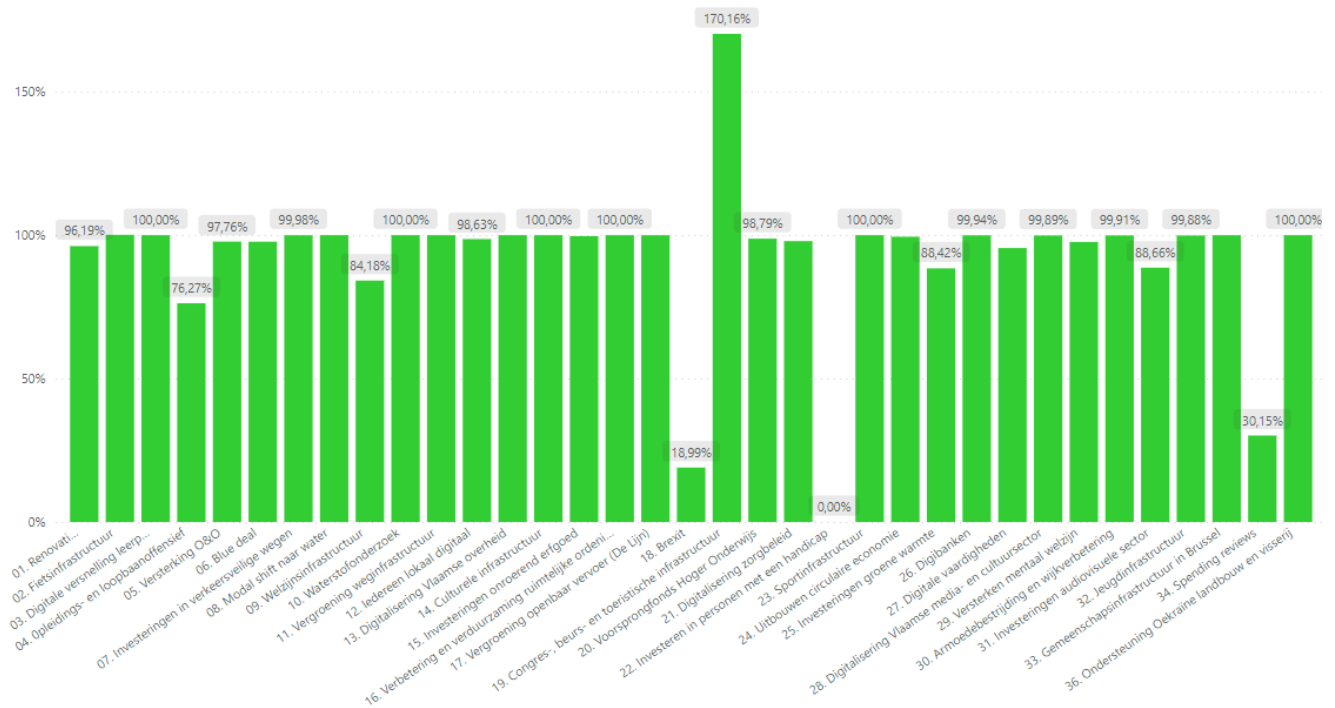

Het grootste aandeel vereffeningen vinden we terug in de nieuwe cluster 36 met 100% vereffening. Verder zien we ook een groot aandeel vereffeningen in de volgende clusters: cluster 31 Investerings audiovisuele sector (81%), cluster 9 Welzijnsinfrastructuur (64%), cluster 13 Digitalisering Vlaamse overheid (59%), cluster 3 Digitale versnelling leerplichtonderwijs (62%) en cluster 27 Digitale vaardigheden (58%).

Uitvoering VEK %

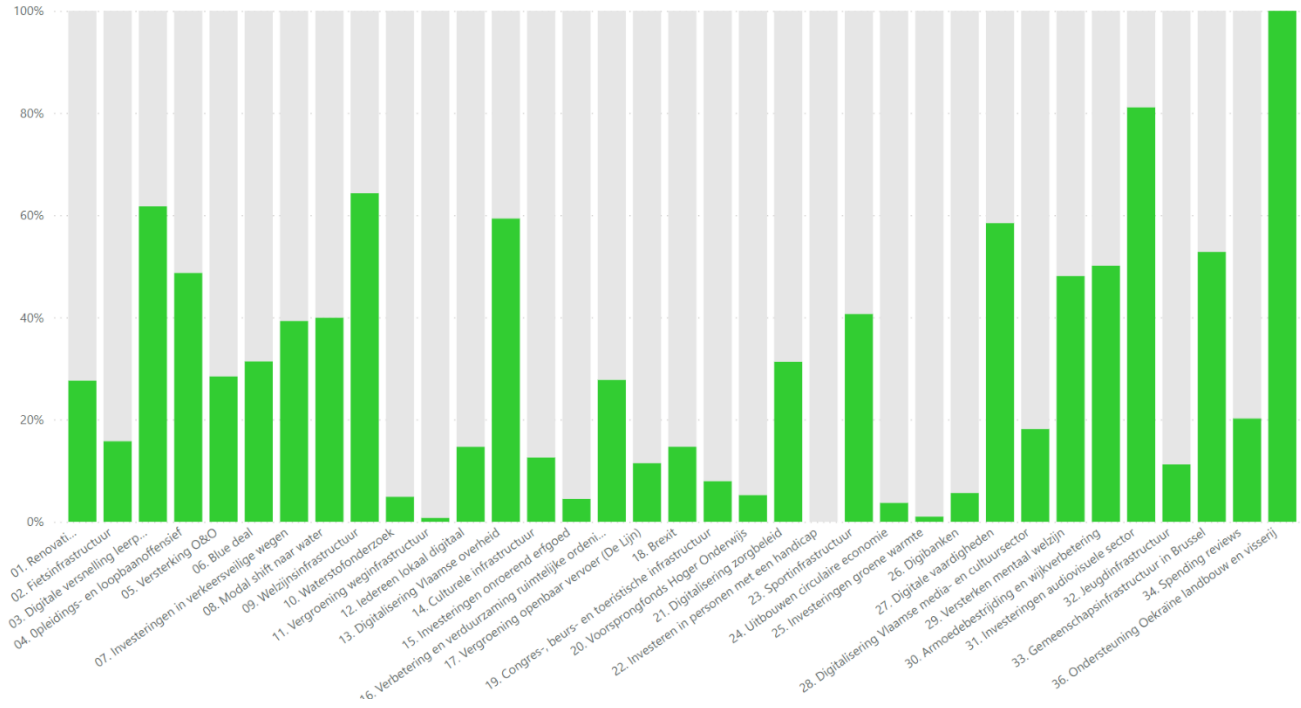

6 RRF-PROJECTEN

Op eerdere vraag van de Taskforce Vlaamse Veerkracht voorzien we sinds meting 4 een aparte analyse over de 55 projecten die gelcofinancierd zouden worden vanuit de Europese Unie, de zogenaamde RRF-projecten (Recovery & Resilience Facility). Zoals eerder in de inleiding aangegeven had Vlaanderen voor zijn relanceplan aanvankelijk recht op een maximum van 2,255 miljard euro. Eind juni 2022 stelde de Europese Commissie dit bedrag bij naar beneden naar 4,52 miljard euro omwille van onder meer een sterkere dan verwachte groei van de Belgische economie. Vlaanderen gaat er van uit dat de aanvankelijk verdeelsleutel blijft gelden, zodat Vlaanderen maximaal 38,06% van de 4,52 miljard euro zou kunnen verkrijgen. In absolute budgettermen gaat dit voor Vlaanderen over 1,72 miljard euro.

De Vlaamse Regering was echter van bij aanvang van het relanceplan duidelijk: wat niet Europees gefinancierd zou worden, zou de Vlaamse overheid zelf financieren. De verminderde Europese financiering heeft dus geen invloed op de uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. In de analyse van de RRF-projecten wordt nog geen rekening gehouden met de komende downsize-oefening van het Belgisch Plan voor Herstel een Veerkracht. De (budgettaire) analysebasis hieronder blijven dus de 55 RRF-projecten.

Nog twee hervormingsprojecten worden ook mee opgevolgd door de EU, maar krijgen geen RRF-financiering. We spreken hierna dus over 57 RRF-projecten.

6.1 OVERZICHT VAN DE RRF-PROJECTEN

Volgende 55 projecten komen in aanmerking voor RRF-financiering. Het verkleinen van dit aantal in functie van de verminderde RRF-bedrag is hierin nog niet meegenomen.

- VV006 | Financiering energieluik woningrenovatiepremie
- VV007 | Batterijpremie
- VV008 | EPC-labelpremie residentieel
- VV009 | Renovaties sociale woningen versnellen
- VV010 | Sociale woningbouw
- VV011 | VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid
- VV012 | Verlenging en uitbreiding sloop- en heropbouwpremie
- VV013 | De inrichting van een groter en veiliger fietsnetwerk (incl. fietstoegang economische poorten en jaagpaden) maakt van de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel en helpt zo het gebruik van personenwagens te reduceren
- VV014 | Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen
- VV015 | Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong)
- VV016 | Activering-verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC
- VV018 | Opleidingsoffensief arbeidsmarkt
- VV020 | Bio-economie
- VV021 | Onderzoeksinfrastructuur (bij Strategische Onderzoekscentra (SOC's), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs)
- VV022 | Versterking O&O bedrijven
- VV023 | Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O

- VV024 | Groenblauwe infrastructuur - open ruimte
- VV025 | Blue Deal – onderzoek
- VV026 | Blue Deal – MOW
- VV027 | Blue Deal – economie
- VV031 | Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving
- VV032 | Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen
- VV034 | Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen
- VV035 | Groenblauwe infrastructuur - waterlopen
- VV036 | Natte natuur
- VV047 | Waterstofonderzoek
- VV049 | Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur
- VV051 | Gemeente zonder gemeentehuis
- VV056 | Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022
- VV057 | Ondersteuning Digitale Transformatie
- VV058 | AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening (inclusief bijdrage subsidieregister)
- VV059 | Digitalisering asset management Aquafin
- VV060 | Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel
- VV061 | Danutsbedrijf
- VV064 | FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening
- VV065 | HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM (Security Information & Event Management)
- VV066 | HFB - Hybride digitale werkplek
- VV067 | HFB - Modernisering cloud en netwerkinfrastructuur
- VV068 | Kaleidos – Digitalisering van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering
- VV069 | Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit
- VV071 | Poolstokalias
- VV072 | Doelgericht digitaal transformeren
- VV073 | Vlaamse Sensor Data Space
- VV074 | Vastgoedinformatieplatform
- VV076 | Zelf beheerde identiteit
- VV105 | Ontsnippen van Vlaams landschap
- VV106 | Vergroening openbaar vervoer De Lijn
- VV112 | Voorsprongfonds Hoger Onderwijs
- VV123 | Circulair bouwen
- VV124 | Circulaire maakindustrie
- VV125 | Circulaire economie - Recyclagehub
- VV126 | Call groene warmte
- VV127 | Digibanken
- VV128 | Digitale vaardigheden
- VV158 | Spending reviews


Volgende 2 hervormingsprojecten worden mee opgevolgd vanuit de EU maar krijgen geen aparte RRF-financiering:

- VV159 | Snellere vergunnings- en beroepsprocedures
- VV160 | Administratieve vereenvoudiging

6.2 ANALYSE

Globale voortgang

We kunnen over de verschillende meetmomenten een positieve evolutie vaststellen. Zo zijn bijna alle RRF-projecten opgestart en geagendeerd op de Vlaamse Regering. Eén project is gerealiseerd.

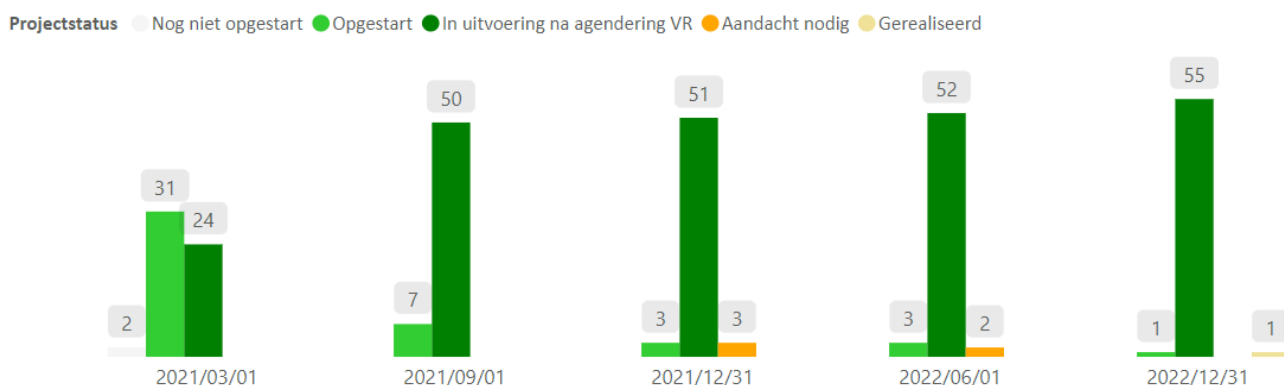


Bij meetmoment 4 waren er 2 RRF-projecten met bijzondere aandacht, nl. VV014 'Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen' en VV056 'Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamcontract 2022'. Deze twee projecten krijgen bij meetmoment 5 een groene status.

Een project krijgt de status gerealiseerd: VV064 'FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening'.

RRF-Mijlpalen

Hieronder bespreken we kort de mijlpalen die in het voorgangsrapport aangeduid zijn als 'RRF-mijlpaal'; de mijlpalen waarover periodiek naar Europa gerapporteerd wordt. Niet elke RRF-mijlpaal stemt overeen met één VV-mijlpaal. Om meer detail aan te brengen in de VV-rapporteringen werden sommige RRF-mijlpalen opgesplitst, of werden er tussenstappen in het behalen van een doel ('RRF-target') als extra mijlpaal meegenomen.

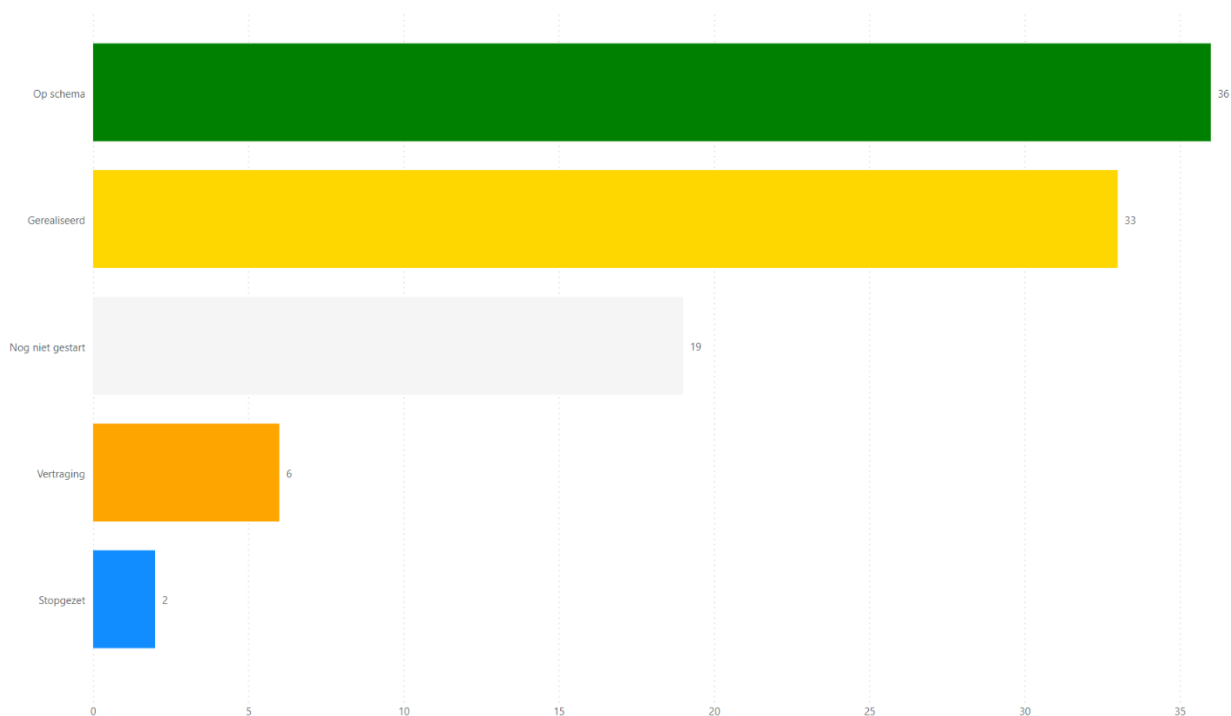

Status RRF-mijlpalen tot Q4 2030

Hierboven de mijlpalen tot en met Q4 2030. Er zijn 53 RRF-mijlpalen opgenomen in de monitoring van Vlaamse Veerkracht. 36 zijn op schema, 33 zijn al gerealiseerd en 6 mijlpalen kennen vertraging. 19 mijlpalen zijn nog niet gestart.

De vertraagde mijlpalen situeren zich in volgende projecten:

- VV006 | 'Financiering energieluik woningrenovatiepremie': door vertragingen in de backoffice, zal deze mijlpaal slechts met vertraging gerealiseerd worden. In 2022 werden reeds meer dan 46.000 dossiers ingediend, waarvan er 1230 in 2022 werden goedgekeurd. De target is hier de toekenning van 61.070 energiepremies. De realisatie van deze mijlpaal wordt voor RRF verwacht in Q2 2023.
- VV011 | 'VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid': hier liepen in het verleden de drie cumulatieve mijlpalen met betrekking tot de selectie van projecten initieel vertraging op. De mijlpaal met streefdatum Q4 2022, met daarin de binnen RRF vereiste totale oppervlakte werd intussen wel gehaald, en bevindt zich dus bij de gerealiseerde mijlpalen.
- VV026 | 'Blue Deal – MOW': Twee mijlpalen met betrekking tot waterwegen (pompinstallaties en sluisdeuren) zijn in uitvoering maar liepen vertraging op. De eerste tussentijdse RRF-mijlpaal betreft echter de start van de werken is dus wel op schema.


De twee stopgezette mijlpalen betreffen eveneens het Blue-Deal project VV026: 'Blue Deal – MOW':

- Pompcapaciteit Albertkanaal / Pompcapaciteit Albertkanaal Wijnegem:
- Vervangen sluisdeuren sluizen Briegden en Neerharen

Beide projecten zullen niet langer binnen de relance-enveloppe uitgevoerd worden, deels omwille van stijgende materiaal- en grondstofprijzen.

Vastleggingen en vereffeningen

Oorsprong middelen

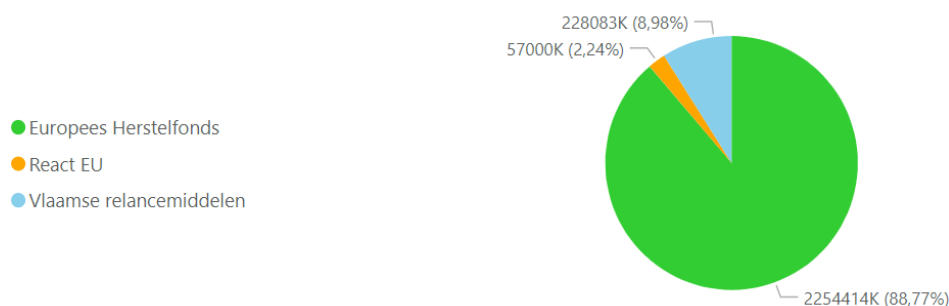


Het relancebudget voor de RRF-projecten bedraagt in totaal 2,53 miljard euro. 89% of 2,25 miljard euro komt uit het RRF-fonds. 9% of 228 miljoen euro zijn Vlaamse relancemiddelen. 2% of 57 miljoen euro is afkomstig uit REACT-EU. Voor deze meting wordt nog geen rekening gehouden met de downsize-oefening van het Plan voor Herstel en Veerkracht, gezien deze nog niet afgerond is.

Op 31 december 2022 is **96%** van de middelen van de RRF-projecten **vastgelegd**.

De **vereffeningen** verlopen uiteraard trager dan de vastleggingen. Ongeveer **30%** van de middelen is op 31 december 2022 vereffend.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend

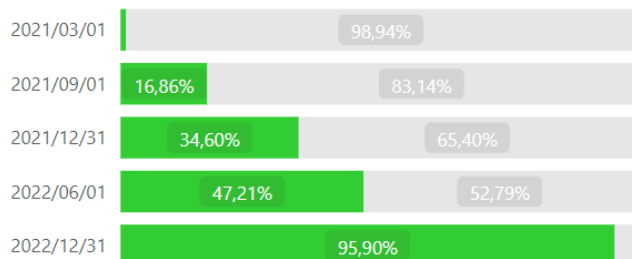

Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

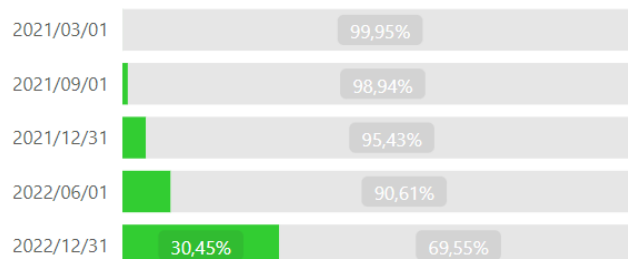

Uitvoering VAK en VEK voor de RRF-projecten

7 LEESWIJZER BIJ HET GLOBALE RAPPORT

In het voortgangsrapport kan men de rapportering van december 2022 voor alle 181 projecten volgens cluster terugvinden.

In het rapport kan men de betrokkenen bij het project terugvinden, onder meer:

- Bevoegde minister
- Trekkende entiteit Vlaamse overheid
- Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project
- Betrokken entiteiten Vlaamse overheid
- Andere belanghebbenden

De projectsituering geeft weer tot welk speerpunt en welke cluster het project behoort:

- Speerpunten relanceplan: 1 van de 7 speerpunten van het relanceplan zoals aangekondigd in de septemberverklaring van 2020
- Cluster relanceplan: 1 van de 36 clusters van het relanceplan zoals meegedeeld op de VR op 5 februari 2021

De projectomschrijving:

- Beschrijft de inhoud van het project. Voor grote projecten met verschillende subprojecten kan dit uitgebreider zijn. Hierin worden de doelstellingen van het project weergegeven.

Input, output en outcome:

- Beschrijft de input, de output en de outcome gelinkt aan het project.

Algemene beschrijving van de projectvoortgang:

- Geeft met een beschrijving en een kleurencode de algemene status van het globale project weer:
 - Donkergroen: project is in uitvoering en werd al minstens 1 keer deels of volledig geagendeerd op de Vlaamse Regering
 - Lichtgroen: project is opgestart maar werd nog niet geagendeerd op de Vlaamse Regering
 - Oranje: project heeft bijzondere aandacht nodig voor één of enkele deelaspecten
 - Rood: bijkomende actie is noodzakelijk
 - Geel: project is gerealiseerd
 - Grijs: project is nog niet opgestart

Gedetailleerde projectvoortgang aan de hand van mijlpalen:

- Omschrijft de voortgang van de verschillende beoogde mijlpalen met een kleurencode. De volgende statussen zijn mogelijk.
 - Donkergroen: mijlpaal zit op schema. De uitvoering loopt, en volgt het afgesproken tijdsplan.
 - Oranje: de uitvoering loopt, maar er is sprake van een vertraging op het afgesproken tijdsplan.
 - Rood: de mijlpaal moet worden bijgestuurd.
 - Geel: de mijlpaal is gerealiseerd.
 - Grijs: de uitvoering van de mijlpaal is nog niet gestart, maar dit is conform het afgesproken tijdsplan. Een mijlpaal blijft op 'nog niet gestart' staan, zolang er binnen het project geen relevante activiteit is met betrekking tot deze mijlpaal. Pas wanneer de uitvoering van deze mijlpaal effectief gestart is, wordt bepaald of deze mijlpaal al dan niet 'op schema' is.
 - Donkerblauw: de mijlpaal is definitief stopgezet.
 - Lichtblauw: de mijlpaal is uitgesteld.

Gedetailleerde projectvoortgang aan de hand van outputindicatoren:

- Geeft de streefwaarde, de realisatie en de realisatiegraad weer.

Projectfinanciering:

- Geeft de beleidsruimte, de vastgelegde kredieten en de vereffende kredieten weer.
- De oorsprong van de middelen (Vlaams of Europees, relancebudgetten of reguliere middelen) wordt per project weergegeven.
- 55 van de 181 projecten van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' zijn opgenomen in de Vlaamse bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht via een [Mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021](#).

Agendering Vlaamse Regering

- Geeft weer of een project al geagendeerd is op de Vlaamse Regering t.e.m. 31 december 2022 met een link naar deze documenten.

Koppeling met andere projecten

- Geeft het verband met andere projecten, buiten de eigen cluster, weer.

8 VOORTGANGSRAPPORT: GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN ALLE PROJECTEN

01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)

VV001 - ASBESTPREMIE DAKEN EN BUITENMUREN NIET-RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.• Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.• Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. <p>Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vervuiling van bodem, lucht en water• Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen• Verlies van recycleerbaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie• Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken. <p>Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling.</p> <p>Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken en muren van niet-residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudend (onder)dak of asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie.

Enmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse (relance)middelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen.

Voor niet-residentiële gebouwen wordt op basis van cijfers van OVAM en VEKA verondersteld dat 25% van de 270.000 gebouwen met risicobouwjaar beschikken over een asbesthoudende gebouwschil (gevel en/of dakbedekking) en 3% over een asbesthoudend onderdak. Dit betekent dat tegen 2034 jaarlijks zo'n 5.400 niet-residentiële gebouwen asbestvrij moet worden gemaakt.

Er is een aanzienlijk aandeel van niet-verwarmde of zeer beperkt verwarmde gebouwen die ook asbest bevatten in de dakbedekking of het onderdak. Het gaat hoofdzakelijk over niet-residentiële gebouwen zoals bijvoorbeeld magazijnen, (landbouw)loodsen, openbare gebouwen, ... Deze doelgroep wordt momenteel niet bereikt met de verhoogde isolatiepremie na asbestverwijdering gezien zij geen nood hebben aan dezelfde energieprestatie-eisen als residentiële gebouwen en doorgedreven isoleren net contraproductief kan werken in sommige gevallen (bv. stallen met dieren). Deze dakoppervlaktes zijn echter wel geschikt voor het plaatsen van een fotovoltaïsche installatie. Op die manier kunnen wij een bijkomend potentieel voor hernieuwbare energie ontsluiten, hetgeen niet alleen goed is voor het bereiken van onze klimaatdoelstelling, maar ook bijdraagt aan de bevoorradingzekerheid en de betaalbaarheid van de energiefactuur. Met de voorgestelde premie wordt gemikt op een versnelling van asbestverwijdering bij grote, niet-complexe daken van onverwarmde niet-residentiële gebouwen.

Het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken is decretaal via het Materialendecreet verboden. Voor asbestdaken waarop de plaatsing van zonnepanelen beoogd wordt, is het dan ook noodzakelijk het volledig dak van asbestmaterialen te ontdoen.

Het uitbreidingsvoorstel bestaat erin om niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen in aanmerking te laten komen voor een premie van 12 euro per vierkante meter verwijderde asbestbedekking en/of onderdak, op voorwaarde dat 'gelijktijdig' een fotovoltaïsche installatie op het dak wordt geplaatst. De plaatsing van de fotovoltaïsche installatie komt afhankelijk van de capaciteit van de installaties eveneens in aanmerking voor de bestaande ondersteuningssystemen voor fotovoltaïsche installatie (de investeringspremie PV, de call groene stroom, de projectspecifieke ondersteuning met groenestroomcertificaten). Om in aanmerking te komen voor deze premie moet de oppervlakte van de fotovoltaïsche zonnepanelen in verhouding tot de totale oppervlakte van het gesaneerde dak minstens 10 procent bedragen.

Uitgaande van de gemiddelde dak- en buitenmuuroppervlaktes van woningen, woongebouwen en niet-woongebouwen, een forfaitaire premie van 8 euro boven de premie voor dak- of muurisolatie enerzijds en de premie van 12 euro per vierkante meter verwijderde asbestbedekking en/of onderdak in combinatie met een fotovoltaïsche installatie anderzijds, is voor de jaarlijkse geschatte aangepakte niet-residentiële gebouwen een budget nodig 15

PROJECTOMSCHRIJVING

miljoen euro voor deze maatregel.

Er worden geen reguliere middelen ingezet voor de meerkosten van de premie voor isolatie voor wat betreft de verhoging van de isolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering noch voor de premie voor asbestverwijdering in combinatie met PV. De relancemiddelen volstaan hiervoor.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	23.000.000 EUR
Output	5366 uitbetaalde premies voor dak- en/of buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering en voor asbestverwijdering in combinatie met de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie in niet-residentiële gebouwen
Outcome	5366 niet-residentiële gebouwen met dak- en/of buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering of asbestverwijdering in combinatie met de plaatsing van een fotovoltaïsche installatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Premies kunnen worden aangevraagd voor de gelijktijdige asbestverwijdering en isolatie van daken en muren van niet-residentiële gebouwen, met eindfacturen voor beide werken in 2021-2022. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 2 jaar na factuurdatum. Bijgevolg zal het overgrote deel van premieaanvragen en uitbetalingen pas volgen in de loop van 2022, 2023, 2024 en 2025. Vanaf 1 april kan ook een premie worden aangevraagd voor de gelijktijdige investering in het asbestvrij maken van het dak van een niet-residentiële, niet-verwarmd gebouw en de plaatsing van een PV-installatie die minstens 10% bedraagt van de gesaneerde dakoppervlakte. Deze wijziging aan de scope was noodzakelijk, gezien een groot aandeel niet-residentiële gebouwen met asbesthoudende daken niet verwarmd wordt en bijgevolg niet in aanmerking komt voor een (verhoogde) isolatiepremie. Dit is een win-win voor de doelstellingen op het vlak van asbestverwijdering enerzijds en groene stroom anderzijds. Deze nieuwe premie werd ingevoerd via het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022. Gemiddelde oppervlakte per gebouw (premedossier) blijkt hoger dan initieel ingeschat. Het voorziene budget van 30 miljoen euro werd bijgesteld naar 23 miljoen euro na een enveloppeverschuiving naar VV007 (batterijpremie). Mijlpalen en outputindicatoren werden naar verhouding aangepast.</p> <p>Eind oktober 2022 waren in totaal 227 premies voor dak-/vloer en/of gevelisolatie in combinatie met asbestverwijdering uitbetaald. Er werden nog geen premies voor asbest+PV uitbetaald, maar eind november 2022 waren wel reeds 115 activiteiten aangemeld o.b.v. een offerte/(voorschot)factuur voor de asbestverwijdering en dakrenovatie.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie - regelgeving	2020 Q4	Gerealiseerd		
Aanvullende premie asbestverwijdering in combinatie met PV - regelgeving	2022 Q1	Gerealiseerd		
983 uitbetaalde premies in 2021	2022 Q1	Vertraging	Eind 2021 waren 86 premies uitbetaald voor dak-/vloer en/of gevelisolatie in combinatie met asbestverwijdering. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...)	
1700 uitbetaalde premies in 2022	2023 Q1	Vertraging	In 2022 werden tot eind oktober 2022 141 premies uitbetaald voor dak-/vloer en/of gevelisolatie in combinatie met asbestverwijdering. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...)	
1700 uitbetaalde premies in 2023	2024 Q1	Nog niet gestart		
983 uitbetaalde premies in 2024	2025 Q1	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal m ² asbestvrij gemaakte dak- en/of muuroppervlakte met isolatie of PV-panelen	1.650.000	2025 Q1	265.049	16,1 %
uitbetaalde premies	5366	2025 Q1	227	4,2 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR
Uitvoering VEK	3.414.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 23.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale openbardienstverplichtingen en REG-openbardienstverplichtingen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

[Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV002 - Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie](#)

[VV003 - Asbestpremie daken residentieel met isolatie](#)

VV002 - ASBESTPREMIE BUITENMUREN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.• Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.• Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. <p>Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vervuiling van bodem, lucht en water• Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen• Verlies van recyclebaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie• Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken. <p>Gezien de langetermijndoelstelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling.</p> <p>Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende muren van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkosten die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudende gevel en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling 2050 voor energetische prestatie. Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies. De meerkosten voor het asbestgedeelte van de premie wordt voor premies 2021 en 2022 volledig vergoed vanuit de relancemiddelen.

Op basis van cijfers van OVAM en VEKA wordt het aantal woningen of woongebouwen met asbesthoudende dakbedekking en/of een asbesthoudend onderdak en/of -gevels ingeschat op 328.000. Daarnaast hebben 511.000 woningen en woongebouwen een asbesthoudend onderdak. Er is een zekere overlap in de aanwezigheid van asbest in meerdere gebouwdelen van eenzelfde gebouw. Het asbestplan streeft naar het asbestveilig maken van Vlaanderen tegen 2034. Dat wil zeggen dat jaarlijkse ruim 40.000 woningen en 1.500 woongebouwen asbestvrij gemaakt moet worden gedurende 14 jaar, en dit op het vlak van asbest aanwezig in dakbedekking en/of onderdak en/of gevelbekleding.

Uitgaande van de gemiddelde buitenmuropervlaktes van woningen en woongebouwen, een forfaitaire premie van 8 euro boven de premie voor dak- of muurisolatie en een bereik van 75% van de jaarlijks asbestvrij te maken gebouwen door deze premie, is voor de jaarlijkse geschatte aangepakte residentiële gebouwen een budget nodig 6 miljoen euro voor de meerkosten (dit is de bijkomende forfaitaire premie van 8 euro per m²) van de buitenmuurisolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering.

Er worden geen reguliere middelen ingezet voor de financiering van deze meerkosten bovenop de isolatiepremie in geval van gelijktijdige asbestverwijdering. Het voorziene relancebudget volstaat hiervoor.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	2250 uitbetaalde premies voor buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen
Outcome	2250 residentiële gebouwen met buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Premies kunnen worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021 voor investeringen in isolatie en asbestverwijdering met eindfacturen in 2021 en 2022. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 2 jaar na factuurdatum. Bijgevolg zal het overgrote deel van premie-aanvragen en uitbetalingen pas volgen in de loop van 2023, 2024 en 2025. Gemiddelde oppervlakte per woning (premiedossier) blijkt hoger dan initieel ingeschat.</p> <p>Het voorziene budget van 12 miljoen euro werd bijgesteld naar 3 miljoen euro na een enveloppeverschuiving naar VV007 (batterijpremie). Mijlpalen en outputindicatoren werden naar verhouding aangepast.</p> <p>Eind oktober 2022 waren in totaal 287 premies voor buitenmuurisolatie in combinatie met asbestverwijdering uitbetaald.</p> <p>Op 2 december 2022 besliste de Vlaamse Regering om de verhoogde buitenmuurisolatiepremie in combinatie met asbestverwijdering te verlengen voor investeringen met eindfacturen in 2023, en dit te financieren via reguliere middelen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALLEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Asbestpremie buitenmuren residentieel - regelgeving	2020 Q4	Gerealiseerd		
188 uitbetaalde premies in 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	Eind 2021 waren 77 premies uitbetaald. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...). Het beoogde aantal werd ondertussen gerealiseerd.	
844 uitbetaalde premies in 2022	2023 Q1	Vertraging	Eind oktober 2022 waren 210 premies uitbetaald. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...)	
844 uitbetaalde premies in 2023	2024 Q1	Nog niet gestart	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving	
375 uitbetaalde premies in 2024	2025 Q1	Nog niet gestart	verlaagd omwille van enveloppeverschuiving	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
uitbetaalde premies voor buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen	2250	2025 Q1	287	12,8 %
Aantal m ² asbestvrij gemaakte muuroppervlakte met isolatie	66.667	2025 Q1	19.065	28,6 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	12.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	610.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

[Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen](#)

VV003 - ASBESTPREMIE DAKEN RESIDENTIEEL MET ISOLATIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.• Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.• Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. <p>Asbestdaken en -gevels dateren van voor 2001 en zijn ondertussen dus minstens 20 jaar oud, met risico op beschadiging. Dit geeft aanleiding tot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vervuiling van bodem, lucht en water• Verhoogde kosten of belemmeringen voor energetische renovaties en onderhoud van gebouwen• Verlies van recyclebaar bouwafval omwille van asbestcontaminatie• Het niet kunnen plaatsen van fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen op asbesthoudende daken. <p>Gezien de langetermijn doestelling om alle gebouwen drastisch energetisch te renoveren tegen 2050, vormt de aanwezigheid van asbest in dakbedekking, onderdaken en gevelbekleding, een belangrijk struikelblok voor het behalen van deze doelstelling. Volgens het Actieplan asbestafbouw is het doel om tegen 2034 al het asbest dat aanwezig is in de gebouwschil te verwijderen. De voorgestelde subsidie is gericht op het bereiken van ongeveer 75% van het jaarlijkse potentieel van de voorraad asbestgebouwen per jaar.</p> <p>Ter ondersteuning van het versneld uitvoeren van renovaties van asbesthoudende daken van residentiële gebouwen, wordt voor investeringen met eindfactuur vanaf 2021 een verhoogde isolatiepremie voor dak- dan wel buitenmuurisolatie gegeven per isolatieproject met voorafgaande asbestverwijdering van een asbesthoudende gevel voorzien. Deze premie vormt een tussenkomst onder de vorm van een verhoogde isolatiepremie vanwege de Vlaamse overheid in de meerkost die investeerders hebben bij de renovatie van een asbesthoudend dak en moet zorgen voor een versnelde en veilige/verantwoorde verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Investeerders hebben tot 2 jaar na factuurdatum de tijd een premie aan te vragen, waarna deze na controle door Fluvius, als werkmaatschappij van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt uitbetaald. De premies voor energiebesparende investeringen zijn in Vlaanderen opgevat als 'openbaredienstverplichtingen' opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. De technische voorwaarden voor de premies zijn per onderdeel gericht op het behalen van de langetermijndoelstelling</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

2050 voor energetische prestatie.

Eenmaal per jaar valideert het VEKA de door Fluvius uitbetaalde premies en wordt vanuit de Vlaamse Relancemiddelen een vergoeding aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders uitbetaald voor de door hen uitbetaalde in aanmerking komende premies. De meerkost voor het asbestgedeelte van de premie wordt voor premies 2021 en 2022 vergoed vanuit de relancemiddelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.200.000 EUR
Output	19.238 uitbetaalde premies voor dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen
Outcome	19.238 residentiële gebouwen met dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Premies kunnen worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021 voor investeringen in isolatie en asbestverwijdering met eindfacturen in 2021 en 2022. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 2 jaar na factuurdatum. Bijgevolg zal het overgrote deel van premie-aanvragen en uitbetalingen pas volgen in de loop van 2023, 2024 en 2025. Gemiddelde oppervlakte per woning (premedossier) blijkt hoger dan initieel ingeschat. Het voorziene budget van 42 miljoen euro werd bijgesteld naar 20,2 miljoen euro na een enveloppeverschuiving naar VV007 (batterijpremie). Mijlpalen en outputindicatoren werden naar verhouding aangepast.</p> <p>Eind oktober 2022 waren in totaal 3.138 premies voor dak-/vloerisolatie in combinatie met asbestverwijdering uitbetaald.</p> <p>Op 2 december 2022 besliste de Vlaamse Regering om de premie te verlengen voor investeringen met eindfactuur in 2023, en dit te financieren met reguliere middelen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Asbestpremie daken residentieel - regelgeving	2020 Q4	Gerealiseerd	
1832 uitbetaalde premies in 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	Eind 2021 waren 926 premies voor dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering uitbetaald. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALLEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			beschikbaarheid aannemers...). Het beoogde aantal werd intussen gerealiseerd.
6413 uitbetaalde premies in 2022	2023 Q1	Vertraging	Eind oktober 2022 waren reeds 2.212 premies voor dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering uitbetaald. Deze vertraging is het gevolg van het feit dat men 2 jaar de tijd heeft om een premie-aanvraag in te dienen en houdt ook verband met vertragingen in de uitvoering van werken (o.a. beschikbaarheid aannemers...)
6413 uitbetaalde premies in 2023	2024 Q1	Nog niet gestart	vertraagd omwille van enveloppeverschuiving
4581 uitbetaalde premies in 2024	2025 Q1	Nog niet gestart	vertraagd omwille van enveloppeverschuiving

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal m ² asbestvrij gemaakte dakoppervlakte met isolatie	1.442.857 m ²	2025 Q1	413.342	28,6 %
uitbetaalde premies voor dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen	19238	2025 Q1	3.138	16,3 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	42.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.200.000 EUR
Uitvoering VAK	20.200.000 EUR
Uitvoering VEK	4.408.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies](#)

[Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen](#)



KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV001 - Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie](#)

[VV002 - Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie](#)

VV004 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Belanghebbenden	Vereniging van steden en gemeenten, Interafval

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034. • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034. • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. <p>Het actieplan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen (lokale besturen, zorgvoorzieningen, ...) , landbouw, jeugd (scholen, ...).</p> <p>Voor de doelgroep lokale besturen en residentiële gebouwen werd een subsidie-instrument voorzien voor de organisatie en coördinatie van lokale asbestafbouwprojecten volgens vastgelegde projectformules.</p> <p>Doelgroep: particulieren, jeugdverenigingen, lokale besturen</p> <p>Ondersteuning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – subsidies voor de lokale projectcoördinatie; – subsidies voor de cofinanciering van asbestinzameling en verwijdering; – ontzorging voor aanbesteding door particulier zelf <p>Gesubsidieerde projectformules:</p> <ul style="list-style-type: none"> o organisatie van ophaling van asbestcement afval aan huis o specifieke Calls naar lokale jeugdinfrastructuur om asbest gericht te inventariseren en te verwijderen. o gegroepeerde verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding via raamcontracten

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	27.600.000 EUR
Output	Aantal asbestverwijderingen Aantal asbestinventarisaties Aantal ingezamelde tonnages asbestcement

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	De realisatie van een asbestveilig Vlaanderen 2040 meet zich af aan het aantal asbestveilige gebouwen met risicobouwjaar tot 2001. De impact van dit project beoogt het toewerken naar een maximaal aantal asbestveilige locaties in Vlaanderen. Dit door de relancebudgetten via asbestprojecten bij lokale besturen in te zetten voor een maximaal aantal verwijderlocaties bij burgers, lokale jeugdinfrastructuur en lokale besturen. Zo wordt op deze locaties toegewerkt naar een asbestveilige leefomgeving.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Opstart operationalisering	2021 Q3	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
aantal asbestinventarisaties (gecumuleerd sinds opstart Relance)		2022 Q4			
aantal asbestverwijderingen (gecumuleerd sinds opstart Relance)		2022 Q4	1.682		
ton asbestcement ingezameld (gecumuleerd sinds start Relance)		2022 Q4	2.216		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.600.000 EUR
Uitvoering VAK	27.600.000 EUR
Uitvoering VEK	3.390.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.600.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Circulaire economie - Asbest lokale besturen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Circulaire economie - Asbest lokale besturen](#)

VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Belanghebbenden	Vereniging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.• Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.• Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040. <p>Het plan beschrijft de prioritaire doelgroepen waarvoor de OVAM een ondersteuningskader moet uitwerken: residentiële gebouwen, publieke gebouwen, landbouw, jeugd (scholen, ...).</p> <p>Voor de sectoren zorgvoorzieningen, scholen, landbouw en sociale huisvesting wordt onder de vorm van een sectorprotocol een ondersteuningskader met ontzorging, cofinanciering en subsidiëring aangeboden. Het sectorprotocol wordt formelelijk ondertekend door de OVAM, de voorgedij minister(s) en de sectorvertegenwoordiging. Het beheer en de operationalisering van de sectorprotocollen gebeurt binnen de werking van de OVAM.</p> <p>De Relancemiddelen zijn een sterke aanvulling op de reguliere jaarlijkse 3000 keuro. Ze maken het mogelijk om naast het bestaande sectorprotocol voor scholen nieuwe te initiëren voor de doelgroepen zorg, landbouw en sociale huisvesting</p> <p>Sectorprotocol scholen Doelgroep: Vlaamse onderwijsinstellingen Ondersteuning: – contracten op afroep voor gratis asbestinventaris; – contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering – subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer Partners: GO!, AGION</p> <p>Sectorprotocol landbouw</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Doelgroep: Vlaamse landbouwondernemingen

Ondersteuning:

- gratis inzameling van asbestcementafval bij de vervanging van asbestdaken

Partners: Boerenbond, ABS, VAC

Sectorprotocol sociale huisvesting

Doelgroep: Vlaamse sociale woningen

Ondersteuning:

– subsidie per gerealiseerde asbestveilige woning;

– aangepaste procedure extrapolatie van asbestinventarissen voor kostenbesparing

Partners: VMSW, VVH

Sectorprotocol zorgvoorzieningen

Doelgroep: Vlaamse zorgvoorzieningen

Ondersteuning:

– contracten op afroep voor gratis asbestinventaris en asbestexpertise;

– contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering;

– subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: VIPA, VEB, zorgkoepels

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	12.400.000 EUR
Output	Aantal asbestinventarisaties en asbestverwijderingen uitgevoerd.
Outcome	Meer gebouwen geïnventariseerd en asbestveilig gemaakt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle sectorprotocollen zijn ondertekend en in uitvoering.
Noodzakelijke politieke actie	nvt

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Operationalisering protocol zorgvoorzieningen	2021 Q4	Gerealiseerd	Het sectorprotocol werd opgestart met de opening van de call op 15 oktober 2022.
Ondertekening protocol zorgvoorzieningen	2022 Q1	Gerealiseerd	Het sectorprotocol is ondertekend.

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal asbestinventarisaties scholen (gecumuleerd sinds opstart Relance)		2022 Q4		
aantal asbestverwijderingen landbouw (gecumuleerd sinds opstart Relance)		2022 Q4	298	
aantal asbestverwijderingen zorg (gecumuleerd sinds start Relance)		2022 Q4		
aantal asbestverwijderingen scholen (gecumuleerd sinds start Relance)		2022 Q4	99	
aantal asbestveilige sociale woningen (gecumuleerd sinds start Relance)		2022 Q4		
aantal asbestinventarisaties zorg (gecumuleerd sinds opstart Relance)		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	12.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	12.400.000 EUR
Uitvoering VAK	9.487.000 EUR
Uitvoering VEK	1.424.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 12.400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Circulaire economie – asbest sectorprotocollen - scholen Vervolprotocol asbestafbouwbeleid scholen (incl. internaten en clb's) van het gesubsidieerd onderwijs. Bijlage Vervolprotocol asbestafbouwbeleid van het Go! Gemeenschapsonderwijs. Bijlage Nota aan de Vlaamse Regering van 20 mei 2022. Uitvoering van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht project VV5 'Circulaire economie – sectorprotocol landbouw'

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Uitvoering van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht project VV5 'Circulaire economie – asbest sectorprotocollen - scholen'](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Update van de relancemiddelen die worden voorzien het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht](#)

VV006 - FINANCIERING ENERGIELUIK WONINGRENOVATIEPREMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Uit onderzoek blijkt dat 57% van de woningen herstellingen, renovaties of een totaalrenovatie nodig hebben om te voldoen aan de minimale woningkwaliteitseisen. Om de energiedoelstellingen van de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie 2050 te behalen, moeten in 96,5 % van de Vlaamse woningen werkzaamheden uitgevoerd worden. Als we zowel woningkwaliteit als energie in rekening brengen, zijn er bijna in alle Vlaamse woningen nog werken nodig. Beide doelstellingen op vlak van woningkwaliteit en energieprestatie, kunnen in de meeste gevallen niet los van elkaar worden gezien.</p> <p>Bovendien toont onderzoek aan dat problemen inzake woningkwaliteit en slechte energieprestatie zich concentreren in bepaalde segmenten van de woningmarkt en bij bepaalde doelgroepen, nl. de meest kwetsbare doelgroep van alleenstaanden, eenoudergezinnen, huishoudens met een beperkt inkomen, en dat precies hier de renovatieactiviteit het laagst is.</p> <p>Om de renovatiegraad op te krikken bestaan er sinds jaren premies gericht op energie-efficiëntie en het stimuleren van investeringen in hernieuwbare energie installaties enerzijds (energiebeleid) en doelgroepgerichte premies voor de verbetering van de woningkwaliteit anderzijds (woonbeleid). Ter bevordering van de klantvriendelijkheid en de transparantie alsook om de renovatiegraad te verhogen, is een vereenvoudiging van het premielandschap noodzakelijk, met uniforme en versterkte doelgroepgerichte maatregelen en premies. Door zoveel mogelijk premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning in één loket te bundelen, wordt aan deze nood tegemoet gekomen.</p> <p>Hierbij werd vertrokken van volgende uitgangspunten: (i) het behouden van de aandacht voor woningkwaliteit en (ii) het verhogen van de aantrekkelijkheid van de premies.</p> <p>De mate van ondersteuning hangt af van financiële draagkracht van de investeerder.</p> <p>Steun voor energetische investeringen voor iedereen, steun voor investeringen in woningkwaliteit voor lagere inkomens waarbij het steunpercentage afhankelijk is van het inkomen. Dit impliceert voor energiepremie afstappen van de verhoogde premies voor de doelgroep 'beschermde afnemer' (= federaal bepaalde rechthebbenden op sociale maximumprijzen energie).</p> <p>De klantgerichtheid wordt bevorderd door een vlotte dossierbehandeling, het voorzien van slechts één indienings- en</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

betaaladres en het vereenvoudigen van de procedures. Maximale aandacht gaat naar de begeleiding en ontzorging van kwetsbare doelgroepen.

Vereenvoudiging en vergaande afstemming van de in aanmerking komende investeringen en de toekenningsvoorwaarden die worden gehanteerd in de huidige stelsels.

De relancemiddelen worden ingezet voor de financiering van een deel van de energiegerelateerde onderdelen van deze nieuwe, geïntegreerde premie. De premies die niet vergoed kunnen worden vanuit de relancemiddelen, worden vergoed vanuit de nettarieven, tenzij hiervoor expliciet bijkomende middelen voorzien zouden zijn vanuit de Vlaamse uitgavenbegroting of het Energiefonds, zoals bepaald in het Energiebesluit van 19 november 2010.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	180.000.000 EUR
Output	220.000 premie-aanvragen voor energiegerelateerde investeringen over periode 2022-2024.
Outcome	Energiebesparing en hoger aandeel hernieuwbare energie bij minstens 202.000 woningen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het decreet voor de oprichting van het unieke loket voor de aanvraag en behandeling van premie-aanvragen werd een eerste keer principiële goedgekeurd in februari 2021 en na parlementaire behandeling bekrachtigd door de VR op 19 november 2021. Het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering werd definitief goedgekeurd op 4 februari 2022. Via besluitwijziging van de VR van 20 mei 2022 worden de premies voor dak, buitenmuur, ramen en deuren, vloer, binnenrenovatie en elektrische en sanitaire installaties voor de twee laagste inkomensgroepen verhoogd voor premie-aanvragen via de Mijn VerbouwPremie in 2022 en 2023. Ook de premies voor (hybride) warmtepompen en warmtepompboilers worden verhoogd voor investeringen met eindfacturen in 2022 en 2023. Ook de dakisolatiepremie wordt verdubbeld voor investeringen met eindfacturen in 2022 en 2023.</p> <p>De Mijn VerbouwPremie ging van start op 1 juli 2022, aanvragen via het uniek loket kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Fase 1 regelgevend traject: Definitieve goedkeuring decreet oprichting uniek loket door Vlaamse regering. Eerste principiële goedkeuring besluit Vlaamse regering. Definitieve goedkeuring besluit	2021 Q3	Gerealiseerd	Definitieve goedkeuring VR decreet oprichting uniek loket op 9 juli 2021. Eerste principiële goedkeuring besluit VR uniek loket en definitieve goedkeuring besluit vergoedingen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
vergoedingen elektriciteitsdistributienetbeheerders			elektriciteitsdistributienetbeheerders op 9 juli 2021.	
Fase 2 regelgevend traject. Bekrachtiging Vlaamse Regering decreet oprichting uniek loket. Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering besluit oprichting uniek loket en wijziging van het Energiebesluit en het Besluit Vlaamse Codex Wonen.	2022 Q1	Gerealiseerd	Decreet bekrachtigd 19 november 2021. Besluit goedgekeurd 4 februari 2022.	
Go live uniek loket frontoffice en backoffice met basisfunctionaliteiten	2022 Q3	Gerealiseerd	Go live gerealiseerd op 1 oktober 2022.	
Uitbreiding functionaliteiten uniek loket voor premieaanvragen	2023 Q2	Op schema		
Definitieve goedkeuring van de nieuwe regelgeving voor een hervorming van de energie- en woningrenovatiepremies (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd		
Toekenning van 60.000 energiepremies voor investeringen uitgevoerd in 2022, resulterend in minstens 54.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)	2023 Q2	Vertraging	Premie-aanvragen voor investeringen uitgevoerd in 2022 konden vanaf 1 oktober 2022 ingediend worden. Door vertragingen in de back-office, zal deze mijlpaal slechts met vertraging gerealiseerd worden. In 2022 werden reeds meer dan 46.000 dossiers ingediend, waarvan er 1230 in 2022 werden goedgekeurd.	
Toekenning van 80.000 energiepremies voor investeringen uitgevoerd in 2023, resulterend in 72.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)	2024 Q2	Nog niet gestart		
Toekenning van 80.000 premies voor energetische investeringen uitgevoerd in 2024, resulterend in 72.000 uniek gerenoveerde woningen (RRF target)	2025 Q2	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
premie-aanvragen voor energiegerelateerde investeringen over periode 2022-2024	220.000	2025 Q1		
aantal unieke woningen gerenoveerd	202.000	2025 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	180.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	180.000.000 EUR
Uitvoering VAK	180.000.000 EUR
Uitvoering VEK	881.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 180.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Eerste principiële goedkeuring decreetwijziging op 5 februari 2021 - memorie](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van vergoedingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter financiering van openbare dienstverplichting en ter bevordering van het rationeel energiegebruik](#)

[Schematisch overzicht geïntegreerde premie. Bijlage](#)

[BIS Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Briefadvies Minaraad. Uniek loket renovatie-en energiepremie](#)

[Advies van de VREG van 3 augustus 2021](#)

[Advies SERV van 13 september 2021. Besluit woon-en energiepremies](#)

[Advies Vlaamse Toezichtcommissie van 20 juli 2021](#)

[Schematisch overzicht Mijn Verbouwpremie. Bijlage](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 4 februari 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

[Tabel. Bijlage](#)

[Adviesaanvraag van de Raad van State. Adviesaanvraag 70.641/3over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon-en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021](#)

VV007 - FINANCIERING FLANKEREND BELEID TRANSITIE OUDE ELEKTRISCHE VERWARMING EN TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Ongeveer 101.000 prosumenten verliezen in 2021 hun (virtuele) terugdraaiende teller gezien ze al over een digitale meter beschikken. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 heeft een onmiddellijke of uitgestelde impact op alle prosumenten die sinds 2006 een PV-installatie plaatsten. Naast een retroactieve investeringspremie voor de getroffen prosumenten, wordt een flankerend beleid voorgesteld om de impact op deze prosumenten te beperken. Omdat het aangewezen is dat eigenaars van decentrale productie-installaties hun onmiddellijk elektriciteitsverbruik verhogen of hun productie tijdelijk opslaan, wordt een toegenomen interesse verwacht bij dergelijke prosumenten om een thuisbatterij te plaatsen. De batterij kan immers het zelfverbruik en de flexibiliteit verhogen en aldus de investering in PV rendabeler maken. Daarom wordt voorzien in een hogere premie voor thuisbatterijen vanaf 1 april 2021.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	57.850.000 EUR
Output	Toekenning van minstens 35.351 premies voor thuisbatterijen
Outcome	Een flexibeler elektriciteitsverbruik: een verschuiving van de vraag naar elektriciteit wanneer de prijzen laag zijn en (hernieuwbare) energie overvloedig ter beschikking is, een hoger zelfverbruik van eigen geproduceerde elektriciteit bij prosumenten. Dit alles leidt tot minder congestie op het net en de mogelijkheid om meer hernieuwbare energie aan te sluiten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op 9 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit definitief goed wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt. In dat wijzigingsbesluit werd ook de verhoogde batterijpremie geregeld.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering om 37,8 miljoen euro relancemiddelen te verschuiven van projecten VV001-VV003 naar VV007.</p> <p>Op 2 december 2022 besliste de Vlaamse Regering om de batterijpremie met ingang van 1 april 2023 stop te zetten.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Regelgeving voor premie thuisbatterij en sturing elektrische warmte definitief goedgekeurd (Vlaamse mijlpaal)	2021 Q3	Gerealiseerd		
Regelgeving voor premie thuisbatterij en sturing elektrische warmte definitief goedgekeurd (EU mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd		
Toekenning van 9.500 premies voor thuisbatterijen in 2021	2022 Q1	Vertraging	In 2021 werden tussen 1 april 2021 en 31 december 2021 in totaal 18.058 premies aangevraagd. Door de behandelingstermijn werden voor wel slechts 4631 batterijpremies uitbetaald.	
Toekenning van 17.391 premies voor thuisbatterijen in 2022	2023 Q1	Gerealiseerd	Tussen 1 januari en 8 december 2022 werden 23.343 batterijpremies uitbetaald.	
Toekenning van 7377 premies voor thuisbatterijen in 2023	2024 Q1	Op schema		
Toekenning van 8.460 premies aan huishoudens voor thuisbatterijen vanaf Q2 2021 met RRF middelen	2023 Q2	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal premies thuisbatterij toegekend sinds Q2-2021 met Vlaamse relancemiddelen	26.891	2023 Q1	19.514	72,6 %
Aantal verhoogde premies thuisbatterij toegekend sinds Q2-2021 met RRF middelen	8460	2023 Q2	8.460	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.050.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot) update	57.850.000 EUR
Uitvoering VAK	57.850.000 EUR
Uitvoering VEK	57.047.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.050.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 37.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022</p> <p>Definitieve goedkeuring op 09/07/2021 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010</p> <p>Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota</p> <p>Bis-nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2022 - update relancemiddelen</p>

VV008 - EPC-LABELPREMIE RESIDENTIEEL

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Volgens de langetermijn renovatiedoelstelling moeten alle bestaande woongebouwen uiterlijk in 2050 een vergelijkbaar energieprestatieniveau halen als nieuwbouwwoningen met vergunningsaanvraag in 2015. Deze langetermijndoelstelling betekent dat tegen 2050 het gemiddelde EPC-kengetal van het volledige woningenpark wordt verlaagd met 75%. Op de gehanteerde EPC-schalen met energielabels (A tot F), komt dit overeen met het label A (EPC-kengetal 100).</p> <p>Op basis van data uit de EPC-databank wordt vastgesteld dat op dit moment ongeveer 3,5% van het bestaande woningenpark van bijna 3 miljoen woningen (huizen en appartementen) voldoet aan het streefdoel, terwijl 29% een F-label heeft. Er moeten dus nog 2,9 miljoen woningen evolueren naar de doelstelling 2050 (96,5% van het woningenbestand). Dat betekent dat, als de inspanningen uniform worden gespreid, de komende dertig jaar per jaar gemiddeld 3% van het woningenbestand of ruim 95.000 wooneenheden moeten evolueren naar de doelstelling 2050. Gebeurt de renovatie, zoals doorgaans het geval is, in fases, ligt de noodzakelijke renovatiegraad nog hoger.</p> <p>Om dit te verwezenlijken legt de langetermijnrenovatiestrategie 2050 een sterk accent op grondige renovaties op natuurlijke opportuniteitsmomenten, zoals bijvoorbeeld bij transactiemomenten (verkoop, vererving), start van een nieuwe verhuring en sloop van de slechtste woningen gevolgd door vernieuwbouw. Maar ook buiten deze sleutelmomenten blijft het verhogen van de renovatiegraad en het stimuleren van diepgaande energetische renovaties een permanente noodzaak. Prioriteit gaat naar de slechtst presterende woningen.</p> <p>Daarom werd vanaf 1 januari 2021 een EPC-labelpremie ingevoerd voor die investeerders in een woning of appartement met een zeer slecht EPC-label, die de woning renoveren tot minstens label C (appartement tot minstens label B). Het premiebedrag varieert in functie van het behaalde label na renovatie en kan in stappen worden verkregen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	25.350.000 EUR
Output	8400 aangevraagde premies over periode 2021-2022
Outcome	Energiebesparing van EPC-label E/F/D naar EPC-label C/B/A in 8400 woningen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Maatregel ingegaan vanaf 2021. Relancemiddelen voorzien voor renovaties in 2021 en 2022 (dus start-EPC's opgemaakt t.e.m. 2022). Op basis van een slecht EPC-voor en een goed EPC-na binnen de 5 jaar na start EPC, kan een premie worden aangevraagd bij de netbeheerder. Wie start met renoveren in 2021, heeft dus tijd t.e.m. 2026 om dat nieuwe EPC te laten opmaken en daarna nog 1 jaar tijd om de premie-aanvraag in te dienen. Bijgevolg kent dit project een trage opstart, wat echter niet representatief is voor het uiteindelijk succes en het uiteindelijk aantal grondig gerenoveerde woningen.</p> <p>Momenteel zijn 1166 premies effectief uitbetaald (stand van zaken t.e.m. 31 oktober 2022) en ca. 5800 start-EPC's ingediend (stand van zaken t.e.m. 30 november 2022). Dit is een onderschatting van het effectief aantal opgestarte werken in 2021-2022, gezien men ook kan wachten tot na de uitvoering van de werken om het start-EPC en nieuwe EPC samen in te dienen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
1600 gerenoveerde woningen met EPC-labelpremie	2022 Q1	Vertraging	Eind oktober 2022 waren reeds iets minder dan 1200 EPC-labelpremie's uitbetaald. Men heeft 5 jaar tijd na opmaak van start-EPC om de renovatiewerken af te ronden en daarna nog 1 jaar de tijd om premieaanvraag in te dienen. Renovatie en premieaanvragen realiseren zich trager dan initieel ingeschat.	
Goedkeuring door Vlaamse Regering van de energielabelpremie (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd		
8400 woningen gerenoveerd met EPC-labelpremie (RRF-mijlpaal)	2023 Q2	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Uitbetaalde premies over periode 2021-2022	8400	2023 Q2	1.166	13,9 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.350.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	25.350.000 EUR
Uitvoering VAK	25.350.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	3.621.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 25.350.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies

VV009 - RENOVATIES SOCIALE WONINGEN VERSNELLEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds die beroep kunnen doen op deze subsidies voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Het voordeel dat hiermee wordt gecreëerd door een lagere energiefactuur komt ten goede van de sociale huurders.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met het oog op het behalen van de ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050, moet er volop worden ingezet op de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Zo werd door de Vlaamse Regering immers beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Naast grote inspanningen op de private woonmarkt, wordt ook van de sociale huisvestingssector een inhaalbeweging verwacht op dat vlak .</p> <p>Het doel van dit project is om aan de hand van de toekenning van VKF-premies aan sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaamse Woningfonds de energetische renovatie van sociale huurwoningen te stimuleren en te versnellen. Naast de opname van een gesubsidieerde lening bij de renovatie van sociale huurwoningen kunnen initiatiefnemers dan ook gebruik maken van deze subsidie wat voor hen voordeliger is. Op die manier worden initiatiefnemers gestimuleerd om projecten op te starten wat enerzijds een positieve impact zal hebben bij het heropstarten van de bouwsector na de coronamaatregelen en anderzijds zal resulteren in sociale woningen met een laag energieverbruik en bijgevolg een beperkte CO2-impact.</p> <p>Rekening houdend met het gegeven dat er geen subsidie toegekend kan worden voor de plaatsing van een gascondensatie ketel, gaan we uit van een gemiddelde subsidie van 6.734 euro per woning. Met een budget van 30 miljoen euro, afkomstig van het relanceplan 'Vlaamse Veerkacht', zullen op die manier ongeveer 4.455 woningen een energetische renovatie kunnen ondergaan.</p> <p>De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal instaan voor het beheer en de toekenning van deze subsidie aan de initiatiefnemers, zoals ze dat tot nu toe ook al heeft gedaan voor de middelen die vanuit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking werden gesteld voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Er kan dus verder gewerkt worden op een bestaande regeling die al is ingeschreven in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.48 tot en met artikel 5.55). Daarbij kan een initiatiefnemer afhankelijk van de energetische investeringen die worden gedaan in de sociale huurwoning zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een zonneboiler, condensatieketel, warmtepomp, zoldervloerisolatie, de na-isolatie van de bestaande spouwmuur,... een subsidie aanvragen bij de VMSW.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	30.000.000 EUR
Output	Aan een gemiddelde subsidie van 6.743 euro per woning, zal met een budget van 30 miljoen euro op die manier ongeveer 4.455 woningen een energetische renovatie kunnen ondergaan.
Outcome	Versnelde energetische renovatie van sociale huurwoningen met een daling van het energieverbruik als gevolg, wat op zijn beurt zal resulteren in een daling van de CO2-uitstoot.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Uiteindelijk werd van de voorziene 30 miljoen euro een bedrag van 25 miljoen euro benut voor de energetische renovatie van 4.286 sociale huurwoningen. Een mogelijke verklaring dat het budget niet helemaal werd aangewend, is het feit dat het renoveren van sociale huurwoningen sterk onderhevig is aan verschillende markteconomische tendensen, zo is er de impact van de covid-crisis, de stijgende bouwkosten en de algemene inflatie n.a.v. de situatie in Oekraïne die een rem zetten op de bouwactiviteiten. Daarnaast speelt ook de herstructurering van de sociale huisvestingssector een rol.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opmaak nota aan de Vlaamse regering met oog op herverdeling middelen.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opmaak toelagebesluit waarbij het eerste deel van de middelen vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking worden gesteld die instaat voor het beheer en de toekenning van de subsidie.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Tweede herverdeling waarbij de resterende middelen (10 mio euro in VAK en VEK) worden ter beschikking gesteld van het agentschap Wonen-Vlaanderen	2022 Q2	Gerealiseerd	
Opmaak toelagebesluit waarbij het tweede deel van de middelen vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter beschikking worden gesteld die instaat voor het beheer en de toekenning van de subsidie.	2022 Q3	Gerealiseerd	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal sociale huurwoningen waarvoor een subsidie voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen werd toegekend	5143	2022 Q4	4.286	83,34 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	25.000.000 EUR
Uitvoering VEK	12.287.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 30.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Renovaties sociale woningen versnellen

VV010 - SOCIALE WONINGBOUW

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting - Wonen-Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Wonen-Vlaanderen
Belanghebbenden	De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen dankzij de verhoogde leningsmachtiging meer leningen opnemen bij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), zodat er sneller bijkomende sociale woningen gebouwd en gerenoveerd kunnen worden. De uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium richt zich bij uitstek tot de meest kwetsbare groepen op de woningmarkt.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De vraag naar sociale huurwoningen in Vlaanderen is groter dan het aanbod. De huidige pandemie zorgt bovendien voor bijkomende uitdagingen op de woningmarkt, voornamelijk in het onderste segment van de huurmarkt.</p> <p>Daarnaast staan we voor ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050. Zo werd door de Vlaamse regering beslist dat uiterlijk in 2050 de bestaande woningen een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau moeten behalen als nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag in 2015. Om het patrimonium binnen de sociale huisvestingssector op dit niveau te brengen, moeten nog grote investeringen gebeuren.</p> <p>De doelstelling van dit project is om de renovatie van sociale woningen te versnellen door éénmalig in het begrotingsjaar 2021 de FS3-machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te verhogen met 250 miljoen euro. Hierdoor kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen goedkope leningen aangaan bij VMSW om hun renovatieprojecten te financieren. De VMSW staat in voor het toekennen van deze leningen aan de initiatiefnemers volgens een regeling die is opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 5.38 tot en met 5.44).</p> <p>Voor de financiering van deze maatregelen zal de VMSW renteloze leningen opnemen bij het Vlaamse Gewest die zich op haar beurt zal financieren op de kapitaalmarkt. Het budget van 5 miljoen euro betreft een compensatie van de rentelasten waarmee Financiën & Begroting zal worden geconfronteerd gedurende een periode van 4 jaar (gerekend aan 0,5% rente).</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	Omdat de omvang en de complexiteit van renovaties sterk kan variëren, is het niet direct mogelijk om op voorhand aan te geven hoeveel sociale huurwoningen kunnen worden gerenoveerd met een budget van 250 miljoen euro.
Outcome	Dit zal voor een versnelling zorgen in de energetische renovatie van sociale huurwoningen met een daling van het energieverbruik als gevolg, wat op zijn beurt zal resulteren in een daling van de CO2-uitstoot.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Na de goedkeuring van dit project op de Vlaamse regering van 25 juni 2021 werd het totaal bedrag van 250.000.000 euro toegewezen voor de renovatie van sociale huurwoningen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opmaak nota aan de Vlaamse Regering met oog op herverdeling van de middelen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2021	2022 Q3	Gerealiseerd	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2022	2022 Q3	Op schema	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2022	2022 Q4	Op schema	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2023	2023 Q3	Op schema	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2023	2023 Q4	Op schema	
Herverdeling 1,25 mio euro in 2024	2024 Q3	Op schema	
Vastlegging en uitbetaling 1,25 mio euro in 2024	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
FS3-financiering die werd toegewezen voor de renovatie van sociale huurwoningen	250.000.000 euro	2022 Q4	250.000.000	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 5.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Sociale Woningbouw

VV011 - VEB-ENERGIE-EFFICIËNTIE VLAAMSE OVERHEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energiebedrijf
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energiebedrijf
Belanghebbenden	Elke Vlaamse entiteit die onderworpen is aan de wetgeving overheidsopdrachten kan gebruik maken van het VEB als aankoopcentrale en/of als opdrachtcentrale. Vanuit haar opdracht concentreert het VEB zich prioritair op overheden in Vlaanderen en in het bijzonder deze die gevat worden door de wetgeving overheidsopdrachten. Met andere woorden: de Vlaamse overheid zelf en entiteiten die werkingsmiddelen, subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse overheid. De entiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit dit relanceplan zijn evenwel beperkt tot deze waarbij de Vlaamse Overheid ook de toezichhoudende entiteit is (institutionele sector 1312), en de aan de wetgeving overheidsopdrachten onderworpen onderwijs- en zorginstellingen in het Vlaams Gewest.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Verbeteren van energieprestatie Vlaamse Overheid door ondersteuning investeringen</p> <p>Voor de overheidsgebouwen wordt vanuit de voorbeeldrol van de overheid 2045 gesteld voor een CO2-neutrale gebouwenvoorraad. De doelstelling is om tegen 2045 geen emissies meer uit gas of stookolie te genereren in gebouwen en technische infrastructuur.</p> <p>De Vlaamse overheid wil haar verantwoordelijkheid opnemen in het behalen van de doelstellingen met behulp van het interne Klimaatplan van de Vlaamse overheid. Elke entiteit moet jaarlijks haar primair energieverbruik met 2,5 % verminderen en hiertoe een meerjarenplan opnemen in hun ondernemingsplan. In 2022 werd deze doelstellingen verhoogd naar 3% vanaf 2023 (VR 2022 1507 DOC.0869/1BIS). Om deze klimaatdoelstellingen te halen, moeten onder andere investeringen gebeuren in een goed onderbouwde vastgoedstrategie en daaraan gekoppeld duurzaam meerjarenonderhoudsplan met implementatie van energiebesparende maatregelen.</p> <p>De projecten die worden weerhouden voor het toekennen van steun, moeten zorgen voor een versnelling van de klimaatinspanningen en moeten helpen om de economie te laten opveren. We opteren hierbij voor projecten die direct of indirect bijdragen tot het verduurzamen van het vastgoed van de Vlaamse overheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projecten die inzicht geven in de energie- en koolstofbesparingsmogelijkheden <p>Daarnaast worden ook maatregelen ondersteund die slechts indirect tot een energie- of koolstofbesparing leiden, maar wel essentieel zijn om tot een koolstofneutraal patrimonium te komen doordat ze leiden tot een kwantitatief en kwalitatief inzicht in besparingsmogelijkheden en verbruik.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

- Energiescans of -audits

• Projecten die leiden tot een directe energie- en koolstofbesparing

Dit zijn meestal projecten waarbij technische aanpassingen en/of gebouwschilmaatregelen worden geïmplementeerd (niet-limitatieve lijst):

- Relighting
- Verwarmen en koelen (HVAC), met bijzondere aandacht voor uitfasering van stookolie-installaties
- Isolatiemaatregelen (muur, dak, vloer)
- Schrijnwerk en beglazing
- Energieprestatiecontracten, zowel bij de facilitatie als bij de uitvoering
- Hernieuwbare energie (opwekking en opslag)

Er zal een procentuele steun toegekend worden op de weerhouden projecten, zodat de subsidie-efficiëntie gewaarborgd wordt. Het percentage steun dat zal worden toegekend, wordt bepaald overeenkomstig de (potentiële) impact van het project of maatregel, zijnde de energie- en CO2-besparing.

Er wordt geopteerd om met een vast steunpercentage te werken per type project of maatregel.

Energiescans of -audits: 20% - 25% (Vlaamse overheid)

EPC-facilitatie en uitvoering: 20% - 25% (Vlaamse overheid)

Groene Warmte: 30% - 37,5% (Vlaamse overheid)

Technische installaties: 30% - 37,5% (Vlaamse overheid)

Gebouwschil 40% - 50% (Vlaamse overheid)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	Kwantitatieve einddoelstelling: 261.428 m ² gerenoveerd vloeroppervlak
Outcome	Een beter inzicht in de energie- en koststofbesparingsmaatregelen en een verbetering van de energieprestaties van de Vlaamse Overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Dankzij dit Relanceprogramma kon het VEB 339 energie-efficiëntieprojecten realiseren. Met 20 miljoen euro aan Relancesteun kunnen op die manier voor 53 miljoen euro aan investeringen in de energie-efficiëntie van gebouwen uit de publieke sector in Vlaanderen gemobiliseerd worden. Bij 75 van die 339 projecten hebben de renovaties ook al effectief plaatsgevonden en zijn de werken opgeleverd. De doelstellingen zullen behaald zijn tegen Q2 2026. Het volledige budget (20 miljoen euro) werd ook reeds opgevraagd bij de Vlaamse Regering.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Validatie operationeel kader voor toewijzing projecten	2021 Q1	Op schema		
Selectie van weerhouden projecten 2021 (46.764 m ² in deze periode)	2021 Q3	Vertraging	Er diende nog bekendheid te worden verworven. Dit werd ondervangen met enkele op maat gerichte webinars in Q1 van 2022 met 50-inschrijvingen voor de zorg en meer dan 180 inschrijvingen op een webinar gericht op het onderwijs.	
Selectie van weerhouden projecten 2021 (70.146 m ² in deze periode, 116.910m ² cumulatief)	2021 Q4	Vertraging	Er diende nog bekendheid te worden verworven. Dit werd ondervangen met enkele op maat gerichte webinars in Q1 van 2022 met 50-inschrijvingen voor de zorg en meer dan 180 inschrijvingen op een webinar gericht op het onderwijs.	
Selectie van weerhouden projecten 2022 (57.807 m ² in deze periode, 174.717 m ² cumulatief)	2022 Q2	Vertraging	Er werden reeds voor 82 energie-efficiëntie projecten middelen aangevraagd bij de Vlaamse Regering. De uitgevoerde maatregelen beslaan een brutovloeroppervlakte van 200.868m ² . De wezenlijke goedkeuring vindt pas plaats op 3 juni van de laatste aanvraag en die bevat enkele grote oppervlakten. Vandaar dat de huidige outputindicator slechts 126746m ² betreft.	
Selectie van weerhouden projecten 2022 (86.711 m ² in deze periode, 261.428 m ² cumulatief)	2022 Q4	Gerealiseerd	Dankzij dit Relanceprogramma kon het VEB 339 energie-efficiëntieprojecten realiseren. Met 20 miljoen euro aan Relancesteun kunnen op die manier voor 53 miljoen euro aan investeringen in de energie-efficiëntie van gebouwen uit de publieke sector in Vlaanderen gemobiliseerd worden. De projecten zullen allemaal uitgevoerd zijn voor eind 2026. Het volledige budget (20 miljoen euro) werd ook reeds volledig opgevraagd bij de Vlaamse Regering.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Verbeteren van energieprestatie Vlaamse Overheid door selectie van projecten voor de renovatie van 261.428 m ² vloeroppervlak (Selectie = energie-efficiëntieprojecten waarvoor erbij de Vlaamse Regering middelen reeds herverdeeld zijn. Voor deze projecten werd reeds een offerte ondertekend bij een aannemer die intekende op het raamcontract van VEB)	261.428 m ²	2022 Q4	297.394	100 %
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR			
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	20.000.000 EUR
Uitvoering VEK	19.462.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Relance budget 11 – VEB energie-efficiëntie Vlaamse overheid</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Aanpak besteding middelen Vlaams Klimaatfonds voor de maatregel energetische renovatie van gebouwen publieke sector</p> <p>Bijlage. Aanvraagjabloon</p>

VV012 - VERLENGING EN UITBREIDING SLOOP- EN HEROPBOUWPREMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Woningeigenaars, sectoren en bedrijven actief in de bouwsector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	01. Renovatie gebouwenpatrimonium (energetisch & asbestverwijdering)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Sloop en heropbouw is een belangrijke beleidsmaatregel om het verouderd patrimonium, dat vaak minder geschikt is voor een grondige energetische renovatie, versneld te laten slopen en te herbouwen, via een stimulerend beleid. Op die manier komt bebouwde ruimte versneld terug vrij, waarbij deze ruimte opnieuw wordt ingevuld met woongebouwen die aan de actuele energieprestatie-eisen voldoen.</p> <p>De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd ingevoerd vanaf 1 oktober 2018 en liep af op 31/12/2020. Deze premie van 7500 euro was bestemd voor de gebieden waar de 6% btw bij sloop- en heropbouw niet van toepassing was (= buiten de centrumsteden). Vanaf 1 januari 2021 werd de federale maatregel inzake 6% btw gedeeltelijk uitgebreid naar het volledige grondgebied, weliswaar beperkt tot de enige/eigen woning met een bewoonbare oppervlakte tot 200 m² en dit voor een periode van 2 jaar.</p> <p>De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd verlengd voor bouwaanvragen in 2021 en 2022 en verhoogd van 7500 naar 10.000 euro. Deze Vlaamse sloop- en heropbouwpremie is enkel bestemd voor wie niet kan genieten van de uitbreiding van de federale maatregel.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	17.600.000 EUR
Output	1760 uitbetaalde sloop- en herbouwpremies
Outcome	Minstens 1760 bijna-energie neutrale nieuwbouwwoningen ter vervanging van energie-inefficiënte woningen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De verlenging van de sloop- en herbouwpremie werd goedgekeurd Q4-2020. De verhoogde premie kan aangevraagd worden voor omgevingsvergunningen aangevraagd tussen 1 januari

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>2021 en 31 december 2022.</p> <p>Op 2 december 2022 besliste de Vlaamse Regering om de sloop- en heropbouwpremie te verlengen tot 31 december 2023, en dit te financieren via het Energiefonds.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Aanvraagprocedure sloop- en heropbouw operationeel	2021 Q1	Gerealiseerd		
300 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2021 Q2	Gerealiseerd		
600 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2021 Q4	Gerealiseerd		
Regelgevende aanpassingen: verlenging en verhoging Vlaamse sloop- en heropbouwpremie in 2021 en 2022 (RRF mijlpaal)	2022 Q1	Gerealiseerd		
900 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2022 Q2	Gerealiseerd		
1200 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2022 Q4	Gerealiseerd	Eind december werden er 1215 dossiers uitbetaald, voor een budget van 10.172.500 euro Doelstelling is budgettair dus niet volledig gerealiseerd	
1400 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2023 Q2	Op schema		
1600 sloop- en herbouwpremies uitbetaald	2023 Q4	Op schema		
1760 sloop- en herbouwpremies uitbetaald (RRF mijlpaal)	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
uitbetaalde sloop- en herbouwpremies	1760	2022 Q4	1.017	57,8 %
uitbetaalde sloop- en herbouwpremies	1760	2024 Q4	969	55 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	17.600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	17.600.000 EUR
Uitvoering VAK	14.415.000 EUR
Uitvoering VEK	10.173.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 17.600.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - BVR
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - nota
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 - advies

02. Fietsinfrastructuur

VV013 - DE INRICHTING VAN EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - De Werkvennootschap - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Lantis - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Weggebruikers, Vlaamse havens, lokale besturen en hun inwoners, bedrijven, Vlaamse havens

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Door voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden te voorzien worden zoveel mogelijk mensen gestimuleerd om de fiets te gebruiken, en ondersteunen we een fietsreflex zowel voor recreatieve als functionele verplaatsingen. Zo kunnen we van Vlaanderen een echte fietsregio maken, de modal shift realiseren en bijgevolg het aandeel duurzame transportmodi laten toenemen.</p> <p>De investeringen die in het licht van deze doelstelling gedaan worden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de nieuwe aanleg en de heraanleg en het herstel van vrijliggende fietspaden, - het herinrichten van kruispunten, - uitrusten van knooppunten met fietsinfrastructuur (fietsenstallingen), - het vervolledigen van fietssnelwegen, - de aanleg en het herstel van jaagpaden, - de verlichting van fietspaden en fietsoversteken, - het realiseren en herstellen van fietsbruggen, - het aanleggen van fietstunnels. <p>Naast de uitvoering worden alle voorbereidende onderdelen zoals studie, ontwerp en onteigeningen voor deze fietsprojecten hier ook op aangerekend.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	252.066.000 EUR
Output	Aanleg van 67km nieuw fietspad, Verbetering van 405km fietspad tegen 2026.
Outcome	Aantrekkelijk maken van de fiets als vervoersmiddel, daling gebruik van personenwagens.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De diverse agentschappen realiseerden heel wat fietsinitiatieven of zijn actief bezig met de uitvoering of voorbereiding van fietsinvesteringen. Deze investeringen bestaan uit de aanleg van nieuwe fietspaden, het herstel en verbeteren van bestaande fietspaden (bv. jaagpaden), het aanleggen van fietsersbruggen en-tunnels alsook de nodige investeringen in fietsenstallingen.</p> <p>Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft zo reeds 86,52 km fietspad verbeterd en 2,22 km nieuw fietspad aangelegd . Op dit meetmoment zijn werken in uitvoering voor 4,4 km nieuw en 134,76 km verbeterd fietspad. Daarnaast werd de aanbestedingsprocedure doorlopen en werden de middelen vastgelegd voor 2,5 km nieuw fietspad en 103,3 km te verbeteren fietspad. Er wordt naar gestreefd al deze projecten tegen uiterlijk medio 2026 uit te voeren.</p> <p>De Vlaamse Waterweg nv (DVW) draagt onder meer via relancemiddelen bij aan het in goede staat brengen/houden van de jaagpaden en het optimaliseren van fietsverbindingen naar bedrijfsterreinen. Tot op heden heeft DVW 57km fietspad verbeterd. De uitvoering van de verbeteringen aan 6,15km fietspad is lopende, alsook de bouw van 3 fietsbruggen (Fietsbrug Gent t.h.v. Eiland, Wielsbeke-Waregem & fietsbrug Menen). De budgetten zijn gereserveerd voor de renovatie van de brug over sluis 9 in Kortrijk, de fietsinfrastructuur t.h.v. het Moleneiland te Harelbeke, de bouw van de fietsbrug aan sluis 10 Schoten, fietsinfrastructuur in GOG Rijmenam, de bouw van 2 fietsersbruggen over de Bovendijle, de fietsersbrug Turnhoutsebaan Wijnegem, de renovatie van de Bombardierbrug en 8 km nieuw fietspad. De uitvoering van deze projecten wordt op dit moment ingepland.</p> <p>Lantis is sinds begin 2022 gestart met meerdere projecten voor 14,18 km verbeterd en 2,55 km nieuw aangelegd fietspad. Op dit moment is hiervan 1,7 km uitgevoerd (fietsverbinding Ter Borcht en fietsverbinding Vaartkaai-Groenendaallaan) en zijn meerdere projecten in uitvoering voor 3,2 km (o.a. verbetering van de fietspaden rondom de Groenendaallaan, Masurebrug en de fietstunnel Turnhoutsebaan en fietsverbinding Hoogboom-Kapellen, waar in de K. Astridlaan een fietsstraat wordt ingericht). Van de overige projecten zijn er reeds een aantal vergund of wordt de opening van aanbesteding (OVA) begin 2023 verwacht. De uitvoering hiervan zal dan ook starten in 2023. Enkele projecten gaan gepaard met rioleringswerken (fietsconnectie tussen Kleine Bareel en park Brasschaat, door de Zwaantjeslei; F. Verbieststraat in Antwerpen) of grondverwingen (fietssnelweg F107) en hebben daardoor een beperkte vertraging opgelopen. Voor het project 'fietssnelweg F13: missing link Hoboken-Niel' werd het aandeel t.l.v. Lantis beperkt tot 400m fietspad en een veiligere fietsoversteek langs de Provinciale Steenweg tussen de grens Hemiksem-Schelle en de Fabiolalaan. De gemeente Schelle zal deze fietspaden aanleggen in 2024, samen met de overige fietspaden langs de Fabiolalaan. Daarnaast zijn er ook 9 projecten in voorbereiding voor het installeren van fietsenstallingen aan de Park & Rides en andere overstappunten (bv. snelbushaltes). Mogelijks komt er één project in het gedrang qua uitvoering omwille van een vergunningsproblematiek (fietsenstalling aan P+R Sint-Job). Voor de overige fietsenstallingen zal de aannemer begin 2023 starten met de bouw van een mock-up op de P+R Massenhoven. Als deze positief beoordeeld wordt, kunnen achtereenvolgens ook dezelfde fietsluifels geplaatst worden op de andere voorziene locaties die reeds vergund zijn (P+R Wommelgem, Zoersel, Kasteeldreef in Stabroek). Daarna zullen er nog fietsenstallingen volgen op de P+R Oelegem, P+R Kontich, P+R Stabroek en P+R Rumst.</p> <p>De Werkvennootschap (DWV) zet in op enkele nieuwe fietssnelwegen, namelijk de F29 tussen Tervuren en Leuven en de F203 tussen Sterrebeek en Bertem. Ook langs de spoorlijn Oudenaarde – Maarkedal komt er met de F428 een nieuwe fietssnelweg. Deze projecten werden aanbesteed..</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>Deze projecten zijn samen goed voor meer dan 25 km. Verder heeft DWV de werken aan de fietspaden langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren (9km verbeterd fietspad) uitgevoerd en zet ze ook nog relancebudgetten in voor studiewerk voor vele andere fietsdossiers in de Vlaamse Rand en in Ronse.</p> <p>Gecumuleerd betekent dit voor de geambieerde fietspadkilometers dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de werken voor 154,25 km verbeterd fietspad uitgevoerd zijn; • de werken voor 142,1 km verbeterd fietspad in uitvoering zijn; • de werken voor 2,22 km nieuw fietspad uitgevoerd zijn; • de werken voor 6,42 km nieuw fietspad in uitvoering zijn; • de werken voor 116,69 km te verbeteren fietspad worden ingepland; • de werken voor 35,95 km nieuw fietspad worden ingepland;
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Fietsprojecten De Werkvennootschap	2024 Q4	Op schema		
Fietsprojecten De Vlaamse Waterweg	2024 Q4	Op schema		
Fietsprojecten Lantis	2024 Q4	Op schema		
Fietsprojecten Agentschap Wegen en Verkeer	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal kilometer nieuw fietspad	67	2026 Q2	2,22	3 %
aantal kilometer verbeterd fietspad	405	2026 Q2	154,25	38 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	252.066.000 EUR
Uitvoering VAK	252.054.000 EUR
Uitvoering VEK	61.908.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 219.230.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 32.836.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV039 - Versnelling investeringen in veilige schoolroutes](#)

VV014 - FIETSINFRASTRUCTUUR AAN GEMEENTEWEGEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers - Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	De Vlaamse gemeenten, inwoners, weggebruikers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	02. Fietsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We voorzien een enveloppe van 157 miljoen euro voor cofinanciering via trekkingsrechten per gemeente (op basis van het aantal inwoners). Elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor investeringen in fietsinfrastructuur versterken we met 1 euro. Daarnaast krijgt elk provinciebestuur een trekkingsrecht van 9 miljoen euro voor investeringen in fietsnelwegen. Daarbovenop kunnen de eerst aangemelde projecten van gemeenten bovenop het trekkingsrecht een subsidie krijgen van 50%, totdat het budget is opgebruikt. Zo wordt er in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten gerealiseerd. De subsidie kan gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook voor heraanleg of herinrichting van bestaande infrastructuur of het duurzaam en structureel onderhoud ervan. Ook de studie en ontwerp (wanneer resulterend in een effectief uitgevoerd project en niet gebeuren door eigen personeel), de aanleg van kunstwerken (bruggen, tunnels, etc.), en onteigeningen die een onderdeel vormen van de fietsinfrastructuur komen in aanmerking. Initieel bedroeg het totale subsidiebedrag 150 miljoen, maar door diverse budgetverschuivingen (waaronder 6.223.000 euro van VV053) werd het bedrag opgetrokken.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	156.223.000 EUR
Output	Gerenoeverde fietspaden en nieuwe fietspaden
Outcome	Stijging van het aantal afgelegde fietskilometers

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	157 miljoen euro aan subsidies zijn vastgelegd voor projecten van gemeenten en provincies inzake nieuwe en vernieuwde fietsinfrastructuur

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opmaak regelgeving	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lokale dossiers aangemeld voor nieuwe en vernieuwde fietsinfrastructuur	2022 Q4	Gerealiseerd	
Subsidies uitbetaald voor nieuwe fietspaden en vernieuwde fietsinfrastructuur	2025 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aangemelde projecten: aantal kilometers nieuw	71,7	2022 Q4	596	831 %
Aangemelde projecten: aantal kilometers vernieuwd	946,1	2022 Q4	440	46 %
Nieuwe fietsinfrastructuur aan gemeentewegen	71,7	2025 Q4		
Gerenoveerde fietspaden aan gemeentewegen	946,1	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	150.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	156.223.000 EUR
Uitvoering VAK	156.677.000 EUR
Uitvoering VEK	2.496.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 126.230.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 29.993.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur](#)

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur. Bijlage](#)

[BVR van 26 februari 2021 tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur. Nota](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse provincies voor investeringen in fietssnelwegen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de Vlaamse provincies voor investeringen in fietssnelwegen](#)

[VR 16/12/2022. Wijziging subsidiebesluit aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur: bevat de beslissing over de overheveling van relancemiddelen van VV053 naar VV014](#)

03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs

VV015 - DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS (DIGISPRONG)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Leerlingen, personeelsleden en onderwijsinstellingen van het leerplichtonderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	03. Digitale versnelling leerplichtonderwijs
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Vlaanderen wil de coronacrisis aangrijpen voor een duurzame digitale versnelling in het onderwijs. Dit doen we door te investeren in de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren en in ICT-toestellen voor gedeeld gebruik in elke kleuterklas en klas van het eerste tot en met vierde leerjaar in het lager onderwijs. Daarnaast voorzien we middelen voor het ter beschikking stellen van een eigen ICT-toestel voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs en de leerlingen van het secundair onderwijs.</p> <p>Er wordt ook voorzien in de nodige omkadering voor scholen, onder meer met een sterker statuut voor de ICT-coördinator van de school, de uitbouw van digitale dienstverlening aan scholen en een kennis- en adviescentrum ten dienste van het werkveld. Er komen aangepaste ICT-opleidingen voor leerkrachten en ook in de lerarenopleidingen zal er meer ingezet worden op digitale competenties. Ook de leerkrachten voorzien we van ICT-materiaal.</p> <p>Digisprong bevat ook verschillende acties om te voorzien in kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal en om creativiteit te stimuleren. De uitbouw van KlasCement als uniek platform voor educatief "open" lesmateriaal en de doorontwikkeling van het Archief voor Onderwijs ter verrijking van de leermiddelen met audiovisueel materiaal. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal in TSO en BSO. Tenslotte zetten we ook in op cybersecurity.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	375.000.000 EUR
Output	IT-infrastructuur in scholen die up to date is, beschikbaarheid van vormingsaanbod rond digitalisering, beter statuut voor ICT-coördinatoren, beschikbaarheid van een kennis- en adviescentrum digisprong.
Outcome	Digitale versnelling in het onderwijs realiseren

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het grootste deel van de voorziene middelen voor ICT-infrastructuur werd reeds in 2021 uitbetaald. Eind december 2021 werd nog een extra impuls van 85 miljoen euro gegeven om ook leraren te voorzien van het nodige ICT-materiaal. In augustus 2022 werd een tweede en laatste schijf ICT-infrastructuurmiddelen (voor het SO) uitbetaald. Hiermee zijn alle voorziene ICT-infrastructuurmiddelen aan de scholen uitgekeerd.</p> <p>Met betrekking tot speerpunt 2 werden sinds 1 september 2021 de vernieuwingen op het vlak van het ambt van ICT-coördinator doorgevoerd. Er werd een jobprofiel voor ICT-coördinatoren opgemaakt en inmiddels loopt ook een ondersteuningsproject voor meer teamgerichte ICT-werking op schoolniveau. Om scholen verder te ondersteunen werd een "beleidsplanner" gelanceerd, dit is een tool waarmee scholen gericht en op basis van de schooleigen visie een ICT-beleidsplan kunnen opmaken of een bestaand ICT-plan kunnen verbeteren.</p> <p>Er werd gestart met de ontwikkeling van een Single Sign On die de naam LeerID kreeg. Deze LeerID moet onderwijsprofessionals en leerlingen in staat stellen om éénmalig in te loggen, waarna automatisch toegang wordt verschaft tot allerhande digitale applicaties en leermiddelen. De LeerID werd in augustus 2022 gelanceerd. Digitale leermiddelen werden ondersteund via extra subsidies. Bijkomende relancemiddelen werden voorzien om extra functionaliteiten in het "Archief voor Onderwijs" in te bouwen, alsook in het leermiddelenproject Smart Education @Schools om bestaande projecten te verduurzamen. De voorziene evaluatiestudie van I-Learn is opgeleverd en vrijgegeven.</p> <p>Ondertussen werd ook werk gemaakt van de vormingspijler van de Digisprong. Scholen kregen in 2022 extra ICT-nascholingsmiddelen (deze middelen werden gepoold vanuit Digisprong en Edusprong). Tevens werd een openbare aanbesteding gelanceerd voor de organisatie van extra vormingsaanbod (bootcamps) voor het lager onderwijs en voor de professionalisering van ICT-coördinatoren. Het kenniscentrum lanceerde de "Digisnap", een instrument waarmee leerkrachten en schoolteams hun digitale vaardigheden in kaart kunnen brengen. Digisnap is bovendien gekoppeld aan een nieuwe (ICT-)vormingsdatabank.</p> <p>Het Kenniscentrum Digisprong heeft verschillende taken in de uitrol van het actieplan Digisprong. Het Kenniscentrum biedt ondersteuning aan scholen in de vorm van adviezen, inspiratiegidsen, concrete tips en stappenplannen onder meer op vlak van afstandleren en digitale evaluaties op afstand. Er werden verschillende inspiratiegidsen en adviezen gepubliceerd over o.a. fiscale aspecten van de infrastructuursubsidies, privacy, duurzaamheid en een aankoopgids voor mobiele toestellen.</p> <p>Daarnaast werd , conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 april 2021, betreffende het opzetten van een Beheers- Controle en Auditsysteem bij de projecten ingediend in het kader van de Europese Faciliteit voor Veerkracht en Herstel, een beheers- en controlesysteem uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Speerpunt 1 Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur : monitoring van de	2024 Q1	Gerealiseerd	In augustus 2022 werd een tweede en laatste schijf ICT-infrastructuurmiddelen (voor het SO) uitbetaald. Hiermee

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
middelen toegekend aan de instellingen			zijn alle voorziene ICT-infrastructuurmiddelen aan de scholen uitgekeerd.
Speerpunt 2: Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT schoolbeleid, monitoring van de ICT-coördinatoren	2022 Q3	Gerealiseerd	De puntenenveloppe voor ICT-coördinatie werd met 22 miljoen euro verhoogd (baseducatie krijgt ook voor het eerst ICT-middelen) en het ambt van ICT-coördinator en de mogelijkheid tot vaste benoeming werd in het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor baseducatie en de academies voor deeltijds kunstonderwijs ingevoerd.
Speerpunt 3: ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen, monitoring van ICT-coördinatoren en rapportering over werking van het Kenniscentrum (zie speerpunt4)	2022 Q3	Gerealiseerd	Bijkomende relancemiddelen werden voorzien om extra functionaliteiten in het "Archief voor Onderwijs" in te bouwen, alsook in het leermiddelenproject Smart Education @Schools om bestaande projecten te verduurzamen. Op 24 juni 2022 besliste de Vlaamse Regering over extra nascholingsmiddelen voor ICT-opleidingen. Elke school uit het leerplichtonderwijs, de Centra voor Baseducatie, de Centra voor Volwassenenonderwijs en de academies voor Deeltijds Kunstonderwijs zullen extra middelen krijgen. Met deze middelen kunnen onderwijsinstellingen bestuurs- en onderwijzend personeel de mogelijkheid bieden om zich extra te professionaliseren in ICT. Tevens worden professionaliseringstrajecten (Bootcamps) voorzien.
Speerpunt 4: Een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld, een dienstencatalogus is beschikbaar	2022 Q3	Gerealiseerd	Volgende diensten (cfr dienstencatalogus) biedt het kenniscentrum aan (niet exhaustieve lijst) : <ul style="list-style-type: none"> • Verspreiden van kwaliteitsvolle informatie, inspiratiegidsen en adviezen mbt digitalisering in het onderwijs • Uitbesteden van wetenschappelijk onderzoek en delen van wetenschappelijke inzichten • Goede praktijken inventariseren en verspreiden • Ontwikkelen van adviezen en richtlijnen die scholen helpen bij het maken van relevante keuzes • Delen van (open) educatieve leermiddelen • Promoten van open standaarden • Innovatieprojecten opzetten in het domein van edtech
Speerpunt 4: Opstart van een kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld	2021 Q4	Gerealiseerd	
Speerpunt 4 Een kennis- en adviescentrum Digisprong ten	2024 Q2	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
dienste van het onderwijs: rapportering over de werking				
Voor alle speerpunten: Resultaten van het MICTIVO-onderzoek zijn beschikbaar	2024 Q1	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal schoolteams dat zal deelnemen aan de trajecten voor ICT-teams uit alle onderwijsniveaus (ikv de bootcamps)	75	2025 Q1		
aantal scholen dat zal intekenen voor de trajecten voor leerkrachtenteams in het basisonderwijs (ikv de 'bootcamps')	104	2025 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	375.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	375.000.000 EUR
Uitvoering VAK	374.999.000 EUR
Uitvoering VEK	231.482.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 318.160.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 56.840.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit aan de Vlaamse Regering van 11 december 2020 en Visienota Digisprong Van Achterstand naar Voorsprong ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde en nota aan de Vlaamse Regering

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 30 april 2021](#) en [besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 in het kader van de Digisprong voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de hbo5-opleiding verpleegkunde](#)

[Advies Raad van State bij dit besluit](#)

[Plan Vlaamse Veerkracht: Kennis- en adviescentrum 'Digisprong' ten dienste van het onderwijsveld en aangepaste digitale leermiddelen. 25/06/2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021](#) en [Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie en protocollen van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 24/06/2021 en Bijlage](#)

[BVR van 3/09/2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie](#)

[BVR van 3/09/2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie. Nota](#)

[BVR van 3/09/2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie. Advies Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 12 november 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan "Van kwetsbaar naar weerbaar" en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan "Van kwetsbaar naar weerbaar" en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging](#)

[Advies van de Raad van State. een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan 'Van kwetsbaar naar weerbaar' en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging'](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 1 juli 2022. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2022 in het kader van de DIGISPRONG voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2022 in het kader van de DIGISPRONG voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2022 in het kader van de DIGISPRONG voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2022 in het kader van de DIGISPRONG voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de hbo5-opleiding Verpleegkunde](#)

[Advies van de Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 september 2022. Overheidsopdracht professionalisering in het kader van Digisprong \(Bootcamps\)](#)

[Bijlage bis2](#)

04. Opleidings- en loopbaanoffensief

VV016 - ACTIVERING-VERHOGEN VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD 80 PROCENT VESOC

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Raad van Bestuur VDAB, werkgevers, sectorfondsen, onderwijspartners (CVO's, Hoger Onderwijs), zorgsector, taalcoachingspartners, ATC, SERV

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We versterken de veerkracht van werknemers, ondernemingen en zelfstandige ondernemers en streven naar maximale en duurzame tewerkstelling. Vermits de arbeidsmarkt vandaag verschillende jobkansen biedt, is het van belang om snel te schakelen, om bestaande vacatures maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden.</p> <p>Dit vereist een VDAB die samen met partners klaarstaat om burgers te ondersteunen in het maken van loopbaankeuzes. Wie zijn werk verliest wordt begeleid naar een nieuwe job, maar evenzeer blijft VDAB inzetten op de activering van o.a. langdurig werkzoekenden, anders-actieven en inburgeraars. Het vereist ook ondernemingen die klaar staan om al deze mensen te ontvangen door breder te rekruteren, in te zetten op vorming en opleiding, op werkplekieren en op een inclusief ondernemingsklimaat.</p> <p>Mensen duurzaam aan het werk houden betekent ook meer dan ooit aandacht besteden aan de gevolgen van corona en de digitale transformatie op de werkvloer. Daarom zetten we in op werkbaar werk (en telewerken) in ondernemingen en organisaties. We versterken ondernemingen en organisaties, ook in de sociale economie, om de transitie te maken met aandacht voor werkbaarheid, wendbaarheid, welzijn en het menselijk potentieel in de organisatie. Via de oproep strategische transformatie en innovatie zullen ondernemingen in de sociale economie worden ondersteund in het conceptualiseren, ontwikkelen en uitrollen van strategische bedrijfstransformaties om optimaal en flexibel te kunnen reageren op marktendensen en samen te werken met de reguliere economie.</p> <p>Tenslotte dragen we zorg voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: niet-beroepsactieven, personen met een migratieachtergrond, personen met een arbeidshandicap of gezondheidsproblemen, mensen met een psychosociale problematiek, ... We ondersteunen hen om hun loopbanen te versterken en werken drempels weg die zij op weg naar (betaald) werk ervaren.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	14.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Sociaal ondernemerschap: oproep innovatiesteun • Sociaal ondernemerschap: oproep opleidingen werknemers • Actieplan zij-instroom in de zorg • Uitbreiding transitiepremie voor werkzoekenden en wijziging van de premie voor ondernemers die de premie aanvragen
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het actieplan Zij-instroom in de Zorg werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van VDAB van 09/06/'21 en wordt uitgerold en geïmplementeerd.</p> <p>Belangrijk voor de zorg is dat de VIA6-akkoorden geland zijn. VDAB volgt de acties rond het verhogen van de zij-instroom verder op en legt de connectie met het bovenstaande actieplan.</p> <p>Voor zowel zorg als onderwijs werd de screening en inschatting van klanten geoptimaliseerd om hen het meest passende traject richting deze knelpuntsectoren/-beroepen aan te bieden.</p> <p>Er werd een communicatiecampagne rond opleidingen in de zorg en onderwijs gelanceerd, net zoals een social media campagne rond onderwijs en bekendmaking van zorgberoepen. Sinds september 2021 wordt ook volop ingezet op meer (geïntegreerde) opleidingen en het bereiken van talent (bv. begeleider kinderopvang). VDAB zet ook steeds meer in op het bereiken van anderstalig talent en mensen met grotere afstand tot arbeidsmarkt.</p> <p>VDAB zoekt connectie met werkgevers en knelpuntvacatures, bijv. door middel van een ondersteuningsaanbod rond taal op de werkvloer.</p> <p>Een versterkte inzet op zij-stroom in het onderwijs wordt gerealiseerd door toeleiding en ondersteuning van werkzoekenden naar de lerarenopleidingen. VDAB erkent in alle provincies verschillende leertrajecten van de lerarenopleidingen aan de hogescholen en universiteiten. Door extra in te zetten op bijkomende erkenning van opleidingen in alle provincies is de instroom van werkzoekenden (met VDAB-ondersteuning) in de lerarenopleidingen sinds 2019 sterk toegenomen. Om de instroom verder te verhogen worden extra mogelijkheden gecreëerd door uitbreiding van het aantal mogelijk te volgen knelpuntvakken, door de erkenning van LIO trajecten voor werkzoekenden, en door erkenning van het voorbereidingsprogramma van de Verkorte Educatieve Master.</p> <p>Wat de oproep 'innovatie en strategische transformatie' betreft, werden 66 van de 83 ingediende en ontvankelijke projecten eind 2021 goedgekeurd en gegund (62 maatwerkbedrijven, 1 maatwerkafdeling, 3 LDE). De projecten gingen van start in januari 2022. Momenteel zijn deze allemaal in uitvoering.</p> <p>Er werd een gesloten oproep 'opleidingen' gelanceerd op 18/10/'21 en afgesloten op 17/11/'21. Daarnaast zijn beide opleidings- en vormingsprogramma's in collectief maatwerk zijn gestart op 1 januari 2022, met een totaalbereik van 123 maatwerkbedrijven. Het gaat hierbij om een drie jaar durend geïntegreerd totaal opleidings- en vormingsprogramma (een voor de beschutte</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>werkplaatsen en een voor de sociale werkplaatsen).</p> <p>Van april 2021 tem. maart 2022 werd de aanvraag voor de transitiepremie goedgekeurd voor 288 - 45 jarige ondernemers. Voor de +45 jarige ondernemers trad deze wijziging wat betreft het bedrag van de premie in vanaf 1 juni 2021. Sinds april 2021 werd de aanvraag voor 139 +45 jarige ondernemers goedgekeurd binnen de oorspronkelijke regeling en voor 100 +45 jarige ondernemers binnen de gewijzigde regeling. De uitbreiding van de doelgroep en de wijziging van het premiebedrag is ondertussen structureel, en een regelgevend traject rond de nieuwe uitbreiding van de doelgroep van de transitiepremie is gerealiseerd.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Sociaal ondernemerschap: opleidingen werknemers en innovatie-oproep	2021 Q4	Gerealiseerd	2 oproepen: Oproep 'innovatie en strategische transformatie' - projecten goedgekeurd en gegund eind 2021 (momenteel in uitvoering) Oproep 'opleidings- en vormingsprogramma' – projecten goedgekeurd en gegund eind 2021 (zullen 3 jaar duren)	
Uitbreiding transitiepremie naar doelgroepen	2022 Q1	Gerealiseerd		
(Zij-)instroom in de zorgsector en het onderwijs: goedkeuring actieplan (VDAB)	2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
<p>Het aantal ondernemingen dat in een van de volgende categorieën steun genoten heeft in het kader van een maatregel: i) kmo's die met een competentiecheck zijn bereikt; ii) ondernemingen in de sociale economie die ondersteuning in hun innovatieve strategische transformatie ondersteuning hebben gekregen via de "open innovatieoproep strategische investeringssteun" en het "toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie"; iii) ondernemingen die een transitiepad aanvatten via de transitieproefopstellingen of transitiepunten (RRF)</p> <p>Categorieën i) en iii) worden opgenomen in project VV018</p>	600	2024 Q4	66	11 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Opgelet, de RRF-indicator wordt op een striktere manier berekend en pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	14.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	14.000.000 EUR
Uitvoering VAK	14.000.000 EUR
Uitvoering VEK	7.742.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 12.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen - nota</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen - advies</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 1 oktober 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings-en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge COVID-19</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings-en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge COVID-19 – definitieve goedkeuring</p> <p>Subsidieoproep 2021: open innovatie en strategische transformatie in de sociale economie. Bijlage</p> <p>Advies SERV. Strategische investerings-en innovatiesteun aan sociale economie ondernemingen ingevolge COVID-19</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Advies van de Raad van State. Een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ‘tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings-en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge COVID-19’](#)

[Advies European Commission. Strategic investment and innovation support to social economy companies in the context of the COVID-19 outbreak](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19- nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19 – definitieve goedkeuring](#)

[Handleiding subsidieoproep 2021 : opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge Covid-19](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV017 - Extra aandacht meest kwetsbaren](#)

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

[VV018 - Opleidingsoffensief arbeidsmarkt](#)

VV017 - EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Leerlingen en scholieren in het leerplichtonderwijs, studenten in het Hoger onderwijs, personeel in het onderwijs (leerplicht en HO), lerarenopleidingen, Centra Voor Leerlingenbegeleiding.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De visienota "van kwetsbaar naar weerbaar – Plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs" vormt het vierde luik van de onderwijsplannen in het kader van "Vlaamse veerkracht". Samen met de acties in de Digisprong, de Edusprong én het Voorsprongfonds wordt ervoor gezorgd dat de kwetsbare leerlingen mee deze sprong voorwaarts maken.</p> <p>Dit plan maakt het volledige Vlaamse onderwijs in twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) toekomstbestendig voor alle leerlingen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren.</p> <p>Om dit te realiseren wordt onder meer ingezet op het terugdringen van de leerachterstand die ten gevolge van de crisis bij de meest kwetsbare leerlingen nog opgelopen is. Daarnaast zetten we in op de mentale gezondheid en het welbevinden van alle lerenden, want de voorbije periode bracht de nodige angst en onzekerheid met zich mee omdat voor velen hun veilige haven wegviel. Deze sprong voorwaarts is enkel mogelijk als de leraren, lerarenopleiders en schoolleiders ook ondersteund en versterkt worden.</p> <p>We weten immers dat sterke leraren en schoolleiders het verschil maken voor weerbare leerlingen.</p> <p>Concreet vertalen we dit naar drie speerpunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Van achterstand naar voorsprong: aanpakken leerachterstand. 2. Bevorderen van het mentaal welzijn van leerlingen, scholieren en studenten 3. Versterking van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders <p>De mijlpalen verwijzen naar acties die gelinkt zijn aan de drie speerpunten.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	90.000.000 EUR
Output	<p>Speerpunt 1: aanpakken leerachterstand door onder meer het organiseren van zomerscholen voor ongeveer 11.000 leerlingen en scholieren en het zorgen voor een ICT-versterking in het buitengewoon onderwijs (OV1 en OV2), het DBSO (arbeidsmarktgerichte finaliteit) en de Leertijd die kwetsbare leerlingen ten goede komt.</p> <p>Speerpunt 2: een integrale aanpak voorzien voor de verbetering van het mentaal welbevinden van alle</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	<p>leerlingen via een investering in de CLB en het zorgen voor een digitaal platform voor een vlotte toegang tot de CLB, het oprichten van een digitale tool voor welbevinden van scholieren (te gebruiken door de scholen), het duurzaam verbeteren van studentenwelzijn door het uitrollen van een breed beleid in het Hoger Onderwijs</p> <p>Speerpunt 3: specifieke focus op het versterken van lerarenopleidingen via pilootprojecten en het professionaliseren van schoolleiders via specifieke trajecten</p>
Outcome	Deze visienota wordt uitgerold met het oog op het versterken en veerkrachtiger maken van verschillende componenten uit het onderwijsveld (scholen, CLB, ICT-infrastructuur, mentale weerbaarheid,...) en van diverse doelgroepen (studenten, lerarenopleiders, leraren, schoolteams, leerlingen,...)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De acties die vallen onder de globale visienota 'van kwetsbaar naar wendbaar' (VV017) werden geclusterd in drie speerpunten. Deze speerpunten blijven de belangrijkste focus van dit project. Onder speerpunt 1 (terugdringen van de leerachterstand) springen de zomerscholen in het oog. Op 3 juni 2022 werd het decreet voor de organisatie van zomerscholen gestemd in het Vlaams Parlement. Zo werd ervoor gezorgd dat er jaarlijks zomerscholen kunnen georganiseerd worden volgens vaste modaliteiten hetgeen rechtszekerheid biedt aan de organisatoren (lokale besturen en scholen). De voorbije zomer namen zo'n 8500 leerlingen deel aan een zomerschool, verspreid over Vlaanderen.</p> <p>Binnen datzelfde speerpunt werd ook het actieplan Virtual en Extended Reality (XR) verder uitgerold. Dit actieplan bevat 5 deelacties die als mijlpalen werden opgenomen. Hier is vooruitgang geboekt in quasi alle deelacties.</p> <p>In november 2022 besliste de Vlaamse Regering over de toekenning van de projecten binnen de XR Academy. De XR uitleendienst wordt verder voorbereid en het onderzoek werd gegund. Op 1 september 2022 gingen 12 projecten van start in het kader van XR Innovet voor het technisch en arbeidsmarktgericht onderwijs. Doelstelling is het stimuleren van de ontwikkeling van XR-applicaties en software en het testen daarvan vanuit concrete samenwerkingsverbanden. Het gaat hierbij zowel om scholen die nog beginnen met XR als scholen die al gevorderd zijn.</p> <p>Wat betreft mentale gezondheid en welbevinden van alle lerenden (speerpunt 2) werd een subsidie toegekend voor de ontwikkeling en verspreiding van een digitale tool die het welbevinden van leerlingen in kaart zal brengen. Er zal ook een digitaal CLB-platform worden ontwikkeld zodat de CLB-sector leerlingen en ouders laagdrempelig kan toeleiden naar het CLB. Via dat platform kan men ook een online begeleidingsaanbod organiseren, relevante informatie ter beschikking stellen en inspraak en participatiemogelijkheden bieden aan leerlingen en hun ouders. De app Appwell rond mentaal welbevinden van leerlingen wordt doorontwikkeld en verspreid. Wat betreft de duurzame versterking van de hogeronderwijsinstellingen op het vlak van het beleid rond mentaal welzijn van studenten, worden de voorziene acties (Moodspace, lerend netwerk en poortwachterstrainingen) verder uitgerold.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Concretisering onder speerpunt 2 (bevorderen mentaal welzijn van studenten) Addendum SIHO in verband met studentenwelzijn	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uitrol acties SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs): -Moodspace uitbouwen en verderzetten (een e-Health platform dat een samenwerking is tussen de Vlaamse overheid, SIHO, VVS en de hoger onderwijsinstellingen). Het is gericht op studenten maar ook op docenten, studentenbegeleiders, zorgpersoneel van de instellingen) -lerend netwerk verderzetten	2023 Q4	Op schema	de acties worden verder uitgerold en zitten op schema
Subsidie voor poortwachterstrainingen in het hoger onderwijs	2023 Q4	Op schema	In de trainingen worden studenten en personeelsleden opgeleid om signalen van mentale moeilijkheden te herkennen bij studenten, om ze vervolgens door te verwijzen naar de juiste hulp.
Tussentijds rapport professionaliseringsprojecten. Concretisering onder speerpunt 3 (versterken van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders) = Professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs, in het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'	2022 Q2	Gerealiseerd	
Concretisering onder speerpunt 3 = Uitvoering van 12 pilootprojecten ter versterking van de lerarenopleidingen, in nauwe relatie met actoren die instaan voor het verdere professionele continuüm van de leraar voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023	2023 Q3	Op schema	
Eindrapport professionaliseringsprojecten. Concretisering onder speerpunt 3 (versterken van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders) = Professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs, in het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'	2023 Q3	Op schema	
Concretisering speerpunt 1 = Toekennen van extra ICT-middelen (2021) voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair	2024 Q1	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
onderwijs en de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (SYNTRA)			
Concretisering speerpunt 2= Versterking van de CLB's ter ondersteuning van scholen en leerlingen	2023 Q3	Op schema	
Concretisering speerpunt 2= Ter beschikking stellen van een sjabloon dat het mogelijk moet maken dat CLB's efficiënt kunnen rapporteren over de aanwending van gekleurde middelen	2022 Q3	Gerealiseerd	Sjabloon werd ingevuld door de CLB en info werd aangeleverd
Ontwikkeling digitaal CLB platform	2023 Q4	Op schema	Subsidie van 500.000 euro voor de ontwikkeling van een digitaal CLB platform voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2023. Met het digitaal CLB platform wil de CLB-sector leerlingen en ouders laagdrempelig toeleiden naar het CLB, een online begeleidingsaanbod organiseren, relevante informatie ter beschikking stellen en inspraak en participatiemogelijkheden bieden aan leerlingen en hun ouders.
Concretisering onder speerpunt 1 (wegwerken leerachterstand) Administratieve en financiële afhandeling van de Vlaamse zomerscholen die in de zomer van 2021 werden georganiseerd door lokale besturen en scholen om de leerachterstand weg te werken en een goede start van het schooljaar te bewerkstelligen.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Organisatie zomerscholen 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	Ook in 2022 werden er zomerscholen georganiseerd voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren met een zinvol onderwijs- en vrijetijdsgedeelte. Er namen 8556 leerlingen aan deel. In juni 2022 werd een decreet over de organisatie van de zomerscholen gestemd in het Vlaams parlement.
ACTIEPLAN XR: Opzetten XR Academy (concretisering speerpunt 1. wegwerken leerachterstand. Virtual Reality in TSO en BSO)	2022 Q3	Gerealiseerd	Nascholing van onderwijzend personeel dat gebruik wil maken van het materiaal van de uitleendienst. Toewijzing aan VIVES hogeschool is gebeurd in november 2022. Project loopt tot 31/12/2024
ACTIEPLAN XR: Lerend netwerk XR (concretisering speerpunt 1. wegwerken	2024 Q4	Op schema	Uitbreiding lerend netwerk XR en expertondersteuning van het XR actieplan

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
leerachterstand. 1.3.3. Virtual Reality in TSO en BSO). nota goedgekeurd VR 1/4/2022			(Thomas More Hogeschool). Project loopt van 1/4/2022 tot 31/12/2024
ACTIEPLAN XR: Innovet XR (concretisering speerpunt 1. wegwerken leerachterstand. 1.3.3. Virtual Reality in TSO en BSO). oproep goedgekeurd door VR 22/4/2022, oproep verschenen 25/04/2022	2024 Q4	Op schema	8 projecten (tot 31/08/2023) en 4 projecten (tot 31/08/2024) werden na een oproep toegewezen.
ACTIEPLAN XR: Uitleendienst XR-materiaal. (concretisering speerpunt 1, 1.3.3. Virtual Reality). Eerste nota hiervoor goedgekeurd VR 1/4/2022	2024 Q4	Op schema	Het opzetten van een uitleendienst met XR-materiaal en software voor alle Vlaamse BSO- en TSO-scholen door de Regionale Technologische Centra.
ACTIEPLAN XR: Onderzoek XR. Dit is een concretisering van speerpunt 1 (leerachterstand wegwerken, 1.3.3. Virtual Reality in TSO en BSO).	2022 Q4	Gerealiseerd	Binnen dit actieplan XR zijn er 5 deelprojecten, die hier als 5 mijlpalen worden aangeduid. De O&O opdracht "XR in het Vlaamse beroepsgericht en technisch onderwijs: evaluatie van praktijken en acties in het XR plan" werd gegund.
Ondersteuning en doorontwikkeling van Appwel, een app van Hogeschool PXL die het welbevinden van leerlingen meet.	2023 Q3	Op schema	<p>Leerlingen krijgen driemaal per schooljaar een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst aangeboden op basis waarvan ze een score krijgen omtrent hun mentaal welbevinden binnen de schoolcontext. Het welbevinden wordt gemeten aan de hand van vijf domeinen: tevredenheid, betrokkenheid in de les, academisch zelfconcept, pedagogisch klimaat en sociale relaties. Leerlingenbegeleiders en zorgcoördinatoren hebben toegang tot de resultaten van de leerlingen conform de GDPR-regelgeving. De resultaten zijn zowel op individueel niveau, klasniveau als schoolniveau beschikbaar. Naast de gesloten vragen hebben leerlingen ook de mogelijkheid om zelf nog opmerkingen mee te geven en kunnen ze zichzelf een score geven over hun mentaal welbevinden. Met de ondersteuning in het kader van Vlaamse Veerkracht wordt mogelijk gemaakt dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appwel kan worden uitgebreid tot nog meer scholen van het secundair onderwijs en dat het kan worden verbreed naar het basisonderwijs. • De ondersteuning voor PXL Appwel

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			bedraagt 475.200 euro. Het project loopt van 1/9/2022 tot 30/06/2024.	
Organisatie zomerscholen 2023	2023 Q4	Nog niet gestart	Ook in 2023 worden er zomerscholen georganiseerd waarbij de modaliteiten bepaald zijn in het decreet over de organisatie van de zomerscholen.	
Oprichting "Leerpunt"	2022 Q4	Gerealiseerd	Oprichting en subsidie private stichting "Leerpunt" voor onder andere de versterking van de brede basiszorg en verhoogde zorg in scholen voor gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs	
Leerpunt: inhoudelijke en financiële opvolging recurrente taken (Werkingsbudget: 2.605.000 euro)	2024 Q3	Op schema	Eind juni 2024 loopt de subsidie af; eind juli 2024 wordt het inhoudelijk eindverslag opgeleverd. Eind augustus 2024 wordt het financieel verslag verwacht.	
Leerpunt: focus op brede basiszorg en verhoogde zorg- inhoudelijke en financieel verslag (budget 6.000.000 euro)	2026 Q4	Op schema	Oplevering inhoudelijk en financieel eindverslag: 20 november 2026	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal leerlingen die aan gerealiseerde zomerscholen deelnemen	11000	2021 Q4	7.720	70 %
Aantal leerlingen dat deelneemt aan de zomerschool 2022	11000	2022 Q4	8.556	78 %
Projecten ter versterking van de lerarenopleiding: 12 projecten	12	2023 Q3		
Projecten professionalisering schoolleiderschap: 10 projecten	10	2023 Q3		
Aantal leerlingen dat deelneemt aan een zomerschool in 2023	11000	2023 Q4		
XR Innovet projectoproep: 12 projecten nemen deel	12	2024 Q3		
Uitleendienst XR: geschat wordt dat een derde van de scholen arbeidsmarktgericht en technisch onderwijs deelneemt en materiaal uitleent (ongeveer 210 scholen)	210	2024 Q4		
Lerend netwerk XR: 100 scholen nemen deel aan een inspiratiesessie	100	2024 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Lerend netwerk XR: 25 scholen nemen deel aan een intensieve 1-1 begeleiding	25	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	90.000.000 EUR
Uitvoering VAK	89.954.000 EUR
Uitvoering VEK	63.847.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 90.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 4 december 2020 - goedkeuring addendum (t.b.v. 801 KEUR) aan het convenant met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) i.v.m. mentaal welzijn studenten
Mededeling aan de Vlaamse Regering 15 januari 2021. Projectoproep voor de subsidiëring van projecten ter verbetering van schoolleiderschap
Mededeling aan de Vlaamse Regering 29 januari 2021. Pilotprojecten lerarenopleiding en Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Visienota Van kwetsbaar naar weerbaar—deel 1 beter leren, beter voelen: plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het relanceplan Vlaamse veerkracht en bijlage BIS
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging en bijhorend besluit
Nota aan de Vlaamse Regering van 17 september 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot wijziging van

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van extra ICT-middelen 2021 voor de scholen in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2 ,de centra voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en de centra voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, tot toekenning van extra middelen aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, in het kader van de uitvoering van het plan “Van kwetsbaar naar weerbaar” en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de verhoging van het aantal uur kinderverzorging](#)

[VR 2021 1709 VV DOC.0140/3. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 11 februari 2022. Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen](#)

[Voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen](#)

[Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen. Samenvatting](#)

[Advies van de VLOR over het voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 1 april 2022. Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van zomerscholen](#)

[Ontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen](#)

[Ontwerp van decreet betreffende de organisaties van zomerscholen. Samenvatting](#)

[Advies van de Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 22 april 2022. Oproepen InnoVET XR 2022-2024 in uitvoering van het XR-actieplan](#)

[Projectoproep INNOVETXR. Handleiding en richtlijnen. Bijlage](#)

[Indienen van een projectvoorstel in het kader van InnoVETXR – deeloproep 1InnoVET NEW. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3 juni 2022. Oproep XR Academy 2022-2024 en algemene opvolging in uitvoering van het XR-actieplan](#)

[Projectoproep XR Academy. Handleiding en richtlijnen. Bijlage](#)

[Indienen van een projectvoorstel in het kader van XR Academy–2022-2024](#)

[VR van 8 juli 2022: 475.000 euro subsidie Hogeschool PXL voor Appwel, een digitale tool voor welbevinden in scholen](#)

[VR van 15/07/2022. Subsidie poortwachtertrainingen studentenwelzijn juli 2022 - december 2023](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

VV018 - OPLEIDINGSOFFENSIEF ARBEIDSMARKT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Vlaams Partnerschap Duaal Leren, SERV, VLOR, Klankbordgroep sectoren, RvB VDAB, UNIZO/VOKA, transitiepunten, Federgon, Werkplekarchitecten, begeleidingspartners, sectorfondsen, private NT2 opleidingspartners, AGII, sociale partners, Vlaams Partnerschap Levenslang Leren

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Om zowel werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen als ondernemingen en zelfstandig ondernemers meer wendbaar en beter inzetbaar te maken, zetten we versneld in op de omslag naar levenslang leren. We zien de coronacrisis als een opportuniteit voor meer structurele heroriëntering en om een doorbraak te realiseren in het leren tijdens de loopbaan.</p> <p>We nemen initiatieven om competenties op peil te houden en om nieuwe competenties te verwerven. We faciliteren transitie over sectoren en ondernemingen heen. We maken de competenties van werknemers zichtbaar en zorgen ervoor dat ze zich kunnen her- of bijscholen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verruimen.</p> <p>We streven daarbij ook naar een arbeidsmarkt waarin vlottere werk naar werk transitie en meer arbeidsmobiliteit binnen een onderneming, tussen ondernemingen en tussen sectoren mogelijk worden.</p> <p>We doen dit alles vanuit een lange termijnvisie op levenslang leren en binnen een breed partnerschap met onderwijs- en opleidingsverstrekkers gaande van CVO's, CBE's, hogescholen, universiteiten, VDAB, Syntra's, sectoren tot private opleidingsverstrekkers en ondernemingen, ...</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	131.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeidsmarktgerichte digitale cursussen met een focus op technische en/of soft skills. • Het contacteren door VDAB van alle personen die sinds 1 januari 2021 tijdelijk werkloos zijn, met een aanbod voor opleiding, stage, vrijwilligerswerk. • Uitwerken competentiecheck, open innovatieoproep strategische investeringssteun, toekomstgericht

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie, uitwerken van transitiepaden en transitiepunten.
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De actie rond de eenmalige verruiming en verhoging van de stagebonus werd gerealiseerd: Het definitief resultaat voor de aanvullende stagebonus schooljaar 2020-2021 is dat er finaal 3.308 aanvullende stagebonussen betaald werden, goed voor 3.308.000 euro. Het voorlopig resultaat voor schooljaar 2021-2022 is 1.138 verruimde stagebonussen, goed voor € 569.000.</p> <p>De maatregel werd intussen bijgestuurd naar een verruimde stagebonus en verlengd tot en met schooljaar 2022-2023. Zie ook: https://www.vlaanderen.be/stagebonus/aanvullende-en-verruimde-stagebonus</p> <p>Het online opleidingsaanbod van VDAB blijft populair, al noteren we het laatste jaar toch een dalende trend. In 2021 telde VDAB 213.433 inschrijvingen voor online opleidingen (een stijging t.o.v. 2020). In de eerste 6 maanden van 2022 (jan - juni) telde VDAB 77.758 inschrijvingen voor online opleidingen (dalende trend t.o.v. 2021). Dit is onder meer te verklaren doordat de fysieke opleidingen na de covidperiode ondertussen opnieuw allemaal terug zijn opgestart. Samengeteld zitten we nu aan 291.191 inschrijvingen voor online opleidingen. Op vlak van face-to-face opleidingen werd vooral geïnvesteerd in oriënterende trajecten en werd een nieuwe tender rijbewijs B opgestart, waarbij 1500 trajecten worden voorzien (looptijd van september 2021 tot eind 2023). In 2022 werd verder geïnvesteerd in oriënterende tools en het mobiele aanbod van VDAB. Het totaal aantal gestarte face-to-face opleidingen in Q2 2022 bedroeg 6.100 (-14% t.o.v. Q2 2021). Het aandeel te begeleiden werkzoekenden die bezig zijn met competentieversterking ligt in Q2 2022 tussen 10% en 14% en toont gelijkaardige percentages als Q2 2021 (tussen 11% en 13%).</p> <p>VDAB werkte begin 2021 een aanpak uit met als doel alle tijdelijk werklozen te benaderen met een passend aanbod. Hoe intensiever de tijdelijke werkloosheid, hoe intensiever en persoonlijker het aanbod van VDAB. Sinds oktober 2021 werd de communicatie-aanpak naar tijdelijk werklozen bijgestuurd. Er wordt sindsdien een communicatie verstuurd naar alle tijdelijk werklozen, bestaande uit een reeks e-mails die gepersonaliseerd worden o.b.v. de interesse die de tijdelijk werkloze toont. Voor tijdelijk werklozen die zich bij VDAB inschrijven doet VDAB bovendien een vrijblijvend dienstverleningsaanbod BWRW (begeleiding werknemers met recente werkervaring).</p> <p>Belangrijk is ook dat het volledige opleidingsaanbod van VDAB en partners nog steeds kosteloos is opengesteld voor tijdelijk werklozen. Sinds begin 2021 werden meer dan 99% van de tijdelijk werklozen bereikt via mailcommunicatie van VDAB. Daarnaast werden tussen de start van de coronacrisis (maart 2020) en eind oktober 2022 7% van de tijdelijk werklozen bereikt met een vorm van competentieversterking. Voor de intensief tijdelijk werklozen (minstens 10 dagen tijdelijk werkloos in de laatste 3 maanden) bedroeg dit aandeel 11%. Beide percentages gaan nog steeds in stijgende lijn. Om de behoeften en verwachtingen van tijdelijk werklozen en de effecten van de acties van VDAB in kaart te brengen, lanceerde VDAB in 2021 ook twee bevragingen van de groep van tijdelijk werklozen. Uit het laatste rapport blijkt onder meer dat 42% van de intensief tijdelijk werklozen een opleiding, vrijwilligerswerk of een andere tijdelijke job deed tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.</p> <p>Het tijdelijk gezamenlijk besluitrecht VOV is lopende. Voor schooljaar 2021-2022 betroffen 43.530 (46%)</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

van de ontvangen terugbetalingsaanvragen voor VOV een opleiding gevolgd op voorstel van de werkgever. Uitgedrukt in unieke werknemers zien we dat 27.229 (48%) werknemers ingaan op het voorstel van de werkgever om een opleiding te volgen. De maatregel werd verlengd in het kader van het Vlaams VESOC Werkgelegenheidsakkoord "Iedereen nodig, iedereen mee" voor de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024.

Het project rond de competentiechecks, -coaching, en -versterking voor werkenden is gestart:

- C1: Competentiechecks voor werkenden: De competentiecheck voor werkenden bestaat uit een digitale tool die eind 2022 werd opgeleverd. Het flankerend uitdiepend adviesgesprek werd gewijzigd naar de opzet van een brede communicatiecampagne. Deze brede communicatiecampagne zal vanaf 2023 gestart worden.

De campagne loopt op twee tracks:

- een campagne naar het brede publiek van werkenden.
- een stakeholdercampagne gericht op organisaties die de meest kwetsbare doelgroepen (werknemers) bereiken. Deze campagne heeft als doel om deze organisaties aan te moedigen gebruik te maken van de tool binnen de begeleiding van deze doelgroepen of deze doelgroepen in contact te brengen met de tool.

- C2: Competentiechecks ondernemingen: De overheidsopdracht en de aanstelling van een tijdelijke projectcoördinator werden goedgekeurd door VR op 22/04/2022. De overheidsopdracht (MPMO) werkt in tweede fasen. De eerste fase met betrekking tot de selectiebeslissing werd afgerond begin juli 2022. Het bestek werd gelanceerd voor indiening van de offertes eind september. Ook de tweede fase werd ondertussen finaal afgerond. Begin 2023 zullen 5 dienstverleners starten met het bereiken van minimaal 500 KMO's. Bij deze KMO's is het de bedoeling om het competentiedenken binnen te brengen en daarmee strategisch verder aan de slag te gaan. Naast de overheidsopdracht voor het aanstellen van de dienstverleners werd ook een overheidsopdracht voorbereid in het kader van de evaluatieopdracht bovenop de competentiechecks. We hebben de intentie om deze evaluatieopdracht te gunnen in de loop van de maand januari 2023. De intentie is om minimaal 500 KMO's met de competentiecheck voor ondernemingen te bereiken.

- C3: Transitie naar werk: Sinds april 2021 werken we via het pilootproject CareerFlow aan negen concrete bedrijfscases, met als doel om via een proactieve benadering interne en externe mobiliteit tussen werkgevers te stimuleren. Hierbij werden reeds 21 bedrijven betrokken. De inzichten en ervaringen uit deze experimentele cases werden en worden meegenomen naar de brede oproep voor transitiepunten. Deze werd in het najaar van 2022 gelanceerd. Momenteel loopt de evaluatie van de ingediende projecten. In februari 2023 wordt officieel van start gegaan met de gegunde projecten.

De acties rond de versterking van werkpleklers zijn lopende. Sinds begin 2021 telt individuele beroepsopleiding (IBO) mee als een positief uitstroomresultaat waardoor de drempel verlaagd wordt voor partners om in te zetten op deze vorm van werkpleklers. Verder werd een communicatiecampagne gelanceerd gericht op de bekendmaking van IBO bij werkgevers. Daarnaast operationaliseerde VDAB in 2022 de werkvorm 'GLOW' (groeien en leren op de werkvloer). Deze nieuwe vorm komt in de plaats en zal de sterktes combineren van de begeleidingsvormen TWE (traject tijdelijke werkervaring) en GOB (gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst). De opstart van deze werkvorm is voorzien begin 2023.

In 2022 werden ook de voorbereidingen getroffen om in 2023 de proefprojecten op te starten m.b.t het concept van "Leerjobs", een leertraject via werkpleklers en EVC voor ongekwalificeerde jongeren, werkzoekenden en werknemers.

De uitrol van de tenders ter versterking van de begeleidingscapaciteit is gerealiseerd. De uitrol is gefaseerd opgestart sinds begin 2021: TIBB4, SIF en TAL die al enkele jaren liepen zijn sinds begin 2021 uitgebreid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>en BWRW (begeleiding werknemers met recente werkervaring) en het voucherproject zijn sinds maart 2021 effectief gestart. De nieuwe tender IB+ (integrale begeleiding plus) is opgestart in december 2021.</p> <p>De acties in het kader van het talenplan, die de uitstroom naar werk van anderstalige klanten moeten bevorderen, zijn in uitvoering. Ze worden beschreven in het actieplan "Vijf voor Taal":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het inschatten van het taalniveau van anderstalige klanten wordt geoptimaliseerd. Uitrol wordt verwacht in '23. Intussen werd een toolbox taalscreening ontwikkeld en ook het ondersteuningsaanbod t.a.v. VDAB-bemiddelaars om het taalniveau te bepalen, werd geoptimaliseerd. - Ook zet VDAB samen met partners verder in op het aanbod (geïntegreerde) talige competentieversterking in diverse vormen. Het aanbod taalcoaching op de werkvloer werd verder op punt gezet en bekend gemaakt t.a.v. werkgevers. - VDAB werkte aan een duidelijke en proactieve communicatie t.a.v. werkgevers, bv. via een vernieuwde landingspagina. - Digitale toepassingen, zoals (web)apps rond uitspraakbegeleiding, beeldwoordenboeken en online leermodules, werden uitgewerkt om de taalverwerving te ondersteunen. - De realisaties van de verschillende pijlers van het talenplan werden opgenomen in het rapport 'Het talenplan in cijfers': https://www.vdab.be/sites/default/files/media/files/NT2_Cijferrapport_Het%20talenplan%20in%20cijfers_A5_2022.06%20interactief.pdf <p>De goedgekeurde projecten (31 ondernemingen) ikv. de oproep telewerken – digitale vaardigheden zijn van start gegaan op 01/09/'21 en eindigen op 30/11/'22. Op uitdrukkelijke aanvraag en mits motivering van de promotor kan men omwille van corona een verlenging bekomen van 3 maanden. Projecten eindigen uiterlijk op 28/02/2023. In de loop van april 2022 kon men onder voorwaarden nieuwe opleidingen toevoegen aan het opleidingsplan, dit om tegemoet te komen aan gewijzigde opleidingsnoden binnen de organisatie.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Naar duurzaam telewerken - digitale vaardigheden: De projecten zijn gelanceerd.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Versterking begeleidingscapaciteit: De nieuwe begeleidingstenders BWRW (begeleiding voor werknemers met recente werkervaring) en IB+ (Integrale Begeleiding Plus) zijn operationeel. (VDAB)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Talenplan: Het Talenplan werd uitgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VDAB. (VDAB)	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Enmalige verruiming en verhoging van de stagebonus: Alle vergoedingen zijn betaald.	2022 Q1	Gerealiseerd		
Gericht en breed opleidingsaanbod voor tijdelijk werklozen: Een communicatie-aanpak naar tijdelijk werklozen werd uitgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VDAB. (VDAB)	2022 Q4	Gerealiseerd		
Competentiechecks voor werkenden (C1): De digitale tool is opgeleverd.	2022 Q4	Gerealiseerd	Scope van de competentiechecks wordt aangepast. In de vernieuwde scope vallen de adviesgesprekken weg. Daarom werd de mijlpaal aangepast.	
Competentiechecks voor ondernemingen (C2): De overheidsopdracht is gegund.	2022 Q4	Gerealiseerd		
Transities naar werk (C3): De subsidie-oproep transitiepunten is gelanceerd.	2022 Q4	Gerealiseerd	De overheidsopdracht is een subsidie-oproep geworden. Daarom werd de mijlpaal aangepast.	
Ruim en toegankelijk opleidingsaanbod: We realiseren een stijging in het aantal inschrijvingen voor online opleidingen. (VDAB)	2022 Q4	Gerealiseerd		
Versterking werkplekleren: De nieuwe werkplekleervorm GLOW (Groeien en Leren op de Werkvloer) is operationeel. (VDAB)	2023 Q1	Op schema		
Tijdelijk gezamenlijk besluitrecht VOV: Alle vergoedingen zijn betaald.	2023 Q2	Op schema		
Steun voor opleidingsverlof en onlineopleidingsaanbod in Vlaanderen (RRF)	2022 Q4	Gerealiseerd		
Ondersteuning van tijdelijk werklozen in Vlaanderen (RRF)	2022 Q4	Gerealiseerd		
Steun aan ondernemingen in Vlaanderen via competentiechecks, transitiepunten en oproepen tot het indienen van projecten (RRF)	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uitbetaalde aanvullende stagebonussen	6000	2021 Q4	3.308	55 %
Aandeel tijdelijk werklozen dat ingaat op opleidingsaanbod VDAB (in procent)	Stijging tov. maart 2020 tem. februari 2021 (3,4%)	2021 Q4	7	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Alle personen die sinds 1 januari 2021 tijdelijk werkloos zijn, worden door VDAB gecontacteerd met een aanbod (opleiding, stage, vrijwilligerswerk). (RRF)	100%	2022 Q4	99	99 %
Aantal nieuw opgestarte trajecten in de nieuwe begeleidingstender IB+ Opgelet: de meest recente cijfers zijn van september 2022.	3930	2022 Q4	1.931	49,13 %
Het aantal personen dat sinds 2021 gebruik gemaakt heeft van hun recht op opleidingsverlof of hebben zich ingeschreven voor een onlineopleidingsaanbod, inclusief arbeidsmarktgerichte digitale cursussen met een focus op technische en/of soft skills. (RRF) Opgelet, in deze rapportering geven we het cijfer weer zoals werd berekend in het kader van RRF, daarom betreft het de aantallen tot juni 2022. De cijfers t/m december 2022 zullen pas beschikbaar zijn half februari 2023. Er waren 291.191 inschrijvingen voor online opleidingen (cijfer tot juni 2022)	307.500	2022 Q4	343.567	100 %
Het aantal ondernemingen dat in een van de volgende categorieën steun heeft genoten in het kader van de maatregel: i) kmo's die met een competentiecheck zijn bereikt; ii) ondernemingen in de sociale economie die ondersteuning in hun innovatieve strategische transformatie ondersteuning hebben gekregen via de "open innovatieoproep strategische investeringssteun" en het "toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie"; iii) ondernemingen die een transitiepad aanvatten via de transitieproefopstellingen of transitiepunten. (RRF) Categorie ii) wordt opgenomen in project VV016. Opgelet, de RRF-indicator wordt op een striktere manier berekend en pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.	600	2024 Q4	66	11 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	122.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	131.000.000 EUR
Uitvoering VAK	65.306.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	53.858.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 63.100.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 57.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 9.900.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING	
Besluit van de Vlaamse Regering - tijdelijk experiment gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams opleidingsverlof - nota	
Besluit van de Vlaamse Regering - tijdelijk experiment gemeenschappelijk initiatiefrecht Vlaams opleidingsverlof - BVR	
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020 -2021	
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020-2021	
Nota VR 09/07 : Alle Hens aan Dek - Acties VDAB binnen de prioriteit 'opleiding- en loopbaanoffensief.	
Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023	
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023	
Nota aan de Vlaamse Regering van 11 maart 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023	
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023	
Advies van het Vlaams Partnerschap Duaal Lereren	
Advies van de VLOR over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor 2021-2022 en 2022-2023	
Advies van de SERV over de verruimde stagebonus schooljaren 2021-2022 en 2022-2023	
Advies van de Raad van State van 25 februari 2022	

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021–2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 16 september 2022. Transitiepunten in Vlaanderen](#)

[Advies van de SERV. Transitiepunten](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022. Actieplan E-leren in het kader van Vlaamse Veerkracht \(VV128 – Digitale Vaardigheden\)-Digitaliseringsprojecten VDAB en Departement Werk en Sociale Economie in het kader van AHAD relance–budgetverschuiving VV128 naar VV018–Opleidingsoffensief arbeidsmarkt](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Ontwerp MB competentiechecks voor werkenden](#)

[Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”](#)

[Alle hens aan dek. Bijlage](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

[VV016 - Activering-verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC](#)

VV019 - VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen - Departement Onderwijs en Vorming
Belanghebbenden	Cursisten, personeelsleden en onderwijsinstellingen van het volwassenenonderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	04. Opleidings- en loopbaanoffensief
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het Vlaams volwassenenonderwijs is een belangrijke partner voor een samenleving die opstaat uit de crisis. De centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie zijn een sterke schakel binnen een breder veld van vorming, opleiding, werk en sociale ontplooiing. Er wordt een groot offensief gelanceerd op vlak van opleiding, zowel voor werkzoekenden, als voor tijdelijk werklozen, als voor inactieven, als voor mensen die een job hebben maar zich wensen (of genoodzaakt zien) te heroriënteren. De ambitie van dit plan om mensen zo snel mogelijk in staat te stellen om toekomstige jobkansen te grijpen, past volledig binnen de ambities van het project Versterken Levenslang Blijven Leren dat zich echter ook tot andere doelgroepen dan de werkenden en werkzoekenden richt.</p> <p>Het project Versterken Levenslang Blijven Leren wil het volwassenenonderwijs een boost geven om meer dan ooit de speler te worden die de sociale mobiliteit van mensen faciliteert, via omscholing, bijscholing en kwalificering. We mikken daarom op een grotere naamsbekendheid, een toeleiding bij het grote publiek en een sterke verankering in de regionale context. Een vernieuwing en optimalisatie van het studieaanbod en de daaraan gekoppelde leermethodes moeten het volwassenenonderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte focus en een 21ste eeuws karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en duurzame verankering staan hierin voorop. Een versterking van de noodzakelijke digitale infrastructuur en methodiek moeten bijdragen tot het maximaal realiseren van de beoogde doelstellingen. Om deze ambitie waar te maken richten we ons op vier inhoudelijke speerpunten waaraan 13 actielijnen worden gekoppeld. De vier speerpunten zijn (1) het volwassenenonderwijs vervult een belangrijke rol in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren, (2) het versterken van arbeidsmarktchansen via om- en bijscholen, (3) de versterking van digitale competenties en (4) het gericht inzetten op kwalificatie.</p> <p>Het volwassenenonderwijs wil een belangrijke rol vervullen in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren. Om deze ambitie waar te maken ontwikkelen we een opleidingskompas en voorzien we in een wervende Vlaanderenbrede en gefaseerde promotiecampagne. Aanvullend wordt een lokale doeltreffende informatieverstrekking met aandacht voor kansengroepen in samenwerking met lokale partners en bestaande initiatieven opgezet.</p> <p>Dit project heeft de ambitie om het aanbod in het volwassenenonderwijs te versterken op het vlak van duurzame arbeidsmarktgerichte kwalificatiemogelijkheden. Het volwassenenonderwijs zal actiever kunnen inspelen op lokale arbeidsmarktbehoeften door het versneld ontwikkelen van toekomstgerichte curricula en infrastructuur, een doorgedreven EVC-beleid, het verruimen van flexibele opleidingsmogelijkheden zoals een vakantieaanbod en het inzetten op geïntegreerde trajecten. Daarnaast worden verschillende vormen van hybride leren ontwikkeld in functie van een flexibel en gedifferentieerd aanbod.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het speerpunt 'Versterking van digitale competenties' richt dit project zich niet enkel tot een maatgericht aanbod voor het versterken van de algemene digitale geletterdheid maar is er ook expliciet aandacht voor opleidingen voor mensen die plaats- en tijdsafhankelijk werken en het gericht ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. Het behalen van een diploma secundair onderwijs of een duurzame beroepskwalificatie biedt jongeren ook een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Binnen dit project zetten we daarom in op het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom via een outreachende aanpak in samenwerking met partnerorganisaties (o.a.VDAB, Actiris, ...), een aanklampende cursistenbegeleiding tijdens het traject en een doorgedreven samenwerking met de examencommissie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	60.000.000 EUR
Output	Minstens 20 centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) hebben een project uitgevoerd in het kader van Edusprong
Outcome	De visienota Edusprong wordt geoperationaliseerd met het oog op het stimuleren van levenslang leren, het versterken van arbeidsmarktkansen via om- en bijscholen, het versterken van de digitale competenties van Vlamingen en het gericht inzetten op kwalificatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>In het voorjaar van 2022 dienden alle 46 cvo en cbe een projectaanvraag in het kader van de tweede projectoproep Edusprong in. Na een tweede beoordelingsfase werden 143 unieke projecten positief geadviseerd door een jury. Op 15 juli 2022 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het subsidiebesluit dat 22.604.486,12 euro verdeelde over de cvo en cbe. Op 1 september 2022 konden de centra starten met de uitvoering van de ingediende projecten.</p> <p>Naast de twee projectoproepen, die samen 29.993.661,96 euro verdeelden over de cvo en cbe, zijn er een aantal Edusprong-acties die centraal gecoördineerd worden.</p> <p>Op 8 juli 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een projectoproep rond leerloopbaanbegeleiding. Zes organisaties dienden een projectaanvraag in die in oktober 2022 door een jury beoordeeld werden. Vijf projecten werden gunstig geadviseerd en kunnen, na goedkeuring door de Vlaamse Regering, op 1 januari 2023 van start gaan.</p> <p>Ook de ontwikkeling van de Vlaanderenbrede communicatiecampagne is gestart. Een eerste creatief ontwerp zal in januari 2023 opgeleverd worden. In functie van de afstemming tussen de Vlaanderenbrede en lokale promotiecampagnes van cvo en cbe werd op 16 december 2022 een besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd waarin middelen worden toegekend aan deze centra. Met betrekking tot het opleidingskompas is er een behoefteanalyse gebeurd naar de noden van potentiële cursisten voor de ontwikkeling van het kompas. De opdracht voor de ontwikkeling is ondertussen gegund en de ontwikkeling kan beginnen. We verwachten een eerste resultaat in juni 2023.</p> <p>Verder is er ook een behoefteanalyse gebeurd door KPMG naar de IT-noden van de cvo en cbe rond cursistenadministratie. Op 16 december 2022 keurde de Vlaamse Regering een subsidiebesluit goed waarbij middelen worden toegekend aan de cvo en cbe in functie van de optimalisatie van softwaretoepassingen voor cursistenadministratie.</p> <p>Wat betreft de actualisering en ontwikkeling van opleidingsprofielen werd, in samenwerking met de sector, een longlist van arbeidsmarktgerichte opleidingen gemaakt. Er werd ook een subsidiebesluit</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>goedgekeurd door de Vlaamse Regering waarin middelen werden toegekend aan de pedagogische begeleidingsdiensten in functie van de versnelde omzetting van beroepskwalificaties naar nieuwe en geactualiseerde opleidingen.</p> <p>Op 23 september 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een subsidiebesluit waarin middelen worden toegekend aan de pedagogische begeleidingsdiensten in het kader van het opstellen van een gemeenschappelijk vrijstellingenkader voor (aanvullende) algemene vorming. Het vrijstellingenkader wordt op dit moment ontwikkeld. Aansluitend werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor de ontwikkeling van vrijstellingsproeven voor ICT en talen (Frans, Nederlands, Engels) voor cvo binnen de studiegebieden van AV en AAV. De ontwikkeling start in 2023.</p> <p>Voor de ontwikkeling van EVC-instrumenten werd een overheidsopdracht uitgeschreven. Vanaf 2023 starten verschillende cvo met de ontwikkeling van de instrumenten. Verder werd ook de studieopdracht rond EVC-begeleiding opgeleverd in het najaar van 2022. Aan deze studie wordt een vervolg gekoppeld over de implementatie van tools en methodieken voor EVC-begeleiding. Deze opdracht werd ondertussen gegund.</p> <p>Ook zijn we gestart met een gedragenheidsstudie en conceptuele verduidelijking rond de actie 'registratie van competenties' en het beter zichtbaar maken van verworven competenties.</p> <p>We zetten verder in op de samenwerking tussen cvo en de Examencommissie. Op 9 december 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een subsidiebesluit waarin middelen worden toegekend aan vier cvo voor de uitvoering van pilootprojecten in het kader van de organisatie van flexibele diplomatrajecten binnen de opleidingen Zorg en STEM. De kick-off van deze samenwerking en deze projecten heeft reeds plaatsgevonden.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt de visienota Edusprong. Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht"	2021 Q1	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering kent middelen toe aan de cvo en cbe ter uitvoering van een regioscan.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Lancering van een eerste projectoproep voor de toekenning van projectmiddelen aan de cvo en cbe	2021 Q3	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan cvo en cbe goed in het kader van de eerste projectoproep.	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Tussentijdse financiële rapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de eerste projectoproep	2023 Q1	Op schema	Tussentijdse financiële rapportering werd een eerste keer opgeleverd in juni 2022 en december 2022. Een laatste tussentijdse financiële rapportering wordt eind mei 2023 verwacht.
Inhoudelijke en financiële eindrapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de eerste projectoproep	2023 Q4	Op schema	
Lancering van een tweede projectoproep voor de toekenning van projectmiddelen aan de cvo en cbe	2022 Q1	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan de cvo en cbe goed in het kader van de tweede projectoproep	2022 Q3	Gerealiseerd	
Inhoudelijke en financiële eindrapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de tweede projectoproep	2024 Q4	Op schema	
Tussentijdse financiële rapportering van de uitgevoerde projecten ihkv de tweede projectoproep	2024 Q2	Op schema	Een eerste tussentijdse rapportering werd opgeleverd in december 2022. Een tweede en derde tussentijdse rapportering volgt in november 2023 en mei 2024
Lancering van een projectoproep voor leerloopbaanbegeleiding-initiatieven	2022 Q2	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen goed aan vijf organisaties ter ondersteuning en versterking van leerloopbaanbegeleiding-initiatieven	2022 Q4	Gerealiseerd	
Tussentijdse rapportering leerloopbaanbegeleiding-initiatieven	2025 Q3	Nog niet gestart	Een tussentijdse financiële rapportering wordt verwacht in september 2023, juni 2024 en juni 2025. Een tussentijdse inhoudelijke rapportering wordt verwacht in juni 2024.
Inhoudelijke en financiële eindrapportering leerloopbaanbegeleiding-initiatieven	2026 Q1	Nog niet gestart	
Opstart van een promotiecampagne voor het volwassenenonderwijs	2022 Q3	Gerealiseerd	Voor de opstart van de Vlaanderenbrede communicatiecampagne werd een communicatiestrategie ontwikkeld door LDV United nv. De Vlaamse Regering keurde het voorstel tot

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			uitwerking van de Vlaanderenbrede communicatiecampagne principieel goed (VR 2022 1811) en de Inspectie van Financiën gaf gunstig advies om te werken binnen bestaande raamcontracten met de Vlaamse overheid.
Creatieve ontwikkeling en uitwerking Vlaanderenbrede communicatiecampagne	2023 Q4	Op schema	Eind december 2022 vond de startvergadering plaats met LDV United nv voor de creatieve ontwikkeling en uitwerking van de Vlaanderenbrede campagne.
Eerste fase uitrol Vlaanderenbrede communicatiecampagne	2023 Q3	Nog niet gestart	
Tweede fase uitrol Vlaanderenbrede communicatiecampagne	2023 Q4	Nog niet gestart	
Derde fase uitrol Vlaanderenbrede communicatiecampagne	2024 Q1	Nog niet gestart	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan cvo en cbe goed ter ondersteuning en professionalisering van lokale promotiecampagnes	2022 Q4	Gerealiseerd	
Tussentijdse rapportering ihkv de ondersteuning en professionalisering van lokale promotiecampagnes van de cvo en cbe	2023 Q3	Nog niet gestart	
Inhoudelijke en financiële eindrapportering ihkv de ondersteuning en professionalisering van lokale promotiecampagnes van cvo en cbe	2025 Q1	Nog niet gestart	
Behoeftenanalyse naar de noden van (potentiële) cursisten voor het opleidingskompas	2022 Q4	Gerealiseerd	Behoeftanalyse werd uitgevoerd door IPSOS
Gunning ontwikkelaar opleidingskompas	2023 Q1	Gerealiseerd	
Lancering eerste versie website 'opleidingskompas' met een overzicht van het actuele aanbod in het volwassenenonderwijs	2023 Q4	Op schema	
Toevoegen bijkomende functionaliteiten en onderwijsniveaus aan het opleidingskompas	2024 Q2	Op schema	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Behoeftenanalyse in de sector naar de IT-noden van de centra rond cursistenadministratie	2022 Q4	Gerealiseerd	Behoefteteanalyse werd uitgevoerd door KPMG
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan cvo en cbe goed in het kader van de optimalisatie van cursistenadministratie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Bijkomende consultancy voor de cvo en cbe om de middelen voor de optimalisatie van de cursistenadministratie op een efficiënte en waar mogelijk synergetische manier in te zetten	2023 Q2	Op schema	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan de pedagogische begeleidingsdiensten goed in het kader van de actualisering van de opleidingsprofielen	2022 Q4	Gerealiseerd	
Actualisering van de opleidingsprofielen	2024 Q4	Op schema	
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan de pedagogische begeleidingsdiensten goed in het kader van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk vrijstellingenkader	2022 Q3	Gerealiseerd	
Realisatie van het gemeenschappelijk vrijstellingskader	2024 Q4	Op schema	
Uitschrijven overheidsopdracht voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke vrijstellingsproeven	2023 Q1	Gerealiseerd	
Ontwikkeling gemeenschappelijke vrijstellingsproeven	2024 Q4	Op schema	
Uitschrijven overheidsopdracht voor de ontwikkeling van EVC-instrumenten	2022 Q4	Gerealiseerd	
Ontwikkeling EVC-instrumenten	2024 Q4	Op schema	
Uitschrijven overheidsopdracht voor de studie naar EVC-begeleiding	2022 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Uitvoering studieopdracht over EVC-begeleiding	2022 Q4	Gerealiseerd	Studieopdracht uitgevoerd door Idea Consult	
Uitschrijven overheidsopdracht voor de implementatie van tools en methodieken voor EVC-begeleiding	2022 Q4	Gerealiseerd		
Uitvoering implementatie van tools en methodieken voor EVC-begeleiding	2024 Q4	Op schema	Opdracht gegund aan Idea Consult	
Gedragenheidstudie en conceptuele verduidelijking rond registratie van competenties	2023 Q4	Op schema		
De Vlaamse Regering keurt de toekenning van middelen aan de pilootcentra goed in het kader van de ontwikkeling van gedeelde diplomatrajecten tussen de Examencommissie en de centra voor volwassenenonderwijs	2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal centra die een aanvraag ingediend hebben en van wie de aanvraag goedgekeurd werd in het kader van de eerste projectoproep van Edusprong.	46	2021 Q4	46	100 %
Oplevering rapporten regioscan	11	2022 Q1	11	100 %
Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een aanvraag ingediend hebben en van wie de aanvraag goedgekeurd werd in het kader van de tweede projectoproep Edusprong	46	2022 Q4	46	100 %
Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een project hebben uitgevoerd in het kader van de eerste projectoproep Edusprong	20	2023 Q4		
Aantal ontwikkelde EVC-instrumenten	14	2024 Q4		
Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een project hebben uitgevoerd in het kader van de tweede projectoproep van Edusprong	20	2024 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal nieuwe en geactualiseerde opleidingsprofielen	20	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	55.728.000 EUR
Uitvoering VEK	18.251.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 60.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p><u>Beslissing van de Vlaamse Regering. Visienota "Edusprong, Van Achterstand naar Voorsprong. Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering van het relanceplan "Vlaamse veerkracht" (nota en bijlage)</u></p> <p>Nota en Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels om aanvullende punten en werkingsmiddelen in het volwassenenonderwijs toe te kennen om een regioscan en de regionale afstemming van het opleidingsaanbod op te zetten ter uitvoering van het relanceplan Edusprong</p> <p>Oproep voor projectsubsidies in het kader van het relanceplan Edusprong (project VV 19 – Versterken levenslang blijven leren) (Mededeling en bijlage op VR 16/07/2021)</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van maximaal 7.389.175,84 euro aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 augustus 2023 in het kader van de eerste projectoproep Edusprong (BVR goedgekeurd door de Vlaamse regering op 26/11/2021)</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 18 februari 2022. Tweede oproep voor projectsubsidies in het kader van het relanceplan Edusprong</p> <p>Nota en besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2022 tot vaststelling van de regels om subsidies in het volwassenenonderwijs toe te kennen met het oog op de afstemming van het ICT-opleidingsaanbod voor onderwijspersoneel binnen centra voor volwassenenonderwijs met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied informatie-en communicatietechnologie in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 om het relanceplan Edusprong uit te voeren</p>

[Nota aan de Vlaamse Regering van 8 juli 2022. Oproep voor leerloopbaanbegeleiding-initiatieven in het kader van het relanceplan Edusprong](#)

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot toekenning van een subsidie van maximaal 22.604.486,12 euro aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 in het kader van de tweede projectoproep Edusprong

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2022 tot toekenning van subsidies aan de pedagogische begeleidingsdiensten voor de Edusprong-actie Gemeenschappelijk vrijstellingenkader voor (aanvullende) algemene vorming voor maximaal 360.000 euro in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024

Nota aan de Vlaamse Regering van 18 november 2022 betreffende de uitvoering van de Vlaanderenbrede projecten van Edusprong

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022 tot toekenning van een subsidie van maximaal 1.516.475,6 euro voor leerloopbaanbegeleiding-initiatieven in het kader van het relanceplan Edusprong voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022 tot toekenning van subsidies aan de pedagogische begeleidingsdiensten voor de Edusprong-actie versnelde omzetting van beroepskwalificaties naar nieuwe en geactualiseerde opleidingen in het volwassenenonderwijs voor maximaal 360.000 euro in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2022 tot toekenning van subsidies voor het Edusprong-project "Flexibel leertraject Examencommissie en Volwassenenonderwijs" voor maximaal 320.000 euro in de periode van 1 december 2022 tot en met 30 september 2024

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2022 betreffende de optimalisatie van softwaretoepassingen voor de cursistenadministratie in het kader van het relanceplan Edusprong voor de periode van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2022 betreffende de ondersteuning en professionalisering van de lokale promotiecampagnes in het kader van het relanceplan Edusprong voor de periode van 15 december 2022 tot en met 31 december 2024

05. Versterking O&O

VV020 - BIO-ECONOMIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Landbouw en Visserij
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De bio-economie omvat zowel de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen als het gebruik van die hulpbronnen en reststromen. Deze worden verwerkt tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en energie.</p> <p>Vlaanderen heeft een sterke traditie in biogebaseerde activiteiten. Gezien de afwezigheid van grote voorraden natuurlijke hulpbronnen, heeft Vlaanderen expertise opgebouwd in het slim omgaan met grondstoffen voor een circulaire bio-economie.</p> <p>De strategie en het beleidsplan Bio-economie hebben tot doel het netwerk van innovatieactoren op dit gebied te versterken en nieuwe initiatieven voor het duurzaam gebruik van biogebaseerde oplossingen te stimuleren. Deze acties pakken de huidige uitdagingen van de bio-economie in Vlaanderen aan door:</p> <ul style="list-style-type: none">- meer samenwerking op te bouwen tussen actoren in verschillende economische sectoren;- innovatie te stimuleren in samenwerking met partners uit de landbouw;- ondersteuning te bieden aan start-ups en KMO's bij de snelle opschaling en industrialisatie van hun oplossingen;- de onderzoeksgemeenschap op dit gebied te stroomlijnen en versterken;- de bestuurlijke capaciteit te versterken om de Vlaamse bio-economie op te volgen en te ondersteunen. <p>Het eerst impulsprogramma bio-economie werd op 18 december 2020 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hiermee gaat een investering gepaard van 10 miljoen EUR, waarvan 3 miljoen EUR voor wetenschappelijk onderzoek en 7 miljoen EUR voor O&I-projecten in samenwerking met bedrijven.</p> <p>Een tweede impulsprogramma van 10 miljoen EUR zal in 2021 worden voorgesteld.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.000.000 EUR
Output	<p>FWO-oproep: minimum 6 tweejarige projecten goedgekeurd tegen eind 2021. Tegen eind 2022 worden nog eens 6 bijkomende projecten goedgekeurd.</p> <p>O&I-projecten met bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actie clusterprojecten: tegen eind 2021 worden een 3-tal (grotere) clusterprojecten bio-economie verwacht. Tegen eind 2022 worden in totaal 7 projecten goedgekeurd onder deze actie. - Actie pilootinfrastructuur: tegen eind 2021 worden een 60-tal 'pilottrajecten bio-gebaseerde toepassingen' verwacht. Met de beslissing van de Vlaamse regering omtrent de verbreding worden voor deze actie in totaal 60 projecten verwacht tegen eind 2022.
Outcome	<p>FWO-oproep: Met de thematische oproep bio-economie wil men excellent vernieuwend strategisch basisonderzoek binnen het thema bio-economie financieren zodat technologische ontwikkelingen met hoog potentieel voor economische of maatschappelijke valorisatie, de grootste kans van slagen krijgen.</p> <p>O&I-projecten met bedrijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actie clusterprojecten: versterking van waardenketens inzake bio-economie passend binnen de (triplehelix) roadmaps van de speerpuntclusters. - Actie pilootinfrastructuur: opschaling van labo-onderzoek inzake bio-economie naar marktrijpe toepassingen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Na evaluatie van de eerste oproepen voor onderzoeksprojecten, clusterprojecten en projecten pilootinfrastructuur werd op 29 april 2022 door de Vlaamse regering het tweede impulsprogramma goedgekeurd.</p> <p>Met deze beslissing werd de tweede schijf van 10 miljoen ter beschikking gesteld en werd voor de O&I-projecten met bedrijven een uitbreiding van inhoud en instrumenten goedgekeurd.</p> <p>FWO-oproep: Er werden in de eerste oproep eind 2021 zes projecten goedgekeurd. De goedgekeurde projecten kunnen geraadpleegd worden op https://www.fwo.be/nl/nieuws/pers/zes-onderzoeksprojecten-binnen-het-domein-bio-economie-toegekend/</p> <p>In 2022 werd een tweede thematische oproep bio-economie gelanceerd. Er werden 12 projecten ingediend die geëvalueerd werden en uiteindelijk werden opnieuw 6 excellente projecten geselecteerd die ondersteund zullen worden. Deze zullen van start gaan op 1 jan 2023. De lijst met projecten zal geraadpleegd kunnen worden op www.fwo.be</p> <p>O&I-projecten met bedrijven:</p> <p>Actie clusterprojecten: In totaal werden 8 clusterprojecten goedgekeurd voor een totaal VAK van 9.353 kEUR. Het betreft 3 coöperatieve O&O-projecten, 2 Landbouwtrajecten binnen clustercontext en 3 cSBO's.</p> <p>Actie pilootinfrastructuur:</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>In totaal werden 6 ‘pilottrajecten bio-gebaseerde toepassingen’ goedgekeurd. Na de uitbreiding van de Vlaamse Regering (dd 29/4/2022) werden tevens 13 reguliere innovatieprojecten op relancemiddelen bio-economie toegewezen. Het betreft 2 haalbaarheidsstudies, 7 ontwikkelingsprojecten, 1 onderzoeksproject en 3 Landbouwtrajecten. Totaal VAK voor deze actie bedraagt 4.424 kEUR.</p> <p>Na evaluatie van het eerste impulsprogramma bleek de instroom van pilootprojecten lager dan verwacht hierdoor werd met het tweede programma een uitbreiding voorzien waardoor grotere projecten werden ondersteund.</p> <p>Onderzoeksagenda: Hiervoor werd een studieopdracht toegewezen aan Technopolis Nederland. Technopolis heeft in het voorjaar 2022, samen met de Universiteit van Leiden, een scientometrische analyse gemaakt van de wetenschappelijke activiteit in Vlaanderen mbt de bio-economie. Deze analyse wordt verder uitgewerkt in indicatoren die moeten aangeven of Vlaanderen wetenschappelijke excellentie heeft in dit domein, en hoe deze zich verhoudt tot de andere Europese landen.</p> <p>In het najaar werden zes workshops georganiseerd met onderzoekers over zes prioritaire onderzoeksthema’s binnen de bio-economie : microbiom en landbouw, microbiom en gezondheid, klimaataanpassing van de landbouw, synthetische biologie, circulaire voedselketens, en alternatieven voor pesticiden.</p> <p>Op basis van dit overleg wordt het onderzoeksoverzicht genuanceerd, en worden aanbevelingen opgesteld om de wetenschappelijke excellentie in Vlaanderen te bestendigen. De oplevering van de resultaten wordt nog altijd volgens de planning verwacht in de eerste helft van 2023.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALLEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
oplevering studie Onderzoeksagenda	2023 Q2	Op schema	
Lancering tweede FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	2022 Q2	Gerealiseerd	
Selectie projecten tweede FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	2022 Q4	Gerealiseerd	
Toekenning van de steunmiddelen voor O&I-projecten met bedrijven na goedkeuring Vlaamse regering van uitbreiding.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Start opbouw van onderzoeksagenda voor de Vlaamse Bio-economie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning van de steunmiddelen voor O&I-projecten met bedrijven	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Tweede impulsprogramma bio-economie	2021 Q4	Gerealiseerd	Het tweede impulsprogramma bio-economie werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 29/04/2022 (VR 2022 2904 VV DOC.0041/1BIS)		
Lancering FWO oproep bio-economie onderzoeksprojecten	2021 Q4	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
FWO-oproep 1: aantal goedgekeurde tweejarige projecten eerste oproep	6	2021 Q4	6	100 %	
Aantal goedgekeurde clusterprojecten bio-economie na goedkeuring VR uitbreiding	7	2022 Q4	8	100 %	
FWO-oproep 2: aantal goedgekeurde tweejarige projecten tweede oproep	6	2022 Q4	6	100 %	
aantal goedgekeurde 'pilottrajecten bio-gebaseerde toepassingen' na goedkeuring VR uitbreiding	60	2022 Q4	19	32 %	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	13.826.000 EUR
Uitvoering VEK	1.566.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 30 april 2021. Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Advies van het FWO volgend op de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen \(FWO\)](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 29 april 2022. Volgende stappen en uitbreiding van het Vlaams beleidsplan bio-economie](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 29 april 2022. Vlaams beleidsplan bio-economie. Bijlage](#)

VV021 - ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR (BIJ STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTERS (SOC'S), SPEERPUNTCLUSTERS, VLAAMSE ONDERZOEKINSTELLINGEN EN HOGER ONDERWIJS)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Excellente wetenschap en innovatie zijn dé voorwaarden om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De versterking van deze onderzoeks- en innovatie (O&I)-basis kan niet zonder de uitbouw van grootschalige, state-of-the-art (internationale) O&I-infrastructuren. Bovendien zijn deze infrastructuren nodig om de innovatiekloof te kunnen overbruggen en de transfer van kennis en technologie te versnellen naar het industriële en kmo-weefsel. Om onze kennisbasis te versterken, zullen we daarom bijkomend investeren in O&I- en technologische infrastructuur met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg.</p> <p>Een investeringsagenda werd samengesteld op basis van een bevraging van het veld. Er worden 14 subprojecten gefinancierd, waarvan 7 binnen de pijler 'Duurzaamheid' (39,20 mio €), 3 binnen de pijler 'Digitaal' (36,02 mio €) en 4 binnen de pijler 'Gezondheid' (25,91 mio €) voor een gezamenlijk budget van 101,14 mio €.</p> <p>Het gaat om de hiernavolgende subprojecten (projectuitvoerder(s) / toegekende middelen Vlaamse Veerkracht).</p> <p>Pijler Duurzaamheid: (VV021/01) Bio Base NextGen Fermentation Platform: acht drukfermentoren met geavanceerde sensoren (Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) / 1,38 mio €); (VV021/02) Bio Base Demo: demonstratiefermentor op 50 m³ (BBEPP / 10,61 mio €); (VV021/03) Microbiële fermentatiestromen als eiwitbron in voedings- en voedertoepassingen van Vlaamse bedrijven (BBEPP en Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) / 3 mio €); (VV021/04) BioCon pilot plant: biomassa-conversieplatform (KU Leuven / 8,20 mio €); (VV021/05) Samen bouwen aan een klimaatneutraal Vlaanderen: onderzoeks- en demonstratie-infrastructuur (KU Leuven / 7,96 mio €); (VV021/06) Biotope incubator (Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) / 6,50 mio €); (VV021/07) Green Hydrogen Lab (UHasselt / 1,56 mio €);</p> <p>Pijler Digitaal: (VV021/08) Acceleratorprogramma met 6 end-to-end digitale pilootproductielijnen voor digitale transformatie van</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

High-Mix-Low-Volume (HMLV) productie (Flanders Make / 11 mio €);
 (VV021/09) Uitbreiding Fotonica pilotlijn infrastructuur (VUB Brussels Photonics (B-PHOT) / 5,02 mio €);
 (VV021/10) Miniaturisatie in geavanceerde halfgeleidertechnologieën: opzet van een Hoge Numerieke Apertuur (NA) Extreme Ultra Violet (EUV)-golflengte Lab (Imec / 20 mio €);

Pijler Gezondheid:

(VV021/11) CESPE Innovatie Accelerator voor (bio)farmaceutische productie (UGent / 9 mio €);
 (VV021/12) Ecosysteem voor pandemiebestrijding: Vaccinopolis (4 mio €) + Flipped TTO (1,3 mio €) (UAntwerpen / 5,3 mio €);
 (VV021/13) Europese translationele motor voor AAV-getherapie (KU Leuven / 9,17 mio €);
 (VV021/14) Remote Clinical Monitoring Center (RCMC) (UHasselt / 2,44 mio €).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	101.135.000 EUR
Output	De verwachte output per subproject (14 in totaal) werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').
Outcome	De verwachte outcome per subproject (14 in totaal) werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle subprojecten zijn in uitvoering en zitten op schema.
Noodzakelijke politieke actie	Geen.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bevraging van het veld	2021 Q3	Gerealiseerd	
Alle projecten werden goedgekeurd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Alle overeenkomsten werden opgemaakt	2022 Q1	Gerealiseerd	
Alle overeenkomsten werden ondertekend door alle partijen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Gunning van overheidsopdrachten voor O&O en infrastructuurprojecten	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Alle projecten zijn gestart	2022 Q4	Gerealiseerd		
Voortgangsrapportage over werkjaar 2022	2023 Q1	Op schema		
Voortgangsrapportage over werkjaar 2023	2024 Q1	Nog niet gestart		
Voortgangsrapportage over werkjaar 2024	2025 Q1	Nog niet gestart		
Voortgangsrapportage over werkjaar 2025	2026 Q1	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde projecten van investeringsagenda onderzoeksinfrastructuur	14	2021 Q4	14	100 %
Alle projecten van investeringsagenda onderzoeksinfrastructuur zijn gestart	14	2022 Q4	14	100 %
Voltooiing van de gegunde O&O- en infrastructuurprojecten	14	2026 Q2		
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR			
Beleidsruimte (begroot) update	101.135.000 EUR			
Uitvoering VAK	101.135.000 EUR			
Uitvoering VEK	28.416.000 EUR			
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 101.135.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR 			

AGENDERING VLAAMSE REGERING

De 14 projecten werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 juli 2021.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Vlaamse Veerkracht: investeringsimpuls in O&O&I- infrastructuur in Vlaanderen \(project VV021\) \(VR 2021 0907 VV DOC.0099/1BIS\)](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV023 - Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O](#)

VV022 - VERSTERKING O&O BEDRIJVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Ondernemingen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Innovatie staat centraal in de aanpak van het herstel in Vlaanderen. In de eerste plaats omdat innovatie nodig is om onze bedrijven competitief en productief te houden, zodat jobs in Vlaanderen behouden en gecreëerd kunnen worden.</p> <p>Vlaamse bedrijven staan in de voorhoede van innovatie in Europa. Investerings ten belope van 2,16% van het bbp onderstrepen de R&D-intensiteit van de bedrijven en dragen sterk bij tot het feit dat we in Vlaanderen met 2,92% in 2018 dicht bij de 3% O&O-doelstelling zitten. We stellen bovendien vast dat bedrijven in deze crisis blijven inzetten op innovatie en willen hen daarin ondersteunen. Daarom trekken wij 100 miljoen euro extra uit voor subsidies aan O&O-projecten van bedrijven. Deze subsidies zullen worden toegekend onder de voorwaarden van de huidige instrumenten die gericht zijn op O&O-steun aan bedrijven.</p> <p>Het innovatiebeleid slaagt er steeds beter in om ook kleine(re) bedrijven te bereiken. Toch blijft de spreiding van O&O over meer sectoren en bedrijfstypes een uitdaging voor onze regio. Na de Corona-crisis zal innovatie nog meer dan voorheen bepalend zijn voor de concurrentiekracht van onze bedrijven en de economische groei. Deze investeringen gaan daarom gepaard met een doorlichting van het VLAIO innovatie-instrumentarium. We willen immers meer innoverende ondernemingen en meer innovatie in bedrijven stimuleren. De uitdaging bestaat erin om het aantal innoverende bedrijven in Vlaanderen op te trekken en het instrumentarium dat Vlaanderen inzet om ondernemingen aan te zetten tot innovatie laagdrempeliger te maken, aan te passen aan de mogelijkheden van kmo's en sterker in te zetten op economische valorisatie van de resultaten van innovatie. Bij het opmaken van het Vlaams regeerakkoord werd deze uitdaging verwoord als het verbreden van het O&O-instrumentarium naar kleine bedrijven.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	100.000.000 EUR
Output	Aantal goedgekeurde projecten
Outcome	Meer O&O-investeringen ondernemingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle middelen werden vastgelegd en het aantal projecten werd ruimschoots overschreden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALLEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Selectie COOCK projecten Zorg en Circulaire Economie, Clusterprojecten Zorg	2022 Q4	Gerealiseerd	Eerste oproep werd afgehandeld (1.6 mln vastgelegd), iets onder besteding, wordt gecorrigeerd via bijkomende oproep Tweede oproep opengesteld (twv 2.4 mln)	
Doorlichting VLAIO-instrumentarium (2 studies: 1. additionaliteit O&O-steun en 2. policy mix).	2021 Q4	Gerealiseerd	Beide evaluatierapporten ikv Vlaamsbrede heroverweging werden opgeleverd en geven een positief beeld van de toegevoegde waarde van de Vlaamse O&O steun.	
Selectie van O&O-projecten via reguliere aanpak	2022 Q4	Gerealiseerd	De vastleggingen van O&O-projecten verloopt op schema. De beoogde aantallen zijn reeds gehaald.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vastleggingen Relance Middelen O&O	30.000.000,00	2021 Q4	29.981.830	100 %
Gezondheid en zorg - COOCK Gezondheid en zorg - TETRA Gezondheid en zorg - Clusterprojecten (vastleggingen euro)	8.000.000	2022 Q4	8.000.000	100 %
Vastleggen O&O relance middelen deel 3	30000000	2022 Q4	30.000.000	100 %
Aantal O&O-projecten	100	2022 Q4	274	100 %
Vastleggen O&O relance middelen deel 2	32000000	2022 Q4	32.000.000	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	99.909.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	32.073.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 100.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 18 december 2020. Bijkomende middelen voor VLAIO O&O-projecten 2020</p> <p>Impulsprogramma - Innovatie in gezondheid en zorg. Nota VR 18/06/2021</p> <p>Impulsprogramma - Innovatie in gezondheid en zorg. Kadernota VR 18/06/2021</p> <p>Impulsprogramma - Innovatie in gezondheid en zorg. Bijlage. Doelgroepbevraging</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 25 maart 2022. Overdracht relancemiddelen voor O&O-projecten VLAIO</p> <p>VR 14 oktober 2022 - O&O bedrijfssteun Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)</p>

VV023 - VERSTERKING ONDERZOEKSVELD EN VERSNELLING O&O

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Bedrijven, speerpuntclusters, universiteiten, hogescholen, (strategische) onderzoekscentra

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	05. Versterking O&O
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Innovatie is meestal een proces van vele jaren, startend met fundamenteel onderzoek over strategisch basisonderzoek naar meer toegepast onderzoek. Om de innovaties van de toekomst te kunnen voeden, hebben we daarom versterking nodig van onze kennisbasis. Bijkomend zullen we investeren in onderzoeksprojecten met een inhoudelijke focus op 3 thema's: digitalisering, duurzaamheid en zorg.</p> <p>Binnen dit Vlaamse Veerkracht project worden de hiernavolgende subprojecten gefinancierd (projectuitvoerder(s) / toegekende middelen Vlaamse Veerkracht).</p> <p>(I - VV023) Oproepen infrastructuur hogescholen (meerdere / 6 mio €): dit subproject omvat het investeren in onderzoeksinfrastructuren bij de Vlaamse hogescholen. Hiervoor wordt een bedrag van ongeveer 2 x 3 mio € verdeeld in 2 oproepen (2021 en 2022). De oproep 2021 werd op 23 april 2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en werd opengesteld tussen 23 augustus 2021 en 15 september 2021. Op 7 december 2021 werden 17 projecten goedgekeurd voor financiering. De oproep 2022 werd opengesteld van 1 t.e.m. 14 september 2022 met een resterend budget van 2.933.632,85 €. Op 19 oktober 2022 werden 14 van de 21 ingediende projecten goedgekeurd voor financiering.</p> <p>(II - VV023) Projecten via VLIR (IOF) (meerdere / 17,96 mio €): in het kader van dit subproject werd een investeringsagenda samengesteld op basis van een bevraging van het veld. Enerzijds wordt binnen dit subproject voorzien in de versterking van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) ten belope van 14 mio €, waarbij via de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) 7 O&O&I-infrastructuurprojecten werden uitgewerkt. Daarnaast worden 2 O&O&I-infrastructuurprojecten van enerzijds het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en anderzijds een consortium imec/VITO ondersteund. Er worden in het kader van dit subproject dus 9 'sub-subprojecten' gefinancierd, waarvan 3 binnen de pijler 'Duurzaamheid' (6,76 mio €), 1 binnen de pijler 'Digitaal' (0,56 mio €) en 5 binnen de pijler 'Gezondheid' (10,65 mio €) voor een gezamenlijk budget van 17,96 mio €. Het gaat meer bepaald om de volgende sub-subprojecten:</p> <p>Pijler Duurzaamheid: (VV023/01) Innovatief ecosysteem voor circulair gebruik en opwaardering van CO2, stikstof en andere componenten in de lucht ter verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving (BlueApp) (UAntwerpen / 1,86 mio €); (VV023/02) Valorisatie van agro-industriële biomassa & biomassa residuen in een duurzame circulaire bio-economie</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

(TRANSfarm) (KU Leuven / 1,90 mio €);
(VV023/03) Nanotechnologie voor efficiëntere productie van Groene Waterstof (Groene Waterstofelektrolyse) (imec en VITO / 3 mio €);

Pijler Digitaal:

(VV023/04) Een schaalbare en flexibele infrastructuur voor de transformatie naar digitaal-fysieke werkomgevingen (MAXVR-INFRA) (UHasselt / 0,56 mio €);

Pijler Gezondheid:

(VV023/05) Een geïntegreerd platform voor de identificatie, isolatie en karakterisatie van humane monoklonale antilichamen (MabMine) (KU Leuven / 1,90 mio €);
(VV023/06) PRecisiegeneeskunde door geïntegreerde Spatiale Multi-Omics (PRISMO) (KU Leuven / 1,89 mio €);
(VV023/07) Geautomatiseerd, geïntegreerd en modulair High Throughput platform voor reactie-optimalisatie en continue flow productie van geneesmiddelen in Vlaanderen (HighTru Lab) (UGent / 4,40 mio €);
(VV023/08) Centre of excellence voor microfabricage van microfluidics in glas (MICROLAB) (VUB / 1,46 mio €);
(VV023/09) Supporting ITM's Scientific Infrastructure to Innovate for the Global Good (ITG / 1 mio €).

(III - VV023) Investeringsprojecten (meerdere / 26 mio €) bij Strategische Onderzoekscentra, speerpuntclusters en Vlaamse onderzoeksinstellingen op basis van een bijkomende bevraging van het veld. Het gaat meer bepaald om de volgende sub-subprojecten:

(VV023/10) Opstart SolidLab Vlaanderen (Imec / 7 mio € waarvan 5 mio € relancemiddelen uit VV023 en 2 mio € reguliere middelen);

(VV023/11) Opstart Testing & Experimentation Facility Hardware for Edge AI (TEFHW4AI) Vlaanderen (Imec / 20 mio €);

(VV023/12) Opstart We Are open ecosysteem voor burgerbeheerde persoonlijke gezondheidsdata (VITO / 3,4 mio € relancemiddelen waarvan 1 mio € vanuit het Departement EWI, 1 mio € vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en 1,4 mio € 'in natura' vanuit het Agentschap Digitaal Vlaanderen).

(IV - VV023) (VV023/13) Bijkomende financiering achtste FWO-oproep voor Zware Onderzoeksinfrastructuur (oproep 2021-2022) (FWO / 8,98 mio €).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	58.865.000 EUR
Output	<p>I - VV023: de verwachte output werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>II - VV023: de verwachte output per sub-subproject werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>III - VV023: de verwachte output van de sub-subprojecten VV023/10 (SolidLab Vlaanderen), VV023/11 (TEFHW4AI Vlaanderen) en VV023/12 (We Are) werd opgenomen in de resp. nota's aan de Vlaamse Regering zelf (zie links onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>IV - VV023: de verwachte output van het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering achtste oproep Zware Onderzoeksinfrastructuur) werd opgenomen in de desbetreffende nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>Zie ook info onder projectbeschrijving.</p>
Outcome	<p>I - VV023: de verwachte outcome werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>II - VV023: de verwachte outcome per sub-subproject werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	<p>zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>III - VV023: de verwachte outcome van de sub-subprojecten VV023/10 (SolidLab Vlaanderen), VV023/11 (TEFHW4AI Vlaanderen) en VV023/12 (We Are) werd opgenomen in de resp. nota's aan de Vlaamse Regering zelf (zie links onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>IV - VV023: de verwachte outcome van het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering achtste oproep Zwarte Onderzoeksinfrastructuur) werd opgenomen in de desbetreffende nota aan de Vlaamse Regering zelf (zie link onder het veld 'Agendering Vlaamse Regering').</p> <p>Zie ook info onder projectbeschrijving.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>I - VV023: de projecten in het kader van de eerste oproep (2021) infrastructuur hogescholen zijn in uitvoering en zitten op schema. De resultaten van de tweede oproep (2022) infrastructuur hogescholen werden voorgelegd aan de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en beslist op 24 november 2022.</p> <p>II - VV023: alle 9 sub-subprojecten zijn in uitvoering en zitten op schema.</p> <p>III - VV023: de sub-subprojecten VV023/10 (SolidLab Vlaanderen) en VV023/11 (TEFHW4AI Vlaanderen) zijn in uitvoering en zitten op schema; de projectovereenkomst voor het sub-subproject VV023/12 (We Are) is in opmaak.</p> <p>IV - VV023: het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering achtste oproep Zwarte Onderzoeksinfrastructuur) is in uitvoering en zit op schema.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
(I - VV023) Oproep 1 hogescholen gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
(I - VV023) Projecten oproep 1 hogescholen zijn opgestart	2022 Q2	Gerealiseerd	
(I - VV023) Projecten oproep 1 hogescholen zijn afgerond	2025 Q2	Op schema	
(I - VV023) Oproep 2 hogescholen gelanceerd	2022 Q4	Gerealiseerd	
(I - VV023) Projecten oproep 2 hogescholen zijn opgestart	2023 Q2	Nog niet gestart	
(I - VV023) Projecten oproep 2 hogescholen zijn afgerond	2026 Q2	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
(II - VV023) Bevraging van het veld	2021 Q3	Gerealiseerd		
(II - VV023) Alle projecten zijn goedgekeurd	2021 Q3	Gerealiseerd		
(II - VV023) Alle overeenkomsten werden opgemaakt	2022 Q1	Gerealiseerd		
(II - VV023) Alle overeenkomsten werden ondertekend door alle partijen	2022 Q1	Gerealiseerd		
(II - VV023) Alle projecten zijn opgestart	2022 Q4	Gerealiseerd		
(II - VV023) Alle projecten zijn afgerond	2026 Q2	Op schema		
(III - VV023) Bevraging van het veld is afgerond	2022 Q4	Gerealiseerd		
(III - VV023) Alle projecten zijn goedgekeurd	2022 Q4	Gerealiseerd		
(III - VV023) Alle projecten zijn opgestart	2022 Q4	Vertraging		
(III - VV023) Alle projecten zijn afgerond	2026 Q2	Op schema		
(IV - VV023) Project is goedgekeurd	2022 Q4	Gerealiseerd		
(IV - VV023) Project is opgestart	2022 Q4	Gerealiseerd		
(IV - VV023) Project is afgerond	2026 Q2	Op schema		
(VV023) Gunning van overheidsopdrachten voor O&O en infrastructuurprojecten	2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
(II - VV023) Alle projecten zijn opgestart	9	2022 Q4	9	100 %
(II - VV023) Aantal goedgekeurde projecten	9	2022 Q4	9	100 %
(IV - VV023) Aantal goedgekeurde projecten	1	2022 Q4	1	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
(I - VV023) Aantal goedgekeurde projecten 2021-2022	20	2022 Q4	31	100 %
(IV - VV023) Alle projecten zijn opgestart	1	2022 Q4	1	100 %
(III - VV023) Alle projecten zijn opgestart	3	2022 Q4	2	66 %
(III - VV023) Aantal goedgekeurde projecten	3	2022 Q4	3	100 %
(I - VV023) Alle projecten 2021-2022 zijn opgestart	20	2023 Q2	17	85 %
(I - VV023) Alle projecten 2021-2022 zijn voltooid	20	2026 Q2		
(IV - VV023) Alle projecten zijn voltooid	1	2026 Q2		
(III - VV023) Alle projecten zijn voltooid	3	2026 Q2		
(II - VV023) Alle projecten zijn voltooid	9	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	58.865.000 EUR
Uitvoering VAK	58.864.000 EUR
Uitvoering VEK	17.600.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 58.865.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>I - VV023: de oproep 2021 voor 3 miljoen euro werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 23 april 2021.</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021: investeringen in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen in het kader van het Relanceplan (VR 2021 2304 VV DOC.0033/1BIS)</p> <p>Ministerieel Besluit tot toekenning van steun voor onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap</p> <p>Bijlage 1. Handleiding oproep onderzoeksinfrastructuur hogescholen</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bijlage 2. Aanvraag onderzoeksinfrastructuur](#)

II - VV023: de 9 sub-subprojecten werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 juli 2021.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Vlaamse Veerkracht: versterking onderzoeksveld en versnelling O&O: onderdeel O&O&I-infrastructuren voor universiteiten en kennisinstellingen \(project VV023\) \(VR 2021 0907 VV DOC.0100/1BIS\)](#)

III - VV023: de sub-subprojecten VV023/10 (SolidLab Vlaanderen), VV023/11 (TEFW4AI Vlaanderen) en VV023/12 (We Are) werden resp. op 17 december 2021, op 10 december 2021 en op 15 juli 2022 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 december 2022: Vlaamse Veerkracht: TEFHW4AI Vlaanderen - Testing & Experimentation Facility Hardware for Edge AI \(project VV023\) \(VR 2021 1012 VV DOC.0169/1\)](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021: Vlaamse Veerkracht: opstart SolidLab Vlaanderen \(project VV023\) \(VR 2021 1712 VV DOC.0172/1BIS\)](#)

VR 25 februari 2022 - Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O

VR 25 maart 2022 - Ondertekening projectovereenkomst SolidLab Vlaanderen

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022: Vlaamse Veerkracht: innovatief burgergedreven databeheer voor gezondheid en innovatie, inclusief verschillende use cases - We Are \(project VV023, VV116, VV076\) \(VR 2022 1507 VV DOC.0087/1\)](#)

IV - VV023: het sub-subproject VV023/13 (bijkomende FWO-financiering voor Zware Onderzoeksinfrastructuur) werd op 15 juli 2022 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022: Vlaamse Veerkracht: toekenning van een subsidie voor bijkomende ondersteuning van de FWO oproep zware infrastructuur via middelen uit het Vlaams Relanceplan Vlaamse Veerkracht \(project VV023\) \(VR 2022 1507 VV DOC.0071/1\)](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV021 - Onderzoeksinfrastructuur \(bij Strategische Onderzoekscentra \(SOC's\), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs\)](#)

06. Blue deal

VV024 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Landmaatschappij - Departement Omgeving - Agentschap Natuur en Bos - Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	programmamateam Water-Land-Schap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project groen-blauwe infrastructuur - open ruimte wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied. Het bestaat uit drie projectonderdelen.

Het project zet versterkt in op waterconserving in de open ruimte om grondwatervoorraden aan te vullen en verdroging van natuur- en landbouwgebieden tegen te gaan. Het is daarbij noodzakelijk dat we beter gebruik maken van de perioden met neerslagoverschot om perioden met neerslagtekorten te overbruggen. Dat kan enkel als we zowel infiltratie als retentie in de bovenstroomse gebieden versterken. Dit heeft ook als gevolg dat bij hevige neerslag water minder snel afvloeit en overstromingsschade in afwaartse gebieden wordt vermeden. Maatregelen om water langer tegen te houden en te laten infiltreren in de open ruimte zijn onder meer erosie maatregelen, aanleggen van bufferbekkens, het voorzien van peilgestuurde drainages, bovenwaterlopen terug meer laten meanderen, waterpeilen in de valleigebieden terug verhogen door minder water te onttrekken en minder te draineren in polders en wateringen, afwateringskanalen in natuurgebieden zoveel mogelijk dempen.

De realisatie van dergelijke maatregelen is vaak niet eenvoudig gelet op de sterke versnippering van de ruimte in Vlaanderen waarbij natuur-, bos- en landbouwgebieden naast elkaar voorkomen en landgebruik niet altijd in overeenstemming is met de noden van het watersysteem. Daarom is een nauwe samenwerking met de beheerders van de open ruimte essentieel. Het project richt zich dan ook op (1) het mobiliseren van lokale gebiedscoalities voor het nemen van droogtmaatregelen in hun gebied (Water-Land-Schap 2.0) en (2) op het nemen van extra droogtmaatregelen binnen de geïntegreerde gebiedsgerichte projecten waarbij al een structurele samenwerking tussen gebiedspartners is opgezet. Ook toegang tot grond is een cruciale factor om deze maatregelen mogelijk te maken. Daarom voorziet het project ook (3) de oprichting van een grondenbank Blue Deal die inzet op grondmobiliteit en rechtstreekse aankopen om het landgebruik meer in overeenstemming te brengen met de noden van het watersysteem. Tot slot stelt het (4) afsluiten en uitvoeren van lokale gebiedsdeals de lokale coalities in staat om ook de meer complexe maatregelen voor de versterking van het watersysteem te kunnen uitvoeren.

De extra droogtmaatregelen zijn specifieke relance-deelprojecten binnen ruimere inrichtingsprojecten. Deze deelprojecten zijn volledig gefinancierd door relancemiddelen. Een aantal extra droogtmaatregelen betreft subsidies aan lokale actoren. Dan worden de relancemiddelen steeds aangevuld door reguliere middelen van deze lokale actoren.

PROJECTOMSCHRIJVING

Het subsidiepercentage wordt vastgelegd in de specifieke oproepen en overeenkomsten. Water-Land-Schap en Gebiedsdeals betreffen subsidies aan lokale actoren. Ook hier worden de relancemiddelen steeds aangevuld door reguliere middelen van deze lokale actoren. Het subsidiepercentage is vastgelegd in de oproepen. De verwervingen in het kader van de grondenbank Blue Deal zijn deels gefinancierd door relancemiddelen (10 mio euro) en deels gefinancierd door Vlaamse middelen (10 mio euro).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	40.000.000 EUR
Output	8 systeeminnovaties gerealiseerd, 15 gebiedsprogramma's opgemaakt ism coalities, 15 extra droogtmaatregelen gerealiseerd, 10 lokale gebiedsdeals gerealiseerd, 150 ha aangekochte grond ifv vernatting
Outcome	verhoogd inzicht in de werking van maatregelen, bevorderde data- en kennisuitwisseling, vergroten van de waterreserve, verhoogde waterretentie in de bodem, vernatting van gebieden, verbeterde waterkwaliteit, bijkomende groen-blauwe verbindingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In het kader van Water-Land-Schap 2.0 zijn de middelen voor de 8 geselecteerde systeeminnovaties en de 15 geselecteerde gebiedsprogramma's toegekend. Deze zijn/gaan nu volop op terrein in uitvoering. Er zijn 15 extra anti-droogtmaatregelen in uitvoering binnen de projectenportefeuille van de Vlaamse Landmaatschappij. In het kader van de grondenbank Blue Deal konden we instaan voor de verwerving van 188 ha in functie van versterking van het watersysteem. De middelen voor de gebiedsdeals zijn toegekend. Deze gaan nu volop in uitvoering
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
W-L-S: lanceren oproep	2021 Q2	Gerealiseerd	
W-L-S: indienen voorstellen systeeminnovaties en gebiedsprogramma's	2021 Q3	Gerealiseerd	
W-L-S: selectie op basis van de ingediende voorstellen	2021 Q4	Gerealiseerd	
W-L-S: start inhoudelijke studie	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
W-L-S: start begeleidingstraject en procesbegeleiding gebiedsprogramma's	2022 Q1	Gerealiseerd	
W-L-S: start uitvoering systeeminnovaties	2022 Q1	Gerealiseerd	
W-L-S: goedkeuring gebiedsprogramma's door de Vlaamse Regering	2022 Q4	Gerealiseerd	
W-L-S: start uitvoering gebiedsprogramma's	2023 Q1	Op schema	
W-L-S: systeeminnovaties uitgevoerd	2024 Q1	Op schema	
W-L-S: gebiedsprogramma's uitgevoerd	2026 Q3	Op schema	
INR: goedkeuring droogtemaatregelen	2021 Q1	Gerealiseerd	
INR: droogtemaatregelen 2021 zijn vastgelegd	2021 Q4	Gerealiseerd	
INR: droogtemaatregelen 2022 zijn vastgelegd	2022 Q4	Gerealiseerd	
INR: droogtemaatregelen zijn uitgevoerd	2026 Q3	Op schema	
Grondenbank: goedkeuring grondenbank Blue Deal	2021 Q1	Gerealiseerd	
Grondenbank: oprichten rapporteringsoverleg met VLM, VMM, Agentschap Natuur en Bos en Departement Omgeving	2021 Q1	Gerealiseerd	
Grondenbank : vastleggen middelen grondenbank Blue Deal schijf 1	2021 Q4	Gerealiseerd	
Grondenbank: vastlegging middelen grondenbank Blue Deal schijf 2	2022 Q4	Gerealiseerd	
Grondenbank: grondenbank Blue Deal is uitgevoerd	2026 Q3	Gerealiseerd	
gebiedsideals - selectie lokale gebiedsideals	2022 Q4	Gerealiseerd	
gebiedsideals zijn uitgevoerd	2026 Q3	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
start of Blue Deal projects		2023 Q1	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal systeeminnovaties in uitvoering	8	2022 Q1	8	100 %
aantal geselecteerde gebiedsdeals	10	2022 Q4	10	100 %
aantal opgemaakte gebiedsprogramma's	15	2022 Q4	15	100 %
aantal extra droogtemaatregelen in uitvoering	15	2023 Q1	15	100 %
aantal gebiedsprogramma's in uitvoering	15	2023 Q1	15	100 %
aantal gebiedsdeals in uitvoering	10	2023 Q1	10	100 %
aantal uitgevoerde systeeminnovaties W-L-S	8	2024 Q1		
aantal gerealiseerde gebiedsprogramma's	15	2026 Q3		
aantal aangekochte ha grond ifv vernatting	150	2026 Q3	188	125 %
aantal gerealiseerde gebiedsdeals	10	2026 Q3		
aantal gerealiseerde extra droogtemaatregelen inrichtingsprojecten	15	2026 Q3		
completion of Blue Deal projects	(deel VV024)	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	40.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	40.000.000 EUR
Uitvoering VAK	37.477.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	8.365.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 39.600.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021</p> <p>VR 25 november 2022 - Subsidie groenblauwe infrastructuur provincie West-Vlaanderen</p> <p>VR 25 november 2022 - Subsidiëring 6 projecten proeftuinen droogte</p> <p>VR 9 december 2022 - Subsidies voor uitvoering Water-Land-Schap 2.0</p> <p>VR 9 december 2022 - Subsidies 'Lokale Gebiedsdeals Droogte'</p>

VV025 - BLUE DEAL - ONDERZOEK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Landbouw en Visserij - Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	primaire sector, agro-industriële sector, kennisinstellingen, praktijkcentra landbouw

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING

De waterbeschikbaarheid per capita in Vlaanderen is één van de laagste in de OESO. De klimaatverandering en meer specifiek de droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten. De grondwaterreserves slinken zienderogen en droogteperiodes leiden tot uitputting van regenwaterreserves en grote schommelingen in watergebruik met nefaste gevolgen voor natuur en landbouw. De landbouwsector komt in de problemen voor wat betreft het garanderen van voldoende voedselproductie voor de industriële voedingssector. Het inkomen van de landbouwers staat onder druk en is onzeker.

Naast investeringen is innovatie belangrijk om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Bedoeling is op vrij korte termijn innovaties te initiëren die een antwoord bieden aan deze uitdagingen en kostenefficiënt kunnen toegepast worden op bredere schaal. Mogelijke onderzoekspistes zijn circulair watergebruik met aandacht voor de waterkwaliteit (voedselveiligheid, milieuaspecten zoals zoutinrusie), onderzoek naar droogteresistente en nieuwe klimaatrobuuste (eiwit)teelten en teelttechnieken of beheersmaatregelen die een duurzaam antwoord kunnen bieden op de klimaatverandering (zoals peilgestuurde drainage of het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem zodat de bodem het water langer kan vasthouden). Indirect zal ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid gegarandeerd worden en zal de toeleveringssector van de resultaten van dit impulsprogramma kunnen genieten. Specifiek voor de nieuwe droogteresistente en/of eiwitteelten voor Vlaanderen moet er aandacht besteed worden aan zowel teelttechniek, afzetmogelijkheden en verwerkingstechnieken.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt gebruik gemaakt van een bestaand onderzoeksprogramma, met name de landbouwtrajecten. De steuntoekenning in het kader van LA-trajecten betreft niet-staatssteun en is voorbehouden voor Organisaties voor Onderzoek en Kennisverspreiding voor de uitvoering van niet-economische activiteiten zoals onafhankelijke onderzoeksactiviteiten en/of kennisverspreiding.

Dit onderzoeksprogramma is vraaggedreven en beoogt reeds tijdens de duur van het project veranderingen teweeg te brengen bij een ruime doelgroep. De projecten worden aan 90% gesteund, met 10% inbreng van leden van de begeleidingscommissie, wat het vraaggedreven karakter moet garanderen. Regelmatig worden, naast landbouworganisaties en individuele landbouwers, ook industriële sectororganisatie en toeleveranciers of afnemers van landbouwproducten in de gebruikerscommissies aangetroffen. De finaliteit van het programma is primair economisch met aandacht voor maatschappelijke aspecten. De call 2020 omvat verschillende projecten die reeds aan de gestelde doelstellingen voldoen. Gezien de budgettaire ruimte die voorhanden is, is het slaagpercentage van het

PROJECTOMSCHRIJVING

programma laag (ca. 27% voor de call 2020) en kwaliteitsvolle projecten kunnen niet altijd gesteund worden. Extra middelen voor dit programma kunnen leiden tot een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde.

Het programma Landbouwtrajecten werd in de loop van 2020 hervormd voor wat betreft de evaluatiecriteria, onder meer om tegemoet te komen aan de vraag uit het beleid om sterker in te zetten op maatschappelijke uitdagingen inzake innovatieve, milieu- en klimaatvriendelijke economische productie. Voor de call 2020-2021 werd een nieuw criterium 'maatschappelijke meerwaarde' toegevoegd dat met name de milieu- en sociale aspecten van duurzame landbouw omvat. Milieuaspecten zijn bijvoorbeeld efficiënt water(her)gebruik, circulaire economie, minder gebruik van pesticiden en meststoffen, klimaatmitigatie door minder broeikasgassen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Sociale aspecten zijn bijvoorbeeld arbeidsveiligheid, gezondheid van landbouwer en consument, inkomenszekerheid, (dieren)welzijn, werkbaar werk en landschapsbeleving. De bedoeling is om projecten die in aanzienlijke mate geïnspireerd zijn door aspecten van duurzame landbouw, en een hoog ambitieniveau hebben op dat vlak, een zekere (beleids)prioriteit te kunnen geven.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	6.000.000 EUR
Output	Minstens 6 onderzoeksprojecten gericht op duurzaam watergebruik in de landbouwsector.
Outcome	<ul style="list-style-type: none">• Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen• Duurzamer watergebruik via alternatieve bronnen• Bijkomende waterbesparende technologieën en technieken• Verhoogd aandeel droogteresistente teelten• Bevorderde data- en kennisuitwisseling"

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De 7 blue deal Landbouwtrajecten zijn allen opgestart en worden nu verder opgevolgd. De onderwerpen zijn divers gaande van nieuwe teelttechnieken waaronder het vasthouden van water in de akkers, onderzoek m.b.t. droogteresistente teelten, efficiëntie van watergebruik, circulair watergebruik en gebruik van alternatieve waterbronnen.
Noodzakelijke politieke actie	Geen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
labeling en evaluatie van landbouwtrajecten call 2020-2021 die binnen de blue deal passen	2021 Q1	Gerealiseerd	
Nota Vlaamse regering	2021 Q2	Gerealiseerd	Nota Vlaamse Regering: Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven en steun voor onderzoek in de landbouwsector in het kader van het Relanceplan

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Beslissing over de blue deal projecten onderzoek call 2020-2021 landbouwtrajecten	2021 Q2	Gerealiseerd		
Lancering tweede call "bleu deal landbouwtrajecten"	2021 Q3	Gerealiseerd		
Start eerste landbouwtrajecten/blue deal projecten	2021 Q4	Gerealiseerd		
Beslissing over blue deal projecten call 2021-2022	2022 Q2	Gerealiseerd		
Alle blue deal onderzoeksprojecten voor de versterking van de biodiversiteit en/of mitigatie van de gevolgen van de klimaatverandering zijn gestart.	2023 Q1	Gerealiseerd		
Voltooiing van blue deal projecten onderzoek	2026 Q2	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gesteunde landbouwtrajecten onder de "blue deal"	6	2022 Q2	7	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.054.000 EUR
Uitvoering VEK	1.043.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 6.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven en steun voor onderzoek in de landbouwsector](#)

VV026 - BLUE DEAL - MOW

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Industrie en landbouw gevestigd langs de waterlopen, drinkwatermaatschappijen, binnenvaartondernemers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Voor de voeding van de hoofdassen in het Vlaamse binnenwaterennet bestaat een afhankelijkheid van stroomopwaarts gelegen waterwegen in beheer van andere landen en regio's. Het water dat voor de exploitatie van dit waterwegennet beschikbaar is dient dan ook zo optimaal mogelijk benut te worden.</p> <p>Binnen de "Blue Deal" wordt door de Vlaamse waterwegbeheerder een selectie van projecten opgenomen in volgende domeinen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Voorzien van pompinstallaties op waterwegen die onderhevig zijn aan waterschaarste met als doel de watervoorziening voor scheepvaart, industrie, drinkwaterbedrijven, landbouw maximaal te vrijwaren ook bij periodes van langdurige droogte;2. Renovatie van sluisdeuren en -mechanismen waardoor lekverliezen worden gereduceerd. <p>Concrete inhoud van de projecten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Oppompen van schutwater bij sluisen naar het opwaarts pand – pompinstallaties <p>Het voorzien van vaste pompinstallaties op een aantal vaarassen: Het netwerk van Albertkanaal en de Kempense kanalen worden uitsluitend gevoed met water dat afkomstig is uit de Maas, waarvan een deel in gemeenschappelijk beheer met Nederland. Dit maakt dat slechts een deel van het Maaswater ter voeding van deze kanalen kan worden aangewend. Op elk van de 6 sluiscomplexen van het Albertkanaal werd gebouwd/zal worden gebouwd een pompinstallatie waardoor schutverliezen beperkt worden door terugpompen van water van het afwaartse naar het opwaartse kanaalpand... wat resulteert in beperking van waterafname uit de Maas. Deze installaties werden reeds ontworpen. Daarbij is het ontwerp zo opgevat zodat ze, bij voldoende waterbeschikbaarheid, ook in omgekeerde richting als waterkrachtcentrale kunnen werken. In het Blue Deal project wordt de installatie ter hoogte van de sluis in Genk gebouwd.</p> <p>Het Kanaal naar Charleroi wordt gevoed vanuit Wallonië. De afgelopen zomers werden we telkens geconfronteerd met een ontoereikende toevoer, waardoor in eerste instantie moest overgegaan worden tot gegroepeerd schutten, en in tweede instantie tot het instellen van een diepgangbeperking. Door de bouw van pompinstallaties op de 4 sluisen van het kanaal kan deze problematiek vermeden worden en kan de scheepvaart ook in periodes met zeer lage waterbeschikbaarheid blijven doorgaan.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Voor de eerstvolgende zomers wordt in afwachting van de bouw van de vaste installaties voorzien in de huur van mobiele pompen.

In de Durmevallei is de bouw van 2 pompstations voorzien in de verdere realisatie van de Sigmagebieden Groot Broek en Klein Broek. Ze voorzien om het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten naar de Durme gecontroleerd af te voeren, alsook om de waterstand in het Sigmagebied Groot Broek te reguleren.

De bouw van deze 2 pompstations biedt zowel een remediëring tegen de wateroverlast in de winterperiode in de Durmevallei (bij hoogtij en piekwaterstanden), als een remediëring tegen verdroging in de zomerperiode (sponswerking en verhoging grondwaterstanden in Groot Broek).

2. Dichting sluisdeuren zodat geen lekverliezen optreden – renovatie sluisdeuren

Uit patrimoniuminspecties blijken de lekverliezen ter hoogte van een reeks sluisdeuren niet verwaarloosbaar. Door een overwogen combinatie van renovatie/vervanging van deuren en modernisering van de bewegingsmechaniek zullen deze lekverliezen tot een minimum beperkt worden.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	36.740.000 EUR
Output	7 bijkomende vaste pompinstallaties, aanpak van 3 sluiscomplexen met structurele herstellingswerken ter vermindering van lekverliezen.
Outcome	Verminderd verlies van water, Verbeterde waterallocatieopties, vergroten van de waterreserve, Verhoogde productie duurzame energie, Verbeterde afstemming waterallocatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none">- De werken voor het vervangen van de sluisdeuren te Boezinge werden afgerond.- Het contract voor de huur van mobiele pompen is in 2021 afgesloten, de droogtesituatie van 2019 indachtig. In afwachting van de bouw van vaste pompinstallaties bij de sluizen langs het Kanaal naar Charleroi worden via dit contract telkens wanneer nodig mobiele pompen gehuurd. Op die manier kan een stremming van het scheepvaartverkeer in droogteperiodes worden vermeden.- In de Durmevallei is de bouw van twee pompinstallaties in uitvoering ter hoogte van het Sigmagebied Groot Broek. Deze installaties zullen ervoor zorgen dat het bovenstroomse hemelwater van beken en grachten kan worden afgevoerd naar de Durme, alsook dat de waterstand in het Groot Broek kan worden gereguleerd.- Voor de herstellingen aan de sluis Ooigem zijn de werken gegund en lopen de voorbereidende werken en onderzoeken.- De aanbestedingsprocedure voor de bouw van vier pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi werd afgerond en de aannemer is gestart. Het einde van de werken is voorzien in Q1 2024.- De omgevingsvergunning voor de bouw van een pompinstallatie ter hoogte van de sluis te Genk is ontvangen. Effectieve start van de werken is voorzien in Q1 2023.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	- De aanbestedingsprocedure voor het vervangen van de sluisdeuren van de sluis te Briegden-Neerharen is niet afgerond in 2022. Als alternatief werd de eerste fase van het project 'Renovatie sluisdeuren Zemst' toegevoegd. De aanbesteding van dit dossier is rond en de werken starten in Q1 2023.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Vervangen sluisdeuren Boezinge Dorp	2021 Q4	Gerealiseerd	
Contract huur mobiele pompen in afwachting van ingebruikname effectieve pompen	2022 Q4	Gerealiseerd	
Renovatie sluisdeuren Zemst	2023 Q1	Op schema	De start van de werken voor het plaatsen van een nieuwe schipdeur is voorzien voor Q1 2023.
Structurele herstelling sluis Ooigem	2023 Q3	Vertraging	De oplevering is uitgesteld van Q4 2022 naar Q3 2023. Voor de renovatiewerken moet de sluis drooggezet worden en kunnen er gedurende een periode geen schepen geschut worden. Intensief overleg met stakeholders is hiervoor lopende. De planning van de werken is i.f.v. dit overleg.
Pompinstallaties Durme t.h.v. Groot Broek (2 pompinstallaties)	2023 Q4	Op schema	
Pompcapaciteit Albertkanaal / Pompcapaciteit Albertkanaal: Wijnegem	2023 Q4	Stopgezet	Wegens de hogere kostprijs van een aantal relanceprojecten als gevolg van de stijging van de materiaal- en grondstoffenprijzen wordt dit project verschoven naar 2023 en gefinancierd met reguliere middelen.
Pompinstallaties Kanaal Brussel-Charleroi (4 pompinstallaties)	2024 Q1	Op schema	
Pompcapaciteit Albertkanaal (Genk): Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale ter hoogte van het sluisencomplex (1 pompinstallatie)	2024 Q4	Vertraging	De opstart van de werf heeft vertraging opgelopen waardoor de timing van de oplevering geactualiseerd werd tot Q4 2024.
Vervangen sluisdeuren sluisen Briegden en Neerharen	2025 Q4	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer gedragen op relancemiddelen en wordt daarom stopgezet binnen deze relancerapportering.

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Voltooiing van Blue Deal-project: herstelling aan sluizen ter reductie/voorkomen van lekverliezen	4	2026 Q2	1	25 %
Voltooiing van Blue Deal-project: bouw van vaste pompinstallaties	7	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	36.740.000 EUR
Uitvoering VAK	36.740.000 EUR
Uitvoering VEK	7.003.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 33.900.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.840.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Ondernemingen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Uit recente kaarten die gemaakt werden op basis van satellietbeeldenonderzoek blijkt dat België één van de Europese landen is die het zwaarst getroffen worden door de extreme droogte. Ons grondwater staat een pak lager dan normaal en daarmee doen we het slechter dan bijvoorbeeld Spanje en Zuid-Italië. Bijna de helft van onze oppervlakte staat in het diepste rood.</p> <p>Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering die droogte en waterschaarste aanpakken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • op een structurele manier; • met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten; • met betrokkenheid van de industrie als deel van de oplossing; • met een duidelijke oproep naar de lokale besturen om ook inspanningen te doen. <p>Doelstelling van dit project is ondernemingen aan te zetten tot investeringen in innovatieve waterbesparende technologieën precies om zich te wapenen tegen waterschaarste en zich minder waterafhankelijk te maken. Dat doen we door bijkomend 10 miljoen euro te voorzien op de twee ecologiesteunmaatregelen, met name Ecologiepremie Plus (EP Plus) en Strategische Ecologiesteun (STRES), van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, specifiek voor waterbesparende projecten, door oproepen te lanceren voor waterbesparende projecten die niet subsidieerbaar zijn onder EP Plus of STRES, en ten slotte door waterscans aan te bieden aan ondernemingen die hun waterhuishouding en de potentiële winsten daarop in kaart brengen.</p> <p>1) De EP Plus is een laagdrempelig steuninstrument om innovatieve maar gestandaardiseerde (breed uitrolbare) ecologische technologieën te ondersteunen. Via een applicatie kan een onderneming een steunaanvraag indienen voor een technologie die op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL), de lijst met steunbare technologieën, staat. Deze lijst evolueert en is vraaggestuurd, met andere woorden technologieën komen op de lijst doordat een leverancier of een investerende onderneming een aanvraag doet om een nieuwe technologie op de lijst te laten zetten. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) beoordeelt vervolgens het ecologisch voordeel, de meerkost en het steunpercentage op basis van de kosteneffectiviteit.</p> <p>Los van de technologieën met betrekking tot waterbesparing die vandaag al op de lijst staan, bevraagt het Agentschap Innoveren & Ondernemen proactief de markt in de zoektocht naar nieuwe technologieën om op de lijst te zetten. Bovendien werd de EP Plus-technologieënlijst aangepast zodat de waterbesparende technologieën meer steun kunnen krijgen. Op die manier stimuleren we nog meer investeringen in relevante technologieën en schakelen we een</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

versnelling hoger in het tegengaan van droogte en waterschaarste.

2) STRES anderzijds is een steuninstrument voor bedrijfsspecifieke, innovatieve investeringen die, omwille van hun bedrijfsspecifieke karakter, niet standaardiseerbaar of breed uitrolbaar zijn. Ook deze steunmaatregel staat open voor waterbesparende dossiers.

3) De oproepen 'waterbesparende investeringen' (BDEW) staan open voor kmo's die waterbesparende projecten zullen realiseren die omwille van hun niet-innovatieve karakter niet passen onder EP Plus of STRES. Deze oproepen zijn op die manier een brede en laagdrempelige aanvulling op de reguliere ecologiesteun.

4) De waterscans ten slotte brengen de waterhuishouding van een onderneming in kaart alsook waar er winsten behaald kunnen worden, niet alleen door het besparen op de waterafname, maar ook door het anders inzetten van (bijvoorbeeld proces)water. Een basisscan, die al goed beeld geeft en duidelijk maakt of een uitgebreide scan aangewezen is, wordt gratis aangeboden, terwijl de onderneming zelf een deel bijdraagt voor de uitgebreide scan.

Met deze aanpassingen van de ecologiesteun, gericht op het sterker stimuleren van (kleinere) ondernemingen tot investeringen in waterbesparende technologieën, een proactieve benadering van bedrijven via clusterorganisaties en andere overheidsinstellingen die werken rond de waterproblematiek bij bedrijven en het in de markt zetten van nieuwe, watergerichte steuninstrumenten, willen we meer (waterintensieve) bedrijven aanzetten tot waterbesparende investeringen zodat zij op die manier een structurele bijdrage kunnen doen aan de strijd tegen droogte en waterschaarste.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 15 goedgekeurde dossiers voor waterbesparende projecten
Outcome	Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen Duurzamer watergebruik via alternatieve bronnen Verhoogd gebruik van proceswater Nieuwe waterbesparende technieken en technologieën Verhoogde bewustwording duurzaam watergebruik

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Alle doelstellingen van dit Blue Deal-project, met name:</p> <ul style="list-style-type: none">• het openstellen van Strategische Ecologiesteun en Ecologiepremie Plus voor waterbesparende investeringen• het lanceren van een oproep voor kmo's voor waterbesparende investeringen, de oproep Blue Deal Waterbesparende Investerings (BDEW)• het aanbieden van waterscans aan ondernemingen <p>en met als finale doel het wapenen van ondernemingen tegen waterschaarste werden gerealiseerd. Op die manier werd 10 miljoen euro besteed aan meer dan 100 waterbesparende projecten, vier keer meer (projecten) dan vooropgezet.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie nodig

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opzetten EP Plus en STRES voor waterbesparingsdossiers	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opzetten eerste oproep waterbesparingsdossiers	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opzetten volgende call(s) waterbesparingsdossiers	2022 Q2	Gerealiseerd	
Aanbieden van waterscans aan ondernemingen	2022 Q3	Gerealiseerd	
Tien miljoen euro steunbudget gealloceerd aan kwalitatieve projecten	2022 Q4	Gerealiseerd	
Start van projecten voor versterking van biodiversiteit en/of mitigatie van gevolgen van klimaatverandering	2023 Q2	Gerealiseerd	
Voltooiing van Blue Deal-projecten	2026 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde dossiers voor waterbesparende projecten	15	2022 Q4	100	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.942.000 EUR
Uitvoering VEK	1.443.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 10.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven en steun voor onderzoek in de landbouwsector](#)

[Ternota aan de Vlaamse Regering van 22 april 2022. Blue Deal - Ecologiesteun aan bedrijven in het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht](#)

VR 16 december 2022 - 907.000 euro strategische ecologiesteun Inovyn Manufacturing Belgium nv in Antwerpen

VV028 - DROOGTERESISTENTE TEELTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Inzetten op onderzoek en innovatie productie, afzet en verwerking van droogteresistente teelten. Ketenpaanpak voorzien, gaat om nieuwe teelten zoals plantaardige eiwitten.</p> <p>a) Project : "slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw". De plantaardige praktijkcentra in Vlaanderen zullen zich verenigen om een project uit te voeren gericht op enerzijds een innovatie-gedreven waterefficiëntie in land- en tuinbouw en anderzijds op een aanpassing van de teeltkeuze en/of teeltplan van de landbouwers.</p> <p>b) Oproep droogteresistente teelten – eiwitten De projectoproep 'Realisatie Eiwitstrategie' helpt concrete initiatieven i.k.v. de zes doelstellingen van de eiwitstrategie uit te voeren en de huidige knelpunten, zoals afzetontwikkeling, weg te werken. Bij deze initiatieven staat samenwerking tussen diverse partners in de eiwitketen voorop, waardoor duurzame eiwitketens opgezet en uitgebouwd worden. De projecten moeten bijdragen tot de verduurzaming en verbreding van het eiwitaanbod in Vlaanderen.</p> <p>c) project 'FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer'. Dit project heeft als doel de Vlaamse landbouw weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering door te focussen op adaptatie van gewassen aan droogte en verzilting. Binnen het project wordt geïnvesteerd in bijkomende gespecialiseerde infrastructuur die moet toelaten om de knowhow in Vlaanderen te versterken rond plantenveredeling met focus op droogtetolerantie en zoutstresstolerantie van bestaande of innovatieve gewassen en cultivars enerzijds en het modelleren van de impact van droogte op gewasopbrengsten anderzijds.</p> <p>Voor de financiering van VV181 Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij werd het budget van enkele VV-projecten herschikt: o.m. 496.000 euro van VV028.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	7.504.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	a) 12 deelnemende partners aan het samenwerkingsverband Praktijkcentra Plant in kader van het project "slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw" b) 16 projecten die een minimumscore op de beoordelingscriteria behalen en worden geselecteerd c) 1 project FutureAdapt van EV ILVO
Outcome	- Verminderd gebruik van kwetsbare bronnen - Verhoogd aandeel droogteresistente teelten - Bevorderde data- en kennisuitwisseling - Verhogen bevoorradingszekerheid voedingsnijverheid - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	a) project van samenwerkingsverband 'Praktijkcentra Plant' in uitvoering b) oproep en selectie projecten oproep eiwitstrategie afgerond. Projecten in uitvoering c) project 'Future Adapt' in uitvoering vanaf 2022
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring door VR van project 'slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'	2021 Q2	Gerealiseerd	
het project 'slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw' is gerealiseerd	2023 Q4	Op schema	
de oproep voor projecten 'realisatie eiwitstrategie' is gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
de selectie projecten 'realisatie eiwitstrategie' is afgerond	2022 Q1	Gerealiseerd	De selectie van de projecten is afgehandeld.
de geselecteerde projecten zijn uitgevoerd	2025 Q4	Op schema	Projecten zijn geselecteerd en de uitvoering kan worden gestart overeenkomstig de voorziene uitvoeringsperiode van de respectieve projecten.
Goedkeuring door VR van project 'FutureAdapt' van Eigen Vermogen ILVO	2021 Q2	Gerealiseerd	
het project 'FutureAdapt' is gerealiseerd	2024 Q4	Op schema	Uitvoering zoals voorzien in het project vanaf startdatum 1 januari 2022.

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
a)- deelnemers aan het samenwerkingsverband 'Praktijkcentra Plant' in kader van het project 'Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'	12	2023 Q4		
c)- project 'FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer'	1	2024 Q4		
b)- aantal projecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt geselecteerd	16	2025 Q4	19	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.504.000 EUR
Uitvoering VAK	5.291.000 EUR
Uitvoering VEK	1.199.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.504.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021: subsidie praktijkcentra plant (DOC VR2021 1607 VV DOC.0113/1bis)</p> <p>nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021: FutureAdapt (DOC VR2021 1607 VV DOC.0131/1bis)</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Bestedingskader middelen Projectoproep Realisatie Eiwitstrategie</p> <p>nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022: bijzondere aanpassingssteun voor landbouwers die getroffen worden door marktverstoring ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne</p>

VV029 - GROENE INVESTERINGEN OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>a) pré-ecoregelingen</p> <p>Er wordt aan landbouwers de kans geboden om een of meerdere nieuwe verbintenissen aan te gaan voor een termijn van 1 jaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - de inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel van minimum 30 are - ecologisch beheer van grasland op een landbouwperceel van minimum 30 are - de inzaai van milieu-, klimaat-, en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel van minimum 30 are - toepassing van precisielandbouw per perceelniveau - het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via het teeltplan <p>b) groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven</p> <ul style="list-style-type: none"> - productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven - niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven (investeringen waar de economische meerwaarde onbestaande is of zeer beperkt is) <p>Zowel binnen VLIIF productieve en niet-productieve investeringen wordt voorrang gegeven aan investeringen die de waterkwaliteit en/of –kwaliteit ten goede komen.</p> <p>Voor de financiering van deze initiatieven werd 4.536.000 euro herschikt vanuit VV102 naar VV029</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	14.536.000 EUR
Output	<p>a) pré-ecoregelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - oppervlakte met verbintenis 'inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel' - oppervlakte met verbintenis 'ecologisch beheer van bestaand grasland op een landbouwperceel' - oppervlakte met verbintenis 'inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel' - oppervlakte percelen met toepassing van precisielandbouw per perceelniveau - oppervlakte met verbintenis 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via teeltplan'

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	b) groene investeringen - Aantal productieve investeringen in land- en tuinbouwbedrijven - Aantal niet-productieve investeringen in land- en tuinbouwbedrijven
Outcome	- Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Verhoogde waterretentie in de bodem - Verhoogde koolstofopslag in de bodem - Verhoogde infiltratie - Stimulans alternatieve verdienmodellen in de landbouw - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	a) pré-ecoregelingen: De aanvragen zijn ingediend. Subsidiebesluiten zijn ondertekend. b) groene investeringen goedkeuring aanvraagdossiers afgerond.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
pré-ecoregelingen: regelgeving goedgekeurd	2021 Q4	Gerealiseerd		
pré-ecoregelingen: aangaan verbintenissen	2022 Q2	Gerealiseerd	aanvragen zijn ingediend	
pré-ecoregelingen: verbintenissen uitgevoerd	2023 Q2	Op schema		
pré-ecoregelingen: aanpassing regelgeving goedgekeurd	2022 Q3	Gerealiseerd	regelgeving op administratief niveau afgerond, goedkeuringsprocedure is doorlopen.	
goedkeuring dossiers productieve en niet-productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	2022 Q4	Gerealiseerd		
personeel is aangeworven	2021 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
oppervlakte met een verbintenis 'ecologisch beheer van bestaand grasland op een landbouwperceel' (ha)	3.940	2022 Q4	15.737	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
oppervlakte met een verbintenis 'inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel' (ha)	3.380	2022 Q4	376	11,12 %
oppervlakte percelen met toepassing van precisielandbouw per perceelniveau (ha)	25.500	2022 Q4	104.555	100 %
oppervlakte met een verbintenis 'inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel' (ha)	3.000	2022 Q4	2.234	74,47 %
oppervlakte met een verbintenis 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via teeltplan' (ha)	50.000	2022 Q4	18.759	37,52 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	14.536.000 EUR
Uitvoering VAK	13.622.000 EUR
Uitvoering VEK	48.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 14.536.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 september 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit](#)

[Advies van de Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Bestedingskader middelen Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds \(VLIF\)](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit en tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaan reducerend effect aan melkvee](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit en tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Bijlage](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 30 september 2022 betreft Relanceplan Vlaamse Veerkracht project VV029. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteiten tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2022 tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit en tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2022. Advies van de Raad van State](#)

VV030 - HERGEBRUIK VAN RESTWATER

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>a) De projectoproep “Hergebruik Restwater” en individuele projecten willen het hergebruik van restwater in de land- en tuinbouwsector stimuleren. Hier wordt ingespeeld op de uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende waterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. De projecten moeten bijdragen tot het verhoogd aanwenden van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik.</p> <p>Samenwerkingsverbanden tussen landbouwers met een watervraag enerzijds en aanbieders van restwater anderzijds kan leiden tot een win-win situatie. De landbouwsector verhoogt zo de bevoorradingszekerheid voor water, terwijl hergebruik van restwater ook zorgt voor een afname van de druk op kwetsbare waterbronnen.</p> <p>b) aanvullend dossier Aquafin wordt financieel via beleidsdomein OMG afgehandeld.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	- 9 projecten die een minimumscore op de beoordelingscriteria behalen en worden geselecteerd - dossier Aquafin
Outcome	- Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Verduurzamen watergebruik via alternatieve bronnen - Vergroten van de waterreserve - Verhogen bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven - Bevorderde data- en kennisuitwisseling

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
oproep voor projecten is gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
de selectie van de projecten is afgerond	2022 Q1	Gerealiseerd	de projecten zijn goedgekeurd
geselecteerde projecten zijn uitgevoerd	2025 Q4	Nog niet gestart	
overkoepelende studiedag en brede kennisdeling	2025 Q4	Stopgezet	
personeel is aangeworven	2021 Q4	Gerealiseerd	
uitbesteding behandeling dossiers na 2022	2022 Q4	Gerealiseerd	
opdracht Aquafin hergebruik restwater in de land- en tuinbouw uitgevoerd	2024 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal projecten dat wordt ondersteund	9	2025 Q4	6	66,66 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.151.000 EUR
Uitvoering VEK	90.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

nota aan de Vlaamse Regering van 2 december 2022 : subsidie hergebruik restwater VV030

nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022: subsidie hergebruik restwater en studie VV 030

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Bestedingskader middelen Projectoproep Hergebruik Restwater](#)

VR 9 december 2022 - Subsidies duurzaam watergebruik en overheidsopdracht studie naar 'Groenblauwe business modellen voor landbouwers'

VR 16 december 2022 - Restwater voor land- en tuinbouw - bijkomende opdracht Aquafin nv

VV031 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR IN DE BEBOUWDE OMGEVING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met dit relanceproject wil de Vlaamse overheid groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving versneld stimuleren en ondersteunen binnen het Vlaams adaptatiebeleid. Het vanuit het departement Omgeving eerder geïnitieerde programma 'Vlaanderen breekt uit' zal gebruikt worden om de acties en maatregelen van dit project op te zetten.</p> <p>Met de oproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte' worden maximaal 15 ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen geselecteerd die voorbeeld stellend willen zijn voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie van de Vlaamse regering. De bedoeling is om ter beschikking te staan voor vragen van deze steden en gemeentes en om samen met hen op zoek te gaan naar de projecten met de grootste meerwaarde voor de doelstellingen uit de Blue Deal.</p> <p>De geselecteerde steden en gemeentes zullen in kader van de oproep enerzijds minstens 3 quick-win projecten realiseren binnen de drie jaar. Met de quick-wins realiseren de gemeenten een significante toename van groen en blauw binnen de bebouwde omgeving. Daarnaast zal de gemeente een concreet uitvoeringsdossier moeten opstellen voor een transformatieproject dat een structurele ruimtelijke transformatie realiseert voor groenblauwe dooradering, klimaatadaptatie, waterretentie en -infiltratie en een grotere meerwaarde biedt voor de lokale leefomgevingskwaliteit. Belangrijk bij al deze projecten is het hefboomeffect dat ze hebben voor de ruimere omgeving.</p> <p>Door het engagement van lokale besturen voor verankering van een onthardingsvisie in de lokale beleidsplanning en door het opnemen van een ambassadeursrol voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie, wordt een structurele aanpak van deze beleidsvoornemens in de toekomst gegarandeerd. Ze betrekken hierbij doelgroepen en stakeholders met als doel een breed draagvlak te creëren in de regio voor groenblauw en klimaatadaptatie.</p> <p>Een vervolgooproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0' worden nog meer lokale besturen gestimuleerd om ook een project in te dienen. Ze worden ondersteund om 1 tot 3 quick-wins vergelijkbaar met de eerste oproep uit te voeren.</p> <p>Om een onthardings- en vergroeningsgolf op gang te brengen, worden bovendien verenigingen en intercommunales ondersteund in de realisatie van projecten die zorgen voor ontharding en vergroening en zo onder meer droogte tegengaan. Dit via de oproep 'groenblauwe parels'. Zo ontstaat een grotere coalitie van actoren die actief de bebouwde</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

omgeving klimaatadaptief willen inrichten.

Deze oproep richt zich op kleine en middelgrote projecten rond ontharding en vergroening met aandacht voor de droogteproblematiek van de bodem o.a. via een betere waterinfiltratie in de bebouwde omgeving. Er wordt ingezet op zowel private als publieke delen van terreinen. Opdat de projecten een grote voorbeeldfunctie zouden hebben, wordt er gekozen voor terreinen met een grote zichtbaarheid voor verschillende doelgroepen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	20.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> • 30 quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 2,5 jaar en maximaal 27 quick-win projecten gerealiseerd binnen de drie jaar. • 10 uitvoeringsdossiers (inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor ruimtelijke transformatieprojecten gericht op groenblauwe dooradering zijn uitgewerkt en klaar voor uitvoering • minstens 45 kleine en middelgrote projecten zijn gerealiseerd • 1 Vlaams-brede campagne en leertraject gelanceerd rond groenblauwe dooradering en ontharding
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Verminderde afvoer van hemelwater • Verhoogde infiltratie • Verhoogde grondwatervoorraad • Temperatuurregulatie • Meer groen en biodiversiteit • Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit • Draagvlakcreatie voor groenblauw en klimaatadaptatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse Regering keurde op 13 mei 2022 de ondersteuning goed van de projecten van tien steden en gemeenten, die geselecteerd werden als resultaat van de eerste projectoproep 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte'.</p> <p>De oproepen 'groenblauwe parels' en 'groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte 2.0' werden begin april 2022 gelanceerd, voorstellen konden ingediend worden tot augustus 2022 en de beslissing werd genomen november 2022. De projecten zijn nu grotendeels in uitvoering, de projecten die nog niet gestart zijn, hebben tijd tot 3 mei 2023 om op te starten.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Groenblauwe infrastructuur: lancering oproep 2021 naar lokale besturen	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering oproep groenblauwe parels		2022 Q2	Gerealiseerd	
Selectie van 10 steden en gemeenten op basis van de ingediende voorstellen		2022 Q2	Gerealiseerd	
Start begeleidingstraject, inhoudelijke studie en procesbegeleiding gebiedsprogramma's		2022 Q2	Gerealiseerd	
10 masterplannen, financiële plannen, en overeenkomsten met partners voor transformatieprojecten zijn uitgewerkt		2024 Q4	Op schema	
Realisatie van 30 quick-win projecten (2,5 jaar)		2024 Q4	Op schema	
Realisatie van maximaal 27 quick-win projecten (3 jaar) rond ontharding en vergroening in de bebouwde omgeving		2026 Q1	Op schema	
Realisatie van minstens 45 kleine en middelgrote projecten (3 jaar) rond ontharding en vergroening in de bebouwde omgeving		2026 Q1	Op schema	
10 uitvoeringsdossiers voor complexe transformatieprojecten opgestart en in realisatie		2026 Q3	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vlaams-brede campagne gelanceerd rond groenblauwe dooradering en ontharding	1	2023 Q4		
Aantal quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 2,5 jaar	30	2024 Q4		
Quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 3 jaar	27	2026 Q1		
Realisatie van kleine en middelgrote projecten rond ontharding en vergroening in de bebouwde omgeving	45	2026 Q1		
Aantal uitgewerkte uitvoeringsdossiers (inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor ruimtelijke transformatieprojecten gericht op groenblauwe dooradering	10	2026 Q3		
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR			
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	19.522.000 EUR
Uitvoering VEK	1.380.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 20.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving</p> <p>Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving: 10 subsidiebesluiten: 13 mei 2022 op voorstel van Vlaams minister Zuhail Demir (niet publiek beschikbaar)</p> <p>VR 28 oktober 2022 - Groenblauwe infrastructuur - ontharden en vergroenen binnen lokale besturen</p>

VV032 - INNOVATIEVE PROJECTEN CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN SLIMME MEETNETTEN EN DATASYSTEMEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Belanghebbenden	bedrijven, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, rioolbeheerders, drinkwatermaatschappijen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.</p> <p>Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het inzetten op een meer duurzaam watergebruik onder meer door het aanspreken van alternatieve waterbronnen, een slimme sturing in waternetwerken en buffers.</p> <p>Dit project bestaat uit onderstaande onderdelen. Het project wordt integraal gerealiseerd met relancemiddelen.</p> <h3>1. Proeftuinen Droogte</h3> <p>Via de proeftuinen droogte worden bedrijven die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, gesubsidieerd bij de concrete uitvoering van hun project. De selectie van de meest innovatieve en effectieve gebeurt na een algemene oproep. Om complementair te zijn aan bestaande ondersteuningsmogelijkheden voor bedrijven en landbouwbedrijven wordt deze subsidie benut voor samenwerkingsverbanden van minstens 3 bedrijven.</p> <p>Zowel in 2019 als 2020 kregen bedrijven reeds de kans om voorstellen in te dienen en werden resp. voor 4 miljoen en 3,2 miljoen subsidies toegekend.</p> <p>Via dit nieuwe initiatief zullen ook in 2021 en 2022 soortgelijke oproepen worden gelanceerd en zullen projecten worden gesubsidieerd. Het voorziene subsidiebudget bedraagt 4 miljoen per jaar.</p> <h3>2. Call circulair water: grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van bestaande buffers en optimale benutting van effluent</h3> <p>Via dit initiatief worden in de praktijk projecten ondersteund die:</p> <ul style="list-style-type: none">- zorgen dat hemelwaterbuffers door een slimme sturing optimaler kunnen worden ingezet- grootschalige collectieve buffers realiseren om zo een oplossing te bieden aan bestaande of potentiële watertekorten of suboptimaal watergebruik- Effluent op een duurzame manier inzetten om te voldoen aan een lokale watervraag, dus zonder de ecologie van de

PROJECTOMSCHRIJVING

ontvangende waterloop te hypothekeren of aanleiding te geven tot intensief transport over de weg van water. Een aantal interessante piloten worden geselecteerd en op het terrein geïmplementeerd.

Voor dit initiatief wordt over de periode 2021-2022 een subsidiebudget van 16 miljoen euro uitgetrokken.

3. Automatisatie meetnetten oppervlaktewater en grondwater

Via dit initiatief worden de nodige investeringen uitgevoerd om de bestaande meetnetten performanter te maken door het fijnmaziger te maken en de stap te zetten naar digitale monitoring en datavergaring om in periodes van droogte het nemen van goed onderbouwde (beleids)beslissingen op lokale of regionale schaal te faciliteren. De data-ontsluiting is hierbij ook voorzien.

Het voorgestelde Blue Deal project draagt bij aan het effectiever en efficiënter beheer van de zoetwaterreserves zowel voor grond- als oppervlaktewater bij droogte en waterschaarste, het gericht monitoren van het oppervlaktewater in functie van o.a. waterproductiecentra, het opvolgen van verzilting, het in kaart brengen van milieu-incidenten en het onderbouwen van het waterbeleid.

Het initiatief omvat volgende concrete onderdelen:

- De automatisatie van het kwaliteitsmeetnet oppervlaktewater door de inzet van onder meer multiparametersondes en geautomatiseerde monsternametoestellen; De aankoop van de hardware gebeurt in 2022, het bijbehorende beheer wordt ingezet over een periode van drie jaar vanaf 2022.
- De automatisatie van grondwaterpeilmetingen en de uitbreiding van het grondwatermeetnet: De installatie van de automatische peilmeetsondes wordt gespreid over 2021-2023. De uitbreiding van het meetnet is voorzien voor 2022.
- De uitbreiding van het laagwatermeetnet waterlopen: Hiervoor worden in 2022 de nodige investeringen voorzien.

4. Slimme datasystemen VMM

We investeren in slimme datasystemen voor water waarin we informatie over het watersysteem en de waterketen samenbrengen en toegankelijk maken voor specifieke eindgebruikers: lokale besturen, waterbeheerders, kennisinstellingen, sectorale stakeholders, De watersysteemdata en -informatie worden gebiedsgericht aangeboden via meerdere ingangen, voorstellingswijzen en communicatiekanalen zoals loketten en tools, interactieve indicatoren, dataportalen, Alle data worden aangeboden als 'open data' zodat externe partijen er bijkomende services rond kunnen ontwikkelen. De slimme datasystemen worden gerealiseerd door de bestaande portalen met watergerelateerde data zoals Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), Waterinfo en het Klimaatportaal verder uit te bouwen en met elkaar te koppelen of te integreren. Daarnaast zullen een aantal nieuwe modules opgezet worden rond waterkwaliteit, waterbeleving en drinkwater. De technische uitwerking van de modules zal uit efficiëntie-overwegingen zo veel mogelijk gekoppeld en geïntegreerd verlopen. Op die manier groeien we toe naar één slim waterplatform.

5. Slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin

Met dit project wordt het hoofdnetwerk van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen omgevormd tot een slim net. De infrastructuur wordt uitgebreid met een "digitale laag" die in staat is een nieuwe functie te vervullen in het kader van de klimaatverandering en meer bepaald de strijd tegen droogte.

Via het project worden concrete initiatieven genomen omtrent het digitaal meten en regelen van de bovenlokale hemel- en afvalwaterinfrastructuur. We maken werk van het optimaal verzamelen, delen en combineren van data tot kennis, inzichten en slimme sturingen. Het project ambieert de digitalisering van de infrastructuur om via real-time monitoring en simulaties naar predictieve modellering en slimmere sturingen een efficiënt en ecologisch antwoord te bieden op klimaatuitdagingen maar ook tegelijk op energie management reducties, vuilvrachtreductie en veiligheidspreventie van alle betrokkenen die op de infrastructuur toegang nodig hebben.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	44.049.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - 15 projecten gerealiseerd in het kader van de proeftuinen Droogte - 8 projecten gerealiseerd in het kader van de call circulair water - 14 bijkomende automatische meetpunten oppervlaktewaterkwantiteit beschikbaar - 200 automatische meetpunten grondwater incl dataontsluiting beschikbaar - 180 automatische meetpunten voor oppervlaktekwaliteit gerealiseerd - 2 nieuwe en 2 geoptimaliseerde modules binnen het nieuwe dataportaal water gerealiseerd - nieuwe automatiseringsarchitectuur en het smart data platform bij Aquafin beschikbaar
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering infrastructuur • Verbeterde werking watersysteem via slimme sturing • Bevorderde data- en kennisuitwisseling • Verduurzaamd watergebruik via alternatieve bronnen • Verhoogd gebruik van proceswater • Snellere detectie van calamiteiten • Verbeterde onderbouwing waterbeleid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Half maart werd een nieuwe oproep voor de Proeftuinen Droogte 2022 gelanceerd. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat op een duurzame manier bedrijfsverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, konden een subsidieaanvraag indienen. Er werden 11 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 4,77 miljoen euro aan subsidie. De call circulair watergebruik werd half februari afgesloten. Voor het luik 'grootschalig hergebruik van hemelwater' werden 21 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 3,77 miljoen euro aan subsidie. Voor het luik 'hergebruik RWZI-effluent' werden 5 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 11,29 miljoen euro aan subsidie.</p> <p>In het kader van de automatisatie van het laagwatermeetnet zijn de nodige aanbestedingen gebeurd. In het totaal zullen er op 9 meetlocaties aanpassingen aan de meetsecties gebeuren. Daarnaast zullen in de loop van 2023 187 IoT modules geïnstalleerd worden op waterlopen in het beheer van de VMM en de 5 provincies voor de realtime meting van de peilen.</p> <p>De opdracht voor de automatisatie van het grondwatermeetnet is aanbesteed en van start gegaan. De automatische meting van 440 mono- en multilevel grondwaterputten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, is voorzien. In een eerste fase worden 3 pilootinstallaties gebouwd. Daarnaast is ook de opdracht voor het uitbreiden van het freatisch grondwatermeetnet voor de opvolging van de grondwaterstandsindicator gegund. Hiertoe worden ca 50 bestaande meetputten met een gelijkgrondse afwerking omgevormd naar een bovengrondse afwerking, zodat een automatische opvolging van de grondwaterstanden mogelijk wordt. Daarnaast wordt ook het primair grondwatermeet met 13 meetpunten uitgebreid op locaties waar een hogere ruimtelijke meetresolutie noodzakelijk is. Ook deze opdracht is gegund.</p> <p>Voor de automatisering van het oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnet zijn 2 aanbestedingen gebeurd voor de levering van ca 170 multiparametersondes. 150 daarvan worden tegen 15/12 geleverd en in 2023 gebruikt voor diverse use cases, waaronder in het kader van de gebiedsgerichte werking.</p> <p>De pilootopzet van het nieuwe dataplatform van de VMM is beschikbaar. Er is een dienstverlener aangesteld om services aan dit platform toe te voegen waarlangs de data aan externen ter beschikking zullen worden gesteld. Er is inmiddels een team aan de slag om een aantal concrete cases te realiseren op dit nieuwe platform, onder andere dynamische waterlichaamdashboards die</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>op termijn statische rapporten gaan vervangen. Voor wat betreft de uitbreiding van bestaande platformen, is er een toekomstvisie voor waterinfo in opmaak, wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het klimaatportaal met grondwaterdata en is de ontwikkeling van de bemalingstool binnen de Databank Ondergrond Vlaanderen lopende.</p> <p>De uitwerking van de slimme hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur is van start gegaan. Er is een dataplatform opgezet dat data vanuit verschillende systemen capteert. Eerste slimme sturingen en use cases zijn uitgewerkt en zijn overgedragen aan Operations binnen Aquafin.</p> <p>In de budgetverdeling Blue Deal -Relance die op 23 april 2021 aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd, was voor het voorliggend project VV 32 (Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen) een totaalbudget van 45 miljoen euro voorzien. Doordat onvoldoende kwaliteitsvolle projecten werden ingediend in het kader van de voorziene oproepen circulair Water effluent (VR 21 oktober 2022) en hemelwater (VR 18 november 2022) en de proeftuinen droogte (VR 3 december 2021 en VR 25 november 2022), rest er een budget van 951.000 euro binnen dit project. Dit budget werd herschikt naar het Blue Deal project VV 35 Groenblauwe infrastructuur –waterlopen. De Vlaamse Regering hechtte op 9 december haar goedkeuring aan deze aanpassing van budgetverdeling (Nota VR 2022 0912 VV DOC.0197/1BIS).</p>
Noodzakelijke politieke actie	Geen actie noodzakelijk

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Proeftuinen Droogte: lancering oproep 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Herverdeling middelen uit relanceprovisie + opdracht uitvoering aan Aquafin voor het deelproject slimme afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur Aquafin	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opgezet Aquafin dataplatform in the cloud	2021 Q4	Gerealiseerd	
Call circulair water: lancering oproep	2022 Q1	Gerealiseerd	
Guidelines en catalogustool beschikbaar tbh de data governance bij Aquafin	2022 Q2	Gerealiseerd	
Proeftuinen Droogte lancering oproep 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Selectie projecten circulair water	2022 Q4	Gerealiseerd		
Selectie samenwerkingsverbanden Proeftuinen Droogte oproep 2022	2022 Q4	Gerealiseerd		
Een cloud gebaseerd IoT-dataplatform in gebruik bij Aquafin	2022 Q4	Gerealiseerd		
Uitbreiding volautomatisch meetnet oppervlaktewaterkwantiteit met minstens 14 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2023 Q2	Op schema		
Uitbreiding van het grondwatermeetnet met minstens 10 bijkomende meetplaatsen	2023 Q3	Op schema		
De realisatie van minstens 2 nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal en minstens 2 bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	2023 Q4	Op schema		
Grootschalige connectie van IoT devices met het Aquafin IoT-platform	2023 Q4	Op schema		
de automatisatie architectuur voor een toekomstgerichte sturing is klaar om verder te worden uitgerold op de waterzuiveringsinfrastructuur van Aquafin	2024 Q4	Op schema		
Gartner maturiteitsniveau 3 bereikt voor de data governance bij Aquafin	2024 Q4	Op schema		
Automatische metingen grondwater in minstens 200 putten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2025 Q4	Op schema		
Automatische metingen oppervlaktewaterkwaliteit voor minstens 180 punten incl. ontsluiting meetgegevens via IoT platform	2025 Q4	Op schema		
Een smart data platform en nieuwe automatiseringsarchitectuur is beschikbaar om intelligente sturing van de Aquafin-infrastructuur toe te laten	2025 Q4	Op schema		
Volledige uitvoering projecten call circulair water	2026 Q3	Op schema		
Volledige uitvoering projecten Proeftuinen Droogte door geselecteerde samenwerkingsverbanden	2026 Q3	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
bijkomende automatische meetpunten oppervlaktewaterkwantiteit	14	2023 Q2		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	2	2023 Q4		
Aantal nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal water	2	2023 Q4		
Aantal nieuwe automatische meetpunten grondwater incl dataontsluiting beschikbaar	200	2025 Q4		
Aantal bijkomende automatische meetpunten voor oppervlaktekwaliteit	180	2025 Q4		
Aantal projecten gerealiseerd in het kader van de Proeftuinen Droogte	15	2026 Q3		
Aantal projecten gerealiseerd in het kader van de call circulair water	8	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	45.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	44.049.000 EUR
Uitvoering VAK	44.053.000 EUR
Uitvoering VEK	13.989.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 43.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 749.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving
VR 21 oktober 2022 - Innovatieve Projecten Circulair Watergebruik
VR 18 november 2022 - Subsidie innovatieve projecten Circulair Watergebruik in kader van Blue Deal
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Update van de relancemiddelen die worden voorzien voor het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht

VV033 - SENSIBILISERING, OPLEIDING EN ADVISERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Sensibilisering, opleiding en advisering van land- en tuinbouwers, onder meer door in te zetten op digitalisering (online tools, bedrijfsdata verzamelen en analyseren, ...)</p> <p>a) projectoproepen samenwerking Om de gevolgen van de Covid-19-pandemie op de land- en tuinbouwsector te milderen worden projectoproepen rond samenwerking m.b.t. ondernemerschap, digitalisering en kennisdeling gelanceerd. De samenwerkingsprojecten beogen oplossingen voor water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënter beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook kunnen zij gericht zijn op een digitale transformatie met het oog op het verhogen van veerkracht en ondernemerschap van bedrijven.</p> <p>b) bodempaspoort Met het bodempaspoort zal een digitaal en gebruiksvriendelijk instrument ontwikkeld worden en aangeboden worden aan de landbouwer, waarbij bodemdata uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier en op perceelsniveau worden samengebracht. Op die manier wordt de landbouwer gestimuleerd om een data-gedreven, gericht en meer duurzaam bodembeheer uit te voeren.</p> <p>Voor de financiering van VV181 Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij werd het budget van enkele VV-projecten herschikt: o.m. 1.504.000 euro van VV033.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	4.496.000 EUR
Output	a) projectoproepen samenwerking - 15 samenwerkingsprojecten b) bodempaspoort - 1 digitaal instrument
Outcome	- Verminderd watergebruik van kwetsbare bronnen - Toegenomen waterreserve - Digitalisering leer- en adviestrajecten

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	<ul style="list-style-type: none"> - Positie van de landbouwer in de voedselketen versterkt - Verhoogde veerkracht van individuele landbouwbedrijven

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
de projectoproep samenwerking 2021 is gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
selectie projecten i.k.v. oproep 2021 'samenwerking' is afgerond	2022 Q1	Gerealiseerd	
de projecten oproep 'samenwerking' zijn uitgevoerd	2025 Q4	Op schema	
de projectoproep samenwerking 2022 is gelanceerd	2022 Q4	Stopgezet	oproepen samenwerking wordt beperkt tot 1 oproep in 2021, waarbij 82% van het voorziene budget werd toegekend. Resterend budget wordt aangewend i.k.v. maatregelen rond de gevolgen van de Oekraïne-crisis.
bodempaspoort	2023 Q4	Op schema	
personeel is aangeworven	2021 Q3	Gerealiseerd	
uitbesteding behandeling dossiers na 2022	2022 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Oproep samenwerking: aantal samenwerkingsprojecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt gesubsidieerd	15	2023 Q1	14	93 %
Bodempaspoort: digitaal instrument	1	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.496.000 EUR
Uitvoering VAK	3.559.000 EUR
Uitvoering VEK	686.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.496.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Sensibilisering, opleiding en advisering
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 september 2021 (VR 2021 1009 VV DOC.0139/1BIS). Bodempaspoort
Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de visserijsector als gevolg van de situatie in Oekraïne
Besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de visserijsector als gevolg van de situatie in Oekraïne

VV034 - VLAGGENSCHIPPROJECTEN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Vlaamse Milieumaatschappij - De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Lokale besturen, waterbeheerders, terreinbeherende verenigingen, landbouwers, private eigenaars, ...

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering onder andere inzetten op natuurgebaseerde oplossingen om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving toekomstgericht te herstellen. Met die aanpak beoogt ze integrale oplossingen uit te werken die de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit verhogen, die helpen om de impact van klimaatverandering op te vangen en te milderen, en die bijdragen tot o.a. aanvulling van de grondwatertafel, biodiversiteitsherstel en een verhoogde koolstofopslag. In het kader van de relance-investeringen werden vier gebieden in Vlaanderen geselecteerd als 'vlaggenschip'projecten om deze integrale, natuur-gebaseerde aanpak versneld te ontwikkelen en te realiseren.</p> <p>Tijdens de periode 2021–2024 wordt in die vier projectgebieden versneld en op grote schaal ingezet op concrete terreinrealisaties. Het betreft het kustduinencomplex (West-Vlaanderen), Rivierherstel Leie (West- en Oost-Vlaanderen), Vallei van de Kleine Nete (Antwerpen) en het brongebied van de Zwarte Beek (Limburg). Gezamenlijk bestrijken die vier projecten een breed spectrum van specifieke wateruitdagingen, waarvoor natuurgebaseerde oplossingen ontwikkeld en gerealiseerd zullen worden. Deze projecten zullen telkens ingebed worden in een brede gebiedswerking met alle betrokken actoren. Voor Rivierherstel Leie en de vallei van de Kleine Nete bestaat er reeds zo'n (langlopende) gebiedswerking. Aan de kust wordt de uitdaging opgenomen als nieuw spoor binnen de gebiedswerking van T.OP Kustzone. Voor de Zwarte beek wordt er een gepaste governance opgezet.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	23.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m² gesloopte bebouwing, afgegraven terreinen en weggenomen verharding - Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m² verworven woon-, woonuitbreidings- en recreatiegebied i.f.v. realisatie rivier- en valleierstelproject - Kleine Nete: (deelproject 2): Aantal m² verworven project- en/of ruilgronden in functie van realisatie natte natuurdoelen SBZ-H - Zwarte Beek: Aantal ha verworven of ingericht ten bate natte natuur - Duinencomplex: Aantal gerealiseerde projecten ifv versterking watersysteem kustduinen

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	- Rivierherstel Leie: Aantal ha ingerichte of verworven natte natuur
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Opmaak en uitvoering meerjarenprogramma voor gebiedsgerichte projecten rond waterberging, -buffering en infiltratie. Herstel van habitatrictlijngebieden met structurele verdrogingsproblemen. • Kustduinen: realisatie doelstellingen ambitienota voor de versterking van watersysteem van de kustduinen. • Vernatten van gebieden • Verhoogde infiltratie • Verhoogde waterretentie in de bodem • Verhoogde koolstofopslag in de bodem • Verbeterde hydromorfologie • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Verminderde verzilting • Bijkomende groenblauwe verbindingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Vlaggenschip Kleine Nete</p> <p>- Deelproject 1. De Grote Opkuis (trekker VMM). De 13 betrokken Kleine Nete gemeenten hebben zich in het kader van het strategisch project o.a. geëngageerd om op korte termijn (tegen 2024) elk minstens 1 ha netto-ontharding en 13 ha bosuitbreiding te realiseren. Om deze ambitie inzake ontharding waar te maken en te faciliteren wordt vanuit het beleidsdomein Omgeving het initiatief genomen om in één centrale aanbesteding voor werken de concrete sloop van gebouwen en constructies en het wegnemen van verhardingen, ophogingen en verontreinigingen etc. met het oog op valleierherstel en herstel van de infiltratiecapaciteit op te nemen waarbij dergelijke werken op korte termijn effectief uitgevoerd kunnen worden op de terreinen van de betrokken gemeenten of andere partners binnen de gebiedswerking. In 2022 zijn de projecten geselecteerd en heeft VMM het bestek voor de openbare aanbesteding gepubliceerd. De opdracht wordt uitgevoerd in 2023.</p> <p>- Deelproject 2. Grondverweving signaalgebied Olympiadelaan Herentals i.f.v. valleierherstel (trekker ANB). De Vlaamse Regering duidde het woonuitbreidingsgebied Olympiadelaan langs de Kleine Nete in Herentals aan als signaalgebied. Via een samenwerkingsverband tussen stad Herentals, provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid is de afgelopen jaren een ambitieuze ontwikkelingsvisie uitgewerkt voor dit gebied waarbij de Kleine Nete opnieuw ruimte zal krijgen om te meanderen en dit gebied heringericht zal worden valleigebied zodat een groenblauwe ader van formaat doorheen het kleinstedelijk gebied Herentals gerealiseerd wordt. Binnen het beleidsdomein Omgeving engageert VMM zich om de werken voor de herinrichting op korte termijn uit te voeren (via VV035 Groenblauwe infrastructuur – waterlopen), doch om dit te kunnen realiseren is een specifieke grondbeleidsstrategie ontwikkeld waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos deze gronden (bestemd als woonuitbreidingsgebied en woongebied) verwerft (en het latere beheer van het nieuw te ontwikkelen stedelijk natuurgebied op zich neemt) en de stad Herentals instaat voor de herlokalisatie van een aantal bestaande functies (zoals voetbalterreinen en delen van het recreatiepark Netepark) die binnen deze als natte natuur te ontwikkelen zone niet behouden kunnen blijven. Eind 2022 is een principiële akkoord tussen het ANB en stad Herentals bereikt over de verkoop van de gronden bereikt.</p> <p>- Deelproject 3. Versnellen grondmobiliteit i.f.v. de realisatie van de natte natuurkernen van Natura 2000 (trekker VLM). Binnen de vallei van de Kleine Nete dienen in uitvoering van de door de Vlaamse Regering vastgestelde Europese natuurdoelen (IHD) een aantal grote natte natuurkernen ontwikkeld</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

te worden. Het gaat o.a. om de SBZ-H-gebieden van Graafweide-Schupleer, Olens Broek-Langdonken, De Zegge-Mosselgoren en waar nog een oppervlakte van meer dan 300 ha nieuwe natte natuur te realiseren is. Voor de realisatie van de natte natuur zijn grondverwevingen nodig. Zowel voor de verwerving van projectgronden in SBZ-H als voor ruilgronden voor landbouwers die uitgeruild moeten worden. Grondaankopen kunnen o.a. via een aantal bestaande grondenbanken die daarvoor ingezet kunnen worden, maar verlopen in praktijk moeizaam. Om dit proces te kunnen versnellen wordt voorgesteld om aanvullend het instrument 'vergoedingen bij lokale grondenbanken' uit het decreet landinrichting in te zetten. Op 1 april 2022 besliste de Vlaamse Regering op 1 april 2022 over de inzet instrument 'vergoedingen bij lokale grondenbanken' voor deelproject 3 binnen vlaggenschipproject Kleine Nete. Het instrument is operationeel en wordt ingezet door VLM voor het verwerven van project- en ruilgronden i.f.v. de realisatie van natte natuurdoelen in SBZ-H's in de Kleine Nete.

De resultaten van de eerste subsidieoproep uit september 2021 werden door de Vlaamse Regering op 22 april 2022 goedgekeurd. Er werd een project geselecteerd voor Aquaduin in Koksijde. Een tweede oproep werd gelanceerd in mei 2022. In december 2022 werden 5 project goedgekeurd door de Vlaamse Regering, in de gemeenten Koksijde, Oostende, Zeebrugge (2stuks) en Knokke-Heist.

Vlaggenschip Rivierherstel Leie

Om de effectieve realisatie van de vooropgestelde watergebonden, terrestrische natuur in het kader van Rivierherstel Leie te versnellen, keurde de Vlaamse Regering op 24 september 2021 een aantal bijsturingen goed op het vlak van projectgebieden, timing en flankerend beleid. Zo breidt ze het projectgebied uit tot alle 15 deelgebieden uit het plan-MER van het geïntegreerde Seine-Schelde project en geeft ze aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht onverwijld alle initiatieven te nemen in functie van de ontwikkeling van de watergebonden terrestrische natuur in de Leievallei tussen Wervik en Deinze. Hiervoor wordt een bedrag van 5,6 miljoen euro gereserveerd uit het plan Vlaamse Veerkracht, aangevuld met reguliere kredieten van ANB en VLM. Het flankerend beleid wordt aangevuld met twee bijkomende vergoedingen voor het zoekgebied, met name eigenaarstoelage en pachtaanvaardingsvergoeding. Om het draagvlak in de regio te garanderen, wordt een intendant aangesteld die in dialoog met de eigenaars en gebruikers van de gronden en de landbouworganisaties op zoek gaat naar instrumenten voor de effectieve realisatie. Het departement Omgeving zal starten met de opmaak van het AGNAS-GRUP Bavikhove – Deinze om de nodige herbestemmingen in functie van rivierherstel Leie door te voeren. Deze beslissing gaf een nieuw elan in de werking rond Rivierherstel Leie : de intendanten zijn gestart in het gebied, het tempo van de grondaankopen is gestegen, de LER's en inrichtingsplannen zijn ingepland volgens de timing in de nota Vlaamse regering, de onteigeningsbesluiten zijn in voorbereiding.

Vlaggenschip Zwarte Beek

Voor Zwarte Beek werd het natuurinrichtingsproject i.s.m. VLM opgestart. Daarnaast lopen de procedures in het kader van mogelijke verwervingsopportuniteiten in het brongebied van de Zwarte Beek.

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Kleine Nete: Goedkeuring rapportering en werkplan gebiedswerking Kleine Nete	2020 Q4	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Selecteren deelprojecten voor financiering binnen Vlaggenschip Kleine Nete	2021 Q2	Gerealiseerd	
Kustduinen: Opmaak ambitienota voor waterfuncties in de kustduinen met relevante stakeholders	2021 Q2	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 2. Opmaak schattingsverslagen te verwerven gronden	2021 Q3	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 3. Voorbereiden ontwerpbeslissing Vlaamse Regering inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2021 Q3	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 1. Uitwerken bestek en selecteren op te nemen locaties en werken	2021 Q3	Gerealiseerd	
Kustduinen: Lanceren projectoproep voor realisatie ambities + selectie projecten ism expertengroep	2021 Q4	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 3. Beslissing Vlaamse Regering inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2021 Q4	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 2. Onderhandelingen met eigenaars i.f.v. opmaak overeenkomst over prijs te verwerven gronden	2021 Q4	Gerealiseerd	
Kustduinen: Beslissing Vlaamse Regering over eerste projectoproep + lanceren tweede projectoproep	2022 Q1	Gerealiseerd	
Kustduinen: Beslissing Vlaamse Regering over tweede projectoproep	2022 Q2	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 1. Publiceren bestek	2022 Q3	Gerealiseerd	
Kleine Nete: Deelproject 3. Inzet instrument vergoedingen bij lokale grondenbanken	2022 Q4	Gerealiseerd	
Zwarte Beek: Verwerving 150 ha ten bate van natte natuur in het brongebied Zwarte Beek	2022 Q4	Gerealiseerd	
Kustduinen: Goedkeuring Vlaamse Regering projecten tweede oproep	2022 Q4	Gerealiseerd	
Rivierherstel Leie: Opmaak LER voor vijf bijkomende deelgebieden	2024 Q4	Op schema	
Rivierherstel Leie: Realisatie 100 ha natte natuur rivierherstel Leie	2024 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Rivierherstel Leie: Opmaak inrichtingsplannen en uitvoeringsplannen voor 4 deelgebieden rivierherstel Leie	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m ² verworven woon-, woonuitbreidings- en recreatiegebied i.f.v. realisatie rivier- en valleierherstelproject	70.000 m ² (7 ha)	2022 Q4		
Zwarte Beek: Aantal ha verworven of ingericht ten bate natte natuur	150	2022 Q4		
Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m ² gesloopte bebouwing, afgegraven terreinen en weggenomen verharding	50.000 m ² (5 ha)	2022 Q4		
Kleine Nete: (deelproject 2): Aantal m ² verworven project- en/of ruilgronden in functie van realisatie natte natuurdoelen SBZ-H	1.000.000 m ² (100 ha)	2024 Q4		
Rivierherstel Leie: Aantal ha ingerichte of verworven natte natuur	100	2024 Q4		
Duinencomplex: Aantal gerealiseerde projecten ifv versterking watersysteem kustduinen	6	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR
Uitvoering VEK	12.600.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 19.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020. Tussentijdse beslissing gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020. Voortgangsrapportage gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier. Bijlage](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 1 april 2022. Voortgangsrapportage coördinatieopdracht Kleine Nete en Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – vlaggenschipproject Kleine Nete](#)

[Coördinatie Kleine Nete. Bijlage](#)

VR 28 oktober 2022 - Vlaggenschipprojecten ter versterking van het watersysteem van de kustduinen

VV035 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - WATERLOPEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Milieumaatschappij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Grondeigenaars, terreinbeherende organisaties, gemeenten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Vlaanderen kent een lage waterbeschikbaarheid en is zeer gevoelig voor waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en urbanisatiegraad in Vlaanderen en het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen gedurende lange tijd erop gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.</p> <p>Om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken is een oplossingenmix noodzakelijk. Eén van de essentiële elementen is het vasthouden van water en het voorzien van meer ruimte voor water door het aanleggen van groenblauwe netwerken, het voorzien van buffers, het hermeanderen van waterlopen, het herstellen van winterbeddingen etc. om zo de waterbeschikbaarheid te verhogen.</p> <p>Het totaalproject bestaat uit een reeks investeringsprojecten waarmee de VMM als beheerder van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie inzet op het creëren van groenblauwe netwerken en het aanpassen van de beschikbare infrastructuur (wachtbekkens, stuwen) zodat zij kunnen worden ingezet om ook in tijden van droogte tot een optimaal waterlopenbeheer te komen voor mens en natuur.</p> <p>De investeringsprojecten zijn zeer divers maar alle deelprojecten bezitten steeds een vernattingscomponent of beogen de realisatie van een groenblauwe verbinding. Zo kan door hermeandering meer water gebufferd worden, bieden openleggingsprojecten de mogelijkheid om groenblauwe netwerken te creëren, ..</p> <p>Via vernieuwing van de kunstwerken worden wachtbekkens, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden zo optimaal mogelijk benut voor infiltratie, met slimme sturing voor berging en lediging.</p> <p>De doelstelling voor dit project is het uitvoeren van een set van projecten voor het volledig voorziene budget van 31 miljoen euro. Dit budget is integraal afkomstig van relancemiddelen. Een lijst van concrete projecten die hiervoor in aanmerking komen is beschikbaar.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	30.951.000 EUR
Output	Realiseren van 20 projecten om waterschaarste op een structurele manier aan te pakken
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Vernatten van gebieden • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Verbeterde werking watersysteem via slimme sturing • Digitalisering van de infrastructuur

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

- Verbeterde hydromorfologie
- Realiseren van groenblauwe verbindingen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Eind 2022 werd een volledige benutting verzekerd van de beschikbare middelen. Bij beslissing van de VR op 9 december 2022 werd het vastleggingskrediet verhoogd met 951 keuro. In totaal werden 24 projecten vastgelegd.
Noodzakelijke politieke actie	niet van toepassing

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
30% van de budgetten vastgelegd	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering van 5 projecten gestart	2021 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering van 10 projecten gestart	2022 Q4	Gerealiseerd	
alle dossiers vastgelegd	2022 Q4	Gerealiseerd	
5 projecten voltooid	2022 Q4	Vertraging	Eind 2022 december zijn 4 projecten voltooid en 3 projecten effectief opgeleverd. Voor 1 project is de oplevering pas begin 2023 voorzien omdat nog een voorwaardelijk deel voor de gemeente moest worden uitgevoerd. Een 5e project waarvan de voltooiing nog in 2022 werd gepland, liep vertraging op wegens de moeizame levering van stukken. Begin 2023 wordt wel de voltooiing van 3 bijkomende projecten verwacht, zodat de vertraging op vlak van de indicator geen wezenlijk probleem vormt.
Uitvoering van 15 projecten gestart	2023 Q4	Op schema	
50% van het VEK-budget benut	2023 Q4	Op schema	
10 projecten voltooid	2024 Q2	Op schema	
Uitvoering van 20 projecten gestart	2024 Q2	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG						
MIJLPALEN						
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING			
75% van het VEK-budget benut	2025 Q4	Op schema				
15 projecten voltooid	2025 Q4	Op schema				
Uitvoering van minstens 20 projecten groenblauwe netwerken en optimalisatie infrastructuur aan waterlopen voor een totaal bedrag van 30 miljoen euro	2026 Q2	Op schema				
OUTPUT						
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD		
Aantal gerealiseerde projecten die waterschaarste op een structurele manier aanpakken	20	2026 Q2				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.951.000 EUR
Uitvoering VAK	30.951.000 EUR
Uitvoering VEK	4.983.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 24.800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.151.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Relanceplan Vlaamse Veerkracht – Blue Deal – beleidsdomein Omgeving
VR 13 mei 2022 - Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving: 10 subsidiebesluiten
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Update van de relancemiddelen die worden voorzien voor het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht

VV036 - NATTE NATUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Agentschap Natuur en Bos
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Departement Omgeving - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaamse Milieumaatschappij - Vlaamse Landmaatschappij
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	06. Blue deal
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Dit project betreft de opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor valleierherstel en herstel van natte natuur. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het herstel en de bescherming van veengebieden (laagveen, hoogveen, veenbossen) die de grootste hoeveelheid water kunnen vasthouden en ook veel koolstof opslaan.</p> <p>Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 legt sterkt de nadruk op het verhogen van onze weerbaarheid tegen droogte, onder meer via circulair waterbeleid en de actieve inzet van een veerkrachtige ruimte met (extra) natuur om de klimaatverandering te milderen. Bossen, moerassen, meanderende rivieren en graslanden houden immers koolstof vast en bufferen wateroverlast, droogte en hitte-effecten. Daarom kiest de Vlaamse regering ervoor gezonde ecosystemen te herstellen door het versneld realiseren van een sterk samenhangend geheel van natuur-, bos- en valleigebieden, die kwaliteitsvol ingericht worden. Met de 'Blue Deal' wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste aanpakken. Als onderdeel van deze Blue Deal wordt ingezet op een groot investeringsprogramma om natte natuur in Vlaanderen te herstellen. De afgelopen decenniajaar verloor Vlaanderen 75 procent van zijn natte natuur. Van de 244.000 hectare natte natuur die er rond de jaren 1950 nog was, blijft nu maar 68.000 hectare over, waarbij de kwaliteit van deze natuur wisselvallig van aard is. Via het investeringsprogramma in wetlands en valleigebieden zal deze natte natuur hersteld en versterkt worden.</p> <p>Wetlands zijn nuttige gebieden in de strijd tegen overstromingen en droogte. Ze zorgen voor een grotere wateropvangcapaciteit en tragere afvoer waardoor het risico op wateroverlast verkleint. Extra natte natuur creëren is een van de beste manieren om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk meer natuurlijke buffers te hebben tegen hevige regenval. Daarnaast slaan wetlands koolstof op en zorgen ze zo voor de reductie van broeikasgassen. Wetlands zorgen tenslotte ook voor verkoeling.</p> <p>Het investeringsprogramma bestaat uit het realiseren van verscheidene natuurprojecten door het Agentschap Natuur en Bos via aankopen en inrichtingswerken voor een bedrag van 70 miljoen euro. Daarnaast wordt er voor derden een oproep gelanceerd voor specifieke aankoop- en investeringssubsidies in het kader van natte natuur voor een bedrag van 30 miljoen euro.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	100.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Vernatten van gebieden • Verhoogde bescherming van waardevolle bodems • Verhoogde berging in en langs waterlopen • Realiseren van groenblauwe verbindingen • Verbeterde hydromorfologie • Meer biodiversiteit • Verhoogde koolstofopslag in de bodem • Vertraagde afvoer van water

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het project omvat:</p> <p>1. Het verwerven of inrichtingen van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos op eigen terreinen of kaderend binnen een bestaande samenwerking. Op basis van aantal criteria zullen projecten uitgevoerd worden rond herstel en inrichting van (gedegradeerde) wetlands. De projecten worden geselecteerd op basis van:- Bijdrage aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen;- Opname in stroomgebiedbeheerplan ;- Waterconservering – bijdrage van project aan vasthouden, vertraging afvoer water ;- Bevorderen van infiltratie – wanneer expliciet het bevorderen van infiltratie wordt beoogd;- Verbetering van de waterkwaliteit;- Ecohydrologisch herstel – actieve grondwaterpeilverhoging;- Structuurherstel grachten en waterlopen; Op basis van deze aanpak worden lopende projecten versneld gerealiseerd (bvb. gebiedsgericht projecten in valleien zoals Kleine Nete, IJzervallei, Zennevallei, ...) of wordt de achterstand in uitvoering ingehaald (bvb. Sigmaplan, Demervallei, ...) of waar mogelijk worden opportuniteiten benut met het oog op snelle realisatie. De verschillende in te richten natuurgebieden doorlopen allen dezelfde fasen:- Waar nodig worden gronden verworven of in een aantal gevallen geruild i.s.m. met de Vlaamse Landmaatschappij;- Diverse studies of al of niet wettelijk verplichte plannen worden opgemaakt om de ecohydrologische toestand en de in te richten werken te bepalen en disproportionele gevolgen voor de omgeving te voorkomen;- De noodzakelijke werken voor effectieve realisatie van natte natuur op terrein, worden aanbesteed. De uitvoering is lopende waarbij de meeste gronden zijn aangekocht en de meeste inrichtingswerken aanbesteed.</p> <p>2. Subsidiëren van derden voor de creatie van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos voor inrichtingswerken en grondverwervingen. Naast de realisatie van projecten in eigen beheer worden ook derden aangemoedigd om bij te dragen aan bijkomende natte natuur in Vlaanderen. Er worden aankoopsubsidies verleend voor de verwerving van gronden van die projecten die voldoen aan het natuurbeheerplan type 4, zijnde de meest ambitieuze typologie met de hoogste ecologische waarden in Vlaanderen. Naast deze aankoopsubsidies worden ook voor inrichtingswerken subsidies verleend aan derden via een oproep die in januari 2021 is gelanceerd en waarvan de projecten zijn ingediend. De selectie is eind 2021 goedgekeurd. Deze oproep werd opnieuw in januari 2022 gelanceerd en de projecten werden in december goedgekeurd. Het te bepalen subsidiabel bedrag wordt gebenchmarkt aan normkosten voor gelijkaardige inrichtingswerken. Er worden afgerond voor 22,5 miljoen euro aan aankoopsubsidies en 7,5 miljoen euro aan inrichtingsubsidies verleend.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2021	2021 Q1	Gerealiseerd		
Goedkeuring VR wijziging subsidiebesluit inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur (Blue deal)	2021 Q3	Gerealiseerd		
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2021	2021 Q4	Gerealiseerd		
Lancering van de projectoproep investeringsprojecten 'natte natuur' 2022	2022 Q1	Gerealiseerd		
Goedkeuring en toekenning van de projecten in het kader van de projectoproep 'natte natuur' 2022	2022 Q3	Gerealiseerd		
Alle noodzakelijke verwervingen van gronden zijn gerealiseerd	2022 Q3	Op schema		
Toekenning aankoopsubsidies aan derden voor gronden ter realisatie van projecten natte natuur	2022 Q4	Gerealiseerd		
Uitbesteding van de noodzakelijke studies ter voorbereiding van de inrichtingswerken en uitbesteding van de inrichtingswerken	2022 Q4	Gerealiseerd		
Uitvoering inrichtingswerken	2024 Q4	Op schema	Aandachtspunt in het kader van van de aanbesteding en de uitvoering zijn de beperkingen op de capaciteit bij de administratie en de studiebureaus om de verscheidene projecten gedraaid te krijgen en het doorlopen van de vergunningstrajecten.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal - projecten in regie van ANB		2026 Q2	760	33 %
Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal - projecten derden		2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	100.000.000 EUR
Uitvoering VAK	100.000.000 EUR
Uitvoering VEK	56.223.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 94.400.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>VR 18 december 2020 - Projectsubsidies voor lokale hefboomprojecten 'Natte Natuur' in kader van gebiedsontwikkeling</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur</p> <p>Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur</p> <p>Advies Minaraad over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur</p> <p>VR 23 april 2021 Plan Vlaamse Veerkracht: projectlijnen die invulling geven aan relanceprojecten Omgeving in het kader van de Blue Deal</p> <p>VR 2021 3004 VV DOC.0041-1 Geïntegreerd natuurbeheer - notaBIS</p> <p>VR 2021 3004 VV DOC.0041-2 Geïntegreerd natuurbeheer - BVRBIS</p> <p>VR 16 juli 2021 wijziging subsidiebesluit inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur (Blue deal)</p> <p>VR 2021 1607 VV DOC.0121-1 Geïntegreerd Natuurbeheer - nota</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-5 Geïntegreerd Natuurbeheer - advies](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-2 Geïntegreerd Natuurbeheer - BVRBIS](#)

[VR 2021 1607 VV DOC.0121-6 Geïntegreerd Natuurbeheer - advies](#)

VR 1 juli 2022 - Subsidie aan provincie West-Vlaanderen voor natte natuurverbinding langsheen de Vuile Vaart

07. Investerings in verkeersveilige wegen

VV037 - ASSETMANAGEMENT - AANPAKKEN CAT. 4-KUNSTBOUWERKEN IN SLECHTE STAAT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer - De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Lokale besturen; Farys; bedrijven; weggebruikers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Met de aanpak van deze kunstbouwwerken is het doel om de kunstwerken in slechte staat te herstellen/te vervangen en zo de mobiliteit/verkeersveiligheid van personen en goederenvervoer te garanderen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	105.833.000 EUR
Output	Herstelde of vervangen kunstwerken.
Outcome	Verlengen levensduur van het patrimonium kunstwerken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Er worden meerdere assets aangepakt via deze relancecluster:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het viaduct in Gentbrugge werd na het uitvoeren van ingrijpende werken in november 2021 terug opengesteld voor het verkeer. Er zijn nog wel werkzaamheden aan de onderzijde van de brug. - De Moerbruggebrug in Oostkamp en de renovatie van de Wijngaardbrug (Geraardsbergen) werden uitgevoerd. - De renovatie van het viaduct Boorseme is gestart in januari 2022. Ook de renovatie van de Tuchthuisbrug in Vilvoorde, de herbouw van de Meulestedebrug, de herstellingen aan de Nieuwe Kalebrug, de renovatie van de Tolhuisstuwbrug en de Verapazbrug in Gent zijn in uitvoering.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>- De vervanging van de brug van de E40 over de spoorlijn Brussel-Oostende en de brug in de Merestraat over de E40 (Erpe-Mere) werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 maart 2022 en zijn opgestart in juli 2022</p> <p>Ook voor volgende initiatieven werd de aanbestedingsprocedure doorlopen en starten de werken in 2023: de herbouw Spanjeveerbrug (Mendonk), de renovatie van de voetgangersbrug over sluis 11 (Kortrijk), de herbouw van de Bospoortbrug in Halle, de renovatie van de centrumbrug in Izegem en de herbouw van de Krommewalbrug in Gent.</p> <p>- Voor de Leiebrug (Kortrijk), de Lysbrug, de herbouw van de Tolpoortbrug in Deinze worden met de relancebudgetten louter de studies uitgevoerd. Deze zijn lopende.</p> <p>Wegens de hogere kostprijs van een aantal relanceprojecten als gevolg van de stijging van de materiaal- en grondstoffenprijzen (o.a. staal) konden een aantal projecten niet binnen de beschikbare relancebudgetten worden uitgevoerd. Deze krijgen de status 'Stopgezet'.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sanering viaduct van Gentbrugge (fase 2)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Herbouw Meulestedebrug Gent	2021 Q4	Vertraging	De werken zijn reeds van start gegaan, maar hebben enige vertraging t.o.v. de initiële planning.
Renovatie Wijngaardbrug te Geraardsbergen	2022 Q2	Gerealiseerd	
Herbouw Waasmunsterbrug (incl. jaagpad & fietstunnel)	2022 Q4	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Studie herbouw Leiebrug te Kortrijk	2022 Q4	Vertraging	
Renovatie Moerbruggebrug te Oostkamp	2022 Q4	Gerealiseerd	
Renovatie Tuchthuisbrug te Vilvoorde	2023 Q1	Op schema	
Renovatie viaduct van Boorseme	2023 Q1	Op schema	
Renovatie Tolhuisstuwbrug Gent	2023 Q1	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Herbouw Oosthoekbrug St-Laurens	2023 Q2	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Renovatie voetgangersbrug over sluis 11 te Kortrijk	2023 Q2	Op schema	
Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16) te Gent	2023 Q3	Vertraging	De werken zijn reeds van start gegaan, maar hebben enige vertraging t.o.v. de initiële planning.
Bouw Verapazbrug te Gent & herbouw kaaimuur	2023 Q3	Op schema	De Vlaamse Waterweg draagt bij aan het project door de herbouw van de kaaimuur ter hoogte van de brug. Het waterbouwgedeelte wordt opgeleverd in Q3 2023. De oplevering van de brug zelf is voorzien 2025.
Studie opwaardering kanaal Roeselare-Leie: Lysbrug	2023 Q3	Op schema	
Vervangen opleggingen Drongenbrug W4 over de Ringvaart te Gent	2023 Q4	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Renovatie centrumbrug Izegem	2023 Q4	Op schema	
Spoorwegbrug E40 Erpe-Mere	2024 Q1	Op schema	Werken zijn gestart en zijn gepland te eindigen begin 2024.
Renovatie kaaimuur Wiedauwkaai te Gent	2024 Q2	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Herbouw Krommewalbrug te Gent	2024 Q3	Vertraging	Er is een lichte vertraging in de aanbestedingsprocedure.
Herbouw Spanjeveerbrug Mendonk	2024 Q4	Op schema	De timing werd geactualiseerd omwille van een vertraging door een ontwerpwijziging.
Herbouw Tolpoortbrug te Deinze	2024 Q4	Stopgezet	Uit het studiewerk bleek dat ook de bestaande funderingen vernieuwd moeten worden. Het project wordt daardoor niet langer op met relancemiddelen gefinancierd. Daarom wordt het dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Vernieuwen brug over het afleidingskanaal – N9 Adegem	2025 Q2	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Herbouw Steenbruggebrug te Brugge	2026 Q3	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer met relancemiddelen gefinancierd en wordt dan ook binnen deze rapportering stopgezet.
Herbouw Bospoortbrug te Halle	2026 Q3	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	105.833.000 EUR
Uitvoering VAK	105.786.000 EUR
Uitvoering VEK	50.285.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 105.833.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Relancemiddelen MOW
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Relancemiddelen MOW. Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage

VV038 - AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	(zwakke) weggebruikers, politiediensten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investeren in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Om het aantal verkeersslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen zet de Vlaamse Overheid maximaal in op de verkeersveilige (her)inrichting van haar fietspaden, wegen en kruispunten. Sinds 2018 wordt er daarom ingezet op de dynamische lijst van gevaarlijke punten. Bij de berekening van gevaarlijke punten wordt telkens de laatste drie jaar aan beschikbare ongevalldata gebruikt, waarbij een gewicht wordt gegeven aan elke lichtgewonde (1), zwaargewonde (3) en dodelijke gewonde (5) weggebruiker. Bovendien wordt sinds 2019 een extra gewicht gegeven aan elke zwakke weggebruiker (factor 1,7).</p> <p>Om gevaarlijke punten snel aan te pakken wordt waar mogelijk overgegaan tot het uitvoeren van kleine ingrepen, quick wins. Dit zijn ingrepen die op korte termijn en met beperkte middelen, de verkeersveiligheid ter plaatse kunnen verbeteren. Om zicht te krijgen op de best passende maatregel wordt eerst een grondig onderzoek uitgevoerd, dat voor een deel van de punten door een extern studiebureau wordt uitgevoerd.</p> <p>Het wegwerken van gevaarlijke punten kan bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van de lichtenregeling, het verbeteren van de markering, het verbeteren van de zichtbaarheid, het plaatsen van handhaving, enz. Op een deel van de punten volstaan deze kleinere ingrepen om de verkeersveiligheidsproblemen weg te werken. Op een ander deel betreft dit een tussentijdse oplossing en zijn meer uitgebreide maatregelen nodig. Deze uitgebreide maatregelen omvatten de herinrichting van (een deel van) het kruispunt.</p> <p>In de aanpak van de gevaarlijke punten wordt prioritair ingezet op punten in de buurt van een school, lichtengeregelde punten en overige punten waar zwakke weggebruikers betrokken waren.</p> <p>MIA staat voor Mobiliteit Innovatief aanpakken. Met MIA wil men komaf maken met ingewikkelde procedures en lange doorlooptijden die de aanpak en uitvoering van infrastructurele werken of quick wins verhinderen of vertragen. Daarnaast beoogt MIA een vlotte samenwerking met vervoerregio's, provincies, gemeenten, burgers, wetenschappers en deskundigen.</p> <p>Op de Vlaamse regering van 3 september 2021 werd het ontwerp van bekrachtigingsdecreet van MIA -in infrastructuurwerken definitief goedgekeurd. Met dit ontwerp van bekrachtigingsdecreet wordt het BVR tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur definitief geregeld. Op die manier wil men zorgen voor snellere uitvoering van tal van verkeersveiligheidsmaatregelen en ingrepen in onze</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

weginfrastructuur. MIA is een ander bestuursproces met nadruk op een proactieve aanpak, eenvoudige procedures en inspraak.

Voor het aanpakken van een deel van de gevaarlijke punten wordt onder meer dit relancebudget benut.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	51.355.000 EUR
Output	Het aantal gevaarlijke punten waar een ingreep werd uitgevoerd.
Outcome	Het verhogen van de verkeersveiligheid door het gevaar te verminderen voor de (zwakke) weggebruiker.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De verschillende deelprojecten lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none">- De werken voor de aanleg van een wisselaar met de A19 aan de R8 Kortrijk West zijn in uitvoering. Dit project zal in het najaar van 2023 afgerond zijn.- Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA): Binnen het MIA-project is het de bedoeling dat de aannemer al vanaf de start van een project betrokken wordt. Zodoende werken ze mee de oplossing van een probleem uit. Er lopen momenteel 2 MIA-proefprojecten, 1 in West Vlaanderen en 1 in Limburg. De proefprojecten hebben betrekking op de aanpak van gevaarlijke punten en fiets maatregelen. Wat de gevaarlijke punten betreft werden via de proefprojecten MIA in Limburg en West-Vlaanderen inmiddels 11 projecten uitgevoerd, 10 punten zijn in uitvoering en 2 werden vastgelegd. <p>De overige ingrepen in het kader van gevaarlijke punten betreffen onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none">- het conflictvrij maken van kruispunten,- infrastructuuringrepen aan kruispunten,- het aanleggen van middeneilanden,- het aanpassen van de lichtenregeling,- het aanpassen van signalisatie,- het voorzien van circulatiemaatregelen,- ... <p>26 ingrepen zijn reeds uitgevoerd, 41 werken zijn op dit moment in uitvoering en voor 30 ingrepen werd de uitvoering ingepland of gebeurt dit op korte termijn. Verder is er ook nog het studiecontract lopende voor het aanpakken van de resterende gevaarlijke punten die nog uitgevoerd zullen worden met de relance-investeringen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALLEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Proefproject wegen Oost-West Vlaanderen (MIA)	2024 Q4	Op schema		
Aanpak gevaarlijke punten	2024 Q4	Op schema		
Proefproject wegen Limburg (MIA)	2024 Q4	Op schema		
R8 Kortrijk West: aanleg wisselaar met de A19	2024 Q4	Op schema	De timing werd geactualiseerd.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal ingrepen via MIA		2022 Q4	11	
Aantal weggewerkte gevaarlijke punten	+80	2024 Q4	26	32 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	51.355.000 EUR
Uitvoering VAK	51.354.000 EUR
Uitvoering VEK	13.044.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 51.355.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021. Bijlage bijlage
BVR van 28 mei 2021 tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur
Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

VV039 - VERSNELLING INVESTERINGEN IN VEILIGE SCHOOLROUTES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	Lokale besturen, inwoners, weggebruikers, scholen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Een veilige route van huis naar school is essentieel voor schoolgaande kinderen. Wanneer ouders de route niet veilig vinden, kiezen ze vaker voor de auto om hun kinderen naar school te brengen. Via investeringen langs gewestwegen en subsidies voor veilige schoolroutes kunnen ingrepen langs lokale wegen plaatsvinden om de schoolroutes veiliger te maken. Momenteel wordt de helft van het voorziene budget indicatief voorzien voor investeringen langs gewestwegen, de andere helft wordt indicatief via subsidies toegekend aan lokale besturen, voor investeringen op gemeentewegen. Kinderen zijn de ideale fietsambassadeurs om de modal en mental shift naar meer duurzame verplaatsingen mee te realiseren.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	32.152.000 EUR
Output	Aanpassingen aan infrastructuur en signalisatie op schoolroutes
Outcome	Veiligere en vlottere schoolroutes voor fietsers/voetgangers, een stijging in het aantal actieve verplaatsingen naar school met de fiets/te voet.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Gemeentewegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de subsidies Veilige Schoolroutes op gemeentewegen werden de stukken door de Vlaamse Regering goedgekeurd in 2021 waardoor een subsidie voor lokale besturen liep tot november 2022. In totaal dienden 104 gemeenten één of meerdere aanvragen in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor het aanpassen of inrichten van schoolroutes. De 120 goedgekeurde aanvragen omvatten meer dan 1017 ingrepen verspreid over 331 schoolroutes.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>- De meest aangevraagde werkzaamheden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • werken aan het voetpad of aan het wegdek, • de afbakening van een fietsstraat, • de markering van een fietssuggestiestrook of een oversteekplaats. <p>- Voor de uitvoering van de werken hebben de aanvragers 15 maanden de tijd na goedkeuring van hun dossier. Voor reeds 19 projecten werden de werken uitgevoerd door het lokaal bestuur en werd de afrekening ontvangen.</p> <p>Gewestwegen:</p> <p>- Voor de uitvoering van ingrepen langs gewestwegen in functie van het veiliger maken van de schoolroutes werden door het Agentschap Wegen en Verkeer 874 knelpunten langs schoolroutes geïnventariseerd op basis van meldingen door 194 gemeenten. Het specifiek raamcontract voor de aanpak van deze knelpunten is in uitvoering. Niet al deze knelpunten zullen met Relancemiddelen uitgevoerd worden. Een deel zal met reguliere middelen worden gefinancierd.</p> <p>- De vaakst voorkomende gevraagde aanpassingen betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aanpassingen aan oversteekvoorzieningen, • markeringswerken, • kleine infrastructuurwerken, • aanpassingen aan lichtregelingen, • vernieuwing van fietspaden. <p>- Tot op heden werden 26,5% van de door lokale besturen ingediende knelpunten op gewestwegen uitgevoerd en zijn 10,5% in uitvoering.</p> <p>- Voor de trajectcontroles op schoolroutes langs gewestwegen werden de nodige budgetten vastgelegd. Er werden reeds 8 bevestigde aanvragen ontvangen. Dit project loopt op schema en zal in het voorjaar van 2023 afgerond zijn.</p> <p>- De aanbestedingsprocedure voor de ombouw van het kruispunt Guldensporenlaan N444 te Merelbeke werd afgerond en de nodige middelen werden vastgelegd. Uitvoering zal zoals gepland begin 2023 kunnen aanvangen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Communicatie subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen (algemene mailing + persoonlijk contact)	2022 Q3	Gerealiseerd	
Opmaak Regelgeving - Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen	2021 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Bevraging steden en gemeenten over knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen	2021 Q1	Gerealiseerd		
Toekennen Subsidie Veilige Schoolroutes gemeentewegen aan lokale besturen	2022 Q4	Gerealiseerd		
Investeren in het veiliger maken van knelpunten langs gewestwegen op basis van de geïnventariseerde knelpunten van Vlaamse steden en gemeenten.	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal goedgekeurde subsidieaanvragen lokale besturen		2022 Q4	120	
Aantal ontvangen afrekeningen voor de goedgekeurde subsidieaanvragen lokale besturen	120	2022 Q4	19	16 %
Aantal ingrepen op knelpunten op gewestwegen	365	2024 Q4	97	26,5 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	32.152.000 EUR
Uitvoering VAK	32.152.000 EUR
Uitvoering VEK	14.888.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 32.152.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - nota](#)

[BVR van 19 maart 2021 houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen - advies Raad van State](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

VV040 - VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	07. Investerings in verkeersveilige wegen
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Via de versnelling van verkeerslichtenbeïnvloeding en dynamisch verkeersmanagement is het doel een betere en veiligere doorstroom te bewerkstelligen. Door de verkeerslichtenbeïnvloeding kan de fietsveiligheid verbeterd worden en wordt het gebruik van de fiets voor zowel functioneel als recreatief gebruik gestimuleerd. Zo draagt dit initiatief bij tot de modal shift en verhoogt het aandeel van duurzame transportmodi in Vlaanderen.</p> <p>Een deel van het relancebudget wordt ingezet om het actieplan verkeerslichten verder uit te rollen. Via dit actieplan wordt zowel de doorstroming als de veiligheid op de kruispunten verder verhoogd door de kruispunten uit te rusten met 'slimme' verkeerslichten die dynamischer en flexibeler inspelen op de actuele verkeerssituatie op het betreffende kruispunt. Met het actieplan verkeerslichten wordt geprobeerd om de situatie maximaal conflictvrij te regelen en ervoor te zorgen dat er nooit voor niets voor rood dient gewacht te worden.</p> <p>Daarnaast wordt een deel van het relancebudget ingezet voor het Mobilidata-programma. Mobilidata realiseert een netwerk van duurzame, slimme en betrouwbare data. Via een signaal dat jouw boordcomputer of smartphone uitstuurt, is het mogelijk te 'communiceren' met onze geconnecteerde systemen. De slimme infrastructuur die Mobilidata voorziet, volgt dat signaal op en combineert dat met andere realtime data. Op die manier kunnen bijvoorbeeld verkeerslichten beter op jouw mobiliteitsbehoefte inspelen. Op termijn vormt de uitrol van die slimme data-infrastructuur de basis voor de infrastructuur die zelfrijdende voertuigen in Vlaanderen mogelijk maakt.</p> <p>Relancemiddelen worden ook geïnvesteerd in de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) in Antwerpen. De komende jaren zal de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) stapsgewijs de aansturing van 360 verkeerslichten in en om Antwerpen overnemen. De nieuwe lichtenregelingen zullen het verkeer veiliger en efficiënter laten verlopen. Het doel is om de volledige vernieuwingsoperatie rond te hebben tegen eind 2023.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.462.000 EUR
Output	Realisatie van intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's)
Outcome	Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De diverse initiatieven lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor het dynamisch verkeersmanagement via intelligente verkeersregelaars (iVRI's) en (coöperatieve) intelligente transportsystemen (Mobilidata) zijn 29 iVRI's operationeel, 94 in uitvoering en zijn er 223 voorbereid. - In het kader van het aanpakken van gevaarlijke punten en schoolroutes werden tot op heden 72 ingrepen ikv het actieplan verkeerslichten gekoppeld aan het relancebudget. Hiervan zijn er 18 uitgevoerd, 26 in uitvoering en 26 vastgelegd. - Ten behoeve van een vlottere doorstroom van het openbaar vervoer werden 8 ingrepen aan verkeerslichten met beïnvloeding uitgevoerd. Dit draagt bij tot een verminderd risico voor 8 gevaarlijke punten. 7 gevaarlijke punten worden via deze ingrepen geheel en 1 gedeeltelijk conflictvrij gemaakt. - Het dynamisch verkeersmanagement (verkeerslichtencoördinatie) loopt vertraging op. Het project zal eind 2024 afgerond worden. - Het dynamisch verkeersmanagement (structureel onderhoud) langs autosnelwegen) is volgens schema verlopen. De uitvoering van de werken is afgerond.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Dynamisch verkeersmanagement langs autosnelwegen - Structureel onderhoud	2022 Q2	Gerealiseerd	
Actieplan Verkeerslichten	2023 Q4	Op schema	
Dynamisch verkeersmanagement via (coöperatieve) Intelligente Transport Systemen	2024 Q4	Op schema	Mobilidata ambieert de realisatie van 350iVRI's, incl. het faciliteren van de in het programma voorziene iVRI C-ITS diensten. Ondanks dit luik binnen het programma een jaar vertraging opliep (de timing werd geactualiseerd) is het einddoel van het gehele programma mogelijks nog binnen de oorspronkelijke timing haalbaar.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Plaatsen van verkeerslichten met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer en/of aanpassen van bestaande installaties met het oog op verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer	2024 Q4	Op schema		
Dynamisch verkeersmanagement via verkeerslichtencoördinatie (verkeerslichtencoördinatie Antwerpen)	2024 Q4	Vertraging	De timing werd geactualiseerd. Het project is namelijk sterk afhankelijk van diverse wegenwerken, de installatie van het glasvezelnetwerk maar ook vergunningen of het afstemmen met andere initiatieven van lokale besturen. Aangezien in deze planningen vertragingen ontstaan zijn heeft dit bij gevolg een negatieve impact op de vooropgestelde timing van dit project.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal intelligente verkeersregelininstallaties (iVRI's)	150	2023 Q4	29	19 %
Aantal VRI's aangepast aan actieplan verkeerslichten	68	2023 Q4	18	26 %
Aantal VRI's met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer	8	2024 Q4	8	100 %
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR			
Beleidsruimte (begroot) update	20.462.000 EUR			
Uitvoering VAK	20.461.000 EUR			
Uitvoering VEK	4.258.000 EUR			
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.462.000 EUR 			

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

08. Modal shift naar water

VV041 - MODAL SHIFT NAAR WATER - ALBERTKANAAL (VERSNELD VERHOGEN VAN BRUGGEN)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladere, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om de steile opgang van het containervervoer blijvend te stimuleren wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal. Zo wordt bijgedragen aan de modal shift en wordt maximaal ingespeeld op het verschuiven van het goederenvervoer over de weg naar vervoer over water.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	99.533.000 EUR
Output	Verhogen en/of aanpassen van 7 bruggen en ondersteunende werken ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal.
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Waterweg voorziet acht projecten (deels) te realiseren binnen deze relancecluster: 3 (deel)-projecten werden volledig uitgevoerd. Het betreft: <ul style="list-style-type: none"> - De werken m.b.t. het afvoeren van grondoverschotten voor de kanaalverbreding aan de Theunisbrug, - De werken m.b.t. het vernieuwen van de oevers tussen de Hoogmolenbrug en de brug van den Azijn. - De herbouw van de spoorbrug Genk.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>Volgende 4 (deel)projecten zijn in uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de herbouw spoorbrug (Herentals) startten in maart 2022 de eerste voorbereidende grond- en betonwerken. In het kader van de brugverhoging vinden er in de omliggende straten ook voorbereidende werken aan de distributienetten plaats. De werken lopen volgens planning. - Voor het verhogen van de wegbrug Kempische poort zijn de werken gestart in maart 2022. De werken liepen een kleine vertraging op maar zullen afgerond worden in Q1 2023. - De heraanleg van het kruispunt N120 met de nieuwe Hoogmolenbrug. - De verruiming van het Albertkanaal zone Antwerpen, tussen de brug van den Azijn en het Lobroekdok. <p>De omgevingsvergunning voor de Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52) is bekomen. De werken zullen begin 2023 starten.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Herbouw spoorbrug Genk (BR12)	2022 Q3	Gerealiseerd	
Vernieuwen oevers tussen Hoogmolenbrug en brug van den Azijn	2022 Q4	Gerealiseerd	
Verhogen wegbrug Kempische poort (N74) Hasselt (BR17)	2023 Q1	Op schema	De timing werd geactualiseerd n.a.v. vertragingen op de werf.
Heraanleg van het kruispunt N120 met de nieuwe Hoogmolenbrug	2023 Q2	Op schema	
Herbouw wegbrug Kempische poort	2023 Q3	Op schema	De timing werd geactualiseerd n.a.v. een kleine vertraging op de werf.
LO - afvoeren grondoverschotten kanaalverbreding Theunisbrug	2023 Q4	Gerealiseerd	
Herbouw wegbrug Turnhoutsebaan Wijnegem (BR52)	2024 Q2	Op schema	De omgevingsvergunning werd bekomen. De werken starten op begin 2023.
Verruiming Albertkanaal zone Antwerpen - tussen de brug van den Azijn en het Lobroekdok	2024 Q2	Op schema	Er was/is een vertraging omwille van onteigeningen. De uitvoering werd daarom gesplitst in twee fasen waardoor de voortgang kan gegarandeerd worden.
Herbouw spoorbrug Herentals (BR44)	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Verhogen en/of aanpassen van bruggen, alsook het uitvoeren van ondersteunende werken ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal	9	2024 Q4	3	33 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	96.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	99.533.000 EUR
Uitvoering VAK	99.533.000 EUR
Uitvoering VEK	31.424.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 99.533.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021. Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW
Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage

VV042 - MODAL SHIFT NAAR WATER - EXTRA KAAIMUREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Bedrijven, binnenvaartondernemers, verladers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De focus van het investeringsbeleid voor goederenvervoer ligt op het realiseren van een modal shift van de weg naar de binnenvaart. Ondernemingen en logistieke spelers moeten er nog meer van overtuigd worden dat de binnenvaart een volwaardige, complementaire transportmodus is.</p> <p>Een van de doelstellingen hierin voor de modal shift goederenvervoer is het realiseren van een verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers in het goederenvervoer van de weg naar de alternatieve vervoersmodi waterweg of spoorwag.</p> <p>Watergebonden bedrijventerreinen worden daarom verder uitgerust met, waar mogelijk gemeenschappelijke, kaaimuren. De PPS-formule voor de bouw van kaaimuren wordt blijvend gehanteerd om nieuwe klanten toegang te verlenen tot de waterweg, maar ook om bestaande klanten op het water te houden en hun watergebonden trafieken te kunnen vergroten. Het relanceplan maakt een versnelde realisatie van kaaimuurprojecten mogelijk.</p> <p>Dit project voorziet in de realisatie van nieuwe kaaimuurprojecten alsook in renovaties van kaaimuren op het Kanaal Roeselare-Leie.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	17.415.000 EUR
Output	Realisatie van nieuwe en optimalisatie van bestaande kaaimuren.
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse Waterweg nv voorziet via deze relanceprojecten in de bouw van acht kaaimuurprojecten voor overslag en de renovatie van een kaaimuur: - De uitvoering van het kaaimuurproject Kaneka (Geel) werd afgerond in het najaar van 2021.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<ul style="list-style-type: none"> - De werken aan de kaaimuur van Devamix (Harelbeke) zijn gestart. - De aanbestedingsprocedure voor 3 kaaimuurprojecten werd doorlopen: het kaaimuurproject Rumst Recycling (Rumst), Fingo (Tessenderlo) en kaaimuur Top Mix te Oostende. De uitvoeringsfase is in voorbereiding. - De aanbesteding voor de renovatie van kaaimuur Van den Avenne op het Kanaal Roeselare-Leie is aanbesteed. De uitvoeringsfase is in voorbereiding.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Bouw kaaimuur Kaneka	2022 Q4	Gerealiseerd		
Bouw kaaimuur VARO Energy Group	2023 Q3	Stopgezet	Dit project zal niet op relancemiddelen gefinancierd worden waardoor het in deze rapportering niet langer meegenomen zal worden (stopgezet binnen Relance, niet stopgezet binnen het reguliere investeringsprogramma).	
Bouw kaaimuren Devamix	2023 Q3	Op schema		
Onderdeel scheldekaaien	2023 Q4	Op schema		
Bouw kaaimuur Fingo	2023 Q4	Op schema		
Bouw kaaimuur Top-mix	2023 Q4	Op schema		
Herstellen verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie & Herstellen kaaimuren kanaal Roeselare-Leie	2024 Q1	Op schema		
Bouw kaaimuur Rumst Recycling	2025 Q1	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gebouwde en herstelde laad- en losinstallaties	7	2023 Q4	1	14 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	17.415.000 EUR
Uitvoering VAK	17.414.000 EUR
Uitvoering VEK	2.031.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 17.415.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021. Bijlage</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage</p>

VV043 - WATERBEHEERSING DENDER

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Vlaamse Waterweg
Betrokken entiteit(en) VO	De Vlaamse Waterweg
Belanghebbenden	Vlaamse havens, uitbaters inland-containerterminals, verladers, binnenvaartondernemers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Dender is een bevaarbare waterweg, met als zwaartepunt voor de beroepsvaart het gedeelte tussen Aalst en de tijsluis in Dendermonde. Op heden is dit gedeelte bevaarbaar voor schepen klasse II. Initieel werd met het relancebudget voorzien in een studie en herbouw van de stuw in Denderbelle. Naar aanleiding van de watersnood medio 2021 werd de focus bijgestuurd naar werken aan meerdere stuwen op de Dender.</p> <p>De initiële projectnaam 'Modal shift naar water - opstart Dender (verhoging watertransportcapaciteit)' werd op 13 mei 2022 aangepast. Cf. beslissing Vlaamse Regering 13/05/2022.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	13.176.000 EUR
Output	Vernieuwing stuwen Dender
Outcome	Vermeerderen van het goederenvervoer over water, verbeteren waterbeheersing, optimalisatie vismigratie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Initieel werd met dit budget de studie en herbouw van de stuw te Denderbelle beoogd. Bij de opmaak van het investeringsprogramma 2022 werd – de watersnood medio 2021 indachtig – de focus bijgestuurd naar andere in uitvoering/in voorbereiding zijnde projecten op de Dender. Dit betreft een breder investeringsprogramma waarvan enkele initiatieven binnen het Relanceprogramma gefinancierd worden. Meer concreet betreft het projecten i.f.v. de herbouw van een aantal andere stuwen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In 2022 werden de werken in Aalst verdergezet. - De aanbestedingsfase voor de herbouw van de stuw te Denderleeuw loopt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>- De studie in voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van de herbouw van de stuw te Pollare is in uitvoering.</p> <p>- De voorbereidende studie voor het uitvoeren van de werken voor de opwaardering van de Dender (afwaarts Aalst) - fase 1 loopt. Hiermee worden de opmaak van het aanbestedingsdossier en de documenten voor de omgevingsvergunningsaanvraag (OVA) van het stuwsluiscomplex in Denderbelle voorbereid.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Studie opwaardering Dender afwaarts Aalst	2022 Q4	Gerealiseerd	
Waterbeheersing Dender	2025 Q1	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	21.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	13.176.000 EUR
Uitvoering VAK	13.176.000 EUR
Uitvoering VEK	2.322.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 13.176.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021. Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

VV044 - MINNELIJKE VERWERVINGEN EN ONTEIGENINGEN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	MBZ, havengebonden bedrijven, bewoners, AWW, De Lijn, Stad Brugge

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	08. Modal shift naar water
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De verwervingen in Zeebrugge zijn noodzakelijk om te kunnen starten met het realiseren van een 'Nieuwe Zeesluis in Zeebrugge'. Een initiatief om het goederenvervoer over water maximaal te blijven versterken. Het totaalproject waarvoor deze verwervingen dienen plaats te vinden bestaat uit drie delen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. We realiseren een nieuwe zeesluis als volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. 2. Om het lokaal verkeer en het havenverkeer van elkaar te scheiden, komt er een nieuwe verbindingsweg, de 'Nx'. 3. Het project biedt ook kansen voor de leefbaarheid in Zeebrugge. 	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	27.000.000 EUR
Output	Verwerven van een aantal bedrijfsgronden gelegen binnen de projectzone van het project Nieuwe Sluis Zeebrugge.
Outcome	Herlocaliseren bedrijven in functie van de bouw van de nieuwe sluis en tunnel.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	<p>Voor de realisatie van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge dienen meerdere bedrijfssites, gelegen binnen de projectcontour te worden verworven. In eerste instantie wordt hierbij maximaal ingezet op een vrijwillige verwerving door de overheid, gekoppeld aan een begeleidingstraject i.f.v. de herlocalisatie van betreffende bedrijven. In eerste instantie worden de relancekredieten aangewend voor deze verwervingen. Als de relancekredieten opgebruikt zijn worden verder de reguliere kredieten van MOW aangewend.</p> <p>Alle 4 de bedrijven die voorzien werden om te verwerven met de relancemiddelen werden in 2022 verworven. Alle akten werden verleden én uitbetaald.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Verwervingen nieuwe sluis Zeebrugge	2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal verwervingen	4	2022 Q4	4	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.000.000 EUR
Uitvoering VAK	27.000.000 EUR
Uitvoering VEK	27.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

09. Welzijnsinfrastructuur

VV045 - INZETTEN OP KWALITEIT EN GOOD GOVERNANCE VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) - Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	Woonzorgvoorzieningen erkend door de Vlaamse overheid, personeel in dienst van deze voorzieningen, de gebruikers en bewoners van deze voorzieningen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	09. Welzijnsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het versterken van de zorg en levenskwaliteit voor zorgbehoevende ouderen in de woonzorg. Het project zal bestaan uit verschillende deelprojecten met volgende projectcodes:</p> <ul style="list-style-type: none">VV045.01 - VIA6VV045.02 - Indexering verhoging VIA6 BTZVV045.03 - Extra personeelsinzet wzc (covid-19)VV045.04 - Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022VV045.05 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentraVV045.06 - VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentraVV045.07 - BelRAI-opleidingenVV045.08 - e-Calcura fase 1-3VV045.09 - Transparantie sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorgVV045.10 - Verdere implementatie BelRAIVV045.11 - eWoonzorgfichesVV045.12 - Reviewplatform - een waarderingstoolVV045.13 - MantelzorgplanVV045.14 - DementieplanVV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzetVV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding) <p>Verder lichten we hieronder ook volgende budgetverschuivingen toe:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5.511 keuro naar VV115- 1.982 keuro naar VV116- 1.615 keuro naar VV116

PROJECTOMSCHRIJVING

- VV045.01 - "VIA6":

Om de gestegen zorgzwaarte en werkdruk in de ouderenzorg op te vangen en de kwaliteit van zorg te versterken werd in punt 2. van deel III van het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 afgesproken om maximaal in te zetten op bijkomende tewerkstelling. Er werd 146 miljoen euro beschikbaar gesteld om de gefinancierde personeelsnormen te versterken en/of op te trekken, wat leidt tot bijkomende personeelsinzet. Daarmee wordt ook de ongelijkheid in financiering van bewoners met eenzelfde zorgprofiel opgeheven.

Concreet worden m.i.v. 1/7/2021 tot en met 31/12/2022 woonzorgcentra en centra voor kortverblijf bijkomend gefinancierd via specifieke voorziene delen V1 en V2 in de basistegemoetkoming voor zorg (BTZ) die men per dag en per gebruiker mag factureren aan de zorgkassen. Vanaf de BTZ geldig vanaf 1/1/2023 wordt de BTZ berekend op basis van hogere personeelsnormen in de referentieperiode (1/7/2021-30/6/2022). Dat betekent dat deze voorzieningen m.i.v. 1 juli 2021 ook hogere financieringsnormen inzake personeel moeten nastreven om ook vanaf 1 januari 2023 de maximale basistegemoetkoming voor zorg te kunnen factureren.

Vanuit de relanceprovisie (vv045) wordt 11.053 keuro ingezet (2021) en 39.514 keuro ingezet (2022) in het totaalbudget van 146 miljoen euro. Daarmee werd een deel van de relancemiddelen toegevoegd aan de reguliere middelen.

- VV045.02 - "indexering verhoging VIA6 BTZ": Dit item sluit volledig aan bij vorig deelproject "VIA6" en vervat louter de nodige 3.054 keuro vanuit relance op te vangen die benodigd is om de indexatie van de middelen onder deelproject VIA6 op te vangen. Dit deelproject wordt verder in de tool telkens meegenomen met het deelproject VV045.01 "VIA6".

- VV045.03 - "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)":

In het kader van de COVID-19-crisis werd van 1/4/2021-30/9/2021 voorzien in een tijdelijke maatregel waarbij woonzorgcentra, al dan niet met bijhorende centrum voor kortverblijf, extra personeel konden inschakelen om de COVID-19-crisis aan te pakken. De voorzieningen ontvingen daarvoor een specifieke compensatie als ze de gegevens over het extra ingezet personeel meedeelde in het eLoket van Zorg en Gezondheid. 13.377 keuro van de in totaal voorziene 18.471 keuro werd ingezet vanuit de relanceprovisie. Een deel van de relancemiddelen (13.377 keuro) werd hiervoor dus toegevoegd aan andere middelen.

- VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": Aan woonzorgcentra die ten gevolge van de COVID-19-crisis een verminderde bezetting kennen ten opzichte van de bezetting pré-COVID-19 crisis werd in september 2022 een continuïteitsborg betaald voor de maanden in het eerste kwartaal van 2022. De continuïteitsborg betreft een compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg (= de financiering vanuit de VO per dag per gebruiker, grotendeels vergoeding voor de zorgpersoneelskost). De woonzorgcentra moesten om in aanmerking te komen minstens 90% van de préCovid bezetting halen en hun personeel op pijl houden. Vanuit de relancemiddelen werd hiervoor 6.671 keuro voorzien.

- VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": De COVID crisis illustreert het belang van goede ventilatie. Dit geldt zeker voor woonzorgcentra, waar kwetsbare personen langdurig verblijven en de gezondheidsrisico's ten gevolge van ontoereikende ventilatie voor hen groter zijn.

Omwille van hun eigenheid (in termen van doelpubliek, zorgconcept, schaalgrootte, gebouwtypologie en -gebruik) verdienen woonzorgcentra een specifieke benadering inzake ventilatie. Zowel op conceptueel als op operationeel vlak zijn er momenteel echter onvoldoende duidelijke richtlijnen of vormen van ondersteuning die specifiek afgestemd zijn op dergelijke zorgvoorzieningen.

PROJECTOMSCHRIJVING

Een budget van 660.000 euro (relancemiddelen) zal worden gebruikt om een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra te ontwikkelen, bestaande uit verschillende acties om de kwaliteit van ventilatie te verbeteren:

- Actie 1: uitwerken van een kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra (met uitgewerkte conceptuele en operationele doelstellingen)

- Actie 2: uitvoeren van een ventilatiescan van de aanwezige ventilatievoorzieningen in WZC

Stap 1 Actie 2: (zelf)screening van de CO₂-concentraties in typelokalen van woonzorgcentra als selectieinstrument voor WZC die gratis ventilatiescan krijgen

Stap 2 Actie 2: gratis aanbod ventilatiescan en gedetailleerd analyserapport voor 250 woonzorgcentra

Stap 3 Actie 2: gratis aanbod aanbevelingen voor technische of organisatorische aanpassingen op maat van de voorziening voor 250 woonzorgcentra

Op basis van deze stappen kunnen aanbevelingen naar het beleid worden geformuleerd vb wat de situatie is op vlak van ventilatie en wat nodig is om de ventilatie op niveau te brengen (cf. evalueren verdere subsidiebeslissingen).

- Actie 3: opmaak leidraad (draaiboek) voor een ventilatieplan op maat van het woonzorgcentrum - De aanbevelingen die voortvloeien uit de ventilatiescan, vormen de aanzet voor een woonzorgcentrum voor het uitwerken van een ventilatieplan op maat van het woonzorgcentrum. Het ventilatieplan omvat een stappenplan voor de uitvoering van de technische of organisatorische aanpassingen die nodig zijn om de aanbevelingen van de ventilatiescan te integreren en te verwerken. Om de woonzorgcentra te helpen in het proces van uitwerking en implementatie van hun ventilatieplan zal een leidraad (draaiboek) en een kortstondige begeleiding (bv. door medisch milieukundige) worden aangeboden. Aan de woonzorgcentra zal worden gevraagd om de uitvoering van het ventilatieplan (stappenplan) op te volgen via een periodiek ventilatierapport. Zo'n ventilatierapport kan, naar analogie met bv. het veiligheidsregister of het hitteplan van een voorziening, op termijn ook een element van inspectie worden.

De looptijd van dit deelproject bedraagt 3 jaar (2022-2024).

De acties binnen dit kwaliteitskader ondersteunen de zorgvoorzieningen in de ontwikkeling en integratie van een nieuw, effectief en efficiënt beleid op vlak van ventilatie of om het bestaand ventilatiebeleid te verbeteren. Deze acties steunen op en sluiten in grote mate aan bij reeds bestaande acties voor de zorgsector.

- VV045.06 - "VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra": in administratieve opstart. Budget 1.100 keuro relancemiddelen.

Dit project ondersteunt de woonzorgcentra voor de realisatie van de erkenningsvoorwaarde dat zij de tevredenheid van de zorggebruikers moeten nagaan en afhankelijk daarvan bijsturen. Minstens driejaarlijks moeten zij daartoe een verantwoorde gebruikerstevredenheidsmeting uitvoeren. Aanleiding voor dit project is het VIA6-akkoord waarin de verwachting naar de sector wordt gesteld om via het VIKZ de ervaren kwaliteit van leven, wonen en de zorg per woonzorgcentrum, zoals bevestigd bij de bewoners en hun familie, structureel te meten en transparant te maken.

De Vlaamse Regering erkent en subsidieert het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) als partnerorganisatie om de kwaliteit van de woonzorg transparant te maken en te verbeteren. Naast de beheersovereenkomst met het VIKZ wordt het meten van kwaliteit via bevestigingen bij bewoners (en familie) daarom als bijkomende opdracht aan het VIKZ toegewezen.

De looptijd van dit deelproject bedraagt 3 jaar (2022 - 2025).

- VV045.07 - "BelRAI-opleidingen": Conform het regeerakkoord worden de komende jaren verschillende BelRAI-instrumenten uitgerold in Vlaanderen: BelRAI Screener op 1 juni 2021, Sociaal supplement op 1 juni 2022, BelRAI Home Care op 1 juni 2023 en BelRAI Long-term-Care Facilities op 1 juni 2023. Binnen dit deelproject wordt voorzien in een subsidie om door de opleiding van personeel als BelRAI-trainer en als BelRAI-indicatiesteller binnen de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, dagverzorgingscentra en de verschillende thuiszorgdiensten het kwaliteitsvol gebruik van deze instrumenten mogelijk te maken. Er wordt voorts ook een subsidie toegekend aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek om BelRAI-experten op te leiden om de opleidingscapaciteit op het terrein te verhogen. Het deelproject draagt hierdoor bij aan de doelstelling tot correct leren gebruiken van BelRAI als inschalings- en

PROJECTOMSCHRIJVING

zorgplanningsinstrument met een positief effect op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de woonzorg.

Budget relance: 10.015 keuro van de in totaal 12.108keuro voor dit deelproject werd ingezet vanuit de relanceprovisie. Een deel van de relancemiddelen (10.015 keuro) werd hiervoor toegevoegd aan andere middelen.

- VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3": Het agentschap ontwikkelt een nieuwe eigen toepassing voor de berekening van de basisfinanciering van woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging en de tegemoetkomingen, voortvloeiend uit bepaalde sociale akkoorden, in bepaalde zorgvoorzieningen. De toepassing vervangt de RaaS-toepassing, een toepassing beheerd door het RIZIV, die na de zesde staats hervorming verder werd gebruikt om de continuïteit van financiering te borgen. Deze nieuwe toepassing is toekomstbestendig en stelt de Vlaamse overheid in staat haar eigen beleidsaccenten te leggen zoals het invoeren van de VIA6-financiering en de persoonsvolgende financiering. Hiervoor wordt 4.000keuro voorzien van de relancemiddelen.

Het project voorziet in drie fases:

- Fase 1: het integreren van de wijzigingen die voortvloeien uit het VIA6-akkoord in de basistegemoetkoming voor zorg WZC/CVK.

Het betreft een hybride fase waarin de RaaS-toepassing nog alle gegevensverzameling en de berekeningen uitvoert, met uitzondering van de delen A1 en A2. De naar aanleiding van VIA6 gewijzigde delen A1 en A2 zullen in deze fase worden berekend in de nieuwe toepassing.

- Fase 2: de RaaS-toepassing wordt nog gebruikt voor de gegevensverzameling (t.e.m. 30/6/2023). Nadien zal de gegevensinvoer worden verzameld via eCalcura dat wordt ingebed in het e-Loket van Zorg en Gezondheid. De berekening van alle tegemoetkomingen vindt volledig plaats in de rekenmotor van eCalcura. Een aantal financieringen die nu buiten RaaS verlopen worden geïntegreerd in eCalcura (ex-DAC, ex-gesco en aanvullende financiering).

- Fase 3: we integreren nog bepaalde andere financieringsstromen in eCalcura (bv. werkingsmiddelen centrum voor dagverzorging, infrastructuurforfait, initiatieven jongdementie, oriënterend centrum voor kortverblijf,...) en verfijnen de toepassing.

De voorziene middelen kunnen aangewend worden voor o.a.. projectmanagement, businessbehoefte analyse, functioneel technische analyses en ontwerp, architectuurontwerp en de ontwikkelingskost van de toepassing. Het agentschap sluit inzake analyse, ontwerp en ontwikkeling de nodige BSM's af met de Smals vzw.

- VV045.09 - "Transparantie sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": Overeenkomstig het regeerakkoord en het VIA6-akkoord wordt een transparante sectorspecifieke boekhouding ontwikkeld. In opvolging van het wetenschappelijk onderzoek tot bepalen van richtlijnen voor een transparante sectorspecifieke boekhouding voor de residentiële ouderenzorg starten we het vervolgtraject met de nodige analyse i.f.v. een toekomstige operationalisering. Hiervoor wordt 284.773,50 euro voorzien van de relancemiddelen.

Deze middelen zullen worden aangewend voor het gunnen van de opdracht aan een organisatie binnen de Facilitair bedrijf raamovereenkomst "Consultancy in personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign - perceel 3 organisatiedesign". De opdrachtnemer moet vervolgens de brug slaan tussen de studie van UGent 2019 "Onderzoek tot bepalen van richtlijnen voor een transparante sectorspecifieke boekhouding voor de residentiële ouderenzorg" en de effectieve implementatie en uitrol in de woonzorgcentra.

VV045.10 - Verdere implementatie BelRAI: Conform het regeerakkoord wordt het engagement genomen om BelRAI geleidelijk in te voeren in de woonzorgsector. Hiervoor worden er verschillende instrumenten geïntroduceerd in deze sector. Op 1 juni 2023 moeten de verschillende sectoren binnen de woonzorgsector aan de slag gaan met BelRAI Home Care en BelRAI Long-term-care facilities. BelRAI is in essentie een digitale toepassing. De inschalingen moeten worden ingegeven in het Vlaams IT-platform BelRAI. Om efficiënt te werken worden deze inschalingen digitaal aangemaakt en

PROJECTOMSCHRIJVING

ingevuld. Hoewel er de mogelijkheid bestaat om inschalingen offline in te vullen, moeten ze daarna online verbonden worden met het VIP BelRAI. Het is cruciaal dat de voorzieningen bijkomend investeren in hun IT-infrastructuur, zodat zij de BelRAI kunnen implementeren in hun werking. Om deze reden wordt er een subsidie van 6 miljoen voorzien voor alle sectoren.

VV045.11 - eWoonzorgfiches

In de zoektocht naar een passende zorgvoorziening, maar ook tijdens het verblijf, kan het voor een (familielid van een) gebruiker nuttig zijn om over bepaalde informatie te beschikken.

Het agentschap beschikt over allerlei objectieve data die ze verzamelt bij de uitvoering van haar opdrachten. Voor de woonzorgcentra gaat het bijvoorbeeld over: de dagprijs, de erkende capaciteit, de zorggraad van de bewoners, beschikbaar en vereist personeel, informatie over de erkenningsstatus van de voorziening,

Het project e-Woonzorgfiches (1.499.021,81 euro) zal deze gegevens, dynamisch, per voorziening ontsluiten via een gebruiksvriendelijke digitale omgeving, zijnde het ZorgAtlas Platform, ten behoeve van de burger en/of potentiële zorggebruiker. In deze eerste fase richten we ons daarbij op het beschikbaar stellen van gegevens over woonzorgcentra, desgevallend met bijbehorend centrum voor kortverblijf. Voor bepaalde gegevens zullen detailanalyses en ontwikkelingen moeten plaatsvinden om de data transparant en eenduidig beschikbaar te kunnen stellen. Voor nog andere elementen die wenselijk zijn om gepubliceerd te worden, zullen nog bepaalde ontwikkelingen moeten gebeuren om over de juiste informatie te kunnen beschikken.

De voorziene middelen worden in hoofdzaak aangewend i.f.v. de nodige behoefteanalyses, de analyse en verwerking van data, ontwikkelingen om de toepassing te realiseren en projectleiding.

VV045.12 - Reviewplatform - een waarderingstool

Meer dan vroeger vragen burgers, media, maar uiteraard ook de gebruikers en hun familie zelf dat kwaliteit, of het gebrek eraan, zichtbaar gemaakt wordt. Mensen willen immers meer dan terecht een weloverwogen keuze kunnen maken, maar willen ook hun appreciatie over een voorziening kunnen delen.

Aan de hand van een online waarderingsplatform wil de Vlaamse Overheid optreden als facilitator om transparantie te bieden in de beoordeling en waardering van gebruikers, hun familie en andere burgers over de woonzorgvoorziening(en).

Het platform dient zowel om deze beoordelingen te raadplegen, voorzieningen onderling te vergelijken, alsook om beoordelingen toe te voegen. Eind 2023 zal deze tool worden uitgerold voor de woonzorgcentra. Andere sectoren uit het Vlaamse zorglandschap kunnen eveneens worden opgenomen in een later stadium vb.: kinderopvang.

De decretale basis is vervat in het ontwerp kwaliteitsdecreet.

Voor de externe begeleiding van dit project wordt 600 keuro voorzien van de relancemiddelen. Deze middelen zullen worden aangewend voor het gunnen van de opdracht aan een organisatie binnen de raamovereenkomst van het Facilitair bedrijf "Consultancy in personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign - perceel 3 organisatiedesign".

Naast deze externe begeleiding dient de waarderingstool ook IT-technisch te worden gerealiseerd.

Voor de business- en IT-analyse alsook de IT-ontwikkeling van het waarderingsplatform wordt gewerkt binnen de modaliteiten van de Bijzondere Samenwerkingsmodel of -overeenkomst (BSM) tussen Zorg en Gezondheid en smals vzw.

Hiervoor wordt 1.000.000 euro, inclusief BTW, voorzien.

PROJECTOMSCHRIJVING

VV045.13 - Mantelzorgplan

Een nieuw Vlaams Mantelzorgplan (hierna: mantelzorgplan) werd voorgesteld aan de Vlaamse Regering op 29 april 2022. Het nieuwe beleidsplan legt een belangrijke klemtoon op het erkennen en herkennen van mantelzorgers en de bijdrage die ze leveren aan de zorg. Dit betekent enerzijds dat er acties werden uitgewerkt die als doel hebben waardering en respect te tonen. Anderzijds wordt ingezet op het ondersteunen van mantelzorgers. Hierbij is het de bedoeling goed doordachte en doelgerichte communicatie te voeren, afgestemd op diverse mantelzorgsituaties en doelgroepen. Omdat het mantelzorgplan inzet op een verbindend mantelzorgbeleid, werden thematische werkgroepen opgericht, met vertegenwoordiging uit verschillende beleidsdomeinen, die zich zullen buigen over de verschillende acties uit het plan.

Met het voorliggend project waar vanuit de relancemiddelen een subsidie van 1 miljoen euro werd toegekend, bestaande uit verschillende deelprojecten die elk hun eigen doelstellingen hebben, wordt uitvoering gegeven aan enkele acties die zijn opgenomen in het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024. Alle activiteiten opgenomen in dit project, hebben als doel op de één of andere manier bij te dragen aan de twee grote doelstellingen van het plan, het erkennen/herkennen en het ondersteunen van mantelzorgers.

De deelprojecten zullen zoveel mogelijk in de thematische werkgroepen van het mantelzorgplan worden uitgewerkt, waarvan de voortgang wordt gerapporteerd aan het monitoringcomité dat werd opgericht om de uitvoering van het mantelzorgplan op te volgen.

Het project loopt vanaf 1 december 2022 tot en met 31 december 2024.

VV045.14 - Dementieplan

Aan twee acties uit het dementieplan wordt via dit project uitvoering gegeven: enerzijds de deskundigheid en competenties van zorgverleners in het kader van het opnemen van de referentierol dementie in de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de diensten voor gezinszorg verder uitbouwen, bevorderen en versterken. Anderzijds wil het project door het uitbouwen van referentie-artsen dementie inzetten op de bekendmaking van de ziektebeelden bij dementie bij de doelgroep huisartsen, zodat de tijd tussen de eerste symptomen en de diagnose verkleint.

De activiteiten die zowel de sector diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds als de sector diensten voor gezinszorg zullen uitvoeren in kader van dit project zijn in overeenstemming met elkaar en voorzien in de verdere uitbouw van de referentierol dementie die een ruimere groep van professionals binnen de organisatie opneemt. Daarnaast zal men inzetten op sensibilisering en finaal ook op samenwerking binnen de eerstelijnszones door het openstellen van de verworven expertise naar andere lokale zorgaanbieders.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zal een pilotproject voeren. Hierbij zullen zij een opleiding referentie-arts ontwikkelen. Er wordt daarnaast voorzien in een elektronisch platform om de referentie-artsen digitaal te ondersteunen en er wordt ingezet op het aantrekken en verlonen van de artsen die de opleiding zullen volgen.

De projectduur voor de referentierol in de thuiszorg loopt vanaf 1 december 2022 tot en met 31 december 2025 met een budget van 3.000.000 euro. De projectduur voor de referentie-arts dementie zal lopen vanaf 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 met een budget van 306.000 euro.

PROJECTOMSCHRIJVING

VV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet

Conform het VIA6-akkoord van 30 maart 2021, het geïntegreerde actieplan (zij-)instroom 2021-2024 in de VIA-sectoren en het intersectoraal kaderakkoord van 1 juli 2022 betreffende het structureel instroomkanaal voor de zorg- en welzijnssectoren, wordt voorzien in een structureel kanaal voor instroom en opleiding binnen de Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen.

De Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen hebben hiermee de mogelijkheid om voor de functie van verzorgende/zorgkundige, logistiek assistent/logistiek medewerker in de zorg, kindbegeleider en opvoeder/begeleider/persoonsbegeleider werknemers tewerk te stellen die niet gekwalificeerd zijn om deze zorgfunctie/beroep uit te oefenen.

Deze personen worden structureel mee verankerd in de basisfinanciering. De voorwaarde voor de werkgevers die werken met het structureel instroomkanaal is dat de werknemers die niet opgeleid zijn om een zorgfunctie/beroep uit te oefenen, een kwalificerend opleidingstraject volgen richting één van bovenstaande knelpuntfuncties/beroepen.

Begeleiding en coaching op de werkvloer door de werkgever is essentieel voor het welslagen van het opleidingstraject van de werknemer in het kader van het structureel instroomkanaal. Hierbij wordt dan ook ingezet op het coachings- en begeleidingstraject van de werknemer in opleiding richting één van bovenstaande kwalificaties in het kader van het structureel instroomkanaal.

De werkgever ontvangt een vergoeding per coachings- en begeleidingstraject op de werkvloer. De werkgever kan deze vergoeding vrij inzetten met als finaliteit een kwaliteitsvolle begeleiding en coaching van de werknemer in opleiding.

Het coachings- en begeleidingstraject op de werkvloer in het kader van het structureel instroomkanaal omvat minimaal:

- Coaching op de werkvloer;
- Mentoring op de werkvloer;
- Werkvloerbegeleiding op maat van de werknemer in functie van het aanleren van de competenties met het oog op het behalen van een kwalificatie als verzorgende/zorgkundige, kindbegeleider, opvoeder/begeleider/persoonsbegeleider;
- Sociale dienstverlening;
- Ondersteuning van de HR-dienst in functie van de selectie en screening van de kandidaat-werknemer;
- De studiekost.

Per coachings- en begeleidingstraject van de werknemer in opleiding in kader van het structureel instroomkanaal richting de kwalificatie van logistiek assistent/logistiek medewerker in de zorg wordt een vergoeding van 4.800 euro voorzien, waarvan 600 euro studiekost.

Per coachings- en begeleidingstraject van de werknemer in opleiding in kader van het structureel instroomkanaal richting de kwalificatie van verzorgende/zorgkundige, kindbegeleider, opvoeder/begeleider/persoonsbegeleider wordt een vergoeding van 6.900 euro voorzien, waarvan 600 euro studiekost

Dit bedrag ligt in lijn met het budget van gelijkaardig opgezette trajecten (mentorkorting, doorstroomtraject collectief maatwerk, individueel en collectief maatwerk,...)

Met het voorziene budget van 23 miljoen euro worden minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten gesubsidieerd in de periode 2023-2024. Dit zijn de openstaande vacatures voor de voor ogen zijnde functies in de zorg- en welzijnssectoren.

VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)

De covid crisis illustreerde het belang van goede ventilatie. Om te komen tot een effectief en efficiënt ventilatiebeleid op maat van woonzorgcentra werd een kwaliteitskader voor

PROJECTOMSCHRIJVING

ventilatie in woonzorgcentra ontwikkeld dat momenteel gefaseerd wordt uitgevoerd. Naast woonzorgcentra verdienen ook andere kwetsbare volwassenen en kinderen die langdurig verblijven in kinderopvang, lokale dienstencentra, voorzieningen voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen de nodige aandacht omwille van de grotere gezondheidsrisico's van ontoereikende of ondoelmatige ventilatie in de infrastructuur. Om een goede binnenluchtkwaliteit in de voorzieningen te kunnen garanderen binnen aanvaardbare comfortgrenzen, afgestemd op de uitdagingen inzake energie en klimaat én met een minimale impact op de energiekost is een gerichte aanpak met verschillende maatregelen op maat van en in overleg met de sectoren nodig.

Een gedeelte van de relancemiddelen in het kader van het project VV045 (inzetten op kwaliteit en good governance van WZC en vooruitschuif nieuw beleid) zal worden gebruikt om het kwaliteitskader voor ventilatie systematisch uit te breiden naar de andere kwetsbare sectoren.

De looptijd van dit deelproject bedraagt 4 jaar (2023-2026).

BUDGETVERSCHUIVINGEN

Er vond een budgetverschuiving plaats van VV045 (verlaging) waarbij het budget werd overgedragen naar VV115. Het betreft een bedrag van 5.511.000 euro goedgekeurd door de Vlaamse Regering met de nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid.

De middelen worden op VV115 aangewend voor de (nieuwe) projecten:

- eREVAcFin - fase 2
- eIBWfin
- Ombouwen EMMA

Tot heden werd hieromtrent in VV45 niets geregistreerd, er is dus geen impact op mijlpalen en indicatoren in VV045.

Er vond een budgetverschuiving plaats van VV045 (verlaging) waarbij het budget werd overgedragen naar VV116.

Het betreft volgende bedragen:

- 1.982.000 euro goedgekeurd door de Vlaamse Regering met de nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Rapportering Modular 1 en Modular 2 via het ZorgAtlas Platform.
- 1.615.000 euro goedgekeurd door de Vlaamse Regering met de nota aan de VR van 9 december 2022 over VV045 en subsidie versterking referentierol dementie in de thuiszorg en de uitbouw van referentie-artsen dementie.

De middelen worden op VV116 aangewend voor de (nieuwe) projecten:

- Rapportering Modular 1 en Modular 2 via het ZorgAtlas Platform: 1.982.000 euro
- subsidie versterking referentierol dementie in de thuiszorg en de uitbouw van referentie-artsen dementie: 1.615.000 euro

Tot heden werd hieromtrent in VV45 niets geregistreerd, er is dus geen impact op mijlpalen en indicatoren in VV045.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	129.142.000 EUR
Output	VV045.01 - "VIA6" en VV045.02 - "Indexering verhoging VIA6 BTZ": Aanwerving extra VTE personeel / verhoging inzet bestaand personeel in woonzorgcentra en centra voor

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

kortverblijf

VV045.03 - "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)":

Tijdelijk inschakelen extra VTE personeel ikv COVID-19-crisis in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022":

De continuïteit in de woonzorgcentra borgen middels een financiële vergoeding voor de door COVID-19-leegstand gederfde inkomsten zodat de voorzieningen hun werking verder kunnen zetten en hun personeelsinzet op pijl kunnen houden en afvloeiingen en lagere kwaliteit van zorg worden vermeden.

VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra":

- er is een kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra (met uitgewerkte conceptuele en operationele doelstellingen) beschikbaar
- 250 WZC kregen een gratis ventilatiescan
- een leidraad voor een ventilatieplan op maat is beschikbaar

VV045.06 - "VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra":

- 1) De door de bewoners en hun vertegenwoordigers ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg;
- 2) Meetmethode voor een duurzame, structurele opvolging van de door bewoners en hun vertegenwoordiger ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg;

VV045.07 - "BelRAI-opleidingen":

De opleiding van indicatiestellers en trainers binnen de betrokken ouderen- en thuiszorgvoorzieningen.

VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3":

We realiseren een toekomstbestendige toepassing ter vervanging van de RaaS-toepassing die Vlaanderen in staat stelt de residentiële ouderenvoorzieningen (wzc, cvk & cdv) te financieren en de financiering van de sociale akkoorden in wzc, cvk, cdv, reva, IBW, MBE,... uit te voeren. De toepassing laat Vlaanderen toe eigen beleidsaccenten te leggen en te financieren.

VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg":

We implementeren een transparante sectorspecifieke boekhouding in de residentiële ouderenzorg, met respect voor de diversiteit in juridische organisatiestatuten, de schaalgrootte van het woonzorgcentrum en hieraan gekoppelde wettelijke kaders, daarbij aansluitend, het onderscheid tussen woon-, leef- en zorgkost in de boekhouding.

VV045.10 - "Verdere implementatie BelRAI"

De investeringen in IT hardware en software in de Vlaamse woonzorgsector om de implementatie van BelRAI mogelijk te maken.

VV045.11 - eWoonzorgfiches

Een online platform waar voor de gebruiker objectieve data over de zorgvoorzieningen kan geconsulteerd worden, wordt gerealiseerd.

VV045.12 - "Reviewplatform - een waarderingstool"

Online waarderingsplatform waar subjectieve data continu, dynamisch, laagdrempelig en per voorziening te consulteren en toe te voegen is voor de residentiële ouderenzorg als primaire groep.

VV045.13 - "Mantelzorgplan"

- er is een sensibiliseringscampagne uitgewerkt en geïmplementeerd voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op de werkvloer. Hiervoor werden minstens volgende acties uitgewerkt:

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

- a) ontwikkelen en uitrollen van een sensibiliseringscampagne gericht naar intermediairen zoals vormingsinstellingen en werkgeversorganisaties enerzijds, en werkgevers en mantelzorgers uit diverse sectoren zoals profit en non-profit anderzijds;
- b) implementeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op de werkvloer door het uitwerken of aanpassen en het promoten van verschillende relevante methodieken;
 - er is een samenwerkingsverband met relevante stakeholders en minstens volgende acties werden uitgewerkt:
 - a) in kaart brengen en eventueel ontwikkelen of aanpassen van verschillende methodieken die als doel hebben mantelzorgers beter te betrekken en ondersteunen;
 - b) het opzetten van proeftuinen in verschillende zorgsettings waarbij deze verschillende methodieken worden getest.
 - zorgaanbieders, jeugddiensten, onderwijsinstellingen zijn gesensibiliseerd over de thematiek 'jonge mantelzorgers'. Hiervoor werden minstens volgende acties uitgewerkt:
 - a) ontwikkelen en uitrollen van sensibiliseringsacties in samenwerking met verschillende relevante actoren die jonge mantelzorgers bereiken;
 - b) in kaart brengen van de noden aan ondersteuning van de verschillende stakeholders;
 - c) opzetten van trajecten en acties ter ondersteuning van jonge mantelzorgers in verschillende proeftuinen.
 - via de eerstelijnspsychologische functie wordt voorzien in psychologische begeleiding voor mantelzorgers (individueel en in groep) en er wordt ingezet op mantelzorgondersteuning . Hiervoor werden minstens volgende acties uitgewerkt:
 - a) inzetten op het toeleiden van mantelzorgers naar de eerstelijnspsychologen;
 - b) het sensibiliseren van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en psychologenkringen over het thema mantelzorg en de leefwereld van mantelzorgers opdat hier in de opleiding van (eerstelijns)psychologen en op het terrein voldoende aandacht kan worden aan geschonken;
 - c) het opstarten van gesprekken met het RIZIV over de terugbetaling van specifieke mantelzorgbegeleiding via het systeem van de eerstelijnspsychologische functie;
 - d) het uitwerken van, aanbieden van en sensibiliseren rond psycho-educatiepakketten en psychologische begeleiding voor mantelzorgers, met specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers.
 - de website www.mantelzorgers.be is geoptimaliseerd. Hierbij werden de nodige stappen voor het ontwikkelen van een nieuwe website genomen: van beperkt vooronderzoek; het ontwikkelen van wireframes; tot finale oplevering en promotie.

Voor elk van deze vijf deelprojecten wordt door de begunstigde een projectplan opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan het agentschap ten laatste op 31/03/2023.

Voor elk van deze vijf deelprojecten wordt gerapporteerd over de voortgang aan het monitoringcomité van het Vlaams Mantelzorgplan, die tevens als stuurgroep van dit project zal fungeren.

VV045.14 - "Dementieplan":

- opstellen van een plan van aanpak voor referentierol dementie thuiszorg en referentie-artsen

Specifiek voor referentierol dementie thuiszorg:

- opleidingen, intervisie en coaching rond de referentierol dementie organiseren voor de diensten maatschappelijk werk en de diensten voor gezinszorg

- openstellen van de verworven expertise naar andere lokale zorgaanbieders ter bevordering van de samenwerking tussen diensten en binnen de eerstelijnszones

Specifiek voor referentie-artsen:

- actieonderzoek voeren door een proefproject uit te rollen waarbij een opleiding referentie-arts dementie en een elektronisch platform ontwikkeld worden

- kandidaten aantrekken en verlonen die de opleiding tot referentie-arts zullen volgen

VV045.15 - "VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet"

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

De Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen hebben de mogelijkheid om voor de functie van verzorgende/zorgkundige, logistiek assistent/logistiek medewerker in de zorg, kindbegeleider en opvoeder/begeleider/persoonsbegeleider werknemers tewerk te stellen die niet gekwalificeerd zijn om deze zorgfunctie/beroep uit te oefenen. Deze personen worden structureel mee verankerd in de basisfinanciering. De voorwaarde is dat de werknemers die niet opgeleid zijn om voormelde zorgfunctie/beroep uit te oefenen, een kwalificerend opleidingstraject volgen richting één van bovenstaande knelpuntfuncties/beroepen.

Begeleiding en coaching op de werkvloer door de werkgever is essentieel voor het welslagen van het opleidingstraject van de werknemer in dit kader. Hierbij wordt dan ook ingezet op het coachings- en begeleidingstraject van de werknemer in opleiding richting één van bovenstaande kwalificaties in het kader van het structureel instroomkanaal.

De werkgever ontvangt een vergoeding per coachings- en begeleidingstraject op de werkvloer. Met het voorziene budget worden minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten gesubsidieerd in de periode 2023-2024. Doel is om begin 2023 al het merendeel van deze begeleidingstrajecten op te starten.

VV045.16 - "Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)"

- er is voor elke betrokken sector een sectorspecifiek scenario voor CO2-metingen beschikbaar
 - er is voor elke betrokken sector een sectorspecifiek kwaliteitshandboek voor ventilatie beschikbaar
 - er is voor elke betrokken sector een sectorspecifiek ventilatiescan beschikbaar: 2300 ventilatiescans zijn beschikbaar
 - er is voor elke betrokken sector een sectorspecifieke leidraad voor opmaak ventilatieplan op maat is beschikbaar
-

Outcome

VV045.01 - "VIA6" en VV045.02 - "indexering verhoging VIA6 BTZ":

Een verhoging van het aantal voltijds equivalenten ingezet personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

VV045.03 - "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)":

Een tijdelijke verhoging van het aantal VTE ingezet personeel in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf i.h.k.v. de COVID-19-crisis

VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022":

De continuïteit in de woonzorgcentra wordt geborgd. De personeelsinzet blijft op pijl en ontslagen worden vermeden.

VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra":

kwaliteit van ventilatie in WZC verbeteren-de acties binnen het kwaliteitskader ondersteunen de zorgvoorzieningen in de ontwikkeling en integratie van een nieuw, effectief en efficiënt beleid op vlak van ventilatie of om het bestaand ventilatiebeleid te verbeteren. Dit ten behoeve van de kwetsbare bevolking aanwezig in de WZC.

VV045.06 - ""VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra":

- 1) Resultaten van de meting van door de bewoners ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg;
 - 2) Resultaten van de meting van door de vertegenwoordigers van de bewoners ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg;
 - 3) Structuren, tools en methodieken om te komen tot een duurzame, structurele opvolging van de door bewoners en hun vertegenwoordiger ervaren kwaliteit van leven, wonen en zorg;
 - 4) Transparante communicatie van de resultaten van de meting per woonzorgcentrum.
-

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

VV045.07 - "BelRAI-opleidingen":

Implementatie van de instrumenten BelRAI Screener, Sociaal Supplement, Home care en LTCF volgens het voorziene tijdspad (t.e.m. 1/6/2023)

VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3":

1) In het najaar van 2022 kunnen we de financiering voor 2023 (BTZ) berekenen m.i.v. de financiering voor de VIA6 maatregelen

2) In het najaar van 2023 kunnen we de federale RaaS-toepassing verlaten en beschikt Vlaanderen over een eigen toepassing waarin het eenvoudiger beleidswijzigingen kan implementeren

VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg":

Na de uitrol van de transparante sectorspecifieke boekhouding verhoogt de transparantie over de besteding van middelen.

VV045.10 - "Verdere implementatie BelRAI": Implementatie van de verschillende BelRAI instrumenten in de woonzorgsector in de voorziene tijdspaden.

VV045.11 - eWoonzorgfiches: Aan de gebruiker reiken we bepaalde objectieve informatie aan waarover de overheid beschikt. Deze informatie moet hem o.a. ondersteunen in bijvoorbeeld de keuze voor een woonzorgcentrum. Het portaal biedt ook informatie voor andere geïnteresseerden of belanghebbenden.

VV045.12 - "Reviewplatform - een waarderingstool":

We reiken hiermee continue, toegankelijke, weze het subjectieve, informatie aan die de burger in staat stelt een persoonlijk oordeel te vormen over waardering en beleving van de ervaren kwaliteit van de voorziening door o.a. gebruikers.

Zorgvoorzieningen kunnen meer positieve beeldvorming creëren op basis van waarderingen van de zorggebruiker en dit extra in de verf zetten.

VV045.13 - "Mantelzorgplan":

- er is meer aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.

- professionele zorginstellingen en zorgprofessionals betrekken mantelzorgers meer bij belangrijke scharniermomenten in de zorg en ondersteuning van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, zoals de verhuis naar een woonzorgcentrum en het (nakend) overlijden van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.

- zorgaanbieders, jeugddiensten, onderwijsinstellingen herkennen tijdig jonge mantelzorgers en kunnen hen gepast doorverwijzen naar gepaste ondersteuning of kunnen hen deze ondersteuning zelf bieden.

- er is voorzien in meer psychologische begeleiding voor mantelzorgers (individueel en in groep) en er wordt meer ingezet op mantelzorgondersteuning.

- de huidige website www.mantelzorgers.be is geoptimaliseerd tot een centraal en helder toegangspunt voor basisinformatie rond mantelzorg.

VV045.14 - "Dementieplan": enerzijds de deskundigheid en competenties van zorgverleners in het kader van het opnemen van de referentierol dementie in de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de diensten voor gezinszorg versterken. Anderzijds inzetten op de bekendmaking van de ziektebeelden bij dementie bij de doelgroep huisartsen, zodat de tijd tussen de eerste symptomen en de diagnose verkleint.

VV045.15 - "VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet":

Met het voorziene budget worden minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten gesubsidieerd in de periode 2023-2024. Dit zijn de openstaande vacatures voor de voor ogen zijnde functies in de zorg- en welzijnssectoren. Het betreft hier begeleiding van werknemers die niet opgeleid zijn om een zorgfunctie/beroep uit te oefenen, en die een kwalificerend opleidingstraject volgen richting één van de

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

volgende knelpunctfuncties/beroepen: verzorgende/zorgkundige, logistiek assistent/logistiek medewerker in de zorg, kindbegeleider en opvoeder/begeleider/persoonsbegeleider

VV045.16 - "Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)": kwaliteit van ventilatie in de betrokken sectoren verbeteren-de acties binnen het kwaliteitskader ondersteunen de zorgvoorzieningen in de ontwikkeling en integratie van een nieuw, effectief en efficiënt beleid op vlak van ventilatie of om het bestaand ventilatiebeleid te verbeteren. Dit ten behoeve van de kwetsbare bevolking aanwezig in de zorgvoorzieningen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>VV045.01 - "VIA6" & VV045.02 - "indexering verhoging VIA6 BTZ": Uitgevoerd</p> <p>VV045.03 - "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": Uitgevoerd</p> <p>VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": uitgevoerd</p> <p>VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": Het kwaliteitshandboek ventilatie werd gepubliceerd op de website. De ontwikkeling van de leidraad voor opmaak van een ventilatieplan op maat is opgestart. De standaard voor de ventilatiescan wordt verder op punt gesteld. Een eerste groep WZC werd al gecontacteerd door VEB in kader van de praktische organisatie voor uitvoering ventilatiescan.</p> <p>VV045.06 - "VIKZ-tevredenheidsmeting woonzorgcentra": 1) Projectstuurgroep startte de werkzaamheden, 2) Voorziene middelen op moment van beslissing VR zullen worden uitbetaald.</p> <p>VV045.07 - "BelRAI-opleidingen":</p> <p>VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3": - project ronde fase 1 af. - fase 2 zit op schema. - fase 3 nog niet gestart.</p> <p>VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": - project wordt via minicompetitie gegund in Q4 2022 waarna het effectief start in Q1 2023</p> <p>VV045.10 - Verdere implementatie BelRAI Info toe te voegen</p> <p>VV045.11 - eWoonzorgfiches Het project is toegewezen aan een partner om de aak aangewend i.f.v. de nodige behoefteanalyses, de analyse en verwerking van data, ontwikkelingen om de toepassing te realiseren en projectleiding uit te voeren</p> <p>VV045.12 - Reviewplatform - een waarderingstool</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<p>- Externe begeleiding voor project wordt via minicompetitie gegund in Q4 2022 waarna het effectief start in Q1 2023</p> <p>-----</p> <p>VV045.13 - Mantelzorgplan - BVR goedgekeurd VR 25/11/2022, vastlegging in orde</p> <p>-----</p> <p>VV045.14 - Dementieplan - BVR goedgekeurd VR 9/12/2022, vastlegging in orde</p> <p>-----</p> <p>VV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet Info toe te voegen - BVR goedgekeurd 09/12/22 - uitbetaling subsidie 23 mio aan VIVO gebeurt gefaseerd: * een voorschot van 5 miljoen euro wordt onmiddellijk uitbetaald * het saldo van 18 miljoen euro wordt verder gefaseerd uitgekeerd na validatie van de voortgang van de coachings- en begeleidingstrajecten op de stuurgroep (zij-)instroom VIA6 - De eerste coachings- en begeleidingstrajecten worden opgestart begin 2023</p> <p>-----</p> <p>VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding) -er werd een gunningsprocedure voor projectwerking specifiek voor de begeleiding bij de ontwikkeling van de verschillende pijlers van het kwaliteitskader opgestart. Van zodra de opdracht gegund kan het project starten. VIPA sloot al een samenwerkingsovereenkomst met het VEB af voor de ontwikkeling van de sectorspecifieke ventilatiescan.</p> <p>-----</p> <p>Er vonden volgende budgetverlagingen plaats: - 5.511 keuro overgedragen naar VV115 - 1.982 keuro overgedragen naar VV116 - 1.615 keuro overgedragen naar VV116</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALLEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV045.01 - "VIA6": Uitvoering VIA 6 maatregelen kwaliteit ouderenzorg	2021 Q3	Gerealiseerd	De financiering VIA6 werd geïntegreerd in de basisfinanciering en toegepast m.i.v. 1/7/2021.
VV045.02 - "indexering verhoging VIA6 BTZ" (loopt samen met deelproject "VIA6")	2021 Q3	Gerealiseerd	De financiering VIA6 werd geïntegreerd in de basisfinanciering en toegepast m.i.v. 1/7/2021. Dit deelproject vervat de benodigde middelen om ook de indexatie van de maatregelen op te vangen.
VV045.03 - "extra personeelsinzet wzc (covid-19)": goedkeuring besluit covid-maatregelen	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV045.03 - "extra personeelsinzet wzc (covid-19)": uitbetalen compensaties voor de inzet van extra personeel	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": opmaak BVR	2022 Q2	Gerealiseerd	Opmaak van regelgeving voor goedkeuring door VR
VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": Gegevens zijn opgevraagd en subsidie is uitbetaald	2022 Q3	Gerealiseerd	De woonzorgcentra delen alle gegevens mee aan Zorg en Gezondheid waarna het agentschap de continuïteitsborg berekent en uitbetaalt uiterlijk op 31 augustus 2022. Subsidie werd uitbetaald op 30 september 2022
VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": BVR is goedgekeurd en gepubliceerd	2022 Q3	Gerealiseerd	De Vlaamse Regering keurde het BVR goed op 3 juni 2022 waarna de uitvoering van de regeling kan starten.
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis aanbod ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: Pilotstudie haalbaarheid CO2 zelfmetingen	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis aanbod ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: Ontwikkelen registratietool en dataplatform screening CO2-concentraties	2022 Q1	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: er is een overeenkomst met KUL Onderzoeksgroep Bouwfysica en Duurzaam Bouwen voor de opmaak van het kwaliteitshandboek	2022 Q1	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: CO2-screening (zelfmetingen)	2022 Q1	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor	2022 Q2	Gerealiseerd	WZC werden ook op de hoogte gebracht

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
250 woonzorgcentra: selectie WZC voor gratis ventilatiescan op basis van hun zelfmetingen			
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: er is een overeenkomst met het Vlaams energiebedrijf voor de ontwikkeling van de ventilatiescan	2022 Q2	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: oprichting WG voor input op kwaliteitshandboek met relevante actoren	2022 Q2	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: de KUL heeft zijn opdracht afgerond	2022 Q3	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: pilootstudie ventilatiescans	2022 Q3	Gerealiseerd	timing 2022 Q3 heeft vertraging opgelopen, maar op moment van deze rapportage is de pilootstudie voor de ventilatiescans zo goed als gerealiseerd. De ventilatiescans in de WZC betrokken in de piloot werden allemaal afgerond. De individuele rapporten worden nu gefinaliseerd. De standaard voor het uitvoeren van een ventilatiescan wordt nu op punt gesteld. Vertraging geen impact op uitvoering volgende mijlpaal VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra": uitvoering is opgestart
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: opdracht voor copyright en layout van het kwaliteitshandboek is afgerond	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: het operationele	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
luik van het kwaliteitshandboek opgeleverd door de KUL werd aangevuld			
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra: er is een opdracht voor copyright en layout voor het kwaliteitshandboek	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- leidraad voor een ventilatieplan op maat: er is een opdracht voor de ontwikkeling van de leidraad	2023 Q1	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek voor ventilatie in woonzorgcentra werd gepubliceerd op website	2023 Q1	Gerealiseerd	
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- leidraad voor een ventilatieplan op maat: de leidraad werd gepubliceerd op website	2023 Q2	Op schema	de leidraad is nu in ontwikkeling
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- gratis ventilatiescans voor 250 woonzorgcentra: 250 gratis ventilatiescans werden uitgevoerd	2024 Q4	Op schema	een eerste groep WZC werd al gecontacteerd door VEB in kader van de praktische organisatie voor uitvoering ventilatiescan. Alle ventilatiescans in principe afgerond tegen eind 2024
VV045.06 Inventarisatie bestaande tevredenheidsmetingen en verwachtingen vanuit de sector	2021 Q2	Gerealiseerd	Vaststelling diversiteit van meetinstrumenten. Verwachtingen zijn geëxpliciteerd.
VV045.06 Resultaten pilotmeting en aangepast meetprotocol voor opstart nulmeting	2023 Q3	Op schema	Stuurgroep opgestart. Opstarttaken bezig, projectplanning opgemaakt.
VV045.06 Resultaten nulmeting en meetprotocol bevraging vertegenwoordiger van bewoners	2024 Q3	Nog niet gestart	
VV045.06 Resultaten bevraging vertegenwoordigers van bewoners en eindrapport	2025 Q3	Nog niet gestart	
VV045.07 - BelRAI-opleidingen - subsidie aan voorzieningen voor opleidingsbeleid	2021 Q4	Gerealiseerd	Subsidiebedrag werd uitbetaald. Vormingsbeleid zelf zal een permanent

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			gegeven vormen waarbij tegen 1/6/2023 deze organisaties over voldoende BelRAI-indicatiestellers en -trainers dienen te beschikken om de BelRAI-instrumenten te implementeren. De naleving van deze erkenningsvoorwaarde zal deel uit maken van de inspectiebezoeken van Zorginspectie.
VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3": Fase 1 - implementatie VIA6 in eCalcura gerealiseerd	2022 Q4	Gerealiseerd	Fase 1: de berekening van de financiering via de basistegemoetkoming voor zorg (BTZ) 2023 wordt berekend via eCalcura. De VIA6-maatregelen (in de delen A1 en A2 van BTZ) zijn gerealiseerd in de nieuwe toepassing.
VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3": Fase 2. De e-Calcura toepassing vervangt de volledige rekenmotor van de federale RaaS-toepassing.	2023 Q4	Op schema	De RaaS-toepassing wordt niet langer gebruikt. De ingave van gegevens door de voorzieningen en de volledige berekening van de financiering via de basistegemoetkoming voor zorg en de sociale akkoorden verloopt via eCalcura.
VV045.08 - "e-Calcura fase 1-3": Fase 3 - integratie andere subsidiestromen	2024 Q4	Nog niet gestart	Ook andere bestaande subsidiestromen worden in de eCalcura toepassing geïntegreerd.
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": start opdracht	2023 Q1	Nog niet gestart	De opdrachtnemer start met de opdracht.
VV045.11 - eWoonzorgfiches	2023 Q2	Nog niet gestart	Analyses aangevat en tijdslijn opgesteld. Vanaf dat punt kunnen verder mijlpalen worden gedefinieerd.
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": fase definiëring	2023 Q3	Nog niet gestart	De opdrachtnemer definieerde – in overleg met het werkveld - de activiteitencentra, analytische boekhoudkundige opdeling in kosten- en opbrengstenbestanddelen en – elementen met aandacht voor de verschillen tussen de organisatievormen;
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": richtlijnen en rapporteringssjabloon i.f.v. piloot	2023 Q4	Nog niet gestart	De opdrachtnemer ontwikkelde praktische richtlijnen en standaard rapporteringssjabloon i.f.v. pilootfase
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": pilootfase	2024 Q1	Nog niet gestart	opzet, uitvoeren en analyse van pilootfase inclusief desgevallend bijsturing o.b.v. vaststellingen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": Wettelijk kader	2024 Q2	Nog niet gestart	Het wettelijk kader is voorzien i.f.v. de algemene uitrol.
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg": uitrol sectorbreed	2024 Q2	Nog niet gestart	De rapportering wordt sectorbreed uitgerold.
VV045.10 Verdere implementatie BelRAI	2021 Q4	Op schema	Uitbetaling 80% van het subsidiebedrag is voorzien op 21/12/2022 conform de bepalingen van het besluit
VV045.11 - eWoonzorgfiches: Partner aangesteld voor realisatie van de behoefteanalyses, de analyse en verwerking van data, ontwikkelingen om de toepassing te realiseren en projectleiding	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.12 Waarderingstool : Partner aangesteld voor de externe begeleiding	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.12 waarderingstool: Aanduiden partnerorganisatie	2023 Q2	Nog niet gestart	
VV045.12 Waarderingstool: IT-ontwikkeling tool Piloot	2023 Q3	Nog niet gestart	
VV045.12 Waarderingstool: Go live piloot	2023 Q4	Nog niet gestart	
VV045.13 - "Mantelzorgplan" Het BVR tot toekenning van de middelen is goedgekeurd en de de middelen zijn vastgelegd.	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.13 - "Mantelzorgplan" De projectplannen voor de vijf deelprojecten zijn goedgekeurd.	2023 Q1	Op schema	De opdrachtnemers zijn gestart met de opmaak van de projectplannen.
VV045.13- "Mantelzorgplan" in functie van de ontwikkeling van een nieuwe website mantelzorgers.be werd het vooronderzoek uitgevoerd.	2023 Q2	Nog niet gestart	
VV045.13- "Mantelzorgplan"	2023 Q4	Nog niet gestart	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
in functie van de ontwikkeling van een nieuwe website mantelzorgers.be werden wireframes ontwikkeld.			
VV045.13- "Mantelzorgplan" een nieuwe website mantelzorgers.be werd opgeleverd.	2024 Q3	Nog niet gestart	
VV045.13 - "Mantelzorgplan" er werden trajecten en acties ter ondersteuning van jonge mantelzorgers in verschillende proeftuinen opgezet.	2024 Q4	Nog niet gestart	
VV045.13 - "Mantelzorgplan" verschillende methodieken die als doel hebben mantelzorgers beter te betrekken en ondersteunen werden getest en er werden proeftuinen opgezet in verschillende zorgsettings.	2024 Q4	Nog niet gestart	
VV045.13- "Mantelzorgplan" wanneer nodig worden mantelzorgers systematisch toegeleid naar de eerstelijnspsychologen.	2024 Q4	Nog niet gestart	
VV045.13 - "Mantelzorgplan" sensibiliseringsacties werden ontwikkeld en uitgerold in samenwerking met verschillende relevante actoren die jonge mantelzorgers bereiken.	2024 Q4	Nog niet gestart	
VV045.13 - "Mantelzorgplan"	2024 Q4	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
er zijn verschillende relevante methodieken uitgewerkt of aangepast en het implementeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op de werkvloer wordt gepromoot.			
VV045.13 - "Mantelzorgplan" de noden aan ondersteuning van de verschillende stakeholders t.a.v. de thematiek jonge mantelzorgers, werden in kaart gebracht.	2024 Q4	Nog niet gestart	
VV045.13 - "Mantelzorgplan" verschillende methodieken die als doel hebben mantelzorgers beter te betrekken en ondersteunen werden in kaart gebracht en eventueel ontwikkeld of aangepast.	2024 Q4	Nog niet gestart	
VV045.13- "Mantelzorgplan" onderwijsinstellingen en psychologenkringen zijn gesensibiliseerd over het thema mantelzorg en de leefwereld van mantelzorgers, en er wordt aandacht geschonken hieraan in de opleiding van (eerstelijns)psychologen en op het terrein.	2024 Q4	Nog niet gestart	
VV045.13- "Mantelzorgplan" er is een aanbod aan psycho-educatiepakketten en psychologische begeleiding voor mantelzorgers, met specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers uitgewerkt.	2024 Q4	Nog niet gestart	
VV045.13- "Mantelzorgplan" de Vlaamse Overheid is in gesprek met het RIZIV over de terugbetaling van specifieke mantelzorgbegeleiding via het systeem van de eerstelijnspsychologische functie.	2024 Q4	Nog niet gestart	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV045.13 - "Mantelzorgplan" er is een sensibiliseringscampagne ontwikkeld en uitgerold gericht naar intermediairen zoals vormingsinstellingen en werkgeversorganisaties enerzijds, en werkgevers en mantelzorgers uit diverse sectoren zoals profit en non-profit anderzijds.	2024 Q4	Nog niet gestart	
VV045.13- "Mantelzorgplan" de nieuwe website mantelzorgers.be werd gepromoot.	2024 Q4	Nog niet gestart	
VV045.14 - Dementieplan: goedkeuring BVR + vastlegging middelen	2022 Q4	Gerealiseerd	
VV045.14 - Dementieplan: opstellen van een plan van aanpak voor referentierol dementie thuiszorg en referentie-artsen	2023 Q1	Nog niet gestart	
VV045.14 - Dementieplan: referentie-artsen - actieonderzoek afgerond	2023 Q4	Nog niet gestart	
VV045.14 - Dementieplan: referentierol thuiszorg - opleidingen, intervisie en coaching georganiseerd en verworven expertise wordt opengesteld naar andere lokale zorgaanbieders ter bevordering van de samenwerking tussen diensten en binnen de eerstelijnszones	2025 Q4	Nog niet gestart	
VV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet - opstart begeleidings-en coachingtrajecten in kader structureel instroomkanaal	2023 Q2	Nog niet gestart	Met het voorziene budget van 23 miljoen euro worden minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten gesubsidieerd inde periode 2023-2024. Dit zijn de openstaande vacatures voor de voor ogen zijnde functies in de zorg- en welzijnssectoren. Doel is om begin 2023 al het merendeel van deze begeleidingstrajecten op te starten.
VV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet - afronding begeleidings-en coachingtrajecten in kader structureel instroomkanaal	2024 Q4	Nog niet gestart	Met het voorziene budget van 23 miljoen euro zijn in totaal voor de periode 2023-2024 minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten opgestart of afgerond.
VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)-voor elke sector	2026 Q2	Nog niet gestart	Er werd een gunningsprocedure voor projectwerking specifiek voor de

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
betrokken in de uitbreiding is een sectorspecifiek scenario voor uitvoeren van CO2-metingen beschikbaar: dit scenario wordt opgenomen in het sectorspecifieke kwaliteitshandboek			begeleiding bij de ontwikkeling van de verschillende pijlers van het kwaliteitskader opgestart. Van zodra de opdracht gegund kan het project starten.	
VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)-voor elke betrokken sector is een sectorspecifieke ventilatiescan beschikbaar- in totaal zijn 2300 ventilatiescans beschikbaar	2026 Q2	Op schema	VIPA sloot al een samenwerkingsovereenkomst met het VEB af voor de ontwikkeling van de sectorspecifieke ventilatiescan. Er werd een gunningsprocedure voor projectwerking specifiek voor de begeleiding bij de ontwikkeling van de verschillende pijlers van het kwaliteitskader opgestart. Van zodra de opdracht gegund kan het project verder starten. Timing uitvoering van de scans onder voorbehoud 2026 Q2; afhankelijk van capaciteit bij VEB.	
VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)-voor elke sector betrokken in de uitbreiding is een sectorspecifieke leidraad voor de opmaak van een ventilatieplan op maat beschikbaar : de leidraad werd gepubliceerd op website	2026 Q2	Nog niet gestart	Er werd een gunningsprocedure voor projectwerking specifiek voor de begeleiding bij de ontwikkeling van de verschillende pijlers van het kwaliteitskader opgestart. Van zodra de opdracht gegund kan het project starten.	
VV045.16 - Financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie (uitbreiding)-voor elke betrokken sector is een sectorspecifiek kwaliteitshandboek ventilatie ter beschikking-het kwaliteitshandboek werd gepubliceerd op de website	2026 Q2	Nog niet gestart	Er werd een gunningsprocedure voor projectwerking specifiek voor de begeleiding bij de ontwikkeling van de verschillende pijlers van het kwaliteitskader opgestart. Van zodra de opdracht gegund kan het project starten.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
VV045.01 - VIA6 VV045.02 - Indexering verhoging VIA6 BTZ Bijkomende tewerkstelling per woonzorgcentrum. De geplande aantallen VTE aanwerving en uitbreiding én de aanwervingsdata van de bijkomende personeelsleden worden doorgegeven tegen eind oktober 2021 via het Vlaams e-loket	2.264 (VIA6-akkoord)	2021 Q4	2.660,4	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
(Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).				
VV045.07 - BelRAI-opleidingen: subsidiebedrag wordt uitbetaald aan alle betrokken ouderen- en thuiszorgorganisaties. Vormingsbeleid zelf zal een permanent gegeven vormen waarbij tegen 1/6/2023 deze organisaties over voldoende BelRAI-indicatiestellers en -trainers dienen te beschikken om de BelRAI-instrumenten te implementeren. Daarnaast dient het vormingsbeleid te worden verankerd in de organisatie om permanente intervisie en bijscholing mogelijk te maken. Deze subsidie is een bijdrage om tegemoet te komen in de opstartkost van deze organisaties.	Volledige toekenning van subsidie 12.132.432,07 euro	2021 Q4	12.132.432,07	100 %
VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": aan alle woonzorgcentra met een verminderde bezetting die aan de voorwaarden voldoen wordt een continuïteitsborg betaald	Betaling van compensatie in Q3	2022 Q3	6.671.000	100 %
VV045.10 Verdere implementatie BelRAI: Er wordt 80% van het subsidiebedrag uitbetaald aan de thuiszorg- en residentiële actoren. De investeringen zullen tijdig gemaakt moeten worden om met de BelRAI instrumenten van start te kunnen gaan op 1 juni 2023 en de implementatieperiode die daarna nog zal voorzien worden.	Gedeeltelijke toekenning van het subsidiebedrag	2022 Q4	1	80 %
VV045.08 - Deelproject "e-Calcura fase 1-3"	Fase 1 afgerond	2022 Q4		100 %
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- kwaliteitshandboek	handboek beschikbaar	2023 Q1		100 %
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"- leidraad plan op maat	leidraad beschikbaar	2023 Q2		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg"	Praktische richtlijnen en sjabloon ontwikkeld	2023 Q4		
VV045.08 - Deelproject "e-Calcura fase 1-3"	Fase 2 afgerond	2023 Q4		30 %
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg"	Pilootfase uitgevoerd	2024 Q1		
VV045.11 - eWoonzorgfiches: het webplatform is online	100%	2024 Q1		
VV045.09 - "Transparante sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg"	Uitrol in alle woonzorgcentra (2022 = 825)	2024 Q2		
VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra"-250 gratis ventilatiescans voorzien in oorspronkelijk plan- 218 WZC namen deel aan de CO2-screeningsweek, dus maximaal 218 WZC krijgen gratis ventilatiescan	218	2024 Q4		
VV045.15 - VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet - opstart en afronding coachings- en begeleidingstrajecten in kader instroomkanaal	Met het voorziene budget van 23 miljoen euro worden minimaal 3.300 coachings- en begeleidingstrajecten gesubsidieerd in de periode 2023-2024. Dit zijn de openstaande vacatures voor de voor ogen zijnde functies in de zorg- en welzijnssectoren.	2024 Q4		
VV045.08 - Deelproject "e-Calcura fase 1-3"	Fase 3 afgerond	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	138.250.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	129.142.000 EUR
Uitvoering VAK	117.126.000 EUR
Uitvoering VEK	89.500.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 129.142.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VV045.01 - "VIA6" & VV045.02 - "indexering verhoging VIA6 BTZ" : [Vlaams intersectoraal akkoord \(VIA6\): wijziging uitvoeringsbesluit Vlaamse sociale bescherming wat VIA6-maatregelen kwaliteit ouderenzorg betreft](#)

VV045.03 - "Extra personeelsinzet wzc (covid-19)": [Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 april 2021](#)

VV045.04 - "Covid-19 compensatie continuïteitsborg WZC Q1 2022": [Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2022 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 januari 2022.](#) [Nota en Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2022 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 januari 2022](#)

VV045.05 - "financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra": [Bisnota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC en vooruitschuif nieuw beleid – financiering van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 14 oktober 2022. Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC en vooruitschuif nieuw beleid – financiering van de uitbreiding van een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra naar andere zorg- en welzijnsvoorzieningen WVG](#)

[Bijlage. Uitbreiding ventilatieplan](#)

VV045.06 - "VIKZ-tevredenheidsmeting in woonzorgcentra": beslist door VR

VV045.07 - "BelRAI opleidingen": [Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidie opleidingen BelRAI-instrumenten](#)

Meerdere projecten en budgetverschuiving VV115:

VV045.08: e-calcura fase 1-3,

VV045.09: Transparantie sectorspecifieke boekhouding residentiële ouderenzorg

VV045.11: e-woonzorgfiches

VV045.12: Reviewplatform

Budgetverschuiving: 5.511 keuro naar VV115

VR 28 oktober 2022 - Subsidie meetmethodiek woonkwaliteit woonzorgcentra

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Rapportering Modular 1 en Modular 2 via het ZorgAtlas Platform](#): beslissing over budgetverschuiving van 1,982 miljoen euro van VV045 naar VV116

VR 25 november 2022 - Subsidie projecten mantelzorg Vlaams Mantelzorgplatform vzw en Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

VR 2 december 2022 - Subsidie aan diverse woonzorgvoorzieningen voor IT-infrastructuur voor implementatie van BelRAI-instrumenten

VR 9 december 2022 - Subsidie VIVO vzw voor coachings- en begeleidingstrajecten op de werkvloer in de Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnssectoren

[Nota aan de VR van 9/12/2022 over VV045 en subsidie versterking referentierol dementie in de thuiszorg en de uitbouw van referentie-artsen dementie](#): beslissing over budgetverschuiving van 1,6 miljoen euro van VV045 naar VV116

VV045.13: Mantelzorgplan

VV045.14: Dementieplan

VV045.15: "VIVO: Instroom, retentie, extra personeelsinzet": BVR coachingcoachings- en begeleidingstrajecten op de werkvloer in kader van het structureel instroomkanaal goedgekeurd op [VR 09/12/2022](#)

VV046 - OPTREKKEN STRATEGISCHE FORFAITS ZIEKENHUIZEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Zorgnetlcuro en betrokken ziekenhuizen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	09. Welzijnsinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het strategisch forfait is gelinkt aan een infrastructuurinvestering die past binnen een zorgstrategisch kader voor Vlaanderen. Elke investering die raakt aan de zorgstrategische planning dient goedgekeurd te worden door de Vlaamse overheid en moet in overeenstemming zijn met de zorgstrategische planning zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. Het zorgstrategische kader zal dus in principe de basis vormen voor de toekenning van het strategisch forfait. In afwachting van de goedkeuring van de zorgstrategische plannen op regionaal niveau en de individuele zorgstrategische plannen op ziekenhuisniveau kan de Vlaamse Regering echter strategische forfaits toekennen aan dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	Voor de ziekenhuissector worden extra strategische forfaits ingezet/uitbetaald gekoppeld aan de vernieuwing van het gebouwpatrimonium. In totaal voor 35,6 mio euro (waarvan 10 mio euro uit het Relanceplan).
Outcome	Op korte termijn kunnen de bouwwerken voor of aan de ziekenhuisinfrastructuur worden opgestart.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	De toezegging van investeringssubsidies maakt het mogelijk dat in 35 ziekenhuizen significante bouwprojecten (nieuwbouw of herconditionering van bestaande infrastructuur) kunnen worden uitgevoerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
beslissing VR	2021 Q2	Gerealiseerd		
Beslissing VR	2021 Q4	Gerealiseerd		
Beslissing VR	2022 Q1	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	16.789.154,90	2021 Q2	16.789.154,9	100 %
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	4.280.729,38	2021 Q4	4.280.729,38	100 %
Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	14.564.555,8 euro	2022 Q1	14.564.555,8	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 25.635.000 EUR

10. Waterstofonderzoek

VV047 - WATERSTOFONDERZOEK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Belanghebbenden	De portfolio richt zich op bedrijven als begunstigden van steun. Dit omvat zowel grote ondernemingen als kmo's. De portfolio beoogt evenwel een ruime impact op het ecosysteem die verder gaat dan individuele bedrijfsvalorisatie. Dit wordt expliciet opgenomen in de criteria, met een voorkeur voor projecten met impact op het ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn. Ook samenwerking met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren wordt hier in rekening genomen. De concrete invulling van impact op het ecosysteem en spill overs kan variëren, per project. Deze zullen later evenwel opgenomen worden als voorwaarden in de subsidietoekenningen zoals ook gebeurd is bij de deelname aan IPCEI-batterijen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	10. Waterstofonderzoek
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Waterstof is een belangrijke component in de transitie naar een klimaatneutrale energie. Waterstof is een energiedrager die kan gebruikt worden voor opslag van energie uit hernieuwbare bronnen maar heeft diverse toepassingen, zoals het gebruik in de industriële processen en aanwending voor transport. Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een cruciale uitdaging. In de waterstofstrategie van de EU wordt uitgegaan van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt de uitbouw van waterstofproductie, maar ook de uitbouw van een waardeketen om transport en gebruik van waterstof en transitie van de industrie in het algemeen mogelijk te maken.</p> <p>Projectdoelstellingen :</p> <p>Met het huidige project beoogt de Vlaamse regering een ondersteuning van de transitie naar een duurzame waterstofindustrie in Vlaanderen via investeringen en projectfinanciering. Met deze portfolio beoogt de Vlaamse regering de uitbouw van een waardeketen in Vlaanderen te stimuleren die ingebed is in een lange termijn doelstelling van vergroening van de industrie en bijdraagt tot de transitie van de industrie waarbij ingespeeld wordt de evolutie naar een meer klimaatneutrale industrie.</p> <p>Het project omvat voor een grootste deel een portfolio die ingebed is in de belangrijke projecten van algemeen Europees belang (Important Projects Common European Interest-IPCEI). Hiermee beoogt de Vlaamse regering aansluiting bij ruimere Europese waardeketens om via die weg de competitiviteit en duurzaamheid van de beoogde transitie te ondersteunen. Waar de IPCEI-portfolio zich vooral richt op de uitbouw van een industriële waardeketen</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

naar productie, transport, stockage en toepassingen van waterstof zal er binnen het project ook aandacht geschonken worden aan import van waterstof. De eigen productie nooit zal immers nooit kunnen voldoen aan de vraag zodat import vereist zal zijn om een stabiel en betaalbaar aanbod te waarborgen om continuïteit in de toepassingen te kunnen garanderen.

Uitvoering van het project:

Het project wordt gerealiseerd door investeringen en projectfinanciering bij bedrijven waarbij aangesloten wordt bij het Europese initiatief over Important Projects of Common European Interest (IPCEI). De focus ligt op projecten met een doorbraakkarakter en duidelijke ambitie met voorrang aan projecten met een bijdrage aan een innovatieve component. Projecten moeten een duidelijke impact hebben op het Vlaamse ecosysteem waarbij i.h.b. de kmo's baat hebben bij de uitvoering, ook wanneer zij geen projectpartner zijn.

Buiten de IPCEI-portfolio zullen ook additionele projecten met een focus op waterstof beschouwd worden. Dit kunnen O&O&I- of investeringsprojecten zijn die geen nood hebben aan de verruimde staatsteun geboden in IPCEI of projecten m.b.t. import van waterstof.

Voor deelname aan IPCEI werd een portfolio opgebouwd op basis van expressions of interest vanuit de industrie ingediend in een open oproep op 5 juni 2020. Deze gebeurde gezamenlijk met het Brussels hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest met coördinatie door de federale overheid (FOD-economie).

De portfolio beoogt een brede waardeketen met

- (1) productie van groene waterstof uit hernieuwbare energie,
- (2) omzetting naar vloeibare brandstoffen met afgevangen CO₂ voor bewaring en gebruik als brandstof,
- (3) aanwending in industriële processen met het oog op groene transitie,
- (4) aanwending in mobiliteit (zwaar transport),
- (5) ondersteunende producten vereist voor de realisatie van waterstoftransitie,
- (6) infrastructuur voor transport en bewaring van waterstof.

Er zijn 3 types projecten. (1) Projectmatige steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). (2) Eerste industriële toepassing (first industrial deployment-FID): deze moeten steeds de ontwikkeling mogelijk maken van een nieuw product en/of de ontwikkeling van een fundamenteel nieuw productieproces. FID omvat grotendeels investeringen, maar gekoppeld aan de uitrol van de O&O&I resultaten. Zowel OPEX als CAPEX worden aanvaard. (3) Infrastructuur voor milieu en energie. Dit omvat financiering voor investeringen die niet noodzakelijk gekoppeld zijn aan O&O&I. De financiering wordt toegekend op basis van de beoogde milieuwinst. Enkel CAPEX wordt aanvaard.

De opvolging van de projecten gebeurt door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Na notificatie zullen, aanvragen voor finale financiering behandeld worden door het agentschap, waarbij de operationele implementatie grotendeels zal gebeuren door toepassing van de gangbare werkwijze van het agentschap (evaluatie, betaling, opvolging, voorwaarden en mijlpalen...)

Om een coherente samenwerking in de IPCEI-projecten mogelijk te maken werd een evaluatiecomité opgesteld met vertegenwoordigers van de verschillende financierende autoriteiten op regionaal of federaal niveau en coördinatie daar de federale overheid (FOD-economie). Via deze groep is er een nauw overleg tussen Vlaanderen, het Waalse gewest, het Brusselse hoofdstedelijk gewest en de federale overheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	125.000.000 EUR
-------	-----------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	Aantal gesteunde projecten (vastlegging Vlaamse steunbeslissingen) Aantal gerealiseerde projecten (oplevering resultaten) Betalingen uitgevoerd (90%)
Outcome	Gerealiseerde electrolysecapaciteit voor productie waterstof uit hernieuwbare energie (90 MWatt)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De prenotificatie bij Europa gebeurt in verschillende golven. Wegens een beduidende vertraging in het notificatieproces bij de Europese Commissie heeft Vlaanderen geopteerd om de beslissingen tot steuntoekenning te nemen op voorwaardelijke basis waarbij de steun reeds beslist en vastgelegd wordt maar de uitbetaling en uitvoering afhankelijk blijven van de finale goedkeuring. De bevestiging dat het project kan doorgaan zoals ingediend blijft afhankelijk van deze goedkeuring door de Europese Commissie die dus een duidelijke impact blijft hebben op het schema van het Vlaamse traject.</p> <p>Voor de Vlaamse beslissingen gefinancierd via VV047 werd de portfolio opgedeeld in 11 beslissingen voor (deel)projecten. Voor al deze (deel)projecten werd de beslissing voor steuntoekenning gerealiseerd in 2022 met een totale steuntoekenning van 126,24 miljoen euro. Aangezien het budget 125 miljoen bedraagt werd het negatieve saldo opgevangen door verschuiving vanuit de reguliere middelen van 1,24 miljoen euro wat de totale steuntoekenning ten laste van VV047 op 125 miljoen brengt of 100% van de beschikbare middelen.</p> <p>Wat de Europese goedkeuring betreft werden de eerste 2 IPCEI-golven Hy2Tech en Hy2Use goedgekeurd in juli en september met hierin 3 Vlaamse deelprojecten. Een aantal projecten werd door de Commissie overgedragen naar het CEEAG kader met een individuele notificatie die nog in behandeling is voor 2 Vlaamse deelprojecten. Hiernaast hebben heel wat projecten geopteerd voor een terugvalpositie onder de bestaande staatssteunregels waarvoor een aparte goedkeuring via een Europees notificatieproces niet langer vereist is, deze groep omvat 6 Vlaamse deelprojecten. De omvang van de steun waarvoor de Europese goedkeuring in het CEEAG kader nog in behandeling is bedraagt 31,93 miljoen euro. Hier wordt een goedkeuring verwacht in de eerste helft van 2023.</p> <p>Op niveau van de betrokken ondernemingen werd een goedkeuring onder het IPCEI kader verkregen voor Hydrogenics/Cummins en Engie-Electrabel, is een notificatie nog in behandeling onder het CEEAG-kader voor Hyoffwind en voor het deelproject eerste industriële ontplooiing van het RecHycle project van ArcelorMittal en is geen Europese goedkeuring vereist voor Power to Methanol, DATS, Aertssen, Terranova Hydrogen, Air Liquide en een milieustudie van ArcelorMittal.</p> <p>Naast de financiering binnen VV047 werden aansluitend twee beslissingen genomen voor steun aan deelprojecten met Vlaamse middelen via FIO (Fonds Innoveren en Ondernemen), met name de O&O&I-component en de infrastructuur-component (DRI) van het RecHycle project van ArcelorMittal.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bezorgen van de Vlaamse projectvoorstellen aan de coördinator (Duitsland) voor integratie in het Europese notificatiedossier	2021 Q2	Gerealiseerd	Uitgevoerd in een intensieve workshop in eerste helft van juli 2021
Indienen (door coördinator Duitsland) van het dossier voor prenotificatie bij de Europese Commissie	2021 Q2	Gerealiseerd	Ingediend op 31 augustus 2021
Indienen aanvragen voor Vlaamse steun eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q1	Gerealiseerd	Alle aanvragen voor de Vlaamse steun voor de eerste groep zijn ingediend
Goedkeuring EU eerste groep (golf 1 en 2) onder IPCEI notificatie	2022 Q1	Gerealiseerd	Voor de projecten in IPCEI notificatie: gerealiseerd in juli en september 2022
Bezorgen van de projectvoorstellen aan de coördinator (Duitsland) voor integratie in het Europese notificatiedossier voor de tweede groep	2022 Q1	Stopgezet	Deze mijlpaal is niet langer relevant omdat de Vlaamse projecten in deze groep overgestapt zijn op steuntoekenning onder de bestaande staatssteunregels, die niet langer deelnemen aan het proces voor EU-notificatie
Eerste en tweede Q&A met Commissie voor projecten eerste groep (wave 1 en 2)	2022 Q1	Gerealiseerd	Gerealiseerd met een zeer brede spreiding in de tijd met de eerste request for information in oktober 2021 en de laatste in december 2022
Indienen (door coördinator Duitsland) van het dossier voor prenotificatie bij de Europese Commissie voor de tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q1	Stopgezet	Deze mijlpaal is niet langer relevant omdat de Vlaamse projecten in deze groep overgestapt zijn op steuntoekenning onder de bestaande staatssteunregels, die niet langer deelnemen aan het proces voor EU-notificatie
Start notificatie door Commissie eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q1	Vertraging	Gestart op verschillende tijdstippen! Eén project is overgestapt naar de bestaande staatssteunregels, waar geen notificatie verplicht is. Nog uitstaand voor één project, de start is verwacht in januari 2023. Hier wachten we op de goedkeuring vanuit de EU Commissie.
Ontvangst bijkomende projecten (buiten de portfolio ingediend in de expression of interest of IPCEI)	2022 Q2	Gerealiseerd	Een milieustudie voor ArcelorMittal werd ingediend. Dit sluit aan bij het onderwerp en de oproep voor expressions of interest.
Indienen aanvragen Vlaamse steun tweede groep (golf 2 en 3)	2022 Q2	Gerealiseerd	Al de aanvragen voor Vlaamse steun voor de projecten van de tweede groep werden ingediend. Afgerond sinds 2 mei 2022.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
EU goedkeuring eerste groep overgedragen naar CEEAG-kader	2022 Q3	Vertraging	Nog in behandeling voor twee deelprojecten. Hier wachten we op de goedkeuring vanuit de EU Commissie.
Eerste en tweede Q&A met de Commissie voor projecten tweede groep	2022 Q3	Stopgezet	Deze mijlpaal is niet langer relevant omdat de Vlaamse projecten in deze groep overgestapt zijn op steuntoekenning onder de bestaande staatssteunregels, die niet langer deelnemen aan het proces voor EU-notificatie
Start notificatie door Commissie tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q3	Stopgezet	Deze mijlpaal is niet langer relevant omdat de Vlaamse projecten in deze groep overgestapt zijn op steuntoekenning onder de bestaande staatssteunregels, die niet langer deelnemen aan het proces voor EU-notificatie
Steunbeslissing voor O&O&I-projecten eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q3	Gerealiseerd	Beslissing HBC (Beslissingscomité bij het FIO-fonds) 15 juli 2022
Steunbeslissing voor investeringen in klimaatacties (EET) eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q3	Gerealiseerd	Beslissing VR 15 juli en 10 november 2022
Steunbeslissing voor First Industrial Deployment eerste groep (golf 1 en 2)	2022 Q3	Gerealiseerd	Beslissing VR 21 oktober 2022
Steunbeslissing voor bijkomende projecten (ingediend buiten de portfolio projecten ingediend in de expression of interest voor IPCEI)	2022 Q4	Gerealiseerd	Een steuntoekenning voor de milieustudie ingediend door ArcelorMittal werd toegekend in april 2022.
RRF mijlpaal: contract steunbeslissingen non-IPCEI projecten	2022 Q4	Gerealiseerd	Dit omvat de projecten uit de oproep expressions of interest voor IPCEI, met EU-goedkeuring op basis van CEEAG (EET-component van Hyoffwind en de FID-component van ArcelorMittal) of de bestaande staatssteunregels (EET-component van Power to Methanol, DATS, Aertssen, Terranova Hydrogen en Air Liquide) alsook de additionele projecten ingediend buiten de IPCEI-oproep voor expressions of interest (milieustudie ArcelorMittal)
Steunbeslissing voor projecten O&O&I voor de tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q4	Stopgezet	Niet langer relevant: de portfolio Vlaamse projecten uit de tweede groep, die overgestapt zijn naar de bestaande staatsteunregels, omvat geen O&O&I-projecten
Steunbeslissing voor projecten First Industrial Deployment voor de tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q4	Stopgezet	Niet langer relevant: de portfolio Vlaamse projecten uit de tweede groep, die overgestapt zijn naar de bestaande staatsteunregels, omvat geen FID-projecten. Voor dit type

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			activiteiten is er trouwens geen rechtsbasis in de bestaande staatssteunregels	
Steunbeslissing voor projecten klimaatacties (EET) voor de tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q4	Gerealiseerd	Beslissing VR 9 december en 16 december 2022	
RRF mijlpaal: contract steunbeslissingen IPCEI projecten	2022 Q4	Gerealiseerd	Dit omvat de projecten uit de oproep expressions of interest voor IPCEI, met EU-goedkeuring op basis van de IPCEI-mededeling (O&O&I-component van Hydrogenics/Cummins, FID-component van Hydrogenics/Cummins en EET-component van Engie-Electrabel)	
Goedkeuring EU tweede groep (golf 3 en 4)	2022 Q4	Stopgezet	Deze mijlpaal is niet langer relevant omdat de Vlaamse projecten in deze groep overgestapt zijn op steuntoekenning onder de bestaande staatssteunregels, die niet langer deelnemen aan het proces voor EU-notificatie.	
RRF mijlpaal: eindresultaat projecten (oplevering)	2026 Q2	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal Vlaamse steunbeslissingen toegekend en vastgelegd: streefnorm 125 miljoen euro	11	2022 Q4	11	100 %
Outcome indicator: gerealiseerde electrolyse capaciteit	90 MWatt	2026 Q2		
Aantal (deel)projecten uitgevoerd	11	2026 Q2		
Projecten uitbetaald	90% budget	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	125.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	125.000.000 EUR
Uitvoering VAK	124.998.000 EUR
Uitvoering VEK	6.107.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 125.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 6 mei 2022 - Subsidie ArcelorMittal België voor studie investeringsproject 'Direct Reduction of Iron'

[BVR van 15/07/2022 betreffende ondersteuning project Electrabel nv voor project North-C-Hydrogen](#)

[BVR van 15/07/2022 betreffende subsidie aan Hydrogenics Europe nv voor PEM Water Electrolyser Gigawatt fabriek](#)

[BVR van 15/07/2022 betreffende subsidie Hyoffwind Infrastructure nv voor waterstofonderzoek](#)

[BVR van 21/10/2022 betreffende de subsidie ArcelorMittal Belgium voor project 'Eerste Industriële Ontplooiing RecHycle'](#)

VR 10 november 2022 - Toekenning steun voor infrastructuur Power to Methanol Antwerpen

VR 9 december 2022 - Steun aan waterstofproject BelgHyCo-HD van Etablissements Franz Colruyt in Halle

VR 9 december 2022 - Steun voor infrastructuur Aertssen Group in Stabroek

VR 9 december 2022 - Steun voor infrastructuur Terranova Hydrogen in Evergem-Zelzate

VR 16 december 2022 - Steun project 'RecHycle-DRP' van ArcelorMittal Belgium

VR 16 december 2022 - Steun project 'HyTrucks' van l'Air Liquide Belge nv

11. Vergroening weginfrastructuur

VV048 - INVESTERING LED-VERLICHTING GEWESTWEGEN (VEKP)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	Weggebruikers, de burger

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het doel van dit project is om via innovatieve LED-verlichting te investeren in duurzame weginfrastructuur. Het is energiezuiniger en vergt minder onderhoud.</p> <p>Door een beperkte aanpassing kan bovendien de zichtbaarheid op de weg verbeterd worden, wat leidt tot meer verkeersveiligheid en het aanpakken van files.</p> <p>Het uitvoeren van de ombouw van verlichting uitgerust met lampen naar LED-verlichting zal het energieverbruik van het AWV met ten minste 35% doen dalen, met een totale koolstofbesparing van 6.800 à 9.700 ton CO2 per jaar tot gevolg.</p> <p>Dit project draagt dus significant bij tot de doelstelling van de Vlaamse Regering om een totale reductie in energieverbruik te realiseren van 30% in 2030 t.o.v. het verbruik van 2015, zoals beschreven in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	84.500.000 EUR
Output	Omgebouwde verlichting (naar LED) op gewestwegen, daling van het geïnstalleerd verlichtingsvermogen
Outcome	Optimalisatie van het onderhoudsprogramma van de verlichting, vermindering van het energieverbruik door de overheid (bijdrage aan klimaatplannen).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Tot op heden werden volgende activiteiten uitgevoerd: - Voorbereidende studies en werken, meer specifiek het uitvoeren van verlichtingsstudies, de toetsing aan de toepassing lichtvisie, het uitvoeren van inspecties ter plaatse op de masten om na te

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>gaan of kwaliteit van de masten nog voldoende is (en of deze eventueel dienen vervangen te worden)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkeling van de koppeling tussen lokale apparatuur voor afstandsbewaking en het centraal afstandsbewakingsysteem Edison in het Verkeerscentrum. Deze koppeling laat toe om o.a. de geïnstalleerde armaturen vanop afstand te bewaken en te dimmen. Deze ontwikkelingen zijn nog lopende (zie ook risico's en punt ivm integratie met Edison) - Controle van de aangeboden verlichtingstoestellen, zowel op vlak van lichtsterkte als op vlak van behuizing (coating van de toestellen). <p>De start van de ombouw op terrein werd inmiddels gegeven op 3 november 2022 in Limburg. In Vlaams-Brabant worden de werken opgestart begin 2023, tegen het einde van Q1 2023 zullen de werken ook in de resterende provincies opgestart zijn. De volledige ombouw zal gerealiseerd zijn in het najaar van 2024.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Aanbestedingsprocedure opstarten	2021 Q1	Gerealiseerd		
Gunning	2021 Q3	Gerealiseerd		
Uitvoering ombouw wegverlichtingsinstallaties voor LED-lampen langs de gewestwegen	2024 Q3	Op schema	Ondanks de kleine vertraging met 3 maanden komt de beoogde uitvoeringstermijn voorlopig niet in het gedrang.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal omgebouwde masten	69116	2024 Q3		
Aantal omgebouwde installaties	1197	2024 Q3		
% minder verbruik	-35%	2024 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	90.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	84.500.000 EUR
Uitvoering VAK	84.498.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 84.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 4 juni 2021 - Overheidsopdracht VWT-EW-2020-024: Ombouwen van wegverlichting uitgerust met lampen naar LED langs gewestwegen in het Vlaams Gewest</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW</p>

VV049 - LAADPALEN - VERSNELDE UITROL LAADINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	(Toekomstige) eigenaars van elektrische wagens

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	11. Vergroening weginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De versnelde uitrol van laadinfrastructuur moet bijdragen tot de vergroening van het transport en de modal shift. Nu het wagenpark aan de vooravond staat van een transitie naar volledig elektrisch rijden, wordt er versneld werk gemaakt van een ambitieuze uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen. Door het aantal laadpunten op te trekken en verder te investeren in snellaadinfrastructuur langs grote verkeersassen en strategische locaties in Vlaanderen wordt het comfort en de gemoedsrust van de EV-rijders over langere afstand gegarandeerd. Zo kan er meer ingezet worden op duurzame verkeersmodi.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	28.768.000 EUR
Output	Goedkeuren van een beleidskader, realisatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens
Outcome	Stimuleren van emissievrij vervoer

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De nodige initiatieven voor het installeren van laadpaalinfrastructuur lopen volgens planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De strategienota laadinfrastructuur werd in Q4 2020 gerealiseerd. Het vereiste beleidskader voor de uitrol van oplaadinfrastructuur werd opgeleverd met de parlementaire goedkeuring van het decreet in Q3 2021. Ter afronding werd een bijhorend uitvoeringsbesluit goedgekeurd op de Vlaamse Regering in december 2021. - De opmaak van potentieelkaarten voor laadinfrastructuur werd afgerond eind 2021 met de oplevering van het eindrapport. Het verzamelen van de data over laadpunten loopt volgens schema.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

De data wordt real-time ontsloten.

- Om semi-publieke laadinfrastructuur op privaat domein te stimuleren, leverde een eerste projectcall 210 goedgekeurde projecten op (subsidiebedrag 8,2 miljoen euro). Deze projecten werden vanaf november 2021 gerealiseerd en zijn bij volledige uitvoering goed voor 9.798 van de te realiseren CPE* (laadpuntequivalenten). Op 1 december 2022 waren nog maar een beperkt aantal projecten volledig opgeleverd, goed voor 528 CPE. De uitvoering loopt vertraging op door leveringsproblemen van laadpalen en elektriciteitscabines. De projecten hebben een uitvoeringstermijn van maximum 2 jaar (tot november 2023).

- Een tweede gelijkaardige projectcall werd gelanceerd in Q2 2022 en afgesloten op 15 september 2022. Na jurering wordt voorgesteld om 253 projecten te subsidiëren, bij volledige uitvoering goed voor bijna 11.000 CPE. De beslissing hierover werd eind 2022 genomen. Die uitvoering zal plaatsvinden in 2023 en 2024.

- De eerste concessies voor publieke laadpunten op openbaar domein is gestart in Q3 2022. De aangeduide concessiehouders zullen de laadpalen plaatsen gedurende de komende 2 jaar. Er wordt geraamd dat in die periode hiermee de plaatsing van ca. 10.000 CPE geïnitieerd zal worden.

- Voor (ultra)snelladers langs de grote verkeersassen liep een eerste projectcall tot 15 september 2021 waarbij de 49 goedgekeurde projecten goed zijn voor 2335 CPE (laadpuntequivalenten). Nu worden de procedures doorlopen voor het verkrijgen van de verschillende vergunningen (o.a. omgevingsvergunning als vergunning voor de inname van het openbaar domein). Verwacht wordt dat de meeste ultrasnelladers medio 2023 zullen opgeleverd worden. Intussen is er al een tweede call georganiseerd waarbij er 7 bijkomende locaties aangeboden werden. De goedgekeurde projecten zullen in principe goed zijn voor circa 640 CPE.

- In december 2022 waren er 17.824 + 580 CPE toegankelijk in Vlaanderen. Het oorspronkelijke startpunt was 4926 CPE (laadpuntequivalenten) aan publieke laadpunten. Wanneer de 1636,5 CPE semi-publieke laadinfrastructuur ook wordt meegenomen, ligt het eigenlijke startpunt op 6468 CPE. Dat betekent dat er intussen al 11.356 + 580 CPE is bijgekomen. Het tussentijds doel voor Q2 2023 (9000 extra CPE) is daarmee al ruim bereikt. Met de inschatting werden de 58 Tesla-ultrasnelladpunten, die publiek werden opengesteld bijkomend meegeteld.

Verder werd met de relancemiddelen een contract gegund voor de levering en plaatsing van niet-inwendig verlichte signalisatie voor het aanduiden van dienstenzones langsheen de autosnelwegen in Vlaanderen waar gebruik gemaakt kan worden van de ultrasnelladers. De gunning van dit contract heeft in Q4 van 2022 plaatsgevonden.

*In het kader van de uitrol van publieke laadinfrastructuur spreken we van Charge Point Equivalent (CPE), waarbij een CPE gedefinieerd is in een logisch wegingssysteem. Een laadpaal met een beperkte laadsnelheid/vermogen (3-7 kW) komt overeen met 1 CPE, bij een laadpaal met een normaal vermogen (11-22 kW) zijn dat 2 CPE, bij een AC-snellader (43 kW) zijn het er 4, bij een DC-snellader (50 kW tot minder dan 150 kW) tellen we er 5 en bij een ultrasnellader (150 kW en meer) 10. Dit geldt voor publieke laadpunten (24/7). Laadpunten, die minstens 10u per etmaal voor iedereen toegankelijk zijn, tellen voor de helft. Andere laadpunten worden hierbij niet meegeteld. Op deze manier zorgen we voor een uniform equivalent in de verschillende vermogens en toegankelijkheid van laadinfrastructuur.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opmaak potentieelkaarten laadinfrastructuur	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lanceren subsidiecall laadinfrastructuur 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lanceren subsidiecall laadinfrastructuur 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	
Verzamelen data laadpunten	2022 Q4	Op schema	Het betreft een doorlopende actie om de lopende uitrol te monitoren en verdere uitrol te onderbouwen.
Onderbouwing uitrol laadpunten in Vlaanderen	2022 Q4	Op schema	Het betreft een doorlopende actie om de verdere uitrol te onderbouwen.
Organisatie concessies publieke laadpunten	2022 Q4	Gerealiseerd	
Installatie van snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2021)	2024 Q4	Op schema	
Installatie snelladers langs de grote verkeersassen (deel 2022)	2024 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Goedkeuring beleidskader voor de uitrol van oplaadinfrastructuur. Het beleidskader maakt het mogelijk: - de toekomstige oplaadpunten in kaart te brengen - de concessieopdrachten voor oplaadpunten in het publieke domein te lanceren - de uitrol van (semi-)publieke oplaadpunten op het particuliere domein te stimuleren - de doorlooptijd voor de installatie van oplaadpunten in te korten door de administratieve lasten te verminderen - het opladen in een slim elektriciteitsnet te stimuleren	Goedkeuring van het kader	2021 Q4	1	100 %
Toekenning van concessies voor oplaadinfrastructuur. Het wetgevingskader voor de uitrol van publieke oplaadinfrastructuur wordt verzekerd via door de Vlaamse regering verleende	Schriftelijke kennisgeving van gunning van opdracht aan	2022 Q3	1	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
concessies. De uitrol wordt overgelaten aan particuliere exploitanten.	geslaagde kandidaten			
Oplaainfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))	9000	2023 Q2	11.936	133 %
Oplaainfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))	22.000	2025 Q2		
Oplaainfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))	30.000	2026 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	28.768.000 EUR
Uitvoering VAK	28.765.000 EUR
Uitvoering VEK	871.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 28.768.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
CPT Visie cf. VR 7 september 2021 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen VR 2021 1607 DEC.0073 Decreet zero-emissievoertuigen en voertuigen alternatieve brandstoffen Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021 Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021. Bijlage

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissieervoermiddelen en voermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissieervoermiddelen en voermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen - nota](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissie voermiddelen en voermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor desubsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissieervoermiddelen en voermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Advies Raad van State over het een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot vaststelling van de regels voor de subsidiering van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissieervoermiddelen en voermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Projectoproep uitrol ultrasnelladers \(≥150kW\) op parkings langs autosnel-en gewestwegen](#)

[Oproep tot kandidaatstelling voor uitrol ultrasnelladers \(≥150 kW\) op parkings langs autosnel-en gewestwegen. Bijlage Kandidaatstellingsformulier. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissieervoermiddelen en voermiddelen aangedreven alternatieve brandstof](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissieervoermiddelen en voermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Update relancemiddelen MOW. Bijlage](#)

12. Iedereen lokaal digitaal

VV050 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Agentschap Integratie en Inburgering, IN-Gent vzw, Atlas vzw, Huis van het Nederlands Brussel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het programma 'Digitalisering Integratie en Inburgering' geeft uitvoering aan de ambities, vermeld in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 omtrent de hertekening van inburgering en het aanpassen van het integratiebeleid. De inburgeringstrajecten digitaliseren zal ervoor zorgen dat mensen sneller en meer op zelfstandige basis de vaardigheden en kennis kunnen verwerven om het inburgeringstraject te doorlopen. Zo kunnen ze ook sneller actief worden op de arbeidsmarkt, op eigen benen staan en bijdragen aan de welvaart van onze samenleving.</p> <p>De middelen zullen door het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering, Atlas vzw, IN-Gent vzw en het Huis van het Nederlands Brussel (hierna de agentschappen en het huis) gezamenlijk ingezet worden voor zes werven:</p> <p>Werk 1: De Kruispuntbank Inburgering (KBI): De KBI is het cliëntvolgsysteem dat door de Vlaamse Regering ter beschikking gesteld wordt aan de agentschappen en het huis om de kerntaken uit het decreet te vervullen. KBI faciliteert ook de elektronische gegevensuitwisseling in kader van inburgeringstrajecten, taalkennis Nederlands en Nederlands als tweede taal-trajecten met de Vlaamse onderwijsadministratie, VDAB, Actiris, lokale besturen en OCMW. Het systeem is verouderd en wordt volledig vernieuwd.</p> <p>Werk 2: Community building en digital marketing (CRM): De agentschappen en het huis zetten in op klantenbeheer en klantenbinding door de implementatie van een CRM-systeem. Er wordt hierbij niet alleen op de klantgroep van inburgeraars en anderstaligen gefocust (i.f.v. werving), maar voornamelijk op lokale besturen, (overheids)organisaties, voorzieningen en vrijwilligers i.f.v. de andere dienstverleningen van de agentschappen en het huis (sociaal tolken en vertalen, juridische dienstverlening, integratiewerk, taalbeleid,...). Momenteel verloopt dit binnen de agentschappen en het huis zonder centraal ondersteund systeem.</p> <p>Werk 3: Klantenportaal en -dienstverlening: De agentschappen en het huis willen hun dienstverlening klantgericht, efficiënter en effectiever organiseren. Daarom zetten ze voor hun werking in op digitale loketten. Via deze weg kunnen klanten die voldoende digitaal vaardig zijn via een self-service module het stuur in handen nemen van hun traject. We verhogen hiermee de digitale zelfredzaamheid. Zo zal een centraal portaal de klant toegang geven tot de verschillende tools die hij nodig heeft om het inburgeringstraject te doorlopen en tot tools die het doorlopen van dat traject</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

eenvoudiger maken.

Werk 4: Online leren en testen: De agentschappen en het huis zullen verder inzetten op het online leren en testen van hun verschillende klantgroepen (inburgeraars, anderstaligen, lokale besturen, organisaties, (kandidaat)-tolken). Online leren, maakt activerend en tijd- en plaatsafhankelijk leren mogelijk en is bij uitstek geschikt om de deelnemer de mogelijkheid te bieden om de training of opleiding te volgen wanneer en de wijze waarop zij dat willen.

Werk 5: Nederlandse taalverwerving: We optimaliseren de dienstverlening sociaal tolken en vertalen van de verschillende agentschappen. De werking wordt maximaal gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Naast het professioneel aanbod, zitten ook brugfuncties zitten mee in deze scope (laagdrempelig digitaal intakesysteem om de vraag te verduidelijken en te zorgen voor een automatische matching vraag en aanbod, automatische koppeling registratie- en facturatiesystemen, performant digitaal platform voor afstandstolken (telefoontolken en videotolken),...). Er wordt ook ingezet op de ontwikkeling van een applicatie taalprofielen die de bestaande en toekomstige taalprofielen laagdrempelig ontsluit voor een brede groep gebruikers: o.m. werkgevers, de interim-sector, arbeidsbemiddelaars, opleidingen en overheden.

Werk 6: Digitale wendbaarheid: De digitalisering van de publieke diensten en de samenleving in het algemeen heeft een effect op het leven van de inburgeraar, anderstalige en de medewerkers van de agentschappen en het huis. Concreet zal er ingezet worden op het versterken van digitale vaardigheden van inburgeraars én medewerkers.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	15.000.000 EUR
Output	- aantal vernieuwende acties m.b.t. digitalisering binnen de uitvoering van het inburgeringsbeleid - aantal inburgeraars in het hybride of digitaal traject
Outcome	- klantenwerking te verbeteren: nieuwkomers, inburgeraars, anderstaligen, lokale besturen, andere (overheids)organisaties en iedereen in de samenleving wordt er beter van als de agentschappen en het huis op een meer afgestemde en digitale manier (samen)werken - een sector-overschrijdende vereenvoudiging te realiseren - vereenvoudiging van klantprocessen en datadeling om zo efficiëntiewinst te bereiken - creatie van ruimte voor het personeel bv. op het vlak van dienstverlening die maatwerk vraagt - verhogen digitale vaardigheden

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De uitrol van het digitaliseringsprogramma integratie en inburgering is in volle uitvoering. Drie dossiers voor herverdeling relancemiddelen werden geagendeerd op de Vlaamse Regering en werden goedgekeurd. Overheidsopdrachten en samenwerkingsovereenkomsten i.f.v. de verschillende projecten zijn opgestart en afgerond.
Noodzakelijke politieke actie	/

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Op basis van een uitgewerkt plan van het Agentschap Integratie en Inburgering eerste aanvraag aan middelen herverdelen naar het Agentschap.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Werven opgestart	2021 Q4	Gerealiseerd	Alle werven en projecten zijn in volle uitrol.
Op basis van een uitgewerkt plan van het Agentschap Integratie en Inburgering een tweede en derde aanvraag aan middelen herverdelen naar het Agentschap.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Werk 1: KBI - vooronderzoek (business case o.l.v. Digitaal Vlaanderen)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Werk 1: KBI - bestek en gunning	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werk 2: CRM - Business case technisch platform	2021 Q3	Gerealiseerd	
Werk 2: CRM - bestek en gunning	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werk 2&5: Aanbodplatform - ontwikkeling	2023 Q4	Op schema	Binnen het digitaliseringsprogramma werd de realisatie van een platform voor het netwerk- en participatietraject opgenomen. Daarnaast is er ook de werk 5 dat spreekt over het optimaliseren van de digitale taal oefenkansen. Gezien de overlap tussen beide projecten op vlak van doelgroep(en), aanbod en effecten van het aanbod (Nederlands oefenen + sociaal netwerk uitbreiden) en gezien de gelijkaardige uitgangspunten naar toegankelijkheid, set-up en beheer die beide ontwikkelingsvoorstellen naar voor schuiven, werd op de raad van bestuur van 29 september 2022 goedgekeurd om de mogelijkheden te verkennen om de ontwikkeling van het platform voor het netwerk- en participatietraject en de vernieuwing van nederlandsoefenen.be samen aan te pakken onder de projectnaam: aanbodplatform. De gunning voor het aanbodplatform werd opgestart en afgerond in Q4 2022. De ontwikkeling van het platform start in Q1 2023.
Werk 3: fase 1 betaalmodule	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Werk 3: vernieuwing vreemdelingenrecht.be - vooronderzoek	2021 Q4	Gerealiseerd	
Werk 2: platform netwerk- en participatietraject - vooronderzoek	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werk 3: vernieuwing vreemdelingenrecht.be - bestek en gunning	2022 Q1	Gerealiseerd	
Werk 2: platform netwerk- en participatietraject - gunning	2022 Q4	Gerealiseerd	
Werk 4: Leerplatform - vooronderzoek	2021 Q3	Gerealiseerd	
Werk 4: Leerplatform - gunning	2021 Q4	Gerealiseerd	
Werk 3: Leerplatform - implementatie	2022 Q3	Gerealiseerd	
Werk 3: fase 2 betaalmodule	2023 Q4	Op schema	
Werk 5: Nederlandse taalverwerving - projectplan	2022 Q1	Gerealiseerd	
Werk 6: digitale wendbaarheid - vooronderzoek	2025 Q4	Op schema	Om onze eerstelijnsmedewerkers te versterken tot digitaal inclusieve en mediawijze medewerkers werken we met Mediawijs een vormingstraject uit. Met een laagdrempelig vormingstraject willen we alle eerstelijnsmedewerkers onderdompelen in een e-inclusiebad en handvaten geven hoe zij vanuit hun rol mee kunnen werken aan digitale inclusie van onze doelgroep.
Projectteam voltallig	2021 Q4	Gerealiseerd	Het projectteam is opgestart in september 2021. De laatste openstaande vacature is ingevuld in september 2022.
Werk 5: Nederlandse taalverwerving - vooronderzoek	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werk 6: screeningstool - vooronderzoek	2022 Q2	Gerealiseerd	
Werk 4: Content Hosting en Analytics Collect en Send - gunning	2022 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Werk 5: Nederlandse taalverwerving - gunning	2022 Q3	Gerealiseerd	
Overkoepelende aanpak - nota digitale transformatie - gunning	2022 Q4	Gerealiseerd	
Werk 4: Content Hosting en Analytics Collect en Send - ontwikkeling en implementatie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Werk 4 - e-learningontwikkeling - gunning	2022 Q4	Gerealiseerd	
Overkoepelende aanpak - Implementatieteam - gunning	2022 Q4	Gerealiseerd	
Werk 5: applicatie taalprofielen - vooronderzoek	2022 Q4	Vertraging	De zoektocht naar een geschikte projectleider duurde langer dan gepland. Om die reden wordt het vooronderzoek pas in 2023 opgestart ipv 2022. De samenwerkingsovereenkomst met Digitaal Vlaanderen om het vooronderzoek samen te doorlopen is opgemaakt.
Werk 6: screeningstool - gunning	2022 Q4	Stopgezet	Het project screeningstool voor inburgeraars en anderstaligen wordt mee opgenomen binnen "Iedereen digitaal - opleiding & vorming (Projectnummer: VV053)". Het vooronderzoek dat reeds gebeurde is mee overgedragen. AgII zit mee in de projectgroep en stuurgroep van de screeningstool uit project VV053.
Werk 4: Digitale testen - Testplatform - gunning	2023 Q1	Op schema	Gunningstraject is opgestart binnen perceel 5 van het ICT-raamcontract
Werk 4: Digitale testen - Testplatform - vooronderzoek	2023 Q1	Op schema	Het vooronderzoek is lopende en wordt afgerond in Q1 van 2023
Werk 3: vernieuwing vreemdelingenrecht.be - ontwikkeling en implementatie	2023 Q4	Op schema	de ontwikkeling wordt in Q1 2023 opgestart
Ontwikkeling tool centraal dossier ontheemden	2023 Q4	Op schema	
Overkoepelende aanpak - Implementatieteam - opstart en afronding	2023 Q4	Op schema	Start in Q1 2023
Werk 4: Digitale testen - Testplatform - ontwikkeling en implementatie	2024 Q1	Op schema	De ontwikkeling start in Q2 2023 na het toewijzen van een technische partner

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Werf 1&2: ontwikkeling en implementatie systeem voor KBI en CRM	2024 Q4	Op schema	De ontwikkeling van het systeem is opgestart met de technische partner
Overkoepelende aanpak - nota digitale transformatie - uitwerking	2024 Q4	Nog niet gestart	Opstart vanaf Q2 2023
Werf 3: ontwikkeling en implementatie systeem voor de klantportalen	2024 Q4	Op schema	de ontwikkeling is opgestart met de technische partner

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Er is een leerplatform waar de leerkrachten maatschappelijke oriëntatie op kunnen werken	100%	2022 Q4		100 %
Er is een online betaalmodule via dewelke digitaal vaardige inburgeraars en anderstaligen kunnen betalen	100%	2022 Q4		100 %
Er is een vernieuwde website vreemdelingenrecht.be	100%	2023 Q4		
Er is een klantenportaal waar digitaal vaardige inburgeraars informatie kunnen raadplegen	100%	2023 Q4		30 %
Er is een tool om verplichte inburgeraars die niet werken of niet studeren te matchen in een netwerk- of participatietraject	100%	2023 Q4		
Er is een nieuw klantvolgsysteem voor inburgeraars	100%	2024 Q4		30 %
er is een platform waar online testen op afgenomen kunnen worden	100%	2024 Q4		
Er is een tool om inburgeraars digitaal te werven	100%	2024 Q4		30 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	15.000.000 EUR
Uitvoering VEK	3.959.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 15.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 september 2021. Vlaamse Veerkracht - digitalisering integratie en inburgering](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Vlaamse Veerkracht – digitalisering integratie en inburgering](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 november 2022. Digitalisering integratie en inburgering](#)

VR 18 november 2022 - Projectsubsidie Imec vzw voor 'Iedereen Digitale Coach' en 'Screeningstool digitale vaardigheden'

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022. Goedkeuring opstart tool centraal dossier ontheemden.](#)

VV051 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Lokale besturen, VVSG, V-ICT-OR, Exello.net

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het doel van dit project is het versneld digitaliseren van de processen en dienstverlening van lokale besturen. Op die manier kunnen bedrijven en burgers sneller hun administratieve verplichtingen afwerken, zonder in een fysieke rij te staan. Bovendien moet dit de administratieve rompslomp eenvoudiger maken, de afhandeling sneller en efficiënter. Een "gemeente zonder gemeentehuis" is daarbij de provocerende gedachte, tegelijk met meer telewerkende ambtenaren.</p> <p>Het project "Gemeente zonder gemeentehuis" zal op basis van een systeem met oproepen resulteren in projectsubsidies voor Lokale Besturen die hun dienstverlening meer burgergericht, transparant en efficiënt willen inrichten door middel van digitale tools. Het project creëert dus ruimte en mogelijkheden voor een transformatieve aanpak van de gemeentelijke dienstverlening en werking. Er wordt hierbij gestreefd naar hergebruik door en delen van de oplossingen tussen lokale besturen om de grootst mogelijke impact te hebben.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	35.000.000 EUR
Output	Uitgevoerde projecten van de diverse oproepen (volgt uit mijlpalen) en een verrijking van de Vlaamse Digitale Architectuur voor lokale besturen.
Outcome	Meerdere lokale besturen hebben samen of zelfstandig een stap gezet (effectieve verbetering van de dienstverlening en een leertraject doorlopen) in het burgergericht inzetten van digitalisering. Hiertoe hebben ze zelfstandig of met partners een aantal digitaliseringsprojecten succesvol doorlopen waarbij ze werkten op innovatieve dienstverlening, digitale democratie en de werkplek van de toekomst.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle oproepen zijn ondertussen afgehandeld. We ontvingen in totaal 102 aanvragen van 259 lokale besturen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>72 grotere besturen en 30 kleinere besturen traden op als penhouders. Er waren 9 aanvragen digitale democratie, 78 innovatieve dienstverlening en 15 met als onderwerp werkplek van de toekomst.</p> <p>178 besturen zijn betrokken bij de 61 goedgekeurde projecten.</p> <p>32,9 mio is toegekend aan de verschillende projecten 454K "overschot" is overgedragen aan het project fiestpaden.</p> <p>Een deel van de projecten is reeds gestart, enkele innovatieve concepten zijn afgerond.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Visienota Gemeente zonder gemeentehuis goedgekeurd.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Goedkeuring nota Gemeente zonder gemeentehuis op Vlaamse Regering	2021 Q3	Gerealiseerd	
Eerste oproepronde gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oproep 2 gelanceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
Oproep 3 gestart	2021 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 2	2022 Q2	Gerealiseerd	Het voorgelegde advies van de jury werd integraal goedgekeurd door de Vlaamse Regering
subsidieadvies oproep 1 voorgelegd aan de bevoegde minister	2022 Q1	Gerealiseerd	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 3	2022 Q2	Gerealiseerd	Nadat de jury de dossier beoordeelt wordt een advies aan de Vlaamse Regering opgesteld. Dit gebeurt onder de vorm van een besluit te nemen door de Vlaamse Regering. De regering besliste het voorstel van de jury integraal te volgen op de zitting van 13 mei.
Oproep 4 gestart	2021 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 4	2022 Q2	Gerealiseerd	Het advies van de jury is voorgelegd aan de Vlaamse Regering

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Oproep 5 gestart	2022 Q1	Gerealiseerd		
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 5	2022 Q3	Gerealiseerd		
Eindrapport met retrospectieve over de gerealiseerde projecten en de mate waarin die bijdroegen tot de realisatie van de opgestelde visie.	2026 Q4	Nog niet gestart		
Oproep 6 gestart	2022 Q1	Gerealiseerd		
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 6	2022 Q4	Gerealiseerd		
Oproep 7 gestart	2022 Q2	Gerealiseerd		
Goedkeuring van de geadviseerde dossiers op de Vlaamse regering voor oproep 7	2022 Q4	Gerealiseerd		
Alle goedgekeurde projecten zijn opgestart via een formele opstartmeeting	2023 Q2	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal dossiers bij oproep 1	20	2021 Q4	28	100 %
Totaal aantal goedgekeurde dossiers door de VR in het kader van gemeente zonder gemeentehuis.	60	2022 Q4	61	
Het aantal gemeenten dat betrokken is of samenwerkt bij de digitalisering van lokale dienstverlening (via GZG)	Eén derde van de gemeenten	2022 Q4	259	
Aantal digitale bouwstenen van Vlaanderen voor lokale besturen dat door het project wordt opgezet of verbeterd.	10	2025 Q4	3	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal diensten(processen) dat deels of volledig gedigitaliseerd is door via GzG	25 % van de diensten op basis van IPDC (Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus)	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	35.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	35.000.000 EUR
Uitvoering VAK	34.434.000 EUR
Uitvoering VEK	5.720.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 28.926.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.074.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 26 februari 2021: Gemeente zonder gemeentehuis: oprichting van een programmateam
Mededeling VR 26 februari 2021: Gemeente zonder gemeentehuis: oprichting van een programmateam. Bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Programma Gemeente zonder Gemeentehuis
Lokaal digitaal. Visietekst Bijlage. 9 juli 2021
VR 4 februari 2022 - Gemeente zonder gemeentehuis
VR 29 april 2022 - Subsidies thematisch ontwikkelings- en implementatietraject relanceproject 'Gemeente zonder gemeentehuis'
VR 21 oktober 2022 - Subsidie thematisch ontwikkelings- en implementatietraject 'Gemeente zonder gemeentehuis'
VR 9 december 2022 - Subsidie transformatief ontwikkelings- en implementatietraject in het kader van de zesde oproep 'Gemeente zonder gemeentehuis'
VR 16 december 2022 - Subsidie tien thematische ontwikkelings- en implementatietrajecten 'Gemeente zonder gemeentehuis'

VV052 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Overheidspersoneel
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Dit project maakt deel uit van het actieplan 'Iedereen digitaal' (VV052, VV053 en VV054).</p> <p>We zetten in op de ontwikkeling van een instrumentarium om de lokale besturen, en bij uitbreiding de Vlaamse overheid, te ondersteunen bij hun e-inclusiebeleid. We zetten daarbij in op relanceprojecten zoals digibuddies waarbij gemotiveerde vrijwilligers andere Vlamingen helpen om mee te geraken in de digitale wereld. We zetten experts in die lokale besturen ondersteunen bij het uitrollen van het actieplan "Iedereen Digitaal". We ontwikkelen audiovisuele en andere instrumenten die iedereen helpen om digitaal sterker te worden. We versterken lerende netwerken en bieden de lokale besturen de nodige instrumenten aan om digitale vaardigheden van werknemers te kunnen screenen. Bij uitbreiding voorzien we dergelijk instrumentarium (screening van digitale vaardigheden) ook voor de Vlaamse overheid.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.710.000 EUR
Output	Aantal lokale besturen die ondersteund worden bij hun e-inclusiebeleid.
Outcome	Lokale besturen voeren een lokaal e-inclusiebeleid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Ondersteuning van lokale besturen bij de uitbouw en uitrol van hun e-inclusiebeleid door Imec (Mediawijs) en VVSG is lopende. Overheidsopdracht voor screeningstool digitale vaardigheden voor medewerkers VO is gegund. Project voor modulaire screeningstool digitale vaardigheden (met use cases medewerkers lokale besturen en inbugeraars) werd goedgekeurd en opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Actieplan 'Iedereen Digitaal'		2021 Q1	Gerealiseerd	
Ondersteuning lokale besturen door Imec (Mediawijs) en VVSG van start		2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning opdracht screeningstool digitale vaardigheden medewerkers VO		2022 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring project modulaire screeningstool digitale vaardigheden (met use cases medewerkers lokale besturen en inburgeraars)		2022 Q4	Gerealiseerd	
Screeningstool digitale vaardigheden medewerkers VO werd ontwikkeld en gelanceerd		2024 Q4	Op schema	
Modulaire screeningstool digitale vaardigheden werd ontwikkeld en gelanceerd		2024 Q4	Op schema	
Ondersteuning lokale besturen voltooid		2024 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen die ondersteund worden.	300	2024 Q4	150	50 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.710.000 EUR
Uitvoering VAK	2.707.000 EUR
Uitvoering VEK	776.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.710.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Het actieplan 'Iedereen Digitaal' werd op 16 juli 2021 door de VR goedgekeurd](#): toewijzing relancebudget van 2.710.000 euro aan VV052

[Projectplan generieke screeningstool digitale vaardigheden werd op 18 november 2022 door de VR goedgekeurd.](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

[VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet](#)

VV053 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Agentschap Overheidspersoneel
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Dit project maakt deel uit van het actieplan 'Iedereen digitaal' (VV052, VV053 en VV054).</p> <p>Iedereen moet digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarom ondersteunen we lokale besturen bij het opzetten van hun e-inclusiebeleid en acties rond e-inclusie, waaronder vormingen en opleidingen op maat van verschillende doelgroepen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	11.876.000 EUR
Output	Aantal lokale besturen die financieel ondersteund worden bij het voeren van een lokaal e-inclusiebeleid
Outcome	Lokale besturen hebben een lokaal e-inclusiebeleid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Binnen actieplan 'Iedereen digitaal' (VV052, VV053 en VV054):</p> <ul style="list-style-type: none">- 27 projecten van 108 kleine en middelgrote lokale besturen via de projectoproep 'uitbouw e-inclusiebeleid' lopen.- Het project City Deal 'E-inclusion by Design' rond digitale toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid loopt (subsidie aan Kenniscentrum Vlaamse Steden).- Pc-classes in nooddorpen van Antwerpen en Mechelen werden opgestart (subsidie aan Blenders vzw).- Projectsubsidie aan Imec vzw (Mediawijs) voor de ondersteuning bij de modulaire screeningstool digitale vaardigheden en voor de uitbreiding van de digitale inclusiecoach opleiding werd goedgekeurd. <p>Buiten actieplan 'Iedereen digitaal':</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<ul style="list-style-type: none"> - 3 mio gaat naar het project 'Antwerpen, Cap-A-City, Doorsteek naar een groene verbindende ontmoetingsruimte' (dit valt buiten het actieplan 'Iedereen digitaal') - 1.601.000 euro wordt overgeheveld naar het project VV054 - 6.223.000 euro wordt overgeheveld naar het project VV014
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Actieplan Iedereen Digitaal	2021 Q1	Gerealiseerd		
Oproep 'uitbouw e-inclusiebeleid' gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd		
Oproep 'uitbouw e-inclusiebeleid' afgesloten en beoordeling voltooid	2021 Q4	Gerealiseerd		
Oproepen 'uitbouw e-inclusiebeleid' gestart	2022 Q1	Gerealiseerd		
City Deal 'E-inclusion by Design' gestart	2022 Q1	Gerealiseerd		
Pc-klassen in nooddorpen Antwerpen en Mechelen gestart	2022 Q3	Gerealiseerd		
27 projecten 'uitbouw e-inclusiebeleid' voltooid bij 108 lokale besturen	2024 Q4	Op schema		
City Deal 'E-inclusion by Design' voltooid	2024 Q4	Op schema		
Uitbreiding digitale inclusiecoach opleiding voltooid	2024 Q4	Op schema		
Ondersteuning van Mediawijs bij de modulaire screeningstool digitale vaardigheden werd voltooid	2024 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal projecten van lokale besturen rond lokaal e-inclusiebeleid opgestart.	26	2022 Q1	28	100 %
Aantal lokale besturen die financieel ondersteund worden bij de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid of projecten rond digitale toegankelijkheid.	121	2022 Q4	121	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	19.700.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	11.876.000 EUR
Uitvoering VAK	11.643.000 EUR
Uitvoering VEK	2.947.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 11.876.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Het actieplan 'Iedereen Digitaal' werd op 16 juli 2021 door de VR goedgekeurd: toewijzing relancebudget van 19.700.000 euro aan VV053</p> <p>VR 4 februari 2022 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming</p> <p>VR 15 juli 2022 - Projectsubsidie aan vzw Blenders voor pc-klassen in nooddorpen Oekraïense vluchtelingen</p> <p>De subsidie aan Blenders vzw werd op 15 juli 2022 door de VR goedgekeurd.</p> <p>De subsidie aan Imec vzw (Mediawijs) werd op 18 november 2022 door de VR goedgekeurd.</p> <p>BVR van 16/12/2022 voor subsidie aan Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie en Klimaatpact 2.1: bevat de beslissing over de overheveling van relancemiddelen van VV053 naar VV054</p> <p>BVR van 16/12/2022 over wijziging subsidiebesluit aan de Vlaamse gemeenten voor investeringen in fietsinfrastructuur: bevat de beslissing over de overheveling van relancemiddelen van VV053 naar VV014</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
<p>VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies</p> <p>VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet</p>

VV054 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Dit project maakt deel uit van het actieplan 'Iedereen digitaal' (VV052, VV053 en VV054).</p> <p>Alle Vlamingen verdienen toegang tot internet. Daarom subsidiëren we lokale besturen om kansengroepen te ondersteunen bij de toegang tot internet op het thuisadres en bij de verdere uitrol van hun e-inclusiebeleid. Er gaat ook aandacht naar wetenschappelijke ondersteuning van het e-inclusiebeleid. Ook willen we lokale besturen ondersteunen bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	29.191.000 EUR
Output	Wetenschappelijk onderzoek en rapporten over e-inclusie en een e-inclusiebeleid. Aantal lokale besturen die worden ondersteund bij kansengroepen toegang bieden tot internet thuis en bij hun e-inclusiebeleid. Aantal lokale besturen die worden ondersteund bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening.
Outcome	Het e-inclusiebeleid wordt wetenschappelijk ondersteund en lokale besturen worden ondersteund bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening. Kansengroepen hebben toegang tot internet thuis. Lokale besturen voeren een lokaal e-inclusiebeleid.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Binnen actieplan 'Iedereen digitaal' (VV052, VV053 en VV054):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opdracht wetenschappelijke monitoring en onderzoek i.k.v. het actieplan 'Iedereen digitaal' werd gegund. - 160 lokale besturen en de VGC ontvingen een subsidie voor de (verdere uitrol) van hun e-inclusiebeleid, met als eerste actie het ondersteunen van kwetsbare burgers bij het hebben van een internetverbinding thuis. - Projectsubsidie aan Inter om de digitale toegankelijkheid in Vlaanderen te bevorderen via

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	samenwerking, informatie en promotie. Buiten actieplan 'Iedereen digitaal': - 9 mio gaat naar klimaatacties
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Actieplan 'Iedereen Digitaal'	2021 Q1	Gerealiseerd		
Subsidie-oproep 'uitrol e-inclusiebeleid' gelanceerd	2022 Q2	Gerealiseerd		
Gunning overheidsopdracht wetenschappelijke ondersteuning	2022 Q4	Gerealiseerd		
Aanvragen subsidie i.k.v. 'uitrol e-inclusiebeleid' goedgekeurd	2022 Q4	Gerealiseerd		
Subsidie aan Inter voor projectplan digitale toegankelijkheid van start	2022 Q4	Gerealiseerd		
Acties i.k.v. subsidie 'uitrol e-inclusiebeleid', waaronder acties rond individuele toegang tot internet, afgerond	2024 Q4	Op schema		
Projectplan digitale toegankelijkheid voltooid	2024 Q4	Op schema		
Wetenschappelijke monitoring en onderzoek i.k.v. het actieplan Iedereen digitaal wordt opgeleverd	2025 Q2	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen financieel ondersteund bij kansengroepen toegang bieden tot internet thuis en bij hun e-inclusiebeleid.	300	2022 Q4	161	53,7 %
Aantal lokale besturen ondersteund bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening	300	2024 Q4		
Aantal wetenschappelijke rapporten rond e-inclusie en een e-inclusiebeleid.	9	2025 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.590.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	29.191.000 EUR
Uitvoering VAK	29.061.000 EUR
Uitvoering VEK	1.858.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 29.191.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Het actieplan 'Iedereen Digitaal' werd op 16 juli 2021 door de VR goedgekeurd: toewijzing relancebudget van 27.590.000 euro aan VV054</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Ontwerp van besluit houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van de uitrol van een e-inclusiebeleid. Toelichting bij de oproep voor de aanvraag van de subsidie. Programma</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van de uitrol van een e-inclusiebeleid</p> <p>Toelichting bij de aanvraag van een subsidie voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid</p> <p>Bijlage 1 bij BVR uitrol lokaal e-inclusiebeleid: Maximumbedrag per lokaal bestuur in kader van de subsidie 'ondersteuning uitrol e-inclusiebeleid</p> <p>BVR van 16/12/2022 voor subsidie aan Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie en Klimaatpact 2.1: bevat de beslissing over de overheveling van relancemiddelen van VV053 naar VV054</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
<p>VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies</p> <p>VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming</p>

VV055 - SMART CITIES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	12. Iedereen lokaal digitaal
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Vlaamse Regering wil Vlaanderen in de top 5 van regio's van het Regionale Innovatiescorebord. Digitale innovatie zal de sleutel zijn om dit doel te bereiken. Tegelijk worden steden geconfronteerd met uitdagingen op vele vlakken, gaande van economie tot milieu en van mobiliteit tot sociale cohesie. Daarom moedigen we onze steden en gemeenten aan om smart-city-toepassingen te testen en op te schalen. Dit draagt bij tot de kwaliteit van de informatie en de dienstverlening aan bedrijven en burgers, zoals de voorlopers illustreren. Maar daarmee stimuleren en demonstreren we ook onze technologie- en ICT-bedrijven en bieden we kansen voor internationale doorbraken.</p> <p>We lanceren twee oproepen met focus op zes thema's: Slimme mobiliteit, Slim milieu, Slimme mensen, Slim leven, Slim bestuur en Slimme economie.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.000.000 EUR
Output	Realisatie en implementatie van nieuwe toepassingen voor smart-cities bij lokale besturen
Outcome	Vlaanderen op de kaart zetten als 'slimme regio'

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De projecten uit de oproep City of Things 2021 zijn ondertussen gestart. Ook oproep 2022 is afgehandeld. We hebben zowel de ideefase als de indieningsfase doorlopen in een co-creatief traject met ondersteuning door KPMG. Op 3 oktober 2022 hebben we 17 aanvragen ontvangen en na jurering (jury samengesteld uit verschillende entiteiten en experts binnen de VO) werden 12 projecten goedgekeurd. De dossiers zijn op de VR goedgekeurd en de vastleggingen werden gedaan. De projecten krijgen na de beslissing van de VR tot 6 maanden de tijd om op te starten en kunnen 30 maanden lopen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie meer vereist. VLAIO staat in voor de betekening (beslissingsbrieven).

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering oproep 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Deadline indiening aanvragen	2021 Q4	Gerealiseerd	Er werden 13 aanvragen ingediend.
Jurering ontvankelijke aanvragen	2022 Q1	Gerealiseerd	Alle 13 aanvragen waren ontvankelijk.
Start goedgekeurde projecten	2022 Q3	Gerealiseerd	Op 1 april 2022 werden 10 van de 13 ingediende projecten uit de oproep 2021 goedgekeurd. Vanaf de goedkeuring hebben de projecten 6 maanden de tijd om van start te gaan.
Lancering oproep 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	Op 1 april 2022 werd de oproep City of Things 2022 gelanceerd. Het is een oproep in 2 fasen. De deadline voor de ideefase (fase 1) is 1 juni 2022 en de deadline voor de indieningsfase (fase 2) is 3 oktober 2022.
Ondersteuning potentiële projecten	2022 Q2	Gerealiseerd	VLAIO heeft via een mini-competitie KPMG aangesteld om geïnteresseerde lokale besturen en potentiële indieners te begeleiden en ondersteunen in het vormgeven van en focus geven aan hun idee, en in het zoeken naar partners.

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Kwalitatieve en haalbare smart-city-projecten goedgekeurd binnen het beschikbare budget van oproep City of Things 2021	10	2022 Q1	10	100 %
Kwalitatieve en haalbare smart-city-projecten goedgekeurd binnen het beschikbare budget van oproep City of Things 2022	10	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	19.375.000 EUR
Uitvoering VEK	1.412.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering tot het openstellen van en het verlenen van steun binnen de oproep City of Things 2021](#)

[Oproep City of Things 2021. Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel. Bijlage 1](#)

[Controlerichtlijnenoproep City of Things 2021. Bijlage 2](#)

[Aanmelding ideeën. Oproep City of Things 2021. Bijlage 3](#)

[Aanvraagformulier. Oproep City of Things 2021. Bijlage 4](#)

[Actieplan. Smart Cities Vlaanderen. Het platform voor de uitbouw van de Slimme Regio Vlaanderen. Bijlage](#)

[KPI's Partnership voor een Slimme Regio. Bijlage](#)

VR 16 december 2022 - Subsidie projecten City of Things 2022

13. Digitalisering Vlaamse overheid

VV056 - ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING – ONBOARDING RAAMOVEREENKOMSTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid en lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Dit programma heeft als doel een vernieuwd aanbod ICT-diensten te realiseren, dat zowel afgestemd is op de noden van de Vlaamse overheid als dat het maximaal inspeelt op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan mature diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Deze dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en een geschikte menukaart vormen in lijn met hun behoeften.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	15.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	De vernieuwde raamcontracten zijn operationeel waardoor de klanten gebruik kunnen maken van het vernieuwd en innovatief aanbod van ICT-diensten ter ondersteuning van hun digitale transformatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De operationele service integratie diensten, evenals de verschillende ICT-dienstverleningspakketten zijn van start gegaan op 1 februari 2022. De transitie kon echter nog niet volledig worden afgerond. Er zijn echter geen grote onderbrekingen in de ICT-dienstverlening. De verwachting t.o.v. de ICT-Partners is om de transitie af te ronden in Q1 2023 (op één enkele transitievereiste mbt de realisatie van een Cloudops omgeving na waarvan de oplevering voorzien is in Q3 2023). De de dienstverlening van de meeste ICT-partners bereikt ondertussen het beoogde peil.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema	
Versterking van de interne transitieproject voor de begeleiding van transitie naar het nieuwe model	2021 Q2	Gerealiseerd	De versterking van het initiële transitieprojectteam voor de begeleiding van de transitie naar het nieuwe model is doorgevoerd.
Inrichten van de operationele service integratie	2023 Q1	Vertraging	De operationele service-integratiediensten zijn van start gegaan op 1-feb-2022. De transitie kon weliswaar nog niet volledig worden afgerond. <ul style="list-style-type: none"> Via de basis-integratiediensten is de implementatie en uitvoering van de kritische ITIL processen gewaarborgd. Ondertussen zijn de tevredenheidsmetingen reeds geïmplementeerd. De Service Desk is operationeel en meldingen worden tijdig beantwoord. De oplossingsgraad van de Service Desk is sterk verbeterd. De belangrijkste Gemeenschappelijk Ondersteunende Systemen (GOS) zijn beschikbaar. Het verbeterplan om de klantenportaal-defecten te remediëren is grotendeels uitgevoerd. Het risicobeheersysteem werd ondertussen geïmplementeerd. De informatieveiligheidsdiensten zijn operationeel en het Security Operations Center monitort voor potentiële veiligheidsinbreuken en neemt actie waar nodig.
Transitiedienstverleningspakketten (werkplekken, cloud en datacenter, applicatiediensten)	2022 Q1	Vertraging	De nieuwe ICT-Partners hebben de verantwoordelijkheid van de dienstverlening overgenomen op 1-feb-22, echter de transitie kon nog niet volledig afgerond worden. Weliswaar waren er op 1-feb-22 geen grote onderbrekingen in de Vo werking, o.a. doordat de nodige prioriteiten werden gesteld en dankzij de ICT-functiehouders bij de Vo entiteiten die tijdelijk de onafgewerkte transitiepunten hebben gemitigeerd.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			De verwachting t.o.v. de ICT-Partners is om de transitie in Q1 2023 af te ronden (behalve voor de realisatie van een Cloudops oplossing die voorzien is voor Q3 2023). De grootste openstaande punten betreffen het bereiken van het beoogde niveau van dienstverlening (voornamelijk voor de werkplekdiensten), het afwerken van de procesbeschrijvingen (voor netwerkdiensten) en de realisatie van een Cloudops oplossingen (voor Cloud en datacenter diensten).
Traject om het instappen in de vernieuwde raamovereenkomsten met betrekking tot de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening te faciliteren	2023 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	15.000.000 EUR
Uitvoering VEK	11.330.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 12.400.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 30 april 2021. Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamovereenkomsten

VV057 - ONDERSTEUNING DIGITALE TRANSFORMATIE

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse regering de maatschappij en de economie digitaal transformeren. Eén van de drie horizontale basispijlers van deze ambitie richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Hierdoor wordt de dienstverlening, vanuit het standpunt van de burger, ondernemer of vereniging, als één geheel digitaal getransformeerd.

Dit project omvat de acties die ondernomen worden om deze ondersteuningsstructuur uit te bouwen, verschillende achterliggende gemeenschappelijke digitale bouwstenen te versterken en de ondersteuning bij het gebruik ervan uit te breiden zodat ze efficiënt kunnen worden ingezet in de digitale transformatieprojecten van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Onrechtstreeks zorgt dit project ook voor het bevorderen van de digitale transformatie van economie en maatschappij door meer data als grondstof van de economie en maatschappij aan te bieden en gebruikers te ondersteunen in het gebruik ervan. Daarnaast worden digitale talenten ontwikkeld binnen de Vlaamse entiteiten en lokale besturen door onder andere het uitbouwen van een expertisecentrum digitale transformatie en het voorzien van gerichte ondersteuning en kennisoverdracht bij het gebruik van gemeenschappelijke digitale bouwstenen.

Bureau Digitale Transformatie binnen het nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen

Vooreerst wordt geïnvesteerd in het uitbouwen van een bureau digitale transformatie binnen het nieuw agentschap Digitaal Vlaanderen als ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Dit bureau zal heel vraaggestuurd inspelen op specifieke noden en behoeften van deze overheidsinstanties en dit niet zozeer voor de technische aspecten van de digitale transformatie, maar vooral voor de organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en/of juridische facetten ervan. Het bureau werkt hiermee complementair aan de ondersteuning die het agentschap Digitaal Vlaanderen reeds voorziet door het aanbieden van gemeenschappelijke digitale bouwstenen en de regierol die zal opgenomen worden bij het vernieuwd raamcontract voor gemeenschappelijke ICT-dienstverlening (VV056).

Het vraaggestuurde karakter van het bureau digitale transformatie wordt gegarandeerd door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid nauw te betrekken bij de werking van het bureau. Jaarlijks wordt een actieplan voor het bureau digitale transformatie ter validatie voorgelegd en zal op regelmatige basis gerapporteerd worden over de voortgang ervan.

Het bureau digitale transformatie wordt georganiseerd rond drie recurrente hoofdopdrachten.

PROJECTOMSCHRIJVING

In de eerste plaats zal het bureau, op vraag, de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen ondersteunen bij hun digitale transformatieprojecten. Dit omvat taken gaande van adviesverlening, over analyse van de dienstverleningsprocessen om aan de hand van een business case de beste digitale oplossing uit te werken, tot begeleiding bij de effectieve uitvoering van de projecten.

Flankerend hieraan ondersteunt het bureau het uitwerken van een coherente interbestuurlijke digitale transformatiestrategie in lijn met het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Het uitwerken van deze strategie door middel van referentiekaders en concrete actieplannen moet aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen richting geven bij de uitvoering van hun respectieve digitale transformatieprojecten.

Op vlak van digitale publieke dienstverlening heeft Vlaanderen de ambitie tegen eind 2024 een top-5 positie in te nemen in de Europese Digital Economy and Society Index (DESI-index). Het bureau zal deze ambitie inwerken in deze coherente interbestuurlijke digitale transformatiestrategie en hiervoor een actieplan opstellen. Om de voortgang op te volgen wordt jaarlijks een regionale DESI-score gemeten, op basis van de door de Europese Commissie gehanteerde methodologie.

Ten derde wordt een expertisecentrum inzake digitale transformatie opgericht met als doel de digitale maturiteit van de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen globaal te verhogen. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de technische aspecten van digitale transformatie, maar ook aan organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en/of juridische facetten.

Gemeenschappelijke digitale bouwstenen

Dit relanceproject voorziet eveneens in gerichte investeringen in cruciale gemeenschappelijke digitale bouwstenen van het agentschap Digitaal Vlaanderen, en het versterken van de ondersteuning bij het gebruik ervan, zodat deze efficiënter door de Vlaamse entiteiten en lokale besturen kunnen worden ingezet in hun digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening aan de burgers, ondernemers en verenigingen.

Digitale bouwstenen voor een performante, datagedreven overheid

De Vlaamse overheid en de lokale besturen beschikken gezamenlijk over een schat aan data. Niet alle databronnen zijn echter even vlot toegankelijk en/of gebruikers weten niet altijd goed hoe deze data het meest efficiënt kunnen worden ingezet. Op aangeven van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen wordt daarom een ondersteuningsaanbod uitgewerkt met betrekking tot het ontsluiten en gebruiken van de beschikbare data. Hierbij zullen zij gericht, en in functie van de eigen noden, door een zogenaamde 'vliegende ploeg' begeleid worden in het ontsluiten van de eigen databronnen en het inzetten van data van derden binnen de eigen processen. Specifiek voor het veilig en rechtmatig gebruiken van persoonsgegevens wordt de nodige juridische en IT-technische expertise ter beschikking gesteld.

Heel wat van deze persoonsgegevens worden vandaag ontsloten via het MAGDA-gegevensdelingsplatform. Om de nodige garanties met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) af te dwingen, moeten voor het gebruik van deze persoonsgegevens ook verschillende technische en juridisch-administratieve stappen doorlopen worden tijdens het aansluitingsproces. Complementair aan de acties die reeds in het programma VRD 2 in 2021 zijn voorzien, wordt verder geïnvesteerd in een gebruiksvriendelijker aansluitingsproces voor het MAGDA-gegevensdelingsplatform zodat persoonsgegevens sneller kunnen ingezet worden, steeds met respect voor de AVG.

Diverse bevragingen hebben daarnaast aangetoond dat vandaag verschillende cruciale databronnen ontbreken in het MAGDA-aanbod. Een deel van de investeringen wordt ingezet om de ontsluiting van de meest prioritaire, ontbrekende databronnen via het MAGDA-gegevensdelingsplatform te versnellen en de raadpleging ervan via de webtoepassing MAGDA-online mogelijk te maken. De belangrijkste ontbrekende databronnen worden samen met de

PROJECTOMSCHRIJVING

belanghebbenden bepaald in het tweede kwartaal 2021. De prioriteit wordt mee bepaald door de visie die in kader van het project Gemeente zonder Gemeentehuis (VV051) wordt uitgewerkt en de in voorbereiding zijnde datastrategie die deel uitmaakt van het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Digitale bouwstenen voor een state-of-the-art digitale dienstverlening aan burger, ondernemer en vereniging

Dit relanceproject versterkt eveneens vijf gemeenschappelijke digitale bouwstenen die cruciaal zijn om vanuit de Vlaamse entiteiten en lokale besturen een state-of-the-art, 'low touch', digitale dienstverlening aan de burger, ondernemer of vereniging aan te bieden, met name (1) de module 'eFormulieren', (2) een professioneel CRM-systeem, (3) het digitaal tekenplatform, (4) de MAGDA-documentendienst en (5) de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus. Een belangrijk kenmerk van een 'low touch' dienstverlening is dat met zo min mogelijk verschillende contactmomenten en loketten de dienstverlening zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt, liefst zelfs zo automatisch mogelijk. Gebruikersgerichtheid staat daarbij centraal, waarbij de dienstverlening uitgedacht is vanuit de werkelijke noden en behoeften van de gebruikers.

1. module 'eFormulieren'

Met de module 'eFormulieren' wordt aan Vlaamse entiteiten en lokale besturen de mogelijkheid geboden op een gebruiksvriendelijke digitale manier gegevens aan burgers, ondernemers of verenigingen op te vragen die (nog) niet in een authentieke bron aanwezig zijn. Deze module vormt ook een belangrijke technische component van de generieke aanvraagmodule die door Digitaal Vlaanderen in het programma VRD 2 wordt vormgegeven. Het relanceproject zorgt voor een impulsinvestering om het technisch platform gebruiksvriendelijker te maken en op te waarderen zodat betere ondersteuning van de Vlaamse entiteit of het lokaal bestuur mogelijk wordt.

2. professioneel CRM-systeem

Om een klantvriendelijke dienstverlening aan de burger, ondernemer of vereniging mogelijk te maken is het essentieel dat contacten met die burger, ondernemer of vereniging op een professionele manier opgevolgd en beheerd worden. Daartoe werd in 2020 een raamcontract uitgewerkt dat Vlaamse entiteiten en lokale besturen toegang biedt tot een professioneel CRM-systeem ("customer relation manager"). Via dit deelproject wordt dit CRM-systeem gekoppeld met het organisatiesregister en twee andere gemeenschappelijke databronnen van de Vlaamse overheid (toegangs- en gebruikersbeheer, mail en kalender). Tevens worden de nodige beveiligingsmaatregelen, in lijn met het informatieveiligheidsbeleid, geïmplementeerd. Met de oprichting van een "CRM-community" wordt een netwerk voor kennisdeling binnen de Vlaamse overheid en lokale besturen gegarandeerd.

3. Digitaal Tekenplatform

Ten derde wordt het Digitaal Tekenplatform versterkt dat het elektronisch ondertekenen van documenten binnen de Vlaamse overheid en bij lokale besturen faciliteert. Het digitaal tekenen van documenten vermindert drastisch de papierstroom en zorgt voor belangrijke tijdsinstellingen en een efficiënte bedrijfsvoering, zeker in tijden van maximaal plaats- en tijdsafhankelijk werken. Het project zet in op een hoger gebruiksgemak door QR-codes op een (ondertekend) document toe te voegen waardoor de geldigheid van het document ten allen tijde kan geverifieerd worden ten opzicht van het centraal opgeslagen authentieke document. Eveneens zal bij het ondertekenen een gekwalificeerde timestamp toegevoegd worden zodat het tijdstip van ondertekenen juridisch niet weerlegd kan worden.

4. MAGDA-documentendienst

Met de MAGDA-documentendienst, ten vierde, kan een Vlaamse entiteit of lokaal bestuur geautomatiseerd digitale documenten versturen naar een door de ontvanger geactiveerde e-box of e-mailadres of (aangetekend) per post indien dit niet het geval is. Binnen het programma VRD 2 wordt deze component uitgebreid met de mogelijkheid voor een

PROJECTOMSCHRIJVING

ontvanger om digitaal te reageren op een digitaal ontvangen document. Onder aansturing van de gebruikersgroep worden nu bijkomende functionaliteiten op de MAGDA Documentendienst ingevoerd waaronder de mogelijkheid tot digitaal tekenen door de integratie met het Digitaal Tekenplatform en het voorzien van digitale betaalmogelijkheden. Voor Vlaamse entiteiten of lokale besturen die niet over een volwaardig dossieropvolgingssysteem beschikken, worden de functionaliteiten van Magda Online uitgebreid om eenvoudige documenten te versturen en/of te ontvangen.

De MAGDA-documentendienst wordt in 2021 onder meer gebruikt voor het versturen van de brieven aan iedere burger met informatie over hun voorgestelde vaccinatiemomenten. Ook de belastingbrieven van VLABEL en de provincie Antwerpen zullen dit jaar via dit systeem uitgestuurd worden. Hiervoor is het essentieel dat er over de volledige ketting van versturen tot en met ontvangen van het document de nodige garanties kunnen gegeven worden over de technische beschikbaarheid van het systeem en de veiligheid van het verstuurd document. Op vandaag vervult BOSA, de federale dienstenintegrator, de rol als Document Provider naar de verschillende e-Boxen zoals Doccle, Mijn Burgerprofiel of MyeBox. Gezien de hoge te verwachten transactievolumes vanuit Vlaanderen is er in samenspraak met BOSA afgesproken dat het MAGDA-platform deze rol van "document provider" inricht voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen.

5. Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus

De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC), tot slot, staat sinds eind vorig jaar in voor de SDG-informatievoorziening vanuit Vlaanderen. Deze IPDC laat toe dat elke Vlaamse entiteit zelf instaat voor het beheer van informatie over de eigen producten en diensten én dat deze informatie centraal door andere entiteiten of beleidsniveaus kan worden geraadpleegd. Voorbereidingen worden getroffen om deze gemeenschappelijke digitale bouwsteen ook te laten inzetten door de lokale besturen voor het beheren van lokale producten- en dienstencatalogi (IpdC) die dan eveneens centraal ontsloten kunnen worden.

Gestandaardiseerde beschrijvingen van producten en diensten in de IPDC bieden bovendien de mogelijkheid om proactief de beoogde doelgroep van de dienstverlening te benaderen. Het informeren van iedere doelgroep op maat kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Nagegaan wordt welke aanpassingen er hiervoor op korte termijn aan de IPDC kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast wordt de IPDC gekoppeld aan de interfederale productencatalogus die door de federale overheid in kader van SDG wordt uitgewerkt. Op die manier kan via vlaanderen.be of op webportalen van Vlaamse entiteiten en lokale besturen één geconsolideerd overzicht geboden worden van de dienstverlening die voor de burger, ondernemer of vereniging beschikbaar is, onafhankelijk van het beleidsniveau dat instaat voor deze dienstverlening.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	Operationele effecten op korte termijn: - Uitbouw van een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie onder aansturing van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. - Uitbreiding van de ondersteuning bij het gebruik van gemeenschappelijke digitale bouwstenen. - Versterking van verschillende van die digitale bouwstenen (met name: het MAGDA-gegevensdelingsplatform, de module 'eFormulieren', het CRM-systeem, het digitaal tekenplatform, de MAGDA-documentendienst en de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De afdeling Digitale Strategie & Transformatie is nu volledig operationeel ter ondersteuning van de organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en juridische facetten van de digitale transformatie.</p> <p>Het gebruik en ontsluiten van data is verbeterd door de inzet van een "vliegende ploeg". Daarnaast zijn bijkomende databronnen ontsloten via het Magda-gegevensdelingsplatform en Magda-online. Een uitgebreide business analyse van het Magda aansluitingsproces is uitgevoerd.</p> <p>Drie gemeenschappelijke bouwstenen zijn ontwikkeld (e-Formulieren, CRM-systeem en Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus.) Aan 2 bouwstenen wordt in 2023 verder gewerkt. (Digitaal Tekenplatform en MAGDA-documentendienst)</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	
VV057.01 het bureau digitale transformatie is volledig operationeel en staat ter beschikking van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen.	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV057.02.01 - Bijkomend ondersteuningsaanbod bij het gebruiken en/of ontsluiten van data is operationeel via 'vliegende ploeg'.	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV057.02.02 - Het aansluitingsproces op het MAGDA-gegevensdelingsplatform is gebruiksvriendelijker met een kortere doorlooptijd als gevolg	2021 Q4	Gerealiseerd	Een uitgebreide business analyse is uitgevoerd.
VV057.02.03 - De meest prioritaire, ontbrekende databronnen zijn ontsloten via het MAGDA-gegevensdelingsplatform en MAGDA-Online	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV057.03.01 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'eFormulieren'	2021 Q4	Gerealiseerd	De functionaliteit van "e-formulieren" is verbeterd en opgenomen in het breder pakket van "aanvraagmodule"

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV057.03.02 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'CRM-systeem'	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV057.03.03 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Digitaal Tekenplatform'	2021 Q4	Vertraging	Opdracht is gegund. Uitvoering is gepland tegen Q2 2023. De marktanalyse, uitgevoerde RFI's voor de shortlist en de evaluatie van de ontvangen offertes hebben meer tijd in beslag genomen dan oorspronkelijk verwacht
VV057.03.04 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'MAGDA-documentendienst'	2021 Q4	Vertraging	"Rol van documentprovider" is opgenomen binnen Magda documentendienst. "Digitale betaling" en "integratie met digitaal tekenplatform" is herpland naar Q2 2023. Ontwikkeling van "aangetekende email" wordt herbekeken
VV057.03.05 - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus'	2021 Q4	Gerealiseerd	IPDC v3 is opgeleverd. Koppeling is voorzien met Europese producten catalogus in kader van SDG

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	4.694.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 4.100.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 900.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Ondersteuning Digitale Transformatie

VV058 - VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Financiën en Begroting
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten en lokale besturen

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Met het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse regering de maatschappij en de economie digitaal transformeren. Eén van de drie horizontale basispijlers van deze ambitie richt zich op de digitale transformatie van de overheidsdienstverlening waarbij versneld wordt geïnvesteerd in de achterliggende systemen en processen, als cruciale bouwsteen, om de gemeenschappelijke dienstverlening te faciliteren vanuit een perspectief waarbij de ervaring van de burger, ondernemer of vereniging centraal wordt gezet.

Dit project omvat maatregelen die ondernomen worden om deze versnelde gemeenschappelijke dienstverlening aan Vlaamse entiteiten en lokale besturen te realiseren. Deze maatregelen dragen niet alleen rechtstreeks bij aan de digitale transformatie van de overheidsdienstverlening, maar zijn ook een directe katalysator voor andere projecten uit het relanceplan. Hierdoor kunnen alle Vlaamse entiteiten en lokale besturen evolueren naar datagedreven overheidsinstanties met een state-of-the-art digitale dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen.

Versnelde investering in bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform

Het MAGDA-gegevensdelingsplatform, het deelplatform van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI), zorgt voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van persoonsgegevens binnen en tussen de verschillende beleidsniveaus in Vlaanderen. Dit dienstenaanbod is vandaag een cruciale basisvoorziening waarop heel wat kritische bedrijfsprocessen van Vlaamse en lokale overheden, maar ook private partners, steunen. Bijgevolg verwachten deze doelgroepen afdoende garanties op beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van het platform en de bijhorende diensten. Bovendien moet het platform verder ingericht worden als een schaalbare architectuur die het jaar na jaar sterk stijgend gebruik structureel kan opvangen.

Een verhoogde bedrijfszekerheid draagt ook bij tot de ambitie, zoals beschreven in de Beleidsnota 2019-2024 ICT en Facilitair Management, om van dit deelplatform dé data-draaischijf te maken voor de uitwisseling van unieke gegevens binnen de Vlaamse publieke sector, waaronder de steden en gemeenten, en met de federale dienstenintegratoren, om zo de data-uitwisseling voor alle overheidsactoren te verbeteren en de transitie naar een volledig digitale overheid mogelijk te maken.

Binnen het voorliggende project worden een aantal stappen versneld en in parallel uitgevoerd:

1. de zogenaamde asynchrone diensten, die onder andere bulkbevragingen van authentieke bronnen mogelijk maken of het aanleveren van verschilbestanden om data in systemen van de gebruiker actueel te houden, worden gemoderniseerd en overgezet naar de nieuwe architectuur. Dit zorgt niet alleen voor een lagere toekomstige operationele onderhoudskost per dienst, maar ook voor kortere doorlooptijden (en bijhorende investeringskosten) bij

PROJECTOMSCHRIJVING

het ontwikkelen van nieuwe diensten voor de datagebruikers.

2. Voor professionele gebruikers die veel parallelle aansluitingen opzetten, zoals dienstenleveranciers van lokale besturen, wordt het aansluitingsproces sterk vereenvoudigd en geautomatiseerd. Op die manier kan de doorlooptijd sterk ingekort worden zodat data snel in de processen van lokale besturen kunnen worden ingezet.

3. Voor kritische diensten die vandaag reeds gebruikt worden voor het uitrollen van het COVID19-vaccinatieplan werd een herstelplan (Disaster Recovery Plan) opgemaakt dat maximale beschikbaarheid van deze diensten garandeert. Dit herstelplan wordt nu verder uitgerold voor alle kritische diensten en het gegevensdelingsplatform ontdubbeld over twee, fysiek gescheiden, datacenters in Vlaanderen.

4. Bij het verwerken van persoonsgegevens op het MAGDA-gegevensdelingsplatform moeten de beveiligingsmaatregelen voortdurend mee evolueren met de laatste stand van zaken op vlak van cybersecurity. Om mogelijk gevoelige plekken te detecteren worden verschillende doorgedreven veiligheidscontroles uitgevoerd en eventueel gedetecteerde pijnpunten onmiddellijk aangepakt.

Op die manier wordt sneller tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de beoogde doelgroepen, aan de nieuwe noden die ontstaan zijn naar aanleiding van de COVID19-crisis en kan deze generieke component optimaal renderen binnen de respectieve digitale transformatieprojecten in het relanceplan.

Doorontwikkeling van het subsidieregister

De data die voor het subsidieregister (departement Financiën en Begroting) nodig zijn, worden uit diverse databronnen verzameld, onder meer uit de dossierbehandelingssystemen van de subsidieverstrekkende entiteiten (binnen het ESR-toepassingsgebied 'deelstaatoverheid S.1312'). Op het MAGDA-gegevensdelingsplatform wordt een generieke dienst voorzien voor het ontsluiten van informatie uit deze dossierbehandelingssystemen met maximale aandacht voor informatieveiligheid. Deze data zijn ook voor andere doeleinden interessant. Naast financiële gegevens voor het subsidieregister kunnen zo dossiergegevens over bijvoorbeeld vergunningen of sancties vanuit meerdere systemen samengebracht worden in één entiteitoverschrijdend register. Om de informatie uit het subsidieregister op een geaggregeerde manier te ontsluiten naar data-analysesystemen wordt eveneens een bevragingdienst ontwikkeld die toelaat het subsidieregister op een informatieveilige manier te raadplegen.

Versneld gebruik van de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening'

Met de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening' wordt een nieuw ondersteuningsaanbod uitgewerkt dat maximaal is afgestemd op de noden van de Vlaamse overheid en optimaal inspeelt op het huidige marktaanbod. Ook nieuwe klanten moeten vlot kunnen instappen. Daarom worden voor nieuwe klanten binnen het project "achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamovereenkomsten" (VV056) business cases uitgewerkt die nagaan welke diensten en/of systemen uit de raamovereenkomsten de grootste toegevoegde waarde opleveren voor hun digitale processen.

Vanuit het voorliggend project (VV058) zullen stimulansen worden voorzien om het instappen van nieuwe klanten in deze raamovereenkomsten te versnellen. De precieze aard van deze stimuleringsmaatregelen is afhankelijk van de uitkomst van de business cases en zullen in de tweede helft van 2022 via een bijkomende nota aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	Operationele effecten op korte termijn: - verhogen van de bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform dat uitgroeit tot dé data-

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

draaischijf voor de uitwisseling van unieke gegevens binnen de Vlaamse publieke sector, om zo de data-uitwisseling voor alle overheidsactoren te verbeteren en de transitie naar een volledig digitale overheid mogelijk te maken

- Realisatie van generieke diensten voor het voeden en ontsluiten van het subsidieregister in beheer van het departement Financiën en Begroting.
- nieuwe klanten kunnen vlot instappen in de raamcontracten 'gemeenschappelijke dienstverlening' (VV056).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De Vlaamse regering heeft in oktober bijkomende stimuleringsmaatregelen goedgekeurd om het instappen in de raamcontracten voor nieuwe klanten te stimuleren. Deze activiteiten zijn gepland in 2023. De overige mijlpalen zijn gerealiseerd. De volledige migratie van asynchrone diensten maakt deel uit van een vervolgproject
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RRF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RRF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	
VV058.01 Hogere garanties op vlak van bedrijfszekerheid van het MAGDA-gegevensdelingsplatform zijn gerealiseerd.	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.01.01 - Gemoderniseerde asynchrone bevragsingsdiensten zijn beschikbaar binnen de vernieuwde architectuur	2021 Q4	Gerealiseerd	Een nieuwe applicatie architectuur voor asynchrone MAGDA diensten is beschikbaar, en een Proof of Concept is gerealiseerd. De volledige migratie van asynchrone diensten ifv de bevindingen van de pilootimplementatie wordt in 2023 uitgevoerd in een opvolgproject.
VV058.01.02 - Sterk vereenvoudigd aansluitingsproces voor professionele gebruikers is gerealiseerd	2021 Q4	Gerealiseerd	Een piloot interne aansluitingsconsole voor Magda is opgezet om kortere doorlooptijd te realiseren.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
VV058.01.03 - Uitrol van een herstelplan voor alle bedrijfskritische MAGDA-diensten is doorgevoerd	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.01.04 - Eventueel gedetecteerde pijnpunten op vlak van cybersecurity zijn aangepakt na het uitvoeren van doorgedreven veiligheidscontroles	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.02 Generieke MAGDA-diensten gerealiseerd voor het voeden en ontsluiten van het subsidieregister.	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.02.01 - Generieke webdiensten voor het ontsluiten van data uit dossierbehandelingssystemen is beschikbaar	2021 Q3	Gerealiseerd	
VV058.02.02 - Webdienst voor het raadplegen van data in het subsidieregister is beschikbaar	2021 Q4	Gerealiseerd	
VV058.03. Goedkeuring Nota VR betreffende versneld gebruik van de nieuwe raamovereenkomsten 'gemeenschappelijke dienstverlening'	2022 Q3	Gerealiseerd	Nota VR is goedgekeurd op 21/10/2022
VV058.3.1.1 - Gemeenschappelijk ondersteunende systemen zijn aangepast aan de noden van de klanten	2023 Q3	Op schema	De vernieuwing van de gemeenschappelijke ondersteunende systemen (CMDDB2, Datawarehouse – DWH) is opgestart.
VV058.3.1.2 - Het aanbouw van ICT-bouwstenen van Digitaal Vlaanderen is beter geïntegreerd met de ICT-raamovereenkomsten	2023 Q3	Op schema	De vernieuwing van VO-ALM (Application Lifecycle Management), de verdere uitbouw inzake dienstverlening mbt CRM (Customer Relation Management) en de modernisering van het SMFT (Secure Managed File Transfer) werden opgestart.
VV058.3.1.3 - Nieuwe klanten worden effectief ondersteund bij het instappen op de ICT-raamovereenkomsten	2023 Q4	Op schema	Meerdere klanten worden actueel begeleid bij het instappen op de ICT-raamovereenkomsten. Concrete analyses voor VUTG (Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen) en de Vlaamse waterweg) werden opgestart.
VV058.58.3.2 - Klantspecifieke digitale infrastructuur diensten zijn voorhanden	2023 Q3	Op schema	Een studie / analyse voor een multi-tenancy support en beheer voor werkplekdiensten is geïnitieerd. Daarnaast wordt SDN (Software Defined Network) uitgerold in de verschillende sites van de klanten, in overeenstemming met de behoeften van deze klanten.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	2.166.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.500.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 21 oktober 2022. Versneld gebruik van de nieuwe raamovereenkomsten “gemeenschappelijke dienstverlening”</p>

VV059 - DIGITALISERING ASSET MANAGEMENT AQUAFIN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Aquafin
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij - Departement Omgeving
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Een goede werking van de bovengemeentelijke afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen is cruciaal voor de waterkwaliteit in onze beken en rivieren. Een verdere digitalisering van het beheer is noodzakelijk om zowel financieel als functioneel de beste beslissingen te nemen op het vlak van onderhoud en investeringen. Zo houden we de infrastructuur op een efficiënte en duurzame manier in een goede toestand. De digitalisering ondersteunt hierdoor niet alleen het behoud van de verbeterde waterkwaliteit, het draagt ook bij tot het betaalbaar houden van de waterfactuur voor de burger.

Om de bovengemeentelijke afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in het Vlaamse Gewest in optimale toestand te houden zijn onderhoud en investeringen noodzakelijk. De gemiddelde leeftijd van leidingen, pompstations en afvalwaterzuiveringsinstallaties neemt bovendien toe. Om de budgetten die nodig zijn voor dit onderhoud en deze investeringen zo beperkt mogelijk te houden, richt het relanceproject zich op een versnelde digitalisering van het asset management. De data die hiermee gegenereerd worden geven inzicht in de toestand, betrouwbaarheid, kans op falen en verwachte levensduur van de infrastructuur. Dit maakt het mogelijk om slimmere, gerichtere en optimale onderhouds- en investeringsbeslissingen te nemen. Zo beperken we de kosten en kunnen we de waterfactuur de komende jaren betaalbaar te houden. Het digitaliseringsproject is daarnaast ook noodzakelijk om de verbeterde waterkwaliteit te verzekeren en te voldoen aan de Europese eisen voor de sanering van Stedelijk Afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG).

Het digitaliseringsproject bestaat uit 5 deelprojecten en loopt tot 2030 :

1. Assets – Levenscyclusbeheer & investeringsmanagement voor het maken optimale asset management investeringsbeslissingen
2. Assets - optimalisatie van onderhoud zodat het juiste onderhoud op het juiste moment wordt uitgevoerd en de effectiviteit van onderhoudswerkzaamheden verhoogt door precies op het goede moment in te grijpen, niet te vroeg maar zeker ook niet te laat. Het resultaat is een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de assets en hogere efficiëntie
3. Proces- en performantiemeting & opvolging wat onder meer zorgt voor een naadloze, kwalitatieve en toekomstgerichte data-uitwisseling met andere actoren binnen het volledige watersysteem en zelfs daarbuiten
4. Portfolio planning bestaande infrastructuur incl. GIS-data-uitwisseling om infrastructuurkaarten beschikbaar te kunnen stellen via open data
5. BIM (Bouwwerkinformatiemodel) – Uitwerken van een digitale data flow met studie bureaus & aannemers door samen aan één gemeenschappelijk ontwerp te werken, met kwalitatieve masterdata die naadloos en digitaal doorstromen van ontwerp over As-Built tot onderhoud en beheer

PROJECTOMSCHRIJVING

Het project zal ingedeeld worden in enkele grote fasen ('agile' methodologie).

De kosten van dit project worden deels gedragen door reguliere middelen van Aquafin en deels via bijkomende financiering. Voor de projectdoelstellingen in deze legislatuur wordt de projectkost geraamd op 14,2 miljoen euro waarvan 2.3 miljoen euro met reguliere middelen van Aquafin. Via het relancebudget Vlaamse Veerkracht (VV059) wordt 9 mio EUR voorzien. Deze financiering focust zich voornamelijk op deelprojecten Asset – Levenscyclusbeheer (1), Assets – Optimalisatie Onderhoud (2) en Portfolio planning (4) en is in lijn met de Green Deal en digitale ambities van Europa. De middelen uit het relanceplan zijn hierbij essentieel om de ambities waar te maken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	9.000.000 EUR
Output	De functionaliteiten van het asset management digitaliseringsproject zijn bij Aquafin beschikbaar en worden gebruikt.
Outcome	Snelle en efficiënte beslissingen mogelijk maken met data zodoende de snelheid waarmee de investeringsbudgetten stijgen door ouder wordende zuiveringsinfrastructuur, zo beperkt mogelijk te houden en de waterkwaliteit te verzekeren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Ontwikkelingen gestart en lopende voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Inhoudelijke nota voorgelegd aan de Vlaamse Regering	2021 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Opdracht tijdig gestart : opdracht uitvoering + herverdeling middelen uit relanceprovisie	2021 Q4	Gerealiseerd	
Automatische koppeling met GIPOD van innames op openbaar domein bij geplande onderhoudswerken	2021 Q4	Gerealiseerd	
In gebruik name van nieuwe levenscyclusbeheer en onderhoudssoftware waarmee de gezondheidstoestand van de assets kan gemonitord worden; in eerste fase gebeurt dit op een deel van het totale patrimonium	2022 Q1	Gerealiseerd	De berekening van de gezondheidstoestand wordt op deze moment gerealiseerd in Maximo - MAHI, output realisatie via Power BI.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
In kader van de nieuwe zelfcontrole, implementeert Aquafin een toekomstgerichte data uitwisseling voor analyseresultaten tussen de labo's die de analyses uitvoeren en Aquafin, en van Aquafin naar de VMM - realisatie eerste versie datauitwisseling.	2022 Q4	Gerealiseerd	Tussentijdse oplevering gerealiseerd, structurele oplossing wordt voorzien in een aparte milestone.
In kader van de nieuwe zelfcontrole, implementeert Aquafin een toekomstgerichte data uitwisseling voor analyseresultaten tussen de labo's die de analyses uitvoeren en Aquafin, en van Aquafin naar de VMM - realisatie fundamentele datauitwisseling.	2023 Q2	Op schema	
Aquafin neemt een nieuwe beheerstool in gebruik voor de opvolging en rapportering aan VMM van ecologische prestaties (EPI) van zijn operationele transport- en zuiveringsactiviteiten	2023 Q4	Op schema	
Aquafin hanteert een toekomstgerichte manier om gestructureerde data uit te wisselen met VMM (overstortdata, KPI's, ...) als onderdeel van de analyseresultatenapplicatie	2023 Q4	Op schema	Meer specifiek gemaakt van de milestone ten behoeve van de samenwerking met VMM.
Het Asset Management systeem is gekoppeld aan een digitale planningstool voor field medewerkers waardoor de dagelijkse onderhoudsactiviteiten en de vastgelegde onderhoudsstrategie optimaal op elkaar afgestemd zijn.	2024 Q4	Vertraging	Vertraging door koppeling aan een ander intern Aquafin programma (realisatie SAP implementatie) - hierdoor zullen we de integratie met de planningstool pas later kunnen opleveren dan voorzien, gezien de afhankelijkheid met dit intern programma.
Op basis van de data over de gezondheidstoestand van de assets beschikt Aquafin over een dynamisch Lange Termijn Asset Plan op een uitgebreid patrimonium waarmee de investeringsbehoeftes voor de bestaande assets in kaart gebracht worden.	2024 Q4	Op schema	
Modernisering projectvoorstellentool als onderdeel van Project ideeën platform dewelke zorgt voor een optimalisatie van de projectideeën (centraal beheer) en optimale synergie voor onze Asset Management investeringen	2024 Q4	Op schema	Milestone hernoemt door meer specifiek te richten op een bepaalde doelstelling/applicatie.
RRF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar en bij Aquafin in gebruik	2025 Q4	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Realisatie beperkt patrimonium (pompstations) voor de monitoring van de gezondheidstoestand	100%	2022 Q1		100 %
De functionaliteiten van het asset management digitaliseringsproject zijn bij Aquafin beschikbaar en worden gebruikt.	100 %	2025 Q4		10 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.000.000 EUR
Uitvoering VEK	9.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 9.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 19 november 2021. Digitalisering Asset Management Aquafin

VV060 - VERSNELLING EN VERDERE UITBOUW VAN MIJN BURGERPROFIEL

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Vlaamse entiteiten Lokale besturen burgers ondernemers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Wat je bij een bank, Coolblue of Amazon kan, moet je bij de overheid ook kunnen. Een compleet overzicht zien van het aanbod, vlot kunnen zoeken, iets bestellen of aanvragen, je gegevens kunnen raadplegen, opvolgen waar je dossier zit. Alles in één overzicht. Eenvoudiger, duidelijker en sneller voor burgers en ondernemers.</p> <p>De visie op zo'n virtueel, digitaal loket voor de overheid bevat een compleet, officieel en betrouwbaar overzicht vinden van:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle dienstverlening van de overheid: premies, vergunningen, belastingen, zorgaanbod, ...• Een overzicht van hun gegevens bij de overheid: woningen, diploma's, attesten, vergunningen, ...• Het kunnen aanvragen en beheren van dienstverlening, het opvolgen van lopende dossiers en het ontvangen van berichten of documenten, ... <p>Alles kan zoveel mogelijk digitaal en via selfservice, waar en wanneer je wil.</p> <p>Die visie is niet nieuw. Nieuw is dat dit voor het eerst binnen een haalbaar bereik ligt omdat er de voorbije jaren een noodzakelijke onderbouw is gemaakt, die daarvoor ontbrak. De komende 2 jaren kunnen we zo'n loket realiseren, en daarmee het labyrint van 800 loketten en sites laten vervellen tot een overzichtelijk en volledig, virtueel loket.</p> <p>GEÏNTEGREERDE AANPAK</p> <p>Bestaande loketten en sites worden niet herbouwd maar geïntegreerd en gelinkt tot één virtueel loket voor burgers, ondernemers en verenigingen. Door een aantal gemeenschappelijke componenten te hergebruiken en te werken aan standaardisatie van de data en informatiestromen, creëren we voor burgers, ondernemers en verenigingen de ervaring van een geïntegreerd digitaal loket, met centrale overzichten en toegangen.</p> <p>Zo'n geïntegreerd loket werkt alleen als het volledig is. Concreet kan dit gebeuren door de gemeenschappelijke componenten van het loket via Informatie Vlaanderen aan te bieden. Overheidsinstanties kunnen voor hun communicatie met de burger deze componenten gebruiken. Zo kunnen instanties sneller loketfunctionaliteiten opzetten, kunnen ze ontzorgd worden en efficiëntie verhogen voor de Vlaamse overheid en lokale besturen.</p> <p>Aan de voorkant is Mijn Burgerprofiel een inplugbare header die kan toegevoegd worden aan de bestaande sites en loketten. Daarmee geven we gestalte aan het "Be everywhere" principe: of een burger nu bij overheid A of B aanklopt, het is steeds de bedoeling dat hij het overzicht krijgt van "zijn zaken bij de overheid". Mijn Burgerprofiel verhoogt de vindbaarheid van de overheidsdienstverleningen. Bovendien zorgt de multi-kanaalstrategie ervoor dat de burger dat kanaal kan kiezen dat het dichtst bij hem staat. Via Mijn Burgerprofiel wordt ook het e-loket voor ondernemers (en in</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

de toekomst verenigingenloket bereikbaar: de globale header wordt gebruikt als aanmeldmethode voor zowel burgers als ondernemers (en in de toekomst verenigingen) als een laagdrempelige en veilige manier voor het aanmelden op de verschillende loketten en het vergemakkelijken van het wisselen van rol/hoedanigheid (een burger, een onderneming, een vereniging).

Aan de achterkant is het belangrijk dat de verschillende loketten gevuld worden met alle gegevens, documenten, berichten en dienstverlening. Daarvoor biedt Informatie Vlaanderen de nodige componenten om Vlaamse en lokale hun dienstverlening aan te sluiten op de centrale oplossingen. Via de modernste API's kunnen entiteiten hun applicatie aansluiten op de gemeenschappelijke "App Store" in Mijn Burgerprofiel en e-loket voor ondernemers.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen.
Outcome	Een efficiënte en digitale overheid die op snelle en correcte wijze kan communiceren met haar stakeholders (burgers, ondernemers,...).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het 'no wrong door' principe wordt verder uitgerold. Intussen al bij 227 lokale besturen en 38 entiteiten. Mijn Burgerprofiel is nu ook beschikbaar in een mobiele app met meer dan 100.000 downloads. Daarnaast werden er 13 gemeenteapps gepubliceerd in de app store en heel wat nieuwe functionaliteiten toegevoegd, waaronder de registratie van rekeningnummers voor de jobbonus en het beheer van persoonlijke datakluisen. Ook heel wat back-end aansluitingen vanuit Vlaamse en lokale besturen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
50 lokale en 50 Vlaamse aansluitingen langs de proces-kant worden gerealiseerd in Mijn Burgerprofiel in de meest relevante levensgebeurtenissen tegen eind 2021 (wonen, bouwen, energie, fiscaliteit, onderwijs).	2021 Q4	Gerealiseerd	
De helft van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen is aangesloten voor	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
de front-kant van Mijn Burgerprofiel (header-integratie).				
Er is een dalende doorlooptijd van aansluitingen op Mijn Burgerprofiel.	2021 Q4	Gerealiseerd		
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd		
Elke Vlaamse entiteit en lokaal bestuur ontsluit Mijn Burgerprofiel via de Global header (front-kant)	2023 Q4	Vertraging	Intussen werd de Global Header bij 227 van de 288 lokale besturen opgezet. Op Vlaams niveau merken we daar een vertraagde realisatiegraad omdat niet elke entiteit daar de nodige prioriteit aan kan geven. Momenteel zijn er 38 van de 65 Vlaamse entiteiten die Mijn Burgerprofiel ontsluiten via de Global Header	
Alle relevante dienstverleningen van de Vlaamse en lokale overheden zijn aangesloten op Mijn Burgerprofiel (proces-kant)	2023 Q4	Op schema	De meeste relevante dienstverleningen zijn intussen effectief aangesloten. We realiseerden een stijging van 100% met 160 verschillende dienstverleningsprocessen ontsloten eind 2022. De in het ondernemingsplan vooropgestelde KPI werd daarmee behaald. Er is echter nog een enorm potentieel dat we in 2023 verder willen ontsluiten.	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
De helft van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen is aangesloten voor de front-kant van Mijn Burgerprofiel (header-integratie).	150 lokale besturen	2021 Q4	154	100 %
Verdubbeling aantal dienstverleningen ontsloten in Mijn Burgerprofiel	160	2022 Q4	160	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	10.000.000 EUR
Uitvoering VEK	8.236.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 8.300.000 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 1.700.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 12 maart 2021 - Mijn burgerprofiel - nota](#)

[VR 12 maart 2021 - Mijn burgerprofiel - bijlage](#)

VV061 - DATANUTSBEDRIJF

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Alle Vlaamse entiteiten, lokale besturen en ondernemingen die gebruik maken van de persoonlijke gegevens alsook de personen in kwestie zelf.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Oprichting van het Datanutsbedrijf Vlaanderen. Het Datanutsbedrijf Vlaanderen is een intelligente verkeerswisselaar van data die ervoor zorgt dat er een gelijk data-speelveld is voor alle publieke en private spelers binnen aangesloten ecosystemen. Het vertrouwen in de data-economie wordt geborgd door een neutrale derde partij – het datanutsbedrijf – op te richten die data-deling binnen verticale sectoren en tussen sectoren binnen bereik kan brengen zonder dat bedrijven, organisaties en overheden in dit ecosysteem de controle over de toegang tot hun data verliezen. Data is de grondstof van de nieuwe maatschappij en economie maar die ruwe grondstof moet verder bewerkt worden, aan kwaliteitsstandaarden beantwoorden en moet binnen GDPR en PSI richtlijnen vlot kunnen stromen, zoals andere nutsvoorzieningen, om maximaal van waarde te zijn in nieuwe business modellen. Een digitaal kluzensysteem, toestemmingsmechanismen en een dataverbruiksvergoeding zijn hiervan de hoekstenen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	23.000.000 EUR
Output	- Het datanutsbedrijf als betrouwbare/centrale/neutrale verkeerswisselaar van data - Implementatie van Datakluzen en diverse initiatieven daaromtrent
Outcome	- Optimaal consulteren/beheren van data, data consent > vertrouwen - Efficiënter gebruik van data over diverse partijen heen > efficiëntere werking - Diverse projecten omtrent datakluzen > specialisatie (kennis) en tewerkstelling

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Decreet DNB goedgekeurd door Vlaams Parlement (30 Nov) en Vlaamse Regering (02 Dec). Operationalisering goedgekeurd door Vlaamse Regering (09 Dec)
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste principiële goedkeuring projectdossier op de Vlaamse Regering van 26 november 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Tweede principiële goedkeuring van het projectdossier door de Vlaamse Regering.	2022 Q2	Gerealiseerd	Decreet herwerkt om rekening te houden met adviezen SERV, GBA en VTC. IKW gepland 20/05/2022. 2de goedkeuring 25 mei
Definitieve goedkeuring van het projectdossier 'Oprichting Datanutsbedrijf' door de Vlaamse Regering	2022 Q3	Gerealiseerd	Goedkeuring decreet door Vlaamse Regering op 02 Dec
Parlementaire bekrachtiging van het projectdossier 'Oprichting Datanutsbedrijf'.	2022 Q4	Gerealiseerd	Definitieve goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement 30 Nov
Benoeming DNB bestuurders	2022 Q4	Gerealiseerd	Benoeming DNB afhankelijke bestuurders door Vlaamse Regering
Oprichting DNB 'legal entity'	2022 Q4	Gerealiseerd	Oprichting Vlaams Datanutsbedrijf door notariële akte & registratie DNB KBO nr
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR
Uitvoering VEK	9.552.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 19.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 29 januari 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 26 november 2021. Voorontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf](#)

[Ontwerp van decreethouden de machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf](#)

[Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf. Samenvatting](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 mei 2022. Oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf. Voorontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vorm gegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap. Tweede principiële goedkeuring met het oog op adviesinwinning van de Raad van State](#)

[Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap](#)

[Memorie](#)

[Advies SERV](#)

[Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/103 van 14 december 2021](#)

[Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/037 van 19 april 2022](#)

[Advies Instituut van de Nationale Rekeningen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 september 2022. Voorontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap](#)

[Ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap](#)

[Memorie](#)

[Advies van de Raad van State](#)

VR 9 september 2022 - Aanstellen transitimanager Vlaams Datanutsbedrijf

[Afkondiging decreet door VR 02 Dec](#)

[Akkoord Operationalisering door VR 09 Dec](#)

VR 23 december 2022 - Voordracht vijf bestuurders en aanwijzing twee regeringscommissarissen bij Vlaams Datanutsbedrijf

VV062 - DIGITALISERING DBRC - TOEGANG TOT DE VLAAMSE BESTUURSRECHTSpraak

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De beide onderdelen van het digitaliseringsproject zijn gericht op de procespartijen, dit zijn in eerste instantie burgers en ondernemingen (die betrokken zijn in onze procedures), maar eveneens op hun raadsmanen (advocaten, consultants, architecten, ...) en op overheden (bijv. de overheidsinstantie waarvan de beslissing wordt aangevochten of wiens advies niet is gevolgd, ...). Zij vormen de primaire doelgroep. De secundaire doelgroep zijn burgers en ondernemingen in het algemeen. Een digitale, transparante, rechtszekere en snelle Vlaamse bestuursrechtspraak draagt bij aan een beter ondernemings- en investeringsklimaat.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) overkoepelt en ondersteunt drie Vlaamse bestuursrechtscolleges: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het doel van het digitaliseringsproject is (de procedures in het kader van) de Vlaamse bestuursrechtspraak de komende twee jaar verder, extern te digitaliseren, na een eerste, interne digitaliseringsbeweging. Het project kent twee onderdelen: de bouw van een digitaal platform voor de dossierbehandeling en de bouw van een (interne en externe) kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie.</p> <p>Het digitaal platform moet het voor burgers, overheden, advocaten, ... mogelijk maken de volledige, juridische procedure bij de rechtscolleges digitaal te voeren: digitaal indienen en ontvangen van processtukken, onmiddellijke betaling rolrecht, toegang tot een volledig digitaal dossier, termijnberekening, zittingskalender, overzichten van lopende dossiers voor advocatenkantoren, ... Het platform zal tevens gebruik maken van of aansluiten op andere Vlaamse toepassingen zoals o.a. het Vlaams Toegangsbeheer en het Omgevingsloket.</p> <p>De kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie moet zorgen voor een betere ontsluiting van de rechtspraak, zodat procespartijen (burgers, overheden, advocaten, ...) deze makkelijker kunnen consulteren en gebruiken bij de voorbereiding van hun processtukken (extern) en zodat de rechtscolleges vlotter nieuwe arresten kunnen opmaken (intern).</p> <p>Beide onderdelen van het digitaliseringsproject vergen een substantiële investering.</p> <p>Het eerste onderdeel van het project vergt ook een brede hervorming van de regelgeving, meer bepaald van het DBRC-decreet en -procedurebesluit. De hervorming van de regelgeving zal hand in hand gaan met de technische ontwikkeling van het digitaal platform en zal ertoe leiden dat de procedure herwerkt wordt en volledig uitgaat van een digitale</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

procesvoering, met een eventuele, analoge (papieren) stroom als uitzonderingsregime (bijv. voor kwetsbare groepen die onvoldoende toegang hebben tot digitale middelen).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.600.000 EUR
Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De doelstelling van de DBRC is om het bestaande digitaal loket te laten uitgroeien tot een innovatief en klantvriendelijk digitaal platform. Hierdoor kan de volledige administratieve afhandeling van de procedure bij de bestuursrechtscolleges digitaal verlopen: indiening en ontvangst van processtukken, onmiddellijke (online) betaling rolrecht, toegang tot volledig dossier, termijnberekening, zittingskalender, overzichten van lopende dossiers voor advocatenkantoren, en zo verder.</p> <p>Na een intern voortraject tijdens het voorjaar van 2022 is de overheidsopdracht voor het ontwikkelen van dat digitaal platform uitgeschreven en in mei 2022 in de markt gezet. Eind augustus 2022 is de overheidsopdracht gegund aan een externe partner.</p> <p>September 2022 is gebruikt om het project initiatie traject om het project gestructureerd en gecontroleerd te kunnen opstarten, vorm te geven. 29 september 2022 volgde de kick off van het digitaliseringsproject.</p> <p>De eerste inhoudelijke fase van het project, het voortraject met onder meer het verder uitwerken van de solution architectuur, de set-up van de infrastructuur, het uitwerken van de project backlog, etc., is opgeleverd op 9 december 2022.</p> <p>De volgende fase, de uitvoering, is vervolgens gestart op 12 december 2022 met een eerste sprint op 19 december 2022. 9 sprints van telkens 3 weken zijn voorzien.</p> <p>Het is nog steeds de bedoeling dat dit platform zo snel mogelijk operationeel is, en bij voorkeur bij de start van het werkjaar 2023-2024, dat is 1 september 2023.</p> <p>Daarnaast plant de DBRC een nieuwe kennisdatabank met bijbehorende zoekfunctie te bouwen voor een betere ontsluiting van de rechtspraak. Zo kunnen de procespartijen deze makkelijker consulteren en gebruiken bij de voorbereiding van hun processtukken en kunnen de rechtscolleges vlotter nieuwe arresten opmaken. Voor dit onderdeel van het project is een voorbereidende behoefteanalyse uitgevoerd. De vervolgstappen omvatten de verdere verfijning van de business vereisten en het uitvoeren van een technische analyse met uitwerking van de solution architectuur. De focus ligt momenteel op de uitbouw van het digitaal platform, waardoor deze vervolgstappen nog niet zijn opgestart.</p>
Noodzakelijke politieke actie	De uitrol van het digitaal platform kan enkel in de praktijk gerealiseerd worden indien tegelijkertijd ook de huidige DBRC-regelgeving gewijzigd wordt.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Access to Flemish Justice - ontwikkelen digitaal platform voor een volledige juridische procedure	2023 Q3	Op schema	
Access to Flemish Justice - optimaliseren kennisdatabank voor betere ontsluiting rechtspraak	2024 Q4	Op schema	Behoeftanalyse uitgevoerd

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.600.000 EUR
Uitvoering VAK	1.600.000 EUR
Uitvoering VEK	351.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit
Besluit van de Vlaamse Regering - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit - nota
Besluit van de Vlaamse Regering - Digitaal loket Dienst van de Bestuursrechtscolleges: wijzigingsbesluit - advies
Nota aan de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021. Digitalisering DBRC
DBRC Strategische digitaliseringsroadmap 2019-2024. Bijlage

VV063 - HET OMGEVINGSLOKET – DIGITALISERING INZAGE-LOKET EN OMGEVINGSCHECK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle actoren betrokken bij de vergunningsprocedures, inclusief de burger en verenigingen in het kader van het inzage-recht

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Zowel in het kader van de coronamaatregelen met moeilijke toegang tot de gemeentehuizen voor inzage in omgevingsprojecten in het kader van openbaar onderzoek of de bekendmaking van een beslissing, als met het oog op een betere inspraakmogelijkheid voor de burger, dient het huidig ‘publiek loket’ van het Omgevingsloket herwerkt te worden. Dit ‘publiek loket’ was immers initieel niet bedoeld als platform voor digitale inzage in de omgevingsprojecten zelf, maar om op basis van enkele identificatiegegevens het digitaal indienen van bezwaarschriften of beroepschriften van derden te ondersteunen.</p> <p>Daarom zal een nieuwe toepassing ontwikkeld worden die de burger een nieuwe gebruikerservaring geeft en een beter inzicht in de aangevraagde omgevingsprojecten.</p> <p>Naast een betere dienstverlening in het kader van openbare onderzoeken en bekendmakingen is het tevens de bedoeling om de nodige tools aan te reiken aan instanties met inzage-recht op lopende projecten (adviesinstanties, wooninspectie, handhaving, politiediensten, ...) en inzage in het kader van openbaarheid van bestuur. De complexiteit van vergunningsaanvragen en de bijhorende procedure stellen bijzondere eisen aan de gebruiksvriendelijkheid en visualisatie op beperkte schermen. Daarnaast dienen specifieke oplossingen uitgewerkt te worden om auteursrechtelijk beschermde plannen te kunnen visualiseren met respect voor de intellectuele rechten. Het is de bedoeling om rechtstreeks inzage te verlenen in het huidige ‘burgerloket’ zonder dat data nog hoeven ‘gekopieerd’ te worden naar het ‘publiek loket’, rekening houdend met de verschillende rechten.</p> <p>Aansluitend bij de aangepaste ‘inzage-tool’ is het tevens de intentie om in het kader van een betere dienstverlening ook de ‘omgevingscheck’ te herwerken.</p> <p>Deze ‘omgevingscheck’ was initieel enkel bedoeld om zicht te krijgen op geldende voorschriften en de mogelijke impact van adviesverlening voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. In het kader van de omgevingsvergunning is de ‘omgevingscheck’ echter ook een essentiële en wettelijk verplichte tool geworden voor MER-screening en de mogelijke impact van handelingen en activiteiten op de omgeving. In dat kader zal de performantie, stabiliteit, configuratie-mogelijkheden en kwaliteit van de ‘omgevingscheck’ verbeterd worden door een verdere integratie in het Omgevingsloket.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit deelproject wordt uitsluitend gefinancierd met de relancemiddelen. Het verdere onderhoud van de gerealiseerde toepassingen en eventuele bijkomende functionaliteiten worden opgenomen in de reguliere middelen van het project.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.865.000 EUR
Output	De realisatie van 2 deelt toepassingen bij het Omgevingsloket, met name het 'inzageloket' en de 'omgevingscheck 2.0'
Outcome	Dankzij de twee vernieuwde toepassingen zullen de burgers en bedrijven in de eerste plaats online en 24/7 inzage hebben in de vergunningsaanvragen die in openbaar onderzoek zijn of waarvoor de beroepstermijn van toepassing is, zonder zich nog naar het gemeentehuis te dienen begeven zoals dat vandaag het geval is. Tegelijkertijd zal men beter inzicht krijgen over mogelijke impact van omgevingselementen op de geplande projecten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het 'inzage-loket' is in volle ontwikkeling en zal een belangrijke toegevoegde waarde betekenen voor de burger in het kader van openbare onderzoeken en bekendmakingen van omgevingsprojecten.</p> <p>Door de technische complexiteit en de alignering op de Vlaamse strategie met web-componenten is de ontwikkeling trager dan oorspronkelijk ingeschat.</p> <p>Met het oog op een versnelling werd een bijkomend krediet toegekend. De ambitie is om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 het inzage-loket te lanceren.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Functionele analyse inzageloket	2021 Q3	Gerealiseerd	
Functionele analyse 'omgevingscheck 2.0'	2021 Q3	Gerealiseerd	
herwerkte tool 'Omgevingscheck'	2021 Q4	Gerealiseerd	
implementatie nieuwe toepassing 'inzage loket' in omgevingsprojecten	2023 Q2	Vertraging	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Contact met overheid via internet		2023 Q2		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.865.000 EUR
Uitvoering VAK	1.864.000 EUR
Uitvoering VEK	1.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.865.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Het Omgevingsloket digitalisering inzage-loket en omgevingscheck
Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Update van de relancemiddelen die worden voorzien voor het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht

VV064 - FIT – DATAGEDREVEN ORGANISATIE EN DIGITALISERING DIENSTVERLENING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	Dit project is bedoeld voor de Vlaamse ondernemer die internationaal wil ondernemen alsook de buitenlandse ondernemer die in Vlaanderen wil investeren.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Meer dan ooit moeten wij de klanten snel en doelgericht helpen. Flanders Investment & Trade (FIT) wil een sterke klantgedreven organisatie zijn die wendbaar is voor de toekomst en robuust kan inspelen op onvoorziene bedreigingen voor Vlaamse bedrijven en de Vlaamse economie, zoals Covid-19, Brexit, en wereldwijd groeiend protectionisme. Beperkingen op het verkeer van mensen, goederen en diensten en inperkingsmaatregelen zorgen regelmatig voor verstoring in productie en vraag. De impact op toeleveringsketens, grondstoffen en een lager vertrouwen door disrupties zoals een pandemie of macro-economische gebeurtenissen is groot.</p> <p>Dit project moet de Vlaamse ondernemer herlanceren op het internationale terrein. FIT wil daarom versneld inzetten op digitalisering om zijn dienstverlening nog toegankelijker en meer gepersonaliseerd te maken, de impact van prospectie te verhogen, matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse zakenpartners te faciliteren enz. Het Agentschap investeert in verdere digitalisering en Artificiële Intelligentie (AI) in zowel business processen als in het faciliteren van contacten met klanten.</p> <p>DG Reform lanceerde in September 2019 een project “Blue Print for artificial intelligence adoption at Flanders Investment & Trade”, dat werd afgerond in juli 2020. Het resultaat was een AI-roadmap om de dienstverlening van FIT te versterken aan de hand van 4 pijlers: digital skills, datagedreven, optimalisatie businessprocessen en vergroten van de klanteninteractie. Dit project, VV064, werkt verder op de verworven inzichten.</p> <p>Dankzij een doorgedreven digitalisering van business processen is de dienstverlening van FIT 24/7 toegankelijk. Met een hoofdzetel in Brussel, kantoren in de vijf Vlaamse provincies en een uitgebreid wereldwijd netwerk neemt FIT in het landschap van Vlaamse overheidsinstellingen een bijzondere plaats in: ‘FIT never sleeps’. Verdere digitalisering kan de kloof tussen Vlaanderen en lokale business communities wereldwijd dichten. Een virtuele wereld waar virtuele matching tussen bedrijven de norm is, verbetert bovendien de ecologische impact: minder fysieke zakenreizen, meer en kortere communicatielijnen tussen binnen- en buitenland. Transparant en snel, gevrijwaard van hinderlijke data-silo’s, en maximaal gebruikmakend van uniforme, in de cloud draaiende business tools. Dat is cruciaal om de Vlaamse export en economie niet te laten ontsporen, en investeringsstromen naar Vlaanderen niet te laten stilvallen. Nu meer dan ooit moet er geïnvesteerd worden om de digitale omslag te maken en voorsprong te realiseren.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.000.000 EUR
Output	<p>Aan de hand van betere data: verrijking van klantenbestand (70% van de accounts) en gebruik van digitale ondernemingsfoto om de klant gericht te bedienen;</p> <p>Aan de hand van meer data: lerende algoritmes om predictieve analyses te maken over de customer journey van een bedrijf;</p> <p>Aan de hand van geconnecteerde data: matchingplatform waarmee de Vlaamse ondernemers sneller connecteren met buitenlandse zakenpartners;</p> <p>Opzet van een digitaal marketingplatform om met de juiste klanten op het juiste moment en op de juiste manier te communiceren;</p> <p>Uitrol intern trainingplatform om de digitale vaardigheden in de organisatie te verbeteren;</p> <p>Lancering van een performant informatiesysteem over internationaal ondernemen.</p>
Outcome	Meer gedigitaliseerde, dynamische, interactieve en doeltreffende dienstverlening op maat van de klant.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	<p>Dit ambitieus project zit in de eindfase en wordt, zoals voorzien, afgerond op 31/12/2022. Het project zette in op meerdere digitale domeinen, waarbij een betere dienstverlening aan de klant de centrale focus was: De klantenplatformen werden interactief gemaakt: hierdoor kan een buitenlandse aankoper nu sneller in contact treden met een Vlaamse exporteur, én de klant zelf kan erg snel de eigen marketing via FIT verzorgen. Het klantenbestand werd verrijkt via externe en interne data, geconnecteerd met de klant, die zelf zijn bedrijfsprofiel kan aanpassen, en wereldwijd ontsloten met alle kantoren van FIT, zodat zij over alle informatie van de klant beschikken om hem/haar op maat te bedienen. De FIT Business Academy zag het licht, een intern leerplatform die toelaat dat de posten in het buitenland en in de provinciale kantoren de klanten op de juiste wijze, gestroomlijnd en wereldwijd bedienen. Het interne Kennisplatform KISS (Knowledge Intelligence Sharing Platform) werd vereenvoudigd en verduidelijkt. Informatie over Vlaanderen die onze zakenpartners en investeerders in het buitenland kunnen overtuigen, wordt nu centraal ontsloten. Qua Artificial intelligence is het niet gelukt een predictief model uit te werken, maar de eerste stappen werden gezet aan de hand van experimenten: logo-herkenning via AI om de subsidie-aanvraag efficiënter te maken; suggesties van antwoorden op basis van eerder gegeven antwoorden om het Q&A-proces te vergemakkelijken; suggesties op basis van het gedrag van de klant om hem, net zoals Netflix, de juiste dienstverlening en kennis door te geven. Tot slot, de eerste stappen werden gezet om de marketing en de sales te verbinden en een marketing tool werd geïmplementeerd. De looptijd van het project was echter te kort om de principes, strategie én uitvoering aan te pakken. FIT zal op het ingeslagen pad verder werken.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Doelstelling 1a: Ken de klant (Customer Intimacy) via "ACCOUNTMANAGEMENT VOOR	2022 Q4	Gerealiseerd	FIT is er in geslaagd om de informatie over klanten te verrijken, zowel via interne info

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
SOURCING". Om de (top)bedrijven te identificeren, sourcinglijsten te maken en de matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse spelers te faciliteren, verrijken we de accounts met meer en betere data.			als via eigen aanvullingen van de klant (via het klantenplatform MijnFIT). Daarenboven krijgen we via webscraping extra informatie binnen over de klant op basis van hun publieke websites én kregen we info van de douane over de exportmarkten. Tot slot worden de collega's geïnformeerd wanener een klant ophun markt iets onderneemt, zodat ze snel kunnen inspelen op de behoeften.
Doelstelling 1b: Ken de klant (Customer Intimacy) via "PREDICTIEVE MODELLEN AI". We maken algoritmes om signalen te capteren van potentiële investeerders en van nieuwe Vlaamse exporteurs.	2022 Q4	Stopgezet	Het capteren van signalen en het scoren van potentiële leads wordt aangeboden door verschillende oplossingen. We bekijken welke bestaande oplossingen en algoritmes ons kunnen helpen. We pakken dit aan via een automatisering van marketing en sales. Voor AI werken we aan een aantal experimenten (logo-herkenning, suggesties aan klanten) maar we zijn niet geslaagd in het opbouwen van een predictief model.
Doelstelling 2: Engageer de klant via "MyFIT-PROMOTIETOOL EVENPLATFORM". FIT wil minder fysieke en nog meer online B2B contacten tussen Vlaamse bedrijven en potentiële zakenpartners in het buitenland.	2022 Q4	Gerealiseerd	MijnFIT werd interactiever gemaakt. De promotieplatformen staan helemaal op punt. Hierdoor kunnen klant en buitenlandse zakenpartner met elkaar worden gematcht. FIT speelt hier dus "broker".
Doelstelling 3: Bereik de klant via "DIGITAL PERSONALIZED & ACCOUNT BASED MARKETING". Om de klant op maat te bedienen en te bereiken en onze impact te maximaliseren, zetten we in op "next generation" digitale marketing, gebaseerd op customer centric data.	2022 Q4	Vertraging	FIT heeft een nieuwe marketing technologie en de processen tussen sales en marketing worden uitgetekend. Het is echter bij POCs gebleven door tijdsgebrek.
Doelstelling 4: Werk vlot voor de klant via "TRAINING IN DIGITAL SKILLS". Efficiënte bediening van de klant veronderstelt een digitale transformatie zodat data ingezet worden om de dienstverlening te verbeteren ("Lead by Example"). Bedrijven moeten digitalisering integreren in hun internationale business modellen, de markt voor digitale export ligt open.	2022 Q4	Gerealiseerd	De FIT Business Academy is klaar en wordt vlot gebruikt.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALLEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Doelstelling 5: Informeer de klant via "KENNISBEHEER". Digitale ontsluiting voor de klant van marktkennis via cognitive search	2022 Q4	Gerealiseerd	De projectleider heeft FIT verlaten. Toch is FIT er in geslaagd om het kennisplatform te vereenvoudigen, te ontsluiten en er voor te zorgen dat de collega's toegang hebben tot de kennis over Vlaanderen en het Vlaamse ecosysteem om de potentiële investeerders en zakenpartners in het buitenland te overtuigen.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
DIGITALE VAARDIGHEDEN - Implementatie van een trainingstool om digitale vaardigheden te verbeteren	In gebruikname van de trainingstool	2022 Q3		100 %
DIGITALE PLATFORMEN - Succesvolle in productiestelling en implementatie van het interactieve promotieplatform	65% van de actieve klanten maakt vlot gebruik van een promotieplatform	2022 Q4		100 %
ACCOUNTBEHEER - Creatie van een digitale Ondernemingsfoto van de actieve FIT-klanten	80% van de klanten hebben een digitale ondernemingsfoto	2022 Q4		100 %
KENNISBEHEER - Ontwikkeling van een informatiesysteem om informatie op een efficiënte wijze te verzamelen	Lancering van informatiesysteem met performante zoekroboten	2022 Q4		100 %
ACCOUNT BASED MARKETING - Monitoring van de ontvangst bij de klant van de marketingcampagnes	BI Dashboard om effectiviteit te monitoren	2022 Q4		50 %
ACCOUNT BASED MARKETING - Naast brede campagnes maken we meer gebruik van gerichte communicatie, op maat van de klant, via een performante marketing technologie	Meer gerichte marketingtrajecten via de marketing technologie	2022 Q4		50 %
DIGITALE VAARDIGHEDEN - Ontwikkeling van een monitoringssysteem van de digitale vaardigheden (nulmeting en tussentijdse metingen) van de personeelsleden	60% van de personeelsleden maakt vooruitgang	2022 Q4		65 %
ACCOUNTBEHEER - Afwerking van de gemeenschappelijke FIT-VLAIO Ondernemingsfoto	VLAIO-FIT Ondernemingsfoto in gebruik	2022 Q4		100 %
ACCOUNTBEHEER - Verrijking van accounts uit het klantenbestand met informatie nuttig om op maat te kunnen bedienen (o.a. over exportlanden)	70% van de accounts zijn verrijkt	2022 Q4		80 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
ACCOUNTBEHEER - Creatie van een digitale lijst met Vlaamse bedrijven in een bepaalde sector en in een bepaald land	Digitale zoekmodule om Vlaamse bedrijven te identificeren	2022 Q4		90 %
DIGITALE PLATFORMEN - Lancering van een vernieuwd MijnFIT profiel waar de klant zelf zijn promotie kan beheren	Vernieuwd MijnFIT-profiel met maximale opties is gelanceerd	2022 Q4		100 %
LEAD ONTWIKKELING en SCORING - Creatie van dashboards waar opportuniteiten ("leads") voor Vlaamse bedrijven en potentiële buitenlandse investeerders vatbaar worden weergegeven	Creatie van Dashboard met leads en scoring	2022 Q4		30 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.248.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV065 - CYBERSECURITY EN UITROL SIEM

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om te beschikken over een veilig en privacybestendig aanbod van digitale diensten, rekening houdend met de evoluerende bedreigingen en technologische vernieuwingen. We voeren daarom een aantal cruciale initiatieven en verbeteringen door op vlak van informatieveiligheid.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.500.000 EUR
Output	Zie mijlpalen.
Outcome	Robuuste goed beveiligde en gemonitorde ICT-omgeving die bestand is tegen aanvallen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op meerdere activiteiten is de afgelopen periode vooruitgang geboekt.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema	
Verdere uitbouw van informatieclassificatie-raamwerk	2022 Q4	Gerealiseerd	
Opbouw standaardrapportering en centraal dashboard voor veiligheidsrisico's	2021 Q4	Gerealiseerd	Het centraal dashboard is operationeel. In het centraal dashboard zit ondertussen volgende informatie : - resultaten van phishing testing voor de deelnemende entiteiten. - resultaten van de ethnical hacking voor de deelnemende entiteiten. - de nulmeting van de self assessment.
Ontwikkeling instrument voor self-assessment	2022 Q4	Gerealiseerd	De nulmeting werd ondertussen uitgevoerd.
Ontwikkeling proces en tooling voor conformiteitstoetsing	2022 Q2	Vertraging	De conformiteitstoetsing is afhankelijk van het uitvoeren van een self assessment (zie mijlpaal 6) en heeft mede door een resourcegebrek vertraging opgelopen.
Communicatie -en bewustmaking campagne met betrekking tot informatieveiligheid	2021 Q4	Gerealiseerd	De dienstverlening inzake "Phishing as a service" en "Responsible disclosure", dat past binnen bewustmaking is operationeel en wordt toegepast. Tevens is er een communicatieplan opgesteld mbt informatieveiligheid.
Uitrol SIEM: koppeling met bedrijfsapplicaties en kritieke infrastructuurcomponenten	2022 Q4	Gerealiseerd	De bedrijfskritieke toepassingen, evenals de kritieke netwerk en data center infrastructuurcomponenten zijn gekoppeld met de centrale SIEM-infrastructuur.
Uitrol SIEM: Activeren, trainen en optimalisatie van de motor voor artificiële intelligentie via log analytics	2022 Q4	Vertraging	Door de vertragingen in de transitie van ICT-raamcontracten en bij gebrek aan resource hebben deze activiteiten vertraging opgelopen.
Verdere optimalisatie en inrichting van centraal log management conform vereisten i.k.v wetgeving en informatieveiligheid.	2022 Q4	Gerealiseerd	De oplossing voor centraal log management (LogaaS) staat in productie. Het beheer ervan zal verder worden ingeregeld.
Verdere uitbouw van encryptiebouwstenen zodat de vertrouwelijkheid van gegevens gegarandeerd blijft	2022 Q4	Gerealiseerd	De KMS (Key Management System) die aan de basis ligt van veilige encryptie is operationeel voor toepassingen gehost in AWS. Voor de Azure omgeving en het on prem data center staat de

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			KMS oplossing in preproductie en is dus tevens klaar.
Verdere integratie en uitbouw van PAM zodat er steeds controle is op beheerderstoegangen voor zowel infrastructuur als toepassingen, api's	2022 Q4	Gerealiseerd	PAM is ingeregeld voor de toepassingen alsmede de werkplekdiensten in het data center.
Verdere uitbouw Certificatenbeheer	2022 Q2	Gerealiseerd	
Uitvoering penetratietesten en het koppelen van de veiligheidsbouwstenen aan geïdentificeerde risico's	2022 Q4	Vertraging	Omwille van resourcegebrek (bij uitlopen van de transitie-activiteiten in het kader van de ICT-raamovereenkomsten), heeft dit initiatief vertraging opgelopen.
Self-service portaal voor klanten: self-assessment, maturiteitsscan, onboarding, opvolging en beheer van risicomaatregelen afgestemd op self-assessment en maturiteitsscan	2022 Q4	Vertraging	Door een resourceprobleem heeft dit vertraging opgelopen. De aangepaste planning voorziet een oplevering in Q3 2023.
Levenscyclusbeheer van RPA identiteiten via de veiligheidsbouwstenen.	2022 Q4	Vertraging	Door gebrek aan resources, heeft het initiatief vertraging opgelopen. Momenteel wordt de analyse uitgevoerd. Verwacht wordt dat de implementatie kan worden afgerond in Q2 2023.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.500.000 EUR
Uitvoering VAK	2.500.000 EUR
Uitvoering VEK	1.112.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.100.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV066 - HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten Vlaamse overheid

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

Dit relanceproject voorziet in gerichte investeringen in de mogelijkheden om plaats -en tijdsafhankelijke dienstverlening te organiseren, ter ondersteuning van de Vlaamse overheid en lokale besturen in hun digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening naar de burgers, ondernemers en verenigingen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.000.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	Na uitvoering van het project wordt het hybride werken maximaal ondersteund en wordt een performante datagedreven overheid op niveau van de werkplekken gefaciliteerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De verschillende aspecten mbt het relanceproject zijn lopende, maar er is vertraging opgelopen in de uitvoering omwille van uitlopende transitie-activiteiten bij de invoering van de nieuwe ICT-raamovereenkomsten 2022 waardoor er minder resources (menskracht) bij de ICT-dienstverlener beschikbaar waren voor de uitvoering van dit relanceproject.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema	
Plaats- en tijdsafhankelijk werken - modernisering Alfa AD.	2022 Q4	Vertraging	Gerealiseerd: analyse van de omgeving, opmaak van design & implementatie document met AS-IS en TO-BE , opmaak runbook, aligneren met toegangsbeheer, gebruikersbeheer, netwerken en datacenterdiensten. Nog te realiseren : verfijnen van de finale architectuur en finaliseren van de documentatie en runbook als insteek voor modernisering Alfa AD fase 2 en de implementatie zelf (fase 2). Oplevering voorzien voor Q3 2023.
Data- gedreven werkplek : VV066.02.01 Ontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Low code en Self-service analytics'	2022 Q4	Vertraging	Gerealiseerd: governance aanpak en afspraken met de klanten omtrent Vo Power BI tenantbeheer en instellingen, afstemming met entiteiten o.a. onboarding naar Vo Power BI tenant, licentie voorwaarden, monitoring, beheer premium capaciteiten, Gen2 transitie. Nog te realiseren: data loss prevention, service architectuur. Oplevering voorzien voor Q2 2023
Digitale inkomende post - Doorontwikkeling van en bijkomende ondersteuning bij het gebruik van de generieke component 'Digitale inkomende post'	2022 Q4	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	999.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	404.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Hybride digitale werkplek

VV067 - MODERNISERING CLOUD- EN NETWERKINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Eén van de drie horizontale basispijlers van digitale transformatie ambitie van het relanceplan richt zich op de overheidsdienstverlening waarbij onder andere ingezet wordt op een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen om te komen tot een samenhangende interbestuurlijke digitale transformatie. Dit project omvat de acties die het agentschap Digitaal Vlaanderen zal ondernemen om te beschikken over een digitaal platform van modulaire, herbruikbare en aanpasbare infrastructuur en services, rekening houdend met de behoeften van de relanceprojecten. We voeren daarom een aantal cruciale modernisering en verbeteringen door in de digitale infrastructuur van de Vlaamse overheid.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.500.000 EUR
Output	De concrete output van dit project volgt uit de lijst van mijlpalen
Outcome	Gemoderniseerde ICT netwerk- en cloudinfrastructuur die maximaal is geconsolideerd zodat een efficiënte, innovatieve en geïntegreerd ICT-basisinfrastructuur is gerealiseerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> - De migratie van het NMC4 datacenter naar de vernieuwde hybride cloud loopt overeenkomstig planning. - Het zwaartepunt van de migratie van het verouderde VPC datacenter naar de vernieuwde hybride cloud is verschoven naar de tweede helft 2022 en 2023 gezien de werklast inzake de transitie van de ICT-raamcontracten.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2021 Q2	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2024 Q3	Op schema	
De migratie en modernisering van het legacy datacenter NMC4	2022 Q4	Gerealiseerd	
De migratie van de virtual private cloud naar een hybride cloud infrastructuur	2022 Q4	Vertraging	Omwille van de drukke activiteiten bij de transitie van de raamcontracten zal de migratie van het VPC pas worden beëindigd in 2023. Daarnaast blijkt dat een aantal entiteiten de nodige tijd moeten krijgen om hun entiteitspecifieke acties betreffende de migratie budgettair af te dekken en de acties effectief te implementeren.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.500.000 EUR
Uitvoering VAK	3.500.000 EUR
Uitvoering VEK	2.310.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.900.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Modernisering cloud -en netwerkinfrastructuur

VV068 - KALEIDOS – DIGITALISERING VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE VLAAMSE REGERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Financiën en Begroting - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Direct: Kabinetten van de ministers van de Vlaamse Regering Departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid Inspectie van Financiën Vlaams Parlement Strategische adviesraden Rekenhof & Raad van State Andere overheden Indirect: Ruimere publiek (professionelen, burgers e.a.)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Kaleidos zet in op het digitaliseren van de administratieve processen bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering en de ontsluiting van de bijhorende data. Het gaat om volgende processen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agendering & opvolging van de ministerraad van de Vlaamse Regering • Publicaties in het Belgisch Staatsblad • Digitale ministerraad • Dossierflow binnen de kabinetten • Communicatie van de beslissingen van de Vlaamse Regering, inclusief toegang tot de bijhorende publieke documenten • Dossierflow tussen Vlaamse Regering en Vlaams Parlement (m.b.t. besluitvorming) • Connectie met KRAB-toepassing voor adviezen van de Inspectie van Financiën • Adviezen van de Raad van State en wetgevingstechnisch advies • Koppeling met het Digitaal Archief Vlaanderen <p>Gezien het belang van de dossierstromen en de data wordt ook geïnvesteerd in de redundantie van de applicatie.</p> <p>Het nieuwe datamodel is ontwikkeld en de migratie van de data is al grotendeels gebeurd, maar nog niet operationeel. Met de Relancemiddelen worden volgende doelstellingen gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering van de diverse work flows en documenten • Ontsluiting van data <p>Een belangrijk aandachtspunt, gezien de diverse gebruikersgroepen, is de performantie van de applicatie.</p> <p>Voor de ontwikkeling van de applicatie worden zowel Vlaamse als RRF-middelen gebruikt.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.400.000 EUR
Output	Digitaliseren van de administratieve processen bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering en de ontsluiting van de bijhorende data.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • De administratieve ondersteuning verloopt efficiënter en correcter: de papieren flow verdwijnt waardoor het proces sneller en efficiënter wordt. Werken vanop afstand wordt mogelijk. De ministerraad kan volledig digitaal verlopen wanneer nodig. De documenten worden slechts op één plaats bewaard, waardoor het risico op fouten sterk beperkt wordt. Raadpleging van regeringsdocumenten verloopt veel vlotter. De gebruiksvriendelijkheid wordt groter. • Communicatie over regeringsbeslissingen verloopt sneller en efficiënter door rechtstreekse ontsluiting via diverse overheidstoepassingen. • De transparantie van de besluitvorming verhoogt door de documenten beter toegankelijk te maken. Door te werken met een semantisch verrijkt datamodel kunnen data hergebruikt worden in andere toepassingen. Ze kunnen op die manier vlot ontsloten worden naar andere overheden, burgers e.a.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De beslissing van de bevoegde entiteit om de huidige digitale handtekenmap te vervangen heeft de projectplanning grondig verstoord. De integratie van de digitale handtekening in Kaleidos is hierdoor on hold gezet en verschillende mijlpalen lopen dan ook vertraging op. De planning werd aangepast om het ontwikkelwerk niet stil te leggen. De werkzaamheden voor de integratie van Kaleidos met ACM/IDM zijn afgerond zodat een aanzienlijke uitbreiding van het aantal gebruikers in 2023 mogelijk wordt. Ondertussen wordt de zoekinterface uitgebreid en gebruiksvriendelijker gemaakt. Ook de integratie in het webplatform, met o.m. een betere ontsluiting van de documenten naar externen, werd naar voor geschoven. Volgens de huidige informatie kunnen de werkzaamheden m.b.t. de digitale handtekening begin 2023 hervat worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Het Relanceproject VV068 - Kaleidos is goedgekeurd door de Vlaamse Regering	2020 Q2	Gerealiseerd	
De data uit het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering die beschikbaar zijn in Kaleidos zijn ontsloten voor hergebruik door andere applicaties (zowel binnen overheid als publiek) via het publieke dataportaal Themis	2021 Q4	Gerealiseerd	De gegevens in Kaleidos zijn beschikbaar als open data op https://themis.vlaanderen.be/

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De toepassing is redundant	2021 Q4	Uitgesteld	De redundantie is geëvalueerd in de testomgeving. De effectieve uitrol hiervan betekent ook de inzet van een bijkomende server en dus bijkomende kosten. Om budgettaire redenen worden er voorlopig geen nieuwe servers in productie genomen. Dit wordt meegenomen in de nieuwe hostingomgeving.
Het publicatieproces voor decreten, besluiten e.d. kan volledig digitaal verlopen	2022 Q1	Gerealiseerd	De workflow voor de publicatie van de beslissingen van de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad verloopt digitaal via Kaleidos. Ook de module voor rapportering is afgerond.
Historische data kunnen retro-actief ingevoerd worden	2023 Q4	Op schema	Timing mijlpaal is aangepast. De genormaliseerde dataset van alle ministers staat in productie en gaat terug tot de start van de Vlaamse Regering. Dit was de belangrijkste 'to do' en een voorwaarde om retro invoer mogelijk te maken. De werkzaamheden aan dit luik zijn hier voorlopig mee afgerond. Er blijft wel nog een belangrijke to do: - manuele correcties moeten nog mogelijk gemaakt worden (ad hoc aanpassingen) - nog enkele structurele (automatische) aanpassingen Dit is echter minder prioritair, aangezien een disclaimer duidelijk kan maken welke informatie voorlopig wel en niet beschikbaar is.
Documenten kunnen digitaal getekend worden in Kaleidos	2022 Q3	Vertraging	De ontwikkeling is tijdelijk on hold gezet wegens een selectieproces bij Digitaal Vlaanderen voor een nieuwe digitale handtekentool. Begin 2023 wordt de ontwikkeling weer opgestart.
De dossierstroom voor regelgevende dossiers tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement kan digitaal verlopen	2022 Q3	Vertraging	Het werk voor de technische koppeling is gerealiseerd. De functionele integratie staat on hold tot het Digitaal tekenen is opgeleverd. Dit is een absolute voorwaarde om de authenticiteit van de ondertekende stukken te verzekeren. Tegelijkertijd moeten de analoge werkprocessen hertekend worden in functie van de digitale documentenstroom. De gebruikersinterviews hiervoor starten op in het voorjaar 2023.
De beslissingen van de Vlaamse Regering kunnen via Kaleidos bekend gemaakt worden	2022 Q4	Gerealiseerd	Alle beslissingen van de Vlaamse Regering zijn raadpleegbaar op: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/ en zijn dus publiek beschikbaar.
Het Team Secretarie kan de voorbereiding en afhandeling van de dossierstroom voor de Ministerraad volledig afhandelen in Kaleidos	2022 Q4	Vertraging	Het design voor de volledige digitale dossierstroom wordt uitgewerkt. Stapsgewijs worden de ontwerpen omgezet in digitale modules.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Ministerraad kan online verlopen.	2023 Q1	Vertraging	Het design voor de volledige digitale dossierstroom wordt uitgewerkt. Stapsgewijs worden de ontwerpen omgezet in digitale modules.
De kabinetten kunnen de dossierstroom voor de Ministerraden digitaal verwerken in Kaleidos	2023 Q1	Vertraging	Het design voor de volledige digitale dossierstroom wordt uitgewerkt. Stapsgewijs worden de ontwerpen omgezet in digitale modules.
Een eerste onderdeel van adviesverlening is voorzien in of gekoppeld met Kaleidos	2023 Q1	Stopgezet	Voor deze module moet de voorbereiding nog starten. Als onderdeel van de projectoptimalisatie werd gekozen voor meer focus, d.w.z. aan minder modules tegelijk werken zodat de prioritaire modules goed en meer binnen de vooropgestelde timing afgewerkt worden. Daarnaast gebeurden er performantieverbeteringen en is er geïnvesteerd in de optimalisering van enkele bouwstenen en functionaliteiten in Kaleidos, zodat de fundamenten voor de volledige digitale dossierstroom van de Ministerraad robuuster, efficiënter en betrouwbaarder zijn. Tot slot zullen er ook nog middelen nodig zijn voor de nodige ontwikkelingen voor de gekozen hostingformule. Het is dan ook niet meer realistisch om deze mijlpaal te behouden binnen de huidige planning en voorziene middelen.
De koppeling met het webplatform voor publieke ontsluiting van de beslissingen van de Vlaamse Regering is gerealiseerd	2023 Q3	Op schema	Terug opgestart. De integratie van Kaleidos met het webplatform (www.vlaanderen.be) is bezig. Op het webplatform zal de bezoeker meer zoek- en filtermogelijkheden hebben dan op de huidige website https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/ De content blijft hetzelfde.
Er is een koppeling tussen Kaleidos en het Digitaal Archief Vlaanderen	2023 Q3	Uitgesteld	Op basis van de business behoeften wordt er voorrang gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, zoals de digitale agenda en het digitale tekenen.
Kaleidos is toegankelijk voor alle relevante doelgroepen (overheid)	2022 Q3	Gerealiseerd	De werkzaamheden voor de integratie van Kaleidos met ACM/IDM zijn afgerond. Om de zoekervaring van de gebruiker te verbeteren wordt aanvullend de zoekinterface uitgebreid en gebruiksvriendelijker gemaakt.
Er is een formeel goedgekeurd project closure/completion document beschikbaar voor het relanceproject VV068	2025 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Gebruikers van nieuwe en opgewaardeerde diensten, producten en processen		2025 Q4	192.857	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.400.000 EUR
Uitvoering VAK	2.400.000 EUR
Uitvoering VEK	1.489.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 2.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Kaleidos. Activiteiten en budget 2021

VV069 - DATA INTEGRATIEDIENSTEN VOOR SLIMME MOBILITEIT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Vlaamse regering heeft zich op het vlak van mobiliteit ambitieuze doelstellingen gesteld waaronder een modal shift om Vlaanderen en haar steden leefbaar te houden. Hierbij wordt mobiliteit als een dienst (Mobility-as-a-service, MaaS) vooropgesteld waarbij een gebruiker via digitale kanalen, zoals de Mobiliteitscentrale, eenvoudig meerdere types mobiliteitsdiensten kan combineren tot de meest efficiënte oplossing om zich van punt A naar punt B te verplaatsen</p> <p>Om deze combimobiliteit mogelijk te maken, moet iedere vervoerder en/of MaaS-aanbieder kunnen beschikken over kwalitatieve en integreerbare data over zowel het volledige aanbod, publiek én privaat, als actuele data over bijvoorbeeld de positie van deelfietsen of bussen of filevorming. Met het relanceproject 'Data integratiediensten voor slimme mobiliteit' (VV069) wordt een gestandaardiseerde oplossing voor deze data-uitwisseling tussen alle betrokken partijen mee gerealiseerd. Door deze investering te realiseren in de context van dit relanceproject, zorgt het project voor de kickstart van het data-ecosysteem en de noodzakelijke inspanningen op het vlak van interoperabiliteit en herbruikbaarheid die door de private sector als complex en niet rendabel worden geacht. Hiermee wordt de data-deling voor Mobiliteit zowel voor publieke als private actoren naar een hoger niveau getild en kunnen deze partijen zich naar de toekomst toe richten op meerwaardediensten in het mobiliteitsveld.</p> <p>Het voorliggend relanceproject maakt hiervoor gebruik van de publicatiestraat en de ecosysteemwerking die het resultaat zijn van het relanceproject 'Vlaamse Sensor Data Space' (VV073). Door de mobiliteitsdatastromen te standaardiseren en via de Vlaamse Sensor Data Space ter beschikking te stellen, moeten aanbieders die in verschillende (vervoers-)regio's actief zijn hun data maar één keer delen waarna de mobiliteitsdata vlot beschikbaar en herbruikbaar worden voor alle aanbieders van oplossingen voor combimobiliteit.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.000.000 EUR
Output	Binnen het project worden datastromen gerealiseerd ten behoeve van de Mobiliteitscentrale en Hoppin. Tegelijk wordt ingezet op adoptie van de datadiensten bij lokale besturen door hergebruik binnen de eigen toepassingen mogelijk te maken. Dit wordt concreet toegepast bij de Stad Antwerpen. Via de ecosysteemwerking wordt actief gezorgd voor het delen van de geleerde lessen met zowel andere steden en gemeenten, als mobiliteitsaanbieders.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	<p>Daarnaast zorgt het project voor het ontsluiten van geanonimiseerde verkeersstroomgegevens. Deze datastromen dragen bij aan de beleidsmatige opvolging van de beoogde modal shift. Via de Vlaamse Sensor Data Space zijn deze datastromen bovendien ook voor andere doeleinden te gebruiken.</p> <p>Tot slot wordt de haalbaarheid nagegaan om de burger een meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden door mobiliteitsvoorkeuren te delen via een persoonlijke datakluis die aangeboden wordt door het Vlaams Datanutsbedrijf (VV061).</p>
Outcome	<p>De datastopcontacten ontzorgen de ontwikkelaars van de Mobiliteitscentrale, zodat ze minder energie moeten steken in maatwerkkoppelingen van datastromen. Daardoor is er meer ruimte vrij voor andere prioriteiten, zoals voor slimme toepassingen.</p> <p>Tegelijkertijd dalen de inspanningen van de gehele markt voor het combineren en schaalbaar bevragen Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk verhogen doordat ze ondersteund worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering en interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerkkoppelingen en de bijhorende kosten gereduceerd. Bedrijven en integratoren van mobiliteitsdata kunnen zich toeleggen op het ontwikkelen van waarde creërende toepassingen in plaats van op het telkens opnieuw verzamelen en toegankelijk krijgen van data. van het data aanbod.</p> <p>De referentie implementatie met de Stad Antwerpen effent het pad voor andere steden en gemeentes die op dezelfde standaard manier gebruik willen maken van de datastopcontacten.</p> <p>Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kan dankzij de datastromen beleidsanalyses over de verkeersstromen maken. Door onder meer beroep te doen op geanonimiseerde ANPR-data reflecteren deze analyses immers voor het eerst rechtstreeks de werkelijkheid op het terrein.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> • ICT-dienstenleverancier gegund conform overheidsopdrachten - Governance opgezet • Minimum Viable Product (MVP) van Vlaamse Sensor Data Space (VSDS) werd opgeleverd • 2 mobiliteitsstromen werden als Linked Data Event Streams (LDES) gepubliceerd: Hinder op openbaar domein & Dienstregelingen en real-time vertrek- en aankomsttijden van voertuigen De Lijn • OSLO vervoersknooppunten werd uitgewerkt, OSLO verkeerssensoren in uitwerking, OSLO mobiliteitsbudget wordt opgestart • In ontwikkeling: verkeerssensoren (fietsen, auto's, ...) op een gestandaardiseerde wijze tellen en doorgeven via de Vlaamse Sensor Data Space (VSDS) • Gebruik ANPR data vereist een federale wetswijziging, overweging om beleidsmatig deze problematiek te escaleren.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering.	2021 Q3	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
De mobiliteitscentrale aansluiten op de datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	2022 Q2	Gerealiseerd	<ul style="list-style-type: none"> • Als LDES gepubliceerd: - Hinder op openbaar domein - Dienstregelingen en real-time vertrek- en aankomsttijden van voertuigen De Lijn • OSLO rond vervoersknooppunten werd uitgewerkt • DMOW (VIA) heeft beslist om niet met LDES te werken. Bevoegdheden rond Hoppin worden van DMOW naar De Lijn overgeheveld.
Realisatie Minimum Viable Product (MVP) inzake ontwikkeling van de basisbouwblokken voor de VSIDS publicatiestrategie van de Vlaamse Sensor Data Space. Deze opstelling realiseert de	2022 Q4	Gerealiseerd	Minimum Viable Product (MVP) opgeleverd op 5 december 2022.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMI NG	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
bouwstenen en standaarden tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 7)			
De Case van de stad Antwerpen aansluiten op de datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	2023 Q4	Op schema	In uitwerking: <ul style="list-style-type: none"> • OSLO standaard voor verkeerssensoren • Verschillende verkeerssensoren (fietsen, auto's, ...) op een gestandaardiseerde wijze tellen en doorgeven via de VSDS
De geanonimiseerde verkeersstromen met ANPR data (Automatic Number Plate Recognition) zijn beschikbaar zodat er analyses op kunnen worden uitgevoerd	2023 Q2	Vertraging	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik ANPR data vereist een federale wetswijziging https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=flwb.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1918 • Stappen worden gezet voor data van ANPR camera's die geen eigendom zijn van de politie
De haalbaarheidsstudie om de burger in de toekomst een meer gepersonaliseerde mobiliteitsveraring aan te	2023 Q4	Nog niet gestart	<ul style="list-style-type: none"> • OSLO mobiliteitsbudget wordt opgestart • De haalbaarheidsstudie wordt in februari 2023 opgestart conform de planning

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMI NG	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
bieden is beschikbaar			
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
KPI.1 De mobiliteitscentrale sluit aan op 1 datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	1	2022 Q2	1	100 %
KPI.3 De geanonimiseerde verkeersstromen met ANPR data (Automatic Number Plate Recognition) zijn beschikbaar zodat er analyses op kunnen worden uitgevoerd	1 (= beschikbaar)	2023 Q2		
KPI.2 De Case van de stad Antwerpen sluit aan op 1 datastroom van de Vlaamse Sensor Data Space	1	2023 Q4		30 %
KPI.4 De haalbaarheidsstudie om de burger in de toekomst een meer gepersonaliseerde mobiliteitservaring aan te bieden is beschikbaar	1 (= beschikbaar)	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.657.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 4.200.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021. Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021. Projectdossier](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV073 - Vlaamse Sensor Data Space](#)

VV070 - MATIS, HET VLAAMSE MATERIALENINFORMATIESYSTEEM

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Departement omgeving, afdeling Handhaving, Denuo (sectorfederatie), VVSG/Interafval, Afvalbeheersorganismen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING

De herziene kaderrichtlijn afvalstoffen wijzigde de recyclagedoelstellingen en specificeert nu in detail hoe de berekeningen ervan moeten gebeuren. De gerecycleerde hoeveelheid afval moet vanaf productiejaar 2020 (rapportering in 2022) gemeten worden bij de input in de recyclage-handeling. Dat betekent dat het meetpunt voor de recyclage nu achteraan de verwerkingsketen ligt, terwijl dat voorheen vooraan lag. Een belangrijke doelstelling van MATIS is dat de OVAM het afval kan volgen doorheen de diverse voorbehandelingen tot het effectief gerecycleerd wordt. Dit doen we bij voorkeur via digitale gegevensuitwisseling tussen de betrokken bedrijven en de OVAM zodat de administratieve lasten beperkt blijven.

Regelmatig stellen we vast dat er illegale of frauduleuze afvaltransporten plaatsvinden. De OVAM wil hier korter op de bal spelen en de afvalstoffen traceren om de toezichthoudende diensten van accurate informatie voorzien met het oog op een effectieve en efficiënte handhaving.

Daartoe ontwikkelt de OVAM een nieuwe tool (MATIS) voor gegevensinzameling, -validatie en -ontsluiting. De gegevens van de afvalinzamelaars en -verwerkers zullen via volledig digitale processen naar het OVAM-systeem vloeien, waar de gegevens op een geautomatiseerde manier gevalideerd zullen worden. De gevalideerde gegevens zullen via MATIS op het juiste aggregatieniveau ontsloten worden naar belanghebbenden en naar de OVAM-systemen voor het berekenen van de Vlaamse afvalstatistieken. De OVAM stemt hiervoor maximaal af met de betrokken belanghebbenden zodat optimale gegevensuitwisseling mogelijk is.

Een tweede spoor in het project betreft het digitaliseren van de documenten die afvaltransporten moeten begeleiden. We digitaliseren de identificatieformulieren en stemmen hiervoor af met andere transportdocumenten zodat efficiëntiewinsten geboekt worden. Omdat hier mogelijks gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden (vb locatie gegevens) ondernemen we de nodige acties om de toegang en de verwerking van deze gegevens te regelen. Op termijn worden de identificatieformulieren gebruikt om via 'slimme weegbruggen' de effectief gewogen hoeveelheden op een digitale manier naar de OVAM te laten stromen. De koppeling tussen de gedigitaliseerde identificatieformulieren en MATIS is voorzien inna 2023. De verplichting tot digitalisering van de identificatieformulieren is opgenomen in Vlarema 8 en is reeds een eerste keer door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Zowel de gegevens van de digitale identificatieformulieren, als de gegevens in MATIS kunnen gekoppeld worden aan

PROJECTOMSCHRIJVING

vergunningen en registratiegegevens, zodat onregelmatige transporten onmiddellijk zichtbaar worden. Op deze manier kunnen we ook marktschommelingen en afzetproblemen in de afval- en materialenmarkt van kort kunnen opvolgen.

De gegevens zullen niet langer ingezameld worden bij de Vlaamse bedrijven in het algemeen, maar enkel bij bedrijven die professioneel actief zijn in de afvalinzameling en –verwerking. Op deze manier ontstaan schaalvoordelen waarbij de investering in digitalisering kan lonen voor de bedrijven. Daarenboven kunnen we de administratieve lasten van de afvalrapportering voor een groot aantal Vlaamse bedrijven wegnemen.

Voor de ontwikkeling van MATIS werd reeds een deel van de benodigde middelen gevonden in een Europees Life-project (C-MARTLIFE). Vanuit het CMARTLIFE project werd 1.400.000€ projectsubsidie bekomen voor het ontwikkelen van MATIS als een tool die de Vlaamse overheid in staat zal stellen om te voldoen aan de nieuwe Europese rapportageverplichtingen. De personeelsinzet van de OVAM is binnen CMARTLIFE verrekend in de verplichte eigen inbreng. Daarnaast bedraagt de financiering vanuit de middelen van Vlaamse veerkracht 1.950.000€. De middelen die vanuit CMARTLIFE ter beschikking worden gesteld zullen vooral gebruikt ingezet worden voor de gegevensinzameling en -verwerking met het oog op Europese rapportage verplichtingen, terwijl de middelen van Vlaamse veerkracht vooral gebruikt zullen worden voor de gegevensinzameling en -verwerking met het oog op traceren van afvalstromen. Deze invalshoeken zijn wel niet strikt te scheiden en komen samen binnen het MATIS-project.

De concrete acties binnen dit project kunnen opgedeeld worden in:

- Analyse van de benodigde processen en de afstemming met belanghebbenden;
- ICT ontwikkeling van de software voor data-inzameling, -validatie en -verwerking;
- Gebruik van de data voor rapportering en ontsluiting (naar EU, bedrijven, gemeenten, intermediaire organisaties,..);
- Wetgevende initiatieven ikv digitalisering van afvalidentificatieformulieren en de verwerking van persoonsgegevens;
- Datagedreven studies naar de afvalverwerking van uitgeoefde afvalstoffen, om MATIS te verrijken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	1.950.000 EUR
Output	Er zal software opgeleverd worden voor inzamelaars en verwerkers van afvalstoffen: - om gegevens te rapporteren mbt de hoeveelheden ontvangen en verwerkte afvalstoffen/materialen en de hoeveelheden afgevoerde afvalstoffen/materialen met hun bestemming (rapportering vanuit digitale identificatieformulieren is daarbij een mogelijkheid); - om de gerapporteerde gegevens te valideren (zo veel mogelijk geautomatiseerd); - om gegevens te consulteren door de rapporterende bedrijven en andere bevoegde entiteiten en gericht/geaggregeerd te ontsluiten naar bevoegde entiteiten,vb afdeling handhaving van departement Omgeving.
Outcome	Er zal een systeem ontstaan waarbij afvalstoffen en materialen kunnen gevolgd worden tussen bedrijven. Via dit systeem kunnen we afvalstoffen traceren. De ontsluiting van gegevens uit MATIS naar de afdeling handhaving moet leiden tot een effectievere en efficiëntere handhaving op afvalstoffenbewegingen. Het Vlaamse materialeninformatiesysteem zal toelaten dat de Vlaamse overheid zijn nieuwe wettelijke rapportageverplichtingen met betrekking tot de effectieve recyclage van stedelijk afval kan nakomen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
---------------	--------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	Over het algemeen zit het ICT- project op schema. de uitrol in de praktijk gebeurt volgens de initiële planning met een kleine aanvaardbare vertraging die de algemene projectdoelstellingen niet in de weg staat.
Noodzakelijke politieke actie	De negende wijziging van het VLAREMA is nodig om de wettelijke basis te voorzien voor de rapporteringen die nodig zijn ikv MATIS en om de uitwisselingsformaten in ministeriële besluiten te gieten. VLAREMA was vorig jaar vertraagd, maar is nu de eerste principiële goedkeuring gepasseerd en zit op schema om van kracht te worden in Q2 van 2023. Op dat moment zullen ook de ontwerp-ministeriële besluiten aan de minister voorgelegd worden , zodat deze kort na VLAREMA9 van kracht kunnen worden.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Regelgeving betreffende verplichting digitale identificatieformulieren (2023) van kracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
Eerste pilootrapportering van gegevens huishoudelijk afval is afgerond.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Data-sjabloon voor data-uitwisseling met MATIS afgewerkt, gepubliceerd en verwerkt in een Ministerieel besluit	2022 Q1	Uitgesteld	Er is besloten om deze uitwisselingsformaten op te nemen in een MB over MATIS-uitwisselingsformaten. Die kunnen pas genomen worden nadat het besluit van de Vlaamse regering (VLAREMA) is aangepast. De eerste principiële goedkeuring van VLAREMA is gebeurd. Tweede principiële goedkeuring wordt verwacht in de loop van februari. WE vermoeden dus dat deze mijlpaal pas 2023 Q2 gerealiseerd zal worden. De formaten zijn wel al opgesteld, gedeeld met alle betrokkenen en ze worden gebruikt. Dit uitstel heeft dus geen effect op de uitvoering van het project of op de realisatie van andere mijlpalen.
Software voor digitale en semi-automatische gegevensoverdracht van inzameling en verwerking van stedelijke afvalstoffen is gerealiseerd en in werking	2022 Q1	Gerealiseerd	Deze software is in werking en wordt momenteel gebruikt voor rapportage door verwerkers en inzamelaars van huishoudelijke afvalstoffen
Software voor geautomatiseerde validatie van de gegevens over inzameling en verwerking van afvalstoffen is gerealiseerd en in werking.	2022 Q4	Vertraging	De validatie van de gerapporteerde gegevens heeft plaats gevonden op een niet geautomatiseerde manier. Nadien zijn er sessies met de betrokkenen georganiseerd om de analyse te maken van hoe een geautomatiseerde validatie zou kunnen gebeuren. De ontwikkeling van deze module is uitgesteld in de tijd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			tot de module voor bedrijfsafval is afgewerkt (Q1 2023). In principe kan de nieuwe werkwijze al gebruikt worden voor de volgende validatiecampagne en is er weinig vertraging te verwachten voor de uitvoering en uitrol in de praktijk.
Regelgeving betreffende verwerking persoonsgegevens en toegang tot de identificatieformulieren van kracht.	2023 Q1	Op schema	Het materialendecreet is definitief goedgekeurd en ondertussen van kracht. Dit decreet bevatte de nodige bepalingen mbt verwerking van persoonsgegevens, een definitie van MATIS en specifieke bepalingen over identificatieformulieren. In het ontwerp besluit van de Vlaamse regering (VLAREMA 9) werden nog een aantal aanvullingen op de hoger genoemde decretale bepalingen opgenomen. Deze zijn reeds een eerste keer principieel goedgekeurd op Vlaamse regering. Definitieve goedkeuring is voorzien voor Q2 van 2023
3 Datagedreven onderzoeken voor het in kaart brengen van de recyclage van uitgevoerde afvalstoffen zijn uitbesteed en afgerond	2023 Q4	Uitgesteld	De Europese regelgeving die deze onderzoeken oplegt heeft vertraging opgelopen waardoor deze mijlpaal uitgesteld wordt.
Instrument voor geautomatiseerde ontsluiting van gegevens gerealiseerd en in werking	2023 Q4	Op schema	Een Data-platform werd opgezet voor MATIS. Gekoppeld aan dit platform zijn reeds een aantal basisrapporten voorzien. De gegevens over de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en over de verdelingen van deze afvalstoffen stromen reeds automatisch door naar het dataplatform voor ontsluiting. In de loop van Q1 van 2023 zal dit ook het geval zijn voor de verwerkingsgegevens, zodat ook deze vlot kunnen ontsloten worden via het datawarehouse. Er is reeds een rapport voorzien voor melders van inzamel- en verwerkingsgegevens, waarmee ze de eigen gerapporteerde gegevens kunnen analyseren, alsook de gemelde gegevens voor een bepaald grondgebied van gemeente of intercommunale. Er zijn reeds rapporten over verwerking van afval, zij het suboptimaal. Er is reeds een rapport voor toezichthouders beschikbaar waarmee ze de PRTR-rapportageplicht kunnen evalueren. Rapporten voor intercommunales en gemeenten zitten in de laatste fase voor in productiestelling. Verdere ontsluiting en rapportage volgt nog.

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Koppeling MATIS aan vergunningen, registraties met oog op tracering en kwalitatieve gegevens voor Handhaving is gerealiseerd en in werking	2023 Q4	Op schema	<p>Er werd een projectfiche ingediend bij departement omgeving om een structurele data-uitwisseling op te zetten tussen de milieuvergunningen en De OVAM met als doel om een real time overzicht te krijgen van de vergunde inrichtingen, hun locatie en hun vergunningsstatus.</p> <p>Dit pilootproject zal in Q2 van 2023 afgrond worden. nadien zal de koppeling met MATIS plaats vinden.</p>

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Softwaremodule gegevens inzameling Huishoudelijk afval	eerste versie in productie	2021 Q4	1	100 %
Softwaremodule gegevens verwerking van afval	eerste versie in gebruik	2022 Q1	1	100 %
Data ontsluiting via powerBI naar melders inzameling HA	eerste versie in gebruik	2022 Q1	1	100 %
Softwaremodule herverdelen van afvalstoffen over gemeenten	eerste versie in gebruik	2022 Q2	1	100 %
Ontsluiting van gegevens naar melders van verwerkingsgegevens	eerste versie in gebruik	2022 Q2	1	100 %
Ontsluiting gegevens naar niet melders	Opgezet en eerste versie ingebruik	2022 Q3	1	100 %
Softwaremodule gegevens inzameling Bedrijfsafval	eerste versie in gebruik	2023 Q1		30 %
Ontsluiting van traceringsgegevens naar afdeling handhaving	eerste versie in productie	2023 Q2		
Validatiemodule ter ondersteuning van inhoudelijke validatie van de ingevoerde gegevens	eerste versie in productie	2023 Q2		30 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.950.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.950.000 EUR
Uitvoering VAK	1.950.000 EUR
Uitvoering VEK	1.481.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 1.950.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem](#)

VV071 - AANBOD LOKAAL DIGITAAL

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Lokale Besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het sleutelwoord om succesvol digitaal te transformeren bij lokale besturen, is 'samenwerking', samenwerking onderling, interbestuurlijk met andere overheden en eveneens publiek-privaat. Lokale besturen kunnen de vele digitale uitdagingen niet langer individueel aan en zijn op zoek naar schaalvoordelen om gezamenlijk hun doel te bereiken en hierbij ook het versnipperd ITlandschap aan te pakken. Ook de Vlaamse overheid heeft baat bij een goede samenwerking gezien de vele interbestuurlijke uitdagingen die zich aandienen om een optimale digitale dienstverlening aan te bieden aan burgers, ondernemingen en verenigingen.</p> <p>Om deze redenen wordt met dit project in nauw overleg met de lokale besturen een vraaggestuurd ondersteuningsaanbod 'lokaal digitaal' uitgewerkt gericht op het realiseren van concrete digitale oplossingen die in een zo groot mogelijk aantal lokale besturen het verschil maken. Het aanbod werkt volgens een netwerkmodel om gericht en efficiënt de aanwezige expertise bij de lokale besturen te versterken vanuit de productexpertise op het vlak van digitale transformatie, business analyse en de Vlaamse generieke bouwstenen bij Digitaal Vlaanderen, aangevuld met de aankoop-technische en juridische expertise van Het Facilitair Bedrijf.</p> <p>Tot slot wordt werk gemaakt van een duurzaam businessmodel en organisatiestructuur in regie van de lokale besturen zodat het aanbod na afloop van het relanceproject kan blijven bestaan, afgestemd op de effectieve, toekomstige noden en behoeften van de lokale besturen.</p> <p>Dit project is initieel ingediend onder de naam 'Poolstokalias'.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.000.000 EUR
Output	Behoefteanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Een gedragen, duurzaam businessmodel is uitgewerkt zodat het aanbod 'lokaal digitaal' kan voortgezet worden na de afronding van de projectfase, inclusief opzetten van een organisatiestructuur die een oplossing kan bieden voor het versnipperde IT-landschap.
Outcome	Dit relanceproject draagt door zijn expliciete doelstelling rechtstreeks bij aan de digitalisering van de dienstverlening van de overheid aan burger, ondernemer en vereniging. De voorziene dienstverlening vormt eveneens een katalysator voor de brede digitale transformatie van de lokale besturen, onder andere op het

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	vlak van databeheer, en bevordert betere interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met de private markt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project is in uitvoering na goedkeuring door de Vlaamse Regering op 15 juli 2022. Projectdetectie en -selectie zijn lopende (zie onderstaande mijlpalen). Externe expertise wordt ingehuurd om de gestelde outputs te realiseren.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering	2022 Q3	Gerealiseerd	De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2022 de nota "Aanbod Lokaal Digitaal" goed.
Het kernteam lokaal digitaal is volledig operationeel en staat ter beschikking van de lokale besturen.	2023 Q1	Gerealiseerd	Kernteam compleet Overeenkomst met externe partner afgesloten voor het uitvoeren van behoefteanalyses en marktbevragingen Overeenkomst met externe partner afgesloten voor het uitwerken van het business model en het groeipad naar de organisatiestructuur
Behoeftanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Eerste opdracht geselecteerd	2023 Q1	Op schema	
Behoeftanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Eerste behoefteanalyse, marktbevraging en opdrachtomschrijving uitgevoerd en gevalideerd	2023 Q2	Op schema	
Behoeftanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Eerste digitale oplossing aanbesteed.	2023 Q3	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
Een gedragen, duurzaam businessmodel is uitgewerkt zodat het aanbod 'lokaal digitaal' kan voortgezet worden na de afronding van de projectfase, inclusief opzetten van een organisatiestructuur die een oplossing kan bieden voor het versnipperde IT-landschap.	2024 Q2	Op schema	
Behoefteanalyses, marktbevragingen en aanbestedingen worden uitgevoerd met het oog op schaalbare digitale oplossingen die door alle lokale besturen kunnen worden afgenomen. Laatste digitale oplossing aanbesteed rekening houdend met opgestarte opdrachten (in projectfase).	2024 Q4	Op schema	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.000.000 EUR
Uitvoering VEK	74.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 1.700.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. Relanceproject VV071: "Aanbod Lokaal Digitaal"

VV072 - DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	culturele sector, culturele participanten, markt

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.</p> <p>Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken.</p> <p>Het project 'doelgericht digitaal transformeren' wil de brede waaier van het culturele aanbod verbinden met geïnteresseerde cultuurparticipanten om zo de cultuurparticipatie te verhogen en een impuls te geven aan een datagedreven beleid. De focus ligt hierbij op gegevensontsluiting via standaarden. Het project stimuleert op deze manier de digitale innovatie door middel van samenwerking en verbreding. Tevens worden open innovatie en marktbetrokkenheid gestimuleerd. Verschillende organisaties kunnen namelijk in dit uitwisselingsnetwerk verenigd worden: o.a. organisaties die het culturele aanbod kenbaar maken, actoren die zich met publieksonderzoek en participatie bezighouden en de beleidsmonitoring. De culturele beleving wordt op een nieuwe manier georganiseerd waarbij vraag en aanbod worden verbonden. Uitbreiding naar andere sectoren zoals private en toeristische organisaties kan een verdere impuls zijn voor innovatie.</p> <p>Standaardisering zorgt ervoor dat data door kunnen stromen. Door het werken met standaarden voor de digitale gegevensontsluiting wordt de informatie voor alle partijen toegankelijk en wordt het hergebruik van data geoptimaliseerd. Een digitale basisinfrastructuur maakt het mogelijk dat data over verschillende organisaties wordt verbonden met elkaar. Waar mogelijk worden bestaande bouwblokken versterkt en ingezet voor het volledige ecosysteem, waar nodig worden nieuwe bouwblokken toegevoegd. Monopolies zowel voor zowel culturele als marktspelers worden vermeden door het gezamenlijk beheer van de basisinfrastructuur waarop verschillende use cases door verschillende organisaties kunnen ontwikkeld worden.</p> <p>Middels een verkort business case traject werden de doelstellingen, de scope en de mogelijke oplossingen samen met</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

sector verder uitgewerkt. Dit is van cruciaal belang omdat de sector evolueert naar een open ecosysteem waar partijen samen de verantwoordelijkheid dragen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	Gegevensuitwisselingsplatform als basisinfrastructuur waarop data over het cultureel aanbod in verbinding komt met data over de vraag naar deze data vanuit de cultuurparticipant. Dit uitwisselingsplatform bouwt maximaal verder op reeds bestaande bouwstenen in de sector & verbindt de huidige data in gefragmenteerde bronnen via open data standaarden.
Outcome	Verhoging van de relevante cultuurpropositie naar de cultuurparticipant; Verhoging van de samenwerking op sectorniveau; Verhoging van de interoperabiliteit van data binnen de sector; Verlaging van de planlast voor de sectorspelers.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Voor duurzame verankering van de basisinfrastructuur in de sector werd een samenwerking opgestart met publiek vzw. Het DDT-uitwisselingsplatform (=basisinfrastructuur) wordt gezamenlijk ontwikkeld en de bestaande producten UiTinVlaanderen en UiTDatabank worden doorontwikkeld in functie van incorporatie van DDT functionaliteit en integratie met het DDT-uitwisselingsplatform. Daarnaast zal publiek vzw ook de technische exploitatie van het uitwisselingsplatform opnemen na het einde van het project.</p> <p>In het kader van de samenwerking neemt publiek vzw, in samenspraak met het Departement CJM, een rol op voor de inhoudelijke sturing van de lopende en aankomende ontwikkelingen.</p> <p>Een eerste versie van het uitwisselingsplatform wordt ontwikkeld op basis van prototype data producten van publiek vzw en Kunstenpunt.</p> <p>Een UX-analyse werd uitgevoerd in functie van een ideale gebruikerservaring voor aanbieders en afnemers van culturele data op het uitwisselingsplatform.</p> <p>Het OSLO-standaardisatietraject met betrekking tot cultuurparticipatie belandt in een eindfase: de feedback van de sector gedurende de public review fase wordt verwerkt en getest in de prototypes van de dataproducten.</p> <p>Een PIO-project werd opgestart in het najaar van 2022. Dit betreft zowel een behoeftenanalyse en een marktconsultatie om de verschillende opties en voorstellen voor de adoptie van de nieuwe uitwisselingsstandaard 'cultuurparticipatie' door de private ticketingsoftwaremarkt te verkennen.</p> <p>De resterende relancemiddelen werden in 2022 vastgelegd door middel van overheidsopdrachten en subsidies</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitwerken businesscase als voorstudie om tot een actionable projectplan te komen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Goedkeuring door de VR	2021 Q2	Gerealiseerd	
Validatie van het projectplan door de Stuurgroep	2021 Q3	Gerealiseerd	
Vrijgave van OSLO standaard voor cultuurparticipatie voor public review	2022 Q2	Vertraging	De publiek review loopt nog omdat het theoretisch karakter van de data standaard getoetst wordt met de realiteit van een implementatie wat de nodige bijsturing vraagt. De ambitie is om de standaard in 2023 Q1 voor te leggen.
Uitwerken van een MVP (ontwikkeling uitwisselingsplatform met data aan de aanbodzijde)	2022 Q2	Vertraging	Een eerste versie van het uitwisselingsplatform is opgezet waarin de eerste data producten van Kunstenpunt & publiek vzw op draaien, maar de MVP dient nog de verdere doorontwikkeling te krijgen naast de toevoeging van bijkomende data producten op het platform.
Uitwerken van een UX track waarbij gebruikerservaring voor de aanbieder en de cultuurparticipatie wordt vormgegeven	2022 Q2	Gerealiseerd	Deze analyse is afgewerkt in oktober 2022 en een selectie van de resultaten wordt meegenomen in de 2023 roadmap van de UITproducten.
Opstarten van een MVP ontwikkeling met functionaliteit van aanbiederprofiel	2022 Q4	Uitgesteld	Deze mijlpaal is uitgesteld naar 2023 en wordt mee geïntegreerd in de gedefinieerde roadmap van UiTinVlaanderen.
Opstarten van een MVP ontwikkeling met functionaliteit van cultuurprofiel	2022 Q4	Uitgesteld	Deze mijlpaal is uitgesteld naar 2023 en wordt mee geïntegreerd in de gedefinieerde roadmap van UiTinVlaanderen.
Opstarten van bijkomende ontwikkelingen (MVP industrialisatie, ontbrekende componenten)	2023 Q1	Op schema	Deze mijlpaal ligt in het verlengde bij de mijlpaal "Uitwerken van een MVP (ontwikkeling uitwisselingsplatform met data aan de aanbodzijde)" waar een aantal van de verdere doorontwikkelingen nu al wordt opgepikt.
Opstarten van een MVP ontwikkeling met integratie van ticketing data	2023 Q1	Bij te sturen	Deze mijlpaal wordt herwerkt en bestaat uit 2 onderdelen: 1) Opstart van een PIO dossier voor adoptie van nieuwe data standaard mbt cultuurparticipatie door private ticketingssoftware spelers. In deze context is een behoeften analyse gebeurd en loopt momenteel een marktconsultatie. 2) Ontsluiting van ticketing info vanuit Digitaal Podium naar het DDT-uitwisselingsplatform. Tijdens de DDT

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			stuurgroep van december 2022 is er beslist dat er samenwerking moet komen met het project Digitaal Podium omwille van het versterkend karakter. Deze samenwerking vraagt bijkomende afstemming vanuit het lopend project met de track van Digitaal Podium
Opstarten van een POC voor basis data analyse	2023 Q3	Nog niet gestart	
Goedkeuring van project closure document	2023 Q4	Nog niet gestart	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
-----------	--------------	--------	------------	-----------------

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.887.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 4.200.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Relance-initiatief in het kader van de digitale transformatie van de cultuursector: doelgericht digitaal transformeren
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Digitale transformatie van de cultuursector: doelgericht digitaal transformeren
Business Case Doelgericht Digitaal Transformeren. Bijlage
Budget. Bijlage

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV083 - Inventaris cultuur- en jeugdinfrastructuur](#)

VV073 - VLAAMSE SENSOR DATA SPACE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaamse Milieumaatschappij - Digitaal Vlaanderen - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Om van Vlaanderen een toonaangevende regio te maken op het vlak van smart cities en internet of things (IoT) kondigt het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ de realisatie aan van een data-platform voor sensordata. Het project ‘Vlaamse Sensor Data Space’ (VV073) geeft hieraan invulling.</p> <p>De te ontwikkelen nieuwe generieke bouwsteen biedt een antwoord op de uitdagingen die de verwachte vloedgolf aan (real time) data afkomstig van allerhande sensoren stelt, met name wat betreft het kostenefficiënt verdelen van de bijzonder grote volumes aan data, het omgaan met hoge snelheid waarmee data veranderen en de koppelbaarheid van sensordata aan de meer gangbare ‘statische’ data. Centraal staan de ontwikkeling van een ‘publicatiestraat voor sensordata’ en het definiëren van open standaarden waarmee werk wordt gemaakt van ‘data-stopcontacten’ voor sensordata die overheden en bedrijven toelaten om meer van deze nieuwe en innovatieve data in slimme toepassingen vlot te gebruiken aan een lagere kost en doorlooptijd.</p> <p>Sensordata zullen zonder twijfel een belangrijke stimulans worden voor de Vlaamse data-economie en de lokale en Vlaamse overheid in staat stellen ambitieuze beleidsdoelstellingen zoals Blue Deal, Vlaams Energie en Klimaatplan, Modal Shift of Basisbereikbaarheid te realiseren. Om data in dit netwerk te laten stromen en iedereen toegang tot kwalitatieve data te verzekeren wordt ook ingezet op het implementeren van een ecosysteemwerking met governance-afspraken. Een beslissende factor voor het realiseren van deze strategie is de samenwerking met en de adoptie door de private sector waarvoor het Vlaams Datanutsbedrijf (VV061) een cruciale rol in het ecosysteem zal opnemen.</p> <p>Tijdens het project worden, gefaseerd, minstens twee concrete toepassingen in verschillende domeinen (mobiliteit, water, ...) uitgewerkt om de publicatiestraat en de ecosysteemwerking in de praktijk te brengen. Een eerste toepassing in het domein mobiliteit wordt gerealiseerd in samenwerking met het relanceproject VV069 ‘Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit’. Een tweede toepassing in het domein water zal worden uitgewerkt in samenwerking met het relanceproject VV032 ‘Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen’.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	8.500.000 EUR
Output	Het project voorziet de ontwikkeling van open standaarden en specificaties om te vermijden dat data opgesloten blijft in geïsoleerde systemen (silo’s) en dus niet kan stromen. Deze standaarden moeten over

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	<p>verschillende organisaties en systemen werken.</p> <p>Het project realiseert een “publicatiestraat” om sensordata schaalbaar en kostenefficiënt te kunnen publiceren en delen. De open architectuur van de Vlaamse Sensor Data Space bestaat uit herbruikbare bouwstenen die inplugbaar zijn in diverse platformen.</p> <p>De Vlaamse Sensor Data Space Governance. (werkwijze, processen en regels om de interoperabiliteit te laten werken).</p> <p>Een ecosysteemwerking om de productierealisatie, adoptie en integratie iteratief te vergroten. De ecosysteemwerking spint zich uit over de verschillende actoren: de overheden, private sector en onderzoeksinstellingen.</p>
Outcome	<p>Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk verhogen doordat ze ontzorgd worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering en interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerk koppelingen en de bijhorende kosten gereduceerd. Bedrijven en integratoren van sensordata kunnen zich toeleggen op het ontwikkelen van waarde creërende toepassingen in plaats van op het telkens opnieuw verzamelen en toegankelijk krijgen van data.</p> <p>Het project zorgt voor een evenwaardige toegang tot data voor de actoren in het ecosysteem. Vendor lock-in van publieke instellingen wordt verholpen en de data-economie kan verder opengesteld worden voor andere spelers, wat een extra boost voor bedrijven en innovatie in Vlaanderen zal zijn. Dit komt de dienstverlening naar de burger ten goede.</p> <p>Het project realiseert een oplossing die kostenefficiënt en schaalbaar werkt.</p> <p>Het kostenefficiënt ter beschikking stellen en uitwisselen van data, zal nieuwe inhoudelijke datastromen mogelijk maken en zal de (overheids-) dienstverleningen verbeteren. Het zal leiden tot verhoogde investeringen in innovatie en tot verhoogde kennisopbouw omtrent data inzichten, bedrijfsprocessen, ...</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Vlaamse Sensor Data Space (VSDS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICT-dienstenleverancier gegund conform overheidsopdrachten - Governance opgezet • Minimum Viable Product (MVP) van Vlaamse Sensor Data Space (VSDS) werd opgeleverd • In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij werd de datastroom rond waterkwaliteit als LDES gepubliceerd • Gebouwen- en adressenregister werd als LDES gepubliceerd • In 2023 en 2024 zal de Vlaamse Sensor Data Space verder worden ontwikkeld in releases die telkens bestaan uit 5 sprints van 2 weken <p>Betreft onboarding domein use case 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit' (DIM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 mobiliteitsstromen werden als Linked Data Event Streams (LDES) gepubliceerd: Hinder op openbaar domein & Dienstregelingen en real-time vertrek- en aankomsttijden van voertuigen De Lijn • OSLO vervoersknooppunten werd uitgewerkt, OSLO verkeerssensoren in uitwerking, OSLO mobiliteitsbudget wordt opgestart

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<ul style="list-style-type: none"> In ontwikkeling: verkeerssensoren (fietsen, auto's, ...) op een gestandaardiseerde wijze tellen en doorgeven via de VSDS
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Projectdossier goedgekeurd aan de hand van een nota aan de Vlaamse Regering.	2021 Q3	Gerealiseerd	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Eerste implementatie van de Vlaamse Sensor Data Space. Realisatie Minimum Viable Product (MVP) inzake ontwikkeling van de basisbouwblokken en standaarden tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 7 voor de VSDS publicatiestraat.	2022 Q4	Gerealiseerd	Minimum Viable Product (MVP) opgeleverd op 5 december 2022.
De doorontwikkeling van de Vlaamse Sensor Data Space. Finaliseren van de MVP bouwstenen nodig voor hergebruik en opschaling tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 9 & ontwikkelen van bijkomende bouwstenen.	2023 Q4	Op schema	In 2023 en 2024 zal de Vlaamse Sensor Data Space verder worden ontwikkeld in releases die telkens bestaan uit 5 sprints van 2 weken.
De Vlaamse Sensor Data Space realiseert iteratief de onboarding van de domein use case 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit' (cfr. VV069).	2024 Q4	Op schema	<p>DIM KPI.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Als LDES gepubliceerd: <ul style="list-style-type: none"> Hinder op openbaar domein Dienstregelingen en real-time vertrek- en aankomsttijden van voertuigen De Lijn OSLO rond vervoersknooppunten werd uitgewerkt DMOW (VIA) heeft beslist om niet met LDES te werken. Bevoegdheden rond Hoppin worden van DMOW naar De Lijn overgeheveld. <p>DIM KPI.2</p> <p>In uitwerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> OSLO standaard voor verkeerssensoren Verschillende verkeerssensoren (fietsen, auto's, ...) op een gestandaardiseerde wijze tellen en doorgeven via de VSDS

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			DIM KPI.3 • Gebruik ANPR data vereist een federale wetswijziging • Stappen worden gezet voor data van ANPR camera's die geen eigendom zijn van de politie DIM KPI.4 • OSLO mobiliteitsbudget wordt opgestart • De haalbaarheidsstudie wordt in februari 2023 opgestart conform de planning	
De Vlaamse Sensor Data Space realiseert de onboarding van een tweede use case in het domein water in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (cfr. VV032).	2024 Q4	Op schema	In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij werd de datastroom rond waterkwaliteit als LDES gepubliceerd.	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
KPI.1 De eerste implementatie van de Vlaamse Sensor DataSpace wordt einde Q4 2022 opgeleverd. Deze opstelling realiseert de bouwstenen en standaardentot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 7.	1 (= oplevering)	2022 Q4	1	100 %
KPI.2 De doorontwikkeling van de Vlaamse Sensor DataSpace wordt gerealiseerd tegen 31 december 2023. Deze opstelling finaliseert de bouwstenen nodigvoor hergebruik en opschaling tot een TRL (Technology Readiness Level) niveau 9.	1 (= oplevering)	2023 Q4		30 %
KPI.4 De Vlaamse Sensor Data Space realiseert de onboarding van een tweede use case in het domein water in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (cfr. VV032)	1 (= onboarding)	2024 Q4		40 %
KPI.3 De Vlaamse Sensor Data Space realiseert iteratief de onboarding van de domein use case 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit' (cfr. VV069).	1 (= onboarding)	2024 Q4		20 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	8.500.000 EUR
Uitvoering VAK	8.500.000 EUR
Uitvoering VEK	2.182.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 7.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 15 oktober 2021 Nota aan de Vlaamse Regering van 15 oktober 2021. Projectdossier

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV069 - Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit VV032 - Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen

VV074 - VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Fednot (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) en dus de notariskantoren CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) en dus de makelaars VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en dus de steden en gemeenten VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 en het relanceplan Vlaamse Veerkracht dat op 26 september 2020 goedgekeurd werd door de Vlaamse regering kiest duidelijk voor digitalisering als een speerpunt in innovatie.</p> <p>Zo wil de Vlaamse Regering de toegenomen mobiliteit op de Vlaamse vastgoedmarkt verder ondersteunen via doorgedreven digitalisering. Burgers en bedrijven verwerven en verkopen steeds vaker onroerend goed en verwachten daarbij dat de verschillende overheden sneller en laagdrempeliger dan vandaag relevante én correcte informatie over dat vastgoed kunnen verschaffen. Om de baten voor alle actoren binnen bereik te brengen, moet in het domein van vastgoedinformatie een data-snelweg worden aangelegd.</p> <p>Het voorliggend projectvoorstel omvat twee trajecten. Het eerste traject beoogt de ontwikkeling en uitrol en het beheer en de exploitatie van het vastgoedinformatieplatform waarbij een nieuwe informatiesnelweg in het domein van vastgoedinformatie wordt aangelegd. Het tweede traject zet in op het digitaliseren en doelgericht verbeteren van de kwaliteit van de aan het vastgoedinformatieplatform gerelateerde gegevensbronnen. Dit is cruciaal om op termijn alle voordelen van het platform te kunnen realiseren aangezien op heden minder dan 50% van de noodzakelijke gegevensbronnen volledig digitaal centraal beschikbaar zijn.</p> <p>Het projectvoorstel kwam tot stand op basis van een door Informatie Vlaanderen uitgevoerde haalbaarheidsstudie in opdracht van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB), de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en departement Omgeving (dOMG). De conclusies van deze haalbaarheidsstudie en het voorliggend projectvoorstel werd voorgelegd aan het Stuurorgaan Informatie en ICT beleid alsook goedgekeurd door de bestuursorganen van de vermelde partners en maakt deel uit van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.</p> <p>In de investeringsjaren 2021 – 2023 ligt de nadruk op het eerste traject waarbij de voorziene middelen in hoofdzaak worden aangewend voor de ontwikkeling en de uitrol van het platform. Om de meerwaarde van het platform binnen bereik te kunnen brengen wordt ook meteen het tweede traject opgestart waarbij inzake digitalisering van gegevensbronnen focus wordt genomen op het realiseren van een digitaal register met historische milieu- en</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

vergunninginformatie .

Dit resulteert in een eerste versie van het vastgoedinformatieplatform dat volgens planning in productie gaat tegen einde Q3 2022. Tegen eind 2023 worden alle beoogde datadiensten en functionaliteiten via het platform aangeboden aan de partners en start de operationele fase waar de partners die informatie van het platform afhalen een betalende toegang krijgen tot het platform.

Informatie Vlaanderen zal instaan voor de ontwikkeling en uitrol van het vastgoedinformatieplatform. De projectsturing verloopt via een passende governance structuur waar de bovenvermelde partners via de projectstuurgroep kunnen toezien op de vorderingen en eventuele bijsturingen kunnen laten beslissen.

Vanaf 2024 wint het tweede traject duidelijk aan belang. Daarbij wordt ingezet op een versnelde digitalisering en verdere kwaliteitsverbetering van de aan het platform gerelateerde gegevensbronnen. In het eerste traject komt vanaf 2024 de nadruk te liggen op exploitatie, beheer en doorontwikkeling.

De realisatie van het platform en de versnelde digitalisering van de gegevensbronnen brengt significante baten met zich mee voor alle partners. De gebruikers die gegevens afhalen van het platform ondervinden duidelijk meetbare efficiëntiewinsten in termen van kost en doorlooptijd in vergelijking met de huidige situatie. De bronbeheerders en de lokale besturen in het bijzonder zullen dankzij het platform via 1 uniforme en digitale weg benaderd worden voor het verstrekken van vastgoedinlichtingen.

De totale investeringskost van het platform bedraagt 9 954 keuro . Via het relancefonds prefinanciert de Vlaamse Regering 8 590 keuro. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat prefinanciert 954 keuro. In de investeringsfase is er ook al opstart van het tweede traject rond digitalisering en kwaliteitsverbetering van gegevensbronnen voorzien waarbij focus genomen wordt op een optimalisatietraject voor het register van stedenbouwkundige inlichtingen en een referentie register voor milieu informatie. De Vlaamse regering voorziet hiervoor een bijkomende investering 410 keuro aanvullend op de prefinanciering om het register breed inzetbaar te maken voor overheden in Vlaanderen, ook buiten de scope van het vastgoedinformatieplatform.

Het bedrag van de prefinanciering (8 590 keuro vanuit de Vlaamse Regering en 964 keuro vanuit de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat wordt vanaf 2024 en binnen de 5 jaar volledig terugbetaald door de gebruikers van het platform op basis van het financieel plan opgenomen in deze nota. Een passend decretaal kader daartoe wordt tijdig voorgelegd aan het Vlaams parlement en verankert het financieringsmodel en het engagement van alle partners in dit platform.

Van de 8 590 keuro aan middelen die op deze manier tussen 2024 en 2028 terugvloeien naar de Vlaamse overheid wordt 5 900 keuro geherinvesteerd in het tweede traject om op die manier de noodzakelijke digitalisering en de gerichte kwaliteitsverbetering van de betrokken gegevensbronnen te versnellen. De resterende 2 690 keuro vloeit terug naar de algemene middelen en is het resultaat van de directe economische return van het platform.

Het voorliggend project raakt op geen enkele wijze aan de bestaande gemeentelijke retributies voor het verstrekken van vastgoedinlichtingen. Dit blijft de autonome bevoegdheid van de lokale besturen.

Doelstellingen

Het deelplatform vastgoedinformatie is de oplossing voor het vlot en efficiënt digitaal uitwisselen van alle vastgoedinlichtingen tussen overheden en vastgoedmakelaars, notarissen en burgers.

Het deelplatform vastgoedinformatie werkt de onderliggende complexiteit van de huidige manier van werken weg. Aanvragers kunnen via één kanaal en - indien gewenst - vanuit de eigen dossiertoepassingen authentieke en officiële inlichtingen digitaal opvragen en aangeboden krijgen en de verkregen

PROJECTOMSCHRIJVING

gestructureerde data rechtstreeks in dossiertoepassingen verwerken.

Ook bronhouders hebben hierbij het voordeel dat alle aanvragen via één kanaal ontvangen en beantwoord kunnen worden, waarbij reeds verstrekte inlichtingen hergebruikt kunnen worden voor toekomstige aanvragen.

Het verhogen van datakwaliteit en -interoperabiliteit bij achterliggende gegevensbronnen is een essentiële en noodzakelijke voorwaarde om aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinlichtingen naar de toekomst toe sneller te kunnen afhandelen en beantwoorden. De lange termijn ambitie van het vastgoedplatform bestaat erin om een aanvraag ten laatste "next business day" af te handelen. Om deze doelstelling op termijn binnen bereik te brengen, zijn structurele ingrepen op de onderliggende data vereist. Door in te zetten op Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) en op kwalitatieve koppelingen met de Vlaamse basisregisters (adres, gebouw) en de Vlaamse basiskaart en door gestructureerde data in te winnen in het proces waar ze ontstaan (zoals bijvoorbeeld in lokale besluiten) kunnen manuele tussenkomsten en interpretaties in de afhandeling van aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinlichtingen in de toekomst tot een minimum beperkt worden.

Door het vermijden dat dezelfde informatie meermaals wordt opgevraagd, te onderzoeken welke informatie in welk proces nodig is en het implementeren van automatische dossieropvolging zorgen we voor de verlaging van administratieve lasten en procesoptimalisatie.

De rol van de lokale overheden is in de totstandkoming van het vastgoedinformatieplatform erg belangrijk omdat zij in vele gevallen bronbeheerder zijn en daarnaast ook instaan voor de kwaliteitscontrole op informatiebronnen die een interpretatie van de lokale context behoeven.

Er is een verdere digitalisering en groeipad mogelijk waardoor de administratieve lasten in het kader van de verkoop nog verder dalen, wat zowel de bronhouders als de professionele actoren (makelaars, notarissen) ten goede komt.

Ten slotte is reeds gesteld dat het deelplatform vastgoedinformatie ook de burgers in de mogelijkheid wil brengen om nog meer inzicht en transparantie te krijgen in de gegevens die de overheid heeft over haar of zijn grond of woning. Door het deelplatform vastgoedinformatie te koppelen aan initiatieven zoals de woningpas en Mijn Burgerprofiel, brengen we de burger meer in controle over zijn gegevens.

Algemene baten

Uit de voordelen die het platform oplevert voor de Vlaamse overheid en haar partners volgen enkele algemene baten:

- * Snellere afhandeling van het volledige dossier voor de verkoop, waarbij een daling van 30% gerealiseerd kan worden door het afleveren van vastgoedinlichtingen op 1 dag.
- * Doorgedreven digitalisatie waardoor geïnteresseerde kopers van vastgoed meer zekerheid hebben over termijnen waarbinnen de verkoop kan geformaliseerd en tegenstelbaar aan derden kan worden gemaakt,
- * Sneller schakelen en aanpassingen zijn mogelijk dankzij dossierautomatisatie
- * Daling van de administratieve lasten
- * Realiseren van procesoptimalisatie
- * Aanbieden en gebruiken van gestructureerde data
- * Kosteneffectiviteit door een gezamenlijke investering
- * Het ter beschikking komen van kwalitatieve basis data i.v.m. grondgebonden gegevens die het mogelijk zal maken een aantal dienstverleningen van de overheid te optimaliseren

Te realiseren kostenbesparing in de dossierbehandeling

- * Een eerste conservatieve schatting leert dat per opvraging van vastgoedinlichtingen minstens 75 euro kan worden bespaard in de behandeling van het dossier door de gebruiker van het platform:
- * Een besparing van 25 € bij de aanvraag (30 min)

PROJECTOMSCHRIJVING

- * Een besparing van 50 € bij de verwerking (1 uur)
- * Dit komt neer op minimaal 10 miljoen euro aan kostenbesparing op jaarbasis op basis van 130.000 aanvragen.

Te realiseren kostenbesparing bij de bronhouders en lokale besturen

* Ook bij de bronbeheerder en de lokale overheden kan het platform door de gecoördineerde aanpak zorgen voor een kostenbesparing, met name door het hergebruik van informatie op het platform wat resulteert in het niet meer aanbieden van identieke aanvragen, binnen de geldigheidsduur van de verstrekte informatie. Ook de geautomatiseerde afhandeling van aanvragen inclusief facturatie zorgt voor een efficiëntiewinst. Verderop in de nota wordt dieper ingegaan op de baten voor de lokale besturen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	9.000.000 EUR
Output	Digitaal vastgoedplatform.
Outcome	Snellere aflevering dossiers: Aantal opgeleverde vastgoeddossier via het digitaal platform met 30% van de informatierubrieken binnen 1 dag; efficiënte aflevering dossiers: 75 Euro besparing x 75 Euro per dossier

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Met de realisatie van de inproductiestelling van basisversie van het platform is het project op koers. De inproductiestelling van de lokale besturen verloopt verder gefaseerd in 2022 en 2023.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart van de backend ontwikkeling zomer 2021, vanaf oktober 2021 wordt elke maand een publieke demo van de voortgang voorzien.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Oplossingsarchitectuur is opgesteld in samenwerking met de partners en gevalideerd door het bestuurscomité.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Kandidaat OSLO standaard is gevalideerd door het stuurorgaan voor ICT en informatie, public review periode is gestart.	2021 Q3	Gerealiseerd	
In productiestelling van de basisversie : er worden aanvragen op het platform gedaan, er worden gegevens van centrale bronnen	2022 Q3	Gerealiseerd	Op datum van 03-10-2022 is het vastgoed informatieplatform in productie gesteld voor notarissen en vastgoedmakelaars

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
opgehaald en aangevuld vanuit een gemeentelijk systeem. Het antwoord wordt verstuurd naar de aanvrager.			(informatieaanvragers) in 10 pilootgemeenten. De vastgoedintegratoren Geo-IT, Cevi, ORBIT-GIS en GIM hebben het vastgoedinformatieplatform geïntegreerd in hun software-oplossing.	
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	Op 9 september 2022 werd de werkaanvraag ingediend voor het opmaken van een projectvoorstel 'vastgoedintegratoren via de procedure Raamovereenkomsten Applicatiediensten van Digitaal Vlaanderen. 'De BAFO werd ingediend op 30 november 2022.	
In productiestelling van de betalende versie van het platform : De volledige functionaliteit zoals beschreven in de business case is gerealiseerd. De bronnen zijn aangesloten. De gemeentelijke systemen zijn aangesloten. Alle gemeenten beantwoorden de vraag via het platform. Alle aanvragen voor vastgoedinlichtingen verlopen via het platform.	2024 Q1	Nog niet gestart		
Het doel is om binnen het jaar na de betalende toegang – einde 2024 – reeds 30 % van de informatierubrieken binnen de dag afgehandeld te hebben. Het aandeel van de informatierubrieken die binnen de dag afgehandeld wordt, zal jaarlijks stijgen tot er maximaal 10 % van de informatierubrieken niet binnen de dag afgehandeld wordt. Dit omwille van dossiers waar geen informatie over bestaat of complexe interpretaties die terrein onderzoek vragen.	2024 Q4	Nog niet gestart		
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Vastgoedplatform 100% opgeleverd.	Alle steden en gemeenten aangesloten op het vastgoedplatform	2024 Q1		
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot) update	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.000.000 EUR
Uitvoering VEK	5.038.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 7.400.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.600.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 19 maart 2021 - ontwikkeling, uitrol en beheer en exploitatie van het Vlaams Vastgoed Informatie Platform

VV075 - VLM - MAP6 EN DATAWAREHOUSE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaamse Landmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	*Mestbankloket : landbouwers, mestvoerders, mest be-/verwerkers, kunstmesthandelaren, veevoederfabrikanten en producenten andere meststoffen *loket landinrichting : eigenaars, bewoners en gebruikers, lokale besturen, leden van projectorganen en de landcommissies

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het project MAP6 en datawarehouse bestaat uit 3 deelprojecten :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Versnellen van de aanpassingen en ontwikkeling van toepassingen voor de nieuwe processen van MAP6 Met het 6de Mestactieplan ambieert Vlaanderen een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het 6de Mestactieplan (MAP 6) bevat hierbij fundamenteel nieuwe en gewijzigde processen die op IT-vlak belangrijke investeringen vragen, noodzakelijk om de complexe regelgeving te implementeren. De VLM ondersteunt sinds jaren de sector bij de implementatie van de mestactieplannen door steeds maatwerk per bedrijf/perceel te leveren. Landbouwers, mestvoerders, en alle aanverwante bedrijven kunnen hun aangiften/aanvragen volledig digitaal afhandelen en meteen nagaan of ze in regel zijn, en/of aanpassingen noodzakelijk zijn. Een versnelde digitale implementatie van de MAP6 maatregelen bevordert de opvolging en uitvoering van deze maatregelen. Dit zal dan ook een positieve impact hebben op het milieu.2. Nieuw datawarehouse voor de Mestbank Om haar kerntaken te kunnen uitvoeren moet de Mestbank zelf op een vlotte, eenduidige manier aan zo goed als al haar gegevens kunnen. Data en dataverwerking zullen in de toekomst nog meer aan belang winnen voor dossieropvolging, het genereren van risicoanalyses voor gerichte handhaving en doorlichtingen, kwaliteitsbewaking, communicatietrajecten, De belangrijkste doelen van het datawarehouse zijn :<ul style="list-style-type: none">-een duidelijk gestructureerd datawarehouse waarbij het voor de gebruikers duidelijk is welke data ze waar kunnen terugvinden.-Opvolgbaarheid van het gebruik van de verschillende onderdelen van het datawarehouse-Integratie van andere databronnen dan de Mestbank databank-Integratie met moderne tools voor data-analyse (vb. SharePoint, Power-BI, ...)3. Loket Landinrichting De afdeling 'Landinrichting en Grondenbank' is 1 van de 3 kernafdelingen binnen de Vlaamse Landmaatschappij. De activiteit 'Landinrichting en Grondenbank' focust zich voornamelijk op het inrichten van de open ruimte in Vlaanderen zodat omwonenden en gebruikers er wel bij varen. Tijdens het uitvoeren van de processen met de hierbij horende

PROJECTOMSCHRIJVING

beschikbare instrumenten gebeurt er veel onderlinge communicatie met de belanghebbenden. Het loket landinrichting zal bestaan uit volgende 3 onderdelen :

- Een digitale brievenbus zal er voor zorgen dat alle gerichte onderlinge 'persoons- en/of bedrijfsspecifieke' communicatie digitaal aan onze externe klanten kan bezorgd worden.
- Een interactieve tool en opvolgingssysteem voor projectopvolging. Het aanbieden van een hedendaagse digitale tool voor de belanghebbenden die betrokken zijn in grote herverkavelingsprojecten (projectadministratie) zal de onderlinge communicatie optimaliseren. In deze tool zullen alle procesmatige documenten ter inzage worden gelegd én kan de belanghebbende in interactie gaan met de VLM (bezwaren en wensen toedeling). Bovendien kunnen de belanghebbenden hier het volledige proces (stand van zaken) van het project opvolgen
- Een vergoedingenloket en -databank. Het uitwerken van een vergoedingenloket en een vergoedingendatabank zal er voor zorgen dat de aanvrager van een vergoeding zijn aanvraag digitaal kan indienen (loket) en dat de betrokken VLM'ers, de leden van de landcommissies en andere Vlaamse overheidspartners efficiënt en gestructureerd kunnen werken aan vergoedingendossiers via een goed werkende backoffice (databank).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	2.450.000 EUR
Output	100% digitale aangifte van kunstmestgegevens en debietmeters aantal afgewerkte IT-projecten in het kader van MAP6 Beschikbaarheid van nieuw datawarehouse aantal digitale communicaties met de betrokkenen ivm inrichtingsprojecten aantal digitale aanvragen voor vergoedingen ikv het instrumentendecreet
Outcome	Betere waterkwaliteit door een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw Betere opvolging en uitvoering van de maatregelen opgelegd door MAP6 Maximale digitale communicatie en online projectopvolging door betrokkenen in het kader van inrichtingsprojecten Digitale loket voor aanvragen van vergoedingen en het opvolgen hiervan.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	in uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De ontwikkeling van MAP6 toepassingen loopt. TOMAS en kunstmestregister en debietmeters zijn opgeleverd. De analyse van het nieuw boetprogramma en bezwaarmodule zijn opgeleverd en klaar om te ontwikkelen. Door een tekort aan interne capaciteit verwachten we vertraging op de ontwikkeling van de bezwaarmodule. De uitrijtool is in ontwikkeling. De implementatie van de module handhaving in de TereinOpvolgingsApplicatie loopt (de module bedrijfsdoorlichting is reeds opgeleverd). De de conceptuele analyse van het nieuw datawarehouse is opgeleverd. Er is nog een voortraject nodig voor we kunnen starten met ontwikkeling. De aanbesteding voor de ontwikkeling van loket landinrichting is toegewezen en start Q1 2023.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
MAP6 :oplevering toepassingen maatregelen (TOMAS),kunstmestregister en debietmeters	2021 Q4	Gerealiseerd		
conceptuele analyse datawarehouse	2021 Q4	Gerealiseerd	Conceptuele analyse is afgerond.	
MAP6 :oplevering toepassingen terreinopvolgingsapplicatie (TOA) en staalnames (SNAPP en SMIL)	2023 Q4	Op schema	TOA : module bedrijfsdoorlichting opgeleverd. de ontwikkeling van de module handhaving is gestart. Procedure voor het inhuren van een analist SNAPP en SMIL loopt.	
MAP6 :oplevering toepassingen boetes, bezwaarmodule en uitrijtool	2023 Q4	Vertraging	Analyse van boetes en bezwaarmodule afgerond en klaar om ontwikkelen. Daar gebrek aan interne resources zal bezwaarmodule vertraging oplopen. Ontwikkeling uitrijtool loopt.	
oplevering datawarehouse	2023 Q4	Vertraging	Na de conceptuele analyse blijkt nog een intern voortraject nodig om met de ontwikkeling te kunnen starten.	
oplevering loket landinrichting	2024 Q4	Op schema	Project is toegewezen. Start van implementatie in Q1 2023.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
digitale aangifte van kunstmestgegevens en debietmeter	100%	2022 Q4		100 %
aantal afgewerkte IT-projecten in het kader van MAP6	8	2024 Q4	3	38 %
Beschikbaarheid van nieuw datawarehouse	1	2024 Q4		
Vergoedingsaanvragen verlopen digitaal na inwerkingtreding LOLA		2025 Q4		
Communicatie met belanghebbenden in inrichtingsprojecten verloopt digitaal na inwerkingtreding LOLA		2025 Q4		
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	2.450.000 EUR			
Beleidsruimte (begroot) update	2.450.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	2.450.000 EUR
Uitvoering VEK	1.081.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.450.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 5 maart 2021 Nota aan de Vlaamse Regering van 26 november 2021. Versnelde digitalisering MAP6 en ontwikkeling van een datawarehouse - Ontwikkeling Digitaal Loket Landinrichting

VV076 - ZELFBEHEERDE IDENTITEIT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Digitaal Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle Vlaamse entiteiten, lokale besturen en ondernemingen die gebruik maken van de persoonlijke gegevens alsook de personen in kwestie zelf.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	13. Digitalisering Vlaamse overheid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Vanuit het relanceplan “Vlaamse Veerkracht 2020” wordt ingezet op het versterken van het vertrouwen van de burger in de data-economie waarbij burgers zelf controle hebben over data zodat ze die vlotter en veiliger kunnen delen en zo een zelfbeheerde digitale identiteit kunnen creëren. Het relanceproject VV076 “Zelfbeheerde Identiteit” maakt deze ambitie concreet met de ontwikkeling van een sterke Vlaamse data-economie als uitgangspunt.</p> <p>Vlaamse burgers worstelen met de data paradox: ze houden enerzijds van het gebruiksgemak die datagedreven diensten hen bieden maar anderzijds is er bij veel Vlamingen weerstand door de intransparantie waarmee ‘big tech’ bedrijven omgaan met hun persoonlijke data. Door het uitbouwen van een innovatief platform voor persoonlijke datakluisen gebaseerd op de wereldwijde Solid-standaard, wordt deze paradox overbrugd.</p> <p>De persoonlijke datakluis versterkt de privacy van de burger en zal ertoe leiden dat persoonsgegevens digitaal veiliger en met een grotere transparantie en bewustzijn gedeeld kunnen worden terwijl bedrijven kunnen focussen op nieuwe businessmodellen op basis van deze data die in lijn met GDPR beschikbaar komt. Voor de Vlaamse data-economie betekent dit een belangrijke verlaging van drempels op niveau van ondermeer kosten en doorlooptijd.</p> <p>Hiermee wordt bovendien toekomstgericht ingezet op de Europese digitale identiteit, een kader dat de Europese Commissie uitwerkt om alle burgers, ingezetenen en bedrijven in de EU hun identiteit digitaal te laten bewijzen en elektronische documenten vanuit een persoonlijke datakluis te laten delen. Door gebruik te maken van het platform voor persoonlijke datakluisen kunnen Vlaamse bedrijven zich volop voorbereiden op de komst van deze nieuwe verordening.</p> <p>Een eerste toepassing van deze persoonlijke datakluisen wordt binnen dit project uitgewerkt en laat een burger toe het domicilieadres en contactgegevens in zijn persoonlijke datakluis op te laden en na toestemming ter beschikbaar te stellen aan derden. Bedrijven die van deze data gebruik willen maken, kunnen de geldigheid en juistheid ervan verifiëren. Het project bepaalt eveneens de regels en afspraken voor de deelnemers aan dit nieuwe data-ecosysteem.</p> <p>De operationele doelstellingen voor dit project zijn als volgt gedefinieerd:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluisen in een Software-as-a-Service (SAAS) aanbod, inclusief GDPR-compliant infrastructuur, hosting, licenties en servicemanagement (vanaf Q1 2022)2) Derde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis – na toestemming van de burger - een manier aanbieden waarbij die partijen de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (vanaf Q2 2022)3) Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case waarbij de burger data kan opladen in zijn

PROJECTOMSCHRIJVING

persoonlijke kluis (bv. domicilie adres, contactgegevens) en na toestemming ter beschikbaar kan stellen aan derden (Q4 2022)

4) Opschalen van het Solid ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden door middel van het aansluiten van nieuwe use cases en het hergebruik van de persoonlijke datakluisen (vanaf Q2 2022)

De ontwikkeling en het operationeel beheer van dit platform voor persoonlijke datakluisen wordt opgenomen vanuit het op te richten Vlaams Datanutsbedrijf (relanceproject VV061), verwacht in het tweede kwartaal 2022. Om deze operationele doelstellingen te realiseren werden een aantal projectonderdelen uitgewerkt.

Deze bevinden zich op verschillende niveau's. Er wordt stelselmatig toegewerkt naar het realiseren van een innovatief platform voor persoonlijke datakluisen. Als eerste stap moet er een GDPR-compliant platform ter beschikking zijn en worden de servicemanagement processen ingericht. Ondertussen lopen er business cases die met een aantal stakeholders de eerste use case definiëren. Deze zijn beschreven in het businessplan van het Vlaamse Datanutsbedrijf. Na een initiële opzet is het de bedoeling om middels implementatie van bijkomende use cases het totale aantal gebruikers tegen einde 2024 op te schalen tot 1 miljoen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.000.000 EUR
Output	Digitaal platform van persoonlijke datakluisen op basis van de SOLID specificatie
Outcome	<p>1) Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluisen in een Software-as-a-Service (SAAS) aanbod, inclusief GDPR-compliant infrastructuur, hosting, licenties en servicemanagement (vanaf Q1 2022)</p> <p>2) Derde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis – na toestemming van de burger - een manier aanbieden waarbij die partijen de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (vanaf Q2 2022)</p> <p>3) Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case waarbij de burger data kan opladen in zijn persoonlijke kluis (bv. domicilie adres, contactgegevens) en na toestemming ter beschikbaar kan stellen aan derden (Q4 2022)</p> <p>4) Opschalen van het Solid ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden door middel van het aansluiten van nieuwe use cases en het hergebruik van de persoonlijke datakluisen (vanaf Q2 2022)</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>* DNB / Citizen PODs 2.0 (Sep 2022): ESS 2.0 Saas infra (Pers Data vaults with active consent Mngt) for DNB Solid use cases</p> <p>* Citizen PODs sandboxes (Sep 2022): Sandbox environment for 1) MVP int & ext Dev teams; 2) Solid training providers; 3) DNB sales for lead conversion</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Dit project werd goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 26 november 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Ontwikkeling en exploitatie van het Vlaamse platform voor persoonlijke datakluisen in een SAAS aanbod.	2022 Q2	Gerealiseerd	DNB / Citizen PODs 2.0 (Sep 2022) ESS 2.0 Saas infra (Pers Data vaults with active consent Mngt)
Derde partijen een manier aanbieden om geldigheid en correctheid van data te kunnen verifiëren.	2022 Q2	Gerealiseerd	Een manier aanbieden waarbij 3rde partijen die gebruik willen maken van data in de persoonlijke datakluis de geldigheid en de correctheid van die data kunnen verifiëren (verifiable credential / attestation service topic). Concept & module bestaat in 'Citizen PODs Sandboxes (Sept 2022), implementatie via use cases in 2023.
Analyse, ontwikkeling en implementatie van een eerste use case.	2022 Q4	Vertraging	Implementatie via eerste use cases Solid in Q1 2023.
Opschalen ecosysteem in Vlaanderen met cofinanciering van derden.	2022 Q4	Vertraging	Opschalen na implementatie eerste use cases Solid in Q1 2023. Cofinanciering van derden met implementie FTI Vault.
RFF - Opdrachten tijdig gestart of gegund conform overheidsopdrachten	2022 Q4	Gerealiseerd	
RFF - Functionaliteiten tijdig en conform beschikbaar voor de doelgroep	2025 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	3.028.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 3.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 700.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 26 november 2021. Zelfbeheerde identiteit](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV061 - Datanutsbedrijf](#)

14. Culturele infrastructuur

VV077 - BELFORT AALST

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Renovatieproject voor het Aalsterse Belfort ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het gebouw en de uitbouw van een permanente museale werking. De totale projectkost wordt geraamd op 2 mio euro. Het Departement CJM subsidieert tot 60% van de voorziene werken met relancemiddelen, tot een maximum van 1,093 mio euro. De toekenning van de investeringssubsidie is voorzien in 2021, de opstart van het beheersplan en restauratiedossier in 2022. De uitvoering van de restauratie zal plaatsvinden in de periode 2023-2025.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.093.000 EUR
Output	Herbestemming van het Aalsterse Belfort tot publiek toegankelijk (stads)museum.
Outcome	Het Belfort wordt omgevormd tot een hedendaags (stads)museum waardoor het Belfort meer bezoekers kan ontvangen in een hedendaagse context. De focus ligt op een verhoging van het aantal bezoekers, een verbeterde aantrekkelijkheid ...

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De opdracht voor het ontwerp, de restauratie en de scenografie voor de herbestemming van Belfort Aalst werd gegund en is lopende.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding studiefase ontwerper	2021 Q4	Gerealiseerd	De opmaak voor het bestek van de ontwerpopdracht is in uitvoering en wordt in de zomer van 2022 gepubliceerd.
Gunning studiefase ontwerper	2022 Q1	Gerealiseerd	De opmaak voor het bestek van de ontwerpopdracht is in uitvoering en wordt in de zomer van 2022 gepubliceerd.
Toekenning investeringssubsidie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Gunning ontwerpbeurt scenografie	2022 Q3	Gerealiseerd	Gunning is voorzien voor eind september 2022.
Opmaak definitief ontwerp	2023 Q2	Op schema	
Opmaak beheersplan en restauratiedossier	2023 Q4	Op schema	
Aanbesteding werken (fase 1)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Aanbesteding Renovatiewerken (fase 2)	2025 Q1	Nog niet gestart	
Oplevering van het project (concrete planning onder voorbehoud).	2025 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.093.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.093.000 EUR
Uitvoering VAK	1.092.000 EUR
Uitvoering VEK	252.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.093.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VV078 - ONDERSTEUNING CULTURELE INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het project 'cultuurhuis Blankenberge' omvat de bouw van een nieuw cultuurhuis, incl. theaterzaal met een capaciteit voor 400 personen en een polyvalente zaal voor expo's en clubconcerten. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 9 miljoen euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 3 miljoen euro in kader van de relancemaatregelen.</p> <p>Het initiële projectvoorstel werd eind 2021 door de lokale overheid stopgezet. De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur heeft hierop beslist om de relancemiddelen die voor dit project ter beschikking waren gesteld opnieuw vrij te maken.</p> <p>Het vrijgekomen budget wordt aangewend voor de projecten Rosas (2,4 mio euro) en Cactus (295 keuro).</p> <p>Het project 'Rosas' omvat een nieuwbouw op de site van Rosas in Vorst. Het gebouwencomplex groeit uit tot een belangrijke dans- en podiumkunstencampus, die uniek is in Vlaanderen en Brussel en ook internationaal zeer hoog scoort als werkhuis voor hedendaagse dans. Het is een plek waar talloze artistieke activiteiten plaatsvinden en gevestigde en aankomende podiumkunstenaars elkaar ontmoeten en verrijkende samenwerkingen aangaan. In 2018 kende de Vlaamse Regering een investeringssubsidie toe aan de vzw Rosas voor uitbreiding en aanpassing van het gebouwencomplex Rosas te Vorst (Brussel). De subsidie bedroeg maximum 5.500.000 euro, waarvan 2.500.000 euro vanuit de bevoegdheid onderwijs in 2019 en 3.000.000 euro vanuit de bevoegdheid cultuur in 2018. Deze eerdere subsidie bleek onvoldoende voor de kwalitatieve uitvoering van het project, waarvoor 2.400.000 euro extra noodzakelijk is.</p> <p>Het project 'Cactus Muziekcentrum' omvat de bouw van een nieuw muziekcentrum met een volledig uitgeruste concertzaal op het Kanaaleiland in Brugge. Omwille van de grote stijging van de materiaalprijzen in de bouwsector en de lange doorlooptijd van het project is de bouwkost van het muziekcentrum (exclusief café) inmiddels gestegen naar 4.271.018,44 euro. Voor de succesvolle realisatie van dit bouwproject is een bijkomende investeringssubsidie van 295.000 euro noodzakelijk.</p> <p>De resterende beschikbare middelen werden herverdeeld naar andere investeringen in culturele infrastructuur:</p> <ul style="list-style-type: none">- VV081: bijkomend budget investeringssubsidies oproep grote culturele infrastructuur 2022: 179.013,87 euro- VV97 bijkomend budget investeringssubsidies oproep sectorale prioriteiten 2022: 125.986,13 euro

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.695.000 EUR
Output	De bouw van een nieuw cultuurhuis in Blankenberge = stopgezet. De bouw van een nieuwe infrastructuur in Vorst (Rosas). De bouw van een nieuw muziekcentrum in Brugge (Cactus).
Outcome	Het nieuwe cultuurhuis in Blankenberge wordt gebouwd om een nieuwe hedendaagse productie-en presentatieplek te realiseren waardoor culturele actoren een plek kunnen krijgen en er producties en evenementen kunnen gehost worden = stopgezet. De nieuwe infrastructuur voor Rosas wordt gebouwd om de dans- en podiumkunstencampus verder internationaal op de kaart te zetten. Door de bouw van het nieuwe muziekcentrum voor Cactus Muziekcentrum vzw kan Cactus zich verder ontwikkelen tot een professioneel centrum voor actuele muziekcultuur met een nationale uitstraling.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Na de beslissing van gemeentebestuur Blankenberge in het najaar van 2021, om het projectvoorstel voor Cultuurhuis Blankenberge niet langer uit te voeren, heeft de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur beslist om de relancemiddelen die voor dit project ter beschikking gesteld waren, opnieuw vrij te maken.</p> <p>Het vrijgekomen budget wordt aangewend voor de projecten Rosas (2,4 mio euro) en Cactus Muziekcentrum (295 keuro).</p> <p>De studieopdracht voor de nieuwbouw voor Rosas is ondertussen afgerond. De uitvoering van de werken is gegund aan een aannemer.</p> <p>De bouw van het nieuwe muziekcentrum met concertzaal voor Cactus Muziekcentrum vzw is inmiddels opgeleverd. Na realisatie van het project Kunst in Opdracht' kan de investeringssubsidie volledig uitbetaald worden.</p> <p>De resterende beschikbare middelen werden herverdeeld naar andere investeringen in culturele infrastructuur: - VV081: bijkomend budget investeringssubsidies oproep grote culturele infrastructuur 2022: 179.013,87 euro - VV97 bijkomend budget investeringssubsidies oproep sectorale prioriteiten 2022: 125.986,13 euro</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanstellen ontwerper	2021 Q4	Stopgezet	
Toekennen investeringssubsidie	2022 Q1	Stopgezet	De toekenning van de investeringssubsidie aan gemeente Blankenberge werd stopgezet, nadat beslist werd om het initiële projectvoorstel niet verder uit te voeren. Het gemeentebestuur kon geen alternatief project voorleggen dat voldoet aan de bestedingsvoorschriften inzake relancemiddelen.
Opmaak ontwerp	2022 Q4	Stopgezet	
Toekenning investeringssubsidie aan Rosas vzw en Cactus Muziekcentrum vzw	2022 Q4	Gerealiseerd	Subsidie toegekend.
Oplevering werken muziekcentrum Cactus	2022 Q4	Gerealiseerd	
Start uitvoering werken nieuwbouw Rosas	2023 Q1	Op schema	
Aanbesteding van de werken is gebeurd	2023 Q2	Stopgezet	
Oplevering uitvoering nieuwbouw Rosas	2025 Q3	Nog niet gestart	
Oplevering project	2026 Q2	Stopgezet	
Uitvoering werken is gestart	2026 Q2	Stopgezet	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.695.000 EUR
Uitvoering VAK	2.695.000 EUR
Uitvoering VEK	128.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 2.695.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 14 januari 2022 - Investeringsubsidies grote culturele infrastructuur

VR 14 januari 2022 - Toekenning investeringsubsidies culturele topinfrastructuur en cultuurinfrastructuur van bovenlokaal belang

[Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 over Plan Vlaamse Veerkracht: Culturele investeringsubsidies](#)

VR 9 december 2022 - investeringsubsidies voor culturele topinfrastructuur en cultuurinfrastructuur van bovenlokaal belang

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV081 - Grote culturele infrastructuur](#)
[VV097 - Sectorale investeringsubsidies](#)

VV079 - DESINGEL ANTWERPEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	DeSingel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Als eigen cultuurinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap wordt er in het kader van de relance de komende jaren ook extra geïnvesteerd in de verdere renovatie van deSingel. De verbindende wandelgangen bieden een mooi uitzicht op het geheel van de kunstsites en de diverse fases waarin ze gerealiseerd zijn. Wie de blik naar binnen richt, wordt echter geconfronteerd met een interieur dat na veertig jaar een grondige vernieuwing nodig heeft. Voor deSingel werd een investeringsbudget van 1,65 miljoen goedgekeurd door de Vlaamse Regering voor de renovatie van de wandelgangen en een aantal foyerruimtes. Zoals in de publieke rapportering van Vlaamse Veerkracht Relanceplan (Projectnummer: VV079) wordt meegedeeld bedraagt de raming van het project 3,7 miljoen euro met als gevolg dat het Departement Cultuur, Jeugd en Media de rest zal financieren via regulier budget. Het project heeft in de studiefase vertraging opgelopen waardoor de toewijzing/herverdeling van deze middelen niet kon gerealiseerd worden in 2022. Het departement heeft na afstemming met kabinet Cultuur beslist het relanceproject alsnog te laten doorgaan en volledig te financieren via regulier budget in 2023. Het relancebudget van 1,65 miljoen euro werd in 2022 aangewend om andere infrastructuurprojecten binnen deSingel te financieren. Als compensatie wordt in 2023 regulier budget ingezet op het relanceproject.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.650.000 EUR
Output	Via een investeringsbudget van 1,65 miljoen worden extra middelen vrijgemaakt voor deze noodzakelijk renovatie: de wandelgangen, aantal foyerruimtes en concertzalen.
Outcome	deSingel wordt opnieuw een toonaangevende hedendaagse kunstsites incl. een hedendaagse productie- en presentatieplek, waardoor het huis aan zowel gebruikers, gezelschappen als bezoekers een hedendaagse kunstervaring kan aanbieden in een grootstedelijke context. Specifiek zullen de gerenoveerde wandelgangen en foyerruimtes van deSingel de bestaande ruimtes opnieuw integraal verbinden..

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het aanbestedingsdossier is in opmaak en wordt in het voorjaar van 2023 gepubliceerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart aanbesteding studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringsbudget	2021 Q2	Gerealiseerd	
Gunning studieopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opstart studie door studie bureau	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering studie	2022 Q4	Uitgesteld	Door nieuwe inzichten is de scope van het bestek aangepast. Door deze aanpassing hebben we meer tijd nodig dan initieel voorzien.
Opstart aanbesteding renovatiewerken	2022 Q4	Uitgesteld	Het project heeft in de studiefase vertraging opgelopen waardoor de aanbesteding niet in Q4 2022, zoals initieel voorzien, kon worden opgestart.
Gunning renovatiewerken	2023 Q2	Nog niet gestart	
Opstart renovatiewerken door aannemer	2023 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering renovatie	2024 Q2	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.650.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.650.000 EUR
Uitvoering VAK	1.650.000 EUR
Uitvoering VEK	54.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.650.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV080 - GROENINGEABDIJ KORTRIJK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De site 'Groeningeabdij' te Kortrijk wordt een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingssite in Kortrijk met beeldende kunst als motor en met identiteit als centraal thema op een historisch uitzonderlijke erfgoedlocatie.</p> <p>Het wordt een hybride mix van een kunsthall, een museum en een plek voor de hele stad als bruisende ontmoetingsplaats. De studieopdracht is reeds gestart en de werken zullen opstarten in het voorjaar van 2022. Het gebouw zal in gebruik genomen worden vanaf 2024.</p> <p>De totale projectkost is 12.500.000 euro. Vanuit de relanceprovisie wordt 7.500.000 euro (60%) vrijgemaakt.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	7.500.000 EUR
Output	Door een investering van investeringssubsidie van 7.500.000 euro wordt de Groeningeabdij omgevormd tot een innovatieve tentoonstellingssite in Kortrijk
Outcome	De komst van een vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingssite in Kortrijk moet zorgen voor een bruisende ontmoetingsplaats in een hedendaagse context.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De werken zijn gegund en de sloop- en grondwerken van het project zijn gestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gunning studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Start studieopdracht	2021 Q1	Gerealiseerd	
Definitief ontwerp	2022 Q2	Gerealiseerd	Omgevingsvergunning is verleend in College Burgemeester en Schepenen 18/7/2022.
Aanbesteding werken	2022 Q2	Gerealiseerd	Opening der inschrijvingen is verschoven van 21/6 naar 30/6.
Gunning van de werken	2022 Q3	Gerealiseerd	Gunning in College Burgemeester en Schepenen 29/08/2022.
Start van de werken	2022 Q4	Gerealiseerd	De sloopwerken zijn gestart eind september 2022, bevel van aanvang ruwbouwwerken is verleend op 24/10/2021.
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2024 Q2	Nog niet gestart	Einde der werken is voorzien voor 15/06/2022.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	7.500.000 EUR
Uitvoering VEK	1.242.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

VV081 - GROTE CULTURELE INFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>In de periode 2021-2022 is er in totaal 7.000.000 euro uit de relancemiddelen beschikbaar voor het verlenen van investeringssubsidies voor grote cultuurinfrastructuur, met een werking die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer. Het doel is om meervoudig en hedendaags gebruik van performante, veilige en milieuvriendelijke culturele infrastructuur in Vlaanderen voor allerlei makers en gebruikers te stimuleren.</p> <p>In 2021 en 2022 wordt voor dit reguliere beleidsinstrument bijkomend budget vanuit de relanceprovisies voorzien zodat de uitvoering van een aantal geplande projecten kan versnellen met deze financiële ondersteuning. Na de stopzetting van het project VV078 voor het nieuwbouwproject Cultuurhuis Blankenberge werd in 2022 bijkomend 179.013,87 euro budget toegevoegd voor de goedgekeurde projecten die een aanvraag voor een investeringssubsidies grote culturele infrastructuur in 2022 ingediend hebben.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	7.179.000 EUR
Output	Via het toekennen van één of meer investeringssubsidies voor grote culturele infrastructuur wordt de grote cultuurinfrastructuur in Vlaanderen gerenoveerd en/of gerestaureerd met het oog op meervoudig en hedendaags gebruik. De precieze output is afhankelijk van ingediende projectvoorstellen die een investeringssubsidie ontvangen.
Outcome	Er wordt geïnvesteerd in performante, veilige en milieuvriendelijke culturele infrastructuur van uitzonderlijke omvang (infrastructuur die zich richt tot de Vlaamse gemeenschap en ruimer); voor alle makers en gebruikers in een hedendaagse context.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op 15 mei 2022 werden de aanvragen ingediend voor een investeringssubsidies Grote culturele infrastructuur.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De Vlaamse Regering kende op 10 oktober 2022 een investeringssubsidie toe aan A.D.V.N. vzw en muziekclub Wintercircus in Gent.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Indienen aanvragen investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Principiële beslissing en advies IF	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidies (BVR) dossiers 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Indienen aanvragen investeringssubsidies Grote Culturele Infrastructuur 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	
Aanbesteding studiefase Cultuursite Mechelen	2022 Q3	Gerealiseerd	
Aanbesteding uitvoering werken Predikherenkerk Mechelen	2022 Q3	Gerealiseerd	De aanbestedingsfase voor de uitvoering van de werken is nog lopende.
Principiële beslissing en advies IF Grote culturele infrastructuur 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidies (BVR) dossiers 2022	2022 Q4	Gerealiseerd	
start uitvoeren werken Design Museum Vleugel 1992	2022 Q4	Gerealiseerd	
Start uitvoering werken Predikherenkerk Mechelen	2022 Q4	Uitgesteld	De aanbestedingsfase voor de uitvoering van de werken is nog lopende.
Aanbesteding uitvoering werken Cultuursite Mechelen	2023 Q1	Op schema	
start uitvoering werken Wintercircus Gent	2023 Q3	Nog niet gestart	
Start uitvoering werken A.D.V.N.	2023 Q4	Nog niet gestart	
Voorlopige oplevering werken Design Museum Gent.	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering werken Predikherenkerk Mechelen	2024 Q1	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitvoering werken Cultuursite Mechelen: uitvoering 'Cultuursite fase 1'	2024 Q2	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.179.000 EUR
Uitvoering VAK	7.179.000 EUR
Uitvoering VEK	1.147.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.179.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 over Plan Vlaamse Veerkracht: Culturele investeringssubsidies

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV078 - Ondersteuning culturele infrastructuur

VV082 - HOTEL DUMONT ANTWERPEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Literatuur Vlaanderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De restauratie en de renovatie van het Hotel Dumont in Antwerpen heeft als doel het realiseren van een semi-publiek 'Huis van de Letteren', waarin zowel Literatuur Vlaanderen als Iedereen Leest hun intrek zullen nemen in het kader van een geïntegreerd letterenbeleid in Vlaanderen. Op het binnenplein zal bijkomend een nieuwbouwpaviljoen worden gerealiseerd. De werken werden ondertussen twee keer aanbesteed, maar de aanbestedingsprijzen blijken hoger te liggen dan oorspronkelijk geraamd, vandaar dat er bijkomend budget wordt gevraagd. Via de relancemaatregelen werd een bijkomende financiering van 750.000 euro toegekend om het project haalbaar te houden. Totale kostprijs van het project: 3.520.000 euro incl. BTW (reeds goedgekeurde investeringssubsidies van FoCI voor een bedrag van 950.000 euro).</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	750.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 750.000 euro wordt het renovatiebudget van Hotel Dumont als nieuwe thuishaven voor Literatuur Vlaanderen en Iedereen Leest dicht gereden. Daardoor kan het bouwproject gerealiseerd worden.
Outcome	Realisatie van een semi-publiek 'Huis van de Letteren' door de renovatie van het Hotel Dumont en de bouw van een nieuwbouwpaviljoen met literaire tuin op het binnenplein. Hierdoor ontstaat een nieuwe culturele infrastructuur die literaire activiteiten kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De uitvoering van de werf liep een kleine vertraging op. De voorlopige oplevering van de werken is uitgesteld tot 17 januari 2023.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oplevering renovatie hotel Dumont en nieuwbouw in binnengebied	2022 Q4	Uitgesteld	In principe was de oplevering van de werken gepland voor eind 2022. De uitvoering van de werfwerken liep echter een kleine vertraging op. De nieuwe vooropgestelde datum is 17 januari 2023.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	750.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	750.000 EUR
Uitvoering VAK	750.000 EUR
Uitvoering VEK	750.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 750.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

VV083 - INVENTARIS CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele en jeugdsector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.</p> <p>Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken</p> <p>De inventaris brengt de cultuur- en jeugdinfrastructuur in kaart via een omvattende databank, met een uitbreidbare set relevante gegevens. Deze informatie wordt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media aangewend om een overzicht te krijgen over de bestaande infrastructuur. Dit enerzijds voor de toetsing van toekomstige aanvragen voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur. Anderzijds voor analyse en de opmaak van een periodieke landschapstekening van de cultuur- en jeugdinfrastructuur om zicht te krijgen op lacunes, noden en dynamieken met het oog op de ontwikkeling en actualisering van beleid. De dataset wordt volgens de principes van open data door het Departement CJM publiek beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in overleg met de sectoren onderzocht welke noden en/of opportuniteiten er momenteel zijn omtrent infrastructuurgegevens (bijvoorbeeld naar gedeeld gebruik ...) en op welke manieren deze ontsloten kunnen worden.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	600.000 EUR
Output	Een omvattende databank van de cultuur- en jeugdinfrastructuur
Outcome	Toetsing van aanvraagdossiers voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur; Overzicht en data over de bestaande infrastructuur als input voor analyse en beleidsondersteuning; Tegemoet komen aan kennis- en informatienoden bij de cultuur- en jeugdsector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Tijdens Q3 2022 werkte de administratie een bestek uit dat via het ICT-raamcontract perceel 5 Applicatiediensten zou worden gegund. Tijdens Q4 2022 liep de gunningsprocedure via een mini-competitie. Twee organisaties dienden een offerte in (Cronos Public Services en DXC-Cegeka). Op 15/12/2022 besliste de administratie om het project toe te kennen aan DXC-Cegeka. Alle administratie werd ondertussen in orde gebracht zodat het project in januari 2023 van start kan gaan.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Opstart voorbereidend onderzoek inventarisatie cultuur- en jeuginfrastructuur	2021 Q2	Gerealiseerd		
Afronding voorbereidend onderzoek en bepaling van eventuele nodige tussenstappen/mijlpalen voor uitvoering	2022 Q2	Gerealiseerd	Het finale rapport werd opgeleverd op 8 april 2022.	
Lancering bestek en afronding aanbestedingsprocedure voor implementatie	2022 Q3	Gerealiseerd	De nieuw aangestelde projectleider is eind Q2 2022 van start gegaan met de opmaak van een bestek en aanbesteding voor implementatie. Dit gebeurt in samenwerking met de IT-architect die betrokken was bij het voorbereidende onderzoek.	
Start implementatie inventaris cultuur- en jeuginfrastructuur	2023 Q1	Nog niet gestart		
Oplevering 1 basis databank met set relevante parameters	2023 Q3	Nog niet gestart		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	600.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	600.000 EUR
Uitvoering VAK	600.000 EUR
Uitvoering VEK	27.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ Brexit-fonds: 0 EUR

○ React EU: 0 EUR

● Vlaamse relancemiddelen: 600.000 EUR

● Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV072 - Doelgericht digitaal transformeren](#)

VV084 - KUNST IN OPDRACHT IN DE PUBLIEKE RUIMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	kunstenaars, lokale en regionale overheden, organisaties uit diverse sectoren, burgers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Dit relanceproject gaat over het stimuleringsinstrument voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte als hefboom voor de realisatie van kunstopdrachten zowel in de stedelijke publieke ruimte als de open ruimte in Vlaanderen. Naast een geografische spreiding van de te realiseren projecten over heel Vlaanderen, is het streefdoel tevens projecten met verschillende grootteordes van budget (kleine projecten, middelgrote en grote projecten) te ondersteunen. Inhoudelijk is het uitgangspunt van het stimuleringsinstrument niet de realisatie van een kunstopdracht naar aanleiding van een specifiek bouw- of verbouwproject zoals in het decreet Kunst in Opdracht van 1 maart 2019, maar stimuleert het reglement publieke ruimte met een culturele dimensie en initieert het locatie-specifieke kunstopdrachten waarbij gemikt wordt op nieuwe creaties door hedendaagse kunstenaars met een bovenlokale uitstraling. Een brede waaier aan potentiële opdrachtgevers in Vlaanderen wordt aangespoord om cross-sectorale verbindingen aan te gaan en een subsidieaanvraag in te dienen voor een deel van de voorbereidings-, ontwikkelings- en realisatiekosten voor kunstwerken in de publieke ruimte. Andere actoren dan de aanvrager kunnen initiatiefnemer zijn maar dienen zich te verbinden met een publieke of semi-publieke partner die garant kan staan voor financiering, beschikking van de publieke plek, toelatingen, organisatie en/of professionele ondersteuning op maat opdat het werk effectief gerealiseerd kan worden. Het betreft aanvragen waarbij maximum 50% cofinanciering als principe gehanteerd wordt en het conglomeraat van partners die een project indienen en investeren in de kwaliteit van de publieke ruimte een deel van het kunstproject zelf financieren. Een multi-disciplinair expertenpanel staat voor de twee geplande oproepen (2021 - 2022) in voor selectie, advisering en beoordeling van de projecten.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.000.000 EUR
Output	De realisatie van 44 kunstopdrachten in de publieke ruimte. Deze kunstopdrachten verschillen qua artistieke verschijningsvorm, vermaterialisatie, realisatietermijn en grootteorde van budget. De realisatiedatum van de kleine projecten met een maximum van 75.000 euro ligt 1,5 jaar na selectie van de projecten. De middelgrote projecten met een realisatiebudget tussen 75.000 euro en 150.000 euro krijgen 2,5 jaar tijd voor realisatie. De grote projecten, waarvan de budgetten hoger zijn dan 150.000 euro krijgen tijd tot de

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	einde looptijd voor realisatie van de relancemiddelen. Verspreid over 2022, 2023, 2024 en 2025 zullen de verschillende projecten gerealiseerd worden.
Outcome	Met de subsidielijn van het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte wordt de realisatie van kwaliteitsvolle kunstopdrachten in de publieke ruimte beoogt die een diverse groep van opdrachtgevers uit verschillende maatschappelijke geledingen de weg biedt naar een professionele aanpak om kunstopdrachten te initiëren. Tevens wordt als resultaat beoogt dat de kunstwerken zich door hun openbaar karakter richten tot een diverse groep van burgers die gebruik maken van de publieke ruimte.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De toezegging van alle middelen via het Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte is gefinaliseerd, wat betekent dat 3 mio euro is toegewezen aan 37 projecten. In juli 2022 werd in het kader van de tweede oproep, gelanceerd in januari 2022, een bedrag van 2.049.000 euro toegewezen aan 21 positief beoordeelde projecten en bekrachtigd door de minister. In de tweede helft van 2022 werden 3 projecten gerealiseerd (de kunstopdrachten te Wintam, Piloot te Gent en voor Musica te Neerpelt).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Goedkeuring reglement stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte	2021 Q2	Gerealiseerd		
Start realisatie van de geselecteerde kunstopdrachten uit de oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd		
Toekennen subsidies oproep 2021	2021 Q4	Gerealiseerd		
Toekennen subsidies oproep 2022	2022 Q3	Gerealiseerd		
Start van de realisatie van de geselecteerde kunstopdrachten oproep 2022	2022 Q4	Gerealiseerd		
De 37 kunstopdrachten zijn gerealiseerd	2025 Q4	Op schema	5 van de 37 projecten zijn al volledig gerealiseerd.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
37 kunstopdrachten zijn gerealiseerd.	37	2025 Q4	5	14 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.490.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

VV085 - KURSAAL OOSTENDE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het Kursaal Oostende wordt grondig vernieuwd. Het concept bestaat uit een uniek, mobiel hefsysteem dat de volledige zaal kan ombouwen tot een multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.</p> <p>Dit innovatief zaalconcept kent verschillende opstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zittende opstelling (auditorium): capaciteit van 2.000 zitplaatsen; - vlakke opstelling voor staande concerten: capaciteit van 2.750 personen op parterre, incl. balkon is dat 3.150; - foyeropstelling: extra capaciteit van 1.500m² voor beurzen, galadiners, etc. <p>De werken zorgen verder voor de integrale toegankelijkheid van het gebouw en er gebeuren aanpassingen aan de scène-opening, het HVAC-systeem en de licht- en klankinstallatie.</p> <p>Het project legt de focus op ontsluiting van erfgoed en wil de link leggen met de evenementensector en het kusttoerisme.</p> <p>De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 16.670.358,89 euro excl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 9 mio euro in kader van de relancemaatregelen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	9.000.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 9.000.000 euro (maximaal 60% van de projectkost) wordt Kursaal Oostende omgevormd tot een innovatieve multifunctionele oppervlakte met vlakke en variërende opstellingen.
Outcome	Realisatie van verbouwing van grote zaal van het Kursaal Oostende tot multifunctionele zaal met grotere zaalcapaciteit waardoor een nieuwe culturele infrastructuur ontstaat op het snijvlak tussen enerzijds cultuur en anderzijds de evenementensector en kusttoerisme.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Aandacht nodig

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	EKO nv meldde dat de raming van het definitieve ontwerp hoger is dan het voorziene budget omwille van stijgende materiaalprijzen. EKO nv polste naar bijkomende financiering en bezorgde de administratie een aangepaste raming. Het is inmiddels duidelijk dat vanuit de Vlaamse overheid geen bijkomende financiering kan toegekend worden. De opmaak van het aanbestedingsdossier werd in tussentijd verdergezet maar de ambities van het project zullen aangepast worden in functie van beschikbare budgetten. Het basisidee van het ombouwen van de zaal tot een multifunctionele zaal blijft behouden binnen het project.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding studieopdracht	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning studieopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	
Finalisering definitief ontwerp door studie bureau	2022 Q2	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding werken	2022 Q4	Vertraging	Aanbestedingsdossier wordt aangepast qua ambitie in functie van beschikbare budgetten.
Gunning werken	2023 Q1	Nog niet gestart	
Uitvoering werken deel 1: engineering en productie	2023 Q2	Nog niet gestart	
Uitvoering werken deel 2: werf	2024 Q1	Nog niet gestart	
Oplevering werken	2024 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	9.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	9.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.000.000 EUR
Uitvoering VEK	88.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 9.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV086 - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Kortrijk

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>In het masterplan voor de Schouwburg worden de kleedkamers en de bureaus vernieuwd en de foyer omgebouwd tot een cultuurcafé, dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats en als co-working space. Door de nieuwe verbouwingsfase zal het gebouw voldoen aan de hedendaagse normen rond toegankelijkheid en duurzaamheid en wordt het Arenatheater uitgebreid van 120 naar 200 plaatsen met daarboven een vernieuwde dansstudio. De studieopdracht van dit project start in mei 2021, de realisatie van de werken start in 2023 en duurt tot en met 2025. De totale projectkost is €13.000.000. Vanuit de relanceprovisie wordt 7.800.000 euro (60%) vrijgemaakt.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	7.800.000 EUR
Output	Realisatie van het masterplan waarbij de schouwburg gerenoveerd en uitgebouwd wordt tot een open meervoudig bruikbaar huis dat toonaangevend is m.b.t. toegankelijkheid en duurzaamheid.
Outcome	Een hedendaagse productie- en presentatieplek waardoor het huis aan meer makers en bezoekers een plek kan bieden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het voorontwerp werd goedgekeurd en de omgevingsvergunning werd ingediend.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart studie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oplevering studie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding werken	2023 Q1	Nog niet gestart	
Gunning werken	2024 Q2	Nog niet gestart	
Opstart werken	2024 Q3	Nog niet gestart	
Oplevering werken	2026 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.800.000 EUR
Uitvoering VAK	7.800.000 EUR
Uitvoering VEK	586.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

VV087 - MATERNITEIT DE BIJLOKE - DE CREATIECLUSTER (GENT)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De voormalige 'Materniteit' op de Gentse Bijlokesite wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte om als creatiecluster ruimte te geven aan organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen. De infrastructuur zal zorgen voor de nodige kruisbestuivingen tussen de verschillende organisaties die er hun intrek nemen, waaronder Festival van Vlaanderen, Les Ballets C de la B, Muziektheater LOD, Symfonie orkest Vlaanderen en Studio Orka. Er wordt gefocust op gedeeld ruimtegebruik inzake studio's, flexwerkplekken en ruimtes voor individuele repetities.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	4.980.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 4.98 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt in de materniteit van de Gentse Bijlokesite ruimte voor een creatiecluster gerealiseerd voor organisaties uit de sectoren muziek, opera, dans, theater en alle mogelijke tussenvormen.
Outcome	Via de herbesteding en renovatie van voormalige Gentse Materniteit wordt een hernieuwde culturele infrastructuur gerealiseerd die ruimte biedt voor kruisbestuivingen en meer culturele activiteiten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het financieel plan voor dit project was onvolledig. De investeringssubsidie werd (pas) definitief toegekend door de Vlaamse Regering op 9 december 2022. Omwille hiervan lopen verschillende mijlpalen vertraging op.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding en gunning stabiliteitsonderzoek zijn gebeurd	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	De investeringssubsidie werd intussen toegekend op 9 december 2022.
Start ontwerpfase	2021 Q4	Vertraging	Vertraging aangezien financieel plan eerst onvolledig was. Omwille hiervan kon het project pas op 9/12 goedgekeurd worden door de VR. Daardoor lopen verschillende mijlpalen vertraging op.
Aanbesteding gegund aan ontwerper	2021 Q4	Vertraging	Vertraging aangezien financieel plan eerst onvolledig was. Omwille hiervan kon het project pas op 9/12 goedgekeurd worden door de VR. Daardoor lopen verschillende mijlpalen vertraging op.
Aanbestedingsdossier en omgevingsvergunning werken zijn klaar	2022 Q4	Vertraging	Vertraging aangezien financieel plan eerst onvolledig was. Omwille hiervan kon het project pas op 9/12 goedgekeurd worden door de VR. Daardoor lopen verschillende mijlpalen vertraging op.
Gunning werken	2023 Q3	Op schema	Ondanks de vertraging van de aanbesteding voor de werken, hebben de stadsdiensten dit verder voorbereid in afwachting van toekenning van de nodige financiering door de Vlaamse Regering. Hierdoor blijft de timing van aanbesteding werken voorlopig op schema.
Start uitvoering van de werken	2023 Q3	Op schema	
Voorlopige oplevering van de werken	2025 Q3	Nog niet gestart	
Definitieve oplevering	2027 Q3	Nog niet gestart	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2027 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.980.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.980.000 EUR
Uitvoering VAK	4.980.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 4.980.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 9/12/2022 betreffende de investeringssubsidies voor culturele topinfrastructuur en cultuurinfrastructuur van bovenlokaal belang](#)

VV088 - MOOOV TURNHOUT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	MOOOV vzw

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Dit project omvat de renovatie van het zalencomplex Den Bond, een presentatieplek voor kunstenaars, i.s.m. De Warande, en art house cinema. De totale projectkost is €3.200.000. Vanuit de relanceprovisie wordt 1.300.000 euro vrijgemaakt. Doel van deze investeringssubsidie is om een hedendaagse art house cinema in Turnhout te creëren voor makers, gebruikers, producties en culturele evenementen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.300.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 1.3 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een hedendaagse presentatieplek voor kunstenaars en art house cinema gecreëerd.
Outcome	Het zalencomplex Den Bond wordt omgevormd tot een hedendaagse art house cinema in Turnhout waardoor een culturele infrastructuur gecreëerd wordt die aan makers en gebruikers nieuwe kansen biedt en meer producties en culturele evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De aanbestedingsprocedure voor het toekennen van de ontwerp opdracht is opgestart. De opdrachtgever kiest voor een tweestapsprocedure waarbij in een eerste fase drie architecten worden gekozen om tegen betaling een conceptontwerp uit te werken.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekennen investeringssubsidie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Aanbesteding ontwerper	2023 Q1	Op schema	Het bestek voor de aanbesteding van het ontwerpteam is in opmaak. Er wordt gekozen voor een 2-stapsprocedure. Die wordt in januari 2023 opgestart.
gunning ontwerpteam	2023 Q2	Nog niet gestart	
Start ontwerpfase	2023 Q3	Nog niet gestart	
Definitief ontwerp + start opstellen aanbestedingsdossier werken	2023 Q4	Nog niet gestart	
Aanbesteding werken	2024 Q2	Nog niet gestart	
Gunning van de werken	2024 Q3	Nog niet gestart	
Start van de werken (obv termijn ontwerp)	2024 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering van de werken	2026 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.300.000 EUR
Uitvoering VAK	1.300.000 EUR
Uitvoering VEK	459.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VV089 - MUSEA BRUGGE NIEUWE MUSEUMSITE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Musea Brugge, onderdeel van de Stad Brugge, zal een bruisende museumsite realiseren op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge. De site zal bestaan uit een prestigieuze tentoonstellingshal, een onderzoekscentrum met museumbibliotheek en een nieuw museumpark en een gerenoveerd het Groeningemuseum. De opening van de tentoonstellingshal is voorzien in 2024, vanaf 2025 start het renovatietraject van de Groeningesite en aanliggende gebouwen. Het betreft het versnellen van een gepland investeringsproject uit het Vlaams Regeerakkoord. Vanuit de relanceprovisie wordt 27 mio euro voorzien (maximaal 60% van de totale projectkost).</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	27.253.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 27 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een museumsite gerealiseerd in het historisch centrum van Brugge via restauratie en renovatie van de bestaande gebouwen enerzijds en de aanleg van een nieuw museumpark.
Outcome	Op de site Garenmarkt in het historisch centrum van Brugge wordt een nieuwe museale museumsite gerealiseerd die plek geeft aan nieuwe makers en evenementen enerzijds en nieuwe bezoekers anderzijds.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In de zomer van 2022 zijn de afbraakwerken gestart op de site waar de nieuwe museumhal gebouwd zal worden. In het Groeningemuseum werden aanpassingen aan het HVAC-systeem uitgevoerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Begrotingsakkoord	2020 Q4	Gerealiseerd	
Aanbesteding Design en Build procedure BRUSK	2021 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Plaatsing HVAC Groeninge	2022 Q3	Gerealiseerd	
Finalisering werken deelproject Centrum voor Collectieonderzoek	2023 Q3	Op schema	Ontwerp opdracht is lopende.
Voorlopige oplevering deelproject BRUSK	2024 Q4	Nog niet gestart	
Finalisering werken verbinding BRUSK-Groeningemuseum	2024 Q4	Nog niet gestart	
Verhuis scenografie en inregelen van technieken BRUSK	2025 Q3	Nog niet gestart	
Einde sloopwerken Groeningemuseum	2025 Q4	Op schema	
Finalisering renovatiewerken Groeningemuseum en Groeningekapel	2026 Q4	Nog niet gestart	
Finalisering werken Museumpark	2026 Q4	Nog niet gestart	
Voorlopige oplevering deelproject renovatie Groeningemuseum	2027 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering Museumsite	2027 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.253.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.253.000 EUR
Uitvoering VAK	27.253.000 EUR
Uitvoering VEK	1.658.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 27.253.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV090 - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Momenteel zit SteM Sint-Niklaas verspreid over drie locaties: het SteM/Zwijgershoek, het Mercatormuseum (museumtuin) en de Salons. De komende jaren beoogt de stad de uitbouw van de site Zwijgershoek als een volwaardige museumsite en culturele hotspot. In 2022 worden de Salons overgebracht naar het gerestaureerde Huis Janssens. Tevens worden de verschillende onderdelen op de site met elkaar verbonden door de aanleg van een museumtuin. De stad wenst d.m.v. de middelen in het kader van de Relance o.a. ingrepen te doen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid, waardoor een museumsite wordt gecreëerd waar topstukken in een veel betere conditie kunnen getoond en bewaard worden. Voor het SteM zal de stad ook een Energieprestatiecontract afsluiten met een ESCO om op termijn tot een significante energiekostenbesparing te komen. De verschillende werken kennen een gefaseerd verloop, waarbij de laatste fase medio 2023 wordt voltooid.</p> <p>De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 1.923.126,77 euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 900.000 euro in kader van de relancemaatregelen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	900.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 46,8% (op de totale projectkost of 900 keuro) wordt de site Zwijgershoek tot een volwaardige museumsite omgebouwd.
Outcome	Via de realisatie van vier deelprojecten, wordt de site Zwijgershoek tot een volwaardige museumsite en culturele hotspot gevormd waardoor de site aan meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De oplevering van de toegankelijkheidswerken en installatietechnieken Huis Janssens is uitgesteld tot begin volgend jaar. De uitvoering van de verluchting van het Museumtheater van het SteM en werken deelproject

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	toegang en beveiliging Mercatormuseum zijn momenteel aan de gang. De werken klimatisatie van het Mercatormuseum zullen in januari 2023 worden gegund.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start van de toegankelijkheidswerken en installatie technieken Huis Janssens	2021 Q1	Gerealiseerd	
Start werken entresolvloer SteM	2021 Q2	Gerealiseerd	
Gunning werken EPC-dossier	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Oplevering werken entresolvloer SteM	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning studie Mercator museum klimatisatie	2021 Q4	Gerealiseerd	
Start werken EPC-dossier	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering van het definitief ontwerp Mercator museum klimatisatie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering toegankelijkheidswerken en installatie technieken Huis Janssens	2022 Q3	Uitgesteld	De afwerking van de technieken verloopt moeizaam. Er zal dit jaar niet kunnen opgeleverd worden. Begin volgend jaar wordt het gedeelte elektriciteit afgewerkt en kan er opgeleverd worden.
Start werken Mercator museum toegang en beveiliging	2022 Q3	Gerealiseerd	
Gunning werken depotinrichting Huis Janssens	2022 Q4	Uitgesteld	
Gunning werken Mercator museum klimatisatie	2022 Q4	Uitgesteld	Bestek is gepubliceerd. Opening offertes is voorzien op 13/01/2023.
Start werken depotinrichting Huis Janssens	2023 Q2	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Oplevering werken Mercator museum toegang en beveiliging	2023 Q2	Op schema	
Start werken Mercatormuseum klimatisatie	2023 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering werken EPC-dossier	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering werken Mercator museum klimatisatie	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oplevering werken depotinrichting Huis Janssens	2023 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	900.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	900.000 EUR
Uitvoering VAK	900.000 EUR
Uitvoering VEK	600.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 900.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

VV091 - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY GENT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kopergietery vzw

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Kopergietery is een organisatie voor kinderkunsten in Gent, opgericht door Eva Bal. Kopergietery is eigenaar van het gebouw waarin zich ook de theaterzaal bevindt, en huurde tot voor kort het aanpalende gebouw. Dit aanpalende gebouw werd recent aangekocht, en wil men vervangen door een nieuwbouw waardoor het huis meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten. In deze nieuwbouw zullen de volgende ruimtes worden voorzien: drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers voor de artiesten, transparante en open bureaus voor de medewerkers, een bouw-atelier en twee technische ateliers. Het betreft in totaal een oppervlakte van +- 1.400 m². De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 3.543.464 euro excl. BTW (BTW medecontractant), de Vlaamse overheid investeert hiervan 2,125 mio euro in kader van de relancemaatregelen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.125.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 2,125 mio euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt een nieuwbouw gerealiseerd met drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurtatelier, twee residentie-units, kleedkamers, open bureaus, een bouwatelier en twee technische ateliers.
Outcome	Realisatie van Kopergietery STUDIO's, uitbreiding van bestaande culturele infrastructuur met nieuwbouwproject waardoor het huis meer makers en bezoekers een plek kan bieden en meer culturele evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In het najaar van 2021 werd het ontwerpteam aangesteld. In een volgende fase wordt het bestek met programma van eisen opgemaakt voor uitvoering van de werken. Deze ontwerpfase is nog lopende.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding ontwerper	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opmaak aanbestedingsdossier	2022 Q2	Vertraging	Volgens de initiële projectplanning zou de aanbesteding in mei 2022 plaatsvinden. Momenteel is er nog geen aanbesteding ontvangen omdat er moet bekeken worden om het project te faseren i.f.v financiële noden.
Gunning en sluiting van de opdracht voor werken	2022 Q3	Vertraging	De ontwerpfase is nog lopende, de werken worden in 2023 aanbesteed.
Oplevering nieuwbouw repetitiestudio's (timing onder voorbehoud)	2024 Q2	Nog niet gestart	
Uitvoering van de werken	2024 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.125.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.125.000 EUR
Uitvoering VAK	2.125.000 EUR
Uitvoering VEK	1.091.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.125.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector.](#)
[23/04/2021](#)

VV092 - NIEUWE BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Sint-Niklaas

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De stad Sint-Niklaas wenst een nieuwe bibliotheek te realiseren. De beoogde nieuwbouw zal ook onderdak bieden aan het 'Huis van het Kind'. In het kader van dit bouwproject opteert de stad voor een Design & Build-procedure. In de aanloop van deze procedure wordt er in 2021 werk gemaakt van een projectdefinitie en een selectieleidraad. Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd dossier heeft de stad nood aan juridische en technische ondersteuning. Voor een deel van de kosten van dit voorbereidend onderzoek wenst de stad een beroep te doen op de middelen in het kader van de Relance. Tegen november-december 2022 wil de stad een ontwerper/aannemer aanstellen en in januari 2024 starten met de bouw. De hiervoor vrijgemaakte relancemiddelen bedragen ongeveer 2% van de geraamde totale projectkost (15 mio incl. BTW).</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	300.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 2% op de totale projectkost wordt een deel van de kosten van het voorbereidend onderzoek gefinancierd. Het gaat over juridische en technische luiken in de aanloop van een Design & Build-procedure.
Outcome	Het voorbereidend onderzoek zal leiden tot de realisatie van een nieuwe bibliotheek d.m.v. een Design & Build-procedure.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De stad Sint-Niklaas werkt momenteel aan een herziening van de budgetopmaak omwille van een prijsstijging in bouwmaterialen, studie bureaus etc. Daarom moet de stad de planning en timing van het project herbekijken. Het project loopt reeds een vertraging van zes maanden op. Er werd nog geen nieuwe planning ontvangen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring selectieleidraad Design & Build door gemeenteraad	2021 Q4	Gerealiseerd	
Goedkeuring gunningsleidraad Design & Build door gemeenteraad	2022 Q1	Gerealiseerd	18/2/2022 : goedkeuring gunningsleidraad (bestek) door de gemeenteraad (CBS)
Aanstelling drie ontwerpteams	2022 Q1	Gerealiseerd	01/3/2022 : na selectie van drie ontwerpteams wordt de gunningsleidraad overgemaakt aan de geselecteerde teams.
indienen conceptontwerp en offerte door de 3 gekozen ontwerpteams.	2022 Q3	Gerealiseerd	De 3 gekozen ontwerpteams legden een ontwerp voor. De budgettering ligt echter ver boven de oorspronkelijk voorziene middelen.
Gunning & contractafsluiting Design & Build	2023 Q1	Bij te sturen	Doordat de budgettering van de voorgelegde projecten ver boven de oorspronkelijke voorziene budgetten ligt, wordt door de stad Sint-Niklaas een nieuw bestek opgemaakt. Dit bestek zal in januari 2023 doorgegeven worden aan de 3 ontwerpteams. Er zal hen gevraagd worden een nieuw conceptontwerp op te maken. Hierdoor zal de planning 11 maanden opschuiven.
Definitief ontwerp	2023 Q3	Nog niet gestart	
Aanbesteding werken	2024 Q1	Nog niet gestart	
Gunning van de werken	2024 Q1	Nog niet gestart	
Start van de werken	2024 Q2	Nog niet gestart	
Einde en oplevering van de werken	2025 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	300.000 EUR
Uitvoering VAK	300.000 EUR
Uitvoering VEK	300.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021](#)

VV093 - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VLAAMS ARCHITECTUUR INSTITUUT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	VAI

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De huidige werking van het VAI zit momenteel verspreid over twee locaties (kunstencampus deSingel & depotruimte provincie Antwerpen). Met dit project wil het VAI haar functies onder één dak brengen via de herbestemming van een parochiekerk te Berchem (Antwerpen) en aan meer gebruikers en bezoekers een plek bieden om culturele activiteiten te beleven en te hosten. Het concept van deze herbestemming is een box-in-a-box depot samen met de kantoren en de publiekswerking van het VAI. Het VAI wil zo ook fungeren als ankerpunt in de wijk en zal het project in 2021 lanceren.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.800.000 EUR
Output	Een nieuwe huisvesting voor het VAI met alle functies onder één dak.
Outcome	Een nieuwe culturele infrastructuur in een toonaangevend pand nl. de parochiekerk van Berchem waardoor het huis aan meer gebruikers en bezoekers een plek kan bieden en culturele activiteiten kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De architecten en studie bureaus werken verder aan het ontwerp dat afgestemd wordt met verschillende instanties zoals stad Antwerpen, openbaar domein, bureaus, etc... In februari 2023 zal het voorontwerp voorgesteld worden aan de stuurgroep.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start studieopdracht	2022 Q2	Gerealiseerd	
Indiening subsidieaanvraag door VAI	2022 Q2	Gerealiseerd	Subsidiedossier is ingediend op 13/05. Het project wordt gecontroleerd op volledigheid en er volgt een adviesformulering.
Toekenning investeringssubsidie	2022 Q4	Gerealiseerd	Goedgekeurd door VR op 09/12/2022. BVR is ondertekend en het subsidiebedrag is vastgelegd.
Afronden uitvoeringsdossier + gunning werken	2024 Q2	Nog niet gestart	
Start uitvoeringswerken	2024 Q3	Nog niet gestart	
Oplevering project (timing onder voorbehoud)	2027 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.800.000 EUR
Uitvoering VAK	5.800.000 EUR
Uitvoering VEK	54.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Besluit van de Vlaamse Regering van 9/12/2022 betreffende de investeringssubsidies voor culturele topinfrastructuur en cultuurinfrastructuur van bovenlokaal belang

VV094 - KUNSTENWERKPLAATS 'KC GROENPLEIN' HASSELT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Hasselt

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Stad Hasselt plant de bouw van een open kunsthuis/kunstenwerkplaats in het centrum van de stad. Op het Groenplein – naast het historische stadhuis – wil de stad Hasselt het voormalig administratief centrum Groenplein verbouwen tot een hybride plek, waar spelers uit het lokale werkveld, diverse disciplines een unieke werking kunnen opbouwen binnen de functies productie, ontwikkeling en presentatie. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 8.564.547,75 euro incl. BTW, de Vlaamse overheid investeert hiervan 5,1 mio euro in kader van de relancemaatregelen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.100.000 EUR
Output	Via het verlenen van een investeringssubsidie van 5.100.000 euro (maximaal 60% van de projectkost) wordt een open kunsthuis/kunstenwerkplaats gerealiseerd. .
Outcome	Realisatie van een kunsthuis/kunstenwerkplaats waar verschillende disciplines een unieke werking kunnen opbouwen en waar meer culturele activiteiten kunnen geproduceerd, ontwikkeld en gepresenteerd worden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op 10 november werden 2 offertes ingediend die op 18 november werden toegelicht door de betreffende consortia. Beide biedingen gaan uit van het maximaal behoud van het bestaande patrimonium. In januari zal het voorstel van het consortium dat de voorkeur krijgt worden toegelicht op de gemeenteraad. Doel is om met dit consortium te onderhandelen tot een BAFO. Gunning is gepland voor maart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Vorbereiding aanbesteding DBM	2021 Q4	Gerealiseerd	
Gunning DBM	2022 Q4	Uitgesteld	De fase gunning van het DBM-project loopt in beperkte mate uit omdat de voorstelling van de projectvoorstellen door de twee consortia meer tijd in beslag heeft genomen dan aanvankelijk ingeschat. In januari zal het voorstel van het consortium dat de voorkeur krijgt worden toegelicht op de gemeenteraad. Doel is om met dit consortium te onderhandelen tot een BAFO. Gunning is gepland voor maart.
Oplevering definitief ontwerp	2023 Q2	Nog niet gestart	
Omgevingsvergunning	2023 Q4	Nog niet gestart	
Start van de werken	2024 Q1	Nog niet gestart	
Oplevering werken	2026 Q1	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.100.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.100.000 EUR
Uitvoering VAK	5.100.000 EUR
Uitvoering VEK	51.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.100.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

[Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector.](#)
[23/04/2021](#)

VV095 - PARTERRE CC DE WERF AALST

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Aalst

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De voormalige stadsbibliotheek op de parterre van CC De Werf in Aalst wordt met dit project omgevormd tot een polyvalente ruimte met een co-creatieve werking als opzet, met focus op de digitale en multimediale wereld, zowel voor creatie en presentatie van content als voor een educatief programma. Het project kadert binnen de nieuwe visie van CC De Werf en in het kader van de toekomstige programmatie zal de Werf dan ook samenwerking zoeken met andere partners binnen en buiten Aalst. De investering moet toelaten op kleinere schaal culturele voorstellingen te laten doorgaan, en biedt ruimte voor zowel kleine als grotere organisaties voor repetitie en presentatie. De Vlaamse overheid investeert 450.000 euro voor de uitvoering van dit project in het kader van de relancemaatregelen (maximaal 60% van de totale projectkost).</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	450.000 EUR
Output	Via het verlenen van de investeringssubsidie van 450.000 euro (maximaal 60% van de totale projectkost) wordt de voormalige stadsbibliotheek in Aalst omgevormd tot een polyvalente ruimte.
Outcome	De realisatie van vernieuwde parterre voor CC De Werf voor een hedendaagse co-creatie met focus op de digitale en multimediale wereld waardoor er meer plek is voor culturele productie en presentatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het raamcontract branddetectie en de werken op de verdiepingen voor brandcompartimentering liften en brandhaspels zijn uitgevoerd. De aanbesteding voor de herinrichting van de ruimtes is lopende.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Aanbesteding Studie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Gunning studie	2022 Q2	Gerealiseerd	
Aanbesteding werken	2022 Q3	Gerealiseerd	De werken in kader van brandpreventie werden opgestart in het voorjaar 2022, via het raamcontract van de Stad Aalst. Voor de overige werken wordt een aparte overheidsopdracht gepubliceerd.
Start van de werken	2022 Q4	Gerealiseerd	
Voorlopige oplevering project (timing onder voorbehoud)	2023 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	450.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	450.000 EUR
Uitvoering VAK	450.000 EUR
Uitvoering VEK	182.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 450.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

VV096 - SCHOUWBURG BOOM

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Gemeente Boom

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
Dit project omvat diverse werken in het kader van de renovatie van de schouwburg van CC De Steiger te Boom in opdracht van de gemeente. Concreet gaat het onder meer over de vernieuwing van de inkom, de renovatie van de artiestenvertrekken, de aanpassing van de laad- en loszone, het vervangen van de podiumvloer en het plaatsen van een nieuwe lichtbrug/trekken. Het doel van de investeringssubsidie is om opnieuw een hedendaagse speelplek voor culturele activiteiten te creëren. De hiervoor vrijgemaakte relancemiddelen bedragen 300K euro, de geraamde totale projectkost bedraagt 705K euro.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	300.000 EUR
Output	Via een investeringssubsidie van 300K euro wordt de schouwburg van CC De Steiger in Boom opnieuw een hedendaagse speelplek.
Outcome	De realisatie van een gerenoveerde schouwburg waardoor een hedendaagse werking mogelijk gemaakt wordt en meer culturele activiteiten gehost kunnen worden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Procedure voor de gunning ter aanstelling van het ontwerpteam is lopende.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding projectbegeleiding	2022 Q2	Gerealiseerd	
Gunning opdracht projectbegeleiding	2022 Q3	Gerealiseerd	
Opstart projectbegeleiding	2022 Q3	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding aanstellen ontwerpteam	2022 Q4	Gerealiseerd	
Gunning ontwerpteam	2023 Q1	Op schema	
Opstart aanbesteding renovatiewerken	2023 Q4	Nog niet gestart	
Gunning renovatiewerken	2024 Q2	Nog niet gestart	
Opstart renovatiewerken door aannemer	2024 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering renovatiewerken	2025 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	300.000 EUR
Uitvoering VAK	300.000 EUR
Uitvoering VEK	106.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

VV097 - SECTORALE INVESTERINGSSUBSIDIES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>In de periode 2021-2022 is er extra budget uit de relancemiddelen voor het verlenen van sectorale investeringssubsidies voor bovenlokale culturele infrastructuur. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor het automatiseren van theatertrekken, het nemen van energiezuinige maatregelen of voor het toegankelijker maken van de infrastructuur. Op die manier wil het Departement CJM de culturele infrastructuur verbeteren m.b.t. toegankelijkheid, veiligheid en energiezuinigheid. Voor 2022 worden deze middelen toegekend o.b.v. het nieuwe subsidiereglement. We verlenen € 4.100.000 extra sectorale investeringssubsidies. We voorzien € 900.000 voor personeelsondersteuning, die ook wordt ingezet voor de overige cultuurinfrastructuurprojecten uit het relanceplan.</p> <p>Na stopzetting van het project Cultuurhuis Blankenberge (VV078) werd bijkomend relancebudget toegevoegd aan de investeringssubsidies oproep sectorale prioriteiten 2022: 125.986,13 euro</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.126.000 EUR
Output	Via sectorale investeringssubsidies wordt in Vlaanderen de bestaande culturele infrastructuur verbeterd m.b.t. toegankelijkheid, veiligheid en energiezuinigheid.
Outcome	Investeren in toegankelijke, veilige en energiezuinige infrastructuur. Het ondersteunen van projecten met oog op een performante en duurzame infrastructuur die op een kwaliteitsvolle manier plaats moet bieden aan meer gebruikers en bezoekers.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De minister kende een investeringssubsidie toe aan 12 projectvoorstellen na de oproep sectorale prioriteiten voor culturele infrastructuur in 2022. Het totaalbedrag van de investeringssubsidies bedraagt

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Na stopzetting van het project Cultuurhuis Blankenberge (VV078) werd bijkomend relancebudget toegevoegd aan de investeringsubsidies oproep sectorale prioriteiten 2022: 125.986,13 euro
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanvraagperiode 2021	2022 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning sectorale investeringsubsidies ronde 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Aanvraagperiode 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringsubsidies ronde 2022 (timing onder voorbehoud i.f.v. nieuwe subsidiereglement, van kracht in 2022)	2022 Q4	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.126.000 EUR
Uitvoering VAK	5.125.000 EUR
Uitvoering VEK	787.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.126.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 over Plan Vlaamse Veerkracht: Culturele investeringsubsidies

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV078 - Ondersteuning culturele infrastructuur](#)

VV098 - VERSNELLING OPERA GENT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Stad Gent, Ballet Vlaanderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	14. Culturele infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Met de aankoop van het post-telegraafkantoor en het vredegerrecht zag Opera Ballet Vlaanderen in het kader van haar masterplan voor de Gentse Opera een unieke opportuniteit om het historisch pand niet alleen te restaureren maar ook te herdenken tot een meervoudig bruikbaar open huis. Door de omvorming van productie- naar presentatieplek kan het huis een plek bieden aan meer gezelschappen en ook meer producties en evenementen hosten. Deze 5 mio euro extra uit de relancemiddelen zorgt voor een versnelling van het dossier, waarvoor in 2021 ook 4 mio euro uit de reguliere middelen is voorzien. De financiële impact op de volgende legislatuur wordt hierdoor verkleind. De totale projectkosten bedragen 112.220.000 euro.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.000.000 EUR
Output	Een deel van de architectuurstudie voor de renovatie en restauratie van de Gentse Opera tot een open meervoudig bruikbaar huis.
Outcome	De opera wordt omgevormd tot een hedendaagse productie- en presentatieplek, waardoor het huis aan meer gezelschappen een plek kan bieden en meer producties en evenementen kan hosten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Tijdens de laatste stuurgroepvergadering signaleerde sogent een overschrijding van 24 mio euro t.o.v. het projectbudget. De timing voor de aankoop van het postkantoor blijft ook onduidelijk.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart studie	2021 Q2	Gerealiseerd	
Oplevering studie	2023 Q1	Op schema	
Aanbesteding uitvoering	2023 Q2	Nog niet gestart	
Gunning uitvoering	2024 Q1	Nog niet gestart	
Uitvoering van de werken	2024 Q2	Nog niet gestart	
Oplevering renovatie	2030 Q4	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.536.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: 100 miljoen euro voor versnellen infrastructuurinvesteringen Vlaamse cultuursector. 23/04/2021

15. Investerings onroerend erfgoed

VV099 - INVESTERINGEN IN DE ONTWIKKELING EN PROMOTIE VAN ONROEREND ERFGOED

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Agentschap Onroerend Erfgoed
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	- alle categorieën 'premiënemers' (initiatiefnemers van erfgoedontwikkelingsprojecten), zowel privé als publiek, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen; - de erfgoedsector (inclusief specialisten, erfgoedverenigingen ...); - de toeristische sector; - de gebruikers van erfgoed.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	15. Investerings onroerend erfgoed
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het investeren van relancemiddelen in Onroerend Erfgoed onderstreept het economisch belang van het beleidsdomein. Het wordt algemeen erkend dat de restauratiesector een bijzonder arbeidsintensieve en gespecialiseerde sector is, het gaat dan om die sectoren die 'hands on' aan het onroerend erfgoed werken zoals restaurateurs, aannemers of archeologen. Ook vormt erfgoed een belangrijke drager van toerisme, onroerend erfgoed is een van de belangrijkste motivatoren om plaatsen te bezoeken, te beleven en te ervaren.</p> <p>In het kader van 'relance' zal in het beleidsveld onroerend erfgoed worden geïnvesteerd in:</p> <p>(1) een reeks gerichte projecten uit de wachtlijst voor erfgoed- en restauratiepremies. Hiervoor zijn in 3 beslissingsrondes 53,225 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd: 32 miljoen euro is toegezegd op 2 april 2021 (cf. de toenmalige nota aan de Vlaamse Regering), op 3 december 2021 volgde een bijkomende toezegging van 14 miljoen euro (cf. nota aan de Vlaamse Regering op die datum) en op 28 oktober 2022 (cf. nota aan de Vlaamse Regering op die datum) volgde 7,225 miljoen. De middelen worden besteed onder de vorm van restauratie- en erfgoedpremies volgens de onroerendoerfgoedregelgeving. Deze premies bedragen een bepaald percentage van de projectinvesteringen, 40 tot 90% naargelang het soort project en het soort premienemer. De rest is als eigen aandeel door de premienemer op te leggen. De premie is aan strikte uitvoeringsvoorwaarden en -termijnen gebonden. Kandidaat-dossiers worden administratief gekeurd en mits ontvankelijk opgenomen in een wachtlijst. Begin 2021 omvatte deze wachtlijst 561 dossiers voor een totaal premiebedrag van 304.468.767,32 euro aan aangevraagde premies. Het betreft uitvoeringsklare dossiers met focus op de restauratie van beschermd erfgoed. Uitvoering mag pas van start gaan zodra de premie is toegekend. Dit gebeurt bij jaarlijkse programmatierondes, waarvoor in principe reguliere middelen worden gebruikt. Pro memorie: het jaarlijkse reguliere budget voor alle soorten erfgoedpremies schommelt rond de 80 miljoen euro. De 53,225 miljoen aan relancemiddelen gereserveerd voor de 'wachtlijst' zal worden besteed aan een gerichte selectie van dossiers uit de wachtlijst, met name projecten die:</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

- bijdragen aan ruimtelijke en regionale ontwikkeling: projecten die vanuit de beoogde functie of finaliteit bijdragen tot een ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Dit gaat zowel om projecten met een sociale finaliteit (welzijn en schoolgebouwen) als projecten met een meer culturele finaliteit (musea, toeristische ontsluiting), maar ook projecten die bijdragen tot ontwikkeling van de omgeving (bv stedelijke parken, cfr link met vrijetijdsbesteding in Covid-crisis);
- bijdragen aan de groene transitie omdat ze inzetten op een duurzaam hergebruik (herbestemming) van erfgoedsites;
- bijdragen aan de ondersteuning van KMO's: projecten met een directe impact op werkgelegenheid voor kleinere en middelgrote bedrijven. Het gaat hier zowel om kleine bedrijven in de restauratiesector, zoals orgelrestaurateurs, molenbouwers, glas-in-loodateliers of interieurrestaurateurs. Het gaat dan om kleinschalige projecten die werkgelegenheid voorzien voor kleinere bedrijven in onze sector die meer geleden hebben onder de Covid-crisis en dreigen te verdwijnen bij gebrek aan werkgelegenheid. Daarnaast vallen onder deze categorie ook projecten die geïnitieerd worden door andere KMO's: handelspanden die gevestigd zijn in beschermde panden die een premie aanvragen voor de restauratie van dit pand;
- bijdragen aan de groene transitie: projecten die inzetten op verbetering van energieprestaties, zoals de vernieuwing van technische installaties in beschermde gebouwen.

Dossiers die niet aan deze criteria voldoen worden met reguliere middelen gehonoreerd bij toekomstige programmaties.

(2) Enkele gerichte oproepen voor erfgoedpremies in toepassing van de vernieuwde erfgoedpremiëprocedure. Er zal worden ingezet op volgende thema's: economische herinvulling van erfgoed, her- en nevenbestemming van kerken, erfgoed en wonen, erfgoed en toerisme. Voor deze oproepen wordt een totaal van 15 miljoen euro aan relancemiddelen gereserveerd (cf. mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021), aangevuld met telkens 5 miljoen euro aan reguliere middelen vanwege Toerisme en Wonen voor de desbetreffende oproepen. Via oproepen worden kandidaat-premienemers uitgenodigd te kandideren voor een erfgoedpremie. De oproepen monden dus uit in erfgoedpremies en dekken dus een bepaald percentage van de investeringen (cf. supra).

(3) Enkele voorbeeldprojecten:

- een investering van 10 miljoen euro in de cascorestauratie van het kasteel van Heers (cf. bovenvermelde nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021). De kasteelsite, sinds het voorjaar van 2021 eigendom van de Vlaamse overheid, wordt een erfgoedlabo waarin partners, zowel van overheid als particulier, samen de toekomst van de site veilig stellen. Het toepassen van nieuwe technieken in conservering, restauratie, exploitatie, programmering en communicatie zal van Heers een voorbeeldsite maken over omgang met landgoederen in de 21ste eeuw. Daarin komt naast de historische betekenis, ook de economische en sociale meerwaarde voor de directe omgeving in het centrum van de ontwikkeling te staan. Het klassieke functie- en herbestemmingsdenken wordt verrijkt met een open aanpak die met de aanwezige erfgoedwaarden aan de slag gaat. Een mix aan verdienmodellen kan er getest en geborgd worden. In een eerste fase worden alle kennispartners rond de tafel gebracht, om zo effectief mogelijk de kansen van de site te verbinden aan externe expertise (van kennis rond restauratietechnieken, over gemeenschapsvorming, tot natuurbeheer en beleving inclusief duurzaam toerisme). Belangrijke delen van het kasteel krijgen een casco-restauratie zodat herbestemming en invulling op korte termijn mogelijk is. De uiteindelijke projectkost zal worden bepaald door de keuzes die in de loop van het toekomsttraject worden gemaakt;

- een investering van 10 miljoen in het project Thermae Palace, Oostende (cf. bovenvermelde nota aan de Vlaamse Regering van 3 december 2021). Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de 10 miljoen euro louter te besteden aan de restauratie van Thermae Palace en de Koninklijke gaanderijen. Een ruimere omgevingsaanpak door de stad Oostende staat los van de financiële bijdrage vanuit Onroerend Erfgoed. De totaalrestauratie en herbestemming van Thermae Palace is een bijzonder grootschalig en complex gegeven (gaanderijen en hotel). De geplande toekenning van 10 miljoen euro dient gezien te worden als een eerste injectie (maar vanuit Onroerend Erfgoed tevens de definitieve) om de meest dringende werken aan te pakken. Aanvullend nog premies aanvragen wordt uitgesloten. De huidige restauratieve werken en de herbestemming van het hotel wordt geraamd op minimum 70 miljoen euro. Voor de restauratie van de gaanderijen is ca. 12 miljoen euro nodig. Indien het huidige consortium niet tot een economisch

PROJECTOMSCHRIJVING

haalbare én uitvoerbare piste komt, creëert de uitvoering van de meest dringende werken mogelijk extra ruimte om een nieuw verhaal te schrijven, enerzijds qua tijdsdimensie, anderzijds qua stakeholders en participanten, waarbij mogelijks wel een integrale herbestemming mogelijk en haalbaar is. De relancemiddelen kunnen zorgen voor dit verhoogd katalysator-effect. Van zodra het restauratiedossier voor de meest dringende werken volledig is, kan het subsidiedossier gelanceerd worden. Gelet op de decretale basis die nog moet voorzien worden via de begrotingsaanpassing 2022, zal de toekenning pas mogelijk zijn vanaf juli 2022.

- een investering van 4 miljoen euro in de actualisatie van de GGA-kaart (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022). De GGA-kaart (Gebied Geen Archeologie) is een instrument ontwikkeld door het agentschap Onroerend Erfgoed en identificeert zones waarvoor bij het aanvragen van een omgevingsvergunning geen archeologisch traject moet worden doorlopen. De GGA-kaart is met andere woorden een belangrijk hulpinstrument voor ontwikkelaars, en het maximaal up to date houden ervan is dan ook een belangrijke beleidsdoelstelling. Hierdoor kunnen immers onnodige archeologische vooronderzoeken en dus kosten vermeden worden. De Relance-investeringen zullen worden gespendeerd aan een grootschalige actualisatie, enerzijds onder de vorm van GGA-kaarten op gemeentelijke schaal, anderzijds door integratie van gegevens uit de OVAM-databanken;

- een investering van 5 miljoen euro in de restauratie van erfgoed in het polderdorp Doel (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022). Uit het voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering voor het complex project extra containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen (CP ECA), definitief goedgekeurd op 31 januari 2020, vloeit voort dat het polderdorp Doel niet hoeft te verdwijnen voor de aanleg van een nieuw containergetijdendok. Het departement MOW startte daarom een externe studie op om een toekomstperspectief voor Doel uit te werken, in overleg met een begeleidingsgroep van Vlaamse en lokale stakeholders. Er is ook een politieke task force voor Doel opgericht. Op voorwaarde dat het overleg met de betrokken actoren resulteert in een akkoord is de Vlaamse Regering bereid tot inspanningen in onder meer zichtbare realisaties die het polderdorp Doel weer (be)leefbaar moeten maken. Dat betekent ook duurzame investeringen in werken aan het Doels erfgoed (o.m. het Hooghuis);

- een investering van 5 miljoen euro in de herbestemming van de droogdrokkensite in Antwerpen tot maritieme belevingssite (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022). De site van de stadsdroogdokken is sinds 2001 beschermd als monument (droogdokken en oude pomphuis). Het terrein was tot januari 2018 in gebruik door het Havenbedrijf, daarna werd de stad Antwerpen eigenaar. In 2016-2017 werd een doorgedreven historisch onderzoek uitgevoerd voor de herontwikkeling van de site tot maritiem museum. Deze piste werd in 2019 echter verlaten. Nu ligt de ontwikkeling tot maritieme belevingssite op tafel. Gelet op de belangrijke maatschappelijke meerwaarde van dit dossier, wil de Vlaamse Regering investeren in het restauratieve luik om het ontwikkelingsproces in beweging te brengen;

- een investering van 800.000 euro in de restauratie van de materniteit op de Bijlokesite Gent (cf. nota aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022). De Gentse Bijlokesite, een voormalig hospitaalcomplex, is grotendeels herbestemd tot culturele cluster. Hier zijn heel wat culturele organisaties gehuisvest die budgettair en organisatorisch samenwerken met de stad Gent. De stad wil deze culturele kaart verder uitspelen en hiertoe het ruimtegebruik op de site verbeteren. Daarvoor is in 2019 een masterplan opgemaakt. De materniteit is één van de gebouwen die in dit plan worden aangepakt. Het gebouw krijgt een hoognodige restauratie en wordt ruimtelijk geoptimaliseerd. Gelet op de belangrijke maatschappelijke meerwaarde van dit dossier, wil de Vlaamse Regering 800.000 euro investeren in de restauratie van het exterieur (bedaking en dakspant, de gevels en het buitenschrijnwerk) en het oplossen van de stabiliteitsproblematiek;

- een investering van 4,025 miljoen euro in de ontwikkeling van Herita tot Vlaamse National Trust (cf; nota aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022). De Vlaamse regering treft momenteel de voorbereidingen om Herita te laten doorgroeien tot Vlaamse National Trust, met een meer uitgebreide en beter beheerde erfgoedportefeuille. Om de doorstart te stroomlijnen wil Herita alvast de exploitatie van de huidige portefeuille op punt stellen, om zo meer netto opbrengsten te genereren. De Vlaamse regering is bereid hierin Relancemiddelen te investeren, omdat een groter en beter functionerend Herita ook een aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde betekent. De Vlaamse Regering zal

PROJECTOMSCHRIJVING

investering in verschillende deelprojecten: enerzijds is een extra injectie voorzien voor de restauratie van het kasteel van Horst, één van de laatste grote werven die de huidige Herita-portefeuille als voorwerp hebben, anderzijds worden middelen geïnvesteerd in diverse vormen van ontsluiting.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	100.000.000 EUR
Output	De onder (1) en (2) vermelde investeringen gebeuren onder vorm van restauratie- en erfgoedpremies en leiden dus tot een aantal premies die in eerste instantie worden vastgelegd, en naargelang de uitvoering volgt effectief uitbetaald. Er is een voorschottenregeling. Over het precieze aantal premies wordt gericht gerapporteerd (dit hangt af van het selectieproces en de omvang van dossiers). De onder (3) vermelde investeringen zullen gebeuren onder de vorm van gerichte subsidies, zodra hiervoor dossiers beschikbaar zijn.
Outcome	<ul style="list-style-type: none">- Elke premie en subsidie staat voor een erfgoedontwikkelingsproject, met focus op restauratie. Uitvoering leidt tot geresatureerde en herbestemde erfgoedlocaties. Projecten worden in het kader van relance geselecteerd in functie van de maatschappelijke meerwaarde die ze genereren, bovenop het restaureren (zie hoger). Projecten gaan pas effectief van start na het toekennen van de premies, maar in functie van relance gelden strakke uitvoeringstermijnen (2025).- Ook de projecten 'kasteel van Heers' en 'Thermae Palace' zijn in wezen erfgoedontwikkelingsprojecten met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Het proces is echter even belangrijk als het eindresultaat.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>In de tweede helft van 2022 zijn een groot aantal beslissende stappen gezet in de besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen Relancemiddelen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Op 28 oktober keurde de Vlaamse Regering de laatste selectie aan projecten goed. Er is geopteerd voor investeringen in 3 bijkomende voorbeeldprojecten: de ontwikkeling van de Antwerpse droogdokken tot Martieme Belevingsite (5 miljoen euro voor de restauratie van Onroerend Erfgoed), de restauratie van de voormalige materniteit op de Gentse Bijloke (800.000 euro) en een ondersteuning van de erfgoedorganisatie Herita (4,025 miljoen euro, enerzijds bijkomende injectie in het restauratieproject 'Horst', anderzijds investeringen in de doorgroei van de organisatie tot Vlaamse National Trust). De overblijvende 7,225 miljoen euro aan middelen mocht worden besteed aan een laatste gerichte selectie van dossiers uit de wachtlijst voor restauratie- en erfgoedpremies ;- Op 2 december 2022 keurde de Vlaamse Regering de toekenningsbesluiten (BVR) goed voor de subsidies aan de projecten 'Kasteel Heers', 'Thermae Palace', 'Droogdokken', 'Materniteit';- Op 9 december 2022 keurde de Vlaamse Regering de toekenningsbesluiten (BVR) goed voor de twee hogervermelde subsidies aan Herita;- Op 9 en 16 december 2022 keurde de Vlaamse Regering de toekenningsbesluiten (BVR) goed voor subsidies in het kader van het project Doel. Er wordt enerzijds geïnvesteerd in de opmaak van Onroerenderfgoedrichtplan voor de Linkerscheldeoever, dat een breed kader moet bieden voor de toekomst van het lokale erfgoed. Anderzijds wordt geïnvesteerd in de restauratie van het Hooghuis en het Hof ter Walle. Tot slot is een kleiner budget gereserveerd (buiten BVR) voor diverse deelprojecten met het oog op de conservatie en voorbereiding van de museale ontsluiting van de Doelse kogge, een middeleeuws schip dat in 2000 is ontdekt bij het uitgraven van het Deurganckdok, en in Doel zal worden tentoongesteld (resultaten zouden al in 2023 zichtbaar moeten zijn);

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<ul style="list-style-type: none"> - De procedures voor de oproepen voor erfgoedpremies in het teken van Relance zijn afgerond. Er werden premies toegekend voor 18 dossiers (MB), goed voor een totaal premiebedrag van 13.131.006,51 euro; - De derde gerichte selectie van dossiers uit de wachtlijst van restauratie- en erfgoedpremies is afgerond. Er werden premies toegekend voor 10 dossiers (MB), goed voor een totaal van 7,663 miljoen euro; - Eind december zijn de subsidies toegekend voor de uitbreiding van de GGA-kaart. Het betreft enerzijds een subsidie van 4.832.256 euro (MB) voor het vlakdekkend aanvullen en updaten van de GGA-kaart per gemeente, waarvan 3.801.374,67 euro Relancemiddelen betreffen, en 1.030.881,33 euro eigen kredieten van het beleidsveld Onroerend Erfgoed. Anderzijds is er een beperkte subsidie van 169.291,1 euro toegekend voor het OVAM-luik van de opdracht.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremies uit de bestaande wachtlijst	2021 Q2	Gerealiseerd	
Tweede gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremies uit de wachtlijst	2021 Q4	Gerealiseerd	
Derde gerichte programmatie van restauratie- en erfgoedpremiedossiers uit de wachtlijst	2022 Q4	Gerealiseerd	
Aanbesteding/gunning van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremiedossiers en eventueel uitbetaling eerste voorschotten	2023 Q4	Op schema	
Uitvoering van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremiedossiers (start werken, opvolging voortgang ...)	2025 Q4	Op schema	
Oplevering van de 'geprogrammeerde' restauratie- en erfgoedpremiedossiers (einde werken, realisatie project, uitbetaling saldo)	2025 Q4	Nog niet gestart	
Oproepen voor erfgoedpremies in het kader van relance zijn gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Procedure oproepen voor erfgoedpremies, 1ste fase: ontvangen kandidaat-dossiers, jurering en preselectie	2022 Q2	Gerealiseerd	
Procedure oproepen voor erfgoedpremies, 2de fase: ontvangen en beoordelen 'definitieve dossiers', definitieve selectie en toekennen van premies	2022 Q4	Gerealiseerd	
Oproepen erfgoedpremies: uitvoering van de geselecteerde premiedossiers (aanbesteding/gunning, uitbetaling voorschotten, start werken)	2025 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Het toekomsttraject voor het kasteel van Heers is opgestart	2021 Q3	Gerealiseerd	
Goedkeuring subsidiedossier Heers en vastlegging subsidie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Oplevering project Heers (realisatie project, uitbetaling saldo)	2025 Q4	Nog niet gestart	
Uitvoering project Heers (aanbesteding/gunning, uitbetaling voorschotten, start werken)	2025 Q4	Nog niet gestart	
De actualisatie van de GGA-kaart is uitbesteed	2022 Q4	Op schema	
De actualisatie van de GGA-kaart is uitgevoerd	2025 Q4	Nog niet gestart	
Goedkeuring subsidiedossier Thermae Palace en vastlegging subsidie	2022 Q4	Gerealiseerd	
Oplevering project Thermae Palace (realisatie project, uitbetaling saldo)	2025 Q4	Nog niet gestart	
Uitvoering project Thermae Palace (aanbesteding/gunning, uitbetaling voorschotten, start werken)	2025 Q4	Nog niet gestart	
De subsidie voor het project 'droogdokken Antwerpen' is toegekend	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering project 'Droogdrokken'	2025 Q4	Op schema	
De subsidie voor het project 'Materniteit Bijloke Gent' is toegekend	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering project 'Materniteit Bijloke'.	2025 Q4	Op schema	
De subsidie voor het restauratieproject 'Horst' (Herita) is toegekend	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering restauratie Horst	2025 Q4	Op schema	
De subsidie voor het project 'doorgroei Herita tot Vlaamse National Trust' is toegekend	2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering projecten 'doorgroei Herita tot Vlaamse National Trust'	2025 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring subsidiedossier 'Opmaak Onroerenderfgoedrichtplan door de Linkerscheldeover' (Doel) en vastlegging subsidie		2022 Q4	Gerealiseerd	
Opmaak onroerenderfgoedrichtplan 'Linkerscheldeover' (Doel)		2025 Q4	Nog niet gestart	
Goedkeuring subsidiedossier 'Restauratie Hof Ter Walle' (Doel) en vastlegging subsidie		2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering restauratie Hof ter Walle (Doel)		2025 Q4	Nog niet gestart	
Goedkeuring subsidiedossier 'Restauratie Hooghuis' (Doel) en vastlegging subsidie		2022 Q4	Gerealiseerd	
Uitvoering restauratie Hooghuis (Doel)		2025 Q4	Op schema	
Toekenning subsidie voor projecten gerelateerd aan de conservatie en ontsluiting van de Doelse kogge en uitvoering projecten		2025 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal toegekende subsidies aan ad hoc restauratieprojecten (kasteel Heers, Thermae Palace Oostende, Droogdokken Antwerpen, Materniteit Bijloke Gent, kasteel Horst, Hooghuis Doel, Hof ter Walle Doel)	7	2022 Q4	7	100 %
Aantal toegekende restauratie- en erfgoedpremies in het kader van relance	126	2022 Q4	126	100 %
Aantal toegekende subsidies voor niet-restauratieve projecten (GGA-kaart, erfgoedrichtplan Linkerscheldeover, doorgroei Herita tot Vlaamse National Trust)	4	2022 Q4	4	100 %
Aantal uitgevoerde niet-restauratieve erfgoedprojecten	4	2025 Q4		
Aantal uitgevoerde erfgoedprojecten (restauratie- en erfgoedpremiédossiers, ad hoc restauratieprojecten)	133	2025 Q4		
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	100.000.000 EUR			
Beleidsruimte (begroot) update	100.000.000 EUR			
Uitvoering VAK	99.662.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	4.508.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 100.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen - nota</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance</p> <p>Advies van de Raad van State. Over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022. Besteding van de aan het beleidsveld Onroerend Erfgoed toegewezen middelen in het kader van het Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'</p> <p>VR 25 februari 2022 - Kasteeldomein van Heers (akte tot vestiging van een erfpachtrecht en akte overeenkomst uitvoeren herstelmaatregelen)</p> <p>VR 11 maart 2022 - Investerings in de ontwikkeling en promotie van onroerend erfgoed</p> <p>VR 28 oktober 2022 - Investerings onroerend erfgoed</p> <p>VR 2 december 2022 - Subsidie restauratie kasteeldomein Heers</p> <p>VR 2 december 2022 - Subsidie restauratiewerken Thermae Palace en Koninklijke Gaanderijen in Oostende</p> <p>VR 2 december 2022 - Subsidie voor restauratiewerken aan de voormalige materniteit op de Bijlokehospitaalsite in Gent</p> <p>VR 2 december 2022 - Subsidie restauratiewerken Droogdokkensite Antwerpen</p> <p>VR 9 december 2022 - Subsidie Herita vzw voor restauratieve werken aan het kasteel van Horst</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 9 december 2022 - Subsidie Herita vzw voor haar rol als National Trust van Vlaanderen

VR 9 december 2022 - Subsidie opmaak onroenderfgoedrichtplan polders Linkerschelde-oever

VR 16 december 2022 - 1,46 miljoen euro subsidie voor restauratie van het Hooghuis in Doel

VR 16 december 2022 - Subsidie Herita vzw voor restauratie Hof ter Walle in Beveren

16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening

VV100 - ACHTERSTAND BIJ SUBSIDIES TEGEN LEEGSTAND VERMINDEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Omgeving
Belanghebbenden	Aanvragers van de subsidie zoals decretaal bepaald.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het hoofddoel van de Vlaamse subsidie-instrumenten ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is het tegengaan van één van de belangrijkste ruimtelijke problemen die zich reeds jarenlang voordoen, namelijk het stedelijk verval. Dat komt tot uiting in twee fundamentele ontwikkelingen: enerzijds de uitholling en anderzijds het uitdijen van de stad. Bij het fenomeen uitholling wordt men onder meer geconfronteerd met een verlies aan bedrijven, wat een duidelijke ruimtelijke impact heeft op het stedelijk weefsel. Wanneer bedrijven hun activiteit om economische redenen stopzetten of omwille van uitbreidingsproblemen of milieuhygiënische redenen naar nieuwe locaties moeten verhuizen, worden de oude bedrijfsruimten achtergelaten. Naargelang het type van gebouw, de al dan niet resterende bedrijfsinfrastructuur en de aantrekkelijkheid van de onmiddellijke omgeving, wordt door het marktmechanisme bepaald hoe snel deze gebouwen opnieuw in gebruik worden genomen. Leegstaande bedrijfsruimten die niet onmiddellijk worden heropgenomen in het marktaanbod leiden uiteindelijk tot verwaarlozing en verkrotting. Dergelijke panden oefenen bovendien een negatieve invloed uit op de omgeving. Daardoor dreigen de aanpalende buurten of wijken eveneens in een verkrottingsspiraal terecht te komen. Zulke bedrijfsruimten moeten dan ook beschouwd worden als probleemgebieden, zowel vanuit economisch standpunt, als vanuit het streven naar een kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving. Als men deze trend wil tegengaan, moet men / vertrekken van een ruimtelijke ordening die uitgaat van de principes van een duurzame ontwikkeling, waarbij het beheer van de ruimte centraal staat. In stedelijke gebieden betekent dit in de eerste plaats een meer efficiënte organisatie en beheer van de ingenomen ruimte. De leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten nemen in deze stedelijke gebieden immers ruimte in beslag die in principe, via inbreidingsprojecten, een nieuwe aangepaste bestemming kan krijgen. Een efficiënter beheer van de reeds ingenomen ruimte zal bovendien een verder ongecoördineerd aansnijden en versnipperen van de open ruimte helpen vermijden.</p> <p>De Vlaamse regering zit via het relancebeleid in op een inhaalbeweging op het vlak van de subsidiëring van openbare en private initiatieven om de sanering van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten te versnellen. Hiervoor wordt een extra budget van 15 miljoen euro voorzien via dit project.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	14.135.000 EUR
Output	Aantal toegekende saneringssubsidies leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten
Outcome	Aantal dossiers waarvan de saneringswerken werden gestart

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De subsidieaanvragen werden goedgekeurd bij MB door de minister. Uitbetaling van de subsidies nog lopende (gebeurt in fasen)
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
14 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie voor de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	2021 Q3	Gerealiseerd		
20 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie van de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	2021 Q4	Gerealiseerd		
31 door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie van de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.	2022 Q3	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal door de minister bij MB goedgekeurde aanvragen voor subsidie van de saneringswerkzaamheden ingediend bij het departement Omgeving.		2022 Q4	31	100 %
Aantal opgestarte saneringsprojecten	100% - Maximale benutting van het beschikbare budget.	2022 Q4	5	25 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	14.135.000 EUR
Uitvoering VAK	14.127.000 EUR
Uitvoering VEK	4.381.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 14.135.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 12 maart 2021. Achterstand bij subsidies tegen leegstand verminderen](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Update van de relancemiddelen die worden voorzien voor het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht](#)

VV101 - INHAALBEWEGING VERNIEUWING BEDRIJVENTERREINEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We blijven investeren in kwalitatieve ruimte om te ondernemen. We versnellen de transformatie van bestaande, verouderde bedrijventerreinen naar moderne en duurzame terreinen van de 21e eeuw. Bijzondere aandacht gaat naar meer ruimte voor groene en blauwe corridors, benutting van het potentieel van warmtenetten en zonne-energie, de verbetering van waterhuishouding, en aangepaste weginfrastructuur met meer ruimte voor veilig fietsen zodat ook meer werknemers met de fiets naar het werk kunnen komen.</p> <p>Voor de aanwending van de relancemiddelen zoeken we naar in te richten terreinen waar er zich knelpunten voordoen waardoor de realisatie geblokkeerd is of vertraagd wordt.</p> <p>Stand van zaken op datum 31/12/2021: drie dossiers goedgekeurd door de VR voor een totaalbedrag van 4.761.529 euro.</p> <p>1) Dossier Tybersite te Menen</p> <p>De realisatie van het brownfieldconvenant Menen Tybersite is afhankelijk van het omvormen van de rotonde N58xN8 tot een lichtengeregeld kruispunt. Deze omvorming van het kruispunt is conform het RUP Tybersite een voorwaarde voor de volledige realisatie van het brownfieldproject. Ook de realisatie van het regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik is afhankelijk van het omvormen van de rotonde N58xN8 tot een lichtengeregeld kruispunt, eveneens omwille van de verplichtingen uit het RUP. De actuele inschatting van de kostprijs van de werken bedraagt 4,5 miljoen euro excl. de bijkomende fietstunnels. Inclusief de fietstunnels wordt dit op 6,5 miljoen euro geraamd.</p> <p>Een cofinanciering vanuit de relancemiddelen ten belope van 2 miljoen euro zorgt voor duidelijkheid over de beschikbare kredieten kunnen zorgen zodat het realisatietraject voor deze werken kan opgestart worden.</p> <p>2) Dossier Wildebeek te Erembodegem/Denderleeuw</p> <p>Door de besprekingen in het kader van het brownfieldconvenant is er momenteel een dialoog tussen de gemeente Denderleeuw, de stad Aalst, AWV, MOW, VLAIO, SOLVA en de ontwikkelaar Zabra, om tot een oplossing te komen voor het kruispunt Nachtegaalstraat – N405, en bij uitbreiding het vlak bij gelegen kruispunt Industrielaan (Zuid III) met de N405. Dit is nodig om een volledige herontwikkeling van de Dekalpy site op het grondgebied Denderleeuw mogelijk te maken. Maar ook los van die ontwikkeling bleek eerder al dat verkeerstechnische aanpassingen wenselijk zijn. Belangrijkste uitdaging is de financiering, en in bijzonder de verdeling ervan tussen de verschillende partijen</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

(Denderleeuw, Aalst, Zabra, AWV), in het bijzonder ook de 6 te verwerven eigendommen om een verkeerstechnisch goede oplossing te bekomen.

Een gedeeltelijke financiering van deze verwervingskosten vanuit de relancemiddelen ten belope van 2 miljoen euro kan een oplossing faciliteren. Vervolgens zullen ook bij AWV de nodige kredieten voor de uitvoering van de werken moeten voorzien worden.

3) Dossier Buke te Zottegem

Herinrichting van de Leeuwrikstraat en de Smalleweg zijn noodzakelijk als ontsluitingsinfrastructuur van het bedrijventerrein. Deze ontsluitingsweg is nu erg smal en onvoldoende uitgerust als ontsluitingsweg van een bedrijventerrein. Het terrein is zo'n 25 ha groot, volledig bezet en een mengeling van diverse soorten bedrijven. Er wordt 761.529 euro voorzien vanuit de relancemiddelen om de verbeterde ontsluitingsweg mogelijk te maken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	6.000.000 EUR
Output	Realisatie van de transformatie van een aantal belangrijke en vaak complexe dossiers inzake verouderde bedrijventerreinen tot moderne, duurzame bedrijventerreinen, waarvan reeds 3 concrete dossiers voorwerp zijn van besluitvorming en andere dossiers worden voorbereid.
Outcome	Doel: Knelpunten rond ontsluitingsinfrastructuur helpen oplossen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Er zijn uiteindelijk 5 bedrijventerreinendossiers geselecteerd die nood hadden aan subsidies maar bezwaarlijk in aanmerking kwamen voor reguliere subsidies. Reguliere subsidies lagen moeilijk omdat het type kosten niet voorzien was op basis van de subsidieregeling bedrijventerreinen of omdat de bestaande subsidieregeling uitgaat van een integrale herontwikkeling van een verouderd bedrijventerrein terwijl de hier geselecteerde dossiers louter specifieke ingrepen vergden op vlak van ontsluitingsinfrastructuur.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aantal gedeblokkeerde herinrichtingen van brownfields/verouderde bedrijventerreinen	2022 Q4	Op schema	
Investeringsagenda opmaken	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
VV101 "Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen" --> SVZ (02/09/2021) --> onderzoeksfase ter voorbereiding besluitvorming voor 3 dossiers ten bedrage van ca. 2 miljoen euro/dossier.	2021 Q3	Gerealiseerd		
Opstart projecten	2022 Q1	Op schema		
Aanbesteding werken.	2023 Q1	Nog niet gestart		
Start uitvoering werken.	2023 Q3	Nog niet gestart		
Einde werken.	2024 Q3	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal dossiers	5	2022 Q4	5	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Beslissing Vlaamse Regering van 17/12/2021 inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen
Nota aan de Vlaamse regering van 15 juli 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de visserijsector als gevolg van de situatie in Oekraïne

VV102 - INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Gemeenten, handelaars

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Investeren in bedrijvige en bruisende kernen: projectoproepen rond aankoop en transformatie van handelspanden, flankerend beleid op vlak van mobiliteit en parkeren en data-gedreven beleidsvoeren op basis van retaildata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oproep 'Aankoop en/of transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten' (eerste schijf van 10 miljoen) - 'Profploeg' en 'Vitrine' (2 miljoen euro) - Oproep 'Duurzame bereikbaarheid van de kern' - Oproep cofinanciering gemeentelijke premies ter verduurzaming en verfraaiing handelspanden - Oproep subsidies verordeningen en RUP's voor IHB-planconcepten - Oproep collectieve begeleiding gemeenten door experts <p>Er heeft een budgetverschuiving plaatsgevonden van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4,536 miljoen euro naar VV029 op basis van een Besluit van de Vlaamse Regering van 30/09/2022 - 1,5 miljoen euro naar VV111 op basis van een Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2022

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.743.000 EUR
Output	Zorgen voor transformatie van leegstaande of onderbenutte handelspanden/bedrijfspanen tot actieve panden die bijdragen tot de versterking van het lokaal economisch weefsel, en ondersteuning van gemeenten via begeleiding en ervaringsuitwisseling.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Oproep 'Aankoop en/of transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten' --> stimuleren van het lokaal ondernemerschap. - Profploeg --> professionele ondersteuning van steden en gemeenten voor concrete aanpak van uitdagingen handelskernversterking. - Vitrine --> begeleiding van ervaringsuitwisseling tussen gemeenten en het documenteren en verspreiden van goede praktijken. - Oproep Duurzame bereikbaarheid kernen: investeringen openbaar domein en ondersteunend studiewerk - Oproep cofinanciering gemeentelijke premies: verduurzaming en verfraaiing handelspanden (gericht op eigenaars en exploitanten handelspanden) - Oproep subsidiëring verordeningen en RUP's: meer toepassing van (plan)concepten integraal

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	handelsvestigingsbeleid - Oproep collectieve begeleiding gemeenten door experts: ondersteuning bij implementatie acties n.a.v. profploeg
--	---

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Doordat 93 gemeenten een begeleiding hebben gekregen van de 'profploeg' werd samenwerking gestimuleerd tussen de lokale ambtenaren economie en hun lokale collega's van omgeving en openbare werken zodat er heel wat meer initiatieven werden ondernomen en, door de hulp van de profploeg bij het uitschrijven van een projectvoorstel ook tot een goed einde gebracht. Dit proces had tijd nodig maar sedert de zomer van 2022 begonnen de projectvoorstellen binnen te stromen. Finaal werden er 33 aankoop-en transformatiedossiers van leegstaande panden gesubsidieerd, 34 projecten die de bereikbaarheid van de kernen moeten verbeteren, ook voor fietsers en voetgangers en die kernen moeten vergroenen, 27 dossiers waarbij de gemeentelijk premies aan eigenaars/exploitanten ter verduurzaming en verfraaiing van handelspanden worden gefinancierd en ten slotte 3 planningsinitiatieven om via een RUP of stedenbouwkundige verordening de kern af te bakenen. Niet alle ingediende dossiers konden worden gesubsidieerd. Voor de aankoop en transformatie van leegstaande handelspanden en voor de planningsinitiatieven gold een doorlopende indieningsmogelijkheid. Tot eind november bleven dossiers binnenkomen zodat er respectievelijk 13 aankoop-en transformatiedossiers en nog eens 2 planningsinitiatieven niet meer konden worden gesubsidieerd.</p> <p>Financieel bleef het uitgangspunt dat 25 miljoen euro beschikbaar zou zijn voor deze relancemaatregelen. Gezien er eerder middelen werden getransfereerd voor andere doeleinden, dienden op het einde middelen te worden bijgesteld, deels uit relancebudget (van Media) maar voor het grootste deel via reguliere budgetten.</p> <p>Deze budgetten werden ook aangewend voor overheidsopdrachten. Initieel waren er twee voorzien, nl. individuele kortlopende begeleidingstrajecten door de multidisciplinaire profploeg en een vorm van collectieve ervaringsuitwisseling onder de roepnaam 'de vitrine'. Uiteindelijk werd er naast de initiële overheidsopdracht voor de profploeg nog voorzien in meerwerken door de profploeg (mede doordat er 93 gemeenten begeleiding kregen i.p.v. het geraamde/verhoopte aantal van 85) en werden de collectieve begeleidingstrajecten en de opmaak van een interactieve website voor ervaringsuitwisseling in 2 afzonderlijke overheidsopdrachten uitbesteed. Alle overheidsopdrachten zijn inmiddels gegund. De oproep naar gemeenten voor inschrijving (kosteloos) voor de collectieve trajecten is voorzien in maart 2023. Tegen dan zijn de meeste begeleidingstrajecten van de profploeg afgelopen en hebben de gemeenten verder uit te werken acties waarvoor ze dan ondersteund worden door experts én kunnen leren van gemeenten die aan eenzelfde actie werken. Die collectieve begeleidingstrajecten betreffen 12 verschillende thema's, gaande van het bepalen van het DNA van de gemeente in functie van aangepaste branding, acties rond leegstand tot en met het uitwerken van een beleid voor gemeenten langs klassieke 'steenwegen' met veel handelslinten.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Lanceren oproepen	2021 Q2	Gerealiseerd		
Start dienstverlening aan lokale besturen en investeringen door lokale besturen. SVZ: Aankondiging opdracht d.d. 28/04/2021 in het Bulletin der Aanbestedingen, Selectieverslag d.d. 10/06/2021, Gemotiveerde selectiebeslissing d.d. 29/06/2021, Bestek nr. VLAIO-2021-07, Proces-verbaal van de opening van de offertes d.d. 10/08/2021, Gunningsverslag d.d. 27/08/2021 aan 'Idea Consult', tijdens eerste oproep --> 34 aanvragen voor begeleiding ingediend door gemeenten.	2021 Q3	Gerealiseerd		
Bijkomende oproepen te lanceren	2022 Q1	Gerealiseerd	Dossiers komen binnen op 1 juni en 15 september (oproepen wedstrijdformule); andere oproepen zijn met doorlopende indiening.	
Einde oproep	2022 Q4	Gerealiseerd		
Einde fase dienstverlening en investeringen	2025 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal gestarte begeleidingstrajecten om gemeenten te helpen bij het vernieuwen van hun beleid rond bedrijvige kernen	85	2022 Q1	93	109 %
aantal dossiers rond leegstaande bedrijfspanden die getransformeerd gaan worden met het oog op het versterken van het lokaal ondernemerschap	30	2022 Q4	28	93 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.743.000 EUR
Uitvoering VAK	20.746.000 EUR
Uitvoering VEK	2.647.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 20.743.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022. Investeren in kernversterking via projectoproepen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022. voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit en tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 30 september 2022 betreft Relanceplan Vlaamse Veerkracht project VV029. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteiten tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2022 tot wijziging van artikel 1, 3, 9 en 10, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit en tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2022. Advies van de Raad van State](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 tot toekenning van subsidie aan het hefboomrelanceproject Commanderie Gruitrode in Oudsbergen in het kader van het plan Vlaamse Veerkracht](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 december 2022. Herverdeling relancemiddelen VV102 \(investeren in kernversterking via projectoproepen\) en VV134 \(digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse Mediasector\)](#)

VV103 - LANTIS - PFOS-VERVUILING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	Lantis
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Lantis
Belanghebbenden	De burger, de volksgezondheid

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
Met dit initiatief wordt de PFOS-vervuiling afgeschermd die werd aangetroffen bij de aanleg van Oosterweel.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	23.000.000 EUR
Output	
Outcome	Er wordt grondverzet gerealiseerd volgens het standstillprincipe. Hierbij wordt er enerzijds gewerkt met een specifieke afdekmethodiek, anderzijds worden voor het grondwater bemalingsbeperkende invloeden gerealiseerd zodat er enkel gezuiverd grondwater geloosd wordt. De werken worden uitgevoerd conform de adviezen van de commissie Grondverzet (o.l.v. professor Vrancken). Bovendien is er bijkomende regelgeving in afronding voor de site (het sitebesluit) en de omgang met PFAS-vervuilde grond (tijdelijk handelingskader PFAS).

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Als bouwheer van de Oosterweelverbinding is Lantis gebonden aan het standstill-principe. Dat houdt in dat de werken die Lantis uitvoert niet mogen zorgen voor een verdere verspreiding van de PFOS-verontreiniging. Dankzij strenge maatregelen, waar zowel intern als door externe instanties toezicht op wordt gehouden, wordt de verspreiding van PFOS/PFAS maximaal vermeden. De Oosterweelwerken zorgen namelijk voor een verbeterde situatie omdat de verontreiniging duidelijk in kaart is gebracht, de meest vervuilde gronden zorgvuldig worden afgedekt en het grondwater wordt gezuiverd tot er geen PFOS meer wordt aangetroffen.</p> <p>Het grondwater dat Lantis tijdens de werken oppompt, wordt gezuiverd alvorens het naar de Schelde wordt afgevoerd of terug in de bodem wordt gepompt. Daartoe werd een speciale waterzuiveringsinstallatie gebouwd binnen de werfzone Linkeroever. De Vlaamse</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>Milieumaatschappij (VMM) volgt deze waterzuivering op. Deze waterzuiveringsinstallatie is in exploitatie en metingen tonen aan dat er in het water dat het waterzuiveringsstation verlaat, geen PFOS boven de detectielimiet meer gevonden wordt.</p> <p>Specifiek voor de PFAS problematiek rond de Zwijndrechtse 3M-site, die de Oosterweelwerven Linkeroever en Scheldetunnel treft, werden ondertussen een saneringsovereenkomst en saneringsverbond ondertekend, en worden ook regelgevende initiatieven genomen. Hierdoor kunnen de Oosterweelwerven in synergie met de sanering van 3M worden gevoerd.</p> <p>De afronding van dit project loopt samen met de infrastructuurwerken Linkeroever en is voorzien in 2024, onder voorbehoud van voortgang van het grondverzet. Met de toelage uit de Vlaamse relancemiddelen werden noodzakelijke maatregelen getroffen in kader van de aanpak van verontreinigde gronden en grondwater, om de Oosterweelwerven te kunnen continueren.</p> <p>De juridische rechtsgrond is te vinden in de verkoopovereenkomst uit 2004 tussen het Vlaams Gewest en de BAM aangaande de gronden van de Oosterweelverbinding. Onder artikel 9 van de verkoopovereenkomst verbindt het Vlaams Gewest zich ertoe BAM te vrijwaren alle schade aangaande enige bodemverontreiniging op de site. In de beslissing van de Vlaamse Regering over de milderende maatregelen en flankerend beleid Infrastructuurwerken Linkeroever van 22/12/2017 is dit bevestigd.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	23.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	23.000.000 EUR
Uitvoering VAK	23.000.000 EUR
Uitvoering VEK	23.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 23.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW](#)

VV104 - VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA (EXTRA OPROEP STADSVERNIEUWING)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	13 centrumsteden, 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De oproep "Veerkrachtige steden na Corona" wil de steden bijkomend financieel ondersteunen bij de uitvoering van (in hoofdzaak) investeringsprojecten in een bepaalde wijk of stadsdeel. De focus is driedig, namelijk de sociale, fysieke en economische dimensie van een bepaalde wijk of stadsdeel. De oproep mikt op projecten die vanuit een geïntegreerde aanpak inzetten op vernieuwing en innovatie binnen deze drie focusgebieden. Er is ook ruimte voor de ondersteuning van nieuwe werkingen in een opstartfase.</p> <p>Met de economische dimensie worden werkingen en investeringsprojecten beoogd die bijdragen tot de economische heropleving, het verhogen van de werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, opleidingsmogelijkheden, enzovoort.</p> <p>Met de sociale dimensie wil de oproep bijdragen aan een sociaal inclusieve stad met de steden als plaatsen waar iedereen mee aan boord blijft, met een sterk welbevinden en welzijn bij de bewoners, met een sociale mix, participatie en activering van kwetsbare groepen aan het maatschappelijke leven, het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en waar condities voor sociale mobiliteit worden geschapen.</p> <p>Het derde focusgebied gaat over de kwaliteit van de publieke ruimte en de mate waarin omgevingskenmerken zoals toegang tot groen, goede woonomstandigheden, een mix van woongelegenheden, de aanwezigheid van cultuur en sportinfrastructuur in de buurt, wijk of het stadsdeel bijdragen aan de ontplooiing van de inwoners, de tevredenheid over de buurt, meer ontspanningsmogelijkheden, enzovoort.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Aan de hand van innovatieve en vernieuwende investeringsprojecten bijdragen aan de stadsvernieuwing van de wijk/stadsdeel/stad - Investeringsprojecten die tegemoet komen aan de tekortkomingen die werden en nog steeds worden ervaren tijdens de Coronapandemie: noden aan ontmoetings- en publieke ruimten, aan kwalitatieve en

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	betaalbare woningen, aan groen en water in de stad, aan publieke infrastructuur (bibliotheken, jeugdhuizen, cultuurcentra, ...), aan ruimte voor jonge ondernemers en starters, ... -
Outcome	- De investeringen hebben bijgedragen aan de sociale inclusiviteit van de stad in kwestie waar iedereen mee aan boord blijft, de bewoners zich goed voelen, met een sociale mix, participatie en activering van kwetsbare groepen aan het maatschappelijke leven, het onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en waar condities voor sociale mobiliteit worden geschapen. - De investeringen dragen bij tot een verhoogde werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, opleidingsmogelijkheden, ondersteuning van starters, ... - De investeringen zorgen voor betere ontmoetingsruimten binnen het stadsdeel, sport- en culturele infrastructuur, betere woonomstandigheden, ontspanningsmogelijkheden, .. -

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Deze stadsprojecten bevonden zich doorheen 2022 in een opstartfase. Het gaat vooral over investeringen. Sommige projecten hebben eerste realisaties achter de rug, maar het merendeel ervan zullen pas later hun investeringsmiddelen uitputten.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering van de oproep	2021 Q2	Gerealiseerd	
Jurering van de ingediende aanvragen naar stadsvernieuwingsprojecten	2021 Q3	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering keurt de geselecteerde stadsvernieuwingsprojecten goed	2021 Q4	Gerealiseerd	
Jaarlijkse voortgangsrapporten van de stadsvernieuwingsprojecten	2022 Q4	Gerealiseerd	
Eindrapport van de gerealiseerde stadsvernieuwingsprojecten binnen deze oproep (deadline: 2026)	2026 Q3	Nog niet gestart	
Permanente evaluatie door stuurgroepen		Nog niet gestart	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal subsidieaanvragen	20	2021 Q3	25	100 %
start van de projecten		2022 Q1	9	100 %
jaarlijkse rapportering		2022 Q4	9	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	20.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 5 maart 2021 - nota Goedkeuring VR op 17/12/2021 van projectsubsidies in het kader van de oproep 'Veerkrachtige steden na Corona'

VV105 - ONTSNIJPEREN VAN VLAAMS LANDSCHAP

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Natuur en Bos - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Agentschap Wegen en Verkeer
Belanghebbenden	VLM, lokale besturen, middenveldorganisaties

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	16. Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Dit project zet in op de ecologische ontsnippering van bestaande gewestelijke transportinfrastructuur en draagt zo bij aan het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen. Daarvoor werkten de betrokken entiteiten binnen de VO een Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) uit. Het beoogt een structureel georganiseerde, programmatische aanpak van de versnipperingproblematiek zowel binnen de Vlaamse overheid als in samenwerking met diverse externe partners.</p> <p>Het eerste deel van het VAPEO is gericht op de verwezenlijking van terreinrealisaties (ecoducten, ecotunnels,...) om de voornaamste versnipperingsknelpunten aan gewest- en snelwegen weg te werken. Hiervoor is een eerste vijfjarenprogramma opgemaakt met 15 concrete projecten die tijdens die periode worden uitgevoerd of verder uitgewerkt. Daarnaast kunnen acute knelpunten opduiken die een snelle uitvoering vragen aangezien het een rollend programma betreft. Ondersteunende instrumenten en een gerichte communicatie maken eveneens deel uit van het VAPEO. De afspraken voor de uitvoering van dit project zijn opgenomen in een protocol dat op 23 september 2020 werd ondertekend door de bevoegde Vlaamse ministers Zuhail Demir en Lydia Peeters. De financiële verdeelsleutel is als volgt bepaald : ½ AWV, ¼ ANB, ¼ DOMG.</p> <p>Concreet zullen volgende 6 projecten met Relance-middelen uitgevoerd worden:</p> <ul style="list-style-type: none">- E40 (Bertem): ombouw bestaande brug tot bermbrug;- N75 (Dilsen-Stokkem) : aanleg nieuwe ecobrug;- N71 (Lommel): ontwerp en aanleg ecoduct;- N76 (Oudsbergen): ontwerp en aanleg ecovallei (met medegebruik);- E17 (Waasmunster): ombouw bestaande brug tot bermbrug;- R0 (Hallerbos): ontwerp en aanleg ecobrug met medegebruik. <p>Verder wordt er binnen Relance gewerkt aan 3 ondersteunende acties:</p> <ul style="list-style-type: none">- Communicatie faunapassage;- Uitwerken ondersteunende instrumenten;- Acute knelpunten aanpakken. <p>De andere VAPEO-projecten en ondersteunde acties worden met reguliere middelen aanbesteed tussen 2021-2024.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	25.000.000 EUR
Output	Realisatie van 6 ontsnipperingsprojecten.
Outcome	Verbetering van de ecologische ontsnippering.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Alle (deel)projecten zijn al uitgevoerd of in uitvoering. Voor alle (deel)projecten zijn trekkers bij de verschillende entiteiten momenteel bezig met uitvoering van aanbestedingen en start van de werken en opdrachten.
Noodzakelijke politieke actie	Geen politieke actie vereist.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
E17 (Waasmunster): ontwerp en aanbesteding ombouw bestaande brug tot bermbrug	2021 Q4	Op schema	Opdracht gestart.
Communicatie - aanbesteding opdracht	2021 Q4	Op schema	Opdracht communicatiecampagne 'VanDierNaarDaar' gestart.
E40 (Bertem): ontwerp en aanbesteding ombouw bestaande brug tot bermbrug	2021 Q4	Op schema	Aanbesteding afgerond.
Acute knelpunten aanpakken - aanbesteding	2022 Q4	Op schema	Plaatsing wilddetectiesysteem N76 Oudsbergen gestart.
N71 (Lommel): ontwerp en aanbesteding ecoduct	2022 Q4	Op schema	Opdracht gestart.
Uitwerking ondersteunende instrumenten - aanbesteding	2022 Q4	Op schema	Studie 'Dieren onder de wielen als (beleids)ondersteunend instrument bij registratie en evaluatie van versnipperingsknelpunten aan transportinfrastructuur' gestart.
R0 (Hallerbos): ontwerp en aanbesteding ecobrug met medegebruik	2022 Q4	Op schema	Aanbesteding afgerond.
N75 (Dilsen-Stokkem): ontwerp en aanbesteding ecobrug	2022 Q4	Op schema	Omgevingsvergunning aangevraagd. Bestek opgemaakt en gelanceerd, offertes ontvangen en gunning lopende.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
N76 (Oudsbergen): ontwerp en aanbesteding ecovallei (met medegebruik)	2022 Q4	Op schema	Opdracht gestart.	
Uitwerking ondersteunende instrumenten - aanbesteding	2022 Q4	Op schema	Opdracht 'Evaluatie monitoring wilddetectiesysteem N76 Oudsbergen' gestart.	
N75 (Dilsen-Stokkem): oplevering ecobrug (met medegebruik)	2026 Q4	Nog niet gestart		
R0 (Hallerbos): oplevering ecobrug met medegebruik	2026 Q4	Nog niet gestart		
E40 (Berthem): oplevering bermbrug	2026 Q4	Nog niet gestart		
N71 (Lommel): oplevering ecoduct	2026 Q4	Nog niet gestart		
Acute knelpunten - oplevering	2026 Q4	Nog niet gestart		
Communicatie - oplevering opdracht	2026 Q4	Nog niet gestart		
Uitwerking ondersteunende instrumenten - oplevering	2026 Q4	Nog niet gestart		
E17 (Waasmunster): oplevering bermbrug	2026 Q4	Nog niet gestart		
N76 (Oudsbergen / Genk): oplevering ecobrug met medegebruik	2026 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde ontsnipperingsprojecten	6	2026 Q4		
Aantal gerealiseerde ontsnipperingsprojecten	6	2026 Q4		
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	25.000.000 EUR			
Beleidsruimte (begroot) update	25.000.000 EUR			
Uitvoering VAK	25.000.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	234.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 24.700.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontsnippen Vlaams landschap</p> <p>Vlaams actieprogramma ecologische ontsnippering. Deel 1 - wegen. Bijlage</p> <p>Protocol in verband met de uitvoering van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) Deel 1 - wegen. Bijlage</p> <p>Budget. Bijlage</p>

17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)

VV106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER DE LIJN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Lydia Peeters
Trekkende entiteit VO	De Lijn
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	De Lijn
Belanghebbenden	Inwoners, weggebruikers, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	17. Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
De doelstelling van dit project is een gefaseerde overgang naar een groene en duurzame busvloot van vervoersmaatschappij De Lijn. Naast een bijdrage aan de vergroening van het transport en de modal shift wil men via dit initiatief het economisch herstel te ondersteunen door te investeren in duurzame en openbare mobiliteit.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	93.000.000 EUR
Output	De concrete outputs betreffen het realiseren van een verdere elektrificatie van de busvloot. In functie hiervan worden hybride bussen omgebouwd naar e-hybride bussen en worden e-hybride bussen aangekocht. In functie van het onderhoud van deze bussen worden de stelplaatsen aangepast en wordt voorzien in een raamcontract voor het onderhoud van deze bussen.
Outcome	Verbetering luchtkwaliteit.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<ul style="list-style-type: none"> - De bestelling voor de ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen werd in 2021 geplaatst en de aanpassingen zijn opgestart. De aanpassingen werden gefaseerd uitgevoerd in de periode Q1 tot Q4 2022. - Er werden 44 gelede e-hybride bussen besteld in 2021. De e-hybride gelede bussen zullen gefaseerd instromen in de periode Q1-Q3 2023. <p>Studies & adviesopdrachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De bestelling werd in 2021 geplaatst voor de uitvoering van de studies voor de aanpassingen voor de eerste drie stelplaatsen voor elektrische bussen. Voor de uitvoering van de studies voor

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

aanpassingen voor de stelplaatsen is het contract gesloten. De uitvoering van de studies van de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen) zijn afgerond in Q2 2022.

- De studie over de brandveiligheid werd in 2021 geplaatst en is lopende. De studies brandveiligheid stelplaatsen werden afgerond in Q2 2022.
- In juni 2022 werden de ontwerpstudies opgestart voor de vergunningsaanvragen voor de stelplaatsen Hasselt en Brugge.

Laadinfrastructuur & werken:

- De eerste bestelling voor de laadinfrastructuur voor de 60 e-bussen en e-hybride bussen werd in 2021 geplaatst bij twee leveranciers. Beide leveranciers zullen elk de helft van de bestelling installeren en in bedrijf stellen van in totaal 102 laders. Deze laadinfrastructuur zal ervoor zorgen dat de eerste e-bussen en e-hybrides op hun stelplaatsen geladen kunnen worden. De volgende bestellingen voor laadinfrastructuur in het gegunde raamcontract werden in 2022 toegewezen via een mini-competitie (cf. infra: tweede bestelling laadinfrastructuur).
- De Lijn heeft op 20 april 2022 goedkeuring gegeven om de aanpassingswerken op de stelplaatsen op te starten om de eerste e-bussen te ontvangen. Deze tijdelijke installaties omvatten onder andere bekabelingswerken, verdeelborden, kabelladderconstructies, overbruggingen....
- De Lijn voerde in Q3 en Q4 2022 de aanpassingswerken uit aan de eerste drie stelplaatsen en plaatst de laadinfrastructuur, zodat de eerste e-bussen vanaf het voorjaar van 2023 in de dienst kunnen opgenomen worden. Voor de stelplaats Kortrijk is er een beperkte vertraging omwille van bijkomende verharding. De stelplaats Kortrijk zal begin 2023 afgewerkt zijn zodat de stelplaats klaar is voor het ontvangen van de e-bussen.
- Na het doorlopen van de minicompetitie van de raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en (niveaus van) onderhoud van laadinfrastructuur, heeft De Lijn in Q2 2022 de tweede bestelling van 252 laders gegund.
- De april 2022 goedgekeurde opstart van een marktraadpleging tot mededinging voor de levering van laadinfrastructuur wordt niet langer gefinancierd met relancemiddelen en valt dan ook buiten deze rapportering.
- De Lijn heeft in mei 2022 plaatsingsprocedures opgestart voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De selectieleidraden zijn in mei 2022 gepubliceerd op het Belgische en Europese aankondigingsplatform. De Lijn kon eind 2022 2 opdrachten gunnen. Los van deze plaatsingsprocedures voerde De Lijn in 2022 kleinere aanpassingen uit aan deze stelplaatsen (cf. supra eerste bestelling laadinfrastructuur en werken), zodat de eerste e-bussen vanaf het voorjaar van 2023 in de dienst kunnen opgenomen worden.
- In juni 2022 werd goedkeuring gegeven aan de uitvoering van de werken voor de eerste fase van de stelplaats Sint-Niklaas. Sint-Niklaas is de vierde stelplaats die een deel van de eerste e-bussen zal ontvangen (naast de stelplaatsen Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen). De werken zullen afgerond zijn in Q2 van 2023.
- In december 2022 werd goedkeuring gegeven aan de uitvoering voor de volgende fase van de werken (na fase 1 Apollo XIII) voor de stelplaatsen Genk Winterslag en Gent Destelbergen (= volgende fase na de eerste aanpassingswerken voor de ontvangst van de eerste e-bussen).

e-bussen:

- Een eerste bestelling voor 60 e-bussen werd geplaatst bij twee leveranciers. Het raamcontract laat een afname toe tot in totaal 350 e-bussen. Uit de 11 kandidaten werden Van Hool en VDL als best geplaatste inschrijvers uit de openbare aanbestedingsprocedure. Ze beantwoordden het best aan de gunningscriteria en boden de beste prijs-kwaliteitsverhouding aan inzake total cost of ownership (TCO), autonomie tussen laadbeurten, technische kwaliteit en look & feel. Als best gerangschikte inschrijver mag Van Hool 60% van de 60 e-bussen of 36 stuks leveren, VDL als tweede gerangschikte levert 40% of 24 stuks.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	- De productie werd opgestart. De bussen zullen, afhankelijk van de productie, vanaf Q1 2023 gefaseerd geleverd worden en zullen vervolgens na de testperiode in dienst genomen worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van de studies voor de aanpassingen voor de stelplaatsen voor elektrische bussen.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Het plaatsen van een bestelling voor de uitvoering van adviesopdrachten voor de uitrol van elektrische bussystemen en ondersteuning programmawerking.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Plaatsen van een bestelling voor de ombouw van bestaande hybride naar plug-in e-hybride bussen.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Plaatsen van een bestelling voor plug-in hybride gelede bussen binnen het bestaande contract	2021 Q2	Gerealiseerd	
Het plaatsen van een bestelling voor de installatie voor de laadinfrastructuur op de stelplaatsen voor de e-bussen (volelektrische bussen) en de plug-in hybride bussen.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Bestelling voor e-bussen (volelektrische bussen).	2021 Q3	Gerealiseerd	
Afronden van de minicompetitie van de raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en (niveaus van) onderhoud van laadinfrastructuur & gunning en plaatsing van tweede bestelling van 252 laders.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Opstart van drie plaatsingsprocedures voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De selectieleidraden zijn in mei 2022 gepubliceerd op het Belgische en Europese aankondigingsplatform.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Realisatie van de ontwerpstudies voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	2022 Q2	Gerealiseerd	
Opstart van een nieuwe marktraadpleging via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging voor de levering van laadinfrastructuur. De nieuw op te starten raamovereenkomst betreft de levering van maximaal 1.600 laadpalen.	2022 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Realisatie van de studie over de brandveiligheid voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	2022 Q2	Gerealiseerd		
Gunning van de opdrachten voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen.	2022 Q4	Gerealiseerd		
Realisatie van de ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen	2022 Q4	Gerealiseerd		
Gunning van de raamovereenkomst betreffende de levering van maximaal 1.600 laadpalen.	2022 Q4	Stopgezet	Dit initiatief wordt niet langer op relancemiddelen gefinancierd en werd dus ook binnen deze rapportering stopgezet.	
Start gefaseerde levering van de 60 e bussen.	2023 Q1	Vertraging	Er is een vertraging bij de producent door wereldwijde supply chain problemen.	
Realisatie van de aanpassingswerken en de installatie van de laadinfrastructuur op de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen) om de eerste e-bussen te ontvangen.	2023 Q1	Op schema	Voor de stelplaats Kortrijk zullen de werken begin 2023 beëindigd worden.	
Start gefaseerde indienstname van de 60 e bussen, vanaf 2022/Q4	2023 Q2	Vertraging	Er is een vertraging bij de producent door wereldwijde supply chain problemen.	
Realisatie van de aanpassingswerken en de installatie van de laadinfrastructuur op de stelplaats Sint-Niklaas om de eerste e-bussen te ontvangen.	2023 Q2	Op schema		
Levering 44 gelede e-hybride bussen	2023 Q3	Vertraging	Er is een vertraging bij de producent door wereldwijde supply chain problemen.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Realisatie van de ontwerpstudies voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	3 studies	2022 Q2	3	100 %
Afronden van de minicompetitie van de raamovereenkomst voor de levering, indienstelling en (niveaus van) onderhoud van laadinfrastructuur & gunning en plaatsing van tweede bestelling van 252 laders.	252 laders	2022 Q2	252	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Opstart van drie plaatsingsprocedures voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De selectieleidraden zijn in mei 2022 gepubliceerd op het Belgische en Europese aankondigingsplatform.	Opstart van 3 plaatsingsprocedures	2022 Q2	3	100 %
Realisatie van de studie over de brandveiligheid voor de eerste drie stelplaatsen (Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen)	3 studies	2022 Q2	3	100 %
Gunning van de opdrachten voor de aannemingswerken op de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen.	Gunning van de opdrachten	2022 Q4	2	100 %
Realisatie van de ombouw van 280 hybride bussen naar plug-in e-hybride bussen	280 plugin e-hybride bussen	2022 Q4	280	100 %
Realisatie van de aanpassingswerken en de installatie van de laadinfrastructuur op de eerste drie stelplaatsen ((Kortrijk, Genk Winterslag en Gent Destelbergen) om de eerste e-bussen te ontvangen.	3 stelplaatsen	2023 Q1	2	75 %
Gefaseerde indienstname van de 60 e bussen.	60 e-bussen	2023 Q2		
Gefaseerde levering van de 60 e bussen.	60 e-bussen	2023 Q2		
Realisatie van de aanpassingswerken en de installatie van de laadinfrastructuur op de stelplaats Sint-Niklaas om de eerste e-bussen op te vangen.	1	2023 Q2		
Levering 44 gelede e-hybride bussen	44 gelede e-hybride bussen	2023 Q3		
Formele bestelling van groene bussen en daarmee samenhangende oplaadinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel: - Bestelling geplaatst voor de ombouw van hybride bussen in e-hybride bussen via een wijziging van de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor hybride plug-inbussen binnen de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor vol-elektrische bussen - Bestelling geplaatst voor de installatie van oplaadinfrastructuur in de depots van de (vol-)elektrische bussen en de hybride plug-inbussen	4	2024 Q4	4	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	93.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	93.000.000 EUR
Uitvoering VAK	92.979.000 EUR
Uitvoering VEK	10.677.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 93.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - goedkeuring opstart initiatieven die invulling geven aan relanceprojecten MOW 2021
Nota aan de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 - bijlage
Nota aan de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 - update relancemiddelen MOW

18. Brexit

VV107 - INITIATIEVEN VANUIT VLAM VOOR DE PROMOTIE EN AFZET VAN PRODUCTEN, O. A. ALS GEVOLG VAN BREXIT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>VLAM werkt in 2021-2023 een relancebeleid uit voor de zwaar getroffen sectoren van de agrovoeding en sierteelt. Volgende maatregelen worden voorgesteld.</p> <p>1. Bedrijfssubsidies</p> <p>VLAM lanceert een open oproep naar Vlaamse bedrijven actief in de agrovoeding en sierteelt om een innovatief project in te dienen om de export richting het VK en wereldwijd te ondersteunen. Ook wordt er een mini-incubator gelanceerd op maat van kleinere en startende exporteurs van Vlaamse agrovoeding en sierteelt.</p> <p>2. Communicatie</p> <p>Er worden imagocampagnes opgezet om de Vlaamse agrovoeding en sierteeltsector te promoten in het VK en onze marktpositie daarbuiten te versterken.</p> <p>3. Personeel</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.000.000 EUR
Output	- Bedrijfssubsidie: minimum 2 incubators Brexit, minimum 2 mini-incubators - Communicatie: 4 imagocampagnes - Personeel: 3 FTE's, waarvan 1 consulent Brexit
Outcome	- Bedrijfssubsidies: innovatieve bedrijven rechtstreeks subsidiëren om de export richting VK en wereldwijd te ondersteunen. - Communicatie: imagocampagnes om de Vlaamse agrovoeding en sierteeltsector te promoten in het VK en onze marktpositie daarbuiten te versterken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bedrijfssubsidies: de oproep incubator 2021 is gelanceerd	2021 Q1	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering incubator 2021	2021 Q2	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: oproep incubator 2022 is gelanceerd	2022 Q1	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering incubator 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: oproep mini-incubator 2021 is gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering mini-incubator 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
bedrijfssubsidies: oproep mini-incubator 2022-2023 is gelanceerd	2023 Q2	Op schema	
Bedrijfssubsidies: selectie en uitvoering mini-incubator 2022-2023	2023 Q4	Op schema	
communicatie: imagocampagne VK (mediaplan B2B)	2021 Q2	Gerealiseerd	
communicatie: imagocampagne VK (prinselijke missie)	2022 Q4	Gerealiseerd	
communicatie: campagne marktpositie versterken (twee prospecties)	2023 Q4	Op schema	
personeel is aangeworven	2022 Q4	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Bedrijfssubsidies in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: oproep incubator	2	2022 Q2	1	100 %
Aanwerving personeel in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren	3	2022 Q4	3	100 %
bedrijfssubsidies in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: oproep mini-incubator	2	2023 Q4		
Communicatie in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: imagocampagne	4	2023 Q4	1	25 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	2.250.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 2.874.000 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 126.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 3 juni 2022 VR 26 februari 2021

VV108 - SUBSIDIES AAN BEDRIJVEN (FINANCIËLE STEUN VOOR BEDRIJVEN, KOSTENVERLAGING VOOR DEELNAME AAN BEURZEN, ONDERSTEUNING VOOR BREXIT) + INZET VAN CONSULTANTS OM VLAANDEREN IN HET BUITENLAND TE PROMOTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	De belanghebbenden van deze maatregelen zijn de in Vlaanderen actieve bedrijven of buitenlandse bedrijven met plannen voor een investering in Vlaanderen/Europa

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
Ondersteuning van bedrijven die getroffen werden door de gevolgen van Brexit in hun exportgeoriënteerde activiteiten en het versterken van onze inspanningen om investeringen aan te trekken naar Vlaanderen in het kader van de ontwikkelingen met betrekking tot Brexit

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	30.000.000 EUR
Output	De maatregelen uit deze actie hebben in het kader van de relance tot doel: 1. exporterende bedrijven die geïmpacteerd zijn door Brexit te helpen bij ofwel het behouden/heroveren/uitbreiden van hun marktaandeel in het VK ofwel de impact van Brexit op hun handelsactiviteiten te compenseren door actief nieuwe markten en exportbestemmingen te gaan opzoeken buiten het VK. Subsidies, extra steun en bijzondere acties moeten hen helpen om meer te doen dan gebruikelijk en dit sneller en intensiever uit te voeren dan in reguliere omstandigheden. 2. in een aarzelande onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.
Outcome	Behoud en groei van de exportcapaciteit van Vlaanderen Behoud en groei van het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>De besteding van de BAR-middelen voor deze actielijn bleef tot nu toe onder de verwachtingen door een combinatie van enerzijds een ongunstig internationaal economisch bestel (in corona en eerste herstelfase na corona) -waardoor prospectie en beursbezoeken bij bedrijven tot een zeer laag niveau gezakt waren- en een aanhoudende onduidelijkheid ivm de subsidiabiliteit van kosten binnen de BAR (meer bepaald de omschrijving en amplitude van de 'negatieve Brexit-impact'). Daarom werden in hoofdzaak 3 Actieslijnen opgezet die de achterstand in de besteding moeten wegwerken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Het subsidiekader werd aangepast <p>Zowel door een verlaging van de drempel (bedrijven met minder VTE's komen nu ook in aanmerking voor subsidie), als door een verhoging (de tegemoetkoming naar de bedrijven werd afgestemd op de mate van impact: meer impact, hogere tussenkomst)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.Er werd eveneens een fijnmaziger systeem opgezet waardoor bedrijven met een partiële negatieve Brexit-impact ook een partiële Brexit-korting kunnen ontvangen wat de doelgroep van begunstigde bedrijven beduidend uitbreidt ; 3.Er werd een meer gedetailleerd en uitgebreider actieprogramma opgezet in het kader van het aantrekken van buitenlandse investeerders met een veelheid aan acties zowel in het VK als daarbuiten. <p>Daarnaast worden de andere elementen uit de Brexit-Nota van FIT (van 18/3/2022) verder uitgewerkt.</p> <p>Dit alles moet in 2023 (de BAR loopt tot 31/12/2023) er toe leiden dat de beschikbare middelen in de loop van dit finale jaar maximaal besteed worden.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Brexitcall 08/02/2021 tot 31/03/2021	2021 Q1	Gerealiseerd	134 steunaanvragen werden goedgekeurd
Brexitcall 15/06/2021 tot 27/08/2021	2021 Q3	Gerealiseerd	39 dossiers goedgekeurd
Brexitcall 27/09/2021 tot 12/11/2021	2021 Q4	Gerealiseerd	19 dossiers goedgekeurd
Brexitcall januari 2022	2022 Q1	Gerealiseerd	15 dossiers goedgekeurd
Brexitcall juni 2022	2022 Q2	Gerealiseerd	13 dossiers goedgekeurd
Brexit call november/december 2022	2022 Q4	Op schema	Oproep liep van 9/11/2022 en 14/12/2022. De dossiers worden momenteel

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			geanalyseerd en beoordeeld. Nu reeds (tot 31/12/2022° 76 dossiers goedgekeurd.	
Extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven mbt brexit	2022 Q4	Op schema		
Subsidies: aanwenden van de bijzondere exportsteun en het starterspakket internationalisering	2022 Q4	Op schema		
Lead generation Dwz de prospectie naar en het aanleggen van een database met potentiële buitenlandse investeringen (in dit geval met behulp van derden, de zgn 'lead generators') waar dan verder via begeleiding op ingezet wordt om buitenlandse investeringen in Vlaanderen te realiseren.	2022 Q4	Op schema		
Versterken van de acties tot internationale diversificatie door het toevoegen van een culturele omkadering	2022 Q4	Op schema		
Kostenverlaging voor deelname aan acties van Flanders Investment & Trade	2022 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
De maatregelen uit deze actie hebben in het kader van de relance tot doel: 1. exporterende bedrijven die geïmpacteerd zijn door Brexit te helpen bij ofwel het behouden/heroveren/uitbreiden van hun marktaandeel in het VK ofwel de impact van Brexit op hun handelsactiviteiten te compenseren door actief nieuwe markten en exportbestemmingen te gaan opzoeken buiten het VK. Subsidies, extra steun en bijzondere acties moeten hen helpen om meer te doen dan gebruikelijk en dit sneller en intensiever uit te voeren dan in reguliere omstandigheden. 2. in een aarzelande onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.395.000 EUR
Uitvoering VEK	6.207.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 30.000.000 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2020: VR 2020 1812 DOC.1581/1BIS</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 18 maart 2022. Maatregelen met betrekking tot het internationaal ondernemen ten behoeve van de door de Brexit geïmpacteerde bedrijven gefinancierd uit de Brexit Adjustment Reserve</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2022 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies in de vorm van bijzondere crisissteun internationalisering en starterspakketten internationalisering voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
<p>VV179 - Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen</p>

VV109 - VLAIO BREXIT ACTIEPLAN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	18. Brexit
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Vlaamse Regering voorziet 83 miljoen euro extra relancemiddelen voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de Brexit. Daarvan is 30 miljoen euro voorzien voor FIT, 50 miljoen euro voor VLAIO, en 3 miljoen euro voor VLAM.</p> <p>Volgende gerichte steunmaatregelen voor de betrokken doelgroepen worden binnen het voor VLAIO vooropgestelde budget van 50 miljoen euro gerealiseerd.</p> <p>1. Post-Brexit Veerkrachtsubsidie. Extra relancebudget voor 2021 en 2022 telkens 14,3 miljoen euro.</p> <p>Deze oproep is gericht op bedrijven die omwille van Brexit hun strategische businessplannen duurzaam moeten omvormen en vervolgens die transformatie implementeren. De doelgroep voor deze oproep zijn dus: Kmo's die getroffen zijn door de gevolgen van de Brexit, hetzij direct in hun export- en importactiviteiten, hetzij indirect omwille van problemen bij outsourcing, insourcing, disruptie in hun waardeketen,</p> <p>2. Gerichte Transformatie Opleidingen. Extra relancebudget 5 miljoen euro.</p> <p>SYNTRA gaat opleidingen organiseren die ondernemers in staat stelt om de uitdagingen van BREXIT te counteren.</p> <p>3. Versterking Brexit Helpdesk</p> <p>De Helpdesk geeft antwoorden op vragen die ondernemingen hebben aangaande Brexit. Voornamelijk betreffen deze vragen export-gerelateerde thema's.</p> <p>4. Vlaams Green Lane project. Extra relancebudget 2 miljoen euro</p> <p>Een project dat de administratieve afhandeling van douanedocumenten voor Vlaamse bedrijven zal moeten faciliteren via een digitaliseringsproject dat in 2022 startte met een pilootfase, met medewerking van de Belgische douane en de Vlaamse zeehavens.</p> <p>5. Ontwrichte Zone</p> <p>Er wordt onderzocht of er bijkomende ontwrichte zones in Vlaanderen haalbaar zijn. In een ontwrichte zone is er een</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

tijdelijke vermindering van de loonkost voor bijkomende duurzame tewerkstelling.

6. Uitbreiding VLAIO Contract Ondernemerschap en DYZO

Voor 2021 en 2022 extra relancebudget van telkens 2.350.000 euro. Voor DYZO 150.000 euro voor 2021 en 2022.

VLAIO gaat met de geschikte partners in het contract Ondernemerschap in gesprek om voorstellen – die zich situeren op het niveau van informatieverzorging, individuele begeleiding, collectieve begeleiding, lerende netwerken op het vlak van bedrijfsvoering voor Brexit-gerelateerde import/exportthema's af te wachten.

Met de middelen voorzien in het Brexit-actieplan van de Vlaamse Regering voor de versterking van de dienstverlening ondernemerschap, zullen - na hierover het advies van de Inspectie van Financiën ingewonnen te hebben - aanvullende diensten besteld worden bij verschillende partners uit het contract. Met name bij:

- Netwerk Ondernemen;
- Unizo;
- Voka;
- het Industrieconsortium, en met name bij de partners Fevia, Fedustria en Agoria

DYZO vzw - dat ondernemingen in moeilijkheden helpt - krijgt extra middelen voor de aanwerving van twee personeelsleden.

7. Versterken van het aantrekken of behoud van investeringen, extra relancebudget 10 miljoen euro

Om nieuwe investeerders te ondersteunen wordt het bestaande budget van Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun versterkt met 10 miljoen euro. De focus ligt op Brexit gerelateerde investeringen.

Er worden ook 8 extra personeelsleden voorzien voor een periode van één jaar ter versterking van de Helpdesk en het team Veerkrachtsubsidie.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	50.000.000 EUR
Output	<ol style="list-style-type: none">1. Post-Brexit Veerkracht subsidie : In totaal werden 68 aanvragen ingediend.2. Gerichte Transformatie Opleiding : de eerste opleidingen starten medio september3. Versterking Brexit helpdesk. Er zijn drie personeelsleden aangeworven. Er werden 478 vragen beantwoord.4. Vlaams Green Lane Project. Een eerste fase van het studieproject door VIL/Deloitte is goedgekeurd.5. Ontwrichte zone. Er wordt permanent gemonitord of er een bijkomende zone mogelijk is. Deze monitoring wordt ook in 2023 verdergezet.6. Uitbreiding VLAIO Contract Ondernemerschap en VIZO.7. Versterken van het aantrekken of behoud van investeringen. Er zijn nog geen dossiers goedgekeurd.
Outcome	Momenteel beperkt de output zich tot het verstrekken van antwoorden op Brexit gerelateerde vragen van ondernemers, en het geven van veerkracht subsidies. De andere instrumenten (opleidingen, extra subsidies, Green Lane, uitbreiding Contract Ondernemerschap, Ontwrichte Zone) zijn nog in opbouw, of worden nog niet gebruikt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
---------------	--------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Beschrijving voortgang	<p>1. Veerkrachtsubsidie :</p> <p>In totaal werden 68 aanvragen ingediend. - 2021: 54 - 2022: 14</p> <p>Er werden tot nu toe 42 dossiers positief beslist.</p> <p>De totaal toegekende steun bedraagt € 1.415.994,00. - Vastgelegd in 2021: € 831.470,00 - Vastgelegd in 2022: € 584.524,00</p> <p>Intussen werd de Brexit veerkrachtsubsidie afgesloten en ingekanteld in de BAR. Wel zijn er nog 2 dossiers in behandeling, deze werden goedgekeurd na bezwaar, maar nog niet formeel beslist. Als deze meegeteld worden zullen de finale cijfers voor de Brexit veerkrachtsubsidie dus als volgt zijn: 44 positief besliste dossiers en een totaal toegekende steun van € 1.494.169,00.</p> <p>2. Opleidingen</p> <p>De opleiding junior customs consultant (douanedeclarant) is in september '22 opgestart in Syntra Antwerpen (campus Mechelen): Opleiding Douanedeclarant (junior) - voltijdse dagopleiding Syntra AB (syntra-ab.be)</p> <p>Zijnde volgende modules ikv brexitproject: M Europese Unie (8019) (36 uur) M Groeipad Junior Customs Consultant (8025) (47 uur) M Introductie tot douane en belangrijkste concepten (8638) (44 uur) M Het inkларingsproces (8838) (32 uur) M BTW en accijnzen - douaneaangifte (8938) (32 uur) M Moderne vreemde talen (8021) (64 uur)</p> <p>Deze telt nu 18 cursisten.</p> <p>Daarnaast wordt momenteel een nieuwe kortlopende lesmodule ontwikkeld die Syntra in februari plant te lanceren.</p> <p>Zakendoen met UK, waar wringt de douaneschoen?</p> <ul style="list-style-type: none">• Uitvoerformaliteiten in de EU - invoerformaliteiten VK• Attest van oorsprong - REX-verklaring• BTW bij in- en uitvoer en impact hiervan• Gebruik van de regeling transit• De relatie tussen de INCO-terms en de douaneformaliteiten• Speciale maatregelen voor voeding, frisdranken, alcohol• Terugkerende zendingen van in het Verenigd Koninkrijk gestockeerde goederen voor BREXIT <p>Sinds 1 januari 2021 is Brexit een feit en loopt er een douanegrens tussen de EU en het VK. Die douanegrens zorgt voor heel wat bijkomende formaliteiten en procedures en heeft ook een grote impact op de logistieke operaties. Voor heel wat bedrijven zijn de douaneformaliteiten een nieuw gegeven en vaak een bron van</p>
------------------------	--

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

frustratie. Met deze opleiding verwerf je inzicht in de procedures en worden oplossingen voor praktische operationele hindernissen besproken.

Doelgroep

- Deze opleiding is bestemd voor iedereen die zaken doet met het Verenigd Koninkrijk en geen of onvoldoende ervaring heeft met douanewetgeving en -processen
- Belgische producenten die uitvoer realiseren naar het Verenigd Koninkrijk
- Belgische bedrijven (geen eigen productie) die goederen invoeren en vervolgens verdelen in Europa en het Verenigd Koninkrijk
- Transporteurs en consolidators die worden geconfronteerd met logistieke problemen
- Boekhouders accountants
- Studenten/cursisten die een logistieke of accountantopleiding volgen (logistiek bediende, assistent-douanedecarant, boekhouder enz)

Aantal sessies (1 sessie = 4 uur van 50 min) 2 sessies

- Professionelen: 1 volledige dag inclusief catering
- Pre-starters/studenten in OT-opleidingen: 2 halve dagen

Didactische aanpak Klassikale lessen, inspelen op concrete cases en vragen van cursisten

3. Help desk Brexit

In de periode tussen 1 januari 2021 tot en met 29 november 2022 kreeg de Brexit Helpdesk 979 Brexit-gerelateerde vragen. De meeste aanvragen kwamen binnen via onze e-mailadressen (brexit@vlaio.be/brexit@fitagency.be).

De vragen die telefonisch zijn binnengekomen worden achteraf in het systeem opgevolgd en worden in de vragen weergegeven met schriftelijk antwoord.

Op 5 mei 2022 organiseerde het BAR-team (Brexit Adjustment Reserve) het kick off-evenement voor de subsidie-oproep. Er waren een 100-tal Vlaamse bedrijven aanwezig uit verschillende sectoren. Na het plenaire gesprek over de BAR-subsidie namen de bedrijven deel aan een netwerkevent met gelegenheid voor individuele afspraken met de BAR-projectadviseurs. In november van dit jaar organiseerde het BAR-team nog bijkomende zitdagen in elke Vlaamse provincie.

Tot nu toe zijn er in de Brexit helpdesk VLAIO 183 bedrijfsprojecten en 128 overheidsprojecten in het E-loket van de BAR.

4. West-Vlaanderen Ontwrichte Zone

Er zijn op basis van de monitoring tot einde 2022 geen economische indicatoren (collectief ontslag) gevonden die dergelijke zone kunnen rechtvaardigen.

5. Oproep Ondernemerschap

In 2022 (stand van zaken, november) is er 678.790,79 euro aan de participanten (VOKA, Unizo, Agoria, Netwerk Ondernemen) uitgereikt, dit op een streefdoel (als het vooropgezette aantal deelnemers gehaald wordt) van 2.963.341,14 euro.

6. Green Lane

Het 'green lane' programma is geëvolueerd naar Gateway2Britain programma. Daarvoor zijn haalbaarheidsstudies van VIL en Deloitte zo goed als afgerond en uitbetaald van het budget dat in de VV enveloppe van VLAIO zit voor BAR doeleinden.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Nu komt er een implementatiefase waarvoor wij twee projectaanvragen verwachten in de loop van de komende dagen. Die twee budgetten zitten in algemene BAR budget buiten begroting (dus niet in VV enveloppe).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitbreiding Contract Ondernemersschap & DYZO,	2021 Q2	Gerealiseerd	
Gerichte Transformatie Opleidingen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Green Lane. Eerste deel studie aangevat	2021 Q2	Gerealiseerd	
Versterken/aantrekken/behoud investeringen door extra middelen aan te bieden. Eerste dossier goedgekeurd	2021 Q2	Op schema	
Brexit Helpdesk - aanwerving extra personeel	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opleidingen Syntra. Eerste opleidingen aangevat	2021 Q3	Gerealiseerd	
VLAIO Contract Ondernemerschap. Eerste contracten getekend	2021 Q3	Gerealiseerd	
Versterking Brexit Helpdesk	2021 Q3	Gerealiseerd	
Post-Brexit Veerkrachtsubsidie.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Brexit Veerkrachtsubsidie	2022 Q2	Gerealiseerd	
Flanders Green Lane	2022 Q4	Gerealiseerd	
Versterken (directe en indirecte) STS en STRES Aantrekken of behoud van investeringen	2022 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
West-Vlaanderen Ontwrichte Zone	2022 Q4	Gerealiseerd	Wordt voorzien in verdere opvolging
Ontwrichte Zones in Vlaanderen	2022 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.364.000 EUR
Uitvoering VEK	3.714.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 50.000.000 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 18 december 2020

19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur

VV110 - CONGRES (5 MEUR BBV)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Belanghebbenden	Lokale besturen, brede MICE-sector, toeristische logies

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Door de COVID-crisis zijn bestaande trends op vlak van MICE-toerisme in een stroomversnelling terechtgekomen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan hybride events, het belang van belevingstoerisme, ... Om de concurrentiepositie van Vlaanderen als MICE-bestemming te vrijwaren, wil dit project focussen op capaciteits- en kwaliteitsverhoging van bestaande MICE-infrastructuren en nieuwbouw waar nodig. Waar mogelijk wordt ook een culturele nevenbestemming nagestreefd. De deelprojecten zullen als publiek-private samenwerking worden uitgevoerd.</p> <p>4 x 5 MEUR beschikbaarheidsvergoedingen</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	20.000.000 EUR
Output	<p>Met de realisatie van de deelprojecten binnen dit project, wensen we de kwaliteit van de infrastructuur te verhogen. Hierbij wordt specifiek ingespeeld op het gegeven dat meetings en congressen in de toekomst vaak een 'digitale' component zullen hebben. Deze hybride events waar een deel van de bezoekers fysiek aanwezig zullen zijn en een deel via digitale manier aanwezig kunnen zijn, vergen de nodige kwaliteitsvolle infrastructuur.</p> <p>Naast het element van de hybride events, willen we ook de beleving die de bezoeker krijgt te versterken.</p>
Outcome	Het aantrekken van extra bezoekers naar Vlaanderen en (associatie)congressen zorgt voor economische meerwaarde voor Vlaanderen en zorgt op deze manier ook voor extra tewerkstelling.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Binnen het project VV110 zijn volgende projecten, na Corda campus, goedgekeurd door Vlaamse regering om ondersteuning te krijgen:

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>- Smaakhaven in Antwerpen (38 mio) - Be-Nature (4,45 mio) - Nekkerhal in Mechelen (10 mio) - Wielerhub in Oudenaarde (6 mio).</p> <p>Deze projecten zijn eind 2022 goedgekeurd en de realisatie van deze projecten start in 2023.</p> <p>Project VV110 werd initieel geraamd op 100 miljoen euro investeringen voor Congresinfrastructuur gespreid over een looptijd van 20 jaar, waaronder 20 miljoen euro aan relancemiddelen. Dit zou worden bewerkstelligd via een publiek-private samenwerking waarbij een terbeschikkingstellingsvergoeding van 5 miljoen euro per jaar zou worden ingeschreven. Deze PPS-formule bleek niet opportuun en werd verlaten voor een aanbesteding. Als gevolg werd het gehele bedrag verminderd met 29 miljoen euro maar werd de vastlegging wel naar voren getrokken ten belope van 70,457 miljoen euro. Gegeven de onderbenutting op andere relanceprojecten werd afgesproken dat dit met relancemiddelen kon worden vastgelegd en werd een overbenutting van 50,457 miljoen euro toegestaan bij de herverdeling.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opzetten projectgroepen voor de verschillende infrastructuurprojecten	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing Vlaamse regering	2022 Q3	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	20.000.000 EUR
Uitvoering VAK	70.457.000 EUR
Uitvoering VEK	2.400.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 20.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Goedkeuring VR op 6 mei 2022 Corda Campus: subsidie project Corda Arena](#)

[Beslissing van de VR van 9/12/2022 tot beperking vastleggingskredieten congresinfrastructuur](#)

VV111 - HEFBOOMRELANCEPROJECTEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Toerisme Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	Toerisme Vlaanderen - Agentschap Onroerend Erfgoed - Departement Cultuur, Jeugd en Media - Agentschap Natuur en Bos
Belanghebbenden	Provinciale en lokale besturen, publieke en private toeristische actoren, erfgoedgemeenschappen, binnen- en buitenlandse bezoekers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	19. Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het project beoogt gerichte investeringen te doen in toeristische infrastructuur. Hierbij wordt enerzijds gemikt op investeringen die op korte termijn leiden tot economisch herstel van onze sector, kwaliteitsverbetering van ons aanbod, aantrekken van binnen- maar vooral ook buitenlandse. Anderzijds wordt ook gekeken naar inspanningen gericht op de langere termijn (bv aanpassen wetgevend kader, oproepen voor meerjarige investeringen in duurzaamheid, opbouw van netwerken van sites maar ook van verhalen en van partners).</p> <p>Deze middelen worden ingezet op infrastructuurprojecten die het potentieel hebben om op beide vlakken een hefboomeffect te realiseren. Daarbij dient vermeld te worden dat elke euro (overheids)investering in toerisme een multiplicatoreffect heeft voor andere delen van de economie (bvb de bouw, de retail, IT, diensten, de maakindustrie, de landbouw, de creatieve industrie etc). Er bestaat geen onderzoek over de totale impact maar deelstudies over economische return (omzetgroei, jobcreatie etc) geven grofweg een multiplicator van vier (cfr studies return Herdenking WO1 en tussentijdse resultaten Vlaamse Meesters). Dus elke euro geïnvesteerd in toerisme worden er vier in onze ruimere Vlaamse economie. Investeren in het zakentoeisme heeft een aanzienlijk hogere return in spenderingen (x 2,5) dan in vrijetijdstoerisme, maar de tendens is dat de grens tussen beiden vager wordt (impact op spenderingen nog niet gekend). Effecten van investeringen in toerisme zijn bovendien niet enkel economisch, maar ook breed maatschappelijk, cultureel, sociaal,...</p> <p>Inhoudelijk wordt hierbij in de eerste plaats gekeken naar projecten die aansluiten bij de thematische krachtlijnen uit de beleidsnota toerisme. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden om deze thema's versneld en versterkt uit te rollen.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	51.500.000 EUR
Output	Zowel via gerichte investeringen als de oproepen wensen we een kwaliteitsopwaardering te doen van de toeristische infrastructuur. De kwaliteit zal gemeten worden door de tevredenheid van de bezoeker te bevragen over de beleving na realisatie.
Outcome	Kwalitatieve belevingen in toeristische infrastructuur zorgt voor het aantrekken van buitenlandse bezoekers en voor een meerwaarde voor de bewoners. Ook de toeristische ondernemers zullen een meerwaarde

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	ondervinden. In lijn met de visie van Toerisme Vlaanderen zal er gestreefd worden naar een evenwicht tussen de meerwaarde voor de bezoeker, bewoner, ondernemer en de plek zelf.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Toerisme Vlaanderen heeft de verschillende subsidieoproepen in het kader van VV111 begin 2022 gelanceerd. Eind 2022 zijn alle indieners op de hoogte gebracht van de beslissing ivm hun dossier. Alle dossiers die ondersteuning krijgen worden in 2023 opgestart.</p> <p>Volgende projecten hebben ondersteuning gekregen vanuit de relancemiddelen binnen VV111 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 toegangspoorten van het NPHK. (in totaal 10.986 keuro. Er is 1,5 miljoen extra vanuit VV102 toegewezen) - Vlaamse meesters in situ (500 keuro) - Vlaamse renaissance in Mechelen (2.970 keuro) - l'impressions (700 keuro) - de Notelaer in Bornem (400 keuro) - abdij site van Herkenrode (5.000 keuro) - Sint-godelieve-abdij (4.250 keuro) - Landschap als getuige (WOI) (2.500 keuro) - Jong koersgeweld in Tremelo (820 keuro) - project Vesalius in Leuven (1.400 keuro) - EK wielrennen (3.478 keuro) <p>Deze projecten zijn eind 2022 opgestart of worden begin 2023 opgestart.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring verdelingsplan relance toerisme	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing Vlaamse regering (diverse beslissingen voor directe investeringen en de subsidieoproepen)	2022 Q3	Op schema	
Beslissing begunstigden subsidieoproepen	2022 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	51.500.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	51.208.000 EUR
Uitvoering VEK	3.296.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 51.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van recreatief en sportief fietsen en bierbeleving</p> <p>Reizen naar morgen. Mijn beleid Onze relance. Brochure</p> <p>De Vlaamse Regering. Relanceplan voor de toeristische sector</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 11 maart 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relance projectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van recreatief- en sportief fietsen en bierbeleving</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van recreatief en sportief fietsen en bierbeleving</p> <p>Advies van de Raad van State van 2 maart 2022</p> <p>VR 1 april 2022 - Verlenging subsidie Westtoer in kader van WOI-themajaar Westhoek 2023 'Landschap als getuige'</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 22 april 2022. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van Vlaamse Meesters, natuur en culinaire belevingen</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van Vlaamse Meesters, natuur en culinaire belevingen</p> <p>Advies van de Raad van State van 13 april 2022</p> <p>Reizen naar morgen. Mijn beleid. Onze relance. Brochure</p> <p>Relanceplan voor de toeristische sector</p> <p>VR 15 juli 2022 - Hefboomrelanceproject 'Jong Koersgeweld' Toerisme Vlaams-Brabant</p> <p>VR 15 juli 2022 - Subsidiëring toeristische toegangspoorten</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

VR 15 juli 2022 - Hefboomrelanceprojecten 'onthaalpaviljoen De Notelaer' en 'Mechelen, hoogtepunten van de Bourgondische renaissance'

VR 10 november 2022 - Subsidie hefboomrelanceproject 'commanderij Gruitrode' in Oudsbergen

[Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 tot toekenning van subsidie aan het hefboomrelanceproject Commanderij Gruitrode in Oudsbergen in het kader van het plan Vlaamse Veerkracht](#)

[VR 10 november 2022 - Subsidie gemeente Houthalen-Helchteren voor hefboomrelanceproject 'LIMPRESSIONS'](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 november 2022. Vlaamse Meesters in situ \(werktitel\)](#)

VR 25 november 2022 - Subsidie aan Brugge Foundation voor financiering werkzaamheden (herbestemming) Sint-Godelieveabdij

VR 9 december 2022 - Financiering Europees kampioenschap wielrennen op de weg 2024

VR 9 december 2022 - Subsidie Katholieke Universiteit Leuven voor financiering hefboomrelanceproject 'Vesalius'

VR 9 december 2022 - Projectsubsidie stad Mechelen voor werkzaamheden realisatie Congres- en evenementencentrum Mechelen

VR 9 december 2022 - Subsidie Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) voor financiering hefboomrelanceproject 'be-NATURE'

VR 9 december 2022 - Subsidie stad Antwerpen voor financiering werkzaamheden voor realisatie Vlaams Culinair Centrum

VR 9 december 2022 - Subsidie toeristische projecten 'Vlaamse Meesters', 'Natuur' en 'culinaire belevingen'

VR 9 december 2022 - Subsidie toeristische projecten 'recreatief- en sportief fietsen' en 'bierbeleving'

VR 9 december 2022 - Uitbouw van de 'Cycling in Flanders'-wielerhub in Oudenaarde door Toerisme Vlaanderen

VR 20 januari 2023 - Hefboomrelanceprojecten: subsidiëring toeristische toegangspoorten Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan gemeente Zutendaal tot financiering van het hefboomrelanceproject 'Belevingscentrum biodiversiteit Lieteberg' in het kader van het plan Vlaamse Veerkracht Materiële rechtzetting

20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs

VV112 - VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Belanghebbenden	Instellingen hoger onderwijs

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	20. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het Voorsprongfonds zal ons hoger onderwijs sterker, flexibeler en digitaler maken. In de toekomst zal het digitale immers nog veel meer dan vandaag een rol spelen in onze samenleving. De coronacrisis heeft ons een gouden kans gegeven daarop in te zetten. Bovendien zijn we ons tegelijk ook bewust geworden van het onmisbare belang van het tastbare en het fysieke in ons leven. Het komt er nu op aan daar ons voordeel mee te doen.</p> <p>We vertrekken vanuit de kansen die zich postcorona voordoen en pakken tegelijkertijd de structurele uitdagingen aan. We mikken op vernieuwingen die het hoger onderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte/maatschappelijke focus, een focus op levenslang leren en een 21ste eeuwse, digitaal karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en verduurzaming staan voorop. Om deze ambitie waar te maken richten we ons op 3 inhoudelijke speerpunten :</p> <ol style="list-style-type: none">1. De uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio dat toekomstbestendig en wendbaar is Binnen dit speerpunt zullen we inzetten op de implementatie van trajecten die leiden naar een toekomstbestendig en wendbaar opleidingsportfolio in alle hogeronderwijsinstellingen, de heroriëntering van curricula en een breed proces naar een nieuwe profilering van hoger onderwijs in Vlaanderen.2. Veel meer mogelijkheden aanreiken om levenslang te leren binnen het hoger onderwijs Binnen dit speerpunt kunnen hogeronderwijsinstellingen concrete initiatieven vormgeven die zich richten op het (her)ontwerpen van hun opleidingsaanbod om het toegankelijk en wendbaar te maken met het oog op levenslang leren. Daarnaast zal er werk gemaakt worden van Vlaamse visie rond levenslang leren in hoger onderwijs.3. Volop inzetten op digitale onderwijsvormen Het Voorsprongfonds wil onderwijsinstellingen ondersteunen bij het kwaliteitsvol verduurzamen van nieuwe werkvormen binnen het hoger onderwijs waarbij een ideale mix van fysiek onderwijs op de campus en digitaal onderwijs op afstand wordt nagestreefd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	60.000.000 EUR
Output	7 instellingen voor hoger onderwijs hebben gebruik gemaakt van het Voorsprongfonds Hoger Onderwijs (RFF mijlpaal)
Outcome	Visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs (RFF mijlpaal) Met het Voorsprongfonds wil de Vlaamse Regering instellingen aanzetten om zich anders te organiseren, zodat hun aanbod toekomst gericht en wendbaar is, en klaar voor de uitdagingen die zich de komende jaren nog zullen stellen. Zo wil de Vlaamse Regering, samen met de instellingen voor hoger onderwijs zorgen voor kwaliteitsvol, rationeel aanbod, dat toekomstbestendig, wendbaar, duurzaam en digitaal is.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Met het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' (VV112), zoals gewijzigd op 17 december 2021, heeft de Vlaamse Regering de toekenning van projectmiddelen voor de projecten, uitgevoerd door de instellingen hoger onderwijs opgestart. De projectuitvoering hiervan loopt verder. Daarnaast werd, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 april 2021, betreffende het opzetten van een Beheers- Controle en Auditsysteem bij de projecten ingediend in het kader van de Europese Faciliteit voor Veerkracht en Herstel, een beheers- en controlesysteem uitgewerkt en goedgekeurd. In de zomer werd gestart met de voorbereidingen voor het opstarten van een visietraject die opgenomen werd als mijlpalen, nl, een visie op levenslang leren in het hoger onderwijs. Deze laatste activiteit kent beperkte vertraging, door beperkte interne capaciteit. De einddatum komt hierdoor niet in het gedrang.</p> <p>Binnen het project was een tussentijdse projectevaluatie voorzien. Gezien de beperkte looptijd van het project, en om de administratieve lasten bij de instellingen hoger onderwijs te beperken, werd hier geen actief gevolg aan gegeven. Wel kunnen projecten, via de stuurgroep Voorsprongfonds, aanvragen indienen voor beperkte budgettaire projectverschuivingen. Dit verloopt conform de procedure beschreven in het BCS voorsprongfonds.</p>
Noodzakelijke politieke actie	geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De Vlaamse Regering keurt de visienota Voorsprongfonds hoger onderwijs goed.	2021 Q1	Gerealiseerd	
De Vlaamse Regering kent de projecttoelages goed, op basis van plannen ingediend door de hogescholen en universiteiten.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Het traject voor de opmaak van een visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs is opgestart.	2022 Q2	Op schema	de voorbereiding voor deze mijlpaal werd opgestart.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
7 instellingen voor hoger onderwijs hebben deelgenomen aan het Voorsprongfonds. (RFF mijlpaal)	2023 Q4	Op schema		
De visienota voor een toekomstgericht, flexibel en digitaal hoger onderwijs is beschikbaar en goedgekeurd door de minister, bevoegd voor hoger onderwijs.	2023 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal instellingen die deelnemen aan het VPF	7	2023 Q4		50 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	60.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	60.000.000 EUR
Uitvoering VAK	59.271.000 EUR
Uitvoering VEK	3.144.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 53.800.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' (VV112)</p> <p>Besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2021 betreffende de toekenning van projecttoelagen in het kader van het Voorsprongfonds, in uitvoering van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' (VV112)</p> <p>Beslissing van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021: Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, voor het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 26 februari 2021. Visienota. Voorsprongfonds hoger onderwijs</p> <p>Visienota Voorsprongfonds Hoger Onderwijs. Bijlage</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, tot het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds](#)

[Oproep tot het indienen van een plan, door de hogescholen en universiteiten, tot het bekomen van een projecttoelage in het kader van het Voorsprongfonds. Bijlage](#)

21. Digitalisering zorgbeleid

VV113 - BLENDED-CARE JEUGDHULP - BANDBREEDTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Digitaal Vlaanderen - Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Jongeren, gezinnen, netwerk van een jongere of een gezin Agentschap Opgroeien Private welzijns- en jeugdhulpvoorzieningen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Tijdens Corona hebben de digitale kanalen versneld ingang gevonden in zorg en welzijn. Online-begeleiding staat 'an sich' ook niet meer ter discussie. De oplossingen die men tijdens de eerste Corona-golf koos waren pragmatisch en dienden het hogere belang 'beter op deze manier contact, dan geen contact', maar waren niet informatieveilig, noch privacy-proof en ook niet geïntegreerd in het begeleidingsproces.</p> <p>Met het project Bandbreedte willen we onze ondersteuning binnen de jeugdhulp verbreden en versterken. Dat zorgt letterlijk voor extra bandbreedte. Méér manieren om onze jongeren te ondersteunen en bredere wegen om bij Jeugdhulp terecht te komen, zowel online als offline. We willen blended werken duurzaam ingang laten vinden in de jeugdhulp in Vlaanderen en de jongeren en hun gezin transparantie bieden over eigen gegevens en in hun kracht zetten. Daarmee streven we volgende 4 doelstellingen na:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Digitale vormen van contact zoals chatten en beeldbellen zijn vandaag meer en meer ingeburgerd in het leven van jongeren en ouders. Deze vormen van contact verlagen de drempels en maken contact mogelijk op momenten dat dit omwille van afstand, tijd of andere redenen (bv. een gezondheids crisis) niet mogelijk is. Binnen de hulpverlening blijft er zeker een grote nood aan reële (face to face) nabijheid. Digitale contacten kunnen en mogen deze nabijheid nooit vervangen, maar kunnen wel versterkend werken. Tegelijk moet, wanneer gekozen wordt voor digitale instrumenten, eenzelfde veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Een hulpverleningsgesprek wordt ook niet georganiseerd op plaatsen waar iedereen kan meeluisteren. Daarom investeren we in veilige beeldbeltools en chatfuncties.2. De digitale transformatie naar blended care staat nog maar aan het begin. Online tools creëren een heel nieuw gamma aan mogelijkheden. Ze verrijken de hulpverlening, ondersteunen de face to face-contacten, vergroten de autonomie van jongeren en hun ouders. Het zijn instrumenten om jongeren en ouders te empoweren, ook op momenten dat de hulpverlener niet aanwezig is. Blended care sluit nauw aan bij de leefwereld van de jongere, versterkt het eigenaarschap en maakt hulpverlening aangenamer en doeltreffender. Blended care houdt ook risico's in op versnippering, datalekken, gebrek aan transparantie. Iedere app of website is hopelijk beveiligd op zichzelf, maar

PROJECTOMSCHRIJVING

voor jongeren betekent dit vooral zich telkens opnieuw aanpassen, aanmelden, een andere gebruikerservaring etc. Dit is een cruciaal aandachtspunt als we blended care echt willen laten slagen. Daarom investeren we in blended care en het opzetten van een changetraject binnen de sector jeugdhulp.

3. Transparantie en toegankelijkheid van eigen gegevens zijn basisrechten. We willen de regie over die gegevens veel meer in eigen handen van jongeren geven. Het zijn immers hun eigen gegevens. Jongeren zullen zelf ook mee kunnen bepalen wie welke gegevens over hen te zien krijgt. We werken aan een schakelbord waarin ze die toegangen zelf kunnen beheren. Daarom investeren we in een "jongerenprofiel"(burgerprofiel) binnen ikgroeio.be.

4. Gezinnen en jongeren vragen naar geïntegreerde samenwerking tussen hulpverleners, en vragen ook dat dit in alle transparantie en met betrokkenheid van henzelf gebeurt. Deze transparantie en samenwerking moet ook een vertaling krijgen in een digitale gedeelde werkruimte. We maken een grondige analyse samen met de stakeholders over welke tools en kwaliteitseisen er nodig zijn om goed digitaal te kunnen samenwerken. Daarbij zijn snelle en vlotte verbindingen en uitwisseling met onze eigen systemen noodzakelijk. Daarom investeren we in digitale werkruimtes die samenwerking vergemakkelijken.

Bij het bereiken van deze 4 doelstellingen zal maximaal ingezet worden in de integratie in bestaande zorginformatiesystemen en zullen ook de mogelijkheden om het breder in te zetten in het welzijnslandschap in Vlaanderen bekeken worden.

Bij digitale zorginnovatie moet naast de technische ontwikkeling altijd 75% van de middelen geïnvesteerd worden in de sociale adoptie van deze digitale zorginnovatiesystemen. E-inclusie staat hier voorop als belangrijk designprincipe. De 4 belangrijke pijlers (toegang, motivatie, digitale vaardigheden & ondersteuning) van E-inclusie worden dus meegenomen in het plan van aanpak van iedere doelstelling op zich. Project breed investeren we dus in het opzetten van een communicatie en changetraject en zetten we een participatiepool op van jongeren en hun sociaal netwerk.

Waar mogelijk leggen we intersectorale linken om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none">- Tegen eind 2023 kunnen alle jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen veilig online communiceren met elkaar.- Tegen eind 2023 hebben minstens 70% van alle gesubsidieerde jeugdhulporganisaties van opgroeien (202 voorzieningen) een trekker of mediacoach die mediawijsheid intern en extern opvolgt- Tegen eind 2023 heeft van de 202 gesubsidieerde instellingen jeugdhulp waarin ongeveer 10 000 medewerkers tewerkgesteld zijn heeft minstens 10% van de werknemers één of meerdere modules blended-care competenties gevolgd en binnen minstens 50 % van de gesubsidieerde instellingen heeft één werknemer een train-the-trainer in huis inzake de mix van de verschillende modules blended-care.- Tegen eind 2023 is een advies gegeven en heeft het agentschap Opgroeien zijn positie bepaald inzake het gebruik van een gedeelde digitale werkruimte voor jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en de hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen- Tegen eind 2023 kunnen alle jongeren in Vlaanderen vanaf 12 jaar inloggen in mijnburgerprofiel en via hun jongerenprofiel hun gegevens inzake de jeugdhulp inkijken- Tegen eind 2023 is het duidelijk voor jeugdhulpactoren welke rol het agentschap Opgroeien zal innemen inzake het gebruik van een digitale werkruimte.
Outcome	<ul style="list-style-type: none">- Veilig online communiceren voor jongeren, ouders, pleegouders, het sociaal netwerk en hulpverleners binnen de jeugdhulp in Vlaanderen- De blended hulp competenties; mediawijsheidscompetenties en e-inclusiecompetenties verhogen binnen

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	<p>de jeugdhulporganisaties in Vlaanderen om zo de digitale transformatie binnen de jeugdhulp verder te realiseren en te implementeren. Het opleiden van mediacoaches en blended-care coaches binnen jeugdhulporganisaties en het beschikbaar stellen van ondersteunende info en materiaal is hierin cruciaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Snelle toegang en transparantie tot eigen gegevens in de jeugdhulp realiseren. - Hulpverleners en gezinnen kunnen veilig gegevens delen met elkaar en samenwerken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>In de laatste fase van de vastleggingen werd werk gemaakt van het financieel plaatje van de uitvoering van de roadmap in kader van het ontwikkelen van het platform Parkour en werden de nodige bijbestellingen gedaan en stappen gezet in kader van het changetraject van de sector. Hierbij wordt verder ingezet op het verhogen van het digitaal zelfvertrouwen van de jeugdhulpprofessional, de digitale competenties, media coachen digitale inclusie en het blended werken met jongeren en gezinnen. Alle evoluties worden gecommuniceerd via www.opgroeien.be/bandbreedte en op de 3 maandelijks online netwerkmomenten van Bandbreedte.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Vorbereiding: Opmaken van plan van aanpak	2021 Q2	Gerealiseerd	
Algemeen: kaderovereenkomst afsluiten met Digitaal Vlaanderen voor digitale strategie en roadmap	2022 Q1	Gerealiseerd	
Pijler 2: bijbestelling digitale competenties - focus op implementatie in hogescholen	2022 Q4	Gerealiseerd	Deze bijbestelling werd geplaatst
pijler 2: bijbestelling plaats in kader van ontwikkelen materiaal	2022 Q4	Gerealiseerd	daar we merken dat praktisch materiaal/ tools meer aanvaard worden door de sector wordt hierop ingezet i.p.v. op kaders en werd hiervoor een bijbestelling geplaatst
Pijler 2: Mediacoach opleiding - bijbestelling opleiding, terugkomdagen, verdiepingstraining en publicatie	2022 Q4	Gerealiseerd	Een extra bijstelling werd geplaatst
Pijler 2: Changetraject - er wordt een gunning uitgeschreven en toegekend om outreachend te werken om het	2023 Q1	Op schema	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
digitaal zelfvertrouwen te vergroten naar de jeugdhulpprofessionals			
Pijler 2: Organisatie terugkomdag 1 mediacoach	2024 Q4	Op schema	
Pijler 2: Specialisatie opleiding(en) Mediacoach	2025 Q4	Op schema	
Pijler 2: Acties om het digitaal zelfvertrouwen bij jeugdhulpprofessionals te verhogen	2025 Q4	Op schema	
Pijler 2: Overleg met hogescholen inzake het duurzaam implementeren van digitale competenties bij sociale professionals	2025 Q4	Op schema	
Pijler 2: publicatie boek: ervaringen verschillende projecten - sluitstuk	2026 Q1	Op schema	
Algemeen: Schrijven en agenderen eerste nota Vlaamse Regering van het project Bandbreedte	2021 Q2	Gerealiseerd	
pijler 1: opmaak roadmap veilig online communiceren (ism Digitaal Vlaanderen)	2022 Q3	Gerealiseerd	Opgenomen in de blauwdruk digitale strategie en onderdeel van platform PARKOUR voor jongeren, gezinnen en ondersteuners
pijler 1: start uitvoering roadmap veilig online communiceren	2022 Q4	Gerealiseerd	Onderdeel van de digitale strategie + roadmap ism met digitaal Vlaanderen en PWC
Pijler 1: Gebruikersonderzoek door Ipsos in samenwerking met digitaal Vlaanderen inzake gebruikerservaringen inzake online communiceren	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 1: Rapport Ipsos inzake de gebruikerservaring van jongeren en hun sociaal netwerk inzake online communicatie en beschrijving van de vereisten inzake de communicatieoplossing	2021 Q4	Gerealiseerd	
pijler 2: kick off: bekendmaking bandbreedte voor jeugdhulpsector	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 14 februari was de kick-off Bandbreedte. Meer dan 240 deelnemers waren aanwezig
Pijler 2: Schrijven van overheidsopdracht "organiseren van	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
mediacoach opleidingen" en publiceren ervan			
Pijler 2: Schrijven en publiceren van overheidsopdracht voor het oprichten en begeleiden van een adviesgroep om te komen tot een voorstel van visie en positionering van blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Schrijven van overheidsopdracht en publiceren ervan voor het ontwikkelen van materiaal inzake mediawijsheid en e-inclusie dat de sector jeugdhulp kan gebruiken in de zorgtrajecten van jongeren en ouders	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Schrijven overheidsopdracht "het ontsluiten en implementeren van veilige digitale tools om blended werken binnen de jeugdhulp te versterken" en het publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Schrijven en publiceren van bestek voor het verhogen van digitale competenties bij jeugdhulpmedewerkers in online en blended hulpverlening.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: uitschrijven overheidsopdracht "Ontwikkelen van kaders voor organisaties jeugdhulp" en het publiceren ervan	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning van bestek voor het oprichten en begeleiden van een adviesgroep om te komen tot een voorstel van visie en positionering van blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning van bestek ontwikkelen van materiaal inzake mediawijsheid en e-inclusie dat de sector jeugdhulp kan gebruiken in de zorgtrajecten van jongeren en ouders	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Pijler 2: Gunning van bestek "Ontwikkelen van kaders voor organisaties jeugdhulp "	2021 Q4	Stopgezet	Omwille van langdurige afwezigheid expert werd dit voorlopig uitgesteld en werd de gunning on-hold gezet. We beslisten om dit ook niet terug op te nemen daar we merken dat de toolbox digitale inclusie al de nodige handvaten biedt aan de jeugdhulpsector en bieden hier nu specifiek webinars rond aan.
Pijler 2: Gunning bestek "het ontsluiten en implementeren van veilige digitale tools om blended werken binnen de jeugdhulp te versterken"	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning bestek het verhogen van digitale competenties bij jeugdhulpmedewerkers in online en blended hulpverlening.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Gunning van bestek organiseren van mediacoach opleidingen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Pijler 2: Investeren in en implementeren van blended-care jeugdhulp – integratie van zorginformatiesystemen (oplevering haalbaarheidsstudie blended care platform)	2022 Q3	Gerealiseerd	De ingeplande workshops werden uitgevoerd en de laatste gesprekken zijn afgewerkt. De haalbaarheidsstudie werd opgeleverd 30 juni 2022 en de resultaten werden meegenomen in de opmaak van de digitale strategie + Roadmap
pijler 2: opzet en lanceren portaalpagina bandbreedte	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 14 februari werd de portaalsite www.opgroeien.be/bandbreedte gelanceerd.
Pijler 3: Ontsluiting van jeugdhulphistoriek via Mijn Burgerprofiel voor minderjarigen	2021 Q4	Gerealiseerd	Op 14 februari 2022 werd dit gerealiseerd
Pijlers 4: Schrijven en publiceren van bestek voor onderzoek naar behoefteanalyse voor digitale werkruimte	2021 Q2	Gerealiseerd	
Pijlers 4: Gunning van bestek voor onderzoek naar behoefteanalyse voor digitale werkruimte	2021 Q3	Gerealiseerd	
Pijler 4: Oplevering onderzoek behoefteanalyse digitale werkruimte	2022 Q1	Gerealiseerd	
pijler 4: digitale werkruimte: proeftuinen	2022 Q3	Gerealiseerd	voorbereiding proeftuinen gestart

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
pijler 4: start uitvoering roadmap digitale werkruimte	2022 Q4	Gerealiseerd	Opstart proeftuinen vanaf najaar 2022 - momenteel lopen deze proeftuinen alsook de lerende netwerken
Algemeen: nota vlaamse regering fase 2	2022 Q1	Gerealiseerd	
pijler 4: opmaak roadmap digitale werkruimte	2022 Q2	Gerealiseerd	Onderdeel van opmaak digitale strategie + roadmap ism digitaal Vlaanderen en PWC
pijler 2: Gunning Extra modules digitale competenties	2022 Q3	Gerealiseerd	Naast de bestaande gunning waar men zich focust op chatten, beeldbellen en mailen in de jeugdhulp wordt nu ook werk gemaakt van de implementatie van blended hulpverlening, online informeren en het uitwerken van train-the-trainer pakketten.
Pijler 2: in kader van experimenten wordt een experiment en upgrade opgestart van het gebruik van de Live-city app in de jeugdhulp	2022 Q3	Gerealiseerd	Binnen de afdeling OSD gaan ze aan de slag met de live-city in hun gesprekken met jongeren en kijken ze hoe de upgrade van het product matched met hun werking. Dit is lopende en een evalueatie wordt voorzien in mei 2023 - intussen zijn er al 2 reflectiemomenten georganiseerd.
pijler 3: opmaak roadmap portaal minderjarigen (werktitel ikgroeiop)	2022 Q3	Gerealiseerd	Onderdeel van opmaak digitale strategie + roadmap die opgemaakt wordt ism digitaal vlaanderen en PWC; dit werd gerealiseerd en samengevat in het document blauwdruk voor een digitale strategie voor Opgroeien
pijler 3: ontsluiten van rekeningnummer, aangemaakt door Opgroeien in MBP	2022 Q4	Gerealiseerd	Jongeren kunnen nu al via hun burgerprofiel hun rekeningnummer van 1/3de groeipakket terugvinden als een jeugdrechter dit voor hen opgestart heeft bij plaatsing.
pijler 3: start uitvoering roadmap	2022 Q4	Gerealiseerd	Momenteel loopt hier voor de gunning om het portaalplatform te realiseren. De P5 competitie werd opgestart en de de gunning werd goedgekeurd door de IF, er werd een deelovereenkomst toegevoegd bij de kaderovereenkomst met digitaal Vlaanderen en een bestelling geplaatst bij Cronos om de nodige integraties te kunnen voorzien.
pijler 3: digitaal aanvragen van inzage in dossier via mijn burgerprofiel	2023 Q1	Op schema	Analyse met digitaal vlaanderen gestart - momenteel wordt opgezet en zijn de nodige emailadressen aan de organisaties aangevraagd waar jongeren hun inzake in dossier rechtstreeks kunnen aanvragen
Opmaak digitale Strategie + roadmap Opgroeien	2024 Q3	Gerealiseerd	Deze oefening is een samenwerking met digitaal Vlaanderen die wordt begeleid door PWC - het einddocument is een blauwdruk van de digitale strategie en er werd een roadmap uitgewerkt voor een MLP met name PARKOUR.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Pijler 2: terugkomdag 2 mediacoach	2025 Q4	Op schema			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
webpagina bandbreedte voor ontsluiten van opgeleverd materiaal: gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand. (ongeveer 10000 jeugdhulpmedewerkers)	2000	2022 Q1	2.139	100 %	
kickoff voor sector jeugdhulp	aantal deelnemers - 150	2022 Q1	247	100 %	
digitale strategie + roadmap	Oplevering document met strategie + roadmap	2022 Q3		100 %	
een roadmap digitale strategie voor Opgroeien		2022 Q3	100	100 %	
Eerste advies inzake visie blended werken in een geïntegreerd gezins-en jeugdbeleid	1 adviestekst	2023 Q1		100 %	
Met hoeveel kinderen zijn consulenten OSD binnen 1 jaar aan de slag gegaan met de live-cityapp	100	2023 Q2			
Hoeveel jeugdhulpmedewerkers volgden de module "Blended Hulpverlenening" over één jaar (e-learning/fysiek/online/webinar/lerend netwerk)	100	2023 Q4			
Aantal modules blended -care competenties die gevolgd werden door werknemers uit de jeugdhulpsector	1000	2024 Q4			
Beschikbare producten voor jongeren en ouders binnen die jeugdhulp inzake mediawijsheid en e-inclusie	50	2024 Q4			
Aantal apps voor kinderen en ouders die gescreend zijn om opgenomen te worden of niet op de welzijns-appstore	100	2024 Q4			
Hoeveel jeugdhulpmedewerkers volgden over een heel jaar de train-the-trainer opleiding -digitale competenties	70	2024 Q4			
Aantal werknemers binnen de sector jeugdhulp die een opleiding mediacoach gevolgd hebben	142	2024 Q4			

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.105.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 18 juni 2021. Blended care jeugdhulp Blended care jeugdhulp -indicatieve planning. Bijlage Nota aan de Vlaamse Regering van 4 februari 2022. Bandbreedte - Blended care jeugdhulp Kaderovereenkomst tussen het Agentschap Opgroeien, Digitaal Vlaanderen en het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen VR 22 april 2022 - Subsidie SAM vzw voor uitbouw van Onlinehulp Vlaanderen

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming VV114 - Digitale hulpverlening - kwaliteitsbevordering VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong) VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel VV116 - Elektronisch patiëntendossier - Geïntegreerd zorg en ondersteuningsplan

VV114 - DIGITALE HULPVERLENING - KWALITEITSBEVORDERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De digitale hulp- en dienstverlening nam doorheen de covid-pandemie een groot deel van de fysieke hulpverlening over. Gelukkig kon men rekenen op bepaalde expertise bij een deel van de organisaties en een deel van het personeel. Zo bleken de chat- en telefoondiensten zeer corona-proof. In andere sectoren waren er al voorzichtige experimenten met online-hulp. Vandaag heeft het gros van de hulpverleners kennis gemaakt met onlinehulpverlening. Om de mogelijkheden hiervan te benutten, maar ook om te bewaken dat de kwaliteit van deze hulpverlening ook op een hoog niveau staat, moet de ondersteuning voor opleidingen en vorming of ondersteuning voor nieuwkomers op het terrein opgedreven worden. Als digitaal een echt alternatief wil zijn, ook post corona, moet deze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen.</p> <p>Aandachtspunt: waar mogelijk leggen we intersectorale linken om over de schotten heen te komen tot een gedeelde meerwaarde.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	500.000 EUR
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ontwikkeling van een vernieuwd expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen 2) Aantal nieuwe partners die betrokken worden en nieuwe samenwerkingen die worden opgezet in het werkveld, de onderwijs- en onderzoeksector en andere steunpunten en koepels rond online en blended hulp- en dienstverlening in Vlaanderen; 3) Ontwikkeling van een onderzoeks- en ontwikkelingsportaal waardoor vraag en aanbod i.v.m. onderzoek en ontwikkeling rond online en blended hulp- en dienstverlening in Vlaanderen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 4) Het aantal beleidstrajecten dat ondersteund werd omtrent online- en blended hulp- en dienstverlening. 5) Aantal inspirerende praktijken, praktische handreikingen en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek over online- en blended werken die beschikbaar worden gesteld voor het brede werkveld via www.onlinehulp-vlaanderen.be; 6) Aantal personen bereikt met www.onlinehulp-vlaanderen.be en bijhorende communicatie-activiteiten; 7) Aantal gescreende websites en apps voor online en blended hulp voor de burger én voor de sociale, welzijns- en zorgprofessionals via www.onlinehulp-apps.be; 8) Aantal personen bereikt met www.onlinehulp-apps.be en bijhorende communicatie-activiteiten; 9) Aantal nieuwe opleidingen, vormingen, trainingen en procesbegeleidingsvormen rond “blended zorg” ontwikkeld en aangeboden via een vormingsportaal en vormingskalender via www.onlinehulp-

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	vlaanderen.be; 10) Het aantal vormingen en begeleidingen gegeven aan organisaties en professionals in zorg en welzijn.
Outcome	<p>1) Organisaties en professionals in zorg en welzijn kennen beter de weg naar het aanbod van Onlinehulp Vlaanderen rond online en blended hulpverlening;</p> <p>2) Organisaties en professionals in zorg en welzijn zijn versterkt in hun competenties op vlak van online en blended hulpverlening en bieden op een kwaliteitsvolle manier online of blended zorg en ondersteuning aan</p> <p>3) Steunpunten, koepels, federaties en belangenverenigingen zijn via een jaarlijks netwerkevenement gestimuleerd om te innoveren op het terrein van online en blended hulp.</p> <p>4) Actoren in zorg en welzijn ervaren een betere matching van hun vragen m.b.t. onderzoek en ontwikkeling voor online en blended hulp en het mogelijke aanbod.</p> <p>5) Betrokkenen bij de ondersteuning van een beleidstraject rond online en blended hulp zijn beter ondersteund in de realisatie van hun traject en bijhorende doelstellingen</p> <p>6) Er zijn meer organisaties, professionals, cliënten en burgers die op basis van hun noden de weg kennen naar een geschikte website of app voor zorg en welzijn en hiervan gebruik kunnen maken</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Tussentijdse rapportage september - december 2022</p> <p>1. WP1 - ONLINEHULP VLAANDEREN COÖRDINATIE EN REGIE</p> <p>Mijlpaal: Opstart regiegroep</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25/08 • Voorstel begroting en feedback op de offertes van de partners • Verdere definiëring rol, opdracht, besluitvorming en verantwoording regiegroep • Volgende bijeenkomst = 12/12 • Finaliseren begroting en tweede offerteronde <p>Mijlpaal: Officiële start Onlinehulp Vlaanderen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/09/2022 • Samenstelling regiegroep: <ul style="list-style-type: none"> - leden: Philippe Bocklandt (Arteheldehogeschool), Tom Van Daele (Thomas More), Annelien Mees (Howest), Herwig Claeys (online-hulpverlening.be), Olaf Minderman (Psyche) - coördinatie: Sandra Beelen (SAM) • Goedkeuring begroting project voor de periode 01/09/2022 tot en met 31/12/2024 • Opstart/doorstart teams: <ul style="list-style-type: none"> - Team Leren 29/08 en 08/09 - Team Website en Team O&O 26/08 - Team Appstore 08/09 <p>Mijlpaal: Geformaliseerde samenwerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • De overeenkomst legt de contouren van de samenwerking de taakverdeling tussen de partners en de verdeling van de budgetten vast. De overeenkomst bevat een gedetailleerde taakverdeling voor jaar dat loopt van 1 sept 2022 – aug 2023. • Start systeem om vormingstarieven gelijk te trekken en offertes gecentraliseerd op te maken vanuit het samenwerkingsverband - workflow aanbod op maat/diensten aan derden in try out tussen november 2022 en maart 2023 <p>Mijlpaal: Communicatie//contentplanning en promotie Onlinehulp Vlaanderen 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • regiegroep 12/12/2022 • aanbod en websites

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- Huisstijl: documentsjabloon, ppt sjabloon, offerteformulier: klaar
- Visitekaartjes en banner van OV: eerste ontwerp
- Start actieve communicatie over Onlinehulp Vlaanderen: januari 2023

2. WP 2 - ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Indicatoren:

1. Er is een overzicht van de matches tussen vraag en aanbod i.v.m. onderzoek en ontwikkeling voor online en blended hulp in sociaal werk, welzijn en zorg
2. Er is een bijdrage geleverd tot meer afstemming van onderzoeks- en ontwikkelinitiatieven op elkaar en op vragen uit het werkveld
3. Steunpunten, koepels, federaties en belangenverenigingen zijn via een jaarlijks netwerkevenement gestimuleerd om te innoveren op het terrein van online en blended hulp

Mijlpaal eerste editie Blender netwerkdag – innovatietafel voor online en blended sociaal welzijnswerk, welzijnswerk en zorg

- met 21 deelnemers van steunpunten koepels en belangenverenigingen
- er werden 7 onderzoeksthema's geformuleerd en geprioriteerd
- er werden 14 ontwikkelingsthema's geformuleerd en geprioriteerd
- daarnaast werden 11 nieuwe onderzoeks- of ontwikkelingsthema's geformuleerd
- er werd besproken of en hoe onderzoeks- en ontwikkelingsvragen worden gecapteerd en welke rol koepels, steunpunten en Onlinehulp Vlaanderen hieraan kan besteden
- de output van Blender wordt verwerkt en eind mei geplaatst op onlinehulp-vlaanderen.be

Mijlpaal: tweede editie Blender netwerkdag op 23/03/2023

- Nieuw concept voor Blender 2023 is uitgewerkt
- Save the date op 22/11/2022 via de SAM nieuwsbrief. Gepersonaliseerde mailings op 23/11/2022 naar de mailinglijst die is opgebouwd tijdens het inventariseren van onderzoeks- en ontwikkelvragen. De save the date gaat vergezeld van twee vragenlijsten voor praktijk en onderzoek, invulperiode is tot 15 januari. De input gaan we gebruiken voor de verdere inhoudelijke uitwerking.
- Verdere inhoudelijke uitwerking staat gepland op 17 januari 2023
- Intussen loopt de praktische organisatie van dit live-evenement (zalen, catering, etc...)
- Deadline communicatie uitnodiging op 27/01/2023

Mijlpaal: Er is een up to date inventaris van onderzoeks- en ontwikkelvragen voor online en blended hulp in sociaal werk, welzijn en zorg

- Inventaris eerste versie 10/10/2022

3. WP 3 – LEERAANBOD

Mijlpaal: Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional".

22 september 2022 in De Kriekelaar in Schaarbeek.

Programma: <https://www.samvzw.be/activiteiten/inspiratiedag-blended-aan-de-slag-als-sociale-professional>.

Doelgroep: sociale, welzijns- en zorgprofessionals die aan de slag (willen) gaan met blended hulp.

Aantal inschrijvingen:

Eerste ontwerp van de basistraining Blended hulp die in het najaar ontwikkeld zal worden. Bepalen van de leerdoelen, inhoud en mogelijkheden verkennen van blended learning en e-learning

Mijlpaal: opstart aanbod op maat (AOM) GGZ najaar 2022

- Inspiratiedag netwerkdag CGG op 8 december i.s.m Zorgnet Icuro
- Workshop onlinehulp-apps.be op GGZ-congres: 22/09/2022
- Begeleidingstraject op maat voor de CGG: december 2022 – juni 2023
- Fit for blended care > vertaling instrument naar Vlaamse context
- Procesbegeleiding en intervisie

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- Lerend Netwerk Blended werken in de CGG: 11/10/2022
- Introductie Onlinehulp-apps op de Netwerkdag Netwerken GGZ Limburg & Oost-Vlaanderen: 18/10/2022

Mijlpaal: ontwikkeling basisvorming blended werken voor GGZ

Focusgroepen ontwikkeling leeraanbod: 14 en 16 februari 2023

Piloten van leeraanbod:

Reeks 1: doelgroep zelfstandige therapeuten – 6 mei, 27 mei en 10 juni van 9.00 tot 14.00, terugkomdag op 14 okt 9.00 tot 13.00

Reeks 2: doelgroep therapeuten in loondienst - 25 april, 11 mei en 23 mei van 9.30 tot 16.00, terugkomdag op 12 okt: 9.30 tot 13.00

Lancering nieuw aanbod vanaf oktober/november 2023

Mijlpaal: Inspiratiedag “Blended aan de slag als ...”.

o.v.: We plannen een tweede Inspiratiedag op 21 september 2023

4. WP 4 – BELEIDSONDERSTEUNING

Intersectorale stuurgroep onlinehulp

- ISOH: deelname aan de stuurgroepen
- Intersectorale visieontwikkeling onlinehulp - Input en feedback Visienota Onlinehulp in beleidsdomein WVG

Ondersteuning Reva

- 19/05/2022 Overleg over ondersteuningsmogelijkheden van Onlinehulp Vlaanderen aan de revasector

Ondersteuning VAPH

- Mei 2022: Voorbereidend overleg en feedback bij het uitwerken van een bevraging van professionals over de vormings- en ondersteuningsnaden bij het implementeren van blended hulp binnen de VAPH- sector op initiatief van de Afdeling Dienstverlening Budgethouders Expertiseinbreng ad hoc werkgroep Hoge Gezondheidsraad
- De Hoge Gezondheidsraad (FOD Volksgezondheid) heeft besloten om een ad hoc werkgroep op te richten over “Het gebruik van technologie in de geestelijke gezondheidszorg” onder het voorzitterschap van Tom Van Daele (Thomas More). Start 26/01/2023. Sandra Beelen en Philippe Bocklandt nemen deel vanuit Onlinehulp Vlaanderen

5. WP 5 – APPSTORE

Indicatoren werkpakket 4

Het aantal bezoekers op www.onlinehulp-apps.be stijgt.

- Aantal bezoekers

- 1 feb: 22.311

- 11 juni: 27.508

- 6 sept: 30.250

- 23 nov: 37.259

- De afgelopen drie maanden (14/9/2022 tot 13/12/2022) hadden we 11509 bezoekers waarvan 7048 nieuwe

- Van feb 2022 tot op heden: 14.948 nieuwe bezoekers

- We hebben sinds november google analytics. In 2023 verwachten we een beter zicht te hebben op de bezoekers van onlinehulp-apps.

Het aantal nieuwe apps (exclusief de apps die voor Bandbreedte gescreend worden)

- In 2022 werden 51 apps gescreend en 40 apps online geplaatst

Tot op heden zijn er 11 favorietenpagina's in gebruik

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<ul style="list-style-type: none"> • Het is voortaan gemakkelijker voor gebruikers om een favorietenpagina aan te maken via de website: https://www.onlinehulp-apps.be/over/over-favorietenpagina-s <p>Kwaliteitscontrole Alle apps die gedurende een jaar op de appstore staan worden gecontroleerd aan de hand van een zelfevaluatietool. In 2022 werden 75 apps opnieuw gecontroleerd en goedgekeurd.</p> <p>Verbeteringen aan de appstore Nieuw richtlijnenkader voor het screeningsteam moet zorgen voor meer uniformiteit bij het taggen met als doel meer efficiënte zoekmogelijkheden voor de gebruiker en een betere toegankelijkheid van de appstore.</p> <p>De zoekfuncties, filterknoppen en sorteropties worden nagekeken op relevantie en juistheid. Er wordt ook gekeken of ze correct gekoppeld zijn aan de apps.</p> <p>Totaal aantal unieke bezoekers tussen 19 aug en 17 nov 11535, waarvan 7300 nieuwe.</p> <p>Promotie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onlinehulp-apps stand op het Netwerkevent van WINGG (GGZ-netwerk K&J West-Vlaanderen): 21/10/2022 • Onlinehulp-apps op de dag van de toekomst op 29/11/2022 <p>6. WP 6 - WEBSITE</p> <p>Het aantal bezoekers op onlinehulp-vlaanderen.be stijgt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tussen 14 september en 13 december 2022 waren er 1066 bezoekers waarvan 574 nieuwe <p>Er is een communicatiebeleid gericht op de bekendmaking en de promotie van het aanbod van Onlinehulp Vlaanderen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanaf januari 2023 starten we met een actieve communicatie vanuit Onlinehulp Vlaanderen aan de hand van ons aanbod en onze evenementen. De website vormt de centrale spil daarin. <ul style="list-style-type: none"> - 3 dossiers klaar + 4 in ontwikkeling - 2 nieuwsitems per maand > 20 tot 24 bijdragen voor 2023 - 2 events (Blender in maart en Inspiratiedag in sept) - Leeraanbod - Workflow communicatie over OV vanuit de consortiumpartners <ul style="list-style-type: none"> > Nieuwsbrieven > Sociale media • Homepagina wordt gerestyled – klaar in januari - Ontwikkeling visuals voor op de website en in de communicatie <p>De vormingskalender is verbeterd en wordt verder aangevuld</p>
Noodzakelijke politieke actie	/

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
WP6 Lancering hernieuwde website Onlinehulp-Vlaanderen	2022 Q2	Gerealiseerd	
WP1 Interne kick-off met projectleden	2022 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
WP5 Onlinehulp-apps promotie op dag van de toekomst	2022 Q3	Gerealiseerd	
WP1 Opstart regiegroep	2022 Q3	Gerealiseerd	
WP3 Inspiratiedag blended aan de slag 1e editie	2022 Q3	Gerealiseerd	
WP1 Officiële start Onlinehulp Vlaanderen	2022 Q3	Gerealiseerd	
WP2 Blender netwerkdag 1e editie	2022 Q3	Gerealiseerd	
WP2 Inventaris R&D 1e versie	2022 Q4	Gerealiseerd	
WP3 Opstart leeraanbod op maat GGZ	2022 Q4	Gerealiseerd	
WP1 Geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst	2022 Q4	Gerealiseerd	
WP1 Communicatie- en contentplanning en promotie Onlinehulp Vlaanderen 2023	2022 Q4	Gerealiseerd	
WP6 Disseminatie aanbod Onlinehulp Vlaanderen	2023 Q1	Op schema	
WP2 Blender netwerkdag 2e editie	2023 Q1	Op schema	
WP4 deelname werkgroep Hoge Gezondheidsraad technologie GGZ	2023 Q1	Op schema	
WP3 Ontwikkeling basisvorming GGZ blended werken	2023 Q2	Op schema	
WP3 Piloten en evaluatie basisvorming GGZ blended werken	2023 Q2	Op schema	
WP3 Inspiratiedag blended aan de slag 2e editie	2023 Q3	Op schema	
WP3 Lancering nieuw aanbod blended werken GGZ	2023 Q4	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Ontwikkeling van een vernieuwd expertisenetwerk Onlinehulp Vlaanderen	1	2024 Q4		
Ontwikkeling van een onderzoeks- en ontwikkelingsportaal waardoor vraag en aanbod i.v.m. onderzoek en ontwikkeling rond online en blended hulp- en dienstverlening in Vlaanderen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.	1	2024 Q4		
Aantal gescreende websites en apps voor online en blended hulp voor de burger én voor de sociale, welzijns- en zorgprofessionals via www.onlinehulp-apps.be;	60	2024 Q4		
Het aantal bezoekers op www.onlinehulp-apps.be	50000	2024 Q4		
Het aantal beleidstrajecten dat ondersteund werd omtrent online- en blended hulp- en dienstverlening.	1	2024 Q4		
Aantal personen bereikt met www.onlinehulp-vlaanderen.be en bijhorende communicatie-activiteiten;	15000	2024 Q4		
Er zijn train de trainer opleidingen voor de modules e-mail, beeldbellen en sociale media ontwikkeld.	3	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	500.000 EUR
Uitvoering VAK	500.000 EUR
Uitvoering VEK	139.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 29 april 2022 - Subsidie voor de uitbreiding van het Vlaams IT-platform BelRAI met de instrumenten sociaal supplement, BelRAI Home Care en BelRAI Long Term

VV115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Zorgactoren (overgedragen zorgsectoren zesde staatshervorming) Zorgkassen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Agentschap Vlaamse sociale bescherming

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Er zijn een aantal essentiële bouwstenen voor de inkanteling en inbedding van zorgsectoren in de Vlaamse Sociale Bescherming. Deze zijn noodzakelijk om een performant systeem uit te bouwen waarmee de doelstellingen van VSB vanuit administratief oogpunt kunnen gerealiseerd worden.</p> <p>Deze investering dient o.a. om de voorzieningen te digitaliseren om zo de sectoren die naar Vlaanderen werden overgedragen vanuit het RIZIV bij de 6de staatshervorming op eenzelfde (minimaal) niveau van informatisering te krijgen op het gebied van de basisprocessen en bijhorende applicaties (digitalisering boekhouding, facturatie, gegevensregistratie, elektronisch patiëntendossier, ...).</p> <p>Zowel de zorgaanbieders als de zorgkassen moeten ook een digitale koppeling maken met het centrale VSB- platform. Via dit platform wordt de verzekeraar binnen VSB getoetst alsook de financiering van het zorgticket en de zorgbudgetten toegekend.</p> <p>Op 10 november 2022 besliste de Vlaamse regering om een budgetverschuiving door te voeren van de VV45 naar de VV115 voor een totaalbedrag van 5.511.000 euro voor de inkanteling van de resterende RIZIV-sectoren in de Vlaamse sociale bescherming. Het gaat dan over de laatste revalidatievoorzieningen, de initiatieven voor beschermt wonen en de rolstoeladviesteams. De nota aan de Vlaamse regering is als bijlage opgenomen.</p> <p>Deze beslissing heeft geen impact op de reeds bestaande mijlpalen en indicatoren. Naar aanleiding van deze beslissing werden wel mijlpalen toegevoegd voor de projecten uit de nota.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	16.511.000 EUR
Output	De sectoren uit het overnamedecreet zijn eind deze legislatuur gedigitaliseerd. Het gaat om de volgende sectoren: de revalidatieziekenhuizen, de revalidatieconventies, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschermt wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen. De digitalisering verloopt gefaseerd (niet alle sectoren tegelijk).
Outcome	Geen papieren circuit tussen zorgkassen, voorzieningen en agentschap. Agentschap beschikt centraal over alle relevante data.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>31/12/2022 Herschikken naar VV115 eREVACfin – fase 2: 3.756.000 euro eIBWfin: 1.533.000 euro Ombouwen EMMA: 222.000</p> <p>Projectmanagement IT-projecten: 375.000 Euro</p> <p>Toestand 31/5/2022 Relancebudget: VAK 11.000.000 VEK 8.275.000</p> <p>Relance prognose in VAK en VEK: 3.225k is beschikbaar voor vastlegging in 2022 2.725k kan nog aan VEK VV 115 worden opgevraagd in periode 2022 - 2024</p> <p>Relance effectief in VAK en VEK: 1.382k uitbetaald in 2022 op overgedragen kredieten voor ontwikkeling applicaties (Smals) en subsidie aan Zorgnet Icuuro</p> <p>Toestand 31/12/2021 VAK 7.775.000 EUR VEK 6.620.000 EUR</p> <p>1.150k vastgelegd, 92k uitbetaald 500k subsidie consortium voorzieningen overnamedecreet + 650k subsidie investeringen zorgkassen</p> <p>2200k vastgelegd, 2200k uitbetaald subsidie verzekeringsinstellingen</p> <p>2225k vastgelegd, 716k uitbetaald 1475k Centrale Gemeenschappelijke Applicatie revalidatieziekenhuizen + 750k Centrale Gemeenschappelijke Applicatie revalidatieconventies eerste golf</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Digitalisering revalidatieziekenhuizen - functionele analyse	2021 Q3	Gerealiseerd	
Applicatie revalidatieziekenhuizen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Digitalisering revalidatieziekenhuizen - applicatie in productie eind december 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2021 Q3	Gerealiseerd	
Consortium: installeren stuurgroep	2021 Q4	Gerealiseerd	
Consortium: aanstellen coördinator	2021 Q4	Gerealiseerd	
Consortium: Omzetten van ICT-planning naar changemanagement: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Vertraging	Deze mijlpaal heeft vertraging en betreft een initiatief dat door derden moet worden genomen. De ontwikkeltijd is echter beperkt waardoor de finale deadline van het project niet in het gedrang komt.
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q1	Gerealiseerd	
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q1	Vertraging	Deze mijlpaal heeft vertraging en betreft een initiatief dat door derden moet worden genomen. De ontwikkeltijd is echter beperkt waardoor de finale deadline van het project niet in het gedrang komt.
VI: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q2	Gerealiseerd	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieziekenhuizen	2022 Q2	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Gerealiseerd	
VI: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2022 Q3	Vertraging	Deze mijlpaal heeft vertraging en betreft een initiatief dat door derden moet worden genomen. De ontwikkeltijd is echter beperkt waardoor de finale deadline van het project niet in het gedrang komt.
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q3	Vertraging	Deze mijlpaal heeft vertraging en betreft een initiatief dat door derden moet worden genomen. De ontwikkeltijd is echter beperkt waardoor de finale deadline van het project niet in het gedrang komt.
Consortium : Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q3	Vertraging	Deze mijlpaal heeft vertraging en betreft een initiatief dat door derden moet worden genomen. De ontwikkeltijd is echter beperkt waardoor de finale deadline van het project niet in het gedrang komt.
Consortium: Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q3	Vertraging	Deze mijlpaal heeft vertraging en betreft een initiatief dat door derden moet worden genomen. De ontwikkeltijd is echter beperkt waardoor de finale deadline van het project niet in het gedrang komt.
Voorzieningen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de	2022 Q3	Vertraging	Deze mijlpaal heeft vertraging en betreft een initiatief dat door derden moet worden

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
eigen toepassing: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen			genomen. De ontwikkeltijd is echter beperkt waardoor de finale deadline van het project niet in het gedrang komt.
Applicatie revalidatieconventies - psychische problemen	2022 Q4	Gerealiseerd	
VI: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q4	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie revalidatieconventies – psychische problemen	2022 Q4	Gerealiseerd	
Zorgkassen: Het omzetten van de specs van de centrale toepassing naar specs van de eigen toepassing: Applicaties fysieke problemen	2022 Q4	Nog niet gestart	Deze mijlpaal is 'nog niet gestart' en betreft een initiatief dat door derden moet worden genomen. De ontwikkeltijd is echter beperkt waardoor de finale deadline van het project niet in het gedrang komt.
Consortium: Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q1	Op schema	
Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q2	Op schema	
Ombouwen EMMA: analyse fase	2023 Q2	Nog niet gestart	
eRevaCfin: analysefase	2023 Q2	Op schema	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Op schema	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Op schema	
eIBWfin: analysefase	2023 Q3	Op schema	
Consortium : Omzetten van ictplanning naar changemanagement: Applicaties fysieke problemen	2023 Q3	Op schema	
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
eRevaCfin: ontwikkelfase	2023 Q3	Op schema	
VI: Het operationeel zijn: Applicatie psychiatrische verzorgingsinstellingen	2023 Q3	Op schema	
Zorgkassen: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Nog niet gestart	
eRevaCfin: oplevering	2023 Q4	Nog niet gestart	
Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Nog niet gestart	
VI: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Nog niet gestart	
eIBWfin: ontwikkelfase	2023 Q4	Nog niet gestart	
Consortium: Begeleiden van de voorzieningen bij het implementeren van geschikte it-oplossingen: Applicaties fysieke problemen	2023 Q4	Op schema	
Ombouwen EMMA: ontwikkelfase	2023 Q4	Nog niet gestart	
Voorzieningen: Het operationeel zijn: Applicaties fysieke problemen	2024 Q1	Nog niet gestart	
Ombouwen EMMA: oplevering	2024 Q1	Nog niet gestart	
eIBWfin: oplevering	2024 Q1	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	11.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	16.511.000 EUR
Uitvoering VAK	16.511.000 EUR
Uitvoering VEK	8.456.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 16.511.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Digitalisering RIZIV – sectoren](#)

[Besluit van de VR van 26/11/2021 subsidie digitalisering RIZIV-sectoren](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Digitalisering RIZIV-sectoren](#)

VV116 - ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER - GEÏNTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De patiënt moet centraal staan in de zorg. Daarom streven we ernaar om de zorg beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren van elke burger. Om deze ambitie in de praktijk mogelijk te maken, is het cruciaal dat ook de gegevensuitwisseling versterkt wordt. We investeren prioritair in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan voor de eerste lijn. Door hierbij ook samen te werken met andere betrokken actoren, vergroten we ook het vertrouwen in en het draagvlak voor dit elektronisch zorgplan bij de bevolking. Deze investeringen dragen bij tot multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling in het kader van geïntegreerde zorg. De levens- en zorg- en ondersteuningsdoelen van de persoon worden als uitgangspunt genomen. Data uit het digitaal zorg- en ondersteuningsplan zullen gedeeld kunnen worden tussen de zorgverstrekkers onderling én met de patiënt, met respect voor het medische geheim en de privacy.</p> <p>Bij de opmaak van een zorg- en ondersteuningsplan wordt rekening gehouden met de BelRAI- indicatie maar ook met de persoonlijk levens- en zorgdoelstellingen van de persoon met een zorgnood. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Vitalink als platform om data te delen.</p> <p>Dit alles moet het mogelijk maken om digitale gedeelde informatie in te zetten voor het bepalen en evalueren van het gezondheidsbeleid, bruikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van de zorg- en hulpverlening (via de ZorgAtlas). Digitale informatiedoorstroming in een uniforme taal (FHIR) tussen zorgactoren en overheid is essentieel om tot kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te komen in de hele keten van zorg en welzijn.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	33.597.000 EUR
Output	Aangeboden of ontsloten toepassingen om digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en zorggebruikers en de cliënt te faciliteren
Outcome	Efficiëntieverhoging van de zorg- en welzijnssector en versterking van patiëntveiligheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De IT-ontwikkeling voor DZOP werd gegund en kan begin 2023 opgestart worden. De aanbestedingen voor de andere deelprojecten (juridische ondersteuning, ondersteuning digitaal Vlaanderen, communicatietraject en ontwikkeling zorgteam) werden eind 2022 vastgelegd en opgestart.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Beslissing om te investeren in de verdere ontwikkeling van ZorgAtlas-platform door post COVID-19 klaar te maken en in te zetten als een volwaardige population and health and care omgeving	2021 Q3	Gerealiseerd	Verschillende bouwstenen werden opgezet waaronder de File Upload Zone (FUZ), de API, de link naar websites, het data entry platform. De eerste stappen werden hierin gezet.
Definiëren van use-cases gelinkt aan de Beleidsnota WVG 2019-2024 en gebaseerd op concrete beleidsmatige noden mho verdere uitbouw van het ZorgAtlas-platform	2021 Q4	Gerealiseerd	Onderzoeken en prioriteren welke non-COVID19 projecten kunnen opgenomen of overgezet worden naar het ZorgAtlas Data Platform.
Beslissing om te investeren in de verdere ontwikkeling van ZorgAtlas-platform door post COVID-19 klaar te maken en in te zetten als een volwaardige population health and care management omgeving.	2021 Q3	Gerealiseerd	Verschillende bouwstenen werden opgezet waaronder de File Upload Zone (FUZ), de API, de link naar websites, het data entry platform. De eerste stappen werden hierin gezet.
Definiëren van use-cases gelinkt aan de Beleidsnota WVG 2019-2024 en gebaseerd op concrete beleidsmatige noden met het oog op de verdere uitbouw van het ZorgAtlas-platform	2021 Q4	Gerealiseerd	Onderzoeken en prioriteren welke non-COVID19 projecten kunnen opgenomen of overgezet worden naar het ZorgAtlas Data Platform.
Beslissing over platform/toepassing dat elke sector/entiteit wil/zal gebruiken voor digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en de cliënt, met oog voor onderlinge mogelijkheden tot uitwisseling.	2022 Q1	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Aanbesteding Programmamanagement Digitaal Zorg & Ondersteuningsplan	2022 Q2	Gerealiseerd	Gunning aan KPMG/WhoCares? voor programmamanagement tot midden 2025. KPMG/WhoCares? werd aangesteld om het Agentschap Zorg- en Gezondheid te ondersteunen in het programmamanagement bij de ontwikkeling en uitrol van DZOP. Concreet gaat dit onder meer over ondersteuning bij het inhoudelijk uitwerken van DZOP, opvolging van de ICT ontwikkeling, belanghebbendenmanagement, etc.
Branding traject nieuwe naam DZOP app	2022 Q3	Gerealiseerd	We sloten een contract met communicatie- en brandingbureau Lemento voor het bedenken van een nieuwe naam voor DZOP.
SWO digitaal Vlaanderen	2022 Q3	Gerealiseerd	Voor de ondersteuning van het ICT-luik werd een SWO opgesteld met Digitaal Vlaanderen. De eerste fase – opmaak bestek en gunning ICT-partner – werd al opgeleverd. Voor de volgende 2,5 jaar wordt momenteel een addendum getekend voor verdere ondersteuning in bij de ontwikkeling en uitrol van DZOP.
Gunning juridische ondersteuning DZOP	2022 Q4	Gerealiseerd	We schreven een bestek uit in het raamcontract voor juridische ondersteuning. Binnen perceel 7 Privacy, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegevens en verwerking persoonsgegevens – AVG, doorgifte van persoonsgegevens, toezichthoudende autoriteit, ICT-recht, informaticamisdrijven en cybercrime, stuurden 5 aanbieders een offerte op. De beoordeling is ondertussen gebeurd en de opdracht werd gegund aan AContrario.law. Het projectplan wordt opgesteld.
Digitalisering dienst Zorgberoepen	2022 Q4	Gerealiseerd	Voor de verdere digitalisering binnen de dienst Zorgberoepen werd er een budget van 885.000 euro voorzien. Hiervan werd 148.000 euro opgevraagd én vastgelegd op basis van een SWO met Digitaal Vlaanderen voor het inhuren van change- en programmamanagement en analyse capaciteit. De overige 737.000 euro wordt dit jaar opgevraagd en vastgelegd op basis van een afroep ten belope van 232.543,86 euro via het AgO raamcontract (bestek 2019/HFB/OP/52226) voor additionele veranderingmanagement en projectmanagement capaciteit. De SWO met Digitaal Vlaanderen voor programma management en analyse capaciteit wordt verder uitgebreid, en zal ook het CRM project voor de dienst Zorgberoepen bevatten. Tot slot wordt een contract met Cronos aangegaan voor het bouwen van

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			een operationeel dashboard in lijn met de auditaanbeveling.
Ontwikkeling Zorgteam	2022 Q4	Op schema	Voor de ontwikkeling van het Zorgteam (link met Belrai) werd een BSM met Smals opgesteld. Zorgteam zal verder bouwen op de bestaande eHealthdatabanken met therapeutische relaties en toegangsrelaties voor zorgorganisaties. De bestaande systemen moeten uitgebreid worden zodat ook informele zorg (mantelzorgers) en welzijnswerkers in een zorgteam kunnen deelnemen.
Self service portaal Vlaamse Zorgkas	2022 Q4	Op schema	Voor de verdere digitalisering binnen de Vlaamse Zorgkas werd er een budget van 550.000 euro voorzien. Dit bedrag werd integraal opgevraagd, en hiervan werd 366.932 euro vastgelegd. De overige 183.068 euro wordt dit jaar vastgelegd op basis van uitbreidingen op het bestaande contract met Faros voor aanpassingen aan het Zorba platform en op basis van uitbreidingen op de bestaande SWO met Digitaal Vlaanderen om Zorba verder te ontsluiten met Mijn Burger Profiel. Tot slot wordt een SWO opgemaakt met Digitaal Vlaanderen waarop een analist zal worden ingehuurd om alle vereisten gedetailleerd in kaart te brengen.
Gunning Communicatie traject DZOP	2022 Q4	Gerealiseerd	We stelden een bestek op voor de ondersteuning op vlak van communicatie rond DZOP. De gunning werd opgemaakt en aan het communicatiebureau LDV United gegeven worden.
Gunning ICT ontwikkeling	2022 Q4	Gerealiseerd	De IT-ontwikkeling werd gegund aan DXC/Cegeka voor de ontwikkeling van de MVP tegen midden 2023 en de verdere ontwikkeling tijdens en na de pilotprojecten.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	33.597.000 EUR
Uitvoering VAK	32.285.000 EUR
Uitvoering VEK	2.923.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 33.597.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Verdere ontwikkeling Zorg Atlas en SUM in 2021](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 februari 2022. Inzit relancemiddelen voor digitalisering binnen Zorg en Gezondheid](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 8 juli 2022. Besluit van de Vlaamse Regering over de IT-investeringen van het Agentschap Opgroeien regie en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin \(Zorginspectie\) in het kader van het actieplaninspectie en handhaving kinderopvang](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Rapportering Modular 1 en Modular 2 via het ZorgAtlas Platform](#): beslissing over budgetverschuiving van 1,982 miljoen euro van VV045 naar VV116

[Nota aan de VR van 9/12/2022 over VV045 en subsidie versterking referentierol dementie in de thuiszorg en de uitbouw van referentie-artsen dementie](#): beslissing over budgetverschuiving van 1,6 miljoen euro van VV045 naar VV116

VR 20 januari 2023 - Stand van zaken uitrol digitale projecten

VV117 - ENKELBANDEN EN STRAFUITVOERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Agentschap Justitie en Handhaving
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De coronapandemie heeft een significante impact gehad op de uitvoering van de werkstraf en het aanbod aan beschikbare werkplaatsen. De aanhoudende corona maatregelen hadden als gevolg dat veel prestatieplaatsen gedurende een lange tijd gesloten bleven voor werkgestraften of met een lager aantal werkgestraften konden werken. Tegelijkertijd werden er nog evenveel werkstraffen uitgesproken en merken we dit jaar zelfs een stijging gezien er ook veel werkstraffen werden uitgesproken voor overtredingen van coronamaatregelen. In sommige regio's (voornamelijk Antwerpen, Limburg, Brussel en Leuven) vraagt deze bijzondere situatie ten gevolge van de coronapandemie dan ook bijkomende maatregelen :</p> <ul style="list-style-type: none">- Een tijdelijk en bijkomend omkaderingsaanbod bij de Stad Antwerpen: Voor de regio Antwerpen willen we aan de Stad Antwerpen de mogelijkheid geven om bijkomend 1 VTE werkvloerbegeleider niveau B tijdelijk in te zetten voor de omkadering van de werkstraffen. Het gaat om een tijdelijke periode, nl. van 1 september 2021 tem 31 december 2023. De Antwerpse begeleidingsdienst (dienst Samen Werken) bestaat reeds meer dan 10 jaar en heeft dus al een aanbod dat afgestemd is op de vraag van de partners van de strafrechtshetketen.- Een tijdelijk werkvloerproject bij vzw VOC Neteland: De afdeling Mechelen van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen signaleert dat er voornamelijk een tekort is in de regio's Heist-op-den-Berg, Berlaar en Nijlen. Met de voorgestelde subsidiemiddelen wordt aan vzw VOC Neteland de mogelijkheid gegeven om bijkomend een halftijds personeelslid in te zetten voor de uitbouw van een tijdelijk werkvloerproject, dit ter omkadering van de werkstraffen en voor een periode van 6 maanden. Er kunnen zowel door de week als in het weekend werkgestraften worden ingeschakeld voor de uitvoering van diverse taken, zoals de verzorging van dieren en ondersteuning bij de aanleg of het onderhoud van de infrastructuur.- Een tijdelijk werkvloerproject bij vzw Natuurpunt Voor de regio's Antwerpen, Borgloon, Genk en Leuven wensen we tijdelijk 1 extra VTE niveau B per regio toe te kennen gedurende een periode van 2 jaar. Met Natuurpunt Beheer vzw is er reeds enkele jaren een goede samenwerking en de organisatie beschikt over de kennis en vaardigheden om met het doelpubliek te werken. Via Natuurpunt krijgen justitiabelen de kans om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk belang in de samenleving, namelijk het beschermen van de natuur, open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu in Vlaanderen.- Mobiele werkvloerprojecten in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Limburg en Brussel We wensen in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg een mobiel werkvloerproject op te starten.

PROJECTOMSCHRIJVING

Een mobiel werkvloerproject houdt in dat er met een groep werkgestraften taken worden uitgevoerd bij externe organisaties die een nood hebben. De opdracht van het mobiel werkvloerproject is tweeledig. We verwachten dat het mobiel werkvloerproject zelf actief op zoek gaat naar taken/opdrachten bij organisaties en daarnaast zelf een planning opmaakt om deze taken met een groep werkgestraften uit te voeren.

Gezien de bijkomende nood die zich in het gerechtelijk arrondissement Brussel stelt, willen we voor deze regio inzetten op een integratie van een dispatchingsfunctie in een mobiel werkvloerproject. Enerzijds voorziet het luik dispatching in de toeleiding van de werkgestraften naar een prestatieplaats en de verdere opvolging van de werkstraffen, en anderzijds kan het luik mobiele werkvloer ondersteuning aan de andere prestatieplaatsen bieden en inspelen op opportuniteiten die zich bij externe organisaties voordoen.

- Mobiel werkvloerproject in samenwerking met OVAM in het kader van het opruimen van zwerfvuil door werkgestraften.

Op 18 juni 2021 besliste de Vlaamse regering dat de informatie met betrekking tot bestuurlijke vervolging en sanctionering voor de gehele Vlaamse regelgeving wordt opgenomen in het bestuurlijk sanctieregister en dat alle Vlaamse ministers hier hun medewerking voor verlenen. De decretale grondslag voor het sanctieregister bevindt zich momenteel in het kaderdecreet bestuurlijke handhaving van 22 maart 2019. In de toekomst zal die terug te vinden zijn in het nieuwe kaderdecreet Vlaamse handhaving, dat voor een tweede keer principieel werd goedgekeurd. Het engagement om mee te werken aan het sanctieregister, en daarbij het ruimer handhavingsplatform zoals bepaald in het kaderdecreet, staat los van de vraag of het kaderdecreet voor het overige van toepassing is op een beleidsmaterie.

Digitaal Vlaanderen ontwikkelt momenteel in samenwerking met CEGEKA het handhavingsplatform, waarop het sanctieregister en bij uitbreiding het handhavingsplatform zal draaien. De belangrijkste modules van het platform en het sanctieregister worden opgeleverd in het eerste kwartaal van 2023. Bij de ontwikkeling worden al een aantal handhavingsdiensten betrokken, zoals de wooninspectie, de Vlaamse Waterweg, het agentschap Natuur en Bos, het departement Omgeving en de sociale inspectie. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met het parket om een digitale informatie-uitwisseling en communicatie mogelijk te maken via een koppeling tussen het Vlaamse handhavingsplatform en Justinventar.

De doelstelling is om tegen eind 2023 alle Vlaamse handhavingsdiensten aangesloten te krijgen, hetzij via de module voor manuele input, hetzij via een machine-to-machine-toepassing. Er wordt in 2023 technische en financiële ondersteuning geboden om deze koppelingen te realiseren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	4.000.000 EUR
Output	De werkstrafprojecten hebben samen 1383 werkstraffen behandeld. Alle Vlaamse Inspectiediensten zijn aangesloten op het Vlaamse Handhavingsplatform
Outcome	De bijkomende maatregelen inzake de uitvoering van de werkstraffen hebben voor een significante inhaalbeweging van de opgelopen achterstand gezorgd. Alle Vlaamse Inspectiediensten aangesloten op het Vlaamse Handhavingsplatform.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p><u>Werkstrafprojecten</u></p> <p>Zoals aangegeven in de voorgaande rapporteringen kenden de verschillende werkstrafprojecten een vertraagde start doordat zij werden geconfronteerd met het gekende probleem dat de hedendaagse arbeidsmarkt kenmerkt, namelijk het vinden van geschikt personeel. De functie van werkvloerbegeleider is een specifiek profiel, waarbij er zowel technische als sociale vaardigheden nodig zijn. Naast het begeleiden van een groep werkgestraften moet de werkvloerbegeleiders immers ook in staat zijn om bepaalde taken samen met die groep uit te voeren. Het vinden van dergelijke profielen bleek bij verschillende organisaties een moeilijke opgave te zijn en de vacatures werden dan ook ettelijke maanden later dan de voorziene opstartdatum ingevuld. Daardoor is men ook later kunnen starten met het wegwerken van de opgelopen achterstand van de werkstraffen door de corona pandemie.</p> <p>Gezien de justitiehuzen gebaat zijn met een maximale benutting van de projecten, werd een nota aan de Vlaamse Regering voorgelegd met de vraag om de subsidiebesluiten van de werkstrafprojecten (behalve VOC Neteland, Natuurpunt Leuven en OVAM) te wijzigen. De Vlaamse Regering besliste op 16/12/2022 om de subsidiebesluiten te wijzigen, waardoor de uitvoeringstermijnen van de verschillende projecten werden aangepast.</p> <p>De verschillende werkstrafprojecten zijn momenteel allen operationeel (behalve het werkvloerproject bij VOC Neteland dat reeds is afgelopen). Tegen september 2023 is er een uitgebreide tussentijdse evaluatie van de verschillende projecten uitgevoerd.</p> <p><u>Bestuurlijk sanctierecht</u></p> <p>Sinds 15 oktober 2022 zijn er op de ontwikkelingsomgeving van het VHP API's beschikbaar op basis waarvan informatie uitgewisseld kan worden tussen de aangesloten inspectiedienst en het VHP. Deze API's kunnen door de aansluitende agentschappen gebruikt worden om de analyse langs de kant van de agentschappen door te voeren, en vervolgens de aansluiting reeds in een vroeg stadium te testen. De API's vormen de basis voor een MVP, dat verder verrijkt wordt tot de gepande release van 1 juni 2023.</p> <p>Aansluiting agentschappen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentschap Wonen sluit aan op 1 juni 2023 • De Vlaamse Waterweg sluit aan in 2023, precieze datum nog te concretiseren • Gesprekken zijn lopende met agentschappen WSE, Natuurinspectie en Omgeving
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Het personeel voor de werkstrafprojecten is aangeworven.	2021 Q4	Gerealiseerd	Deze mijlpaal werd met vertraging gerealiseerd gezien de aanwerving van het personeel moeizaam verliep.	
Oplevering API's van MVP	2022 Q3	Gerealiseerd	Sinds 15 oktober 2023 zijn er API's beschikbaar die de informatieuitwisseling tussen VHP en de Vlaamse inspectiediensten realiseren.	
Release MVP	2022 Q4	Vertraging	De release van het MVP is uitgesteld van Q4 2022 naar Q3 2023, gezien het nieuwe kaderdecreet naar verwachting pas vanaf dat moment goedgekeurd zal zijn. In afwachting wordt het 'minimum viable product' verder verrijkt om zo meer functionaliteiten aan aansluitende agentschappen te kunnen aanbieden. (zie mijlpaal 'release VHP v 1.0	
Release VHP v1.0	2023 Q2	Op schema	De release van VHP v1.0 verloopt conform roadmap.	
Er is een tussentijdse evaluatie van de werkstrafprojecten.	2023 Q3	Nog niet gestart		
Release Maatregelenregister	2023 Q4	Nog niet gestart	Het maatregelenregister wordt momenteel functioneel verfijnd. Ontwikkeling zal naar verwachting Q2 2023 starten.	
De evaluatie van de werkstrafprojecten voor de volledige termijn is uitgevoerd.	2024 Q3	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal aangesloten inspectiediensten	49	2024 Q1		
Aantal behandelde dossiers werkstraffen	1383	2024 Q3		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	4.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.810.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen

PROJECTFINANCIERING

- Europees Herstelfonds: 0 EUR
- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 juni 2021. Vlaams bestuurlijk sanctieregister](#)

[Eindrapport. Bestuurlijk sanctieregister. Bijlage](#)

[BVR van 16/12/2022 betreffende verlenging termijn subsidiebesluiten relanceprojecten justitie in kader van uitvoering werkstraffen](#)

VV118 - GROEIPAKKET - VERDERZETTEN DIGITALISERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Uitbetaling Groeipakket
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Uitbetaling Groeipakket - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Burgers met kinderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>VERDERE DIGITALISERING GP</p> <p>Door verder in te zetten op een verregaande digitalisering van de berekening, gegevensdeling en uitbetaling van het Groeipakket werken we aan een efficiënte overheid en creëren we via automatische rechtentoekenning een solide basis voor de verschillende beleidsdoelstellingen die we met het Groeipakket realiseren.</p> <p>Begin 2021 werd een scope voor de verdere doorontwikkeling van de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) vastgelegd. Deze applicatie staat in voor de automatische rechtentoekenning en dossieropvolging van de Groeipakketten waaronder bijvoorbeeld de berekening van de correcte GP bedragen.</p> <p>Voor 2021 werden 420 story points (functionaliteiten) vastgelegd voor de doorontwikkeling van CGPA. Deze worden bepaald en geprioriteerd op basis van volgende invalshoeken.</p> <p>Wettelijk: Is het noodzakelijk om de functionaliteit verder te ontwikkelen om automatisch (zonder menselijke tussenkomst) aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen.</p> <p>Technisch: Zijn de ontwikkelingen technisch nodig om de garanties op een stabiele en optimale werking van de toepassing te kunnen garanderen.</p> <p>Burger: Bijkomende functionaliteiten die een directe meerwaarde zullen betekenen voor de burger.</p> <p>Gebruiksgemak: Ontwikkelingen die het gebruik door de consulenten van de toepassing optimaler/vlotter laten verlopen.</p> <p>DEELPROJECT ZOË 2.0 (Zorgtoeslag evaluatie - Attestering specifieke ondersteuningsbehoeften)</p> <p>Bij de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid voor de zorgtoeslag overgedragen van het Federale naar het gewestelijke niveau. Omwille van diverse redenen werd op dat moment het as is proces overgenomen en aan de hand van een minimaal levensvatbare toepassing uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat de zorgtoeslag dienstverlening niet optimaal efficiënt verloopt. Met het ZOË 2.0 project willen we de zorgtoeslag processen optimaal ondersteunen met een geïntegreerd applicatieplatform op basis van een nieuwe technologische visie. Daarenboven maken we zoveel als mogelijk gebruik van de bouwstenen van Digitaal Vlaanderen.</p> <p>In functie van efficiëntie en transparantie naar de burger toe willen we tevens de Corona-crisis aangrijpen om het proces versneld te digitaliseren naar de burger.</p> <p>We voorzien 2 fases (releases) waarbij we in release 1 vooral focussen op de digitalisering van de bestaande werking en de opzet van een vernieuwde architectuur klaar voor de toekomst. In fase 2 (release 2) focussen we ons op bijkomende</p>

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>optimalisaties, niet-functionele verplichtingen i.h.k.v. bedrijfscontinuïteit en veiligheid en de implementatie van eventuele nieuwe beleidsinzichten.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	7.000.000 EUR
Output	<p>VERDERE DIGITALISERING VAN HET GROEIPAKKET Eén verdere geoptimaliseerde Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA). - Uitbreiding van de module automatische rechtsbepalingen. - Uitbreiding van de module Ex post controle van gegevens met betrekking op de prestaties. - Uitbreiding van de module controles van de schoolactiviteiten. - Uitbreiding van de module schulden en inningen.</p> <p>DEELPROJECT ZOË 2.0 : Eén nieuwe applicatie voor de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoeften ZOE 2.0</p>
Outcome	<p>VERDERE DIGITALISERING VAN HET GROEIPAKKET - Snellere toekenning van de GP rechten en de bijbehorende uitbetalingen van de correcte GP bedragen. - Kwaliteitsvollere dienstverlening en transparantie naar de burger. - Bereiken van efficiëntiewinsten (performantie/kosten) in de wijze van GP uitbetalingen</p> <p>DEELPROJECT ZOË 2.0 : • Snellere & efficiëntere dossiervoorbereiding: verkorting van de ‘dossiervoorbereiding’ met gemiddeld 1 maand en een substantiële verkorting qua doorlooptijd voor de burger zodra het tekort aan evaluerend artsen is weggewerkt (*) • Transparantie naar de burger: inzage in zijn/haar dossier • Kwaliteitsvollere dienstverlening: lagere foutgevoeligheid van het administratieve proces & een hogere bedrijfscontinuïteit van de toepassing 99% uptime m.u.v. geplande onderbrekingen • Ecologische voetafdruk verkleinen: besparing van jaarlijks ongeveer 325.000 vellen papier (equivalent van 6-7 bomen) wanneer we een optimale digitaliseringsgraad bereiken</p> <p>(*) Het technische project kan geen oplossing bieden voor het tekort aan evaluerend artsen waardoor de algemene doorlooptermijnen vandaag ook oplopen.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	<p>VERDERE DIGITALISERING GP</p> <p>Was reeds gerealiseerd.</p> <p>DEELPROJECT ZOË 2.0 (Zorgtoeslag evaluatie - Attestering specifieke ondersteuningsbehoeften)</p> <p>Na de go-live van release 1 werden de noodzakelijke optimalisaties (functioneel en technisch) alsook de gewenste nieuwe functionaliteiten in kaart gebracht en geprioriteerd. Volgens de agile-projectmethodiek werden er elke 2 weken aanpassingen in productie gezet volgens de afgesproken prioriteiten. Voorbeelden van realisaties zijn: de eerste noodzakelijk IT-ondersteuning voor de clusterprocedure</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	en de inzet van de zomerartsen werd voorzien, de verdere optimalisatie en automatisering van de gegevensdeling m.b.t. artsprestaties, herwerken van de maandelijkse gegevensdeling verhoogde verzekeringstegemoetkoming via SFTP naar een gegevensflux, aanpassingen aan het portaal voor de ouders, enz
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Uitbreidingen aan de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) deel 1 : realisatie van 210 functionele story points binnen CGPA.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Uitbreidingen aan de Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA) deel 2 : realisatie van de volgende 210 functionele story points binnen CGPA.	2021 Q4	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 1 – Opzetten van de nodige architectuur	2021 Q2	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 2 – Bestaande processen digitaal herdenken en scope release 1 bepalen	2021 Q2	Gerealiseerd	
ZOE 2.0 Mijlpaal 3 – Realisatie Salesforce-applicatie ZOE 2.0 & bijhorende integraties met de Magda Documentendienst, het Burgerprofiel (eBox, Dosis, Notificaties en Attesten), de Magda-stromen & KRING (persoonsgegevens, aanvragen, beslissingen), Kariboe (artsgegevens Opgroeien), eHealth (medische formulieren)	2021 Q4	Gerealiseerd	De integratie met MijnBurgerprofiel is opgeleverd voor wat betreft de header (navigatiebalk), dosis (statusupdates aanvraag) en notificaties (opgezet: herinnering 2 weken voor einde indieningstermijn, bevestiging ontvangst medisch formulier). Hiermee is de laatste integratie zoals initieel voorzien opgeleverd
ZOE 2.0 Mijlpaal 4 - Migratie van de bestaande dossiers naar het nieuwe platform	2021 Q4	Gerealiseerd	Sinds 8 februari 2022 is de nieuwe applicatie ZOE 2.0 in gebruik en waren ook alle dossiergegevens inclusief de historiek gemigreerd naar dit platform zodat we oude applicatie kunnen uitschakelen en we de continuïteit naar de gezinnen kunnen garanderen.
ZOE 2.0 Mijlpaal 5 - GO LIVE Release 1	2021 Q4	Gerealiseerd	Release 1 werd opgeleverd op 8 februari 2022.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
ZOE 2.0 Mijlpaal 6 - Bepalen scope release 2 (optimalisaties en nieuwe beleidsinzichten) en agenderen op VR	2021 Q4	Gerealiseerd	<p>Opgenomen in scope:</p> <ul style="list-style-type: none"> - noodzakelijke bijsturingen en optimalisaties na go-live release 1 - digitalisering evaluatie-instrument van de evaluerend artsen - documentenopslag in de cloud - implementatie nieuwe beleidskeuzes - gegevensdelingen m.b.t. automatische rechtentoekenningen 	
ZOE 2.0 Mijlpaal 7 - Release 2 uitwerken en implementeren	2022 Q3	Vertraging	<p>Gaandeweg is de backlog aangevuld met noodzakelijke technische en functionele optimalisaties alsook nieuwe vragen i.k.v. het actieplan Evaluatie Ondersteuningsnood. Met de voorziene middelen hadden we niet de mogelijkheid om al deze vragen te realiseren. Prioriteiten zijn continu bijgesteld.</p> <p>Sinds dit najaar ervaren we technische problemen waardoor een deel van onze middelen is besteed aan het stabiel krijgen/houden van onze omgeving.</p>	
ZOE 2.0 Mijlpaal 8 - GO LIVE Release 2	2022 Q4	Vertraging	<p>Om de 2 weken werden optimalisaties (functioneel en technisch) voorzien alsook nieuwe functionaliteiten volgens de prioriteiten voorzien in mijlpaal 7.</p> <p>Enkele realisaties: de eerste noodzakelijk IT-ondersteuning voor de clusterprocedure en de inzet van de zomerartsen werd voorzien, de verdere optimalisatie en automatisering van de gegevensdeling m.b.t. artsenprestaties, herwerken van de maandelijkse gegevensdeling verhoogde verzekeringstegemoetkoming via SFTP naar een gegevensflux, aanpassingen aan het portaal voor de ouders, enz.</p>	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Eén verdere geoptimaliseerde Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA).	1	2021 Q4		100 %
Eén nieuwe applicatie voor de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoeften ZOE 2.0.	1	2022 Q4		100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.900.000 EUR
Uitvoering VEK	6.900.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV119 - ONTWIKKELEN RECHTENVERKENNER 2.0 MET EEN MEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE TOOL IN STERKE SAMENWERKING MET DE LOKALE BESTUREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur - Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	Professionele zorg en hulpverleners (Wordt uitgewerkt in een samenwerkingsverband met ABB, Digitaal Vlaanderen, VVSG en Kenniscentrum Kernsteden)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De rechtenverkenner wordt gebruikt door voornamelijk hulpverleners van OCMW, CAW, lokale besturen, ... om op basis van het profiel van een hulpvrager te bekijken voor welke rechten deze persoon in aanmerking komt. Dit kan gaan over allerlei levensdomeinen en evenzeer over rechten op het niveau het federale, regionale of lokale niveau. De rechtenverkenner is toe aan een grondige update tot rechtenverkenner 2.0. Zo verhoogt het gebruikerscomfort en kan het structurele gebruik toenemen. De nodige aanpassingen moeten leiden tot verbeterde resultaten in rechtentoekenning en eenvoudiger aanpassingen bij veranderende regelgeving. Zo zal de site ook meer gebruiksvriendelijk zijn voor de geïnteresseerde burger en niet enkel voor de hulpverleners</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Een unieke database met informatie over sociale rechten toegekend door de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Overheid en zo mogelijk aangevuld met federale sociale rechten - Organisatie van het decentraal beheer van de database en centrale kwaliteitsbewaking. - Venster op de database ter beschikking stellen voor burgers en professionele hulpverleners via een gebruiksvriendelijke toepassing te consulteren via website - Database wordt via open data ter beschikking gesteld voor hergebruik (Kenniscentrum Vlaamse Steden wil dit hergebruiken voor rechtentoekenning zit niet in scope van dit project)
Outcome	Interbestuurlijke samenwerking rond sociale rechten, werkinstrument voor zorgprofessionals, geactualiseerde basisinformatie over lokale en Vlaamse sociale rechten . Potentieel basisbestand voor eventuele rechtentoekenning.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>Het departement WVG neemt het eigenaarschap en de productverantwoordelijkheid op van Rechtenverkenner 2.0. Een productverantwoordelijke werd aangesteld. Zij volgt het ontwikkelingstraject op en stuurt de inhoudelijke afbakening, afspraken voor kwaliteitsborging van de informatie, enz.</p> <p>De relancemiddelen (VV 119) zijn overgeheveld en vastgelegd via een Samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Digitaal Vlaanderen (projectleiding en ontwikkeling)</p> <p>Het departement werkt nauw samen met VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden om de nieuwe Rechtenverkenner vorm te geven en te ontwikkelen.</p> <p>De technische en inhoudelijke ontwikkeling zijn opgestart en op schema. In Q1 van 2023 zal de pilootversie grondig afgetoetst worden bij het werkveld zodat evaluatie en bijsturing op basis van die input nog mogelijk is.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Businesscase opstellen en laten goedkeuren	2020 Q4	Gerealiseerd	
Projectinitiatie opstellen met de partners	2021 Q4	Gerealiseerd	
Projectvoorstel voorleggen aan Vlaamse Regering (bekomen relancemiddelen)	2022 Q2	Gerealiseerd	Ontwerpnota en ProjectInitiatieDocument zijn ter validatie aan de stuurgroep bezorgd.
Product discovery	2022 Q2	Gerealiseerd	Werkgroep Kenniscentrum Vlaamse Kernsteden werken in overleg met Digitaal Vlaanderen een POC uit.
Product fundament	2022 Q4	Gerealiseerd	
Agile Product ontwikkeling opstarten	2023 Q4	Nog niet gestart	
Projectorganisatie en inhuren van diensten regelen	2022 Q3	Gerealiseerd	
Gemeenschappelijk beheer van de organisatie uitwerken en voorleggen aan de partners	2023 Q1	Op schema	
City Deal voorbereiden en afsluiten	2023 Q2	Op schema	City Deal wordt voorbereid door kenniscentrum kernsteden
Juridische basis voor Rechtenverkenner onderzoeken en zo nodig voorstellen om aan te passen.	2023 Q2	Op schema	Eerste onderzoek door juridisch team is gestart

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Methodiek voor de centrale kwaliteitsbewaking uitwerken	2023 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.000.000 EUR
Uitvoering VEK	6.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 - Ontwikkeling rechtenverkenner 2.0

VV120 - VERBETEREN VAN DE SOCIALE KAART

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Alle burgers die informatie zoeken over zorgaanbod of zorgverstrekkers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	21. Digitalisering zorgbeleid
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De sociale kaart is voor de hulp- en dienstverleners, zorgpersoneel, OCMW-medewerkers of de burger zelf een instrument om in de eigen buurt de nodige hulpverleners en instellingen te kunnen terugvinden. Het departement WVG nam dit enkele jaren geleden over van de provincies toen hun welzijnsopdracht werd overgeheveld. De sociale kaart bevat veel gegevens en wordt voortdurend bijgewerkt. Toch blijkt de toepassing vatbaar voor verbetering door onder meer de koppeling te maken met bijkomende authentieke datasets die zo automatisch actuele gegevens op de kaart te zetten. Sterke verbeteringen zijn ook nodig aan de zoekfunctie om tot de juiste resultaten te komen en de gebruiksvriendelijkheid kan verbeterd worden. De bijkomende middelen zullen gebruikt worden voor de toevoeging van nieuwe informatie. De verbeteringen zijn reeds opgestart met gewone middelen</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	500.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - In de eerste fase: <ul style="list-style-type: none"> o In de achterliggende database worden de gegevens over de zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers overgenomen uit andere authentieke bronnen van Vlaamse en federale diensten o De achterliggende databank wordt als open data ter beschikking gesteld. o Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers kunnen hun gegevens van de overheidsdiensten zelf verrijken met eigen gegevens. (adressen, openingsuren, telefoon, email,...) o Zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers worden gesensibiliseerd om hun gegevens aan te vullen. De overheidsdiensten zullen deze gegevens ook hergebruiken. o Het doelpubliek wordt geïnformeerd over de nieuwe sociale kaart - In de tweede fase, (na onderzoek en overleg) : <ul style="list-style-type: none"> o Uitbreiding van de gegevens die relevant kunnen zijn voor de burgers: waar kunnen burgers met hun klacht terecht, inspectieverslagen, kwaliteitsindicatoren,...
Outcome	Betere informatie voor zorgpersoneel en zorggebruikers. Hergebruik van overheidsinformatie van het beleidsdomein WVG en de federale overheid

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Na een lang ontwikkelingstraject, waar de ontwikkelaar van de vernieuwde Sociale Kaart ernstige vertraging heeft opgelopen, is de applicatie midden oktober in gebruik genomen. Direct daarna werden de belangrijkste partners zoals VIVEL, de zorggraden en beroepsverenigingen, geïnformeerd over de vernieuwingen. Vanuit het departement wordt ondersteuning geboden aan deze partners, die ook een opdracht hebben m.b.t. de Sociale Kaart. Ook intern werd gericht gecommuniceerd over de vernieuwde applicatie, zoals bv. aan de Stuurgroep eBeleid.</p> <p>Nu wordt eerst gefocust op kwaliteitsverbetering van de gegevens vooraleer de vernieuwde Sociale Kaart bij een groter publiek bekend wordt gemaakt.</p> <p>De uitbreidingsfase werd voorbereid door de relancemiddelen aan te vragen en vast te leggen. In 2023 starten we de business case op voor de verbeterde Sociale Kaart</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.1 Verbeteren van de toepassing	2020 Q4	Gerealiseerd	
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.2 Afwerken en in productie nemen van de nieuwe toepassing	2022 Q2	Gerealiseerd	
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.3 Toevoegen en actualiseren van gegevens van de gezondheidszorgverstrekkers in de databank.	2022 Q3	Gerealiseerd	
Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: 1.4 Opmaken en uitvoeren van een communicatiestrategie en -campagne in functie van de nieuwe sociale kaart. Eerste fase:: 1.1	2023 Q2	Op schema	
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.1 Onderzoeken welke bijkomende informatie via de sociale kaart kan ontsloten worden	2023 Q2	Op schema	
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.2 Concept valideren, overleggen met sectoren en laten bekrachtigen door Vlaamse Regering	2023 Q2	Op schema	
Tweede fase uitbreiden van de informatie in de sociale kaart voorbereiden en implementeren. 2.3 Implementatie van de tweede fase	2024 Q1	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	500.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	500.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Voorzien voor het najaar 2022
Nota aan de Vlaamse Regering van 2 december 2022. Verbeteren van de sociale kaart

22. Investeren in personen met een handicap

VV121 - VOORUITSCHUIF UITBREIDINGSBELEID - FASE 1

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	personen met een handicap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	22. Investeren in personen met een handicap
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Fase 1 van de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid bij personen met een handicap: de in de periode 2020-2024 voorziene extra middelen voor de toekenning van bijkomende budgetten aan personen met een handicap wordt versneld vanaf 2021.</p> <p>Er werd bij BO 2021 beslist om de opstap voorzien op VV 121 – vooruitschuif uitbreidingsbeleid, rechtstreeks in te schrijven op de beleidskredieten van het VAPH voor de toekenning van persoonsvolgende budgetten aan prioriteitengroep 1. Reguliere middelen: 230.000.000 EUR</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	55.000.000 EUR
Output	Door de voorziene middelen uit het Relanceplan kon een garantie worden gegeven voor een inhaaloperatie waarbij aan een groep personen met een handicap een persoonsvolgend budget kon worden ter beschikking gesteld. In fase 1 werd een PVB ter beschikking gesteld aan meerderjarige personen met een handicap die een aanvraag voor een PVB hadden ingediend uiterlijk op 31/12/2020 en die werden ingedeeld in prioriteitengroep 1. In een volgende fase werd een PVB ter beschikking gesteld aan de personen ingedeeld in prioriteitengroep 1 waarbij het streefdoel is om dat aan iedereen in die groep te doen binnen de 18 maanden na de indiening van de aanvraag. Dit komt ook tot uiting in project VV180.
Outcome	De versnelling van de terbeschikkingstelling van een PVB is in 2021 en 2022 gebeurd aan 3.086 personen uit prioriteitengroep 1.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>In de eerste fase was het de bedoeling om aan alle personen met een aanvraag tot en met 31/12/2020 en ingedeeld in prioriteitengroep 1 een PVB ter beschikking te stellen. Dit is gerealiseerd.</p> <p>Intussen wordt verder gegaan met terbeschikkingstellingen aan de personen met een aanvraag na 1/1/2021. Voor hen is het streefdoel om een PVB ter beschikking te stellen binnen de 18 maanden na de indiening van de aanvraag. Dit is het schema dat op dit ogenblik wordt aangehouden.</p> <p>In totaal werd aan 3.086 personen in prioriteitengroep 1 een PVB ter beschikking gesteld.</p> <p>Tevens werd aan 1.098 personen in prioriteitengroep 2 een deelbudget ter beschikking gesteld, bij wijze van project. Dit project wordt geflankeerd door wetenschappelijk onderzoek.</p> <p>Al de terbeschikkingstellingen konden gerealiseerd worden binnen de reguliere begrotingskredieten van het VAPH omwille van het uitbreidingsbeleid dat werd toegekend in de begroting 2021 en 2022. De kredieten voorzien op de relanceprovisie dienden als buffer voor het geval de eigen middelen van het VAPH niet volstonden om de versnelling te financieren.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Versnelde terbeschikkingstelling van persoonsvolgende budgetten aan personen met een handicap op de wachtlijst	2022 Q4	Gerealiseerd	Aan een eerste groep van personen met een handicap die een aanvraag hadden ingediend voor een PVB uiterlijk op 31/12/2020 werd aan PVB ter beschikking gesteld.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aan 3086 erkende personen met een handicap in prioriteitengroep 1 hebben werd een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld. Het gaat in fase 1 om de personen die een aanvraag hadden ingediend uiterlijk op 31/12/2020. In de volgende fase werd aan personen in prioriteitengroep 1 een PVB ter beschikking gesteld binnen 18 maanden na indiening van de aanvraag. Tevens werd aan 1.098 personen in prioriteitengroep 2 een deelbudget PVB ter beschikking gesteld.	2700	2022 Q4	3.086	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	55.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 55.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 230.000.000 EUR

23. Sportinfrastructuur

VV122 - VERSTERKEN OPROEPEN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Sport Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Sport Vlaanderen
Belanghebbenden	De sporter, sportfederaties, sportclubs, de lokale besturen alsook private investeerders in sportinfrastructuur

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	23. Sportinfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Om investeringen in sportinfrastructuur te faciliteren en te versnellen heeft Sport Vlaanderen “Sportsput” in het leven geroepen. Er bestaat de mogelijkheid om via het decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur jaarlijks op een vast tijdstip (31/03/20xx) een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen voor de bouw en/of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur. In het decreet wordt een minimaal budget van 5.000 keuro verankerd dat wordt gebruikt om sportinfrastructuur te cofinancieren tot 30% en een maximaalbedrag van 1.250k euro.</p> <p>Vanaf 2021 kan Sport Vlaanderen twee projectoproepen organiseren. Subsidieaanvragen kunnen dan uiterlijk 31/03/20xx en 30/09/20xx worden ingediend. Bovendien worden er deze legislatuur extra budgetten bovenop het decretaal minimum vrijgemaakt om te investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. Gezien de grote behoefte en de vraag om een inhaalbeweging inzake sportinfrastructuur te versnellen alsook de positieve effecten van sport en bewegen in tijden van een pandemie wordt de eerste grote impuls in 2021 reeds voorzien en heeft dit haar vervolg in 2022.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	55.000.000 EUR
Output	Via deze subsidiepiste worden bestaande bovenlokale sportinfrastructuren verbeterd en wordt nieuwe bovenlokale sportinfrastructuur gerealiseerd. Er wordt een subsidie toegezegd van 22,8 miljoen euro (oproep 2021-mrt) en 15,4 miljoen euro (oproep 2021-sep) voor de realisatie van 73 bouwprojecten. In totaal werden in 2021 93 dossiers ingediend. In 2022 werden 51 dossiers ingediend waarvan in totaal 38 werden geselecteerd. Voor de oproep 2022-mrt werd 6 mio toegezegd en voor de oproep 2022-sep werd 12,5 mio toegezegd waarvan 10.5 relancemiddelen zijn.
Outcome	Een substantiële investering wordt gecreëerd voor de sportinfrastructuur in Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	51 dossiers werden ingediend in 2022 waarvan 38 geselecteerd. 18.5 milj euro aan subsidies werden toegekend waarvan 16.8 milj aan relancemiddelen.
Noodzakelijke politieke actie	Beslissing minister is genomen

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Decretale regeling organiseren twee projectoproepen per jaar.	2021 Q1	Gerealiseerd		
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2021	2021 Q3	Gerealiseerd		
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2021	2021 Q4	Gerealiseerd		
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 1 in 2022	2022 Q2	Gerealiseerd		
Investeren in bovenlokale sportinfrastructuur projectoproep 2 in 2022	2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal ingediende dossiers 2021 voor bovenlokale sportinfrastructuren	90	2021 Q4	93	100 %
Het aantal ingediende dossiers 2022 voor bovenlokale sportinfrastructuren	90	2022 Q4	51	57 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	55.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	55.000.000 EUR
Uitvoering VAK	54.999.000 EUR
Uitvoering VEK	22.374.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

○ React EU: 0 EUR

- Vlaamse relancemiddelen: 55.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR 26/2/2021](#)

[BVR 26/2/2021 - nota](#)

[BVR 26/2/2021 - advies Sportraad](#)

[BVR 26/2/2021 - advies RVS](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Versterken van oproepen bovenlokale sportinfrastructuur](#)

[Belgisch Staatsblad. Bijlage](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur](#)

24. Uitbouwen circulaire economie

VV123 - CIRCULAIR BOUWEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We willen via innovatie nieuwe Circulaire bouwtechnieken en recyclage tot stand brengen. Tegelijk moet dit aanleiding geven tot nieuwe circulaire businessmodellen in de sector van bouwmaterialen en gebouwen. Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten zoals COOCK-projecten (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding), de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs.</p> <p>De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.</p> <p>Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe businessmodellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	<p>Oproepen afgerond en projectsteun toegekend. Projecten starten nu op. Procedure van selectie en gebruikte documenten: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/living-labs-circulaire-economie/indienen-van-een-aanvraag Voor circulair bouwen en circulaire maakindustrie werden samen 92 projecten geselecteerd. (VV123 + VV124)</p>
Outcome	<p>Steun toegekend aan 100 projecten voltooid over circulair bouwen, voor kennisverspreiding over circulaire maakindustrie, voor de inkoop van (externe en interne) adviezen over circulaire productie, en voor de oprichting van collectieve living labs door particuliere ondernemingen, en ten minste 500 ondernemingen (kmo's) en organisaties die als rechtstreekse begunstigde of als deelnemer van collectieve projecten</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	subsidies hebben ontvangen voor beide thema's circulair bouwen en circulaire maakindustrie samen (zie ook VV124)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	oproepen afgerond en projectsteun toegekend. Projecten starten nu op. Procedure van selectie en gebruikte documenten: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/living-labs-circulaire-economie/indienen-van-een-aanvraag Voor circulair bouwen en circulaire maakindustrie werden samen 92 projecten geselecteerd. (VV123 + VV124)
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
KMO groeisubsidie eerste oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	2022 Q2	Gerealiseerd	
KMO groeisubsidie eerste oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Gerealiseerd	
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Gerealiseerd	
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	2022 Q4	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.701.000 EUR
Uitvoering VEK	1.011.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 10.000.000 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Steunmaatregelen ten behoeve van Circulair Bouwen](#)

VV124 - CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Om de omslag te kunnen maken naar een circulaire maakindustrie moet worden ingezet op alle circulaire strategieën van design over hergebruik en delen, herstellen, hermaken tot recycleren. In het algemeen moeten nieuwe circulaire business concepten gepromoot worden in de maakindustrie.</p> <p>In het kader van de werkagenda 'circulaire maakindustrie' van het transversale programma 'Vlaanderen Circulair' onderzoeken we in de tweede helft van 2021 welke waardeketens in Vlaanderen het meest potentieel hebben om de opschaling van de circulaire economie te realiseren. Die waardeketens zijn breed en divers samengesteld en via het relancebeleid willen we extra inzetten op het behoud en het stimuleren van een nieuwe circulaire maakindustrie.</p> <p>Dit zal gebeuren door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten, in het bijzonder COOCK-projecten, de KMO-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs..</p> <p>De concrete keuze over welke instrumenten wanneer voor welke waardeketen zullen worden ingezet zal worden gemaakt in overleg met de betrokken stakeholders, die samenkomen in de aansturing van de werkagenda's.</p> <p>De projecten zullen zijn gericht op alle spelers binnen de maatschappelijke vijfhoek: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.</p> <p>Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten (bv. rond gebruik van reststromen, nieuwe business-modellen, samenwerking met de sociale economie,...) worden uitgetest en gestimuleerd.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	15.000.000 EUR
Output	projectoproepen gelanceerd
Outcome	Steun toegekend aan 100 projecten voltooid over circulair bouwen, voor kennisverspreiding over circulaire maakindustrie, voor de inkoop van (externe en interne) adviezen over circulaire productie, en voor de oprichting van collectieve living labs door particuliere ondernemingen, en ten minste 500 ondernemingen

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	(kmo's) en organisaties die als rechtstreekse begunstigde of als deelnemer van collectieve projecten subsidies hebben ontvangen voor beide thema's circulair bouwen en circulaire maakindustrie samen (zie ook VV123)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	oproepen afgerond en projectsteun toegekend. Projecten starten nu op. Procedure van selectie en gebruikte documenten: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/living-labs-circulaire-economie/indienen-van-een-aanvraag Voor circulair bouwen en circulaire maakindustrie werden samen 92 projecten geselecteerd. (VV123 + VV124)
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
KMO groeisubsidie voor circulair bouwen en circulaire maakindustrie - eerste oproep gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Eerste reeks projecten gesteund (1/2)	2022 Q2	Gerealiseerd	
KMO groeisubsidie circulair bouwen en circulaire maakindustrie beslissingen eerste oproep	2022 Q2	Gerealiseerd	
COOCK oproep circulair bouwen en circulaire mlaakindustrie geëvalueerd	2022 Q2	Gerealiseerd	
Tweede reeks projecten gesteund (2/2)	2022 Q4	Gerealiseerd	

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	15.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	15.000.000 EUR
Uitvoering VAK	15.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.030.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 15.000.000 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2021. Steunmaatregelen ten behoeve van Circulaire Maakindustrie](#)

VR 10 november 2022 - Steun aan projecten binnen de oproep Living Labs Circulaire Economie

VV125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	Denuo, sectororganisatie (bv. essencia, Centexbel, Agoria, ...)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	24. Uitbouwen circulaire economie
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Algemeen beogen we recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen bv. investeringen in nieuwe voorbehandelingstechnieken, recyclage-installaties of uitbreiding van bestaande installaties; of aanpassingen van productieprocessen om gerecycleerde materialen te kunnen verwerken. We beogen hierbij een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning bv. milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten.</p> <p>Een marktverkenning werd uitgevoerd waarin we in eerste instantie als scope hanteerden:</p> <ul style="list-style-type: none">- asbest: De sectorprotocollen, de gesubsidieerde asbestafbouwprojecten bij lokale besturen en de nieuwe asbestpremie voor isolatie en asbestverwijdering zorgen voor een sterk stijgend volume aan te storten asbestafval. De extra relance-middelen gaan de komende jaren deze dynamiek nog versterken. Om de druk op de beperkte stortcapaciteit te verlagen, is de nood aan andere verwerkingstechnologie hoog.- matrassen: De nieuwe aanvaardingsplicht vanaf 1 januari 2020 creëert een aanbod aan selectief ingezamelde afvalstoffen waarvoor nieuwe verwerkingstechnieken mogelijk zijn.- luiers: Het opzetten van een nieuwe selectieve inzameling voor babyluiers en incontinentiemateriaal, evenals een normenkader voor de gerecycleerde materialen, wordt momenteel onderzocht- textiel: De voorbije crisis heeft duidelijk gemaakt dat onze economie kwetsbaar is voor deze stroom door het ontbreken van een aantal schakels in de verwerkingsketen in Vlaanderen/Europa.- kunststoffen (bv. verpakkingen): Enerzijds zetten we beleidsmatig sterk in op de afvalstroom verpakkingen waarbij we een betere sortering en recyclage verwachten, anderzijds stellen we vast dat het de inzet van kunststofrecyclaten sterk onder druk staat (o.a. gelinkt aan de olieprijs). <p>Deze lijst is echter te beschouwen als niet-limitatief. Elk initiatief dat Vlaanderen op weg zet om een toonaangevende recyclagehub binnen Europa te worden, komt potentieel in aanmerking voor ondersteuning. We streven daarbij naar een instrument dat het materialenbeleid en circulaire economie ondersteunt, en complementair is tov bestaande ondersteuningsinstrumenten.</p> <p>In theorie komen meerdere instrumenten in aanmerking om Vlaamse bedrijven te ondersteunen: subsidies, participaties, leningen, Op basis van de beschikbare juridische en financiële informatie is de voorkeurspiste om een investeringssubsidie uit te werken gezien dit de mogelijkheid om meer projecten te ondersteunen dan bij keuze voor participatie. Indien echter uit de marktverkenning zou blijken dat er ook potentieel is voor een mogelijke participatie,</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

kunnen deze relancemiddelen ook zo worden ingezet of kan worden samengewerkt met PMV, om de beschikbare CE-middelen daar te activeren.

Met het recyclinghub-project willen wij ten minste zes grote investeringen in nieuwe recyclingfaciliteiten stimuleren die lokale recycling en gesloten kringlopen mogelijk maken. Hiervoor worden 2 calls georganiseerd.

De financiering van dit project verloopt in hoofdzaak via de extra toegekende relancemiddelen. De verkennende studie van Möbius (2020) werd gefinancierd vanuit de reguliere middelen. Na afronden van de 2e call wordt een evaluatieopdracht voorzien vanuit de reguliere middelen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	30.000.000 EUR
Output	Aantal toegekende subsidies aan nieuwe recyclage-installaties of recyclage-eenheden: minstens 6 tegen medio 2026
Outcome	Een stijging van de hoeveelheid afval die selectief wordt ingezameld en gerecycleerd. Daling van de hoeveelheid afval die naar verbranding gaat. Alternatief voor het storten van asbestafval beschikbaar.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Een tweede call werd georganiseerd (periode van indienen: 31 mei - 22 augustus). 17 investeringsdossiers werden ingediend, waarvan 15 ontvankelijk. Een multidisciplinaire jury beoordeelde de dossiers en stelde 8 projecten voor voor subsidie. De Vlaamse regering besliste op 25 november over de steun. De minister van Omgeving ondertekende op 1 december de MB's die de steun toekennen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Marktverkenning (uitbesteed aan Möbius)	2021 Q1	Gerealiseerd	
Beoordelingskader (uitbesteed aan Möbius)	2021 Q1	Gerealiseerd	
Implementatie van het beoordelingskader	2021 Q2	Gerealiseerd	
Lanceren 1e call	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALLEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste call afgerond	2022 Q2	Gerealiseerd	
Lanceren 2e call	2022 Q2	Gerealiseerd	
2e call afgerond	2022 Q4	Gerealiseerd	
Procedure voor opvolging van de gesubsidieerde projecten uitgetekend.	2023 Q1	Op schema	
Evaluatie van het steunmechanisme	2023 Q1	Op schema	
MP RRF: Minstens 6 recyclage-installaties zijn gerealiseerd	2026 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde recyclage-installaties of eenheden	6	2026 Q3		

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	30.000.000 EUR
Uitvoering VAK	30.000.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 30.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3/09/2021. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten](#)

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaal kringlopen te sluiten](#)

[Briefadvies Minaraad. BVR ondernemingssteun recyclagehub. Bijlage](#)

[Advies SERV. BVR Recyclagehub. Bijlage](#)

[Advies Raad van State. BVR Recyclagehub. Bijlage](#)

VR 1 april 2022 - Resultaten oproep in uitvoering van besluit met steunregels aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten

VR 25 november 2022 - Steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten in kader van tweede oproep 'Recyclagehub'

25. Investerings groene warmte

VV126 - CALL GROENE WARMTE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Belanghebbenden	Investeerders in grootschalige installaties voor de productie van groene warmte, benutting van restwarmte en warmtenetten.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	25. Investerings groene warmte
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen gaat naar de productie van warmte. Er wordt nog steeds massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Grootschalige restwarmtebenuttingsprojecten recupereren warmte die anders verloren zou gaan, groene-warmte-projecten verhogen het aandeel warmteproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Via dit project wordt het budget voor investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie verhoogd. De investeringssteun wordt toegekend via de calls groene warmte, restwarmte en warmtenetten. In 2021 en 2022 worden telkens 2 calls per jaar opengesteld voor projectaanvragen.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	50.000.000 EUR
Output	Minstens 100% aangevraagd budget ten opzichte van het opengestelde budget
Outcome	710 kton vermeden CO2-emissies en ca. 3500 GWh warmteproductie in de eerste 10 jaar, waarvan de helft groene warmte.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De eerste en tweede projectoproep werden ondertussen gegund. De callregeling werd bij beslissing van de VR van 2 juli 2021 aangepast en geoptimaliseerd. De gunning voor de derde oproep is lopende en is nog afhankelijk van de goedkeuring van de VR voor bepaalde ingediende projecten.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
MB eerste call gepubliceerd	2021 Q1	Gerealiseerd	MB voor organisatie van de eerste call voor het jaar 2021 werd in het BS gepubliceerd op 27 januari 2021
Gunning eerste call	2021 Q2	Gerealiseerd	
Aanpassingen Energiebesluit optimalisering callregeling	2021 Q3	Gerealiseerd	
MB tweede call gepubliceerd	2021 Q4	Gerealiseerd	MB voor organisatie van de tweede call voor het jaar 2021 werd in het BS gepubliceerd op 8 september 2021
Gunning tweede call	2022 Q1	Gerealiseerd	
MB derde call gepubliceerd	2022 Q1	Gerealiseerd	MB voor organisatie van derde call (eerste call 2022) werd in het BS gepubliceerd op 22 april 2022.
Gunning derde call	2022 Q2	Vertraging	Gunningsbeslissing wordt verwacht Q1-2023
Gunning van opdrachten in het kader van de aanbesteding voor projecten van hernieuwbare energie of afvalwarmte in het kader van de maatregel "Call groene warmte".	2023 Q1	Op schema	
Voltooiing van de projecten die gegund zijn in het kader van de call groene warmte, met 39 870 000 EUR (of 90% van de RRF-steun) uitgevoerd	2026 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Budget uitbetaald voor in 2021 en 2022 ingediende en gegunde projecten voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten	5.700.000 euro (Vlaamse middelen)	2023 Q1		
Budget uitbetaald voor in 2021 en 2022 ingediende en gegunde projecten voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten	44.300.000 euro (RRF)	2026 Q2	429.650	0,01 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR
Uitvoering VAK	44.210.000 EUR
Uitvoering VEK	505.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 44.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Energiebesluit van 19 november 2010 Titel VII Hoofdstuk IV en V
Bisnota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Call groene warmte
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan
Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Call groene warmte
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan
Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan. Bijlage
VR 9 december 2022 - Subsidie AZTEQ BV voor project Groene Warmte uit geconcentreerd zonlicht voor Boortmalt Herent
VR 9 december 2022 - Uitbreiding subsidiebesluit Ecluse cvba voor project Ecluse 2
VR 16 december 2022 - 1,31 miljoen euro subsidie aan Noven Noord in Gent voor het project 'Groene Warmte Veemarkt
VR 16 december 2022 - 1,26 miljoen euro subsidie aan Noven Noord in Gent voor het project 'Groene Warmte Borgerstein'
VR 16 december 2022 - Weigering subsidie aan Warmtenet Antwerpen Zuid ter ondersteuning van het project Warmtenet Antwerpen Zuid

26. Digibanken

VV127 - DIGIBANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	We kiezen er voor om digibanken tot stand te laten komen als een samenwerking tussen diverse (lokale) partners, zoals overheden, reguliere bedrijven, kennisinstellingen, opleidingspartners, sociale economie en het middenveld. Binnen de lokale partnerschappen zal betrokkenheid van sociale economie-ondernemingen en lokale VDAB-actoren sterk gestimuleerd worden, net zoals de samenwerking met reguliere of lokale ondernemingen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	26. Digibanken
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Volgens de 'Barometer Digitale Inclusie' van de Koning Boudewijnstichting (2020 en 2022) ervaren mensen in een kwetsbare positie (onder meer kortgeschoolden, mensen in armoede en laaggeletterden) in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze kloof is (cumulatief) aanwezig op meerdere facetten.</p> <p>Met de oprichting van 'digibanken' wil de Vlaamse Overheid het risico op digitale uitsluiting verkleinen via drie inhoudelijke doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (vb. uitleendienst).• Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).• Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, enz.) via zogenaamde fysieke knooppunten. <p>De doelgroep als eindgebruiker van de digibanken omvat volwassen personen (+18 jaar) in Vlaanderen met een (risico op) digitale achterstand.</p> <p>Binnen Vlaanderen is een scala aan ondernemingen en organisaties reeds actief op één van bovenstaande doelstellingen en activiteiten. Samenwerking tussen deze partners willen we stiumeren. Dit is momenteel eerder beperkt, ad hoc, en afhankelijk van menselijk en financieel kapitaal. De uitdagingen rond de digitale kloof variëren daarnaast ook regionaal en lokaal.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Het is de ambitie om via dit project deze diverse spelers in lokale samenwerkingsverbanden als 'digibanken' te verenigen en te stroomlijnen in een ketenstructuur met een gezamenlijke doelgerichte strategie en dienstverlening. De digibanken-partnerschappen worden zichtbaar in een laagdrempelige fysieke toegangspoort voor de publieksgroepen naar verschillende (digitale) diensten.

De structuur en samenstelling van elk 'digibank'-project kan lokaal of regionaal verschillen, met voldoende aandacht voor de lokale autonomie en diversiteit, en wordt 'bottom-up' bepaald binnen de kwaliteitsvereisten voorzien in de oproepen. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheden liggen binnen de opgezette partnerschappen.

De lokale digibank-projecten werden toegewezen via verschillende (periodieke) open subsidie-oproepen verspreid over meerdere parallelle indieningsrondes in 2021 en 2022.

De oproep 'Digibanken – Voortraject' voorzag de mogelijkheid aan (kandidaat-)partnerschappen om a) de strategie voor de implementatie van het lokale digibank-project en de gedeelde dienstverlening en b) het partnerschap verder concreet vorm te geven. Binnen de strategie is aandacht voor de doelgroep, outreachstrategie, samenwerking met sociale economie, circulariteit, duurzaamheid en opschaalbaarheid van het model, connectiviteit en impactmeting.

De oproep 'Digibanken – Implementatietraject' wil de effectieve uitvoering van lokale digibank-projecten vanuit het geformaliseerde partnerschap en de samenwerkingsstrategie ondersteunen. Tijdens deze uitvoering werken de partnerschappen aan de drie bovenstaande doelstellingen.

We beogen hierbij partnerschappen met een voldoende schaalgrootte en/of bereik te ondersteunen. We beogen eveneens een duurzame impact: de ontwikkeling van leefbare en innovatieve modellen, met voldoende maturiteit, economische rendabiliteit en opschaalbaarheid die na de ondersteuningsperiode operationeel kunnen blijven.

Bovenstaande doelstellingen omvatten ook activiteiten die een breder circulair en sociaal doel kunnen verwezenlijken. Bijvoorbeeld, herstel en recycling van (ICT-)materiaal, of circulaire aankopen. Via de digibank-projecten willen we bijdragen tot een circulaire economie via vernieuwende antwoorden.

De projecten konden vrijblijvend beroep kunnen doen op ondersteuning voor de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst- en strategie, om de kwaliteit van samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden te garanderen.

Via de website digibanken.vlaanderen.be wordt iedereen geïnformeerd over het project.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	50.000.000 EUR
Output	100 gemeenten in Vlaanderen maken deel uit van het werkingsgebied van de digibank-partnerschappen, om 1) gelijke toegang tot digitale technologie te garanderen via de voorwaardelijke terbeschikkingstelling van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (zoals een uitleendienst); 2) de digitale vaardigheden te versterken, zowel persoonlijke als technische vaardigheden (zoals herstelling van IT-uitrusting) via opleiding en kennisdeling; 3) digitale toegang te verschaffen tot essentiële diensten (zoals de digitale diensten van de Vlaamse overheid, Tax-on-Web) via zogenoemde fysieke knooppunten. (RRF)
Outcome	Bereikte volwassen personen door de digibank-partnerschappen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Het BVR tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken werd ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering op 17 december 2021.</p> <p>Doorheen 2021 en 2022 werden meerdere oproeproncles gelanceerd. Hieronder een overzicht van de oproepen:</p> <p>Voortraject Ronde Indieningsperiode Goedgekeurde projecten 1 4/10/2021 – 15/11/2021 29 2 27/1/2022 – 10/3/2022 9 3 9/5/2022 – 16/6/2022 4</p> <p>Implementatietraject Ronde Indieningsperiode Goedgekeurde projecten 1 4/10/2021 – 15/11/2021 6 2 27/1/2022 – 24/3/2022 1 3 28/3/2022 – 24/6/2022 16 4 20/6/2022 – 8/9/2022 12 5 12/9/2022 – 27/10/2022 19</p> <p>De flankerende acties zijn eveneens lopende. Inzake communicatie werd een infowebsite ontwikkeld (www.digibanken.vlaanderen.be) als landingspagina voor geïnteresseerde partnerschappen, en voor het brede publiek vanaf 2023. Daarnaast werden ook communicatietools- en materieel ontwikkeld voor de digibankpartnerschappen. In 2023 wordt een grootschalige campagne en event gepland om de digibanken in de kijker te stellen voor het brede publiek.</p> <p>De opdracht voor de procesbegeleiding en de realisatie van lerende netwerken werden gegund, en is lopende vanaf januari 2022. De procesbegeleiding werd afgesloten na de 3e ronde voortrajecten. Het lerend netwerk voor digibankprojecten loopt tot medio 2025.</p> <p>Het bestek i.v.m. de impactmeting van het project digibanken werd opengesteld. Hiervoor werden 2 offertes ingediend. Deze worden momenteel beoordeeld. In januari 2023 zal de beslissing hierover genomen worden, zodat deze opdracht in maart van start kan gaan.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De kadernota VR is goedgekeurd.	2021 Q2	Gerealiseerd	
De oproepen 'Digibanken - Voortraject' en 'Digibanken - Implementatietraject' zijn gelanceerd.	2022 Q4	Gerealiseerd	Oproep ronde 1: indiening van 4/10/2021 tot 15/11/2021 (voortrajecten en implementatietrajecten) Oproep ronde 2: indiening tot 10/03/2022

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
			(voortrajecten) en indiening tot 24/03/2022 (implementatietrajecten) Oproep ronde 3: indiening van 28/03/2022 tot 16/06/2022 (voortrajecten en implementatietrajecten) Oproep ronde 4: indiening van 20/06/2022 tot 8/09/2022 (implementatietrajecten) Oproep ronde 5: indiening van 12/09/2022 tot 27/10/2022 (implementatietrajecten)		
Ondertekening van partnerschappen voor de promotie van digitale inclusie (RRF)	2022 Q4	Gerealiseerd	Min. 100 ondertekende partnerschapsdocumenten ontvangen		
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
Het aantal gemeenten in Vlaanderen dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de digibank-partnerschappen (RRF)	100	2022 Q4	200	100 %	
Opgelet, de RRF-indicator wordt pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken. Het gaat hier over het huidige werkingsgebied van de digibanken.					
PROJECTFINANCIERING					
Beleidsruimte (begroot)	50.000.000 EUR				
Beleidsruimte (begroot) update	50.000.000 EUR				
Uitvoering VAK	49.971.000 EUR				
Uitvoering VEK	2.806.000 EUR				
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 50.000.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR 				

AGENDERING VLAAMSE REGERING

kadernota:

[- VR 2/04/2021 Digibanken - nota](#)

[- VR 2/04/2021 Digibanken - bijlage](#)

Regelgeving projectfinanciering

[Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken – principiële goedkeuring](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 25 juni 2021. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken - nota](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 10 september 2021. Digibanken: Oproepen 'Voortraject' en 'Implementatietraject' - 2021](#)

[Oproep digibanken voortraject 2021. Handleiding - Oproepformulier 04/10/2021](#)

[Oproep digibanken implementatietraject 2021. Handleiding - Oproepformulier. 04/10/2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken – definitieve goedkeuring](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken](#)

[Advies SERV van 5 juli 2021. Digibanken](#)

[Advies van de Raad van State van 16 augustus 2021. Een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 'tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken](#)

[Programmadecreet bij de begroting 2022 \(artikel 82\)](#)

[Ontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2023 \(artikel 96\)](#)

- Opname relancemiddelen

[Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021 tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2022 tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022](#)

[Bisnota aan de Vlaamse Regering van 16 december 2022. Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs \(digisprong\)](#)

[VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren](#)

[VV050 - Digitalisering integratie & inburgering](#)

[VV051 - Gemeente zonder gemeentehuis](#)

[VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies](#)

[VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming](#)

[VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet](#)

[VV056 - Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022](#)

[VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie](#)

[VV058 - AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening \(inclusief bijdrage subsidieregister\)](#)

[VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel](#)

[VV063 - Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck](#)

[VV065 - HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM \(Security Information & Event Management\)](#)

[VV076 - Zelf beheerde identiteit](#)

27. Digitale vaardigheden

VV128 - DIGITALE VAARDIGHEDEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Sociale partners, VESOC, (RvB) VDAB, expertisecentrum Innovatieve leerwegen, Departement Onderwijs, opleidingspartners, werkgevers, sectorfondsen, VLABEL, RSZ, FOD FIN, KSZ, AIV

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	27. Digitale vaardigheden
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>We grijpen de mogelijkheden van de huidige crisisperiode aan om de digitale revolutie waar te maken. We bouwen Vlaanderen uit tot een toonaangevende data-economie en -maatschappij en benutten de mogelijkheden die digitalisering aanreikt om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.</p> <p>Door binnen dit akkoord in te zetten op de ontwikkeling van digitale talenten verzekeren we het succes van deze noodzakelijke digitale transformatie. Vlaanderen treedt hier naar voor als pionier en zal in dit kader onder meer een gepersonaliseerd loopbaanplatform en leer- en loopbaanrekening lanceren om mensen te helpen werk te vinden, (online) opleiding te volgen, zich te herscholen en de werkzaamheidsgraad verder te verhogen. Ook ondernemingen en hun werknemers ondersteunen we in de digitale transformatie.</p> <p>Tegelijkertijd hebben we aandacht voor de digitale kloof. We versterken de digitale vaardigheden van alle Vlamingen en ondersteunen initiatieven om kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf.</p> <p>De Vlaamse overheid speelt hier een voorbeeldrol, zowel in de digitalisering van de eigen dienstverlening als wat digitale toegankelijkheid en de ontsluiting en benutting van data betreft.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	45.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> Overeenkomst tussen de sociale partners en de Vlaamse regering over een visienota waarin wordt voorgesteld hoe de leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen zal worden ingevoerd, rekening houdend met de behoefte aan meer transparantie voor burgers, betere inclusie van kwetsbare groepen en in overeenstemming met het digitale leerrekeningsplatform dat op federaal niveau wordt opgezet. (RRF)

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	<ul style="list-style-type: none"> • 70 e-learningprojecten worden goedgekeurd, gelanceerd en voltooid op basis van een oproep tot het indienen van projecten. (RRF) • Volgende digitale tools en diensten voor burgers, werkgevers en VDAB-partners in Vlaamse Gemeenschap zullen worden ontplooid: <ul style="list-style-type: none"> o Een gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform, gekoppeld aan een gepersonaliseerd aanbod van opleidingskansen en incentives voor burgers is toegankelijk en operationeel. o Het digitaal werkgeversloket van VDAB en het digitaal partnerplatform is operationeel, waardoor VDAB-bemiddelaars alle werkgevers met vacatures in gedeeld beheer actief kunnen contacteren en hen digitaal kunnen ondersteunen bij het opvullen van de vacatures. De follow-up van alle VDAB-partners wordt ook verricht via het digitaal partnerplatform. o De digitale diensten voor werkgevers zijn uitgebreid door middel van een digitaal werkgeversloket van het departement Werk en Sociale Economie, dat openstaat voor alle werkgevers. o Het data-ecosysteem voor partners van het departement Werk en Sociale Economie is operationeel gemaakt: 15 relevante gegevensbanken zijn ter beschikking gesteld op het opendataplatform voor onderzoek en andere doeleinden.
Outcome	Meer 25-64 jarigen hebben deelgenomen aan opleiding en vorming (bij voorkeur binnen de 12 maanden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>- Rond het actieplan e-leren:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Een eerste versie van het infopunt e-leren werd in het voorjaar gelanceerd: https://e-leren.vlaanderen/ e-leren.vlaanderen. Er werd gekozen voor een soft launch: er werd geen perscommunicatie gevoerd over de lancering van het platform, maar wel een gerichte communicatie naar de doelgroep van de site. In 2022 werd het infopunt nog verder verfijnd: additionele nieuwe inhoud, leertrajecten, verbeterde gebruiksvriendelijkheid en additionele marketing om het informatiepunt kenbaar te maken bij opleidingsverstrekkers. Deze extra initiatieven worden opgezet o.b.v. onderzoek naar de noden van opleidingsverstrekkers. o Werden 65 van de 83 ingediende projecten in het kader van de oproep e-leren goedgekeurd en opgestart op 15 oktober '21 met een looptijd van een jaar. Hiervan werden er 3 ingetrokken, waardoor er nog 62 projecten e-leren overbleven. Om tot 70 projecten e-leren te komen die operationeel zijn eind 2022 (met link naar opleiding), werden er via entiteiten AgO (Agentschap Overheidspersoneel) en VDAB 16 bijkomende e-opleidingen voorzien. De 62 projecten initiële projecten zijn ondertussen afgelopen. De rapportering loopt. De projecten van AgO en VDAB lopen nog tot 15 december 2023. o Qua overheidsopdrachten moest de overheidsopdracht van het vooronderzoek (noden in kaart brengen) opnieuw gelanceerd worden. Deze opdracht is afgerond eind oktober 2022. De overheidsopdrachten inzake facilitatie van het lerend netwerk e-leren en coaches/experten inzake usability design zijn sinds februari '22 aan de slag. <p>Duiding scopeverkleining: De resultaten van het vooronderzoek naar de verdere afstemming van vraag en aanbod inzake e-leren lieten ons concluderen dat het beter was om de middelen uit het actieplan e-leren over te hevelen van VV128 naar VV018.</p> <p>De verwachtingen die naar voor komen uit het onderzoek, zijn immers vooral praktisch van aard. Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om nog meer diepgaande studies te verrichten naar wat werkt en wat niet met het oog op kwetsbare groepen, blijkt uit het vooronderzoek en de bevraging dat men met de middelen effectief aan de slag wil gaan, en hierbij de nodige ondersteuning wenst te krijgen en toegang wenst tot de reeds opgebouwde kennis en expertise. Om dit te kunnen</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

verwezenlijken, werd een alternatieve invulling gezocht en werd er beslist dat de VDAB deze taken, binnen haar rol als connector en regisseur voor online leren, op zich zou nemen. Er is dan ook een overheveling van de middelen uit het actieplan e-leren (VV128) naar het opleidingsoffensief arbeidsmarkt, deelactie verbreding online-leren (VV018), geformaliseerd door de Vlaamse Regering.

- De eerste versie van het gepersonaliseerd loopbaanplatform is toegankelijk sinds 17/09/'21. 'Mijn Loopbaan' maakte plaats voor (een eerste versie van) het gepersonaliseerd loopbaanplatform vdab.be. Het aantal gebruikers van digitale dienstverlening van VDAB zonder inschrijving ("accountwerking", sinds september 2021), bedroeg in 2022 gemiddeld zo'n 40.000 burgers per maand. In de maand oktober 2022 bedroeg dit aantal 47.430. In de volgende fases (2022 - 2023) zal VDAB het gepersonaliseerde loopbaanplatform verder uitwerken. Concreet werkt VDAB in 2023 onder andere aan een betere visualisatie van de loopbaancheques binnen het loopbaanplatform en het in real-time tonen van het recht op loopbaancheques aan de burger. Dit versnelt en vereenvoudigt de aanvraagprocedure van de loopbaancheques voor de burger.

- Momenteel loopt de technische analyse van het digitaal opleidingsplatform en deze blijft deze doorlopen in 2023. Dit gaat vooral over welke onderliggende technische tool best past. De uitrol is voorzien voor 2024. Zowel bij de huidige versie van het digitale opleidingsplatform van VDAB, (de Vind Een Opleiding) alsook de toekomstige versie, werkt VDAB aan het leggen van linken naar andere relevante beleidsprojecten. Dit gaat bijvoorbeeld over het weergeven van de Vlaamse Opleidingsincentives (opleidingsverlof, opleidingskrediet, opleidingscheque) op voor de burger logische plaatsen op het opleidingsplatform. In het kader van de lopende analyse zal onderzocht worden hoe de leer- en loopbaanrekening hierin stapsgewijs verder kan geïntegreerd worden. Ook vanuit de competentiechecks voor werknemers zullen er opleidingsuggesties gegeven worden die op termijn kunnen leiden naar het opleidingsaanbod in het huidig dan wel toekomstig, nieuw opleidingsplatform.

- De vernieuwde werkgeversbenadering met focus op knelpuntvacatures is in volle ontwikkeling. Daartoe zorgde VDAB in 2022 reeds voor een automatische inschatting waardoor enkel knelpuntvacatures in gedeeld beheer komen en voor een monitoringmodel waardoor lang openstaande vacatures (die geen knelpunt zijn) ook in gedeeld beheer kunnen worden genomen. Vanuit de vernieuwde face-to-face dienstverlening zullen VDAB-bemiddelaars en accountmanagers de werkgevers nog meer proactief benaderen en daarbij concrete oplossingen voorstellen, met de nadruk op werkplekieren en competentieversterking. Deze proactieve werking werd als piloot reeds uitgerold binnen de cluster industrie en wordt -rekening houdend met de leereffecten- in 2023 verder uitgebreid naar de andere clusters.

In oktober 2022 werden 29.115 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het NECzU. Dat is 19,7% minder dan in oktober 2021. De voorbije twaalf maanden (nov 2021 t/m okt 2022) werden 392.651 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is nog steeds 16,2% meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.

- Om te voorzien in een vernieuwd digitaal werkgeversloket werd Op 31/01/'22 de versnelde automatische registratie voor 'Mijn VDAB' gelanceerd. Op 01/02/2022 ging ook de vernieuwde 'Vind een Werknemer', de self-service tool voor de werkgever om zelf gepaste kandidaten te zoeken, live. Hiermee krijgt deze een verbeterde user experience en bijkomende selectiecriteria. Eind 2022 en begin 2023 wordt nog gewerkt aan het verbeteren van het werkgeversplatform 'Mijn VDAB' met o.a. een vernieuwde landingspagina.

- In 2021 liepen experimenten in de provincies met als doel digitale (job)events structureel uit te werken. Sinds mei 2021 werden er 10 digitale beurzen georganiseerd, waar in totaal 5774 personen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

aan deelnamen en 239 bedrijven aanwezig waren. De digitale events zijn nu structureel ingebed in de dienstverlening van VDAB als volwaardig alternatief op fysieke events.

- We digitaliseren het partnermanagement bij VDAB. In 2021 werd reeds gewerkt aan het kader voor business architectuur. De gunning van het CRM platform gebeurde in september 2022, waarna de opstart voor configuratie van het platform kon gebeuren. De oplevering van de eerste versie is voorzien vanaf het tweede kwartaal van '23, daarna volgt finetuning.

- De visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen' werd goedgekeurd op de VR van 25/03/'22. Fase 1 van de leer- en loopbaanrekening, de Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives, werd afgerond in 2021. Fase 2, de voorbereiding van het gepersonaliseerd overzicht opleidingsincentives, is ongoing. De samenwerkingsovereenkomst Mijn Burgerprofiel – WSE werd opgesteld en de ontwikkelingen vinden plaats in Q2-Q3 2022, alsook in Q1 van 2023.

- Verschillende digitaliseringsprojecten naar burgers komen stilaan op koers:

o Dienstencheque innovatie: Uit het eindrapport van de externe consultants werd een voorstel geformuleerd door WSE om het dienstenchequesysteem vanaf 1/1/2025 te digitaliseren. De non-paper met dit voorstel werd in september goedgekeurd door de VR. Hieruit werd een juridisch traject (met aanpassingen aan het BVR dienstencheques) opgestart en werd intern bij WSE gestart met de voorbereiding van de nieuwe uitbesteding. Er wordt vooropgesteld om met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe uitbesteding van start te gaan op 1/1/2025.

o Verdere digitalisering van aanmoedigingspremies is in uitvoering. De nieuwe toepassing met vernieuwde gebruikerservaring werd in gebruik genomen begin 12/2022. Verdere doorontwikkelingen zijn lopende.

o Digitalisering incentives werkplekken dual is opgestart: administratieve vereenvoudiging van de incentive aan ondernemingen in dual leren en andere alternerende opleidingen. De eerste ontwikkelingen zijn opgestart.

o Digitalisering aanvraag jobbonus is in uitvoering.

- Het WSE digitaal werkgeversloket is in volle opbouw:

o Productkeuze customer service management is afgerond, de implementatie ervan opgestart en het gebruikersonderzoek ivf. behoeftenanalyse afgerond. De gunning van een geschikt CRM-platform dat integreert met het WSE loket is voltooid. Het implementatietraject wordt opgestart.

o De digitale aanvraag voor collectief maatwerk en ondersteuningsdecreet werd reeds gerealiseerd
o Voor individueel maatwerk wordt een applicatie gebouwd waarvan het loketgedeelte in IT-testfase zit en binnenkort op businessniveau grondig wordt getest.

o De lancering WSE-loket beroepskaarten (ikv digitaal nieuw beleid) werd gerealiseerd op 1 februari '22. Het proces omtrent operationalisering digitalisering aanvragen beroepskaart is lopende (dossierbehandeling en digitale afhaling van de beroepskaart gerealiseerd). Concreet houdt dit overlegmomenten in met betrokken partijen zoals departement cultuur, sport-Vlaanderen, FIT, Vlaio, federatie diamant, ondernemingsloketten, BUZA, VSI, IT.

o Verdere graduele invoering van de digitalisering van aanvragen via mandataris en niet-EU aanvrager via verblijf in het buitenland loopt.

- De WSE digitaliseringsprojecten naar partners komen stilaan op koers:

o Het gebruikersonderzoek ivf. behoeftenanalyse is afgerond en verdere detailanalyse opgestart.

o Eerste implementatie van het digitaal cijferportaal i.s.m. steunpunt is in uitvoering

o 3 sectorconvenanten-dashboards werden online geplaatst, als onderdeel van het project om gegevensdatabanken op een opendataplatform beschikbaar te stellen.

o Digitalisering dual leren: De operationele digitale wijzigingen nodig voor de introductie van dual leren in het volwassenonderwijs werden gerealiseerd tegen 01/09/2022 zoals voorzien.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De ontwikkeling van het leveranciersplatform beroepskwalificerende trajecten is afgerond. De beslissing om alle uitgaven in het kader van de relancemiddelen eind 2022 vast te leggen bood wat uitdagingen, maar de acties werden allemaal voorgelegd aan VR en goedgekeurd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Actieplan e-leren - centraal informatiepunt: Het nieuwe platform infopunt e-leren is operationeel. (VDAB)	2022 Q4	Gerealiseerd	
Actieplan e-leren - oproep e-leren: De oproep e-leren is gefinaliseerd.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Versnelling uitrol werkgeversbenadering: De vernieuwde intensieve vacaturewerking van VDAB is operationeel. (VDAB)	2023 Q4	Op schema	
Leer- en loopbaanrekening: De gepersonaliseerde portefeuille Vlaamse opleidingsincentives is online beschikbaar	2023 Q4	Op schema	
Digitale dienstverlening WSE naar burgers: Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.	2023 Q4	Op schema	
Digitale dienstverlening naar werkgevers: Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.	2023 Q4	Op schema	
Digitaal werkgeversloket VDAB: Het digitaal werkgeversloket van VDAB is operationeel. (VDAB)	2023 Q4	Op schema	
Digitale jobbeurzen: De organisatie van digitale jobbeurzen is ingebed in de reguliere werking van VDAB. (VDAB)	2023 Q4	Gerealiseerd	
Digitalisering VDAB partnermanagement: Het digitaal partnerplatform van VDAB is operationeel. (VDAB)	2023 Q4	Op schema	
Digitaal opleidingsplatform: Het digitaal opleidingsplatform van VDAB is operationeel. (VDAB)	2023 Q4	Op schema	
Gepersonaliseerde burgerwebsite voor de loopbaan: Het gepersonaliseerd loopbaanplatform van VDAB is operationeel. (VDAB)	2023 Q4	Op schema	
Digitale dienstverlening WSE naar partners: Alle vooropgestelde deelacties zijn geïmplementeerd.	2024 Q4	Op schema	
Actieplan e-leren - overheidsopdrachten: De overheidsopdrachten zijn gelanceerd.	2024 Q4	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALLEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Visienota over leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen (RRF)		2022 Q2	Gerealiseerd	
Ontwikkeling van een elektronisch leeraanbod in Vlaanderen (RRF)		2023 Q4	Op schema	
Digitale tools en diensten voor burgers, werknemers en partners van de Vlaamse Openbare Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), volledig ontplooid in Vlaanderen (RRF)		2023 Q4	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal e-learningprojecten dat wordt goedgekeurd, gelanceerd en voltooid op basis van een oproep tot het indienen van projecten. (RRF) Opgelet, de RRF-indicator wordt op een striktere manier berekend en pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.	70	2022 Q4	77	100 %
DWSE digitaliseringsprojecten naar partners: 15 relevante gegevensbanken zijn ter beschikking gesteld op het opendataplatform voor onderzoek en andere doeleinden. (RRF) Opgelet, de RRF-indicator wordt op een striktere manier berekend en pas op het einde van het RRF-project meegegeven op basis van bewijsstukken.	15	2023 Q4	3	20 %
Aantal jaarlijks gemelde vacatures bij VDAB (periode augustus - juli)	Stijging tov. augustus 2020 - juli 2021 (297.928)	2023 Q4	392.651	100 %
Aantal gebruikers van digitale dienstverlening van VDAB.be zonder inschrijving ("accountwerking", sinds september 2021) Opgelet, het meest recente cijfer is van oktober 2022	stijging t.o.v. december 2021 (36.284 unieke gebruikers in de loop van de meetmaand)	2024 Q4	47.430	100 %
PROJECTFINANCIERING				
Beleidsruimte (begroot)	54.000.000 EUR			
Beleidsruimte (begroot) update	45.000.000 EUR			

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	42.977.000 EUR
Uitvoering VEK	26.308.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 43.200.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Digitaliseringsprojecten VDAB en Departement WSE in kader van AHAD</p> <p>Mededeling aan het stuurorgaan Vlaams informatie en ICT-beleid. Bijlage</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 22 oktober 2021. Actieplan E-leren</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 25 maart 2022. Visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen' + bijlage</p> <p>VR 9 september 2022 - Wijziging subsidiebesluit opleidingsverstrekkers E-leren</p> <p>Mededeling aan de Vlaamse Regering van 7 oktober 2022. Digitaliseringsprojecten Departement WSE in kader van AHAD relance-budgetverschuiving</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022. Actieplan E-leren in het kader van Vlaamse Veerkracht (VV128 – Digitale Vaardigheden)-Digitaliseringsprojecten VDAB en Departement Werk en Sociale Economie in het kader van AHAD relance-budgetverschuiving VV128 naar VV018-Opleidingsoffensief arbeidsmarkt</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
<p>VV015 - Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong)</p> <p>VV019 - Versterken Levenslang Blijven Leren</p> <p>VV050 - Digitalisering integratie & inburgering</p> <p>VV051 - Gemeente zonder gemeentehuis</p> <p>VV052 - Iedereen digitaal - digibuddies</p> <p>VV053 - Iedereen digitaal - opleiding & vorming</p> <p>VV054 - Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet</p> <p>VV056 - Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022</p> <p>VV057 - Ondersteuning Digitale Transformatie</p> <p>VV058 - AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening (inclusief bijdrage subsidieregister)</p> <p>VV060 - Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel</p> <p>VV063 - Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck</p> <p>VV065 - HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM (Security Information & Event Management)</p> <p>VV076 - Zelf beheerde identiteit</p>

28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector

VV129 - CULTUUR - BETERE INFORMATIEDOORSTROMING EN KOPPELING DATABANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het Departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de datagedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.</p> <p>Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken.</p> <p>Het Departement CJM maakt eveneens deel uit van dit ecosysteem en wil haar dienstverlening en data zo maximaal mogelijk afstemmen, inrichten en opbouwen dat ze de processen en digitale transformatie in de sectoren cultuur, jeugd en media mee aanjaagt. Het departement ontwikkelt zijn datastrategie verder door, ook in lijn met de in 2021 opgemaakte datastrategie van de Vlaamse overheid. Digitalisering van dienstverlening en datastromen zijn hierin de rode draad. Het wil evolueren tot een situatie waarbij data gestandaardiseerd kunnen vloeien, waarbij het Departement CJM unieke databronnen kan aanspreken in functie van zijn beleids- en evaluatienoden en deze voor bepaalde processen (subsidieprocessen, gegevensregistratie) ook zelf kan ontwikkelen, waarbij de sector tegelijk ontzorgd wordt en datamogelijkheden beter kan benutten.</p> <p>De uitwerking van bovenvermelde projecten brengen duidelijke knelpunten mee op vlak van de nodige fundamentele datapraktijken (datamanagement, datagovernance, datakwaliteit ...). De veelheid aan externe en interne projecten onderstreept de nood aan een duidelijk samenwerkingsverband tussen mensen die verantwoordelijkheid opnemen om de bruikbaarheid van data binnen het ecosysteem te garanderen en dit over teams en organisaties heen. Dit onderliggend project zet daarom in de periode 2022-2023 in op de verdere ontwikkeling van een duidelijk data strategisch raamwerk om zo de nodige organisatorische bouwstenen te voorzien voor de onderbouwing van de basismonitoring, de data governance en het doorstromen van data doorheen het ecosysteem om de</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

datamogelijkheden optimaler te benutten.

Het Departement CJM start in 2021 en 2022 volgende OSLO-standaardisatietrajecten op: cultuurparticipatie, cultuur- en jeugdinfrastructuur, financiële data, cultureel erfgoed en tewerkstelling. Na de validatie (en erkenning) van de uitwisselingsmodellen dient er ook aandacht besteed te worden aan de implementatie in de adoptie door de culturele sector. Dit is noodzakelijk om het digitale ecosysteem uit te bouwen. Binnen dit project lopen er drie aparte deelprojecten namelijk een OSLO-implementatieproject, het uitschrijven en uitvoeren van een PIO-opdracht en een governance project.

Samen met de kernspelers in de culturele sector worden er implementatiemodellen bepaald met inbegrip van het operationaliseren van de relaties tussen de verschillende OSLO-trajecten. Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling voor applicaties die een bepaalde use case vervullen. Het laat toe om naast een gedeelde semantiek ook bijkomende restricties op te leggen, zoals het vastleggen van kardinaliteiten of het gebruik van bepaalde codelijsten. Een implementatiemodel dient als documentatie voor analisten, ontwikkelaars en dataleveranciers.

Daarnaast wordt ook bekeken hoe culturele organisaties gestimuleerd kunnen worden om aanpassingen aan hun systemen te doen zodat ze OSLO compatibele data genereren. Hiervoor wordt er een PIO-opdracht uitgeschreven waarin beken wordt hoe softwareleveranciers overtuigd kunnen worden om OSLO verder te implementeren. Ook systeemtechnische aanpassingen aan de kant van het Departement CJM komen hierbij in beeld net zoals het opzetten van een governancemodel dat enerzijds het toekomstige beheer en onderhoud van de bestaande OSLO-data-elementen mogelijk maakt maar eveneens nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Er wordt een governanceproject opgesteld met als uitgangspunt een beheersproces waarbij duidelijke taken, rollen, verantwoordelijkheden en mandaten kunnen worden vastgelegd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	250.000 EUR
Output	<p>Dit project voorziet volgende output:</p> <ul style="list-style-type: none">- Niet alle ontwikkelingen binnen de digitale transformatie op vlak van datacentrisch denken kunnen gelijktijdig doorgevoerd worden. De implementatie van de datastrategie en datagedreven dienstverlening wordt op volgorde gezet. Dit project voorziet dan ook in de opstart van een datastrategie backlog en beslissingslog die transparant en toegankelijk bestaande knelpunten documenteert en die duidelijke de gestelde prioriteiten communiceert. Dit houdt dus ook in dat er een referentiekader ontwikkeld moet worden op basis waarvan deze prioriteiten gesteld zullen worden.- Verantwoordelijkheden met betrekking tot data en producten die gebruik maken van data worden gekoppeld aan een aantal rollen, zoals data governance lead, data steward of data owner, en werken samen met één doel: vragen, problemen, drempels die het ecosysteem tegenkomt op haar pad naar een data gedreven, digitale toekomst uit de weg ruimen. Waar nodig reactief, waar mogelijk proactief.- Niet iedereen zal onmiddellijk overtuigd zijn van de noodzaak en van de aanpak. Gezien de impact van de digitale transformatie is dit niet verwonderlijk en ook niet per se problematisch; de digitale transformatie brengt organisatorische cultuuruitdagingen mee binnen het ecosysteem. Om datagedreven beleid succesvol te introduceren, is een zekere mate van change management dus cruciaal. Binnen dit project zal expliciet aandacht geschonken worden aan change management en zullen concrete stappen op dit vlak mee opgenomen worden in de roadmap. Dit houdt in dat concrete acties worden vastgelegd die tot doel hebben mensen en organisaties van de nieuwe aanpak binnen het ecosysteem te overtuigen en ook richtlijnen omtrent hoe omgegaan zal worden met diegene die niet onmiddellijk mee aan boord zijn.- Als onderdeel van bovenvermeld change management zal ook concreet gewerkt worden aan een overkoepelend communicatieluik. Gebrek aan informatiedoorstroming met betrekking tot initiatieven die lopen of in het verleden liepen, is een grote risicofactor ten aanzien van het draagvlak van de digitale

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	transformatie. Ook mensen die overtuigd zijn van het nut ervan, hebben nood aan een duidelijk overzicht van wat ze kunnen verwachten en waar zij zich bevinden binnen het ecosysteem.
Outcome	Het Departement CJM werkt een digitale strategie uit met focus op data en architectuur. De deelprojecten van VV129 laten toe om stappen te zetten inzake governancemodellen voor datastandaardisatie, een aanzet tot coherent architecturaal kader te schetsen en daaromtrent kennis te internaliseren en de standaardisatie m.b.t. het cultureel-erfgoedobject te verfijnen. Het project draagt op deze manier bij tot de creatie van een datagedreven ecosysteem waar zowel het Departement CJM als de culturele (en jeugd- en media-) sector deel van uitmaken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het project is intussen in detail uitgewerkt en valt uiteen in drie delen: (1) een governancestudie mbt OSLO, (2) een enterprise architectuur opdracht met het oog op het verankeren van een enterprise architectuur binnen het programmabureau digitale transformatie en (3) en een OSLO iteratie cultureel erfgoed. Deze drie trajecten zullen in 2022 van start gaan en worden in 2023 voltooid. De eerder geformuleerde mijlpalen worden hieraan aangepast.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opdrachtomschrijving afgewerkt en bestek gepubliceerd	2022 Q2	Stopgezet	We kozen ervoor de lopende OSLO-tracks eerst af te ronden om op die manier het effect van het implementatietraject te verhogen.
Afsluiten van een SWO met Digitaal Vlaanderen voor OSLO iteratie cultureel erfgoed	2022 Q4	Gerealiseerd	
Gunnen van het governanceproject om governancemodel op te stellen	2022 Q4	Gerealiseerd	Gegund in november 22
Afsluiten van een SWO met Digitaal Vlaanderen voor traject enterprise architectuur	2022 Q4	Gerealiseerd	
Gunnen van het OSLO-implementatieproject waarbij implementatiemodellen worden opgesteld	2022 Q4	Stopgezet	Zoals in de projectvoortgang van december '22 aangegeven, is er voor een andere invulling van dit project gekozen
Opleveren van het governanceproject met governance model	2023 Q4	Nog niet gestart	
Opleveren van een governancemodel voor architecturale aansturing en een coherente,	2023 Q4	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
consistente verzameling principes, verbijzonderd naar uitgangspunten, regels, richtlijnen en standaarden voor verdere ontwikkelingen.			
Opleveren PIO-opdracht	2023 Q4	Stopgezet	Zoals in de projectvoortgang van december '22 aangegeven, is er voor een andere invulling van dit project gekozen
Opleveren van een actualisatie van de OSLO Standaard cultureel erfgoed	2023 Q4	Nog niet gestart	
Opleveren van het OSLO-implementatie project	2023 Q4	Stopgezet	Zoals in de projectvoortgang van december '22 aangegeven, is er voor een andere invulling van dit project gekozen

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	250.000 EUR
Uitvoering VAK	250.000 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 250.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Digitale transformatie van de cultuursector. Koppeling databanken en betere informatiedoorstroming
Business Case Doelgericht Digitaal Transformeren. Bijlage
Budget. Bijlage

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV072 - Doelgericht digitaal transformeren](#)

VV130 - CULTUUR - DIGITALISERING VAN COLLECTIES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het Departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt. Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken</p> <p>Een kritische massa aan digitale content is een voorwaarde om het digitale culturele ecosysteem te optimaliseren. De achterstanden inzake gedigitaliseerde (en gemetadateerde) content zijn nog steeds aanzienlijk, zowel binnen cultureel erfgoed als binnen kunsten, ondanks de huidige werking van meemoo en de mogelijkheden die door het Cultureelerfgoeddecreet en ad-hocreglementen zoals de inhaalbeweging digitale collectieregistratie worden geboden. Dit project beoogt om via coördinatie en schaalvoordelen een belangrijke stap vooruit te zetten inzake de digitalisering, metadatering en duurzame beschikbaarheidsstelling van culturele collecties en wil komen tot een situatie waarbij er een duidelijke stand van zaken is en een stappenplan voor verdere evoluties.</p> <p>Na afloop van dit project zullen de grootste achterstanden weggewerkt zijn en is het gecreëerde materiaal open - conform de OSLO-uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed - toegankelijk zodat dit verder maatschappelijk gevaloriseerd kan worden.</p> <p>Het project valt uiteen in volgende vier deelprojecten:</p> <p>Deelproject 1. Gecoördineerde digitaliseringsactie door een consortium, door meemoo gecoördineerd, dat de organisatorische en technische expertise heeft om dit digitaliseringsproject op een gecoördineerde manier uit te voeren teneinde schaalvoordelen te realiseren. (budget: 2.705.000 EUR).</p> <p>Deelproject 2. Een versterking van het reglement rond inhaalbeweging op vlak van digitale collectieregistratie. meemoo voorziet begeleiding tijdens de voorbereidingsfase én tijdens de uitvoering van de projecten. Met dit subsidiereglement worden naast sterker gecoördineerde acties (deelproject 1) ook kansen geboden aan kleinschaliger initiatieven vanuit</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

één of enkele organisaties. Uiteraard wordt er een optimale afstemming beoogd tussen beide deelprojecten. Wat de doelstellingen van het subsidiereglement betreft gaat het om een gecontinueerde inzet op het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie, het inzetten van de collectiedata als open data en het zichtbaar maken van de collectie(data) en het sterker reflecteren over de bredere visie van organisaties op het gebruik van digitale technologie in het beheren en zichtbaar maken van de collectie en de collectiedata. (budget: 1.817.500 EUR, waarvan 130.000 EUR voor begeleiding meemoo, en 1.687.500 EUR voor de subsidielij).

Deelproject 3. Businesscase m.b.t. de randvoorwaarden i.f.v. creatie, duurzame preservatie en ter beschikkingstelling van digitale collecties. Het resultaat is een roadmap voor een optimale organisatorische en technische inrichting van de cultureel-erfgoedsector. (budget: 175.000 EUR).

Deelproject 4. 'Cultuur na corona': In het kader van de relance van de culturele sector werd eind 2020 de Taskforce Relance Cultuur opgericht. Deze Taskforce geeft de opdracht aan een werkgroep korte termijn (WGKT) en een werkgroep middellange termijn (WGMLT) om een aantal voorstellen uit te werken. De WGMLT bestaat onder de naam Toekomsttraject 'Cultuur na corona' uit drie deeltrajecten: kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk. De opdracht wordt in drie (overlappende) fasen gegeven aan Cultuurloket, die voor elk deeltraject samenwerkt met het sectorale steunpunt. Het einddoel is de organisatie van een staten-generaal voor cultuur. (budget: 70.000 EUR).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	5.000.000 EUR
Output	<p>1/ Aantal gerealiseerde projecten - december 2023 (deelproject 2)</p> <p>2/ Realisatie van de roadmap - mei 2022 (deelproject 3)</p> <p>3/ Gecoördineerde actie meemoo - december 2023 (deelproject 1)</p> <ul style="list-style-type: none">- Toename van hoogwaardige digitale content van onder andere kranten, glasplaten en een fotografische productie van Vlaamse Topstukken;- Aanbieden van hulp bij identificatie fotomateriaaltypes;- Metadatacreatie (spraakherkenning en gezichtsdetectie). <p>4/ De Staten-Generaal is een fysieke samenkomst van de cultuursector en zal perspectief bieden op een nieuwe start na corona. Cultuurloket stelt samen met de drie sectorale steunpunten hun rapport voor, daarna zullen drie internationale experts hierover terugkoppelen en vergelijken met de aanpak bij hen. (deelproject 4)</p>
Outcome	<ul style="list-style-type: none">- Een aanzienlijke toename van bruikbare digitale content in functie van maatschappelijke valorisatie (deelproject 1 en 2)- Een roadmap voor de optimale inrichting (organisatorisch/technisch) van de cultureel-erfgoedsector i.f.v. digitale collectieprocessen (deelproject 3)- Het rapport van de Taskforce Relance Cultuur zal een aantal perspectieven bieden op de situatie van de sector na de pandemie. Aan bod komen ook best practices vanuit de sector om zich aan te passen aan een veranderde cultuurbeleving (deelproject 4)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
---------------	--------------------------------

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>- Deelproject 1: Update van de verschillende deelprojecten: * Voor glasplaten en kranten zitten we iets achter op de kalender: de testfasen voor digitalisering zijn voor beiden achter de rug, we beginnen in januari 2023 met de productiefase. De einddatum van de digitalisering komt wel niet in het gedrang. De registratie van de kranten en glasplaten ligt voor op schema. * Voor fotografisch reproductie voor topstukken is de 2D, 3D en Gigapixel digitalisering bezig. De digitalisering voor manuscripten zal normaal in april 2023 starten. * Voor spraakherkenning gebeurde de gunning op 16/12. Deze aanbesteding moest opnieuw gebeuren omdat de indieners bij de vorige procedure fouten gemaakt hadden. Voor gezichtsdetectie is de ontwikkeling van de software bezig.</p> <p>- Deelproject 2: geen updates. De projecten zijn nog steeds lopende.</p> <p>- Deelproject 3: De business case is opgeleverd.</p> <p>- Deelproject 4: Het netwerkevent ging niet door vanwege de coronacrisis. De middelen werden herverdeeld richting de projectoproep rond inhaalbeweging op vlak van digitale collectieregistratie.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Deelproject 3: Finetunen opdrachtomschrijving business case duurzame omgang met digitale collecties en ondertekening samenwerkingsovereenkomst Digitaal Vlaanderen en D CJM	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deelproject 2: Lancering oproep reglement	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deelproject 4: Organisatie Staten-Generaal Cultuur waar het rapport van de werkgroep Middellange Termijn van de Tasforce Relance Cultuur voorgesteld wordt.	2021 Q4	Stopgezet	Door corona kon het publieke evenement niet doorgaan.
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Gunning digitaliseringsopdrachten topstukken/kranten/glasplaten	2022 Q2	Gerealiseerd	
Deelproject 3: Oplevering roadmap (= resultaat van businesscase) voor de technische en organisatorische inrichting van de cultureel-erfgoedsector i.f.v. de omgang met digitale collecties (doorlooptijd sept 21 - september 22)	2022 Q3	Gerealiseerd	
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Oplevering foto gedeelte 'kenjdrager'-tool	2023 Q2	Op schema	
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Oplevering spraakherkenning op 163k bestanden	2023 Q3	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: Einde digitalisering glasplaten (170.000 platen) Einde digitalisering topstukken Einde van de digitalisering van de kranten (630.000 pagina's)Oplevering entiteit extractie op tekst (163k bestanden)Oplevering gezichtsdetectie op video (120k bestanden)	2023 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Deelproject 3: Roadmap voor de optimale inrichting (organisatorisch/technisch) van de cultureel-erfgoedsector i.f.v. digitale collectieprocessen	strategische roadmap	2022 Q3		100 %
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Metadatacreatie via machine learning: Gezichtsdetectie-en herkenning op 120.000 bestanden.	120000	2023 Q4		
Deelproject 1 en 2: Aanzienlijke toename van bruikbare digitale content in functie van maatschappelijke valorisatie		2023 Q4		50 %
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Hoogwaardige fotografische reproductie van Vlaamse Topstukken: 2D: ca. 175 schilderijen, etsen, gravures e.d. 3D: collectie-Van Herck en 10 andere sculpturen Ca. 40 à 50 manuscripten Gigapixelopnames: 25 topwerken van de Vlaamse schilderkunst Aangeboden via meemoo platformen en site van content partner.	175	2023 Q4	44	25 %
Deelproject 2: Aantal gerealiseerde projecten	11	2023 Q4	16	145 %
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Kranten: creatie van hoogwaardige digitale beelden van 630.000 krantenpagina's van ca. 10 erfgoedinstellingen.	630000	2023 Q4		
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Metadatacreatie via machine learning: Spraakherkenning op 163.000 bestanden.	163000	2023 Q4		
Deelproject 1: Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Glasplaten: digitalisering van 170000 glasplaten van zo'n 40 cultureelerfgoedinstellingen.	170000	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	5.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.000.000 EUR
Uitvoering VAK	5.000.000 EUR
Uitvoering VEK	3.039.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 5.000.000 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Plan Vlaamse Veerkracht: dossier 130. Goedkeuring VR 21/05/2021

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV072 - Doelgericht digitaal transformeren

VV131 - CULTUUR - INTEGRATIETRAJECT ERFGOEDDATABANKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	- Collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg als kerntaak hebben - Collectiehoudende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben, inclusief private organisaties - brede publiek / onderwijs / onderzoekers / ...

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt het Departement CJM sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen teneinde de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren. Dit traject leverde begin 2021 een algemeen strategisch kader op dat enerzijds het belang van toegankelijke en gestandaardiseerde gedeelde data en anderzijds een open benadering van gedeelde infrastructuur centraal stelt. Zo kan een open ecosysteem ontwikkeld worden dat bijdraagt tot de ontzorging van de culturele sector, het stimuleren van samenwerking in een netwerkmodel en het verhogen van de data-gedreven dienstverlening. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de strategie en digitale bouwstenen die Vlaanderen uitdraagt.</p> <p>Volgende projecten worden conform dit strategische kader uitgewerkt: (VV072) doelgericht digitaal transformeren, (VV083) inventaris infrastructuur, (VV129) betere informatiedoorstroming en koppeling databanken, (VV130) digitalisering van collecties en (VV131) erfgoeddatabanken.</p> <p>Sinds 2018 vallen de (vroeger provinciale) erfgoeddatabanken onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De integratie op organisatorisch en technologisch vlak moet nog worden gerealiseerd. Het project om deze erfgoeddatabanken te integreren is een belangrijke projectstap om de digitale transformatie binnen de culturele sector te stimuleren. Daarenboven is het een belangrijke stap om een goed functionerend ecosysteem op te zetten waarin collectiedata uitwisselbaar wordt. De OSLO-uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed zal in de collectieregistratietool geïmplementeerd worden. Het finale doel van dit project is het duurzaam en kostenefficiënt faciliteren van 'collectieregistratie' en '-beheer' en 'hergebruik van data' voor organisaties die collectiezorg als kerntaak hebben maar ook de vele houders van erfgoed die de zorg ervan niet als kerntaak hebben.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	Op het einde van dit project is er één laagdrempelig collectieregistratiesysteem ter beschikking van collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben. Er is ook één collectiebeheersysteem voor collectiebeherende organisaties wiens kerntaak erfgoedzorg is. Daaraan gekoppeld is er een kwalitatieve dienstverlening op maat van de diverse gebruikers.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruikers van de bestaande systemen maken ook gebruik van de nieuwe systemen om collectiedata te registreren en collecties te beheren; - het digitale beheer van erfgoedcollecties bij erfgoedhouders die erfgoedzorg als kerntaak hebben wordt verder geprofessionaliseerd; - samenwerking en uitwisseling tussen erfgoedhouders wordt gestimuleerd; - er is steeds meer open data beschikbaar; - de OSLO-standaard ontwikkeld voor de registratie van erfgoedcollecties wordt algemeen gebruikt.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Op basis van deskstudie, data-analyses van de huidige erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht en Erfgoedplus, gebruikersbevragingen via focusgroepen en klankbordsessies en overleg met stakeholders is er een goed beeld op de gewenste functionele architectuur en inrichting van de nieuwe Vlaamse erfgoeddatabank.</p> <p>De lijst met requirements wordt samen met een werkgroep (bestaande uit het projectteam, experts binnen meemoo en vertegenwoordigers van de toekomstige klanten) verder verfijnd en aangevuld met use cases. Beide zullen deel uitmaken van het bestek dat, na goedkeuring van de RVB van meemoo, in het voorjaar 2023 wordt gepubliceerd.</p> <p>De opdracht wordt eind Q3 2023 gegund, waarna we samen met de leverancier de planning voor implementatie en migratie vastleggen. We starten met de migratie van de data in het huidige Erfgoedregister en enkele pilootklanten.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring projectplan VR	2021 Q2	Gerealiseerd	
Officiële start project na aanwerving projectleider	2021 Q3	Gerealiseerd	
Collecties 'collectiehouders die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben' zijn gemigreerd van EIZ naar Erfgoedplus (voorbereidende stap)	2022 Q1	Gerealiseerd	De geplande datamigratie is uitgevoerd

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Technische en functionele analyse collectiebeheersysteem en collectieregistratiesysteem	2022 Q2	Gerealiseerd	De analyses zijn uitgevoerd, in nauwe betrokkenheid met de huidige gebruikers van Erfgoedplus en Erfgoedinzicht, alsook met potentiële gebruikers die overwogen in te stappen. Dit gebeurde door middel van 18 thematische focusgroepen en 4 klankbordsessies. De beschikbaarheid van de gewenste requirements zijn afgetoetst in een brede marktverkenning. De resultaten en voorstellen tot bijsturing worden voorgelegd aan de projectstuurgroep (januari 2023).	
Start aanbesteding collectieregistratiesysteem	2022 Q3	Vertraging	Uit de analyses en marktverkenning blijkt dat het haalbaar is één systeem aan te bieden voor zowel collectieregistratie als collectiebeheer. We plannen de aanbesteding voor dit collectiebeheersysteem op te starten in Q1 2023.	
Start aanbesteding collectiebeheersysteem	2022 Q4	Vertraging	Uit de analyses en marktverkenning blijkt dat het haalbaar is één systeem aan te bieden voor zowel collectieregistratie als collectiebeheer. We plannen de aanbesteding voor dit collectiebeheersysteem op te starten in Q1 2023.	
Start ontwikkeling collectieregistratiesysteem	2023 Q1	Nog niet gestart		
Start configuratie en aanpassingen collectiebeheersysteem	2023 Q2	Nog niet gestart		
Start testfase en migratie pilootklanten collectiebeheersysteem	2023 Q3	Nog niet gestart		
Uitvoeren test en migratieproefsets collectieregistratiesysteem	2023 Q3	Nog niet gestart		
Start uitrol en migratie collectieregistratiesysteem	2023 Q4	Nog niet gestart		
Start migratie en configuratie per klant collectiebeheersysteem	2024 Q4	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Er is een performant collectiebeheerssysteem voor collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg wel als kerntaak hebben	1	2023 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Er is een performant collectieregistratiesysteem voor collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben	1	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.000.000 EUR
Uitvoering VAK	2.000.000 EUR
Uitvoering VEK	857.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Goedkeuring VR op 8/07/2021: Operationalisering integratie erfgoeddatabanken

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV072 - Doelgericht digitaal transformeren

VV132 - DIGITAAL VERENIGINGSLOKET - INVESTERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen - Agentschap Binnenlands Bestuur - Agentschap Innoveren en Ondernemen - Sport Vlaanderen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	Lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De Vlaamse Regering wenst een digitaal Verenigingsloket op te zetten naar analogie met Mijn Burgerprofiel en het e-Loket voor Ondernemers. Dit unieke loket moet verenigingen (vzw's en feitelijke verenigingen) beter ondersteunen bij hun interacties met overheden en andere dienstverleners op alle niveaus, via een betere digitalisering van (overheids)diensten allerhande. Met dit loket wil de Vlaamse overheid zowel de administratieve last voor verenigingen en dienstverlenende instanties verlagen als het beschikbare dienstverleningsaanbod beter zichtbaar maken.</p> <p>De relancemiddelen worden gebruikt als extra investering voor het programma dat ook over reguliere middelen beschikt, nl. 4.050.000 EUR.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.850.000 EUR
Output	<p>We koppelen dienstverleningsproducten aan het V-loket.</p> <p>We sluiten dienstverlenende (overheids)instanties op alle niveaus aan die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren.</p> <p>We identificeren verenigingen die via het V-loket met de overheid interageren.</p>
Outcome	<p>Door het V-loket wordt het dienstverleningsaanbod van overheden (en andere dienstverleners) aan verenigingen vaker digitaal georganiseerd, en bovendien op een efficiëntere wijze: de administratieve last bij aanvraag en afhandeling neemt af, zowel aan de kant van de verenigingen als van dienstverlenende (overheids)instanties.</p> <p>Daarnaast creëert het V-loket een overkoepelend overzicht van het beschikbare dienstverleningsaanbod, zodat verenigingen sneller en vaker toegeleid worden naar ondersteunende of omkaderende maatregelen die op hen van toepassing zijn.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Aan de verschillende deelprojecten binnen het Verenigingsloketprogramma wordt verder gewerkt in samenwerking met alle strategische partners. De ontwikkeling van het Minimal Viable Product (MVP), een eerste prototype van het Verenigingsloket, is volop bezig en wordt in een eerste versie gedemonstreerd eind januari 2023. Parallel bespreken we met enkele piloten de mogelijkheid om testomgevingen op te zetten om de functionaliteiten uit te proberen en om de nodige stappen te zetten om eerste aansluitingen te proberen realiseren tegen de voorstelling van het Minimal Marketable Product (MMP).
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lanceren interactief ideeën-management en burgerparticipatie platform ('community platform')	2021 Q4	Gerealiseerd	Het participatieplatform is een van de gebruikte methodes om onze doelgroepen te bevragen: knelpunten detecteren, ideeën lanceren en capteren, gebruikerstesten doen, prototypes testen, etc.
Lanceren bètaversie verenigingsloket: architectuurtestversie en eerste informatief overzicht	2022 Q1	Gerealiseerd	Basis-testversie om interne testen en gebruikersbevragingen te doen
Doorlopen OSLO-traject om een datastandaard te bepalen om feitelijke verenigingen uniek te identificeren	2022 Q2	Gerealiseerd	Doorlopen OSLO-traject om een datastandaard te bepalen om feitelijke verenigingen uniek te identificeren, met het oog op het ontwikkelen van een gegevensbron voor (feitelijke) verenigingen (onderdeel van Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 - trekker: Digitaal Vlaanderen)
Selecteren van eerste pilootprojecten	2022 Q4	Gerealiseerd	Selecteren van eerste pilootprojecten: zoeken naar en samenwerking opzetten met kandidaat-dienstverlenende instanties die willen meewerken aan Minimal Viable Product (MVP) en Minimal Marketable Product (MMP)
Ontwikkelen van een databron voor (feitelijke) verenigingen	2023 Q1	Op schema	We ontwikkelen een databron voor (feitelijke) verenigingen als belangrijke basisbouwsteen van het Verenigingsloket (onderdeel van Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 - trekker: Digitaal Vlaanderen)
Lanceren Minimal Viable Product (MVP) van het Verenigingsloket	2023 Q1	Op schema	Prototype van het Verenigingsloket om levensvatbaarheid te testen en zo nodig bij te sturen
Lanceren Minimal Marketable Product (MMP) van het Verenigingsloket	2023 Q4	Nog niet gestart	Lanceren van het eerste minimale, ook op de achtergrond werkende, product dat we publiek maken: lancering v1.0.
Uitbreiden groep dienstverlenende instanties	2024 Q2	Nog niet gestart	Uitbreiden groep dienstverlenende instanties: samenwerking opzetten met een bredere groep

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			dienstverlenende instanties die hun diensten willen aanbieden via het Verenigingsloket	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
"We sluiten (overheids)instanties op alle niveaus aan die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren."--> De dienstverleningsproducten die diverse overheden (en andere dienstverleners) aanbieden aan verenigingen zijn nog niet in kaart gebracht (zie andere indicator). Daarnaast moeten met de diverse stakeholders nog diepgaander de opportuniteiten en risico's van aansluiting op het V-loket verkend worden. Beide zaken samen maken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om realistische targets in te stellen.	(zie toelichting)	2024 Q4		
"We koppelen dienstverleningsproducten aan het V-loket." --> Hieraan is nog geen concrete indicatorwaarde toegewezen, omdat in deze fase van het project nog geen duidelijkheid is verkregen over het precieze aantal dienstverleningsproducten die verenigingen als doelgroep hebben. Hierdoor is het op dit ogenblik nog niet mogelijk een concrete target te definiëren. Het in kaart brengen van dienstverlening gericht op verenigingen is onderdeel van het Verenigingsloketprogramma.	(zie toelichting)	2024 Q4		
"We identificeren verenigingen die via het Verenigingsloket met de overheid interageren."--> Het project focust zowel op vzw's als op feitelijke verenigingen. Op dit moment is het niet mogelijk om feitelijke verenigingen uniek te identificeren (een VRD2-project waarin we vanuit het Verenigingsloket meewerken heeft precies tot doel dit mogelijk te maken). Dit heeft tot gevolg dat er momenteel nog geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn over het totale aantal verenigingen dat dienstverlening afneemt van overheden in Vlaanderen. Dit gegeven maakt het onmogelijk om voor deze indicator een realistische target te definiëren. Dit zal bovendien pas mogelijk zijn als een andere indicator (het aantal (overheids)instanties die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren) concreet is vastgelegd, want beide zijn verbonden met elkaar: pas als er een inschatting gemaakt kan worden van welke overheidsinstanties welke onderdelen van hun dienstverlening via het Verenigingsloket willen gaan aanbieden, is het mogelijk om af te leiden hoeveel	(zie toelichting)	2024 Q4		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
verenigingen redelijkerwijs aangesloten zullen kunnen worden op het Verenigingsloket.				

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.850.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.850.000 EUR
Uitvoering VAK	2.849.000 EUR
Uitvoering VEK	1.161.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.850.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 12/3/2021 - nota VR 12/3/2021 - bijlage

VV133 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VLAAMSE MEDIASECTOR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De brede Vlaamse mediasector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. De focus ligt hierbij op samenwerking tussen mediaorganisaties en extra waardecreatie binnen een globale competitieve context, zowel voor de mediaconsument, als voor de Vlaamse mediaspelers. Het programma zal investeren in gedeelde digitale media-infrastructuur en innovatieve diensten en oplossingen rond verschillende thema's (betrouwbare informatie en data / dieper inzicht in het gedrag van de mediaconsument / meer efficiënte en kwaliteitsvolle productie, opslag en distributie van mediacontent / betere vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent).</p> <p>Het digitaal transformatieprogramma zal uitgevoerd worden via 7 projectwerven:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Crossmediaal meetsysteem: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van een geavanceerd en sectorbreed crossmediaal meetsysteem dat een totaalbeeld zal geven van het mediagebruik in Vlaanderen. De scope omvat alle mediacontent die in Vlaanderen bekeken (totaal video), beluisterd (totaal audio) en gelezen (totaal lezen) wordt. De ambitie van dit project is een brug te slaan tussen traditioneel gebruikersonderzoek en de analytics aanpak voor digitale media door een hybride onderzoeksarchitectuur. Daarbij worden socio-demografisch geprofileerde data uit een nieuw representatief panel en grote hoeveelheden gebruikersdata van participerende Vlaamse mediaspelers slim aan elkaar gekoppeld. Dit moet leiden tot nieuwe en rijkere inzichten in cross-platform user life experience, in content keuzes van mediagebruikers en de context en behoeftes die deze keuzes bepalen.2) Mediahub cloudplatform: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van een gedeeld netwerk en cloudplatform voor de Vlaamse mediasector dat de deelnemende mediamakers in staat moet stellen om veilige verbindingen te leggen tussen verschillende medialocaties. De Mediahub zal toelaten om op hoge snelheid mediastreams en -bestanden te versturen, te ontvangen, op te slaan en te bewerken. Daarnaast zal Mediahub ook een diversiteit van diensten, zoals live-connectiviteit en datatransfer, aanbieden die via een gemeenschappelijk platform kunnen ingekocht worden. Dit moet leiden tot meer efficiëntie voor professionele mediamakers doordat de productiemiddelen gedeeld kunnen worden en makkelijker te schalen zijn.3) Projectoproep desinformatie: via een open oproep door het Departement CJM wordt financiële steun toegekend aan samenwerkingsprojecten die inzetten op verschillende facetten van de strijd tegen desinformatie. In dit kader worden onderbouwde initiatieven ondersteund van nieuwsmediaspelers (samen met het mediawijdsheidsveld en onderzoeksgroepen rond media) in hun opdracht en verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie die zij

PROJECTOMSCHRIJVING

verspreiden. Hierbij zal de focus liggen op vier thema's en aspecten: mediawijsheid van burgers en redacties / nieuwe (academische) inzichten inzake desinformatie / innovatieve tools en technologieën om desinformatie te detecteren en weerleggen / factchecking initiatieven.

4) Digitaal transformatieplan regionale omroepen: financiële steun voor de uitvoering van een digitaal transformatieplan op maat van de regionale omroepen dat inzet op noodzakelijke investeringen en gemeenschappelijke projecten die een meerderheid van de betrokken spelers kunnen implementeren. De focus ligt hierbij op toekomstgerichte projecten en investeringen binnen vijf inhoudelijke werven: 1) data, 2) connectiviteit, 3) distributie, 4) multiplatform redactie- en publicatiesysteem en 5) business modellen van de toekomst.

5) Projectoproep digitale transformatie mediasector: via een open projectoproep door het Departement CJM wordt financiële steun toegekend aan zowel grootschalige als kleinschalige samenwerkingsprojecten inzake media-innovatie en digitale transformatie. Hierbij zal de focus liggen op ontwikkelingsprojecten met een kort implementatietraject (2-3 jaar) die inzetten op een van volgende kernthema's: 1) het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse content, 2) slimme technologieën en digitale tools die de efficiëntie en kwaliteit van mediaproductie, opslag en distributie verhogen en 3) mediaplatformen en tools van de toekomst (kijken, luisteren, lezen).

6) Seeds and Growth for Media: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van ecosysteemversterkende activiteiten en een incubatorprogramma die een groeipad moeten bieden voor jonge en doorstartende mediabedrijven. VRT, MediaNet Vlaanderen en Thomas More bundelen samen de krachten om dit initiatief op te zetten. Er zal ingezet worden op 4 doelstellingen: 1) de noden van de media- en audiovisuele sector in kaart brengen, 2) de kennis en vaardigheden op het gebied van digitale technologie binnen de mediasector vergroten, 3) technologische en creatieve innovaties uitwerken tot een concrete proof-of-concept en 4) de beste ideeën laten doorgroeien door coaching en ondersteuning.

7) Flanders Game Hub: financiële steun voor de ontwikkeling en uitrol van ecosysteemversterkende activiteiten en een incubator- en acceleratorprogramma gericht op de Vlaamse gamesector. HANGAR K, FLEGA en HOWEST slaan de handen in elkaar om gamebedrijven in Vlaanderen succesvol te laten starten en te helpen groeien. De algemene doelstelling is om een structurele groei en verduurzaming van de Vlaamse game-industrie te stimuleren.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	27.000.000 EUR
Output	<p>Dit programma heeft als doel digitale transformatie en media-innovatie in de Vlaamse mediasector te stimuleren en accelereren. Het programma omvat meerdere projecten met verschillende outcomes.</p> <p>Ten eerste zal een crossmediaal meetsysteem ontwikkeld en uitgerold worden door het Crossmediaal Consortium, bestaande uit sectorspelers. Dit systeem moet een totaalbeeld kunnen geven van het mediagebruik in Vlaanderen, van alles wat bekeken (totaal video), beluisterd (totaal audio) en gelezen (totaal lezen) wordt. Uit dit systeem zullen verklarende en voorspellende modellen en algoritmes voortkomen die Vlaamse mediaspelers kunnen gebruiken om bv. de media-ervaring van de Vlaamse consument te verbeteren en nieuwe verdienmodellen te versterken.</p> <p>Ten tweede wordt een Mediahub cloudplatform ontwikkeld. Dit gedeeld netwerk en cloudplatform zal zowel connectiviteit in een beveiligde omgeving bieden als een diversiteit aan diensten die via een gemeenschappelijk platform, een Marktplaats, kunnen ingekocht worden door mediamakers.</p> <p>Ten derde wordt er ingezet op de strijd tegen desinformatie. Hiervoor wordt een projectoproep gelanceerd voor samenwerkingsprojecten die hierrond werken. De uiteindelijke projecten zetten in op het verhogen</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

	<p>van de mediawijsheid en weerbaarheid van burgers of journalisten/redacties tegen desinformatie, het verwerven van nieuwe inzichten inzake desinformatie, de ontwikkeling van innovatieve tools en technologieën die ingezet kunnen worden om desinformatie te detecteren of te weerleggen en de ontwikkeling van specifieke methoden om data te analyseren en een accuraat antwoord te bieden op vastgestelde desinformatie vanuit een autonome redactionele missie.</p> <p>Ten vierde worden ook de regionale omroepen gestimuleerd om de digitale omslag te maken aan de hand van een transformatieplan. Hierbinnen wordt op volgende lijnen ingezet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) het ontwikkelen van een 'real time' data-analyse dashboard, 2a) ontwikkelen en implementeren van een digitaal platform voor de 10 regionale zenders voor de aanlevering van content door burgers, 2b) investeren in nieuwe hardware en software om de connectiviteit tussen regio, journalisten, redactie en zender te verhogen, 3) ontwikkelen van een dynamisch 'roadbook' als basis voor een nieuwe digitale architectuur en distributie van de content van de regionale omroepen, 4) inzetten op een zo uniform mogelijk redactiesysteem voor alle regionale zenders dat gebaseerd is op een meer 'story centric flow' en 5) studiewerk inzake de verdienmodellen van de toekomst voor regionale zenders. <p>Ten vijfde wordt digitale transformatie en media-innovatie binnen de sector gestimuleerd. Hiervoor wordt een projectoproep gelanceerd voor grootschalige en kleinschalige samenwerkingsprojecten binnen de brede mediasector. De uiteindelijke ontwikkelingsprojecten voorzien in het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent (via optimaliseringsprocessen, aanbevelingsstrategieën, algoritmes en tools), de ontwikkeling van slimme technologie en digitale tools om de efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen en de ontwikkeling van mediaplatformen en tools van de toekomst inzake kijken, luisteren en lezen.</p> <p>Ten zesde worden jonge en startende mediabedrijven via Seeds and Growth for Media begeleid om verder te innoveren en digitaliseren, zodat ze internationaal sterker staan. Hiervoor zal ingezet worden op 4 doelstellingen: 1) de noden van de media- en audiovisuele sector in kaart brengen, 2) de kennis en vaardigheden op het gebied van digitale technologie binnen de mediasector vergroten, 3) technologische en creatieve innovaties uitwerken tot een concrete proof-of-concept en 4) de beste ideeën laten doorgroeien door coaching en ondersteuning.</p> <p>Ten zevende wordt de structurele groei en verduurzaming van de Vlaamse game-industrie via de Flanders Game Hub gestimuleerd. Hiertoe zal de Flanders Game Hub 1) de drijvende kracht worden van een sterke en economisch bloeiende game- en XR-industrie in Vlaanderen, 2) bruggen bouwen tussen talent, bedrijven, experts, investeerders en partners, 3) bedrijfsontwikkeling ondersteunen via een incubator- en acceleratorprogramma en 4) het kloppend hart van de Vlaamse game community worden via events over heel Vlaanderen.</p>
Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1. Een rijk en diepgaand totaalbeeld van het on- en offline mediagedrag van de Vlaming over de verschillende platformen heen. 2. Vlaamse mediaorganisaties zijn met elkaar geconnecteerd via een cloudplatform (Mediahub) dat een gedeelde basis vormt voor een gebruiksvriendelijk digitaal ecosysteem voor professionele mediatools en diensten. 3. De Vlaamse mediasector en burgers zijn weerbaarder tegen desinformatie. 4. De regionale omroepen maken de digitale omslag en vullen hun kernopdracht efficiënter en

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

kwaliteitsvoller in.

5. De technologische weerbaarheid en economische leefbaarheid van de Vlaamse sector wordt versterkt via digitale innovatie en transformatie.

6. Jonge en startende mediabedrijven worden geholpen en begeleid om verder te innoveren en digitaliseren, zodat ze internationaal sterker staan.

7. De structurele groei en verduurzaming van de Vlaamse game-industrie wordt gestimuleerd.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus

In uitvoering na agendering VR

Beschrijving voortgang

Het digitaal transformatieplan voor de regionale omroepen werd op 12/11/2021 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het project is vervolgens van start gegaan en op 8 december 2022 werd voor de tweede keer gerapporteerd door NORTV over de voortgang van het transformatieplan. De voorbije maanden lag de focus op de uitwerking van het luik data en het luik connectiviteit. De komende periode zal ingezet worden op de luiken distributie, redactie en businessmodellen.

Het reglement van de projectoproep desinformatie werd op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De projectoproep desinformatie werd op 21/03/2022 gelanceerd en de deadline voor indiening van de projecten lag op 2/05/2022. Op basis van het advies van een jury van externe experts besliste de minister van Media op 16 september 2022 om 5 projecten te steunen voor een totaal bedrag van 3.152.712,71 euro. Onbenutte middelen van VV134 voor een bedrag van 153.000 euro werden aan deze oproep toegevoegd. De projecten werden in oktober 2022 opgestart en lopen tot en met juni 2024.

Het reglement van de projectoproep digitale transformatie werd op 17/12/2022 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De projectoproep werd vervolgens inzake staatssteun aangemeld bij de Europese Commissie en kreeg eind mei 2022 formele goedkeuring. Na een tweede goedkeuring van het aangepaste reglement door de Vlaamse Regering op 3/06/2022 werd de projectoproep gelanceerd op 7/06/2022. De deadline van indiening lag op 29/08/2022. In totaal werden er 31 projecten ingediend, waarvan 29 ontvankelijke projecten werden weerhouden en door een jury van externe experts beoordeeld. Op 14 december 2022 besliste de minister van Media om aan 18 projecten te steunen voor een totaal bedrag van 11.790.733,36 euro. Onbenutte middelen van VV134 voor een bedrag van 847.000 euro werden aan deze oproep toegevoegd. De projecten gaan van start in januari 2023 en lopen tot en met december 2024.

Eind maart 2022 werd het finale projectplan opgeleverd over de gezamenlijke ontwikkeling en uitrol van een crossmediaal meetsysteem. De afspraken hieromtrent werden ook vastgelegd in een Memorandum of Understanding tussen de 10 betrokken partijen. Op 22/04/2022 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het project. Vervolgens werd het project inzake staatssteun aangemeld bij de Europese Commissie. Na afronding van deze procedure bij de Commissie zal de Vlaamse Regering in 2023 het project finaal goedkeuren en de middelen (4.000.000 euro) toekennen aan het nog op te richten consortium. In afwachting hiervan werd alvast eind 2022 een bestelaanvraag goedgekeurd om de beschikbare middelen over te dragen naar 2023.

Eind mei 2022 werd het finale projectplan opgeleverd over de gezamenlijke ontwikkeling en uitrol

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>van het Mediahub cloudplatform. De afspraken hieromtrent werden ook vastgelegd in een Memorandum of Understanding tussen de 4 betrokken partijen. Op 8/06/2022 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het project. Vervolgens werd het project inzake staatssteun aangemeld bij de Europese Commissie. Na afronding van deze procedure zal de Vlaamse Regering in 2023 het project finaal goedkeuren en de middelen (4.000.000 euro) toekennen aan het nog op te richten consortium. In afwachting hiervan werd alvast eind 2022 een bestelaanvraag goedgekeurd om de beschikbare middelen over te dragen naar 2023.</p> <p>Het project Seeds and Growth for Media werd op 2/12/2022 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Vanuit de bevoegdheid Media werd er 498.456 euro vrijgemaakt (aangevuld met hetzelfde bedrag vanuit Innovatie in kader van VV134) voor de uitrol van dit project dat van start gaat op 1 januari 2023 en loopt tot 30 juni 2026. In de eerste maanden (Q1 2023) ligt de focus op het samenstellen van het projectteam en de opstart van de werking.</p> <p>Het project Flanders Game Hub werd op 2/12/2022 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Vanuit de bevoegdheid Media werd er 2.000.000 euro vrijgemaakt voor de uitrol van dit project dat van start gaat op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2026. In de eerste maanden (Q1 2023) ligt de focus op het samenstellen van het projectteam en de opstart van de werking.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start uitvoering digitaal transformatieplan regionale omroepen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering projectoproep desinformatie	2022 Q1	Gerealiseerd	
Lancering projectoproep digitale transformatie mediasector (kleinschalige en grote projecten)	2022 Q2	Gerealiseerd	
Selectie projecten desinformatie	2022 Q3	Gerealiseerd	
Selectie projecten digitale transformatie mediasector (kleinschalige en grote projecten)	2022 Q4	Gerealiseerd	
Start Flanders Game Hub	2023 Q1	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Start Seeds and Growth for Media	2023 Q1	Op schema	
Ontwikkeling crossmediaal meetsysteem	2023 Q1	Uitgesteld	Dit dossier werd aangemeld inzake staatssteun bij de Europese Commissie op 9/05/2022. Momenteel bevindt het dossier zich nog in de pre-notificatiefase waarin de Commissie al een eerste uitgebreide analyse maakt van het dossier en de gekoppelde steunmaatregel. Hierna volgt ook nog een officiële notificatie. Het duurt dan gemiddeld minstens 2 maanden alvorens de officiële brief met de beslissing van de Commissie aan het Departement bezorgd wordt via de permanente vertegenwoordiger. Daarna volgt ook nog een tweede traject naar de Vlaamse Regering om diens definitieve goedkeuring te verkrijgen. Hierdoor loopt de geplande uitrol van het crossmediaal meetsysteem in Q1 2023 vertraging op.
Ontwikkeling Mediahub cloudplatform	2023 Q1	Uitgesteld	Dit dossier werd aangemeld inzake staatssteun bij de Europese Commissie op 23/09/2022. Momenteel bevindt het dossier zich nog in de pre-notificatiefase waarin de Commissie al een eerste uitgebreide analyse maakt van het dossier en de gekoppelde steunmaatregel. Hierna volgt ook nog een officiële notificatie. Het duurt dan gemiddeld minstens 2 maanden alvorens de officiële brief met de beslissing van de Commissie aan het Departement bezorgd wordt via de permanente vertegenwoordiger. Daarna volgt ook nog een tweede traject naar de Vlaamse Regering om diens definitieve goedkeuring te verkrijgen. Hierdoor loopt de geplande uitrol van de mediahub in Q1 2023 vertraging op.
Afronding digitaal transformatieplan regionale omroepen	2023 Q3	Op schema	
Oplevering Mediahub cloudplatform	2023 Q4	Nog niet gestart	
Panel crossmediaal meetsysteem in productie	2024 Q1	Nog niet gestart	
Afronding projecten desinformatie	2024 Q2	Op schema	
Afronding projecten (kleinschalige + grote) in kader van de projectoproepen digitale transformatie	2024 Q4	Op schema	
Afronding Seeds and Growth for Media	2026 Q2	Op schema	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Afronding project crossmediaal meetsysteem	2026 Q4	Nog niet gestart		
Afronding project Mediahub cloudplatform	2026 Q4	Nog niet gestart		
Afronding Flanders Game Hub	2026 Q4	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal projecten die gesteund worden in het kader van de projectoproep desinformatie.	5	2022 Q3	5	100 %
Aantal projecten die gesteund worden in het kader van de projectoproep digitale transformatie.	15	2022 Q4	18	120 %
Aantal regionale omroepen die betrokken zijn bij de uitvoering van het digitaal transformatieplan.	10	2023 Q3	10	100 %
Aantal Vlaamse mediaorganisaties die gebruik maken van het crossmediaal meetsysteem.	10	2026 Q4		
Aantal Vlaamse mediaorganisaties en andere relevante mediagerelateerde actoren die gebruik maken van het Mediahub cloudplatform.	10	2026 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	27.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	27.000.000 EUR
Uitvoering VAK	27.954.000 EUR
Uitvoering VEK	1.899.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 27.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media - nota](#)

[Beslissing VR van 12/11/2021. NORTV subsidie uitvoering digitaal transformatieplan regionale tv-omroepen](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Projectsubsidie digitale transformatie. Reglement 17/12/2021](#)

[Projectsubsidie desinformatie. Reglement 17/12/2021](#)

[Advies SARC bij de reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in het kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 3 juni 2022. Reglement projectoproep digitale transformatie in kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Projectsubsidie digitale transformatie. Reglement 03/06/2022. Bijlage](#)

VR 2 december 2022 - steun aan het project 'Streaming affordances in small media markets'

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV134 - Digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector](#)

VV134 - DIGITAAL TRANSFORMATIEPROGRAMMA VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. De focus ligt hierbij op samenwerking tussen mediaorganisaties en extra waardecreatie binnen een globale competitieve context, zowel voor de mediaconsument, als voor de Vlaamse mediaspelers. Het programma zal investeren in gedeelde digitale media-infrastructuur en innovatieve (digitale) diensten en oplossingen rond verschillende thema's (betrouwbare informatie en data, dieper inzicht in het gedrag van de mediaconsument, meer efficiënte en kwaliteitsvolle productie, opslag en distributie van mediacontent, betere vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent...).</p> <p>Het digitaal transformatieprogramma zal uitgevoerd worden via 6 projectwerven waarvan 'F. Instrumentarium / projectoproep media-innovatie' onder de coördinatie van minister Crevits valt. Binnen deze werf, waarvoor 8 miljoen EUR relancemiddelen beschikbaar zijn, zal onder beheer van VLAIO een mix van acties uitgerold worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oproep voor media-ICON-projecten, - Oproep voor media-TETRA-projecten en/of media-proeftuinen, - Ondersteuning van media-acceleratoren. <p>De acties zijn hierbij gericht op</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) de grote en kleine mediabedrijven (VRT, DPG Media, Roularta, Mediahuis, Regionale omroepen...); (ii) toeleveranciers op het vlak van technologie aan de mediasector; (iii) contentleveranciers/productiehuizen 	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	6.221.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - ondersteuning van minstens 3 media-ICON projecten - ondersteuning van minstens 3 of 5 media TETRA projecten en/of maximum 2 proeftuinen voor de media - ondersteuning van minstens 2 media-acceleratoren
Outcome	De technologische weerbaarheid en economische leefbaarheid van de Vlaamse mediasector (en de toeleveringsbedrijven) wordt versterkt via digitale innovatie en transformatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>In het derde kwartaal van 2022 werden bij VLAIO onderstaande projecten goedgekeurd met middelen in het kader van het digitaal transformatieprogramma van de mediasector. De middelen hiervoor werden opgevraagd en toegekend uit de provisie. De steun werd intussen ook vastgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proeftuin Media XR en 5G (Howest en AP Hogeschool), 462.393 EUR steun - Proeftuin REMI (Thomas More), 500.000 EUR steun - 'Streaming Affordances in Small Media Markets' (VUB Smit), 760.968 EUR steun - Solid4Media (UGENT-VRT-DATAVILLAGE-DATANUTSBEDRIJF), 1.725.792 EUR steun - 'Seeds and Growth for Media' (Medianet, VRT, Thomas More) , 498.456 EUR steun (bijkomend werd eenzelfde bedrag vastgelegd op VV133) <p>Eerder werd al 1.272.727 EUR vastgelegd voor de oproep TETRA-media. Eveneens werd 1.000.000 EUR geheroënteerd naar de oproepen desinformatie en digitale transformatie binnen VV133 en tot slot 1.779.000 EUR richting VV102 (kernversterking).</p>
Noodzakelijke politieke actie	Geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Opstart ICON voor de media	2021 Q4	Op schema	
Opstart media-accelerator(en)	2022 Q1	Op schema	
Opstart TETRA en/of proeftuin voor de media	2022 Q2	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	8.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.221.000 EUR
Uitvoering VAK	5.221.000 EUR
Uitvoering VEK	508.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.221.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021. Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 17 december 2021. Reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Projectsubsidie digitale transformatie. Reglement](#)

[Projectsubsidie desinformatie](#)

[Advies SARC bij de reglementen projectoproepen desinformatie en digitale transformatie in het kader van het relanceplan digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 december 2022. Herverdeling relanceprovisie naar de begroting van VRT naar aanleiding van de realisatie van het strategisch project VRTRN 2030: "Een slagkrachtige, wendbare en efficiënte VRT in het nieuwe medialandschap".](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 december 2022. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 december 2022. Herverdeling relancemiddelen VV102 \(investeren in kernversterking via projectoproepen\) en VV134 \(digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse Mediasector\)](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV133 - Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector](#)

VV135 - INVESTEREN IN MEDIAWIJSHEID VAN DE VLAMING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, jongeren in het secundair onderwijs en organisaties die zich richten op kwetsbare doelgroepen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	28. Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Via twee projecten wordt er bijkomend geïnvesteerd in het versterken van mediawijsheid bij de burger. De ontwikkeling en coördinatie van beide projecten gebeurt door Mediawijs - het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid.</p>	
<p>1. Er wordt een flankerend traject bij het bestaande project Nieuws in de Klas opgezet waarbij ingezet wordt op meer interactie om kinderen en jongeren nog nieuwsvaardiger te maken. Het doel van Nieuws in de Klas is om van kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel nieuws- en informatiewijze burgers te maken. Het flankerende traject voegt een extra dimensie van interactiviteit toe. Er zal specifiek gewerkt worden op drie elementen: 1) een 'Nieuwsmakers' wedstrijd gericht op de 1ste graad van het secundair onderwijs, 2) een initiatief rond factchecking gericht op de 2de graad van het secundair onderwijs en 3) een debatmarathon gericht op de 3de graad van het secundair onderwijs.</p>	
<p>2. De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren en organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren begeleiden in Vlaanderen wordt versneld. Mediawijs zal ondersteuning bieden bij het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen deze sectoren en organisaties. Mediawijs zal goede praktijkvoorbeelden en informatieve of educatieve materialen inzake digitale inclusie en mediawijsheid op maat van deze sectoren verzamelen en opschalen.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.000.000 EUR
Output	De output van dit project is tweeledig. Ten eerste worden klassen uit het secundair onderwijs uitgenodigd om deel te nemen aan het flankerend traject bij Nieuws in de Klas. Ten tweede worden organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren geïnformeerd via vormingen over het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.
Outcome	<p>1. Jongeren uit het secundair onderwijs worden nieuwsvaardiger en gaan op een meer bewuste en kritische manier met digitale media, nieuws en informatie om.</p> <p>2. De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid binnen sectoren en organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in Vlaanderen wordt versneld.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Beide projecten (flankerend traject Nieuws in de Klas + bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan) zijn van start gegaan op 1 mei 2021. De middelen vanuit relance werden via twee MB's toegekend aan Mediawijs (imec vzw).</p> <p>Voor het flankerend traject Nieuws in de Klas kwam Mediawijs via een aanbestedingsprocedure tot een partnerschap met StampMedia, Hujo en Mediaraven. Ook Quindo en De Checkers werden bij het project betrokken. Het basisconcept en de wijze van samenwerken werden vastgelegd.</p> <p>Het educatief materiaal per graad bestaat uit een online leerpad voor leerlingen, handleidingen en methodiekenbundels voor in de klas en een schooloverschrijdende challenge. Met de partners werd het educatief materiaal voor de drie graden in secundair onderwijs iteratief uitgewerkt en sinds de paasvakantie 2022 telkens voorgelegd aan verschillende leerkrachten. Op basis van de feedback van leerkrachten werd het lesmateriaal aangepast en in de zomervakantie 2022 gelayout. Voor de opnames van de video's van het online leerpad werd er samengewerkt met verschillende journalisten en ook jongeren werden actief betrokken. Het online leerpad werd in de zomervakantie 2022 gefinaliseerd.</p> <p>Tijdens de studiedag van Nieuws in de Klas op 13 oktober 2022 werden de drie trajecten i.s.m. de verschillende partners voorgesteld/gelanceerd en werden er ondersteunende workshops aangeboden voor de leerkrachten. Mediawijs werkte ook een overkoepelende bundel met gespreksmethodieken uit om spreekvaardigheid bij jongeren te versterken.</p> <p>Momenteel werkt Mediawijs met de partners de verschillende challenges uit. Deze worden in voorjaar 2023 gelanceerd. In mei 2023 verwacht Mediawijs daar de eerste resultaten van. Daarnaast is ook de impactmeting gestart door Arteveldehogeschool. Momenteel worden er verschillende evaluaties van het materiaal gedaan in klassen die de educatieve pakketten wel en niet inzetten. Het rapport hiervan zal ten vroegste in juni 2023 beschikbaar zijn.</p> <p>Binnen Iedereen Digitaal Bovenlokaal werd inzake kaders en richtlijnen in de drie sectoren de beleidstool 'aan de slag met digitale inclusie: 36 bouwstenen voor een digitale-inclusiebeleid voor welzijnsvoorzieningen' verder afgewerkt in co-creatie met de 3 betrokken sectoren. Begin september 2022 werd de tool voorgesteld op verschillende webinars aan de sectoren. Op basis van de bouwstenen heeft Mediawijs met betrokken organisaties een prioriteiten-oefening uitgewerkt. Deze leidde tot de creatie van verschillende ondersteunende materialen waarvan de betrokken sectoren zélf aangeven deze nood te hebben.</p> <p>Er werd een co-creatietraject afgerond rond sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) en online risico's i.s.m. UCLL en 'tRede vzw. Hier spruit een tool rond de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) en online risico's uit voort. Rond vorming en intervisie vond op 31/5/2022 een tweede webinar/intervisie plaats in de jeugdhulp (geflankeerd aan het project Bandbreedte van Agentschap Opgroeien).</p> <p>Op maandag 5 september vond de tweede webinar plaats voor de sector die ouderen ondersteunt. Aan dit event namen 246 personen deel. Een gelijkaardig webinar werd op dinsdag 6 september 2022 gehouden voor organisaties die personen met een beperking ondersteunen. Hiermee bereikten we 126 participanten. Beide webinars hadden een gelijkaardige opzet: Voorstelling van het project, presentatie van de beleidstool 'aan de slag met digitale inclusie' en we lieten ook telkens vier goede praktijkvoorbeelden aan het woord.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De ontwikkeling van het basisconcept voor het flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt afgerond en de nodige partnerschappen worden aangegaan.	2021 Q4	Gerealiseerd	
Tijdens een pilootfase wordt het basisconcept van het flankerend traject rond Nieuws in de Klas uitgetest en geëvalueerd.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Het finaal uitgewerkte flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt uitgerold in het schooljaar 2022-2023.	2022 Q3	Gerealiseerd	
Sectoren en organisaties gericht op kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren werden in de periode 05/2021 - 06/2023 door Mediawijs begeleid en ondersteund bij het opstellen van een kader en richtlijnen voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen hun sector.	2023 Q2	Op schema	
Het finaal uitgewerkte flankerend traject rond Nieuws in de Klas wordt uitgerold in het schooljaar 2023-2024.	2023 Q3	Op schema	
Het flankerend traject bij Nieuws in de Klas wordt afgerond op het einde van het schooljaar 2023-2024.	2024 Q2	Op schema	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal deelnemersuren van personen uit organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in het kader van het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.	1750	2023 Q2	2.572	147 %
Aantal uren vorming georganiseerd in het kader van het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.	100	2023 Q2	66	66 %
Aantal klassen uit het secundair onderwijs die hebben deelgenomen aan het flankerend traject bij Nieuws in de Klas.	1500	2024 Q2	1.565	104 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	1.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	587.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 2/04/2021 Investeren in mediawijsheid van de Vlaming - nota

29. Versterken mentaal welzijn

VV136 - VERNIEUWENDE PROJECTEN HUIZEN VAN HET KIND

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Gezinnen met kinderen in Vlaanderen en Brussel. Bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Opgroeien lanceert een oproep voor vierentwintig Huizen van het Kind die binnen hun werkingsgebied innovatief willen zijn en samen met hun partners werk willen maken van een (meer) geïntegreerde dienstverlening naar gezinnen, over beleidsdomeinen heen.</p> <p>Wat wordt bedoeld met vernieuwende projecten? In de Huizen van het Kind kunnen gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders terecht voor ondersteuning op het vlak van preventieve gezondheidszorg, spel en ontmoeting en gezinsondersteuning. Hiernaast hebben sommige gezinnen echter vaak ook behoefte aan ondersteuning op het vlak van opvang, onderwijs, werk, opleiding, integratie, inburgering en armoede ... In realiteit zijn heel wat van deze behoeften met elkaar verstrengeld. Een meer geïntegreerde dienstverlening over de beleidsdomeinen heen zou voor gezinnen écht het verschil kunnen maken.</p> <p>De Vlaamse Regering wil dat Huizen van het Kind, samen met partners uit de verschillende beleidsdomeinen, meer inzetten op geïntegreerde dienstverlening en doet vanuit dat perspectief een oproep voor vernieuwende projecten. De vernieuwende projecten spitsen zich toe op het verwezenlijken van doelstellingen en opdrachten die enkel kunnen worden gerealiseerd via een (meer) geïntegreerde dienstverlening. Het gaat steeds om de doelstellingen op vlak van preventieve gezinsondersteuning in combinatie met minstens één van de volgende doelstellingen: integratie en inburgering; opvang en onderwijs; tewerkstelling en opleiding; armoedebestrijding.</p> <p>De inzet op een combinatie van doelstellingen is ook interessant voor (lokale) partners binnen deze andere beleidsdomeinen. Ze kunnen mee investeren in de dienstverlening om op die manier hun eigen doelstellingen te realiseren. De Huizen van het Kind vormen samen met deze partners een lokaal netwerk.</p> <p>In essentie gaat het over 'de handen in elkaar slaan over beleidsdomeinen heen binnen de context van het lokale Huis van het Kind, om op die manier geïntegreerd werk te maken van de ondersteuning van een gezin'. Zo worden voor het gezin kansen gecreëerd binnen verschillende beleidsdoelstellingen, op het vlak van ondersteuningsbehoeften die voor het gezin in realiteit ook met elkaar verweven zijn. Hierbij maakt het voor een gezin niet uit of het nu door onderwijs,</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

inburgering of welzijn ondersteund wordt: enkel door samen te werken binnen verschillende doelstellingen die met elkaar samenhangen, kan het recht op kansrijk opgroeien uiteindelijk worden gerealiseerd.

Waar het bij geïntegreerde dienstverlening om gaat is dat er, op maat en vertrekkende vanuit het gezin, samengewerkt wordt tussen spelers van verschillende beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein (welzijn, onderwijs, integratie en inburgering, werk, armoedebestrijding) kent zijn eigen doelstellingen, zijn eigen lokale partners en eigen dienstverlening, maar voor een gezin met een ondersteuningsbehoefte maakt het niet uit door welke overheid of subsidiekanaal het uiteindelijk wordt geholpen. Bovendien zien we dat ondersteuningsbehoeften met elkaar samenhangen, en dan kan het echt versterkend werken om ook op lokaal niveau, over beleidsdomeinen heen, de handen in elkaar te slaan. Hierdoor wordt binnen de context van de Huizen van het Kind samen gebouwd aan het kansrijk opgroeien van elk kind. De Huizen van het Kind zijn belangrijk in dit verhaal. Vlaanderen ziet hen als sleutelspeler in het lokaal geïntegreerd gezinsbeleid en wil de Huizen van het Kind deze legislatuur daarom versterken. Deze subsidie aan 24 Huizen van het Kind is een volgende stap in de versterking van de Huizen van het Kind, die vandaag al zeer lokaal een belangrijke meerwaarde vormen als ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en gezinnen, en als plek waar élk gezin terecht kan voor ondersteuning.

Voor de projecten die inzetten op de doelstelling integratie en inburgering is er cofinanciering voorzien vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	3.000.000 EUR
Output	Realiseren van een geïntegreerde dienstverlening in het kader van het vernieuwend project (gezinsondersteuning in combinatie met werk en opleiding, integratie en inburgering, onderwijs en opvang, armoedebestrijding) binnen het Huis van het Kind, in samenwerking met de partners binnen deze andere beleidsdomeinen.
Outcome	Binnen elk geselecteerd project: een netwerk van partners opzetten (Huis van het Kind én partners binnen andere beleidsdomeinen) om op die manier een vernieuwende, geïntegreerde dienstverlening voor gezinnen te organiseren binnen het Huis van het Kind.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL		TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering oproep vernieuwende projecten		2021 Q1	Gerealiseerd	
Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning		2021 Q1	Gerealiseerd	
Start beoordelingsfase projectaanvragen Huizen van het Kind		2021 Q2	Gerealiseerd	
Kick-Off ondersteuningstraject		2021 Q2	Gerealiseerd	
Verderzetting individueel ondersteuningstraject (impactgericht werken en veranderingstheorie) o.l.v. Arteveldehogeschool		2022 Q1	Op schema	
Verdere uitbouw gezamenlijk ondersteuningstraject en lerend netwerk o.l.v. EXPOO/Opgroeien		2022 Q1	Op schema	
Alle vernieuwende projecten zijn opgestart		2022 Q1	Op schema	
Verdere uitbouw gezamenlijk ondersteuningstraject en lerend netwerk o.l.v. EXPOO/Opgroeien		2023 Q1	Op schema	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
kwalitatieve vernieuwende project opgestart binnen Huis van het Kind	24	2022 Q1	24	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	1.735.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 5 maart 2021 - BVR](#)

[VR 5 maart 2021 - nota](#)

[VR 5 maart 2021 - advies](#)

VV137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Zorg en Gezondheid - zorgvoorzieningen (psychosociale revalidatievoorzieningen en revalidatievoorzieningen verslavingszorg), netwerken geestelijke gezondheid volwassenen, Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid (nu Psyche), Familieplatform Geestelijke Gezondheid

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
Enmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen: extra ondersteunen van de werking van lotgenotengroepen, versterkte inzet van herstelacademies, tijdelijke versterking van de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen, enz.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.500.000 EUR
Output	<ol style="list-style-type: none"> Contextgericht werken en verslaving, o.a. door het opzetten van een familiebuddywerking en opleiden van contextexperten Herstelacademie en verslaving: de huidige Herstelacademies worden gecontinueerd en versterkt en er gaat bijzondere aandacht naar het thema verslaving in het opleidingsaanbod. Kwartiermaken: de methodiek van kwartiermaken wordt uitgerold in 5 nieuwe regio's in Vlaanderen Tijdelijke versterking van de verslavingszorgcentra en de psychosociale revalidatiecentra
Outcome	<ol style="list-style-type: none"> BVR tot toekenning van een subsidie aan de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen voor het aanbieden van laagdrempelige zorg met focus op expertisedeling en overbruggingszorg: <ol style="list-style-type: none"> Zorgpartners met expertise in herstelgerichte zorg op regionaal niveau samenbrengen en deze expertise uitspreiden zodat het aanbod voor de zorggebruiker en diens context nog toegankelijker wordt; Ondersteuning bieden tijdens wachttijd aan zorggebruikers en hun context zodat zij nog beter georiënteerd worden (vermijden dat personen op verschillende wachtlijsten terecht komen) en op een snelle en efficiënte manier beroep kunnen doen op een laagdrempelig aanbod in afwachting van een effectieve opstart. Dit in maximale samenwerking en afstemming met verschillende partners in herstelgerichte zorg; Focussen op laagdrempelige en aanklappende zorgvormen (o.m. outreach) zodat tegemoet kan worden

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

- gekomen aan de noden van kwetsbare zorggebruikers. De voorzieningen in het netwerk geestelijke gezondheid delen de expertise rond aanklampende zorg;
- d. Verbinding naar maatschappij bewaken in trajecten met zorggebruikers (participatie);
 - e. Kennisdeling en betrokkenheid partners bevorderen.
- 2.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Familieplatform Geestelijke Gezondheid voor het project 'contextgericht werken en verslaving'
- a. informatie voor familie i.v.m. alcoholverslaving en suïcidepreventie toegankelijker maken
 - b. het ondersteunen van de familiebuddywerking- mentaalmaatje
 - c. het ondersteunen van contextexperten als ondersteuning naar de zorg door specifiek opgeleide ervaringswerkers in te zetten als lokale experts in het betrekken en ondersteunen van de context in de geestelijke gezondheidsnetwerken voor volwassenen.
- 3.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw voor het project kwartiermaken voor de periode 2022-2023
- a. door psycho educatie en preventie het lokaal versterken van de geestelijke gezondheid van elke burger;
 - b. identificeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid, inclusief mensen die kampen met verslavingsproblematiek of suïcidegedachten, om deze toe te leiden naar zorg;
 - c. het begeleiden van wijken voor het opvangen van mensen uit de geestelijke gezondheidszorg;
 - d. het begeleiden van wijken en lokale besturen in geestelijke gezondheidsaspecten en de brug leggen tussen actoren actief in een wijk met actoren uit de geestelijke gezondheidszorg.
- 4.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw voor het project Herstelacademie en verslaving voor de periode 2022-2023
- a. Continueren en uitbouwen van de partnerschappen in de herstelacademies
 - b. Continueren en uitwerken van nieuwe opleidingen en goede praktijken
 - c. Discovery colleges opstarten
 - d. verslaving is thema binnen de herstelacademies
 - e. uitwerken communicatieplan rond de herstelacademies
5. BVR tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten door de revalidatievoorzieningen verslavingszorg
- a. Aanklampende en outreachende zorgvormen bij zorgwekkende zorgmijders
 - b. Wachtlijstmanagement.
 - c. Doelgroepverruiming met het oog op betere samenwerking en doorstroom vanuit onder andere ziekenhuizen waar veel patiënten met een ernstige alcoholverslaving behandeld worden
 - d. Netwerkgerichte expertisedeling en hulpverlening.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>1.BVR tot toekenning van een subsidie aan de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen voor het aanbieden van laagdrempelige zorg met focus op expertisedeling en overbruggingszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alle betrokken voorzieningen hebben hun thematische keuze bepaald; b. afspraken met betrekking tot regionale partnerschappen zijn gemaakt; c. projectmedewerkers zijn aangeworven voor de meeste voorzieningen. waar geen geschikte projectmedewerker gevonden werd, wordt een nieuw projectplan uitgewerkt; d. voorzieningen met dezelfde thematische keuzes werken samen voor intervisie, delen van good practices en de opmaak van draaiboeken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

- 2.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Familieplatform Geestelijke Gezondheid voor het project 'contextgericht werken en verslaving' :
- informatieverzameling voor familie i.v.m. alcoholverslaving en suicidepreventie gebeurt in nauwe samenwerking met VAD. Later in het project zal een website online komen. Een gezamenlijke studiedag zal georganiseerd worden in maart 2024;
 - het ondersteunen van de familiebuddywerking- mentaalmaatje: linken en verhouding tot buddywerking Vlaanderen wordt in nauwe samenwerking met Psyche onderzocht;
 - het ondersteunen van contextexperten als ondersteuning naar de zorg door specifiek opgeleide ervaringswerkers in te zetten als lokale experts in het betrekken en ondersteunen van de context in de geestelijke gezondheidsnetwerken voor volwassenen: er wordt een eenduidig concept en structuur uitgewerkt waarbij elk netwerk de mogelijkheid krijgt om te vertrekken vanuit eventueel bestaande initiatieven.
- 3.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw voor het project Kwartiermaken voor de periode 2022-2023:
- er zijn 5 wijkgerichte kwartiermakers gestart; waarvan 1 met vertraging;
 - de basisopleiding is uitgewerkt en al gegeven. Hier is grote interesse voor;
 - er is brede interesse en uitwisseling met projecten, lokale besturen en organisaties buiten de scope van deze subsidie.
- 4.BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw voor het project Herstelacademie en verslaving voor de periode 2022-2023:
- Continueren en uitbouwen van de partnerschappen in de herstelacademies: 9 werden herbevestigd, bij 4 wordt daar naartoe gewerkt;
 - Het aanbod en het bereik van de opleidingen is groot
 - Voor het ontsluiten van het aanbod online naar de burgers is de gedragenheid (te) beperkt. Als nieuwe insteek wordt bekeken of dit voor het bereiken van bepaalde kwetsbare doelgroepen mee een antwoord kan bieden;
 - digitaal verzamelen en ontsluiten van materiaal en cursusaanbod tussen de herstelacademies onderling gebeurt
 - Discovery Colleges: visietekst is klaar, toolkit wordt uitgewerkt, intensieve contacten met Overkophuizen om af te stemmen of aparte websites zinvol is of als gewerkt wordt naar een gezamenlijk aanbod;
 - verslaving is thema binnen de herstelacademies: verschillende specifieke cursustitels, grote verscheidenheid in aanpak waardoor uitwisseling en vergelijking resultaten en effectiviteit tegen einde van projectperiode mogelijk is;
 - uitwerken communicatieplan rond de herstelacademies: dit plan wordt gefinetuned en in voorjaar 2023 voorgesteld.
5. BVR tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenczorg voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten door de revalidatievoorzieningen verslavingszorg:
- alle betrokken voorzieningen hebben hun thematische keuze bepaald;
 - afspraken met betrekking tot regionale partnerschappen zijn gemaakt;
 - projectmedewerkers zijn aangeworven, voor de meeste voorzieningen gebeurde dit zeer recent of valt de opstartdatum binnenkort.

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring conceptnota besteding projectmiddelen Vlaamse Regering	2022 Q1	Gerealiseerd	
Start projecten vanaf 1/1/2022	2022 Q1	Vertraging	Projecten zijn van start gegaan, na goedkeuring subsidies door de Vlaamse Regering (13/5/2022)
De psychosociale revalidatiecentra hebben met de tijdelijke middelen aan expertisedeling gedaan, zorggebruikers tijdens de wachttijd beter ondersteunen, gewerkt met aanklampende en laagdrempelige zorgvormen, kennisdeling en betrokkenheid van partners in de zorg bevorderd	2023 Q3	Op schema	
De verslavingszorgcentra hebben aanklampend en outreachend gewerkt, wachtlijstmanagement uitgewerkt, de doelgroep verruimd en expertise gedeeld binnen het netwerk	2023 Q3	Op schema	
Het Familieplatform heeft informatie voor familie i.v.m. alcoholverslaving en suïcidepreventie toegankelijker gemaakt, uitbouwen van het concept van de familiebuddy en het aanwerven van 13 contextexperten	2024 Q1	Op schema	
De methodiek van kwartiermaken is uitgerold in 5 nieuwe regio's in Vlaanderen	2023 Q4	Op schema	
De herstelacademies in Vlaanderen worden verder versterkt, in de opleidingen is extra aandacht voor het thema verslaving	2023 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.500.000 EUR
Uitvoering VAK	3.501.000 EUR
Uitvoering VEK	1.711.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

Op 13 mei 2022 verleende de Vlaamse Regering zijn goedkeuring aan volgende besluiten: 1. BVR tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten door de revalidatievoorzieningen verslaving, 2. BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid voor het project kwartiermaken, 3. BVR tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid voor het project Herstelacademie en verslaving, 4. BVR tot toekenning van een subsidie aan de psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen voor het aanbieden van laagdrempelige zorg met focus op expertisedeling en overbruggingszorg, 5. BVR tot toekenning van een subsidie aan het Familieplatform Geestelijke Gezondheid voor het project contextgericht werken en verslaving.

VR 13 mei 2022 - Eenmalige initiatieven voor de ondersteuning van psychisch kwetsbare personen: vijf subsidiebesluiten

VV138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Agentschap Opgroeien - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	Brede bevolking; zorgverleners; kinderen, jongeren en gezinnen, mensen met een psychische en/of sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid; naasten van overleden patiënten; intermediairen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het coronavirus COVID-19 heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Met het actieplan mentaal welzijn of 'zorgen voor morgen' willen we een sterk signaal geven aan de bevolking dat we de psychosociale gevolgen van de Corona-maatregelen ernstig nemen en er zowel op korte als op middellange termijn adequate oplossingen voor willen implementeren. De eenmalige maatregelen vanuit het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben tot doel niet alleen de brede bevolking maar ook specifieke doelgroepen zoals zorgverleners; kinderen, jongeren, gezinnen; mensen met een psychische kwetsbaarheid; mensen met een sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid en de naasten van overleden patiënten te ondersteunen en versterken.</p> <p>Eind 2022 werden 2 nieuwe acties goedgekeurd.</p> <p>De eerste gaat over de 'Uitbouw en uitrol in de Eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering. De noodzakelijke middelen voor deze actie zijn momenteel beschikbaar op projectlijn VV144 'Zorgzame buurten'. Deze middelen zullen overgeheveld worden naar projectlijn VV138 'Opvolging actieplan Mentaal Welzijn', daar dit initiatief hier inhoudelijk thuishoort.</p> <p>De tweede actie betreft een projectsubsidie aan de OverKopnetwerken voor de uitvoering van opdrachten inzake psycho-educatie ter ondersteuning van het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied, en een projectsubsidie aan Hogeschool West-Vlaanderen voor de uitvoering van een opdracht inzake peer support binnen de OverKophuizen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	11.526.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliseringscampagnes om hulpaanbod bekend te maken • Hulplijnen versterken om bijkomende vragen op te vangen

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	<ul style="list-style-type: none"> • Werkgevers ondersteunen bij het voeren van een gezondheidsbeleid • Uitbouw en uitrol in de eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering • Psycho-educatie ter ondersteuning van het jeugdwerk door de OverKopnetwerken en ondersteuning van peersupport binnen de Overkophuizen
Outcome	Meer personen vinden vroegtijdig hun weg naar het laagdrempelige aanbod en een hoger aantal hulpvragen wordt opgevangen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Versterken hulplijnen</p> <p>1. Tele-Onthaal en 1712</p> <p>De bijkomende middelen ondersteunen en versterken de reguliere werking van zowel Tele-Onthaal als 1712. De cijfers tonen dat er door die capaciteitsversterking daadwerkelijk meer oproepen beantwoord kunnen worden. Officiële cijfers zijn terug te vinden in de jaarverslagen. Voor cijfers van 2021 verwijzen we naar de websites van Tele-Onthaal en 1712. Cijfers van 2022 zijn pas beschikbaar voorjaar 2023.</p> <p>2. Versterking Druglijn</p> <p>2.1. Ondersteuning van de vrijwilligerswerking van de Druglijn</p> <ul style="list-style-type: none"> • In een traject met een externe consultant (Vrijwilligerswerkwerkt) omtrent het coachen van de vrijwilligers, werd een zogeheten 'will-skill'-matrix uitgewerkt, waarbij per vrijwilliger door de Druglijnstaf een individueel profiel werd opgesteld. Dat zal voortaan als leidraad dienen bij het verdere coachen van de vrijwilligers. • Het concept voor de opleiding van nieuwe vrijwilligers is herwerkt tot een modulair traject dat meer inzet op opleiding vanop afstand (zelfstudie en online vorming) naast live sessies die inzetten op vaardigheden. Momenteel wordt werk gemaakt van het uitwerken van de nodige materialen (video, tekst) om dit traject concreet vorm te geven. Voorjaar 2023 wordt een eerste groep van nieuwe vrijwilligers binnen dit nieuwe traject opgeleid. • Eind oktober startte het werven en selecteren van geschikte kandidaat-vrijwilligers voor die nieuwe opleiding. • Ad hoc vond een eerste verkennend overleg plaats met de AP-hogeschool omtrent het inschakelen van studenten in het traject dat stage en vrijwilligerswerk zou combineren. <p>2.2. Ondersteuning data-analyse, rapportering, netwerking, ontwikkeling online-tools</p> <ul style="list-style-type: none"> • Najaar 2022 lag de focus op de monitoring van de vragen omtrent Nieuwe Psychoactieve Stoffen, mede naar aanleiding van de eindrapportering voor het SCANNER-project waar De Druglijn samen met 8 andere drughulplijnen uit Europa bij betrokken is. • Verdere plannen voor data-analyses konden voorlopig niet gerealiseerd worden. De aanhoudende stijging van het aantal vragen aan De Druglijn (+550 of 7% contacten voor de periode januari t.e.m. november) lieten daarvoor weinig marge. • Op het vlak van online tools werden in september en oktober verbeterpunten uitgevoerd aan het intranet (DiReCT) dat door het team en de vrijwilligers gebruikt wordt voor het beantwoordwerk. Zo beschikt dat voortaan over een stabielere agenda en zijn er meer mogelijkheden om relevante bronbestanden te delen. In samenwerking met andere lijnen en chathulp-initiatieven werden verdere verbeterpunten aan de gezamenlijke chatsoftware SIT ontwikkeld en geïmplementeerd. • Via de betrokkenheid bij de OHIL-en OHUP-netwerken werd verder ingezet op uitwisseling met andere hulp- en infolijnen. Het gezamenlijk uitgewerkte protocol omtrent suïcidale oproepers werd

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

door het Druglijnteam verder verfijnd op maat van de eigen werking en inmiddels via vorming geïmplementeerd. In het voorjaar 2023 is het de bedoeling dat protocol te integreren in de nieuwe vrijwilligersopleiding. Tegelijk zijn er verkennende contacten met andere lijnen omtrent het opstarten van een gezamenlijk traject omtrent beroepsgeheim.

- Op internationaal vlak vond divers overleg met consult plaats: met de Nederlandse Drugs Infolijn (Trimbos Instituut) omtrent de ontwikkeling van een intranet; op vraag van de Zweedse overheid vond een consultgesprek plaats omtrent de mogelijke oprichting van een lijn in Zweden; met de Ierse volksgezondheidsadministratie HSE vond een gesprek en demo plaats omtrent de meerwaarde van de inzet van online tools als GRIP en DASH in de setting van een drughulplijn.

2.3. De grondige update van de online zelfhulptool DASH.

Voor de grondige update van de online zelfhulptool DASH loopt het intern project verder. In de eerste onderzoeksfase werd reeds evidentie verzameld omtrent online zelfhulp en momenteel wordt in overleg gegaan met andere aanbieders (zoals Zorggroep Zin en CGG De Kempen) en experts/onderzoekers op vlak van online hulp. Het is de bedoeling om in het voorjaar 2023 tot een dossier te komen dat toelaat om beslissingen te nemen omtrent de beste keuzes voor de update van DASH. De kostprijs van een grondige update zal daarin sterk doorwegen. Aanhoudende inflatie, en daarmee de stijgende loonkost, wegen immers ook op deze projectmiddelen van het relanceplan.

3. Versterking Zelfmoordlijn1813

- Eind 2021 realiseerde het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) een uitbreiding (verdubbeling) van de openingsuren van de chathulp en daarmee samenhangend een verdubbeling van het aantal chatvrijwilligers.
- In 2022 werd ingezet op het behoud van de verdubbeling van de chat en dus het op peil houden van het aantal vrijwilligers, rekening houdend met een verdeling van 120 chatters en 140 telefoonbeantwoorders. Met 1 VTE stafmedewerker werd concreet ingezet op intakegesprekken en opleiding van nieuwe vrijwilligers, organisatie en coördinatie van intervisiemomenten, permanente vorming en ondersteuning van vrijwilligers.
- In het voorjaar van 2022 zijn 18 kandidaat-chatvrijwilligers gestart aan de opleiding, 13 van hen zijn ondertussen actief aan de Zelfmoordlijn-chat. Momenteel zijn er in totaal 110 chatvrijwilligers actief aan de Zelfmoordlijn. In het najaar startten er 10 kandidaat-chatters aan de opleiding. Momenteel ronden 7 chatters de vorming van het najaar af, zij zullen voor het einde van de maand actief worden aan de Zelfmoordlijn. Met 117 chat-vrijwilligers t.o.v. 120 eind 2021, kunnen we stellen dat we het aantal chat-vrijwilligers hebben kunnen handhaven.
- In 2021 voerde het CPZ 38% meer chatgesprekken dan in 2020. In de periode 1/1/22-31/11/22 werden 3.601 chatgesprekken gevoerd. Dit is een stijging met 12,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2021 en een stijging met 56,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

4. Sensibiliseringscampagne suïcidepreventie gericht op mannen

De opdrachten zoals opgenomen in het MB waren op het moment van de vorige rapporteringsronde volledig gerealiseerd.

De campagne 'Kom uit je Kop' werd eind april 2022 gelanceerd. De campagne wordt duurzaam verder uitgedragen binnen de beheersovereenkomst met VLESP, partnerorganisatie voor de preventie van zelfdoding.

5. Oproep telewerk – heroriëntering bedrijfscoaches

- Het project loopt tot 28 februari 2023 i.p.v. 31 december 2022, gevolg van uitstel van lancering (6 mei -> 6 juli 2021).
- Eindrapporten van de projecten worden verwacht op 31 december 2022, de financiële verslagen op 31 januari 2023 als gevolg van jaarafsluit. Een algemene evaluatie van het gehele project vindt in februari 2023 plaats.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

	<ul style="list-style-type: none"> • Alle projecten dienden een tussentijds evaluatieverslag en een financieel verslag in. Er worden geen grote of onoverkomelijke vertragingen vastgesteld. De meeste projecten zijn pas goed en wel in april-mei 2022 gestart (lancering, kick-off,..). Aldus was de tussentijdse evaluatie in juli nog te vroeg om veel resultaten te zien, hoofdzakelijk op bereik, weinig tot geen op vlak van effect. De grootste uitdaging die gesignaleerd werd is meekrijgen van werknemers (of organisaties), tijdsdruk werknemers en de projectduur. <p>6. Uitbouw en uitrol in de Eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering</p> <p>Aan de Koning Boudewijnstichting werd een subsidie toegekend voor de uitbouw en uitrol van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering in de Eerstelijnszones. De subsidie wordt toegekend voor de periode 1 december 2022 tot en met 30 november 2025. De Koning Boudewijnstichting krijgt daarbij de opdracht om een tijdelijk consortium van partners bestaande uit beleids-, kennis-, partner- en doelgroep organisaties op te richten en te coördineren om zo de vele perspectieven en bestaande expertise die nodig zijn om te komen tot een populatiegerichte aanpak inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering te kunnen bundelen. De opdrachten van dit consortium zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terreinverkenning. Het in kaart brengen van bestaande expertises, methoden en praktijken en verkenning van noden op het terrein. Het resultaat van deze verkenning wordt gebundeld in een inspiratienota en leidt tot een concreet werk- en financieel plan voor de rest van het traject. - Een ondersteuningsaanbod ontwikkelen. De ondersteuning kan zowel inhoudelijk als methodologisch en procesmatig zijn. De ondersteuning maakt gebruik van bestaande methodieken en zet in op methodiekenontwikkeling die aansluit bij de noden en context op het terrein. - Capteren van goede praktijken en structurele en andere obstakels doorheen het volledige traject. - Samen met de partners van het consortium een ondersteunend aanbod voor actoren in alle eerstelijnszones aanbieden. Het ondersteunend aanbod dient flexibel aangepast en ingezet te kunnen worden en gaat van intensieve procesbegeleiding tot intervisie, kennisuitwisseling, aanleren van methodieken/gebruik van data, vaardigheidstraining en procesbegeleiding om complexe samenwerkingsverbanden uit te bouwen. <p>7. Eind 2022 starten de OverKopnetwerken met het uitvoeren van opdrachten inzake psycho-educatie ter ondersteuning van het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied, en Hogeschool West-Vlaanderen voert een opdracht uit inzake peer support binnen de OverKophuizen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALLEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sensibiliseringscampagnes: over diverse thema's en voor verschillende doelgroepen worden sensibiliseringscampagnes gevoerd in functie van een betere bekendmaking van het hulpaanbod.	2024 Q4	Op schema	Campagnes over jeugdhulp en zelfmoordpreventie zijn gerealiseerd.
Het participatieproject wordt voorbereid via overheidsopdracht	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Er wordt een campagne gevoerd over suïcidepreventie specifiek gericht op mannen.	2021 Q4	Gerealiseerd	De campagne is gerealiseerd.
Diverse hulplijnen ontvangen extra middelen	2024 Q4	Op schema	
Versterking hulplijnen: de hulplijnen 1712 (geweld), Tele-Onthaal, de chat Nupraatikerover, de Druglijn en de Zelfmoordlijn ontvangen subsidies om de werking te versterken zodat het stijgend aantal gebruikers kan opgevangen worden.	2021 Q4	Gerealiseerd	De subsidies zijn toegekend.
Werkgevers worden ondersteund bij het voeren van een gezondheidsbeleid.	2023 Q1	Op schema	Het project loopt nu op schema na een initiële vertraging waardoor de uitvoeringstermijn voor de projecten werd verlengd met 2 maanden tot 28 februari 2023, dit omdat tijdens de voorbereiding van de oproep bleek dat een toestemming van de Europese commissie nodig was omdat deze oproep beschouwd moest worden als een vorm van staatssteun.
Werkgevers kunnen aanvragen indienen ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid bij telewerk – projecten zijn geselecteerd en kunnen van start gaan	2021 Q4	Gerealiseerd	Er werden 38 voorstellen ingediend waarvan er 14 werden goedgekeurd.
Uitbouw en uitrol in de Eerstelijnszones van een populatiegerichte benadering inzake Vroegkinderlijke Negatieve Ervaringen of traumatisering: terreinverkenning resulterend in een inspiratienota en actieplan voor het verdere traject.	2023 Q2	Op schema	Het project is goedgekeurd op de VR van 9 december 2022. Het traject wordt opgestart.
Psycho-educatie ter ondersteuning van het jeugdwerk door de OverKopnetwerken: plan van aanpak door de netwerken voor de besteding van de middelen hetzij voor het opstarten van een bijkomend Overkophuis, voor versterking van het bestaande huis of voor uitvoering van de opdrachten rond psycho-educatie.	2023 Q2	Op schema	Het project is goedgekeurd door de VR op 9 december 2022. Het traject wordt opgestart.
Ondersteuning door Hogeschool West-Vlaanderen van peersupport binnen de Overkophuizen: uitvoering van 2 vormen voor alle Overkophuizen.	2023 Q4	Op schema	Het project werd goedgekeurd door de VR op 9 december 2022. Het project wordt opgestart.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	6.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	11.526.000 EUR
Uitvoering VAK	11.494.000 EUR
Uitvoering VEK	5.382.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 11.526.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Bisnota aan de Vlaamse Regering van 21 mei 2021. Versterken mentaal welzijn – Opvolging actieplan mentaal welzijn</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022 over de subsidie Koning Boudewijnstichting voor opvolging Actieplan Mentaal Welzijn: bevat de beslissing over de budgetverschuiving van 5, 026 miljoen euro van VV144 naar VV138</p> <p>VR 9 december 2022 - Subsidie OverKopnetwerken voor opdrachten rond psycho-educatie ter ondersteuning jeugdwerk in werkingsgebied, en subsidie Hogeschool</p>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
<p>VV144 - Zorgzame buurten - Versterken van buurtgerichte lokale initiatieven</p>

VV139 - OVERKOPHUIZEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid
Belanghebbenden	Jongeren in Vlaanderen en Brussel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Op voorstel van de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, wil de Vlaamse Regering investeren in het welbevinden van jongeren. Opgroeien lanceert daarom een oproep voor de (verdere) ontwikkeling van zestien OverKophuizen. Geselecteerde initiatieven komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro per OverKophuis die wordt toegekend voor een duurtijd van drie jaar. Een OverKophuis is een plek met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en ondersteuning in een omgeving van vertrouwen en geborgenheid. Het gaat om een plek waar je als jongere een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op ondersteuning op vlak van welbevinden zonder een label opgeplakt te krijgen. Een OverKophuis is een toegankelijke ontmoetingsplek waar de doelstellingen van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidsbevordering gecombineerd worden waargemaakt vanuit een sterke participatieve insteek. Deze aanpak sluit ook aan bij een buurtgerichte benadering van de zorg.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	4.800.000 EUR
Output	Zestien OverKopnetwerken starten binnen hun eigen werkingsgebied minstens één OverKophuis op. In totaal zullen er op 1 januari 2022 in Vlaanderen en Brussel minstens 30 OverKophuizen geopend en werkzaam zijn. De zestien OverKopnetwerken worden vanaf het najaar van 2021 ondersteund vanuit het agentschap Opgroeien via een lerend netwerk en ondersteuningstraject.
Outcome	Tegen 1 januari 2022 zijn in Vlaanderen en Brussel minstens 30 OverKophuizen geopend. Dit zijn 30 toegankelijke ontmoetingsplekken met een geïntegreerde werking voor jongeren, waarbij partners vanuit welzijn, vrije tijd, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, ... de handen in elkaar slaan om de doelstellingen te realiseren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>Vlaamse Veerkracht - eenmalige middelen versterking OverKop</p> <p>Elk OverKopnetwerk ontvangt in 2023 105.000 euro extra bovenop het bestaande subsidiebedrag van 100.000 euro.</p> <p>Aan Hogeschool West-Vlaanderen wordt in het kader van Peer Support Vlaanderen een subsidie van 20.000 euro toegekend voor het organiseren van twee vormingen inzake peer support in alle OverKophuizen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	/

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Definitieve goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	
Principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering oproep OverKophuizen: https://www.opgroeien.be/overkop	2021 Q1	Gerealiseerd	
Start beoordelingsfase ingediende projectaanvragen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Publieke communicatie nieuwe locaties OverKophuizen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Communicatiecampagne (doelgroep jongeren)	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opstart ondersteuningstraject OverKophuizenKick-Off lerend netwerk OverKophuizen 30/09/2021	2021 Q3	Gerealiseerd	
Vanaf september 2021 tot en met december 2021: opening nieuwe OverKophuizen in Vlaanderen en Brussel	2021 Q4	Gerealiseerd	
Verdere uitbouw ondersteuningstraject en lerend netwerk	2022 Q1	Gerealiseerd	
Aantal geopende OverKophuizen: 33	2022 Q3	Gerealiseerd	Momenteel zijn 33 OverKophuizen geopend in Vlaanderen.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Verdere uitbouw ondersteuningstraject en lerend netwerk	2023 Q1	Op schema	<p>We tekenen vanuit het agentschap Opgroeien het ondersteuningstraject voor de OverKophuizen voor het jaar 2023 verder uit. Ook in 2023 willen we de OverKopnetwerken en de OverKophuizen ondersteunen in de vorm van digitale netwerkabbels, interviemomenten, vormingen rond peer support, inspiratiedagen, ... Dit alles gebeurt in dialoog met de OverKopnetwerken zelf, en ook samen partners zoals het Departement Jeugd, het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Departement Welzijn en Gezondheid, etc.,</p>	
Beleidsimplementatie eenmalige extra middelen versterking OverKop	2023 Q1	Op schema	<p>In 2023 worden extra middelen toegekend aan de OverKopnetwerken. Deze middelen worden aangewend voor de versterking van OverKop binnen het specifieke werkingsgebied en voor de uitvoering van opdrachten inzake psycho-educatie. Er wordt in dit kader door elk OverKopnetwerk (een groeipad naar) een ondersteuning van jeugdwerk uitgetekend binnen het werkingsgebied, in de vorm van consultfunctie, intervisie en vorming.</p> <p>Hiernaast worden er in 2023 ook vormingen georganiseerd rond peer support in de OverKophuizen, onder begeleiding van Peer Support Vlaanderen (Hogeschool West-Vlaanderen).</p>	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal geopende OverKophuizen in 2022	30	2022 Q1	33	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.800.000 EUR
Uitvoering VAK	4.800.000 EUR
Uitvoering VEK	2.784.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 4.800.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning - nota](#)

[Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning - advies](#)

VV140 - SAMENWERKINGSVERBANDEN “ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN”

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien - Agentschap Zorg en Gezondheid - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Belanghebbenden	samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan'

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Met 'één gezin, één plan' investeren we sinds 2018 in samenwerkingsverbanden die laagdrempelige, snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulpverlening bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen met pedagogische ondersteuningsnoden. Een eerstelijnspsychologische functie is in deze samenwerkingsverbanden voorzien zodat een geïntegreerd antwoord geboden kan worden, ook wanneer ze sprake is van combinatie van noden op het vlak van pedagogische vaardigheden met geestelijke gezondheidszorgproblematiek</p> <p>De samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan' worden tegen eind 2021 op het volledige grondgebied van Vlaanderen en Brussel actief en zullen een doorstart kennen in 2022. Deze implementatie willen we flankeren met een versterking van de crisisnetwerken, actoren in verontrusting en een ondersteunende campagne.</p> <p>Project VV 140 valt in drie deelprojecten uiteen: 1) de continuering van de uitbreiding van crisisbegeleiding die werd opgestart tijdens de coronacrisis en waarvan stakeholders aangeven dat de nood nog steeds hoog blijft; 2) de uitbreiding van het aantal medewerkers bij de vertrouwenscentra kindermishandeling, ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank, eveneens opgestart in de coronacrisis, met ook hier de vraag om er verder op in te zetten; 3) een ondersteunende campagne om 'één gezin, één plan' beter bekend te maken bij het brede publiek en de connectie met zowel de basisvoorzieningen als de meer gespecialiseerde hulp te versterken zodat we na de relance heel wat vragen rond crisis en verontrusting effectief door deze netwerken kunnen laten opnemen.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.200.000 EUR
Output	deelproject 1. uitbreiding van het aanbod crisisbegeleiding met 250 eenheden in 2022 en 150 in 2023. deelproject 2. bijkomende tewerkstelling van 30 medewerkers in vertrouwenscentra kindermishandeling, ondersteuningscentra jeugdhulp en sociale diensten jeugdrechtbank in 2022. deelproject 3. bekendmakingscampagne
Outcome	deelproject 1. er worden in 2022 en 2023 respectievelijk 250 en 150 kinderen in acute situaties begeleid zodat crisissen omgebogen worden en minder intensieve ondersteuning vermeden wordt.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	<p>deelproject 2. we formuleren antwoorden op het toenemende aantal situaties van verontrusting.</p> <p>deelproject 3. de samenwerkingsverbanden 'één gezin, één plan' zijn beter bekend bij de stakeholders.</p> <p>Finaal slagen we erin om gezinnen met (acute) hulpvragen sneller te bereiken en te ondersteunen zodat ze zonder ingrijpende, intensieve hulpverlening verder kunnen.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	Voor de crisisbegeleidingen verwachten we nog de inhoudelijke rapporten met de exacte aantallen op 31/03/2023 voor 2022. De 60% is vermoedelijk een onderschatting van de definitieve aantallen. Niettemin weten we van personeelsperikelen en langere duurtijden, waardoor we 100% niet zullen halen.
Noodzakelijke politieke actie	Gezien het stijgend aantal crisisvragen over de jaren heen wordt een evaluatie voor de VR voorbereid in de zomer van 2023.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
De middelen voor crisisbegeleiding zijn besteed	2022 Q4	Vertraging	De 750.000 euro middelen van 2022 werden volledig besteed. In 2023 zijn er nog 500.000 euro middelen voorzien.	
De middelen voor de versterking van crisisbegeleiding zijn toegekend.	2022 Q1	Vertraging		
de medewerkers in de ondersteuningscentra jeugdzorg, de vertrouwenscentra kindermishandeling en de sociale diensten jeugdrechtbank zijn geworven.	2022 Q1	Vertraging		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
uitbreiding van het aantal gezinnen in crisissituaties dat begeleid wordt.	250	2022 Q4		60 %
uitbreiding van het aantal gezinnen in crisissituaties dat begeleid wordt	150	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.200.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.200.000 EUR
Uitvoering VAK	3.200.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	1.664.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.200.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV141 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - CRISISOPVANG EN CRISISBEGELEIDING IN RESIDENTIËLE JEUGDZORG

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Zorg en Gezondheid - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Dit project (nr. 141) zet in op de aanpak van crisissituaties in gezinnen door de jeugdhulp, als reactie op verontrustende opvoedingssituaties. Het project valt uiteen in 2 deelprojecten.</p> <p>In 2020 werd het aanbod van crisisbegeleiding op advies van experts tijdelijk uitgebreid om te anticiperen op een stijging van verontrustende gezinssituaties omwille van Corona. Aangezien de Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn, zetten we een gedeelte van deze middelen in om deze tijdelijke uitbreiding voor 1 jaar aan te houden.</p> <p>Daarnaast willen we de relancemiddelen gebruiken om op basis van de adviezen van het maatschappelijk relancecomité een hefboom te creëren om in te zetten op een duurzame verandering rond de aanpak van complexe casussen in de jeugdhulp, die te vaak tot escalaties en crisissen leiden, en waarvoor de crisismeldpunten geen adequate ondersteuning kunnen bieden. We zetten daarvoor proefprojecten 'de ideale wereld' op, waarin we werk maken van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle regionale actoren en de ondersteuningscentra en de sociale diensten van de jeugdrechtsbank (OSD) voor deze casussen.</p> <p>Tegelijk engageren we de administratie om dit proces mee op te volgen en samen met alle actoren de administratieve en logistieke barrières in kaart te brengen (bv. rol van de toegangspoort, sectorspecifieke regelgeving, onderscheid en combineerbaarheid RTJ/NRTJ, intersectorale schakelmogelijkheden, ...), die samenwerking bemoeilijken of blokkeren en de nodige aanpassingen voor te stellen om de samenwerking op het terrein te faciliteren.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.000.000 EUR
Output	<p>deelproject crisisbegeleidingen: het aantal jongeren bereikt met projectmiddelen voor crisisjeugdhulp</p> <p>deelproject 'ideale wereld': ntb</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	deelproject crisisbegeleidingen: de uitkomst van de crisisbegeleidingen bij afloop: terug naar huis/kan thuis blijven, opvang in de context, vraag naar een langdurig verblijf in een residentiële voorziening in de jeugdhulp. deelproject 'ideale wereld': ntb

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Drie proefprojecten 'ideale wereld' zijn geselecteerd en opgestart	2021 Q3	Gerealiseerd		
400 extra crisisbegeleidingen	2021 Q4	Gerealiseerd		
De lerende netwerken zijn opgestart	2021 Q4	Gerealiseerd		
De drie proefprojecten 'ideale wereld' hebben een concreet plan, afgetoetst met alle stakeholders, en zijn klaar om dit te implementeren	2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal jongeren begeleid met de projectmiddelen in crisisjeugdhulp.	400	2020 Q4	302	77 %
Onderzoek naar duurzame verandering rond de aanpak van complexe casussen in de jeugdhulp + testcases		2023 Q4		
Verbeterd inzicht in de voorwaarden voor het verknopen van expertise in trajecten van kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	2.460.000 EUR
Uitvoering VEK	1.830.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 5 februari 2021 VR 9 december 2022 - Subsidie verlenging tijdelijke versterking crisisbegeleidingen

VV142 - VERSTERKING AANPAK INTRA-FAMILIAAL GEWELD - BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
bewustmakingscampagnes om (potentiële) plegers te bereiken en hen preventief toe te leiden naar hulpverlening

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	300.000 EUR
Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Sensibiliseringscampagnes - intrafamiliaal geweld		Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	300.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot) update	300.000 EUR
Uitvoering VAK	200.000 EUR
Uitvoering VEK	8.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 300.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2022. Versterken mentaal welzijn. Preventiecampagne
VR 2 december 2022 - Subsidie aan GAMS vzw voor project 'opgroeien zonder vrouwelijke genitale verminking'

VV143 - ZORGZAME BUURTEN - ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Apothekers Netwerk (VAN vzw), CAW Groep, VVSG

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Dagelijks zien apothekers mensen uit alle lagen van de bevolking met zeer uiteenlopende vragen en behoeftes. Met een gemiddelde van 100 patiëntencontacten per dag, zijn de apothekers de zorgverleners uit de eerste lijn die een groot bereik hebben en lokaal zijn ingebed. Dit biedt enerzijds veel mogelijkheden om patiënten te sensibiliseren en mee te werken aan de preventie van verschillende chronische aandoeningen, en anderzijds kunnen zij een grote rol opnemen inzake detectie en signalering van psychosociale noden en kwetsbaarheden. Met dit project willen we de rol van apothekers als diegenen die psychosociale noden kunnen detecteren en snel kunnen doorverwijzen naar de gepaste hulp versterken. Het Vlaams Apothekers Netwerk vzw (VAN) wil de apothekers in de toekomst een rol geven in de oriëntatie van slachtoffers van geweld en van kwetsbare burgers met psychosociale noden die onder de radar blijven. VAN vzw wil een duurzame samenwerking opzetten met CAW en lokale besturen, en komen tot een goed onderbouwd samenwerkingsakkoord zodat ze elkaars rol kunnen versterken met als effect dat zowel de problematiek van familiaal geweld als de psychosociale noden en behoeften van elke kwetsbare burger gezien wordt, bespreekbaar wordt en gepast wordt aangepakt.</p> <p>De doelstellingen en acties van fase 1 van het project zijn:</p> <p>1° Inventariseren welke samenwerkingen op het terrein reeds bestaan, en bevragen wat de noden en behoeften zijn om deze te verduurzamen en nog efficiënter en kwaliteitsvoller aan te pakken.</p> <p>a. Een onlinebevraging, die wordt verspreid onder de Vlaamse en Brusselse apothekers en de CAW's en de OCMW's (dit kan via VVSG).</p> <p>b. Bekijken, in het kader van het GBO, op welke manier de toeleiding van cliënten die door de apothekers worden gedetecteerd, kan verlopen naar de CAW's, OCMW's en DMW's. Als leidraad hanteren we hierbij de expertise van deze kernactoren inzake psychosociale begeleiding, met bijzondere aandacht voor de expertise van de CAW's inzake problematiek van relationeel/huiselijk geweld.</p> <p>2° Materialen (checklist) en een opleiding ontwikkelen voor apotheekmedewerkers in functie van detectie en herkennen van signalen in het kader van familiaal geweld, en het verbergen en niet onderkennen van psychosociale problemen op de verschillende terreinen. Men kijkt eveneens de mogelijkheden op het niveau van de eerstelijnszones.</p> <p>a. Een checklist die aangeeft hoe apothekers signalen van familiaal geweld kunnen herkennen;</p> <p>b. Een overzicht van algemene kenmerken van 'zorgmijders';</p> <p>c. Handvaten en tools (affiches, stickers, flyers ...) die apothekers kunnen gebruiken om problemen bespreekbaar te</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

stellen;

d. Informatie en afspraken over hoe men dient om te gaan met patiënt-/cliëntinformatie;

e. Een opleiding om de materialen voor te stellen, de achtergrond ervan mee te geven en toe te lichten hoe ze worden gebruikt;

f. Ondersteunende instructies voor de vertegenwoordigers in de zorgraden om dit project op te zetten binnen hun eerstelijnszone

3° Taal en tools aanreiken om problemen bespreekbaar te maken, mensen te ondersteunen en te motiveren en ze snel en gemakkelijk toe te leiden naar de hulpverlening. Een onmisbare tool voor het efficiënt doorverwijzen is de sociale kaart.

a. Een stroomschema met de verschillende stappen die apothekers kunnen zetten bij een vermoeden van familiaal geweld, psychosociale problemen en hoe ze snel kunnen doorverwijzen;

b. Informatie over de beschikbare hulp en de bereikbaarheid (waar, wanneer en hoe), hoe apothekers kunnen doorverwijzen en aanmelden (aanmeldingstool);

c. Afspraken in verband met de registratie en verwerking van data op een geaggregeerd niveau, rekening houdend met de GDPR-regelgeving;

d. Een opleiding/webinar/e-learning die de rol van apothekers in het kader van detectie, signalering en doorverwijzing duidt, concreet maakt en toelichting geeft bij het gebruik van het stroomschema en de afspraken, en handvaten geeft hoe men kan communiceren met slachtoffers en hulpvragers of hulp- en zorgmijders.

Om vanuit de praktijk de link te leggen met het beleidsniveau, zal worden samengewerkt met een academische onderzoeksgroep die de pilootprojecten zal opvolgen, evalueren en bekijkt welke relevante data kunnen gegenereerd worden. Men wil ook nagaan in welke mate de samenwerking met de apothekers de drempel naar de hulpverlening verlaagt.

De doelstellingen en acties van fase 2 van het project zijn:

1° Duurzame competentieontwikkeling bij de apotheker.

-> Verder uitwerken van de materialen (trainingsmateriaal, tools voor de praktijk) zodat ze bijdragen tot een duurzame competentie-ontwikkeling van apothekers. Hierbij wordt o.a. gedacht aan een e-learning met verschillende modules (zowel voor 'startende' apothekers als voor apothekers die al een rol hebben opgenomen in het doorverwijzen van patiënten), intervisiemomenten onder begeleiding van experts, een toolbox,...

-> Ontwikkelen van een trainingspad dat leidt tot een betere detectie en gerichte doorverwijzing van personen met psychosociale noden door de huisapotheker, met verhoogde aandacht voor kwetsbare personen en zorgmijders. Dit gaat van het herkennen, het bespreekbaar maken en het doorverwijzen van personen die kampen met psychosociale problemen.

2° Uitbreiden van het deelnemende apothekersnetwerk.

-> Betrokkenheid van apothekers actief verder uitbouwen (zowel in aantal als geografisch): door de huisapothekers gelegen in een groter geografisch ELZ netwerk te informeren over de werking van het CAW als laagdrempelige en lokaal verankerde hulporganisatie en hen op te leiden en van de nodige handvatten te voorzien;

3° #CAVAsa kenbaar maken bij een breder publiek.

-> Het sensibiliseren van de algemene bevolking; informeren van burgers over de rol van de apotheker als vertrouwenspersoon bij psychosociale problemen;

4° Het installeren van een duurzame samenwerking tussen apothekers en CAW

-> Toolbox ter beschikking van de apothekers up to date houden en uitbreiden naar bijkomende CAW regio's;

-> Website www.cavasa.be voorzien van contactgegevens van het CAW per ELZ en makkelijk toegankelijk maken voor apothekers;

-> Laagdrempelige ontmoetingsmomenten tussen apothekers en CAW-medewerkers organiseren

PROJECTOMSCHRIJVING

-> Compenseren van de inzet van de deelnemende apothekers (gedurende het bijkomende projectjaar).

Tegelijk zal het bijkomende projectjaar van #CAVAasa benut worden om ook onderstaande onderzoeksdoelstellingen te bereiken:

1° Inzicht verwerven in de ervaring van patiënten die via hun apotheker bij CAW zijn terechtgekomen.

-> Informatie en 'materiaal' verzamelen dat gebruikt kan worden om de nieuwe dienstverlening nog meer patient-centered te maken. Testimonials van patiënten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de e-learning te verrijken, of voor communicatie naar patiënten/andere stakeholders;

2° Onderzoek naar de randvoorwaarden voor een duurzame verankering van de rol van de apotheker in het psychosociale zorglandschap.

-> Basis leggen voor een duurzaam samenwerkingsmodel tussen huisapotheker en CAW, toepasbaar voor alle huisapothekers in Vlaanderen;

3° Wetenschappelijke disseminatie

-> Resultaten van het project (zowel kwantitatieve data als kwalitatieve data) kenbaar maken via papers in wetenschappelijke tijdschriften, congressen GGZ, publicaties en activiteiten beroepsverenigingen, meetings met ELZ kernactoren, ...

-> Resultaten en materialen delen met de verschillende universiteiten in Vlaanderen, zodat het concept opgenomen kan worden in de basisopleiding voor apothekers, en er via masterproeven, PhD projecten,... verder onderzoek gedaan kan worden naar de implementatie.

De finale doelstelling is om na het tweede projectjaar de nodige tools te hebben ontwikkeld om het project breed te integreren in het beleid van zoveel mogelijk ELZ, opdat de lokale apothekers en CAW door de lokale besturen en zorggraden autonoom (middels de beschikbare tools) en actief kunnen worden ingeschakeld in het lokale netwerk van zorgzame buurten ter bevordering van het psychosociaal welbevinden. Het werk van twee projectjaren zal worden gebundeld in een laagdrempelig model waarbij iedere huisapotheker (die deze nieuwe rol in de dagelijkse apothekerspraktijk wil opnemen) de samenwerking met het lokale CAW - binnen een zorgzame buurt- op een eenvoudige manier kan aanvangen. Tegelijk zullen een aantal concrete randvoorwaarden worden geformuleerd opdat een brede implementatie in Vlaanderen succesvol en duurzaam kan zijn.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	250.000 EUR
Output	- Een inventaris van bestaande samenwerkingsverbanden en noden/behoefte om deze samenwerkingsverbanden te verduurzamen, efficiënter en kwaliteitsvoller aan te pakken. - Een aantal materialen/tools en opleidingen voor apothekmedewerkers. - Een breder aanbod van de e-learning, brede communicatie en organisatie van een symposium
Outcome	Snellere detectie van psychosociale noden en doorverwijzing naar gepaste hulp. Optimale voorbereiding voor uitrol naar alle eerstelijnszones in 2023.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De subsidie aan het Vlaams Apothekers Netwerk vzw voor de uitvoering van de tweede fase van het project is toegekend. Dit werd goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 11/03/2022. Het project is in uitvoering.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	De bijkomende projectsubsidie van 32.000 euro werd toegekend met ingang van 1 oktober 2022 en loopt tot 30 april 2023.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Fase 1 van het project is uitgevoerd	2022 Q1	Gerealiseerd		
Subsidie aan VAN vzw voor uitvoering van het project - fase 2 is toegekend	2022 Q1	Gerealiseerd		
Fase 2 van het project is uitgevoerd	2023 Q1	Op schema		
De resultaten van het project zijn breed verspreid	2023 Q4	Nog niet gestart		
Subsidie aan VAN vzw voor uitvoering van het project - fase 1 is toegekend	2021 Q1	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Onlinebevraging van samenwerkingsverbanden en noden/behoefte: inventaris	1 inventaris	2021 Q2	1	100 %
Opleidingen voor apothekersmedewerkers: opleiding voor gebruik van de toolsopleiding omtrent apothekers	2 opleidingen	2022 Q1	2	100 %
Materialen/tools: - een checklist- een overzicht met kenmerken van 'zorgmijders'- handvaten en tools (affiches, stickers, flyers,...)- informatie en afspraken m.b.t. omgaan met cliëntinformatie- ondersteunende instructies- stroomschema- aanmeldingstool- registratie- en verwerkingsafspraken	8 uitgewerkte materialen / tools	2022 Q1	8	100 %
Symposium	1 symposium	2023 Q1	1	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	250.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	250.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VAK	250.000 EUR
Uitvoering VEK	228.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 250.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 12 maart 2021 <u>VR 11 maart 2022 - Subsidie project #CAVAAsa 2.0 Vlaams Apothekers Netwerk</u>

VV144 - ZORGZAME BUURTEN - VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Agentschap Zorg en Gezondheid - Agentschap Opgroeien - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	Welzijns- en zorgorganisaties, welzijns- en zorgprofessionals, lokale besturen, patiënten- en cliëntenorganisaties, enz. (Experten zetelend in de Vlaamse Raad WVG)

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	29. Versterken mentaal welzijn
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Vandaag willen mensen met zorg- en ondersteuningsvragen zelf beslissen over de hulp en ondersteuning die ze willen krijgen. Ze zijn niet langer gefocust op gezondheid, maar wel op hun brede levenskwaliteit en willen comfortabel kunnen wonen in hun huis en vertrouwde buurt. Of het nu gaat om ouderen, personen met een handicap, personen met psychische problemen of gezinnen met kinderen of jongeren met een zorg- of ondersteuningsvraag, mensen willen graag, maatschappelijk ingebed, in de buurt blijven wonen.</p> <p>Door het ontwikkelen en stimuleren van zorgzame buurten met aandacht voor buurtgerichte zorg kunnen we die evolutie ondervangen. Met zorgzame buurten zetten we in op zorgzaam samenleven, op ontmoeting, solidariteit en de opbouw van sociaal weefsel. Zorgzame buurten kunnen helpen om vereenzaming te voorkomen. Een zorgzame buurt biedt geborgenheid en ondersteuning in de nabije omgeving. Het draait om “het kleine helpen”. Een zorgzame buurt is er voor iedereen. Daarenboven leggen we de link tussen informele hulp en de professionele zorg zodat complexe hulpvragen sneller, makkelijker een weg vinden naar de professionele hulpverlening en professionele hulpverlening die informele zorg ook beter kan ondersteunen. De betrokkenheid van de professionele zorg in zorgzame buurten moet er voor zorgen dat verschillende welzijns- en zorgorganisaties op dat lokale niveau vanuit eenzelfde focus meer en beter gaan samenwerken en uiteindelijk komen tot het aanbieden van geïntegreerde zorg (vanuit gezondheid én welzijn) met een focus op levenskwaliteit.</p> <p>Daartoe zullen we midden juni 2021 een projectoproep lanceren om tot minstens 95 zorgzame buurtprojecten te komen in het Vlaams Gewest. We zetten een apart traject op om tot minstens 5 projecten te komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.</p> <p>We zullen de minstens 100 zorgzame buurtprojecten een financiële impuls geven gedurende twee jaar. De projecten starten op 1 maart 2022 en lopen tot 29 februari 2024. Ze zullen inhoudelijk begeleid en ondersteund worden door een externe partner, die hiervoor beroep zal doen op de beschikbare expertise op het terrein.</p> <p>In februari 2024 willen we niet enkel tot minstens 100 goedlopende zorgzame buurtprojecten komen, we willen dat deze inspirerend zijn voor andere buurten zodat er zich zorgzame buurten ontwikkelen over heel Vlaanderen en Brussel. Om dat sneeuwbaaleffect te bekomen, zullen we niet enkel een inhoudelijke toolbox uitwerken en ter beschikking stellen van geïnteresseerde buurten in de toekomst, maar ook de projecten en het concept bekend maken zodat het concept leeft op het terrein en andere buurten zin hebben om er zelf mee aan de slag te gaan.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	14.974.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Minstens 100 zorgzame buurtprojecten waarvan minstens 95 in het Nederlandse taalgebied en minstens 5 in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Organisatie van 6 inspiratiedagen voor het brede terrein in voorjaar 2023 in kader van opschalen beleid Zorgzame Buurten - Evaluatiekader (met onder meer een long-list van indicatoren) - Toolbox voor welzijns- en zorgorganisaties en lokale besturen met praktische handvaten/methodieken om aan een zorgzame buurt te werken - Beleidsaanbevelingen tav de Vlaamse overheid (WVG) - Organisatie symposium voor brede terrein in maart/april 2024
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Duurzaamheid van de projecten na de projectduur van twee jaar - Het feit dat de trekkers (en netwerkpartners) een leertraject hebben doorlopen mbt participatief en inclusief werken, het opstellen van een buurtprofiel en buurtanalyse en daaruit verder bouwen om beleid te ontwikkelen, het opstellen van een veranderingstheorie en impactgericht werken en het samenwerken in een netwerk (samenwerking tss welzijn en zorg, beleidsdomeinoverschrijdend, en met buurtbewoners) én wat ze geleerd hebben ook ruimer in de eigen werking kunnen inzetten (bvb impactgericht werken). - Ruimere kennis over/bekendheid van "zorgzame buurten", de werking ervan, werkende principes, enz. bij alle lokale besturen en welzijns- en zorgorganisaties (ook diegene die geen lopend project zorgzame buurten hadden)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Voor 1 oktober 2022 ontvingen we van de projecten een uitgebreide buurtanalyse en eerste veranderingstheorie. We delen deze documenten met het Steunpunt WVG zodat deze als input kunnen dienen voor het onderzoek, alsook met het consortium zodat de vormingen en de coaching van de projecten hierop kunnen afgestemd worden. Het Departement WVG stelt een globale analyse van de ingediende veranderingstheorieën op; we bezorgen deze in januari aan de projecten en het consortium.</p> <p>Het consortium gecoördineerd door de KBS bereidt de volgende vormingen aan de projecten voor; de coaching aan de projecten wordt verder gezet.</p> <p>Het Steunpunt WVG heeft het eerste deel van het onderzoek, het ontwikkelen van een toetsingskader, afgerond en werkt momenteel aan het opstellen van een buurttypologie met het oog op het maken van een toolbox voor startende zorgzame buurten.</p> <p>Het Departement WVG werkt verder aan het verspreiden van informatie en inspiratie met het oog op opschalen van dit beleid via de website zorgzamebuurten.be, die volledig vernieuwd werd. Op de website stellen we basisinformatie rond verschillende deelaspecten van zorgzame buurten ter beschikking. Daarnaast zetten we ook in op storytelling via interviews met de projecten en inspirerende video's rond bepaalde thema's waaronder "eenzaamheid". We verspreiden deze informatie via een eigen nieuwsbrief met intussen meer dan 1000 abonnees, via de nieuwsbrieven van de agentschappen WVG én van de stakeholders. We bereiden vijf provinciale inspiratiedagen voor die doorgaan in april en mei 2023.</p> <p>Tot slot zetten we het Vlaamse Zorgzame Buurtenbeleid ook internationaal in de kijker. We werken</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	samen met de WHO zodat we ons beleid kunnen delen op verschillende WHO fora en zodat we kunnen leren van andere regio's en landen. Recent mochten we onze beleidsaanpak toelichten tijdens het Regions for Health Network van de WHO. We gaan na of we deze samenwerking met de WHO nog verder kunnen uitdiepen.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering projectoproep zorgzame buurten	2021 Q2	Gerealiseerd	
Online inspiratie-/studienamiddag zorgzame buurten	2021 Q3	Gerealiseerd	
Deadline indiening van alle projectaanvragen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Start minstens 100 projecten zorgzame buurten	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 1 maart gingen 119 projecten Zorgzame Buurten van start (114 in het Nederlandse taalgebied en 5 in het tweetalig taalgebied Brussel). Gelet op het animo op het terrein voor dit beleid besliste de Vlaamse Regering op 18 maart om extra middelen toe te kennen voor de projecten waardoor er nu 133 projecten gestart zijn (127 in Vlaanderen en 6 in Brussel).
Ontvangen van gedragen buurtanalyses en veranderingstheorieën van de projecten	2022 Q3	Gerealiseerd	We hebben van alle projecten een gedragen buurtanalyse en eerste veranderingstheorie ontvangen. We hebben deze gevraagd met verschillende doelstellingen: 1) Voor de projecten zelf zodat ze gestructureerd en met een duidelijke impact voor ogen, het project uitwerken. 2) Zodat we/consortium op basis van wat ingediend wordt, kunnen beslissen welke vormen, coaching er prioritair nodig is. 3) Om de projecten aan te zetten tot voortgang. 4) Als input voor het wetenschappelijk onderzoek. Het Departement stelt een globale analyse op van de ingediende veranderingstheorieën.
Organisatie 5 provinciale inspiratiedagen	2023 Q2	Op schema	We bereiden 5 provinciale inspiratiedagen voor (één dag voor Vlaams-Brabant en Brussel) die doorgaan in april en mei 2023 om zo welzijns- en zorgorganisaties en lokale besturen te inspireren, enthousiasmeren, informeren om op een begrijpelijke, toegankelijke manier aan de slag te gaan met Zorgzame Buurten.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
We ontvangen per project eventuele bijgewerkte veranderingstheorie, eerste evaluatieblauwdruk, inhoudelijk en financieel verslag, voortgangsrapport	2023 Q2	Nog niet gestart		
We ontvangen per project een bijgewerkte veranderingstheorie, uitgewerkte evaluatieblauwdruk en eerste dataverzameling, inhoudelijk en financieel verslag, eindrapport	2024 Q2	Nog niet gestart		
Eindsymposium met kennisdeling	2024 Q2	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal startende zorgzame buurtprojecten in Vlaanderen en Brussel	100	2022 Q1	133	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	20.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	14.974.000 EUR
Uitvoering VAK	14.592.000 EUR
Uitvoering VEK	6.087.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 14.974.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Nota aan de Vlaamse Regering van 23 april 2021. Versterking mentaal welzijn – zorgzame buurten

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021: Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake zorgzame buurten](#)

[Beslissing van de VR van 10 december 2021 subsidie Koning Boudewijnstichting voor project 'zorgzame buurten'](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 18 maart 2022. Versterking mentaal welzijn – zorgzame buurten](#)

VR 3 juni 2022 - Zorgzame buurten

[Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022 over de subsidie aan de Koning Boudewijnstichting voor opvolging Actieplan Mentaal Welzijn](#): bevat de beslissing over de budgetverschuiving van 5,026 miljoen euro van VV144 naar VV138

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV138 - Opvolging actieplan mentaal welzijn](#)

30. Armoedebestrijding en wijkverbetering

VV145 - BUITENSCHOOLSE OPVANG ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Lokale besturen, sectoren onderwijs, cultuur, jeugd en sport, gezinnen en kinderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Groeipad vervroegen voor buitenschoolse opvang (vanaf schooljaar 2021-2022).</p> <p>Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) is in werking getreden in 2021. Hierbij komt de regierol inzake BOA bij de lokale besturen te liggen, inclusief de bevoegdheid om te beslissen over de besteding en verdeling van middelen. Echter, tijdens de overgangstermijn (2021-2026) behouden huidige organisatoren van buitenschoolse opvang hun subsidie via opgroeien. De Vlaamse regering voorziet alvast vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding vanaf 2023 en 2024 respectievelijk 3,3 miljoen en 3 miljoen euro een inzet van middelen, ter ondersteuning van de lokale besturen voor de (verdere) uitbouw van een geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten bij deze opdracht. Met dit project, is het mogelijk dit groeipad voor de lokale besturen te vervroegen naar 1 september 2021. Op die manier kan extra aanbod al worden opgestart vanaf de start van het schooljaar 2021-2022.</p> <p>Elke gemeente heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd. Door lokaal het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten af te stemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen, werkt men lokaal aan de drie doelstellingen van het decreet:</p> <ul style="list-style-type: none">- kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden bieden, inspelen op interesses en talenten- voor ouders: de combinatie werk, opleiding en gezin mogelijk te maken- bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften zich welkom voelt. <p>Bij de uitwerking van het decreet in 2019-2020, werden relevante stakeholders betrokken (lokale besturen, werkgevers en werknemersorganisaties vanuit welzijn, onderwijs, cultuur, jeugd en sport en vertegenwoordigers van gezinnen en kinderen)</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	11.400.000 EUR
Output	43 lokale besturen (goed voor ongeveer. 263.911 inwonende en schoolgaande kinderen) ontvangen vanaf 1 september 2021 een subsidie ter ondersteuning van de uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Lokaal wordt invulling gegeven aan de drie doelstellingen van het decreet. Daarbij: 1) Ontwikkelt het lokaal bestuur een lokaal beleid rond BOA op basis van de noden van kinderen en gezinnen, in samenspraak met relevante actoren 2) Beslist het lokaal bestuur over de besteding van de middelen, binnen het kader van het lokaal beleid in punt 1 3) De middelen worden ingezet voor de organisatie van de buitenschoolse opvang (o.m. kleuteropvang met een kwaliteitslabel) en afstemming met buitenschoolse activiteiten (samenwerking met jeugdwerk, sport...) om te komen tot een geïntegreerd en toegankelijk aanbod.
Outcome	Het voorziene groeipad wordt vervroegd. Lokale besturen met een hoog percentage kwetsbare gezinnen, hoog aantal schoolgaande kinderen en op heden weinig subsidies voor buitenschoolse opvang, kunnen hierdoor vervroegd aan de slag met de doelstellingen van het decreet (zie drie punten bij projectomschrijving)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De 43 lokale besturen ontvingen op 1 september 2021 de BOA-subsidie. Zij besteden die aan de realisatie van de doelstellingen van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste principiële goedkeuring besluit Vlaamse Regering over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten en subsidies	2021 Q2	Gerealiseerd	
Voor aankondiging subsidies voor lokale besturen			
Lancering oproep BOA-subsidie (zie opgroei.be/boa/partners/de-boa-subsidie-aan-lokale-besturen)	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning BOA-subsidie	2021 Q4	Gerealiseerd	
Eerste rapportering Vlaamse beleidsprioriteiten	2022 Q4	Gerealiseerd	Ten laatste 31/07/22 rapporteren de lokale besturen binnen de BBC over de BOA-subsidie. Dit doen ze aan de hand van de 2 Vlaamse

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			<p>beleidsprioriteiten, waaraan codes hangen om te rapporteren over de acties ondernomen met deze subsidie.</p> <p>Op basis van deze informatie, maken we in de periode augustus-november een eerste inhoudelijke analyse over wat er precies gebeurt met de Vlaamse Relancemiddelen.</p>
Eerste rapportering OPG-BOA1 en OPG-BOA2	2022 Q4	Gerealiseerd	<p>Op 31/07/2022 rapporteerden de lokale besturen over 2021. De voorbereidingstijd voor lokale beleidsplannen tussen de subsidieoproep en de subsidiering in 2021 was beperkt. Daardoor stellen we vast dat september-december 2021 opstartmaanden waren. De gesubsidieerde lokale besturen concretiseerden de doelstellingen van het decreet in hun lokale context.</p> <p>Algemeen blijkt er nood aan meer concrete handvaten voor de rapportering (aan de hand van de codes OPG-BOA1 en OPG-BOA2) om een beter inzicht te krijgen in het lokaal BOA-beleid.</p>

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal lokale besturen dat vanaf september 2021 een BOA-subsidie ontvangt en de eerste financiële middelen krijgt ifv de doelstellingen van het decreet (afhankelijk van ingediende aanvragen en ev. reservelijst)	43	2021 Q4	43	100 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	11.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	11.400.000 EUR
Uitvoering VAK	11.400.000 EUR
Uitvoering VEK	7.764.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 11.400.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[BVR van 7/09/2021 over het lokaal beleid, de samenwerking en de subsidievoor buitenschoolse opvang en activiteiten](#)

VV146 - COMPENSATIEBESLUIT KO - EXTRA TUSSENKOMST IKT (INKOMENSTARIEF)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Opgroeien
Belanghebbenden	Ouders die kinderopvang gebruiken in een opvang waar men volgens inkomen kan betalen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>In het kader van kinderopvang kunnen gezinnen bij organisatoren die de subsidie voor inkomenstarief ontvangen van het agentschap Opgroeien regie voor de opvang een prijs betalen op basis van hun inkomen. De regelgeving voorziet de mogelijkheid voor gezinnen die zich in bepaalde specifieke situatie bevinden om een individueel verminderd tarief aan te vragen. Naar aanleiding van de COVID-19- pandemie werden heel wat gezinnen geconfronteerd met een inkomensdaling. Om voor die gezinnen de financiële drempel om hun kind naar de opvang te laten gaan, te verlagen, is beslist om een bijkomend specifiek COVID-tarief te voorzien. Om in aanmerking te komen, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin bedraagt minder dan 44.493,57 euro - bruto maandinkomen van het gezin van de maand voor de aanvraag van het COVID-tarief is 10% lager dan 1/12 van het gezamenlijk belastbaar inkomen <p>In dat geval ontvangt een ouder een korting van 25% op zijn berekend inkomenstarief, met een minimum van het standaard minimumtarief.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	975.000 EUR
Output	Bij de bepaling van het benodigde budget voor deze maatregel hebben we ons gebaseerd op het aantal attesten die er zijn tussen de inkomensgrenzen. Om de maximale mogelijke financiële impact hebben we ons gericht op de attesten inkomenstarieven met de hoogste tarieven met de inschatting dat 1 op 3 ouders binnen de aangehaalde financiële grenzen vallen en effectief een covid-tarief zouden kunnen aanvragen. Dit gaat over circa 14.600 attesten inkomenstarief.
Outcome	kinderen die voorheen omwille van de coronacrisis niet meer naar de kinderopvang kwamen, worden terug opgevangen in de kinderopvang kinderen die voorheen omwille van de coronacrisis minder naar de kinderopvang kwamen, worden terug opgevangen in de kinderopvang volgens het initiële opvangplan

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	<p>Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slechts beperkt werd gebruikt (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.</p> <p>Voor de toekenning van bijkomend 10 miljoen euro aan strategische forfaits (bovenop de 20 mio euro die bij regeerakkoord was voorzien) is een bijkomende machtiging ingeschreven bij BO 2021 in artikel 75 van het uitgavendecreet.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Voor de komende periode wordt er een evaluatie voorzien en wordt er nagegaan of een verlenging van de maatregel aangewezen is.	2021 Q2	Gerealiseerd		
Voor de komende periode wordt er een evaluatie voorzien & wordt er nagegaan of een verlenging en/of bijsturing van de maatregel aangewezen is om dezelfde doelstellingen te realiseren en/of hetzelfde doelpubliek te bereiken.	2021 Q3	Gerealiseerd		
Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slechts beperkt werd gebruikt (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.	2021 Q4	Gerealiseerd		
Uit de evaluatie bleek dat de initiële maatregel slechts beperkt werd gebruikt (6%). Het saldo werd ingezet in het bredere kader van de Corona-compensaties voor de kinderopvang.	2022 Q1	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal aangevraagde attesten inkomenstarief met covid-tarief In het kader van kinderopvang	14.600	2021 Q4	1.015	6 %
Diverse maatregelen compensatie Corona – initiatieven kinderopvang	860.840 EUR	2021 Q4	860.840	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	975.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	975.000 EUR
Uitvoering VAK	975.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	975.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 975.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV147 - DOORGAANDE LIJN KINDEROPVANG – ONDERWIJS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Basisgedachte van dit project is de doorgaande lijn in de ontwikkeling van baby's en peuters tot het einde van de kleutertijd, van nul tot zes jaar, tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kinderopvang, in verbinding met thuis en met de buurt en over beleidsdomeinen heen.</p> <p>Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Kinderen en alle betrokkenen hebben baat bij zoveel mogelijk continuïteit. Zowel kind als ouder voelen zich veilig en gekend, omdat ze omringd worden door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving</p> <p>Vanaf het schooljaar 2021-2022 bieden we ruimte aan initiatiefnemers en pioniers die zich in de willen inzetten op een doorgaande lijn van kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en buitenschoolse kinderopvang. Daarbij bekijken we hoe verbinding kan worden gemaakt met thuis en de buurt, o.a. de Huizen van het Kind. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de taalontwikkeling en de verwerving van de Nederlandse taal.</p> <p>Daarvoor zetten we een projectoproep op voor 12 pioniers, ondersteund door externe projectbegeleiding en opgevolgd door een begeleidingscomité, samengesteld uit diverse stakeholders uit beleid, praktijk en onderzoek. De expertise die de pioniers opbouwen wordt gedeeld in het lerend netwerk en moet toelaten om goede praktijken in kaart te brengen, (verder) te ontwikkelen en te dissemineren, om noodzakelijke voorwaarden aan te pakken en om, op basis van een grondige evaluatie, te komen tot beleidsaanbevelingen met het oog op reguliere verankering.</p> <p>Dit project sluit aan bij de aanbeveling van het Maatschappelijk Relancecomité om proeftuinen op te zetten rond geïntegreerde projecten kinderopvang/(kleuter)onderwijs waarbij ook buitenschoolse activiteiten worden betrokken.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.800.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - 12 pioniers (samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal 3 kernpartners met name organisator kinderopvang, kleuterschool en buitenschoolse opvang en activiteiten) ontvangen 45.000€/jaar subsidies om gedurende drie jaar (jan 2022 - dec 2024) te groeien naar een meer geïntegreerde werking - 12 pioniers realiseren de doelstellingen van het individuele project en komen samen (binnen lerend netwerk) tot een gedeeld praktijkmodel - een ondersteuningstraject is opgezet (o.a. individuele ondersteuning van de pioniers en opzet van een

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	lerend netwerk) - een stuurgroep (samengesteld uit diverse relevante partners uit praktijk, onderzoek en beleid) is samengesteld en volgt de voortgang van het project
Outcome	Ontwikkeling van een concept en praktijkmodel(len) voor het verwezenlijken van een doorgaande lijn tussen kinderopvang, kleuteronderwijs en kleuteropvang. Het gaat hier om een pedagogisch concept waarin leren, zorg, opvoeding en spelen met elkaar zijn verbonden, in samenwerking met alle betrokken partners in het lokaal samenwerkingsverband en met een diverse groep van ouders met kinderen.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De leer-en kennispartner (CEGO en VBJK) is met de kernpartners van elke pionier in dialoog gegaan over het verdiepen en verfijnen van het ingediende ondernemingsplan. In het lerend netwerk van oktober en december stonden inspiratie en uitwisseling m.b.t. oudersamenwerking, gemengde groepen, randvoorwaarden, professionele leergemeenschap creëren,... centraal. De pioniers voeren hun plannen uit.</p> <p>De kerngroep, het lerend netwerk en de stuurgroep zetten de nodige stappen in de voorbereiding van de opstart wenselijke/noodzakelijke regelluwte. In opvolging van de inventarisatie van knelpunten en drempels, ging de stuurgroep aan de slag en maakte een adviesnota met een duidelijk en gestructureerd overzicht van drempels en voorstellen regelluwte. Deze nota is doorgesproken met de respectievelijke kabinetten in december en wordt verder opgevolgd.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Het advies m.b.t. het creëren van een regelluw kader voor een 2e experimenteerfase wordt (door de kabinetten) besproken met de ministers van onderwijs en welzijn. Na bespreking kan het legistische proces opstarten.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang	2021 Q1	Gerealiseerd	
Uitwerking, lancering, jurering Bestek 'leerpartner' voor het begeleiden van het ondersteuningstraject (ondersteuning 12 pioniers binnen een lerend netwerk).	2021 Q2	Gerealiseerd	
Toekenning opdracht leerpartner.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Lancering Oproep Pioniers Doorgaande Lijn	2021 Q3	Gerealiseerd	
Jurering en toekenning 12 projecten	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Opstart 1e fase van het traject (jan 2022 - aug 2023)	2022 Q1	Gerealiseerd		
Stuurgroep samenstellen, opdracht en mandaat verduidelijken en procesmatige aanpak en planning goedkeuren.	2021 Q4	Gerealiseerd		
Uitvoeren van een verdiepende analyse met o.a. eerste inventarisatie van drempels en knelpunten (in functie van opstarten proces regelluwte) en het bijsturen van het ondernemingsplan (door de pioniers).	2022 Q3	Op schema		
Opstart experimenteren en implementeren van een vernieuwde geïntegreerde werking binnen huidige regelgevende kader (pioniers).	2022 Q3	Op schema		
Co-creëren van een gedeeld inhoudelijk kader voor de pilootprojecten (lerend netwerk)	2022 Q4	Op schema		
Uitwerken en uitvoeren zelfevaluatie en (financiële) rapportering 1e projectjaar (pioniers)	2023 Q1	Op schema		
Vorm geven aan regelluw kader voor de 2e fase (project- en stuurgroep i.s.m. de betrokken kabinetten - periode juni 2022 - juni 2023).	2023 Q2	Op schema		
Opstart experimenteren en implementeren van een vernieuwde geïntegreerde werking binnen het ontwikkelde regelluw kader (pioniers)	2023 Q3	Nog niet gestart		
Uitvoeren zelfevaluatie en (financiële) rapportering 2 projectjaar (pioniers)	2024 Q1	Nog niet gestart		
Beschrijven van de ontwikkeling praktijk en documenteren van praktijkmodellen; formuleren van beleidsaanbevelingen (lerend netwerk, project- en stuurgroep)	2024 Q4	Nog niet gestart		
Uitvoeren van de eindevaluatie en (financiële) eindrapportage project (pioniers)	2025 Q1	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Tussentijdse evaluatie van de 12 pioniers: 12 uitgewerkte ondernemingsplannen met concrete doelstellingen en aanpak en met voorstellen tot afwijking van de bestaande sectorale regelgeving		2022 Q3		
Eindrapport met o.a. de ontwikkeling van een praktijkmodel Doorgaande Lijn, geïllustreerd vanuit de 12 pioniers en met concrete beleidsaanbevelingen.		2024 Q4		
12 gerealiseerde projecten Doorgaande Lijn		2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.800.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.800.000 EUR
Uitvoering VAK	1.800.000 EUR
Uitvoering VEK	641.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.800.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang</p> <p>Advies van de Raad van State. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang. Bijlage</p>

VV148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Herw!n vzw, sociale distributieplatformen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De COVID-19 crisis heeft het belang van voedselbedeling voor een belangrijke kwetsbare doelgroep van mensen in armoede bevestigd. Op dit ogenblik zijn in Vlaanderen een aantal sociale distributieplatformen actief die een cruciale rol opnemen in de verdeling van voedsel(overschotten) naar organisaties die het voedsel lokaal bezorgen aan mensen in armoede die hier nood aan hebben. Vaak zetten deze platformen ook doelgroepmedewerkers in voor de uitvoering van hun activiteiten.</p> <p>Vlaanderen subsidieert momenteel op projectmatige basis enkele van deze distributieplatformen. Deze subsidies lopen af midden 2021. Gelet op het bewezen nut van deze platformen, zal werk gemaakt worden van een structurele verankering van dergelijke distributieplatformen.</p> <p>In afwachting van dit structureel kader, dat er ten vroegste in 2024 zal zijn, is het belangrijk de huidige distributieplatformen te blijven ondersteunen.</p> <p>Het project betreft daarom concreet in eerste instantie het uitwerken van een financieringskader voor de periode 2021-2025 waarbij er zowel oog is voor de leefbaarheid van de huidige platformen als voor het vergroten van het werkingsgebied waarbinnen de platformen actief zijn, dit door uitbreiding van hun bestaande werkingsgebieden of waar nodig het opzetten van nieuwe platformen. Want het aanbod is op dit ogenblik niet Vlaanderen-dekkend.</p> <p>In tweede instantie betreft dit project dan de effectieve financiering van de sociale distributieplatformen, conform het uitgewerkt financieringskader, dit met het oog op een duurzame verderzetting van deze platformen na 2025. Naast 2.400.000 euro Vlaamse relancemiddelen, wordt ook 400.000 euro reguliere middelen ingezet voor dit project.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	2.400.000 EUR
Output	In elke referentieregio in het Vlaamse Gewest wordt een distributieplatform gesubsidieerd.
Outcome	<p>Elke organisatie in het Vlaamse Gewest die voedsel bedielt aan mensen in armoede, kan een beroep doen op een sociaal distributieplatform. Er zal dus een stijging zijn van het aantal organisaties dat een beroep doet op een sociaal distributieplatform.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daling in ton van voedselverspilling

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	<ul style="list-style-type: none"> • Stijging in ton van voedseloverschotten dat terecht komt bij mensen in armoede • Stijging van het aantal doelgroepmedewerkers actief in de sectoren actief in de herbestemming van voedseloverschotten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Het financieringskader is uitgewerkt en neergeschreven in een projectoproep die op 27 juli 2021 is gelanceerd. Initiatiefnemers konden intekenen op de projectoproep uiterlijk op 30 september 2021. Er werden 14 projectaanvragen ingediend. Toekenning van een subsidie aan 12 projecten i.k.v. projectoproep 'sociale distributieplatformen naar voedselhubs 2021 werd op de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17/12/2021.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Het financieringskader voor sociale distributieplatformen voor de periode 2021-2025 is uitgetekend.	2021 Q3	Gerealiseerd		
Projectmatige subsidiëring van sociale distributieplatformen is toegekend.	2021 Q4	Gerealiseerd		
De projecten zijn uitgevoerd.	2025 Q4	Op schema	De projecten zijn opgestart eind 2021 en lopen t.e.m. 30/11/2025.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal sociale distributieplatformen (streefwaarde is maximum)	15	2021 Q4	12	80 %
Aantal referentieregio's (er zijn 17 referentieregio's) betrokken in goedgekeurde projecten	17	2021 Q4	15	80 %
Aantal gemeenten die beroep kunnen doen op de diensten van een sociaal distributieplatform	300	2025 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	2.400.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	2.400.000 EUR
Uitvoering VAK	2.400.000 EUR

PROJECTFINANCIERING	
Uitvoering VEK	650.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 2.400.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 400.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidiëring sociale distributieplatformen voedseloverschotten. 16/07/2021</p> <p>Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie sociale distributieplatformen voedseloverschotten 2021. 17/12/2021</p> <p>VR 18 maart 2022 - Investeringssubsidie vzw Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg</p> <p>VR 25 november 2022 - Wijziging subsidiebesluit sociale distributieplatformen voedseloverschotten</p>

VV149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Samenwerkingsverbanden GBO bestaande uit OCMW, CAW en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Het project past in de implementatie van een nieuw beleid en nieuwe regelgeving gericht op 1) drempelverlaging van de Vlaamse hulp- en dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen en 2) bestrijding van onderbescherming bij kwetsbare doelgroepen door proactieve rechtendetectie en -realisatie. Dit nieuw beleid wordt in de praktijk onder meer vorm gegeven door de oprichting van samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), bestaande uit OCMW's, het centrum algemeen welzijnswerk actief in het werkingsgebied en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Vanaf 2020 wordt de opstart en uitbouw van een beperkt aantal samenwerkingsverbanden GBO financieel ondersteund. Er is ook een divers ondersteuningsaanbod ontwikkeld.</p> <p>Met het project wordt de uitrol van het Geïntegreerd Breed Onthaal in Vlaanderen gerealiseerd. Dit behelst concreet de financiële ondersteuning van de samenwerkingsverbanden GBO waar dit nu nog niet het geval is, zodat uiterlijk eind 2022 overal in Vlaanderen samenwerkingsverbanden GBO kunnen worden opgestart en eind 2025 overal in Vlaanderen deze samenwerkingsverbanden operationeel zijn. Voor de berekening van de hoogte van de toe te kennen subsidies, wordt gebruik gemaakt van het kader opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.</p> <p>Binnen dit project zal het ontwikkelde ondersteuningsaanbod opgeschaald worden, zodat dit aanbod ook beschikbaar en bereikbaar is voor de nieuwe samenwerkingsverbanden GBO.</p> <p>Tenslotte zal binnen dit project de nodige aandacht gaan naar de uitwerking van regelgeving op het vlak van gegevensdeling naar en binnen GBO-samenwerkingsverbanden, rekening houdend met de doelstellingen van de samenwerkingsverbanden en de geldende regels inzake beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	7.500.000 EUR
Output	Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gesubsidieerd wordt. Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gebruikt maakt van het ondersteuningsaanbod.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	(1) Snellere detectie van psychosociale noden en toeleiding naar de gepaste hulp (2) Snellere detectie van onderbescherming, en realiseren van rechten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Subsidie is toegekend aan 60 samenwerkingsverbanden GBO voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteit “het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal”, en dit in verschillende fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase 0 (via projectsubsidies Vlaamse beleidsprioriteiten, en dus niet via relancemiddelen, vanaf begin 2020): 27 samenwerkingsverbanden GBO; - Fase 1 (projecten die bij de oorspronkelijke oproep een project indienden dat een score kreeg van minstens 60% maar niet geselecteerd werden voor een subsidie): 16 - Fase 2 (projecten die bij de oorspronkelijke oproep een project indienden dat een score kreeg van minder dan 60% en dus niet beantwoordden aan de subsidiecriteria): 11 - Fase 3 (projecten die bij de oorspronkelijke oproep geen project indienden): 6 , <p>Via de relancemiddelen (fase 1, 2 en 3) worden bijgevolg 33 samenwerkingsverbanden GBO gesubsidieerd, en dit tot en met eind 2025.</p> <p>Daarnaast werd een subsidie toegekend aan SAM vzw en VVSG voor de ondersteuning van de samenwerkingsverbanden GBO en aan VGC voor het project “Geïntegreerd Breed Onthaal Brussel 2021-2025: Welzijn op school”</p> <p>Het SWVG is op 1/07/2021 gestart met een onderzoek, opdat een juridisch conform regelgevend kader om gegevensverwerking binnen een GBO-context te organiseren kan gecreëerd worden. De uitvoeringstermijn voor dit onderzoek betreft 01/07/2021 tot en met 31/12/2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
De subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO begin 2020 en die als voldoende beoordeeld zijn door de jury, zijn toegekend.	2021 Q3	Gerealiseerd	
De subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een aanvullende aanvraag hebben ingediend in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO, zijn toegekend.	2022 Q1	Gerealiseerd	
De subsidies aan de samenwerkingsverbanden die een nieuwe aanvraag hebben ingediend in	2022 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO begin 2020, zijn toegekend.				
Het ondersteuningsaanbod is opgeschaald en beschikbaar en bereikbaar gemaakt.	2022 Q4	Gerealiseerd		
Het wetenschappelijk onderbouwd advies omtrent (vernieuwd) regelgevend kader gegevensdeling naar en binnen samenwerkingsverbanden GBO is uitgewerkt.	2022 Q4	Gerealiseerd	Het onderzoeksrapport, uitgevoerd door het Steunpunt WVG, werd afgerond binnen de voorziene termijn (uitvoeringstermijn onderzoek 1/07/2021 tot en met 31/12/2022). De procedure voor vrijgave onderzoek is lopende.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
34 nieuwe samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) (zodat uiterlijk eind 2022 overal in Vlaanderen samenwerkingsverbanden GBO worden opgestart en eind 2025 overal in Vlaanderen deze samenwerkingsverbanden operationeel zijn)	34	2022 Q1	33	97 %
Beschikken over een wetenschappelijk onderbouwd advies omtrent (vernieuwd) regelgevend kader m.b.t. gegevensdeling binnen GBO	1	2022 Q4	1	100 %
Een breed ingezet ondersteuningsaanbod voor GBO	60	2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	7.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	7.500.000 EUR
Uitvoering VAK	7.472.000 EUR
Uitvoering VEK	2.661.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 7.500.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidiëring en ondersteuning van de lokale besturen in functie van het realiseren van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal in heel Vlaanderen en Brussel. 16/07/2021](#)

[Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidies in het kader van het geïntegreerd breed onthaal. 22/04/2022](#)

VV150 - WIJKVERBETERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	300 steden en gemeenten

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Een wijkverbeteringscontract is een engagementsverklaring waarbij de Vlaamse overheid en het lokale bestuur (met lokale partners) de gemeenschappelijke uitdaging aangaan om problematieken in kwetsbare wijken aan te pakken en deze engagementen vervolgens om te zetten in concrete acties. Er wordt in 2021 een oproep gelanceerd die de lokale besturen uitnodigt tot het indienen van voorstellen.</p> <p>Zowel de betrokken lokale besturen als de Vlaamse entiteiten en agentschappen engageren zich om de problematieken in deze wijken te doorbreken en de aanwezige kansen te benutten dankzij een gezamenlijke aanpak met vernieuwende instrumenten.</p> <p>Met de subsidie kan het lokale bestuur zich laten ondersteunen met de inzet van expertise, personeel, werking en beperkte investeringen met het oog op concrete realisaties en dit binnen een termijn van maximaal 4 jaar na de start van het wijkverbeteringscontract.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	4.000.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none">- De engagementen zoals geformuleerd in de besluiten van de Vlaamse Regering worden geconcretiseerd aan de hand van een aantal maatregelen en dit op maat van de betrokken wijk.- De concrete maatregelen worden duidelijk afgebakend en maken deel uit van een geïntegreerde aanpak van de kwetsbare wijk.- Inzet van vernieuwende elementen binnen samenwerkingen, publieke dienstverlening, inzet van technologie, coproductie, ...- Voor elk wijkverbeteringscontract wordt een governance ontplooid die de uitvoering bewaakt en aanstuurt, met o.a. een klankbordgroep en een stuurgroep
Outcome	<ul style="list-style-type: none">- Gaandeweg de doorlooptijd van het wijkverbeteringscontract worden de noodzakelijke acties om de kwetsbaarheid van de betrokken wijken te verbeteren steeds duidelijker en concreter- De (eerste) acties leveren concrete en aantoonbare resultaten op zowel ten aanzien van de wijk als haar kwetsbare bewoners.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	- Nauwe opvolging van de projecten aan de hand van jaarlijkse voortgangsrapportages en een evaluatierapport op het einde van de rit

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De 11 wijkverbeteringscontracten zijn allen in uitvoering. 2022 stond in het teken van de opstart waarbij in het eerste half jaar vooral aandacht ging naar het aanwerven van personeel en de start van de projecten op het terrein. Ondertussen zijn de lokale stuurgroepen eveneens opgestart en worden de projecten langs deze weg opgevolgd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
De Vlaamse Regering keurt het kader voor de oproep goed.	2021 Q1	Gerealiseerd		
Jury: selectie van een beperkt aantal wijkverbeteringscontracten	2021 Q3	Gerealiseerd		
Goedkeuring door de Vlaamse Regering van de geselecteerde wijkverbeteringscontracten	2021 Q4	Gerealiseerd		
Tweejaarlijks vooruitgangsrapport betreffende de uitvoering van de wijkverbeteringscontracten van de bevoegde minister aan de Vlaamse Regering		Nog niet gestart		
Jaarlijkse vooruitgangsrapport door de stuurgroep van elk wijkverbeteringscontract		Gerealiseerd	De eerste voortgangsrapportages van de 11 wijkverbeteringscontracten voor het jaar 2022 werden in de loop van november 2022 ingediend.	
Lancering van de oproep naar wijkverbeteringscontracten		Gerealiseerd		
Evaluatierapporten na het verstrijken van de wijkverbeteringscontracten		Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal subsidieaanvragen	20	2021 Q3	20	100 %
Start van de 11 wijkverbeteringscontracten	11	2022 Q1	11	100 %

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Stuurgroepen van de wijkverbeteringscontracten	minstens halfjaarlijks	2022 Q2	11	100 %
jaarlijks voortgangsrapport van de stuurgroep	jaarlijks	2022 Q4	11	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.999.000 EUR
Uitvoering VEK	1.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 4.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 26 februari 2021 - Goedkeuring kader oproep Goedkeuring Vlaamse Regering op 17/12/2021 subsidiëring projecten oproep wijkverbeteringscontracten

VV151 - WIJKVERBETERINGSCONTRACTEN - INTEGRALE KETENAANPAK WELZIJN-JUSTITIE-LOKALE BESTUREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Agentschap Opgroeien
Betrokken entiteit(en) VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Belanghebbenden	Opgroeien, lokale besturen, lokale actoren breed: politie, justitie, jeugd(welzijns-)werk, buurtwerk, hulpverlening.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Buurtgerichte relanceprojecten op kruispunt lokale besturen – welzijn – justitie Projectsubsidie</p> <ul style="list-style-type: none"> · Voorkomen dat jongeren, jongvolwassenen met een risicoprofiel verglijden naar of hervallen in een criminele levensstijl ('veelplegers') en ingesloten geraken in criminele netwerken. · Bundelen van beschikbare capaciteit in een efficiënt, gestructureerd samenwerkingsverband om systematische, individuele exit-strategieën te bepalen. · Onveiligheid, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in de buurt verminderen <p>We bundelen de krachten voor een integrale ketenaanpak. Het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht biedt bijkomende mogelijkheden om snel en constructief te reageren op jeugddelinquentie, ook op het niveau van het openbaar ministerie. In het Vlaams Regeerakkoord schuiven we de lokale, buurtgerichte aanpak justitie-politie-welzijn sterk naar voren voor een geïntegreerd beleid naar jongeren. In het kader van relance – plan Veerkracht en Herstel geven we lokale initiatieven een bijkomende impuls om te innoveren en goede praktijken van integrale ketenaanpak een doorstart te geven. Hieronder worden de contouren beschreven voor een oproep aan de lokale besturen en partners justitie-politie-welzijn.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.125.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - aantal opgestarte projecten in Vlaanderen; - bereik van doelgroep: aantal jongeren conform doelgroepomschrijving bereikt in de projecten; - aantal bereikte situaties jeugddelict binnen de verschillende projecten - output in termen van aantallen vast te leggen (Q 1 2022) - aantal lokale partners: met volledige dekking van de minimale partners; - outputindicatoren nader te definiëren in overleg met de projecten;
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - voortgang op basis van doelstellingen: de mate van opleiding/werk, woon- en leefsituatie, politiecontacten, overgang van min- meerderjarigheid; - outcome-indicatoren verfijnen met de 5 projecten (Q 1 2022);

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Mededeling Vlaamse Regering integrale ketenaanpak jongeren op snijvlak welzijn-justitie en lokale besturen naar jongeren en jongvolwassen in samenwerking met Binnenlands Bestuur en Justitie en Handhaving	2021 Q1	Gerealiseerd		
Projectoproep lanceren	2021 Q2	Gerealiseerd		
Opstart en subsidiebesluit van de 5 geselecteerde projecten: Antwerpen, Genk, Gent, Kortrijk, Mechelen	2021 Q3	Gerealiseerd		
Besluitvorming en selectie van vijf projecten	2021 Q3	Gerealiseerd		
Opstart inhoudelijke afstemming van de 5 geselecteerde Vlaamse projecten	2021 Q4	Gerealiseerd		
Werkafspraken en kalender in functie van opvolging van projecten	2022 Q1	Op schema		
Organisatie Vlaamse Stuurgroep Projecten Lokale Ketenaanpak Jeugdgedelinquentie in het kader van opvolging en kennisdeling	2023 Q1	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal opgestarte projecten	5	2021 Q3	5	100 %
Aantal jongeren (doelgroep jongvolwassenen) bereikt in de 5 projecten		2022 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.125.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.125.000 EUR
Uitvoering VAK	1.125.000 EUR
Uitvoering VEK	443.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 1.125.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling VR 12 maart 2021](#)

VV152 - PROJECTOPROEP KWETSBARE KINDEREN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Kinderen en jongeren, (boven)lokale jeugdwerkinitiatieven, (boven)lokale sport-, cultuur- en welzijnsinitiatieven, lokale besturen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	30. Armoedebestrijding en wijkverbetering
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” zet in op het versterken van het mentaal welbevinden en de sociale cohesie in de samenleving. Eén van projecten binnen het deelluik “Armoedebestrijding en wijkverbetering” richt zich tot kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.</p> <p>De doelstelling van deze projectoproep is de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te versterken door samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen ruimte en zuurstof biedt om binnen een gevarieerde, zinvolle, creatieve vrijetijdsbeleving jong te zijn. Dit perspectief draagt ertoe bij dat elke kind en elke jongere zijn of haar plaats vindt in de vrije tijd waardoor de sociale cohesie met hun leeftijdsgenoten, buurt en de maatschappij wordt aangehaald en/of versterkt.</p> <p>De focus ligt op het stimuleren van innovatieve vormen van laagdrempelig en vindplaatsgericht werken, waaronder vernieuwende technieken van fysiek en digitaal outreachend werken en out-of-the-box activiteiten, binnen (boven)lokale netwerken die kinderen en jongeren in kwetsbare situaties bereiken en aanspreken.</p> <p>Naast de resultaten van de projecten zelf worden de gehanteerde methodieken gemonitord en geanalyseerd, met het oog op een duurzame bredere aanpak, opschaling en bredere uitrol in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijken, randvoorwaarden oplossingsstrategieën en werkzame methodieken die innovatief, toeleidend en effectief werkzaam zijn, worden inhoudelijk en methodologisch in kaart gebracht en opgevolgd, zowel op niveau van de netwerken zelf als voor Vlaanderen en Brussel.</p> <p>De projectoproep biedt hefboomen aan lokale en bovenlokale netwerken om hun werking inhoudelijk te verdiepen, te innoveren of hun werkingen geografisch of functioneel te verbreden en/of uit te bouwen.</p> <p>De minister heeft beslist om naast de relancemiddelen (3 miljoen euro) ook 801.794 euro reguliere middelen (2021) vrij te maken om deze projectoproep te ondersteunen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.000.000 EUR
Output	Financiering van 29 projecten ter versterking van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
Outcome	Sterkere lokale en bovenlokale netwerken van organisaties en lokale besturen die de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties versterken door samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen ruimte en zuurstof biedt om binnen een gevarieerde, zinvolle, creatieve vrijetijdsbeleving jong te zijn

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De 29 projecten worden momenteel uitgevoerd. Er gingen al twee intervisiedagen door waarop de projectmedewerkers hun ervaringen kunnen uitwisselen. Deze intervisiedagen worden begeleid door UCLL.
Noodzakelijke politieke actie	geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring projectoproep door Vlaamse Regering	2021 Q1	Gerealiseerd	
Lancering van de projectoproep	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beoordeling projectvoorstellen	2021 Q2	Gerealiseerd	
Beslissing goedkeuring projecten	2021 Q3	Gerealiseerd	
Opstart projecten door lokale en bovenlokale netwerken	2021 Q4	Gerealiseerd	
Start intervisietraject	2021 Q4	Gerealiseerd	De onderzoeks- en begeleidingsopdracht werd toegekend aan het experisecentrum "Inclusive Society" van het UCLL
Projecten uitgevoerd	2023 Q3	Op schema	
Einde intervisietraject	2023 Q4	Op schema	Begeleiding van de geselecteerde projecten en het in kaart brengen van de effecten van de projecten voor de kinderen en jongeren, de betrokken organisaties en het beleid (lokaal en Vlaams).

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal gerealiseerde projecten in het kader van projectoproep kwetsbare kinderen	25	2021 Q4	29	116 %
Aantal gerealiseerde projecten per provincie en BHG in het kader van projectoproep kwetsbare kinderen	3	2021 Q4	4	133 %
Aantal gerealiseerde projecten	25	2022 Q2	29	116 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.000.000 EUR
Uitvoering VEK	2.001.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 3.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling VR 26 februari 2021

31. Investerings audiovisuele sector

VV153 - GARANTIEFONDS VOOR DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle - Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Een belangrijke voorwaarde voor de heropstart van de audiovisuele sector in Vlaanderen is dat er een oplossing komt voor het verzekeren van audiovisuele producties. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het voor producenten immers onmogelijk geworden om schade en annuleringskosten als gevolg van pandemieën te verzekeren. Het risico bestaat dat een productie moet worden stopgezet door besmetting van onvervangbare cast- of crewleden of door overheidsmaatregelen tijdens een besmettingsgolf. Dat kan leiden tot onvoorziene kosten, die nu door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Om onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen te dekken, wordt een garantiefonds gelanceerd voor Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties. Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds.</p> <p>De werking van het Garantiefonds werd op 31 oktober 2022 finaal afgesloten.</p> <p>Vanuit de bevoegdheid Media werd van het resterend budget 4.150.000 euro overgeheveld naar VV156 (Jeugdinfrastructuur) om de meerkosten van de infrastructuurprojecten Hoge Rielen en Destelheide op te vangen. Daarnaast werd er ook 625.000 euro overgeheveld naar VV157 (Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel) om de meerkosten in het DKO-investeringsplan van de VG en VGC op te vangen. Vanuit de bevoegdheid Cultuur werd van het resterend budget 1.900.000 euro herbestemd voor de financiering van de vijfjarige verlenging van de beheersovereenkomst met Hefboom, meer specifiek voor de financiering van de kost voor het co-financieringsfonds. Deze kost is ESR-neutraal.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	5.225.000 EUR
Output	Minstens 200 geregistreerde Vlaamse film- of televisieproducties bij het garantiefonds
Outcome	Het aantal Vlaamse film- en televisieproducties dat dankzij het garantiefonds kan opstarten doordat ze gedekt zijn tegen onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Het aantal producties dat

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	schade ondervonden heeft als gevolg van de COVID-19-maatregelen en waarvoor schadeclaims zijn uitbetaald.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse Regering heeft op 5 februari 2021 haar goedkeuring gegeven aan de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds met betrekking tot het garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector. Sinds 9 februari kunnen producenten hun producties registreren bij het VAF, zodat ze in geval van schade door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Tot nu toe werd er met het garantiefonds één schadevergoeding effectief uitbetaald en werden er eind mei 2022 nog twee schadedossiers goedgekeurd, waarvan de schadevergoeding nog moet uitbetaald worden.</p> <p>Gezien de federale beslissing tot overstap naar epidemiologische code geel, werd in samenspraak tussen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging binnen PC227 en PC303.1 beslist om de Covid Sectorgids (PC227) en het Filmprotocol (303.1) vanaf 7 april 2022 op te heffen. Deze specifieke gidsen zijn dus niet langer van kracht. Recent werd ook de Generieke Gids afgeschaft. Bijgevolg is - onder de huidige epidemiologische omstandigheden - art. 7§2 van het Reglement van het Garantiefonds niet langer van kracht.</p> <p>De werking van het Garantiefonds werd op 31 oktober 2022 finaal afgesloten. Over de hele looptijd van het Garantiefonds werden er 163 dossiers aangemeld, waarvan 8 dossiers (2 Cultuur en 6 Media) om diverse redenen niet werden geregistreerd (te laag budget, vormelijk niet aanvaardbaar of teruggetrokken door producent). De overige 155 dossiers (38 Cultuur en 117 Media), die effectief werden geregistreerd, vertegenwoordigden een totale Belgische productiekost van 131.838.274,86 euro. In totaal werden er 6 schadeclaims toegekend (1 Cultuur en 5 Media) verspreid over 4 producties voor een totaal bedrag van 279.889,45 euro., waarvan 201.283 euro binnen Cultuur en 78.606,45 euro binnen Media.</p> <p>Vanuit de bevoegdheid Media werd van het resterend budget 4.150.000 euro overgeheveld naar VV156 (Jeugdinfrastructuur) om de meerkost van de infrastructuurprojecten Hoge Rielen en Destelheide op te vangen. Daarnaast werd er ook 625.000 euro overgeheveld naar VV157 (Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel) om de meerkost in het DKO-investeringsplan van de VG en VGC op te vangen.</p> <p>Vanuit de bevoegdheid Cultuur werd van het resterend budget 1.900.000 euro herbestemd voor de financiering van de vijfjarige verlenging van de beheersovereenkomst met Hefboom, meer specifiek voor de financiering van de kost voor het co-financieringsfonds. Deze kost is ESR-neutraal. Het addendum aan de oorspronkelijke opdracht met verlening van de beheersovereenkomst aan Hefboom is goedgekeurd door de VR op 9/12/2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Oprichting garantiefonds via een overeenkomst met het Vlaams Audiovisueel Fonds	2021 Q1	Gerealiseerd	
Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties worden ondersteund door het garantiefonds bij onvoorziene kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Verlenging opdracht Hefboom voor nieuwe beheersperiode	2023 Q1	Gerealiseerd	

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal geregistreerde Vlaamse film- of televisieproducties bij het garantiefonds	200	2022 Q4	163	81,5 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	5.225.000 EUR
Uitvoering VAK	2.394.000 EUR
Uitvoering VEK	494.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 5.225.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV156 - Jeugdinfrastructuur](#)
[VV157 - Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel](#)

VV154 - IMPULS AAN VAF FILMFONDS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Vlaams Audiovisueel Fonds; audiovisuele sector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Via een financiële impuls aan het VAF Filmfonds wordt de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse films en de vertoning ervan gestimuleerd om ze te versterken. Tijdens de COVID-19-crisis is immers gebleken dat er in de audiovisuele sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale filmproducties. Ook de bioscoopdistributie- en exploitatiesector ondergaan rechtstreeks de korte en lange termijngevolgen van de COVID-19-maatregelen. De extra middelen voor het VAF Filmfonds worden via een 40%-60% ratio verdeeld over respectievelijk 2021 en 2022.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 70 filmproducties en initiatieven binnen de publiekswerking worden door het VAF ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.
Outcome	Versterking van de Vlaamse audiovisuele sector

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse Regering heeft op 2/04/2021 haar goedkeuring gegeven aan het addendum bij de beheersovereenkomst 2018-2021 van het VAF - Filmfonds.</p> <p>Een nieuwe beheersovereenkomst m.b.t. het VAF/Filmfonds voor de periode 2022-2025 werd op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hierin werden specifieke bepalingen opgenomen betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance.</p> <p>De relancemiddelen werden succesvol ingezet voor steun aan creatie, talentontwikkeling en publiekswerking. Inzake creatie werden de middelen aangewend voor het toekennen van zowel</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	hogere premies als extra premies aan filmproducties. Inzake publiekswerking werden de middelen aangewend voor het opzetten van specifieke maatregelen (Digitale Transformatiepremie, Toelage Filmwijze Initiatieven, Zuurstofpremie Bioscopen, Zuurstofpremie Filmorganisaties, Toelage Open Cinema). Inzake talentontwikkeling werd er slechts 70.000 euro aangewend van de voorziene 100.000 euro. In totaal is er dus een overschot van 30.000 euro, wat het totaal aangewende relancebudget op 9.970.000 euro brengt voor de volledige periode 2021-2022. Begin 2023 bekijkt het VAF waar de resterende middelen voor aangewend worden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Addendum aan de beheersovereenkomst 2018-2021 voor de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2021 i.h.k.v. de relance aan het VAF/Filmfonds.	2021 Q2	Gerealiseerd		
Opname van bepaling betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance aan het VAF/Filmfonds in de nieuwe beheersovereenkomst 2022-2025.	2021 Q4	Gerealiseerd		
Alle relancemiddelen worden via het VAF/Filmfonds toegekend aan filmproducties en initiatieven binnen de publiekswerking.	2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal filmproducties en -organisaties die door het VAF worden ondersteund met de bijkomende relancemiddelen	70	2022 Q4	81	116 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	9.970.000 EUR
Uitvoering VEK	9.970.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV155 - IMPULS AAN VAF MEDIAFONDS EN GAMEFONDS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaams Audiovisueel Fonds en de Vlaamse audiovisuele en gamesector

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	31. Investerings audiovisuele sector
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Via een financiële impuls aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds wordt de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse televisiereeksen en games gestimuleerd om ze te versterken. Tijdens de COVID-19 crisis is immers gebleken dat er in de sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale audiovisuele producties en games.</p> <p>De extra middelen voor het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds zullen via een 40/60 ratio verdeeld worden over respectievelijk 2021 en 2022, om zo met een groter budget te kunnen aansluiten bij de nieuwe beheersovereenkomsten 2022-2025.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	Minstens 25 audiovisuele producties (televisiereeksen en games) worden door het VAF ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.
Outcome	Versterking van de Vlaamse audiovisuele en gamesector.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse Regering heeft op 2/04/2021 haar goedkeuring gegeven aan het addendum bij de beheersovereenkomst 2018-2021 van het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds.</p> <p>Nieuwe beheersovereenkomsten m.b.t. het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor de periode 2022-2025 werden op 17/12/2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hierin werden specifieke bepalingen opgenomen betreffende de toekenning van de bijkomende financiering voor het werkjaar 2022 i.h.k.v. de relance.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>Op 28 april 2022 heeft de Europese Commissie haar formele goedkeuring gegeven (inzake staatssteun) aan de nieuwe beheersovereenkomst van het VAF/Gamefonds.</p> <p>De relancemiddelen werden succesvol ingezet voor steun aan creatie en talentontwikkeling. Inzake het VAF/Mediafonds werden de middelen aangewend om enerzijds specifieke steunbedragen voor creatie eenmalig te verhogen en anderzijds om samen met VRT, DPG Media en SBS Belgium, een specifieke call voor mini-fictieseries met focus op jong en/of ondervertegenwoordigd talent op te zetten. Inzake het VAF/Gamefonds werden er extra projecten gesteund, werd in 2022 een vierde call voor (pre)productiesteun georganiseerd en werd het innovatieatelier voor gameproducties ondersteund.</p> <p>Over beide fondsen heen werd het volledige relancebudget van 10.000.000 euro aangewend.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Addendum aan de beheersovereenkomst VAF 2018-2021 voor de toekenning van de bijkomende financiering vanuit relance aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor het werkjaar 2021.	2021 Q2	Gerealiseerd		
Bepaling in de nieuwe beheersovereenkomst VAF 2022-2025 voor de toekenning van de bijkomende financiering vanuit relance aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor het werkjaar 2022.	2021 Q4	Gerealiseerd		
Alle relancemiddelen werden via het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds toegekend aan audiovisuele producties (televisiereeksen en games).	2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal audiovisuele producties (televisiereeksen en games) die door het VAF worden ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.	25	2022 Q4	25	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	10.000.000 EUR
Uitvoering VEK	10.000.000 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 10.000.000 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

32. Jeuginfrastructuur

VV156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Belanghebbenden	Het Vlaams Jeugdwerk en bij uitbreiding Vlaamse jongeren

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	32. Jeuginfrastructuur
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Specifiek voor de investeringen in jeuginfrastructuur werd in het plan Vlaamse Veerkracht een totaalbudget van 30 miljoen euro voorzien voor volgende projecten:</p> <p>A. Investeren in de eigen infrastructuur Hoge Rielen en Destelheide:</p> <p>In de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gerealiseerd waarmee De Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen, de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen ADJ vzw als bouwheer, Het Facilitair Bedrijf als mandataris en het Departement Cultuur, Jeugd en Media als eigenaar van de infrastructuur en als vertegenwoordiger van de subsidiërende overheid. Het projectbudget wordt geraamd op 8.538.866,10 euro incl. BTW. Intussen (meting 5) wordt de totale projectkost voor de realisatie van het aangepast voorstel bedraagt 8.916.418,27 euro excl. BTW of 10.788.866,10 euro incl. BTW (zie voortgangsrapportering).</p> <p>Met de relancemiddelen kan ook de effectieve realisatie van het Masterplan voor Destelheide, opgesteld in 2014, versneld verder uitgevoerd worden. Voor het nieuwe paviljoen en de vernieuwing van de slaapblokken in Destelheide kan er 6,8 miljoen euro incl. BTW vastgelegd worden in 2021 en 2022. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media treedt op als bouwheer.</p> <p>Minister Dalle heeft een resterend budget van 4.150.000 euro vanuit project VV153 Garantiefonds (budget Media) overgeheveld naar VV156 (Jeuginfrastructuur) om de meerkost van de infrastructuurprojecten Hoge Rielen (+ 2.250.000 euro) en Destelheide (+ 1.900.000 euro) op te vangen.</p> <p>B. Optimalisatie aanbod ULDK</p> <p>Door relancemiddelen toe te voegen aan het recurrente budget kan de stock aan seniortenten verhoogd worden met ca. 155 en de stock aan patrouilletenten vernieuwd en verhoogd worden met ca. 240. Dit laatste is een absolute noodzaak want de meest recente aankoop van binnententen dateert van 2012. Bijkomend kunnen ca. 150 extra buitenzeilen voor patrouilletenten worden aangekocht.</p> <p>Door de verhoging van de stock dient de inrichting van het magazijn te worden geoptimaliseerd. Een klein deel van de middelen wordt daaraan besteed. In 2021 kan er voor de aankoop van tenten en de optimalisatie van het magazijn bijkomend 1.050.000 euro incl. BTW worden vastgelegd.</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

C. Project gratis energiescans en quick wins voor jeugdwerkinfrastructuur

In samenwerking met Pulse Transitienetwerk Cultuur, Jeugd, Media en het Vlaams Energiebedrijf worden gratis energiescans aangeboden voor organisaties met rechtspersoon zonder commercieel oogmerk, die beschikken over eigen jeugdinfrastructuur of er een langdurig gebruiksrecht op hebben. Het proefproject in 2020 leverde 26 scans op met hoopvolle resultaten richting maatregelen die bij het begeleidingstraject door VEB worden aangereikt. De geraamde kosten voor de verderzetting van dit project in 2021 en 2022 door Pulse bedragen 445.000 euro (+/- 100 scans en begeleiding), waarvan 312.000 euro relancemiddelen. Voor structurelere maatregelen kunnen de organisaties met bovenlokale jeugdinfrastructuur een aanvraag indienen voor de investeringsubsidies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, indien het project voldoet aan de formele en specifieke voorwaarden. Organisaties met infrastructuur die niet in aanmerking komen voor een Energiescan, zullen ondersteund worden voor het nemen van maatregelen met een hoge impact op korte termijn (quick wins). Deze organisaties kunnen subsidie ontvangen tot 80% van de totale geraamde kostprijs van de quick wins (minimaal 20% eigen inbreng). Voor de quick win-maatregelen is een budget van in totaal 1 miljoen euro voorzien, gespreid over 2021 en 2022.

D. Investeren in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur

Deze oproep wil de mogelijkheden van ontmoeting in de georganiseerde vrije tijd en daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte versterken en verbreden. Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning worden ondersteund en gestimuleerd tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving. Er wordt ingezet op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting via drie focusgebieden: "kwaliteitsvolle en duurzame basisvoorziening", "veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren" en "jeugd vriendelijke vormgeving van buurten en speelgebieden". In 2021 en 2022 vindt telkens één oproep plaats met een totaal voorzien subsidiebudget van 7,7 miljoen euro.

E. Bijkomende middelen sectorale investeringsubsidies jeugdinfrastructuur

In de periode 2021-2022 zal via het relancebudget het budget van de sectorale investeringsubsidies voor jeugdinfrastructuur met 1,7 miljoen euro verhoogd worden. In 2021 kunnen organisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur tot 60% investeringsubsidie ontvangen voor maatregelen ten behoeve van het energiezuiniger of toegankelijker maken van de gebouwen en sites. Vanaf 2022 volgt een nieuwe subsidieregeling na de voorziene periodieke herwerking van het huidige Besluit Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringsubsidies voor bovenlokaal belang (2012, gewijzigd in 2017). Organisaties met jeugdinfrastructuur zullen opnieuw een aanvraag kunnen indienen voor specifieke investeringslijnen inzake de verbetering van de infrastructuur, volgens de prioriteiten die in het BVR worden vastgelegd.

F. Bijkomende middelen investeringsubsidies grote jeugdinfrastructuur

Voor de ronde grote jeugdinfrastructuur 2021 werd 2.310.759,06 euro vastgelegd ten behoeve van het infrastructuurproject voor de reconversie van domein Bautershof.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	34.150.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none">- vernieuwing en verdere ontwikkeling van de jeugdsites in beheer van de Vlaamse overheid: Destelheide en Hoge Rielen- uitbreiding en optimalisering van het aanbod tenten door de ULDK- verlenen van 100 gratis Energiescans en 1 miljoen euro quick win maatregelen voor jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel- verlenen van 7,7 miljoen euro investeringsubsidies voor basisinfrastructuur en inrichting van jeugdwerkinfrastructuur

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
	- verlenen van 4 miljoen euro extra investeringssubsidies voor de sectorale prioriteiten voor jeuginfrastructuur in 2021 en 2022
Outcome	Performantere, veiligere en milieuvriendelijkere jeuginfrastructuur in Vlaanderen en Brussel.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Project Hoge Rielen: door de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne is de noodzaak om energie-ambities te behouden en resoluut te kiezen voor groene energie. Omwille van gestegen bouwkosten wordt aan het renoveren van 6 gebouwen prioriteit gegeven, waarbij een voorstel uitgewerkt werd om de renovatie van 3 gebouwen, 40, 53 en 55, buiten de scope te plaatsen. Om de resterende scope (37-45-46-47-56-57-Contactstrip en hemelwatervoorziening per gebouw) te behouden, is een extra investeringssubsidie van 2,25 miljoen euro toegekend door de Vlaamse Regering.</p> <p>De totale projectkost voor de realisatie van het aangepast voorstel bedraagt 8.916.418,27 euro excl. BTW of 10.788.866,10 euro incl. BTW.</p> <p>Minister Dalle heeft een resterend budget van 2.250.000 euro vanuit project VV153 Garantiefonds (budget Media) overgeheveld naar VV156, Hoge Rielen.</p> <p>Project Destelheide: de bouwvergunning voor het nieuwe paviljoen werd afgeleverd en de werken zijn gestart. Voor de renovatie van de bestaande slaapblokken is de aannemer aangesteld. Deze werken starten midden 2023. Minister Dalle heeft een resterend budget van 1.900.000 euro vanuit project VV153 Garantiefonds (budget Media) overgeheveld naar VV156, Destelheide.</p> <p>Na een de tweede oproep Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeuginfrastructuur, heeft de minister beslist om bijkomend budget te voorzien in 2023 (geen budget relancemiddelen), om het aantal goedgekeurde dossiers gevoelig te verhogen. De beslissing van de tweede oproep werd gepubliceerd op de website van het departement CJM: https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2022-10/investeringssubsidies-projecten-kwabajeu-ronde2.pdf</p> <p>Het reglement voor de oproep voor het verlenen van gratis Energiescans en het toekennen van gratis energiecoaching en middelen voor het nemen van quick-winmaatregelen om de gebouwen waar jeugdwerk plaatsvindt energiezuiniger te maken, werd gelanceerd in één oproep. Het Departement CJM is gestart met het doorzetten van dossiers voor energiescans en energiecoaching naar het Vlaams Energiebedrijf. Het project wordt verdergezet in 2023.</p> <p>In 2022 werd bijkomend budget toegekend voor de sectorale subsidielijin voor bovenlokale jeuginfrastructuur. De minister kende een investeringssubsidie toe aan 4 projectvoorstellen voor een totaalbedrag van 1,2 mio euro.</p> <p>Door in 2021 relancemiddelen (1.045 keuro) toe te voegen aan het recurrente budget (317 keuro) konden 207 seniortenten en 179 patrouilletenten worden aangekocht voor de Uitleendienst voor Kampeermateriaal. Daardoor beschikt de ULDK nu over het grootste aanbod van tenten in stock ooit. Daarnaast werd een kleiner gedeelte van de relancemiddelen (5 keuro) aangewend om de inrichting van de loods en het manipuleren van het tentmateriaal veiliger te maken.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekenning investeringssubsidie Hoge Rielen ADJ vzw. Voor de periode 2021-2024 worden 11 infrastructuurprojecten gestart waarmee de Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen. Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen en de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening voor het domein. Voor de realisatie van dit project wordt een investeringssubsidie toegekend aan de Hoge Rielen ten bedrage van 8.538.866,10 euro.	2021 Q2	Gerealiseerd	
Opstart aanbesteding infrastructuurproject Hoge Rielen	2021 Q3	Gerealiseerd	
Gunning studieopdracht infrastructuurproject Hoge Rielen	2021 Q4	Gerealiseerd	
Opstart studie door studiebureau voor infrastructuurproject Hoge Rielen	2022 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering studieopdracht infrastructuurproject Hoge Rielen	2022 Q4	Vertraging	De ontwerpdracht is nog lopende en wordt in het voorjaar 2023 opgeleverd.
Opstart bouwwerken door aannemer voor infrastructuurproject Hoge Rielen	2023 Q1	Op schema	
Oplevering bouwwerken infrastructuurproject Hoge Rielen	2024 Q4	Nog niet gestart	
Aanstelling studiebureau Destelheide	2021 Q4	Gerealiseerd	
Vastlegging investering Destelheide.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Opstart uitvoering infrastructuurproject Destelheide	2023 Q2	Op schema	
Oplevering van het project Destelheide (concrete planning onder voorbehoud).		Nog niet gestart	
Aankoop tenten en wijzigingen magazijn ULDK.	2022 Q2	Gerealiseerd	
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst dep. CJM en VEB inzake Energiescans jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Goedkeuring reglement kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur, eerste subsidieoproep 2021-2022.	2022 Q1	Gerealiseerd	
Toekenning investeringssubsidies kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en de inrichting van jeugdinfrastructuur, tweede subsidieoproep 2021-2022.	2022 Q4	Gerealiseerd	
Realisatie infrastructuurprojecten kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur. Concrete timing o.b.v. ingediende projecten.	2026 Q4	Op schema	
Goedkeuring subsidiereglement quick win-investeringen en energiescans jeugdinfrastructuur.	2021 Q3	Gerealiseerd	
Toekenning van energiescans en quick-win maatregelen.	2022 Q4	Vertraging	Het toekennen van de energiescans en quick-wins is opgestart in de zomer van 2022. De aanstelling van adviesbureaus nam meer tijd in beslag dan initieel voorzien. Vandaar een beperkte vertraging in de toekenning van energiescans en quick-wins. Momenteel werden 52 energiescans toegekend. In 2023 zullen opnieuw middelen voor energiescans en quick-wins toegewezen worden. De doorlooptijd van een traject voor de energiescans of quick-win investeringen bedraagt tot zes maanden vanaf het moment van toekenning tot en met de telefonische nazorg door het studiebureau. Bijgevolg zal een groot deel van de voorziene relancemiddelen voor dit project in 2023 worden toegewezen nadat de energicoaching ter plaatse heeft plaatsgevonden.
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2021.	2021 Q4	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALLEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Toekennen investeringssubsidies Sectorale Prioriteiten jeugd 2022.	2022 Q4	Gerealiseerd		
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2021.	2021 Q2	Gerealiseerd		
Indientermijn projectaanvragen sectorale investeringssubsidies jeugd 2022.	2022 Q2	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aankoop van senior- en patrouilletenten voor de uitbreiding van de stock in ULDK	300	2022 Q3	386	129 %
Realisatie toekennen 100 gratis Energiescans voor jeugdinfrastructuur	100	2022 Q4	52	52 %
Aantal goedgekeurde dossiers kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur	50	2022 Q4	69	138 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	30.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	34.150.000 EUR
Uitvoering VAK	34.110.000 EUR
Uitvoering VEK	3.832.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 34.150.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Beslissing van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: 30 miljoen euro voor Jeugdinfrastructuur
Beslissing van Vlaamse Regering van 18 maart 2022: Plan Vlaamse Veerkracht: investeringssubsidie voor grote jeugdinfrastructuur aan vzw Bautershof voor de reconversie van Domein Bautershof

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2022 over Plan Vlaamse Veerkracht: bijkomende subsidies door gestegen bouwkosten](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV153 - Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector](#)

33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

VV157 - GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Benjamin Dalle
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Brusselfonds
Belanghebbenden	Het Nederlandstalige netwerk in Brussel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	33. Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>In 2021 en 2022 wordt er geïnvesteerd in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt.</p> <p>De middelen worden ingezet voor infrastructuurinvesteringen aan Vlaamse organisaties en verenigingen in Brussel om hun huisvesting te verbeteren, hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren en verenigingen met een Nederlandstalige dienstverlening die zich inspant voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen.</p> <p>De bestedingsstrategie voor de relancemiddelen via het Vlaams Brusselfonds omvat twee grote pijlers:</p> <p>1. Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur: Vooreerst in de gebouwencomplexen in eigendom van de Vlaamse overheid en die door het Vlaams Brusselfonds wordt beheerd, met name in het gebouwencomplex van het extern verzelfstandigd Agentschap Muntpunt vzw en het Huis van het Nederlands Brussel vzw.</p> <p>a. Voor Muntpunt gaat het om de vernieuwing van het ICT-omgeving voor de stadsstudiezaal (“zichtbare” hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende “onzichtbare” serveromgeving), de uitbouw van een multimediale leer- en maakplek met aandacht voor kansengroepen: jongeren en (jonge) starters en volwassenen met beperkte digitale skills. en waarbij Muntpunt prioritair inzet op het verbinden van particulieren, scholen, middenveldorganisaties, etc. in het Nederlandstalige netwerk. Tenslotte wordt ook het vernieuwen en optimaliseren van Audio, Video en Livestream in het ganse gebouw vooropgesteld dat Muntpunt ook kan inzetten voor de ontsluiting en promotie van het Vlaams gemeenschapsaanbod.</p> <p>b. Voor het Huis van het Nederlands Brussel wil men de dienstverlening naar de klanten en gebruikers optimaliseren door de aanschaf van onder meer een digitaal klantenbegeleidingssysteem, de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs en het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audio-technologie)</p> <p>2. Hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op</p> <p>a. investeringen en verbouwingen in het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

Gemeenschapscommissie.

De geïdentificeerde prioritaire dossiers betreffen het gemeentelijk DKO Sint-Agatha-Berchem, gemeentelijk DKO Sint-Pieters-Woluwe, GO!-DKO F. Chopin en RHoK Etterbeek, gemeentelijk DKO Jette en GO!-DKO Fiocco Schaarbeek. Deze vijf bouw dossiers van de zes academies vertegenwoordigen een geraamd bouwbudget van zo'n 10 miljoen euro. Om een geïntegreerde en efficiënte opvolging tijdens het bouwproces te realiseren zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie de investeringssubsidies toekennen en instaan voor de concrete dossieropvolging. Zij biedt ondersteuning aan de schoolbesturen zonder evenwel zelf de rol van bouwheer op te nemen.

In een eerste stap maakt het schoolbestuur (gemeente St-Agatha-Berchem, Sint-Pieters-Woluwe, Jette en het gemeenschapsonderwijs) haar ambitie en engagement aantoonbaar via een principiële akkoord van de gemeenteraad, respectievelijk de Raad van het GO!. Van het schoolbestuur wordt verwacht dat zij het bouwprogramma voor de academie opstelt, het bouwheerschap opneemt én een eigen financiële bijdrage levert.

Volgend op de vraag en het engagement van het schoolbestuur kent de Vlaamse Gemeenschapscommissie een principeakkoord toe. Dat akkoord wordt omgezet in een effectieve subsidie op basis van het gunningsdossier. Om een geïntegreerde en efficiënte opvolging tijdens het bouwproces te realiseren zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie de investeringssubsidies toekennen en instaan voor een bouw dossier.

De Vlaamse Overheid-coördinatie Brussel kent de Vlaamse Gemeenschapscommissie een investeringsenveloppe DKO toe zoals omschreven in de nota aan de Vlaamse regering: Plan Vlaamse Veerkracht (project nr. 157) – Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel van 21 mei 2021 (DOC.0059/1TER). Er werd bij BVR van 14 oktober 2022 een bijkomende investeringssubsidie toegekend als bijdrage in de onverwachte prijsstijgingen bij de uitvoering van het infrastructuurplan Nederlandstalige academies in Brussel 2021-2025.

b. een oproep voor projecten 'Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek die aanzetten tot intersectorale samenwerking. en die inzet op matchmaking tussen actoren, initiatieven en de infrastructuur van ons Nederlandstalig netwerk.

c. individuele investeringsaanvragen (welzijn, zorg, jeugd, cultuur en sport..) die voldoen aan het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds. Het doel van de infrastructuurinvesteringen is om organisaties de nodige faciliteiten te geven om hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en optimaliseren. De investeringen gebeuren ten dienste van Vlaamse actoren die zich inspannen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners, en de Vlaming die er woont of er komt werken of ontspannen. Het richtlijnenkader omvat volgende beleidsdoelstellingen:

I. de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes;

II. de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van) de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte;

III. de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke invulling ervan;

IV. de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen;

V. de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve (pilot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen;

VI. de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop van duurzaam meubilair of materiaal;

VII. de aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te bouwen of aan te kopen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.625.000 EUR
-------	----------------

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	<p>Digitalisering: - 2 projecten digitalisering van de werking en infrastructuur in eigendom van de Vlaamse gemeenschap (Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel voor 578.496 euro.</p> <p>Hefboomdossiers Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur: - 16 investeringsprojecten op basis van het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds voor 3.846.001,45 euro. De output is afhankelijk van het aantal projectaanvragen. - 5 projecten infrastructuur Deeltijds Kunstonderwijs Brussel voor 3.750.000 euro. - 12 goedgekeurde projecten in het kader van de oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" + begeleidingskosten matchmakingevent, pancartes, begeleiding door bureau en experts en vervolgtraject) voor 2.448.373,75 euro</p>
Outcome	<p>Het realiseren van adequate, duurzame infrastructuur en inrichting van gebouwen zodat de Vlaamse actoren in Brussel een kwalitatieve dienstverlening kunnen garanderen, hun werking kunnen uitbreiden, meer toegankelijk maken of duurzaam optimaliseren.</p> <p>De oproep 'gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel' moet de samenwerking, de verbinding en de uitbouw van het Nederlandstalige gemeenschapsnetwerk in Brussel stimuleren en versterken. Door uitwisseling kunnen organisaties elkaars inhoudelijke werking bevruchten en kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven groeien. Het vervlechten van het weefsel van organisaties kan hun veerkracht versterken. De doelstelling is driedelig: stimuleren van (inter)sectorale samenwerking, faciliteren van meervoudig ruimtegebruik en bijdragen aan een toekomstgerichte aanpak. De focus ligt op (inter)sectorale samenwerking over gemeenschapsbevoegdheden heen of op het snijpunt ervan. Om dat te bereiken, brengen we de infrastructurele noden en opportuniteiten van het Nederlandstalige netwerk in Brussel in kaart en stemmen ze op elkaar af. Organisaties herdenken hun infrastructuur om ze te optimaliseren, te delen en op een duurzamere en toekomstgerichte manier vorm te geven. Er zijn 12 projecten goedgekeurd en in uitvoering</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De voortgang van de verschillende pijlers in het kader van de relancemiddelen gemeenschapsinfrastructuur in Brussel verloopt grotendeels op schema. Het digitaliseringsproject van de infrastructuur en dienstverlening van Muntpunt werd opgeleverd 2021Q4 . het digitaliseringsproject van de dienstverlening in het Huis van het Nederlands Brussel is opgeleverd in 2022 Q4.</p> <p>Er zijn 16 goedgekeurde hefboomdossiers op basis van het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds.</p> <p>Er zijn 12 investeringsprojecten goedgekeurd in het kader van de oproep "Broedplekken". Deze zijn in uitvoering vanaf september 2022. De realisatie/oplevering van de investeringswerken is verschillend en loopt tot uiterlijk 31 maart 2025.</p> <p>De uitvoering van 5 projecten Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel verloopt in verschillende tempo's. De Vlaamse Gemeenschap voorziet een budget van 3.750.000 euro. Het initieel toegekende bedrag van 3 miljoen werd verhoogd met 750.000 omwille van inflatie en energiekosten. Dit bedrag werd herverdeeld vanuit VV-project 153.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>De Vlaamse Gemeenschapscommissie voorziet in haar investeringsplan 2021-2025 een investeringsbudget van 5.150.000 euro voor de infrastructuur DKO.</p> <p>Er zijn 5 principeakkoorden van de inrichtende machten, en de VGC. Vier projecten zitten nog in de studie/ontwerpfase. Bij 1 project zijn de infrastructuurwerken in uitvoering.</p> <p>De realisatie van alle vermelde pijlers draagt bij tot het uitbouwen van een kwalitatief en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen in Brussel en/of een versterking van een (inter)sectorale werking en dienstverlening.</p>
Noodzakelijke politieke actie	geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Toekennen van subsidies aan hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur voor 16 individuele aanvragen i.k.v. het richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds is gerealiseerd	2022 Q4	Gerealiseerd	In 2021 zijn er 7 investeringsprojecten van de volgende organisaties en instellingen (Studio Globo vzw, 't Pasrel vzw, Chez Nous/Bij Ons vzw, Cosmos vzw, Wijkpartenariaat De Schakel vzw , Art2Work vzw en Atelier Groot eiland vzw) goedgekeurd en in uitvoering, Hiervan zijn er 2 aankoopdossiers en 5 verbouwings- of herinrichtingsdossiers. In 2022 zijn er 9 investeringsprojecten van de volgende organisaties en instellingen (Kenniscentrum WZZ, Habbekrats vzw, Moussem vzw, Odisee Hogeschool, Kaaitheater vzw, LDC De Kaai, Growfunding vzw, VUB en Zonneliëd vzw) goedgekeurd en in uitvoering.
Projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" gunning van de opdracht aan begeleidingsbureau en lancering van de oproep	2021 Q3	Gerealiseerd	'Architecture Workroom Brussels', een culturele denk-en-doe-tank voor innovatie binnen de architectuur werd aangesteld voor de begeleiding van de geselecteerde organisaties bij het opstellen van een subsidiedossier voor de verbouwing, inrichting of aankoop van materiaal. de oproep werd gelanceerd op 3 september 2021
projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur als broedplek indiening kandidaatstellingen van organisaties als aanbieder van infra of als zoeker,	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 18 oktober 2021 stelden 73 organisaties zich kandidaat . Uit de inzendingen bleven er 67 kandidaten

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG															
MIJLPALEN															
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING												
koppeling van samenwerkende kandidaten-organisaties starttraject geselecteerde kandidaten met experts			over. Via een matchmaking event werden organisaties aan elkaar gekoppeld en ging het traject van start.												
Aantal ingediende subsidieaanvragen voor de oproep Broedplekken	2022 Q2	Gerealiseerd	Op 30 april 2022 werden er 18 subsidieaanvragen voor investeringsprojecten ingediend.												
Pprojectoproep 'gemeenschapsinfrastructuur als broedplek' - aantal projecten met toegekende investeringssubsidies, inclusief administratieve afhandeling	2022 Q3	Gerealiseerd	Er werden 12 projecten goedgekeurd en een investeringssubsidies toegekend aan de volgende organisaties/instellingen: Cultureghem vzw Danscentrum Jette vzw De Overmolen vzw Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek - Scholengroep Globe Aroma vzw Hoofdstedelijke Kunstacademie – BSF HAMWD Jeugdcentrum Aximax - VGC Kuumba vzw LabNorth vzw ism Urban Foxes vzw Liga voor Mensenrechten vzw Passa Porta vzw Walter Werkt vzw												
projectoproep "Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek" - opstart van de uitvoering van de investeringswerken bij de 12 goedgekeurde projecten. <table border="1" data-bbox="167 1451 730 1908"> <tr><td>Cultureghem vzw</td></tr> <tr><td>Danscentrum Jette vzw</td></tr> <tr><td>De Overmolen vzw</td></tr> <tr><td>Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek - Scholengroep</td></tr> <tr><td>Globe Aroma vzw</td></tr> <tr><td>Hoofdstedelijke Kunstacademie – BSF HAMWD</td></tr> <tr><td>Jeugdcentrum Aximax - VGC</td></tr> <tr><td>Kuumba vzw</td></tr> <tr><td>LabNorth vzw ism Urban Foxes vzw</td></tr> <tr><td>Liga voor Mensenrechten vzw</td></tr> <tr><td>Passa Porta vzw</td></tr> <tr><td>Walter Werkt vzw</td></tr> </table>	Cultureghem vzw	Danscentrum Jette vzw	De Overmolen vzw	Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek - Scholengroep	Globe Aroma vzw	Hoofdstedelijke Kunstacademie – BSF HAMWD	Jeugdcentrum Aximax - VGC	Kuumba vzw	LabNorth vzw ism Urban Foxes vzw	Liga voor Mensenrechten vzw	Passa Porta vzw	Walter Werkt vzw	2022 Q4	Gerealiseerd	De twaalf broedplekken starten vanaf september 2022 en hebben verschillende looptermijnen.
Cultureghem vzw															
Danscentrum Jette vzw															
De Overmolen vzw															
Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek - Scholengroep															
Globe Aroma vzw															
Hoofdstedelijke Kunstacademie – BSF HAMWD															
Jeugdcentrum Aximax - VGC															
Kuumba vzw															
LabNorth vzw ism Urban Foxes vzw															
Liga voor Mensenrechten vzw															
Passa Porta vzw															
Walter Werkt vzw															

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur in de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel is gerealiseerd	2021 Q4	Gerealiseerd	De digitalisering in het Huis van het Nederlands Brussel is gerealiseerd op 2022 Q3
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie- opstart uitvoering infrastructuurplan DKO	2021 Q2	Gerealiseerd	VGC heeft 4 collegebesluiten voorgelegd houdende de principe akkoorden van 4 infrastructuurdossiers voor de projecten van respectievelijk de kunstacademies van St-Agatha Berchem, St-Pieters-Woluwe, Schaarbeek Fiocco en Go muziekschool Etterbeek
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorbereiding van de infrastructuurwerken.	2022 Q4	Gerealiseerd	<p>1. Voor DKO Sint-Agatha-Berchem kende de VGC een investeringssubsidie goed. De bouwvergunningprocedure loopt</p> <p>2. DKO Sint-Pieters-Woluwe: april 2022: beslissing van het college Sint-Pieters-Woluwe tot aanstelling van een ontwerpteam;</p> <p>3. DKO GO! Muziekacademie 'Chopin' en GO! Academie Beeldende kunsten RHOK in Etterbeek Raad van GO! heeft een portfoliobudget 4.100.000 euro excl. bodemsanering. Het dossier wordt herberekend ifv de stijgende bouwkosten;</p> <p>4. DKO Gemeentelijke Academie Muziek-Woord-Dans in Jette Dec 2021: oplevering onderzoek volumestudie + raming bouwbudget; mei 2022 collegebeslissing van de VGC - principeakkoord. Bestek aanstelling ontwerpteam in voorbereiding door gemeente Jette</p> <p>5. DKO GO! Muziekacademie 'Fiocco' in Schaarbeek april 2022: start van de restauratie van de gevelwerken</p>
projectoproep "gemeenschapsinfrastructuur broedplekken" realisatie van de 12 goedgekeurde projecten	2025 Q1	Op schema	De twaalf broedplekken starten vanaf september 2022 en hebben verschillende looptermijnen. De uiterste

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
			uitvoeringsdatum/oplevering van de werken is 31 maart 2025	
Subsidies voor 5 infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie - financiële en functionele verantwoording van de gerealiseerde projecten van het infrastructuurplan DKO	2026 Q3	Nog niet gestart		
Begeleidingsopdracht door Architecture Workroom van de implementatie van de projectoproep Broedplekken en de uitvoering van investeringswerken bij de 12 goedgekeurde projecten	2023 Q4	Op schema	Het organiseren van een inhoudelijke sessie op de Trefdag Brussel in het najaar van 2023 om de Vlaams-Brusselse partners te informeren over de broedplekken als inspirerende praktijk, die gedeeld kan worden.	
Begeleidingsopdracht door Architecture Workroom van de implementatie van de projectoproep Broedplekken en de uitvoering van investeringswerken bij de 12 goedgekeurde projecten	2024 Q1	Op schema	Het verfijnen van de definitie van het concept 'broedplek' en het opstellen van aanbevelingen voor het beleid.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur in de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel	2	2021 Q4	2	100 %
Bereikte organisaties via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek"	50	2021 Q4	67	100 %
aantal ingediende projecten via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek"	20	2022 Q2	18	90 %
aantal weerhouden projecten via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek"	18	2022 Q3	12	66 %
aantal gesubsidieerde, individuele hefboomdossiers	15	2022 Q4	16	107 %
Het organiseren van een inhoudelijke sessie op de Trefdag Brussel in het najaar van 2023 om de Vlaams-Brusselse partners te informeren over de broedplekken als inspirerende praktijk, die gedeeld kan worden.	1 studiemoment	2023 Q4		
Het opstellen van aanbevelingen voor het beleid met betrekking tot het concept 'broedplek'	1 aanbevelingsrapport	2024 Q1		

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
aantal gerealiseerde individuele hefboomdossiers	16	2024 Q4	7	45 %
Uitvoeren gesubsidieerde infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel	5	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.625.000 EUR
Uitvoering VAK	10.623.000 EUR
Uitvoering VEK	5.611.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 10.625.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Beslissing van de Vlaamse Regering van 23 april 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: uitvoering project 157 - Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel</p> <p>Beslissing van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: dossier 157</p> <p>Beslissing van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: investeringssubsidie Gemeenschapsinfrastructuur deeltijds kunstonderwijs (DKO) Brussel</p> <p>Beslissing van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021: Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringsubsidie vzw Cosmos voor de aankoop van een pand in Brussel, om er het Vlaams erkend lokaal dienstencentrum Vives in onder te brengen</p> <p>Beslissing van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022: Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringsubsidie vzw Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg</p> <p>Beslissing van de Vlaamse Regering van 24 juni 2022: 285.000 euro investeringssubsidie aan vzw Moussem</p> <p>Beslissing van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2022: Plan Vlaamse Veerkracht: bijkomende subsidies door gestegen bouwkosten</p>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 9 december 2022: Plan Vlaamse Veerkracht: investeringssubsidie VUB voor bouw vechtsportal](#)

[Beslissing van de Vlaamse Regering van 9 december 2022: Plan Vlaamse Veerkracht: investeringssubsidie vzw Zonnelied voor verbouwing en inrichting De Loods in Brussel](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV153 - Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector](#)

34. Spending reviews

VV158 - SPENDING REVIEWS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Matthias Diependaele
Trekkende entiteit VO	Departement Financiën en Begroting
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	34. Spending reviews
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Vlaamse brede heroverweging betreft een doorlichting in het voorjaar 2021 van de 10 beleidsdomeinen alsook van de sociale toeslagen en kortingen.</p> <p>De bedoeling van de doorlichting is:</p> <ol style="list-style-type: none">1) om aan de hand van een aantal voor de beleidsdomeinen gemeenschappelijke onderzoeksvragen (doelmatigheid huidige regelgeving, is bevoegdheidsverdeling tussen de diverse overheden en versus de (social) profit sector voor verbetering vatbaar, wat zijn de mogelijke besparingsvarianten) tot onderbouwde aanbevelingen te komen in het kader van evidence based policy,2) tot een structurele verankering van beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen in het beleids- en begrotingsproces te komen.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	10.000.000 EUR
Output	Concrete uitgaventoetsingen per beleidsdomein en verankering van het proces van uitgaventoetsingen in het budgettair proces, met het oog op gezondere overheidsfinanciën en het afremmen van de toename van de overheidsschuld.
Outcome	De uitgaventoetsingen zijn bedoeld om de kwaliteit en samenstelling van de overheidsfinanciën in het land te verbeteren. Door een beter inzicht te verschaffen in hoe overheidsmiddelen worden en zouden moeten worden besteed, helpen uitgaventoetsingen regeringen om een aantal problemen aan te pakken. Ze kunnen de samenstelling van de overheidsuitgaven verbeteren, door de efficiëntie en effectiviteit van de uitgaven te beoordelen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen om de uitgaven te richten op groeivriendelijke items of items die duurzaamheid op lange termijn bevorderen, ook voor het milieu.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	<p>Op 20 mei 2022 wijzigde de Vlaamse Regering na advies van de Raad van State definitief de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO). Met artikel 9 wordt het gebruik van brede heroverwegingen en uitgaventoetsingen verankerd in het begrotingsproces. Verder werden er in 2022 zes nieuwe uitgaventoetsingen opgestart:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vlaamse sociale bescherming • Modal Shift Goederenvervoer • Duurzaam watergebruik en de organisatie van het waterlandschap • Onderzoek 'uitgaventoetsing: gezinsfiscaliteit en gezinsbijslag • Culturele Bovenbouw • Organisatiestructuur van de Vlaamse overheid <p>Doel van de uitgaventoetsingen is om het resultaat te kunnen meenemen bij de volgende regeringsvorming. Het resultaat van de uitgaventoetsing dient dus ten laatste beschikbaar te zijn voor de onderhandelende partijen.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Gunning raamovereenkomst Vlaamse brede heroverweging	2021 Q1	Gerealiseerd	
Oplevering eindrapporten van de Vlaamse brede heroverweging	2021 Q3	Gerealiseerd	
Integratie van de uitgaventoetsingen in het begrotingsproces: Regeringsbesluiten die bepalen hoe uitgavenherzieningen (of een soortgelijke aanpak) in het begrotingsproces worden geïntegreerd.	2021 Q4	Gerealiseerd	Q3 2022: goedkeuring van aangepast decreet VCO waarin uitgaventoetsingen nu expliciet zijn voorzien bij een begrotingsopmaak ; ontwerp van decreet aangepast VCO is goedgekeurd door VR op 20 mei 2022
Input spending reviews bij begrotingsopmaak	2024 Q3	Op schema	Bij BO2022 is ook al gebruik gemaakt van resultaten VBH
Integratie van de uitgaventoetsingen in het begrotingsproces: Systematische opname van de resultaten van de uitgaventoetsingen in de jaarlijkse en meerjarige begrotingsplanning vanaf de opstelling van de begrotingswet voor 2024.	2023 Q3	Op schema	opgenomen in de update van de VCO: gebruik van prestatieinformatie bij BO: ontwerp van decreet goedgekeurd op de VR van 20 mei 2022 ; goedkeuring decreet in VP verwacht voor zomerreces
Analyse achteraf van de uitgaventoetsingen: Publicatie van beoordelingsverslag.	2024 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	3.015.000 EUR
Uitvoering VEK	2.022.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 8.300.000 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 1.700.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>Mededeling aan de Vlaamse Regering van 4 december 2020. Vlaamse Brede Heroverweging</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 9 juli 2021. Vlaamse Brede Heroverweging</p> <p>Beslissing Vlaamse Regering van 28 oktober 2022. BVCO</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 18 november 2022. Uitgaventoetsing: gezinsfiscaliteit en gezinsbijslag</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 18 november 2022. Onderzoeksopdracht. Gezinsfiscaliteit en Gezinsbijslag Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Bestek nr.VO/FB/DEP/2022/008/BOBFO</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 9 december 2022. Uitgaventoetsing water</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 december 2022. Uitgaventoetsing: Vlaamse sociale bescherming</p> <p>Onderzoeksopdracht. Vlaamse Brede Heroverweging – Zorgbudgetten VSB. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 16 december 2022. Uitgaventoetsing Modal Shift Goederenvervoer</p>

35. Extra relanceprojecten

VV159 - SNELLERE VERGUNNINGS- EN BEROEPSPROCEDURES

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhail Demir
Trekkende entiteit VO	Departement Omgeving
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Project “sneller en beter” met 5 werven:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Snelle en correcte rechtsbescherming: snellere beroepsprocedures en wegwerken achterstand. Door dit initiatief zal de gemiddelde doorlooptijd van behandeling verkorten met 6 tot 9 maanden. 2. Optimaliseren van de Omgevingsvergunning: het omgevingsvergunningsdecreet wordt geëvalueerd. De belangrijkste opzet is om na te gaan of de doelstellingen van de Unieke Omgevingsvergunning – sneller en beter – gehaald werden en of de beslissingen op het juiste bestuursniveau genomen worden. Dit evaluatietraject zal leiden tot verbeteringen aan de regelgeving. Daarnaast worden technische verbeterpunten verder onderzocht die de behandeling van vergunningsaanvragen meer oplossingsgericht en vlotter moeten maken. De VIP-cel bij het Departement Omgeving wordt versterkt, zodat aan een groter aantal projecten een begeleiding op maat kan geboden worden. Ook het decreet Complexe Projecten wordt aan een eerste evaluatie en optimalisatie onderworpen. 3. Omgevingsbesluit: afstappen van een afwijkingsregelgeving maar werken op maat. Een groot deel van onze regelgeving richt zich op uitzondering- en afwijkingsbepalingen. Dit vormt echter vaak de grond voor juridische geschillen en aanvechtingen in beroep. Het omgevingsbesluit moet bijdragen tot het op een adequate manier en op maat laten activeren van de juiste maatregelen en instrumenten nodig op een bepaald moment in het proces. Er wordt onderzocht op welke manier het Omgevingsbesluit kan geïntroduceerd worden. 4. Hervorming milieueffectenrapportage tot een slank en efficiënt instrument dat de besluitvorming beter en krachtiger maakt en onze leefomgeving voldoende beschermt. De MEB (Milieueffectenbeoordeling) moet de besluitvorming en het primaat van de politiek zo gericht en efficiënt mogelijk ondersteunen. 5. Digitale werf: Het omgevingsloket wordt uitgebreid met een publiek loket zodat ook publieke raadplegingen en openbare onderzoeken maximaal digitaal kunnen verlopen. (zie VV 063) Het loket van DBRC wordt gedigitaliseerd (zie VV 062). Ook wordt de BIM datastandaard als informatiedrager voor een efficiëntere en beter geïnformeerde beleidsuitvoering geïntroduceerd.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	
Output	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Snelle en correcte rechtsbescherming	2022 Q1	Gerealiseerd	
Optimaliseren van de Omgevingsvergunning	2022 Q4	Op schema	Ontwerp BVR in Q4 2022 in procedure politieke besluitvorming. Ontwerp decreet in opmaak en wordt Q1 2023 aan kabinet overgemaakt
Digitale werf	2022 Q4	Op schema	
Omgevingsbesluit	2022 Q4	Op schema	Ontwerp decreet in Q4 2022 overgemaakt aan kabinet voor politieke besluitvorming
Hervorming milieueffectenrapportage	2022 Q4	Op schema	Ontwerp decreet in Q4 2022 overgemaakt aan kabinet voor politieke besluitvorming

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV063 - Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck](#)

VV160 - ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Betrokken entiteit(en) VO	Digitaal Vlaanderen
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING

Met dit project willen we regeldruk en administratieve lasten reduceren om belangrijke kostenbesparingen én een grotere tevredenheid bij burgers, ondernemingen en overheidspersoneel te realiseren. In de verschillende bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid willen we vereenvoudigingsprojecten realiseren waar regelgeving en de bijhorende administratieve procedures de efficiënte werking van de overheid of de vlotte interacties van burgers en bedrijven met die overheid in de weg staan.

We werken daarbij enerzijds "remediërend" door screening van de bestaande regelgeving via zogenaamde "schrapsessies" per beleidsdomein" en "citizen journeys" voor een tweetal concrete levensgebeurtenissen, en anderzijds werken we "preventief" en nemen we maatregelen om efficiënte toekomstige regelgeving te verzekeren.

Voor de financiering van dit project wordt er 2 x 250.000 euro gehaald uit het budget van 10 miljoen euro voor de spending reviews (VV158).

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	<ol style="list-style-type: none">1. Gedetecteerde vereenvoudigingsopportuniteiten (vereenvoudigingsagenda)2. Monitoring van de uitvoering van de vereenvoudigingsagenda3. Uitwerking van 10 disruptieve projecten ("vlaggenscheppen")4. Uitwerking ex ante screeningsmechanisme regeldruk
Outcome	<ol style="list-style-type: none">1. Verminderen bestaande regeldruk en bestaande administratieve lasten t.a.v. ondernemingen/burgers2. Beheersen toekomstige regeldruk en administratieve lasten

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Na de goedkeuring van een eerste vereenvoudigingsagenda met 214 vereenvoudigingsprojecten die voorgesteld werden door de Vlaamse administratie, werden tijdens de eerste helft van 2022 bedrijven en welzijnsorganisaties bevroegd over regeldruk in hun sector. De resultaten van deze

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>bedrijvenpanels hebben geleid tot de tweede vereenvoudigingsagenda die op 15 juli 2022 aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd.</p> <p>Daarnaast werd een monitoringssysteem opgezet dat de voortgang van de projecten in de regelgevingsagenda's periodiek zal opvolgen. De resultaten van de eerste monitoring zijn eveneens op 15 juli 2022 aan de Vlaamse Regering voorgelegd.</p> <p>In het najaar van 2022 zijn de leidend ambtenaren en de bedrijfswereld bevroegd over de invoering van regeldruktoets.</p> <p>De resultaten hiervan worden momenteel met de kabinetten besproken.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Agendering van de mededeling aan de Vlaamse Regering over de invoering van de regeldruktoets

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Eerste (voorlopige) vereenvoudigingsagenda vastgelegd	2021 Q3	Gerealiseerd	
Definitieve vereenvoudigingsagenda vastgelegd	2022 Q3	Gerealiseerd	De definitieve vereenvoudigingsagenda is door Vlaamse Regering vastgelegd op 15 juli 2022.
beslissing over ex ante screeningsmechanisme (regeldruktoets)	2022 Q3	Vertraging	De bevraging bij de leidend ambtenaren en bedrijfswereld is pas in het najaar kunnen starten. De beslissing over de invoering van de regeldruktoets is daardoor ook vertraagd.
Uitvoering van de beslissing over regeldruktoets	2023 Q1	Nog niet gestart	
Opstart van project met uitwerking van 10 disruptieve vereenvoudigingsprojecten ("vlaggenschepen")	2022 Q2	Gerealiseerd	De 2 overheidsopdrachten mbt de begeleiding en de ondersteuning van de vlaggenschepen zijn gegund midden december 2022.
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2022 Q2	Gerealiseerd	Zie mededeling aan de Vlaamse Regering 15 juli 2022.
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2023 Q1	Nog niet gestart	
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2023 Q3	Nog niet gestart	
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2024 Q1	Nog niet gestart	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Monitoring van uitvoering van vereenvoudigingsagenda en "vlaggenschipprojecten"	2024 Q3	Nog niet gestart			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
Aantal gedetecteerde vereenvoudigingsopportuniteiten	250	2022 Q3	231	92,5 %	
Aantal ondersteunde disruptieve vereenvoudigingsprojecten ("vlaggenschipprojecten")	10	2024 Q1			
Aantal uitgevoerde vereenvoudigingsprojecten	231	2024 Q3	7	3 %	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Mededeling aan de Vlaamse Regering van 10 december 2021
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister-President Jan Jambon. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Hilde Crevits. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Bart Somers. Bijlage
Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Ben Weyts. Bijlage

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Zuhair Demir. Bijlage](#)

[Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Wouter Beke. Bijlage](#)

[Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Matthias Diependaele. Bijlage](#)

[Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Lydia Peeters. Bijlage](#)

[Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Minister Benjamin Dalle. Bijlage](#)

[Vermindering Regeldruk - Opportuniteiten Regeringsbreed. Bijlage](#)

[Mededeling aan de Vlaamse Regering van 15 juli 2022](#)

VR 8 juli 2022 - Vermindering van regeldruk en administratieve vereenvoudiging": stand van zaken na de afwerking van de tweede fase van het project

VV161 - DECENTRALISATIEOEFENING NAAR LOKALE BESTUREN

BETROKKENEN

Bevoegde minister(s)	Bart Somers
Trekkende entiteit VO	Agentschap Binnenlands Bestuur
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING

Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 stelt dat de Vlaamse Regering in een commissie decentralisatie samen met de lokale besturen komt tot voorstellen tot decentralisatie. Daarom werd door de Vlaamse administraties een analyse uitgevoerd omtrent mogelijke taken/bevoegdheden die vanuit de Vlaamse overheid kunnen gedecentraliseerd worden naar de lokale besturen. Vertrekkende vanuit deze resultaten wordt een zogenaamde long-list opmaakt die door de Vlaamse Regering wordt gevalideerd en dit met het oog op verdere bespreking met de lokale besturen in functie van de implementatie. In een commissie decentralisatie overlegt de Vlaamse Regering samen met de lokale besturen op welke terreinen, bovenop de in dit regeerakkoord gemaakte afspraken, en door aanpassing van welke regelgeving en binnen welke termijn, zij de autonomie voor de lokale besturen verhoogt door, o.a. de afschaffing van Vlaamse sturing; minder of soepelere normering of de aanpassing van administratieve praktijken.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	
Output	De commissie decentralisatie geeft aan op welke wijze vorm zal gegeven worden aan de decentralisatie ambities van de Vlaamse Regering, binnen een afgelijnde agenda. Dit gebeurt door middel van een programma waarin concreet wordt aangegeven welke regelgeving, administratieve praktijken en/of interbestuurlijke processen deze regeerperiode zullen aangepakt worden om de vooropgestelde beleidsdoelstelling uit het regeerakkoord te realiseren. Tevens wordt van de commissie verwacht dat ze in haar programma voorstellen doet voor de vervolgfase: de (timing van de) implementatie van de voorstellen en de opvolging ervan.
Outcome	Duidelijkere en meer evenwichtige verhoudingen tussen de Vlaamse Regering en de lokale besturen wat betreft autonomie, doorzettingsmacht en instrumenten voor de aanpak van enkele belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	De commissie kwam tweemaal samen:

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<ul style="list-style-type: none"> • op 17 juni 2022 voor de goedkeuring van de long list met decentralisatievoorstellen en de oprichting van de werkgroepen; • op 29 november 2022 voor de bespreking van de conclusies van de werkgroepen en de afspraken voor het eindverslag. <p>De inhoudelijke werkgroepen presenteerden het resultaat van hun werkzaamheden uniform aan de commissie decentralisatie. De commissie valideert de resultaten en legt deze voor aan de Vlaamse Regering.</p> <p>De commissie voorziet op 13 januari 2023 haar eindrapport te presenteren aan de Vlaamse Regering.</p>
Noodzakelijke politieke actie	geen

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Nota VR - voorstel tot oprichting van de commissie decentralisatie	2022 Q1	Gerealiseerd	Op 4 februari 2022 keurde de Vlaamse Regering de startnota goed.	
Startvergadering commissie decentralisatie.	2022 Q1	Gerealiseerd	Omwille van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende humanitaire crisis werden de werkzaamheden van de commissie decentralisatie tijdelijk on hold gezet en werd een aangepaste timing voorgesteld.	
Startvergadering commissie decentralisatie	2020 Q3	Gerealiseerd	Omwille van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende humanitaire crisis werden de werkzaamheden van de commissie decentralisatie tijdelijk on hold gezet. Zowel de interne capaciteit als de capaciteit bij de kabinetten en lokale besturen noopten hiertoe. Een aangepaste timing werd voorgesteld. De startvergadering van de commissie decentralisatie vond op 17 juni 2022 plaats. Ter vergadering werden de inhoudelijke werkgroepen opgericht en werd een gesloten longlist met 61 te behandelen decentralisatievoorstellen afgeklopt.	
Finale rapportering	2022 Q4	Gerealiseerd	De commissie decentralisatie kwam op 29 november samen ter bespreking van de conclusies van de inhoudelijke werkgroepen en de afspraken voor het eindverslag.	
Eindrapport	2023 Q1	Op schema	Mededeling van het eindrapport van de commissie op de Vlaamse Regering.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Eindrapport en implementatieplan decentralisatie		2023 Q1		100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	119.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Startnota Bijlage 1 Bijlage 2

VV162 - INVESTEREN IN VLAAMSE KENNISOVERHEID

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Belanghebbenden	Netwerk Statistiek Vlaanderen

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	07. De overheid efficiënter maken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Investeren in Vlaamse kennisoverheid: 1 miljoen euro recurrente middelen (nieuw beleid in 2021 maar niet in relanceprovisie) voor VSA en SIA vanaf 2021.</p> <p>Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA)</p> <p>In het kader van een snelle en flexibele informatieverzorging naar statistiekgebruikers zetten we in op de data-capaciteit van de Vlaamse Statistische Autoriteit met aandacht voor de verschillende types van databronnen: survey-data, administratieve data en organische (big) data. Dit om veranderingen in de maatschappij en de economie sneller te kunnen duiden. De capaciteit van het VSA Statistisch Datawarehouse wordt uitgebreid om statistische informatie-invoer en verwerking te versnellen en op een overzichtelijke manier weer te geven via innovatieve visualisaties en dashboards met de belangrijkste statistische indicatoren. We breiden eveneens onze survey-capaciteit uit door internet-gebaseerde bevestigingen van de Vlaamse bevolking om de enquêtedruk te verminderen. Er wordt hiertoe ook extra geïnvesteerd in een online probability panel survey in samenwerking met Vlaamse universiteiten via de VLIR.</p> <p>De concrete doelstellingen voor dit deel van het project zijn:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverzorging2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen3. Uitbouw surveycapaciteit / SV-dataverzameling4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR <p>Strategische Inzichten en Analyses (SIA)</p> <p>Om geïnformeerde en toekomstgerichte beleidskeuzes te kunnen maken, richten we ons op macro-economische en statistische analyses. Daartoe wordt geïnvesteerd in het opstarten en verder ontwikkelen van Strategische Inzichten en Analyse (SIA). Naast het beter benutten van statistische data, richten we ons ook op analyses van internationale indicatoren, trends en relevante toekomst studies. Dit als onderdeel van het verder optimaliseren van bestaande kenniscapaciteiten en beleidsonderzoek.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.000.000 EUR
Output	De VSA en SIA realiseren in het kader van dit projecten meerdere doelstellingen. De VSA versterkt haar statistisch datawarehouse, ontwikkelt een dashboard met Vlaamse kerncijfers en bouwt surveycapaciteit en online probability panel survey uit. SIA analyseert COVID-19 data, bouwt een relance dashboard, zet haar schouders onder een kennisnetwerk en werkt aan een netwerkmodel kennisoverheid.
Outcome	Eenzijds wordt via een versterkte data-capaciteit van de Vlaamse Statistische Autoriteit gestreefd naar een snelle en flexibele informatieverschaffing naar statistiekgebruikers. Anderzijds wordt er ingezet op een verdere optimalisatie van de bestaande kenniscapaciteiten en beleidsonderzoek.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Luik VSA</p> <p>De pilootfase van de integratie van surveydata in het Statistisch data warehouse is afgerond.</p> <p>Het pilootproject om de twitter-sentiment analyse pipeline te integreren in het Statistisch Datawarehouse werd eind december 2022 afgerond.</p> <p>Een POC rond de integratie van R en Python in SAS Viya via Jupiter Hub werd opgezet en moet nog geëvalueerd worden. Meer algemeen is een architectuurstudie aan de gang om te kijken in welke mate het SAS VIYA platform kan gebruikt worden om organische data op te slaan en te verwerken. Daarnaast is in oktober 2022 een website gelanceerd specifiek rond de data science activiteiten en projecten van de VSA.</p> <p>Op de website van Statistiek Vlaanderen worden momenteel webpagina's per statistiek en interactieve data aangeboden. Begin juli 2022 is een dashboard gerealiseerd dat een online overzicht van de belangrijkste statistieken over Vlaanderen aanbiedt. De selectie van statistieken gebeurde op basis van de brochure 'Vlaanderen in cijfers' en is gebaseerd op een 6- tot 8-tal grote thema's met dynamische evolutiefiguren. In september 2022 volgde een dashboard met een vergelijking van Vlaanderen met EU-regio's. De technische uitwerking gebeurde in overleg met Digitaal Vlaanderen.</p> <p>Het veldwerk voor de COVID-vervolgbevraging en de nieuwe editie van de SV-bevraging (herhaling editie 1 voor update Vlaamse openbare statistieken – SV4) werd voor de zomer 2022 afgerond . Vanaf eind september tot begin oktober 2022 zijn op basis van de SV4-bevraging verschillende Vlaamse openbare statistieken geactualiseerd (o.a. algemene levensvredeheid, sociale contacten, ...).</p> <p>In het najaar 2022 zijn de dataverzamelingen van 2 nieuwe SV-bevragingen gelanceerd met een herhaling van thema's uit eerdere bevragingen. SV5 bevat vragen over het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, cultuurparticipatie, sportparticipatie en subjectief welzijn. SV6 zoomt in op media, politieke participatie, vertrouwen in instellingen en tevredenheid met voorzieningen.</p> <p>Vlaanderen werd net als de rest van de wereld vanaf het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om daaraan tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen begin 2021 een grootschalige Covid-19-bevraging. Aan de 10.035 deelnemers van deze bevraging werd gevraagd of ze op een later tijdstip opnieuw gecontacteerd</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

mochten worden voor een eenmalige vervolgbepaving. Iets meer dan 2 op 3 deelnemers aan de eerste bepaving gaven hiervoor de toestemming. Die vervolgbepaving werd afgenomen in het voorjaar van 2022 en leverde een bruikbare dataset op met antwoorden van 3.730 respondenten. De antwoorden van de respondenten die aan de vervolgbepaving in 2022 deelnamen, kunnen vergeleken worden met de antwoorden van diezelfde groep in de eerste editie van de bepaving in 2021. Zo wordt duidelijk of hun leefsituatie tussen 2021 en 2022 merkbaar is gewijzigd. In november 2022 werd al een eerste rapport gepubliceerd met de resultaten over gezondheid, welzijn en sociale contacten. Op 15 december 2022 verscheen een rapport met de resultaten van de vragen over werk, inkomen, levenslang leren en digitalisering. Op 22 december 2022 volgt nog een derde en laatste rapport over wonen, mobiliteit, het welzijn van kinderen en de aanpak van de crisis door de overheid. Begin 2023 volgt nog een methodologisch rapport. Alle rapporten zijn beschikbaar op de website Statistiek Vlaanderen.

De procedure om de data uit zowel de SV-bepavingen als de COVID-bepavingen te bekomen voor statistische en wetenschappelijke doeleinden is klaar. Informatie over deze procedure is te vinden op <https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/aanvragen-van-microdata-voor-onderzoek>.

De gesprekken met het consortium van universiteiten die het Online Probability Panel voorbereiden en uitvoeren zijn in de 2e jaarhelft van 2022 verder gezet. Er is een consensus bereikt over de governance structuur en de betrokkenheid van de VSA hierin en de structurele financiering door en deelname van de VSA in de uitbouw van het opzet. De VSA neemt deel aan de werkgroepen ter voorbereiding van de panelrekrutering, de steekproefsamenstelling en de vragenlijsten. Binnen de schoot van het Coördinatiecomité Vlaamse Openbare Statistieken wordt een werkgroep surveyonderzoek opgericht die onder meer zal optreden als 'vraagkanaal' voor beleidsvragen voor het online panel. De rekrutering van de panelleden start in 2023 en het bijkomende aandeel van 1.000 panelleden in het Vlaamse Gewest (bovenop de geplande 2.000) wordt afgerond in het voorjaar 2024. Een eerste Vlaamse vragenmodule is voorzien voor het voorjaar 2024 met een oplevering van de data in de zomer 2024. De inhoudelijke voorbereidingen van de vragenmodule starten in 2023.

De uitbouw van SIA geeft gradueel invulling aan een netwerkmodel beleidsanalyse- en onderzoek met een duidelijke focus op de relancedoelstellingen. In 2022 is ingezet op de thema's economische veerkracht en strategische verkenningen. In 2022 ligt de focus op de thema's economische veerkracht en strategische verkenningen. Via drie netwerkmomenten werd het netwerkmodel van de kennisoverheid geconcretiseerd met het oog op bundeling van expertise en samenwerking met kennispartners binnen en buiten Vlaanderen (o.a. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Nederland en de OESO).

Noodzakelijke politieke actie

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: a. Versterking van het proces van integratie en verwerking van surveydata en ondernemingsdata tot statistische informatie	2022 Q2	Vertraging	Omwille van vertraging in het beschikbaar hebben van de omgeving in ATOS DataCenter zal dit Q1 2023 worden.
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: b. Analyse van de mogelijkheid tot integratie van organische data in het VSA statistisch datawarehouse	2022 Q4	Vertraging	Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden die SAS VIYA biedt op dit vlak. Niet alles lijkt mogelijk en er worden architecturale oplossingen gezocht.
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: c. Versneld beschikbaar stellen van interactieve data	2022 Q2	Vertraging	Omwille van vertraging in het beschikbaar hebben van de omgeving in ATOS DataCenter zal dit Q1 2023 worden.
1. Versterking van de uitbouw van het VSA Statistisch Datawarehouse met het oog op snellere informatieverschaffing: d. Haalbaarheidsanalyse van een remote access facility voor verwerking van atomaire statistische data in het kader van statistisch en wetenschappelijk onderzoek door entiteiten van de Vlaamse overheid en kennisinstellingen.	2022 Q4	Gerealiseerd	Voor dit sub-project werd een uitgebreide studie besteld en uitgevoerd door een externe partner. De resultaten zijn beschreven in een analyse die onder andere een overzicht geeft van de manier waarop statistiekdiensten in een 15-tal andere landen hiermee omgaan. Er worden ook adviezen geformuleerd gebaseerd op de specifieke situatie van de VSA. Bedoeling is om hiermee verder te gaan nadat het S-DWH is uitgerold.
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen a. Scoping dashboard	2021 Q3	Gerealiseerd	
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen b. Ontwerp- en ontwikkelingsfase visualisaties	2021 Q4	Gerealiseerd	
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen c. Testing beta versie	2022 Q1	Gerealiseerd	
2. Aanmaak visualisaties en dashboards met kerncijfers over Vlaanderen d. Launch	2022 Q2	Gerealiseerd	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen a. Rapportering Covid-bevraging	2021 Q2	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen b. Scoping verdere surveyplanning/uitbesteding	2021 Q2	Gerealiseerd	
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen c. Fit data-infrastructuur	2021 Q4	Gerealiseerd	Gestabiliseerde mixed-mode aanpak (mobile first / postaal) met aanbesteding veldwerk via extern bureau.
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen d. Uitbesteding veldwerk	2021 Q3	Gerealiseerd	Gestabiliseerde mixed-mode aanpak (mobile first / postaal) met aanbesteding veldwerk via extern bureau.
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen e. Rapportering SV 2021/2 en 2021/3	2021 Q4	Gerealiseerd	De geplande rapportering over de SV2- en SV3-bevraging vond plaats in het voorjaar 2022.
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen f. Rapportering Covid-vervolgbevraging	2022 Q2	Gerealiseerd	Veldwerk COVID-vervolgbevraging werd afgerond voor de zomer 2022. In november 2022 werd al een eerste rapport gepubliceerd met de resultaten over gezondheid, welzijn en sociale contacten. Op 15 december 2022 verscheen een rapport met de resultaten van de vragen over werk, inkomen, levenslang leren en digitalisering. Op 22 december 2022 volgt nog een derde en laatste rapport over wonen, mobiliteit, het welzijn van kinderen en de aanpak van de crisis door de overheid. Begin 2023 volgt nog een methodologisch rapport. Alle rapporten zijn beschikbaar op de website Statistiek Vlaanderen.
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen g. Ter beschikking stellen van de atomaire data Covid-vervolgbevraging aan partners binnen het netwerk Statistiek Vlaanderen en de wetenschappelijke wereld	2022 Q3	Gerealiseerd	Procedure aanvraag van microdata SV-bevragingen beschikbaar op website Statistiek Vlaanderen.
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR a. Pilotstudie	2022 Q3	Vertraging	De discussie omtrent de exacte governance en de betrokkenheid van de VSA werden in het najaar 2022 uitgeklaard en de afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst 'Online probability panel' met de VLIR. De samenwerkingsovereenkomst heeft op 19 december 2022 een gunstig advies van de Inspectie van Financiën ontvangen. De rekrutering van de panelliden start in 2023 en het bijkomende aandeel van 1.000 panelliden in het Vlaamse Gewest (bovenop de geplande

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
			2.000) wordt afgerond in het voorjaar 2024. Een eerste Vlaamse vragenmodule is voorzien voor het voorjaar 2024 met een oplevering van de data in de zomer 2024. De inhoudelijke voorbereidingen van de vragenmodule starten in 2023.
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR b. Eerste bevragingen	2022 Q4	Vertraging	Volgt op 4.a.
4. Uitbouw online probability panel survey i.s.m Vlaamse universiteiten via de VLIR c. Rapportering	2023 Q1	Vertraging	Volgt op 4.a.
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA): opvolgen Covid-19 survey VSA	2021 Q3	Gerealiseerd	
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA): versterken onderbouwd afwegingskader relance (dashboard)	2021 Q3	Gerealiseerd	
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid: Inzetten op thematische kennisnetwerken	2022 Q2	Gerealiseerd	In 2022 is ingezet op de thema's: economische veerkracht, slimme regelgeving en strategische verkenningen. Inzichten worden onder andere gebruikt bij de voortgangsrapportage.
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid: Graduele implementatie netwerkmodel Kennisoverheid	2022 Q4	Gerealiseerd	Het netwerkmodel Kennisoverheid Vlaanderen is concreet gemaakt via drie netwerkmomenten: op 8/09 in samenwerking met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Nederland; op 25/10 in samenwerking met onder andere de departementen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Omgeving (OMG) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB); en op 14/12 in samenwerking met de Oeso. De strategische inzichten worden ingezet bij de voortgangsrapportage van de Relance.
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevragingen h. Rapportering SV 2022/4	2022 Q3	Gerealiseerd	Vanaf eind september tot begin oktober 2022 zijn op basis van de SV4-bevraging (dataverzameling in voorjaar 2022) verschillende Vlaamse openbare statistieken geactualiseerd (o.a. algemene levenstevredenheid, sociale contacten, ...).

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
3. Uitbouw surveycapaciteit / SV bevestigingen i. Rapportering SV 2022/5 en SV 2022/6	2023 Q1	Op schema	In het najaar 2022 zijn de dataverzamelingen van 2 nieuwe SV-bevestigingen gelanceerd met een herhaling van thema's uit eerdere bevestigingen. SV5 bevat vragen over het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, cultuurparticipatie, sportparticipatie en subjectief welzijn. SV6 zoomt in op media, politieke participatie, vertrouwen in instellingen en tevredenheid met voorzieningen.
5. Versterking van de uitbouw van Strategische Inzichten en Analyse (SIA) met het oog op beter onderbouwd en toekomstgericht beleid: Verdere implementatie netwerkmodel Kennisoverheid (2023-2024)	2023 Q4	Op schema	De strategische inzichten worden verder ingezet bij de voortgangsrapportage. Speciale aandacht gaat naar de internationale uitstraling van Vlaanderen als veerkrachtige en innovatieve regio.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Beleids- en begrotingstoelichting naar aanleiding van de begrotingsuitvoering 2021

VV163 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - PAKKET VAN 500 MILJOEN EURO VOOR ZEER GOEDKOPE ACHTERGESTELDE LENINGEN AAN ENERZIJD'S START-UPS & SCALE-UPS EN ANDERZIJD'S KMO'S

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven, voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en interestvoet verschillen per doelgroep. Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 oktober 2021.</p> <p>Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hiervoor worden geen relancemiddelen ingezet.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	500.000.000 EUR
Output	Aantal door PMV verstrekte coronaleningen aan start-ups en scale-ups (doelgroep 1) en kmo's (doelgroep 2)
Outcome	De liquiditeitsbehoefte van Vlaamse bedrijven op middellange termijn, veroorzaakt door de coronacrisis, mee opvangen. Doelgroepen zijn enerzijds start-up-bedrijven en scale-ups en anderzijds mature kmo's die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Periode van toekenning en uitbetaling leningen afgesloten. Terugbetaling leningen doelgroep 2 gestart
Noodzakelijke politieke actie	Geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALLEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
Kapitaalsverhoging PMV	2020 Q2	Gerealiseerd			
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
Aantal uitbetaalde leningen KMO's (doelgroep 2)	500	2022 Q1	408	81,6 %	
Aantal uitbetaalde leningen start-ups / scale-ups (doelgroep 1)	200	2022 Q2	165	82,5 %	
Aantal uitbetaalde dossiers (bedrag uitbetaald)	250.000.000	2022 Q2	175.172.201	70,1 %	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	500.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	500.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 500.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 15 mei 2020 - COVID-19: Kapitaalsverhoging voor programma achtergestelde leningen Nota aan de VR van 17/12/2021 over het besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een overbruggingslening voor ondernemingen

VV164 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - EXTRA CAPACITEIT VOOR GIGARANT (3 MILJARD EURO) EN VOOR PMV-Z-WAARBORGEN (400 MILJOEN EURO) - HEFBOOM VOOR MAXIMALE BANCAIRE FINANCIERING

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Gigarant (3 miljard euro) Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot 15 oktober 2021, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.</p> <p>PMV/Z-Waarborgen (400 miljoen euro) De bestaande waarborgregeling bij PMV/z (Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) werd tijdelijk uitgebreid met de Waarborg Coronacrisis. Deze uitbreiding liep tot eind 2020 en wordt niet verlengd.</p> <p>Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.400.000.000 EUR
Output	Aantal dossiers met door een waarborg ondersteunde bankfinanciering gerealiseerd waarborgbedrag
Outcome	Oplossen van liquiditeitsnoden (vnl. voor werkkapitaal of investeringen) van Vlaamse ondernemingen via behoud of uitbreiding van bankfinanciering, teneinde op termijn groei van die ondernemingen te bewerkstelligen met bijhorend behoud of uitbreiding van de tewerkstelling in Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>Gigant-covid-waarborgen konden tot 30/6/2022 worden uitgegeven. In totaal werden 62 aanvragen ontvangen, waarvan de RVB van Gigant er 34 goedkeurde, voor een bedrag van 616 miljoen euro. Hiervan werden 30 waarborgen effectief uitgegeven, voor een bedrag van 605 miljoen euro. Bij 4 goedgekeurde waarborgen werd het aanbod uiteindelijk niet gerealiseerd.</p> <p>De corona-garantie van PMW/z-Waarborgen werd stopgezet. Er is in 2022 dus geen voortgang van te melden.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Gerealiseerd covid-19-waarborgbedrag	1.500.000.000	2022 Q2	605.000.000	40 %
Aantal gerealiseerde Gigant-covid-19-waarborgen	50	2022 Q2	30	60 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.400.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.400.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 3.400.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 2020 0405 DOC.0423 - decreet VR 2020 0405 DOC.0423 - nota

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2020 0405 DOC.0423 - memorie](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - advies SERV](#)

[VR 2020 0405 DOC.0423 - advies RVS](#)

VV165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS-PUBLIEK EN REST PRIVAAT)

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Vlaamse overheid gaat een Welvaartsfonds oprichten dat zal beleggen in kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen bij Vlaamse ondernemingen. De overheid zal op termijn een minderheidsparticipatie aanhouden in dat fonds, maar kan bij de opstart wel de meerderheid hebben. Er wordt bij PMV een kapitaalsverhoging van € 240 miljoen voorzien om dit fonds op te starten. Het is de bedoeling om hiermee een fonds ter waarde van € 500 miljoen op te zetten.</p> <p>Belangrijkste kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het fonds zal zich focussen op kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen met een looptijd van 4 jaar en meer, steeds in cofinanciering met private investeerders. - Naast institutionele beleggers zullen ook particulieren in het fonds kunnen investeren en daar een dubbel voordeel genieten: <ul style="list-style-type: none"> -- Ze krijgen een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar (de eerste drie jaar) met een maximum van € 1.000 per belastingplichtige. -- Bij erfenis zullen de aandelen overgaan mits betaling van een recht van 3% en niet meegerekend worden in de globalisatie van het vermogen. - Het fonds zal worden beheerd samen met private spelers. - Het fonds zal investeren in bedrijven die voldoen aan een ethisch kader. De doelgroepen zijn: <ul style="list-style-type: none"> -- start-ups en scale-ups die een financieringsnood hebben van meer dan € 800.000 door de coronacrisis: <ul style="list-style-type: none"> --- door een tijdelijke negatieve impact op de business; --- omdat kapitaalmarkten gesloten zijn; -- start-ups en scale-ups die een opportuniteit zien in de huidige crisis en bijkomende middelen nodig hebben om een versnelling hoger te kunnen schakelen; -- waardevolle, innovatiegedreven bedrijven die het doelwit kunnen worden van buitenlandse overnemers; -- bedrijven met een buy-out problematiek waar verankering en stabilisatie kan geboden worden -- Vlaamse dochterondernemingen van internationale groepen die bijvoorbeeld via een buy-out zelfstandig een toekomst kunnen hebben; -- alle innovatieve bedrijven (product, technologie, businessmodellen, diensten, enz...). - PMV zal vanaf het 6e jaar de liquiditeit van het fonds verzekeren aan boekwaarde voor de particuliere inschrijvers die

PROJECTOMSCHRIJVING

willen uittreden.

Dit fonds wordt in verschillende fasen gelanceerd.

- In een eerste fase verzamelt het Welvaartsfonds een consortium van sterke partners die zich engageren om samen te werken om de solvabiliteit te versterken van Vlaamse bedrijven die geïmpacteerd zijn door de coronacrisis. Aan de hand van een samenwerkingscharter scharen de partners zich zo achter het gezamenlijke doel om de welvaart voor Vlaanderen op lange termijn te verzekeren.
- In een tweede en derde fase – vanaf het tweede kwartaal van 2021 – wordt het fonds juridisch opgericht en verder opgeschaald. Vanaf dan zal het voor de institutionele investeerders (fase 2) en de particuliere spaarder (fase 3) ook mogelijk zijn om mee te investeren in Vlaamse bedrijven.

Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	240.000.000 EUR
Output	Aantal dossiers gesloten door het Welvaartsfonds
Outcome	De solvabiliteit versterken van Vlaamse bedrijven die positief (versnelde groeimogelijkheden) of negatief (bijkomende financieringsnoden) geïmpacteerd zijn door de coronacrisis: via kapitaalparticipaties, achtergestelde leningen en quasi-kapitaal

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	op 31/12/2022 werden 137 potentiële transacties geanalyseerd voor een totaal bedrag van ongeveer 855 mln. euro. 120 dossiers werden inmiddels gestopt. Inmiddels werden 5 investeringen gefinaliseerd, voor een totaal toegezegd bedrag van 19,1 mln. euro. hiervan werd 11,1 mln. euro al effectief geïnvesteerd. Bij de investeerders werd al ongeveer 10%, of 20 mln. euro opgevraagd. Uitbreiding scope Welvaartsfonds, naar het remediëren van de impact van diverse crisissen (incl. Oekraïne- en energiecrisis) werd geformaliseerd eind 2022.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Samenstellen consortium	2020 Q4	Gerealiseerd	
Kapitaalverhoging PMV en LRM	2021 Q1	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
oprichting fonds en eerste closing	2021 Q3	Gerealiseerd		
Opschalen fonds met institutionele investeerders	2021 Q3	Gerealiseerd	Voorlopig gerealiseerd. Een eventuele toekomstige nood aan verdere opschaling zou op dat moment bekeken worden i.f.v. de marktomstandigheden.	
Juridische oprichting fonds	2021 Q3	Gerealiseerd		
Opschalen fonds met private investeerders	Nog te bepalen	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Opgehaalde investeringsmiddelen (privé en publiek)	500.000.000	2021 Q4	205.000.000	41 %
Gerealiseerd investeringsbedrag vanuit het Welvaartsfonds	180.000.000	2024 Q4		
Aantal gerealiseerde investeringsdossiers vanuit het Welvaartsfonds	25	2024 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	240.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	240.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	85.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 240.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 29 januari 2021 - Kapitaalverhoging bij PMV nv en bij LRM nv

VV166 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALPARTICIPATIES EN WAARBORGEN - UITBREIDING VAN DE WIN-WIN-LENING EN VRIENDENAANDEEL

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Bedrijven, burgers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Winwinlening Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven.</p> <p>Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, werd de regeling voor deze lening versoepeld.</p> <p>Vriendenaandeel Met het Vriendenaandeel moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), gevestigd in het Vlaamse Gewest. De particuliere investeerder (vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot € 300.000 extra kapitaal ophalen.</p> <p>Het gaat hier om een uitbreiding van de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	
Output	Aantal geregistreerde Winwinleningen en Vriendenaandelen
Outcome	De solvabiliteit van Vlaamse kmo's versterken via achtergestelde leningen en kapitaalparticipaties door particulieren, en zo hun toegang tot (bancaire) financiering faciliteren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	In 2022 werden 5.174 winwinleningen geregistreerd voor een bedrag van 118,6 mln. euro. Dit is een daling van 22% in bedrag en 40% in aantal t.o.v. 2021, maar nog steeds het tweede hoogste bedrag ooit geregistreerd. In 2022 werden 444 vriendenaandelen geregistreerd voor een bedrag van 898.941 euro, t.o.v. 80 registraties voor 391.007 euro in 2021.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Uitbreiding winwinlening	2020 Q4	Gerealiseerd		
Vriendenaandeel operationeel	2021 Q1	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal geregistreerde winwinleningen sinds uitbreiding van het instrument	6000	2021 Q4	9.690	100 %
Geregistreerde winwinleningen (in bedrag) sinds uitbreiding	150.000.000	2021 Q4	183.600.000	100 %
Aantal geregistreerde vriendenaandelen sinds creatie van het instrument	1000	2024 Q4	37	4 %
Bedrag aan geregistreerde vriendenaandelen sinds creatie van het instrument	10.000.000	2024 Q4	310.000	3 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - BVR](#)

[VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - nota](#)

[VR 2021 2201 DOC.0051 Uitvoeringsbesluit vriendenaandeel - advies](#)

VV167 - UITVOERING MASTERPLAN SCHOLENBOUW 2

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Onderwijs en Vorming
Belanghebbenden	schoolbesturen, leerlingen, onderwijspersoneel

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	02. Investeren in infrastructuur

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Vlaamse Regering wil deze regeerperiode voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe investeringen in schoolinfrastructuur goedkeuren. De inhaalbeweging van de vorige regeerperiode wordt zo exponentieel doorgezet met een extra investeringsimpuls van 500 miljoen euro. Deze investeringsgolf biedt perspectief voor ruim 1.000 nieuwe of gerenoveerde scholen.</p> <p>Ten eerste wordt fors geïnvesteerd in de vervanging van de bestaande schoolinfrastructuur gezien het schoolpatrimonium verouderd is (actiepunt 167/1 Vervangingsinvesteringen).</p> <p>Ten tweede wordt extra capaciteit gecreëerd. Bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen wordt vooral gefocust op het secundair onderwijs, maar ook voor het eerst specifiek voor buitengewoon onderwijs, waar de noden het hoogste zullen zijn in de komende jaren (actiepunt 167/2 Extra capaciteit).</p> <p>Daarnaast wordt een derde DBFM-programma, Scholen van Vlaanderen, opgestart waardoor verder wordt ingezet op alternatieve financiering (actiepunt 167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen).</p> <p>Tot slot gebeuren er ook investeringen via huursubsidies met een jaarlijkse oproep (actiepunt 167/4 huursubsidies). Deze vier actiepunten m.b.t. de investeringsbeleid maken deel uit van het Masterplan Scholenbouw 2.0.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	3.078.000.000 EUR
Output	Via de verschillende actiepunten en subsidiepijlers worden de bestaande schoolgebouwen verbeterd en wordt nieuwe schoolinfrastructuur gebouwd.
Outcome	Een substantiële investering wordt gecreëerd voor het schoolgebouwenpatrimonium.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	in uitvoering na agendering VR

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Beschrijving voortgang	Momenteel worden de actiepunten, zoals vermeld in de projectomschrijving en de projectvoortgang, verder uitgevoerd.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
167/2 Extra capaciteit: goedkeuring door de Vlaamse Regering van extra capaciteitsprojecten voor in totaal 35,5 miljoen aan capaciteitsmiddelen.	2021 Q1	Gerealiseerd	
167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen: goedkeuring decretaal kader.	2021 Q4	Gerealiseerd	
167/2 Extra capaciteit: goedkeuring Vlaamse Regering van geografische verdeling capaciteitsmiddelen scholenbouw 2022-2024	2022 Q2	Gerealiseerd	
167/2 Extra capaciteit: goedkeuring selectie door de Vlaamse Regering.	2022 Q4	Gerealiseerd	
167/1 Jaarlijkse vervangingsinvesteringen; 167/4 Jaarlijkse huursubsidie	2024 Q2	Op schema	
167/3 Derde DBFM-programma Scholen van Vlaanderen: verdere uitrol van het DBFM-programma	2024 Q2	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	3.078.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	3.078.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 3.078.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2 -voorontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Memorie van toelichting. Bijlage](#)

[Evaluatie scholen van morgen. Bijlage](#)

[DBFM-scholen van Vlaanderen. Verslag alternatieven en meest passende uitvoeringsvorm. Bijlage](#)

VR 1 juli 2022 - Selectie en rangschikking scholenbouwprojecten van de eerste oproep in het kader van het DBFM-programma 'Scholen van Vlaanderen'

[Nota aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2 - voorontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Memorie. Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen](#)

[Advies van Vlor over het voorontwerp van decreet over DBFM-scholen van Vlaanderen. Bijlage](#)

[Nota aan de Vlaamse Regering van 1 oktober 2021 - ontwerp van Decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen - Definitieve goedkeuring](#)

[Ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen - Vlaamse Regering 1 oktober 2021 - Definitieve goedkeuring](#)

[Memorie van Toelichting van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen - Vlaamse Regering 1 oktober 2021 - Definitieve goedkeuring](#)

[Advies van de Raad van State. Over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap 'over DBFM-Scholen van Vlaanderen'](#)

[Mededeling van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2022. Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2 – DBFM Scholen van Vlaanderen - selectieleidraad](#)

[Bijlage. Selectieleidraad](#)

VV168 - VERSNELDE UITROL DIGITALE METERS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Fluvius

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>In samenwerking met intercommunales en private bedrijven investeren we ook in een versnelde uitrol van digitale meters (ongeveer 2 miljard euro investering door Fluvius gespreid over 10 jaar, waarvan 80% tegen 2025).</p> <p>Dit kadert in de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord en is in lijn met de Europese Richtlijn 2019/944 waarin de uitrol van digitale meters wordt bepaald. Uit een kostenbatenanalyse van 16 april 2020 uitgevoerd door VREG blijkt deze versnelde uitrol tot een hogere maatschappelijke winst te leiden. Bovendien wenst de Vlaamse Regering de baten van een digitale meter en de digitalisering van het energiesysteem zo snel mogelijk aan alle Vlamingen aan te bieden.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	
Output	Aantal geplaatste digitale meters
Outcome	Zoveel mogelijk netgebruikers maken actief gebruik van de mogelijkheden van de digitale meter. In de eerste plaats gaat het dan om een verbeterd inzicht in het energieverbruik via het webportaal van Fluvius of de lokale gebruikerspoorten. In een volgende stap kan het ook gaan over de mate van actieve sturing van het energiegebruik in functie van eigen productie of de noden van het net.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Aandacht nodig
Beschrijving voortgang	Eind oktober 2022 waren 2.014.513 digitale meters voor elektriciteit en aardgas geïnstalleerd. Dit komt overeen met 32% van de toegangspunten die beschikken over een kleinverbruiksmeterinrichting. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de terugdraaiende teller vernietigde, werd de uitrol bij bestaande prosumanten achteruit geschoven en is er bij heel wat netgebruikers nog steeds heel wat twijfel om een digitale meter te laten installeren. Ook omwille van corona werd een vertraging opgelopen. Hierdoor is een uitrol van 80% eind 2024 uitdagend. Ondertussen werd wel 96% van de budgetmeters omgebouwd naar een digitale meter. 31% van de

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>elektriciteitsmeters bij prosumenten is een digitale meter. Er werden 633.965 digitale meters geplaatst op vraag van de netgebruiker.</p> <p>297.690 netgebruikers volgen actief hun verbruik op via het portaal mijn.fluvius.be.</p>
Noodzakelijke politieke actie	Zorgen voor een voldoende groot draagvlak voor de digitale meter als noodzakelijke stap in de energietransitie is een blijvend aandachtspunt.

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Bestaande actieve budgetmeters zijn vervangen door een digitale meter.	2021 Q4	Vertraging	<p>Volgens het Energiebesluit zouden einde 2021 alle meters uit de proefprojecten en de budgetmeters vervangen moeten zijn door digitale meters. Omdat Fluvius zeer veel moeilijkheden ondervindt om bij de doelgroep van budgetmeters binnen te geraken voor de plaatsing van een digitale meter, is dit niet gelukt. Ondanks alle inspanningen: twee brieven, twee belpogingen en sms'en (indien gegevens beschikbaar), twee mails (indien gegevens beschikbaar) en twee huisbezoeken.</p> <p>Daarom is een aangepaste procedure via de LAC uitgewerkt. Doelstelling is om een afspraak te maken voor de plaatsing van een digitale meter. Indien dit niet lukt, vragen we toelating aan de LAC voor de plaatsing van een oplaadblokkade.</p>
De meters die geplaatst of geactiveerd werden in het proefproject slimme meters en in het proefproject digitale budgetmeter van de distributienetbeheerders zijn vervangen door een digitale meter.	2021 Q4	Gerealiseerd	
80% van de toegangspunten met een kleinverbruiksmeterinrichting beschikt over een digitale meter	2024 Q4	Vertraging	Gezien het arrest van het Grondwettelijk hof dat de virtueel terugdraaiende teller vernietigde bij digitale meters, werd de uitrol bij bestaande prosumenten achteruit geschoven en is er nog steeds heel wat twijfel om een digitale meter te laten installeren waardoor een uitrol van 80% eind 2024 uitdagend is.
100% van de toegangspunten met een kleinverbruiksmeterinrichting beschikt over een digitale meter	2029 Q3	Op schema	

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
% kleinverbruiksmeetinrichtingen met een bestaande actieve budgetmeter die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	100%	2021 Q4		96 %
% kleinverbruiksmeetinrichtingen die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	80%	2024 Q4	2.014.514	32 %
% kleinverbruiksmeetinrichtingen die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	100%	2029 Q3	2.014.514	32 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV169 - VERSNELDE UITROL GLASVEZELNETWERK EN 5G

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Belanghebbenden	Telecomoperatoren, intercommunales

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	03. Vlaanderen digitaal transformeren

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>De Vlaamse Regering streeft naar één open netwerk voor 5G. We onderzoeken hiervoor het concept van een tower company. Dit houdt in dat diverse aanbieders hun infrastructuur aanbrengen op een gezamenlijke basisinfrastructuur (bv. elke aanbieder plaatst antennes op een gezamenlijke mast). Op deze manier streven we in samenwerking met de mobiele operatoren in een versnelde uitrol van een glasvezelnetwerk en 5G. Voorwaarde is evenwel een snelle spectrumveiling op federaal niveau, zodat de betrokken operatoren zekerheid hebben over de frequenties waarover ze beschikken.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	
Output	n.v.t. (binaire output)
Outcome	Versnelde en brede uitrol van 5G en een glasvezelnetwerk (doormiddel van meer samenwerking tussen mobiele operatoren)

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Nog niet opgestart
Beschrijving voortgang	Het aanbod om 5G-uitrol via de oprichting van een TowerCo te faciliteren blijft gelden. Er lopen ondertussen gesprekken met enkele telecomoperatoren om te verkennen wat er mogelijk is.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Tweede versie concept paper voor oprichting 5G-TowerCo voor Vlaanderen	2021 Q2	Gerealiseerd		
Goedkeuring veiling 5G in België	2021 Q2	Gerealiseerd		
Overleg tussen telecomoperatoren en algemeen nutsbedrijf Fluvius over oprichten TowerCo	2022 Q3	Nog niet gestart		
Oprichting van een tower-company	2024 Q2	Nog niet gestart		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Onderzoek van het concept van een tower-company		2022 Q4	1	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV170 - FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAK VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Participatiemaatschappij Vlaanderen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>PMV beheert tevens het Flanders Future Techfund, dat in 2019 werd opgericht met een beschikbaar kapitaal van 75 miljoen euro. Dit kapitaal willen we aanwenden voor investeringen in innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) platformtechnologie.</p> <p>Het gaat hier dus om een injectie vanuit de reguliere werking van PMV die integraal met reguliere middelen van PMV wordt gefinancierd. Hier worden geen relancemiddelen voor ingezet.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	75.000.000 EUR
Output	Aantal gerealiseerde dossiers en geïnvesteerd bedrag
Outcome	Investeringen in beloftevolle technologieplatformen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	In totaal werden, sinds de start in 2021, al 28 potentiële transacties geanalyseerd. daarvan werden inmiddels 2 gefinaliseerd voor een bedrag van 5,5 mln. euro, waarvan 4,5 mln. euro al effectief werd geïnvesteerd. 6 dossiers zijn nog in analyse.
Noodzakelijke politieke actie	Geen

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG					
MIJLPALEN					
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING		
OUTPUT					
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD	
Gerealiseerd investeringsbedrag vanuit FFTF	65.000.000	2024 Q4			
Aantal gerealiseerde projecten vanuit FFTF	5	2024 Q4			

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	75.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	75.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 75.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 29 maart 2019 - oprichting Flanders Future Techfund
Nota aan de Vlaamse Regering van 12/11/2021 over de herpositionering van het Flanders Future Techfund

VV171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	IMEC

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>Imec (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) ontstaat in 1984 als onafhankelijk onderzoekscentrum voor micro- en later nano-elektronica. Het doel is om alle academische kennis rond chiptechnologie in Vlaanderen te bundelen. Sinds 2016 is ook iMinds (voorheen IBBT), het strategische onderzoekscentrum van Vlaanderen op het gebied van digitale innovatie, onderdeel van imec. Daardoor vind je bij imec vandaag zowel soft- als hardware onderzoek & ontwikkeling onder één dak.</p> <p>De onderzoekscleanroom van imec is het strategische fundament van de unieke positie van imec als wereldleidend onderzoekscentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Zonder de cleanroom infrastructuur kan imec zijn brugrol tussen de academische wereld en de industrie niet spelen aangezien de cleanroom essentieel is om de industriële toepasbaarheid van de innovatieve concepten aan te tonen in een relevante productieomgeving. Tegen eind 2022 botst imec op de grenzen van de huidige cleanroom capaciteit. Dit resulteert in de nood tot ingebruikname van de “casco” cleanroom extensie die beschikbaar is binnen de huidige infrastructuur.</p> <p>Sinds zijn oprichting heeft imec zich ook als doelstelling gezet om spinoffs op te richten. Het creëren van startups, waarbij unieke hardware het verschil maakt, is echter zeer kapitaalintensief en risicovol. Om de oprichting van dergelijke kapitaalintensieve hardware spin-offs voldoende te kunnen ondersteunen, heeft imec samen met de Vlaamse Overheid in 2017 het Imec.xpand fonds gelanceerd, een onafhankelijk investeringsfonds dat intussen 117 miljoen euro kapitaal heeft opgehaald. De middelen komen voor meer dan 60% van privé-investeerders, waaronder verschillende buitenlandse investeerders. Imec.xpand werd opgezet als een traditioneel fonds met een investeringsperiode van 5 jaar en een totale looptijd van 10 jaar die 2 keer met een jaar verlengd kan worden. De investeringsperiode loopt binnenkort ten einde. Daarom is er beslist om een nieuw Imec.xpand fonds op te zetten, met het doel om 120 miljoen op te halen bij investeerders verdeeld over overheids- en overheidsgerelateerde entiteiten, universiteiten en internationaal gereputeerde technologiebedrijven. Het is de bedoeling om van start te gaan met een eerste closing van € 60 miljoen euro ten laatste in Q1 2022 en in 2022 de rest van het fonds te closen.</p> <p>Zowel de kapitaalsverhoging van Finlab als die van Fidimec worden gefinancierd via esr8 kapitaal, dat voorzien wordt bij begrotingsaanpassing 2021.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	70.000.000 EUR

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Output	1. ingebruikname van de casco cleanroom extensie 2. opstart imec.xpand II fonds
Outcome	1. het verrichten van grensverleggend strategisch onderzoek inzake nanotechnologie en digitale technologie, om de industriële toepasbaarheid van de innovatieve concepten aan te tonen in een relevante productieomgeving 2. start-ups in een vroeg stadium van voldoende financiële middelen voorzien: investeren in een aantal start-ups

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	1.3 voorontwerp cleanroom indienen: Voorontwerp is afgerond. 90% van de werkpakketten (= detailed design en uitvoering) zijn reeds gekocht. 1.4 oplevering van alle werken: uitvoering van de werken on site zijn gestart in oktober 2022. Huidige detailplanning blijft uitgaan van 100% oplevering in Q4 2023.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
1.1 kapitaalverhoging Finlab nv van 40 miljoen euro	2021 Q2	Gerealiseerd	
1.2 goedkeuring aandeelhoudersovereenkomst Finlab nv	2021 Q4	Gerealiseerd	
1.3 voorontwerp cleanroom indienen	2022 Q2	Gerealiseerd	Voorontwerp is afgerond met vertraging veroorzaakt door Covid en Brexit (zie rapportering juni 2022). 90% van de werkpakketten (= detailed design en uitvoering) zijn reeds gekocht.
1.4 oplevering van alle werken	2023 Q4	Op schema	uitvoering van de werken on site is gestart in oktober 2022. Huidige detailplanning blijft uitgaan van 100% oplevering in Q4 2023
1.5 ingebruikname van de cleanroom	2023 Q4	Nog niet gestart	
2.1 kapitaalverhoging Fidimec nv van 30 miljoen euro	2021 Q2	Gerealiseerd	
2.2 goedkeuring aandeelhoudersovereenkomst Fidimec nv	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
2.3 eerste closing van het imec.xpand 2	2022 Q2	Gerealiseerd	De closing vond plaats op 23 maart 2022 met een toegezegd kapitaal van EUR 138.660.000.

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	70.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	70.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	36.822.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 70.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
<p>1. Kapitaalsverhoging van Finlab nv in het kader van de uitbreiding van de 'casco' Imec cleanroom extensie (VR 2021 2105 VV DOC.0057) en actualisering van de aandeelhoudersovereenkomst van Finlab nv naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Finlab nv, bestemd voor de ingebruikname van de 'casco' Imec cleanroom extensie (VR 2021 1012 VV MED.0019)</p> <p>2. Kapitaalsverhoging van FIDIMEC nv in het kader van de participatie in het Imec.xpand II investeringsfonds (VR 2021 0705 VV DOC.0046) en actualisering van de aandeelhoudersovereenkomst van Fidimec nv naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Fidimec nv, bestemd voor de participatie in het Imec.xpand II investeringsfonds (VR 2021 1510 VV MED.0016)</p> <p>Nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Kapitaalsverhoging van FIDIMEC nv in het kader van de participatie in het Imec.xpand II investeringsfonds</p>

VV172 - INVESTERINGEN IN VLAGGENSCHIPRELANCEPROJECTEN VAN DE VLAAMSE HAVENS INZAKE CO2 CAPTATIE & HERGEBRUIK

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Vlaamse havens, bedrijven

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Investerings in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO2 captatie & hergebruik => zitten deels in de enveloppe O&O en moet op specifiek projectniveau opgevolgd worden door Vlaio. Zij werken met open calls die bottom up worden ingevuld.</p> <p>De klimaatdoelstellingen hebben tot doel de netto uitstoot van CO2 te beperken, wat kan bereikt worden door de energie-efficiëntie op te drijven, processen te veranderen of andere producten aan te maken. Niettemin is het niet altijd mogelijk de aanmaak van CO2 te vermijden. In deze gevallen bestaat er een mogelijkheid om de aangemaakte CO2 af te vangen en ofwel na conditionering te transporteren voor opslag (CCS) ofwel om ze aan te wenden mits de inzet van hernieuwbare energie (CCU).</p> <p>De Vlaamse zeehavens, in het bijzonder de haven van Antwerpen en Northseaport zijn een uitermate geschikte locatie om de uitstoot aan CO2 te reduceren door deze af te vangen en op te slaan. De haven van Antwerpen huisvest de grootste Europese geïntegreerde energie- en chemiecluster en in Northseaport is er een belangrijke concentratie aan zware industrie, waaronder het geïntegreerde staalbedrijf ArcelorMittal. Verschillende belangrijke industriële processen van deze basisindustrie genereren inherent CO2 en de piste CCS/CCU kan in deze gevallen een oplossing aanreiken.</p> <p>De beoogde toepassingen van CCU noodzaken de aanmaak van groene waterstof aan de hand van hernieuwbare energie, de captatie en de verwerking van CO2 en de synthese van beide tot een bruikbare grondstof, bv methanol. In het kader van de IPCEI Waterstof (zie fiche VV047) zijn er mogelijkheden om innovatieve projecten, waaronder zogenaamde First Industrial Deployments te steunen, die tot doel hebben groene waterstof te genereren of die de synthese van bv groene methanol aan de hand van afgevangen CO2 en groene waterstof tot doel hebben. Er is echter een lacune voor de steun aan (innovatieve) projecten, die de captatie en verwerking van CO2 tot doel hebben. Dit is het onderwerp van het voorliggende project.</p> <p>De mogelijkheden om de bedoelde Vlaamse projecten te steunen zijn: Vlaamse steun, al dan niet via de reguliere kanalen, en Europese steun, op de eerste plaats via het ETS Innovatiefonds. Voor minstens twee belangrijke projecten in deze context werd een Letter of Intent (LOI) tot Vlaamse ondersteuning, ondertekend door de Vlaamse minister bevoegd voor innovatie, aangeleverd ter ondersteuning van de aanvraag bij het ETS Innovatiefonds. Vlaamse</p>

PROJECTOMSCHRIJVING

cofinanciering met als doel het verhogen van de slaagkans bij de evaluatie door het ETS Innovatiefonds behoort immers tot de mogelijkheden. Het is voor alle duidelijkheid mogelijk dat er zich bijkomende bedrijfsprojecten met het oog op de captatie en de verwerking van CO2 uit de zeehavens aanbieden voor ondersteuning.

INPUT, OUTPUT, OUTCOME

Input	10.000.000 EUR
Output	De voorziene middelen worden onder de vorm van een subsidie toegekend als Vlaamse cofinanciering voor één of meerdere investeringen in CCUS.
Outcome	De toe te kennen subsidie is een essentieel element om de CCUS investering te (kunnen) laten doorgaan. Uiteindelijke outcome is een beschikbare, operationele CCUS installatie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG

Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	<p>Het project is reeds besproken door de Vlaamse regering maar nog niet geformaliseerd (Kairos) omdat het een project is met Europese financiering en er wordt gewacht op een akkoord van de Europese Unie ivm staatssteun.</p> <p>Overleg met EC leverde een potentiële doorbraak op. De bedoelde dossiers kunnen op basis van de huidige werkversie van de nieuwe groepsvrijstellingsverordening (GBER) gesteund worden, op dit moment dus nog voorwaardelijk. De nieuwe versie van de GBER wordt verwacht eind Q1/2023. In geval van twijfel zal EC/DG COMP informeel advies leveren.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALEN

MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Steunbeslissing EC of Vlaamse overheid betreffende Vlaamse projecten CO2-captatie en/of -verwerking.	2021 Q4	Gerealiseerd	Het project is besproken op de Vlaamse regering maar nog niet geformaliseerd (Kairos) omdat het een project is met ook Europese financiering en er wordt gewacht op akkoord EU ivm staatssteun.
Aanvang projectuitvoering Vlaamse projecten CO2-captatie en -verwerking	2030 Q4	Nog niet gestart	FID verwacht eind 2023.
Definitieve Investeringsbeslissing Vlaamse projecten CO2-captatie en/of -verwerking	2030 Q4	Nog niet gestart	Verwacht vanaf begin 2024.

OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Beslissing VR toekenning Vlaamse subsidie	1	2022 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	10.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	10.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV173 - AD HOC INVESTERINGSMIDDELEN ALS COFINANCIERING VOOR EUROPESE STEUN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Agentschap Innoveren en Ondernemen
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We volgen de Europese subsidie- en financieringsmogelijkheden op met het oog op het realiseren van projecten in Vlaanderen op het vlak van innovatie, klimaat en duurzaamheid. Waar nuttig en mogelijk voorzien we aanvullende Vlaamse cofinancieringsmiddelen die inspelen op Europese financieringsmogelijkheden op het vlak van innovatie en duurzaamheid. In de context van projecten voor het ETS-innovatiefonds, kan het gaan om Vlaamse cofinanciering vanuit de reguliere enveloppes O&O en ecologiesteun in het Fonds Innoveren & Ondernemen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	
Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Opgestart
Beschrijving voortgang	De permanente monitoring van subsidiemogelijkheden via Europese kanalen voor projecten op het vlak van innovatie en duurzaamheid is een continu proces dat deel uitmaakt van de recurrente werking binnen het beleidsdomein EWI.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Permanente monitoring Europese opportuniteiten	2021 Q1	Op schema	
Start toekenning Vlaamse cofinanciering voor projecten met Europese steun	2021 Q2	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

VV174 - NOODKOOPLeningen

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Zuhal Demir
Trekkende entiteit VO	Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	OCMW's, energiehuizen en noodkopers

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	01. Economie en samenleving verduurzamen

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Het Noodkoopfonds is er op gericht om via projecten van OCMW's renteloze leningen te verstrekken aan noodkopers voor de renovatie van hun woning. Noodkopers zijn eigenaars van kwalitatief en energetisch slecht scorende woningen, die door een gebrek aan financiële middelen hieraan niet kunnen remediëren.</p> <p>OCMW's die deelnemen aan de projectoproep kunnen een renteloze kredietlijn bekomen van maximaal 1.800.000 euro, waarmee noodkoopleningen kunnen verstrekt worden van maximaal 30.000 euro (voor de nieuwe projectoproep in 2022 werd dit bedrag opgetrokken tot maximaal 50.000 euro). Deze noodkooplening dient pas te worden terugbetaald bij vervreemding van de woning, of uiterlijk na 20 jaar (voor de nieuwe projectoproep in 2022 zal dit worden opgetrokken tot 25 jaar), gespreid over een periode van 20 jaar.</p> <p>Dit project wordt volledig gefinancierd met reguliere middelen.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	40.000.000 EUR
Output	Minimaal 850 gerenoveerde noodkoopwoningen die voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, vermeld in artikel 3.1 van de Vlaamse codex Wonen.
Outcome	Energiebesparing bij de minimaal 850 gerenoveerde noodkoopwoningen en overeenkomstige broeikasgasemissiereductie.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Op 8 juli 2022 werden verdere optimalisaties doorgevoerd aan het Energiebesluit waardoor het maximaal ontlendingsbedrag per noodkoopwoning wordt opgetrokken van 30.000 tot 50.000 euro. Ook werd de werkingsvergoeding per noodkoopwoning waarvoor een lening wordt verleend

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>verhoogd naar 3.000 euro. Er werd voorzien dat projecten waarbij 75% van de toegekende kredietlijn niet opgenomen is binnen de vijf jaar gedurende twee jaar vanaf het verstrijken van de voormelde termijn van vijf jaar worden uitgesloten van deelname aan volgende projectoproepen. Voor de projecten uit de twee eerste calls wordt voorzien in een overgangsbepaling.</p> <p>In september 2022 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd. In kader van deze projectoproep werden 30 nieuwe projecten gegund voor een totaal budget van 21,05 miljoen euro.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Evaluatie NKF + formuleren optimalisatievoorstellen	2021 Q2	Gerealiseerd		
Lancering projectoproep 2021	2021 Q3	Gerealiseerd		
Projectoproep 2021 gegund	2021 Q4	Gerealiseerd		
Evaluatie call 2021	2022 Q1	Gerealiseerd		
Goedkeuring VR optimalisatievoorstellen	2022 Q2	Gerealiseerd	Besluitwijziging goedgekeurd 8 juli 2022	
Lancering projectoproep 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	Projectoproep gelanceerd 12/09/2022.	
Projectoproep 2022 gegund	2022 Q4	Gerealiseerd		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
gerenoveerde noodkoopwoningen	125	2026 Q4	5	4 %
Gerenoveerde noodkoopwoningen	725	2027 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	40.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	40.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 40.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - BVR](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - nota](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - bijlage](#)

[VR 14 februari 2020 Noodkoop - advies](#)

[VR 16 juli 2021 - nota](#)

[VR 16 juli 2021 - BVR](#)

[VR 8 juli 2022 - nota](#)

[VR 8 juli 2022 - BVR](#)

VV175 - UITBREIDINGSBUDGET VOOR WELZIJN EN ZORG

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	De inzet van de bijkomende middelen wordt tripartite afgesproken in het kader van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025, waarbij zowel werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties betrokken zijn. De middelen worden ingezet ten behoeve van het personeel en de gebruikers in de betrokken sectoren. Het uitbreidingsbeleid welzijn en zorg kent een ruimer spectrum aan belanghebbenden en richt zich op de bredere Vlaamse bevolking, in de eerste plaats mensen met een zorgnood of vraag naar andere ondersteuning.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING	
<p>De Vlaamse Regering voorziet naast het VIA-budget van 577 miljoen euro ook 562,5 miljoen extra middelen voor uitbreidingsbudget voor Welzijn en zet deze versneld in. In totaal wordt zo in het relanceplan "Vlaamse Veerkracht" 1,1 miljard euro voorzien voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector.</p> <p>Deze middelen worden ingezet voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere verloning van het (zorg)personeel en aantrekkelijker maken van beroep (o.m. via positieve beeldvorming, werken op (zij-)instroom en retentie, extra kwalificerende opleidingen, enz.); - Capaciteit: extra uitbreiding van het zorgaanbod in allerlei sectoren; - Kwalitatieve verbeteringen, verlichting van de werkdruk enz.; - Hervormingen: IFIC, ontschotting enz. <p>Via het uitbreidingsbeleid wordt bijkomend geïnvesteerd in personen met een handicap, de ouderenzorg (meer personeel en betaalbaarheid), jeugdhulp, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, gezondheidsbeleid en preventie.</p> <p>Uitbreidingsbeleid (opstap 2020 + op kruissnelheid in 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personen met een handicap: 270 mio euro; - Ouderenzorg: 140 mio euro; - Jeugdhulp: 61,4 mio euro; - Kinderopvang: 58 mio euro; - Geestelijke gezondheidszorg: 18,6 mio euro; - Preventie en gezondheidsbeleid: 14,5 mio euro; <p>Totaal: 562,5 mio euro.</p>	

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	1.139.500.000 EUR
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Betere loonvoorwaarden: naar een gefaseerde invoering of uitrol van IF.IC (nieuwe functieclassificatie met bijhorend loonhuis); - Betere arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijker maken van beroep: o.m. via thuiswerk, verlaging werkdruk, opleiding, positieve beeldvorming, werken op (zij-)instroom, extra kwalificerende opleidingen, ... - Extra personeel, los van het uitbreidingsbeleid: ca. 3.000 VTE; - Extra uitbreiding van het zorgaanbod in allerlei sectoren: zie uitbreidingskalender.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Betere verloning van het personeel in de zorg- en welzijnssectoren. - Aantrekkelijker maken van werken in de zorg- en welzijnssectoren, met focus op knelpuntberoepen. - Extra uitbreiding van het zorgaanbod in verschillende sectoren.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De middelen voor VIA 6 en het uitbreidingsbeleid 2022 zijn in de begroting 2022 voorzien, de verdere uitrol van het uitbreidingsbeleid is voorzien in de meerjarenraming.</p> <p>Het voorakkoord VIA 6 werd gesloten op 24/11/2020. Er werd op 30/03/2021 een akkoord bereikt over het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025.</p> <p>Het BVR betreffende de verdeling van de VIA-middelen voor 2022 is goedgekeurd op de VR van 15 juli 2022. Een tweede BVR betreffende bijkomende indexeringen en de verdeling van het nog niet toegekende budget op 15 juli 2022, is goedgekeurd op de VR van 16 december 2022.</p> <p>Het uitbreidingsbeleid wordt stapsgewijs ingevuld volgens de in de Vlaamse Regering bepaalde prioriteiten en de ter beschikking gestelde budgetten.</p> <p>Een aantal engagementen uit het uitbreidingsbeleid worden versneld uitgevoerd. Over de belangrijkste componenten hierin wordt apart gerapporteerd in de projecten VV045 (ouderenzorg) en de projecten VV121 en VV180 (personen met een handicap).</p>
Noodzakelijke politieke actie	<p>De verdeling en indexering van het budget voor 2022 is goedgekeurd door de VR.</p> <p>Alle bevoegde administraties passen na verdeling van de middelen de desbetreffende besluiten waar nodig aan, en kennen de middelen vervolgens toe aan de rechthebbende voorzieningen.</p> <p>Vanaf 2023 wordt de verdeling van het budget geregeld via de begrotingsopmaak en -aanpassing, naar analogie van de voorgaande VIA</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Van voorakkoord naar akkoord	2021 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Verdeling middelen 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Verdeling middelen 2022	2022 Q4	Gerealiseerd	
Verdeling middelen 2023-2025	2025 Q4	Op schema	
Uitvoering door sociale partners via CAO's en protocollen 2021-2025	2025 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	1.139.500.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	1.139.500.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 1.139.500.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
VR 2020 2711 MED.0378: Voorakkoord zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 24/11/2020 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025
VR 2020 2711 MED.0378: Voorakkoord zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 24/11/2020 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025 - bijlage
VR 2020 1812 DOC.0075: Decreet uitgavenbegroting voor begrotingsjaar 2021
VR 2021 0204 MED.0131/1: Definitief akkoord VIA6 goedkeuring - mededeling
VR 2021 0204 MED.0131/1: Definitief akkoord VIA6
VR 2021 1607 DOC.0967-1: Verdeling budget VIA6 private WVG, WSE en publ. PVT voor het jaar 2021
VR 2021 1607 DOC.0967-2: Verdeling budget VIA6 private WVG, WSE en publ. PVT voor het jaar 2021 - BVR
VR 2021 1211 DOC.1272-1 socioQ publiek Herverdeling - nota

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[VR 2021 1211 DOC.1272-2 SocioQ publiek Herverdeling - BVR](#)

VR 2022 1507 DOC.0906-1BIS Verdeling budget VIA6 2022 - nota

VR 2022 1507 DOC.0906-2BIS Verdeling budget VIA6 2022 - BVR

VR 2022 1612 DOC.1428-1 Bijkomende indexering budget VIA6 - nota

VR 2022 1612 DOC.1428-2 Bijkomende indexering budget VIA6 - BVR

VV176 - ZIJINSTROOM VANUIT DE PRIVÉSECTOR NAAR HET ONDERWIJS AANTREKKELIJK MAKEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Ben Weyts
Trekkende entiteit VO	Departement Onderwijs en Vorming
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Toekomstige zijinstromers, scholen en schoolteams

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>We maken vanaf 1/9/'20 zijinstroom vanuit de privésector naar het onderwijs aantrekkelijker voor een aantal knelpuntvakken- en ambten in het basis- en secundair onderwijs door de in de privésector opgebouwde geldelijke anciënniteit voor nieuwe zijinstromers te honoreren voor maximum 8 jaar. We willen met deze maatregel extra zijinstromers aantrekken en zo het lerarentekort mee helpen wegwerken. Met terugwerkende kracht - vanaf 1/12/'21 - breiden we deze maatregel uit. Enerzijds door een aantal vakken en ambten toe te voegen aan de knelpuntenlijst, anderzijds door het maximum aantal jaren anciënniteit dat kan worden meegenomen vanuit de privésector op te trekken van 8 naar 10 jaar.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	4.000.000 EUR
Output	Na het eerste jaar was er 2.000.000 Euro reeds aangewend budget
Outcome	Door de uitbreidingen enerzijds en door de aandacht voor deze maatregel in de media zien we een stijging van het aantal aanvragen. De voorbije twee schooljaren konden al minstens 1.100 zijinstromers die de overstap maakten van de privésector naar één van de opgenomen knelpuntvakken en -ambten genieten van deze maatregel.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	<p>De Vlaamse regering keurde op 9 september 2022 het ontwerp van besluit tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen definitief goed.</p> <p>Daarin werd deze maatregel met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2021 uitgebreid: enerzijds werden een aantal vakken en ambten toegevoegd aan de knelpuntenlijst, anderzijds werd</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	vanaf 1 december 2021 het maximum aantal jaren dienstanciënniteit dat kan worden meegenomen vanuit de privésector opgetrokken van 8 naar 10 jaar.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Basisonderwijs: 383 FTE - 455 stamnummers Secundair onderwijs: 292 FTE – 495 stamnummers	2021 Q2	Gerealiseerd	
Monitoring van de maatregel in 2021	2021 Q3	Gerealiseerd	
Uitbreiding lijst knelpuntvakken- en ambten	2022 Q3	Gerealiseerd	Het ontwerp van besluit werd definitief goedgekeurd op 9 september.
Monitoring van de maatregel in 2022	2022 Q3	Gerealiseerd	<p>In 2022 had de maatregel betrekking op 871 FTE met een budgettaire impact van 6.490.000 euro.</p> <p>Maken we een opsplitsing tussen basis- en secundair onderwijs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basisonderwijs : 241 FTE en 1.796.321 euro - Secundair onderwijs: 630 FTE en 4.694.234 euro <p>Bij opmaak van de maatregel werd begroot dat deze 4 miljoen euro (per jaarlijkse cohorte!) zou kosten. Ondanks de uitbreiding van de maatregel, concluderen we dat nog steeds niet het volledig begrootte bedrag wordt aangewend.</p>
Monitoring maatregel 2023	2023 Q3	Nog niet gestart	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	4.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	4.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Brexit-fonds: 0 EUR
- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 4.000.000 EUR

VV177 - IMPLEMENTATIE VAN DE VLAAMSE JOBBONUS

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Werk en Sociale Economie
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Departement Werk en Sociale Economie
Belanghebbenden	Werkende Vlamingen en Vlamingen die aan het werk willen gaan, sociale partners, nog andere te bepalen stakeholders

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Werken moet lonen. Om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten en tevens de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen, wordt er vanaf 2021 een Vlaamse jobbonus ingevoerd. Die bedraagt netto maximaal 600 euro op jaarbasis voor mensen die voltijds werken en hierbij tot maximaal 1.800 euro bruto per maand verdienen. Het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt vervolgens uitgefaseerd richting een bruto maandloon bij voltijdse prestatie van 2.500 euro. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt rekening gehouden met het werkelijk aantal gepresteerde uren.</p> <p>De jobbonus heeft de dubbele doelstelling om mensen enerzijds te activeren en anderzijds werken te belonen. De maatregel is bedoeld om meer mensen aan de slag te krijgen en te houden; in het bijzonder voor mensen met lage inkomens is het verschil tussen werken en niet werken vaak te klein om aan de slag te gaan of aan de slag te blijven.</p> <p>Naast de jobbonus voor loontrekkenden komt er ook een jobbonus + voor zelfstandigen. De jobbonus + richt zich op werknemers met een laag inkomen (< 2.500 bruto per maand, afgestemd op de bovengrens van de jobbonus) die de transitie maken van werknemer naar ondernemer in hoofdberoep. De jobbonus+ is voor de laatste groep een stimulus om de transitie naar ondernemerschap in hoofdberoep te maken. In die zin wordt de jobbonus verlengd voor wie de overstap maakt naar ondernemer in hoofdberoep door een premie van €600 euro bij opstart als zelfstandige in hoofdberoep (mits men voldoet aan de voorwaarden) en een bijkomende premie van €600 wanneer men na 1 jaar nog steeds zelfstandige in hoofdberoep is.</p> <p>De jobbonus en de jobbonus plus zijn dus sterk met elkaar gecorreleerd en als één geheel te beschouwen. De jobbonus richt zich tot de loontrekkenden waar de jobbonus wordt berekend op basis van het loon en het tewerkstellingspercentage. Voor de zelfstandigen is er geen tewerkstellingspercentage beschikbaar en spreken we niet van een loon maar een inkomen. Voor de zelfstandigen werd er aldus geopteerd om te werken met een vaste premie gekoppeld aan de start als zelfstandige in hoofdberoep en het blijven uitoefenen van deze activiteit, de jobbonus plus voor startende zelfstandigen.</p> <p>Er wordt eveneens een toepassing ontwikkeld om het uit te betalen bedrag te kunnen bepalen op basis van input uit authentieke bronnen waar beschikbaar en manuele invoer waar niet beschikbaar. De ontwikkeling van deze toepassing is opgenomen in VV128.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	197.000.000 EUR
Output	Aantal uitbetaalde jobbonussen en jobbonus+
Outcome	Aanmoedigen van mensen met lage inkomens om aan de slag te gaan of aan het werk te blijven. Aanmoedigen om als werknemer met een laag inkomen de stap te zetten naar zelfstandige in hoofdberoep.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>De jobbonus is een nieuwe beleidsmaatregel waarmee de Vlaamse Regering wil tegemoet komen aan de landenspecifieke aanbevelingen vanuit de Europese Commissie om werkenden een bijkomende positieve financiële prikkel te geven om aan het werk te gaan of te blijven. De doelgroep van de jobbonus bestaat uit personen met een laag beroepsinkomen. Er wordt gekozen voor een premie die toegekend wordt op basis van het loon op jaarbasis.</p> <p>Het decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 20 mei 2022. Het BVR tot uitvoering van het decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 april 2022 en definitief op 1 juli 2022. Het voorstel tot het toekennen van 100 euro extra (naar aanleiding van de Septemberverklaring) werd aanvaard op 18 oktober 2022 door het Vlaams Parlement.</p> <p>Naast de jobbonus voor werknemers zullen ook werknemers met een laag inkomen die ondernemer worden een jobbonus plus ontvangen. Die premie moet het ondernemerschap stimuleren door in de jobbonus nog voor twee jaar te verlengen (twee maal een schijf van 600 euro). Het decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus aan startende zelfstandigen werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 juli 2022. Het BVR werd definitief goedgekeurd op 10 november 2022.</p>
Noodzakelijke politieke actie	<p>De fiscale vrijstelling van de jobbonus is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen starten met de uitbetaling van de maatregel. De fiscale vrijstelling werd gevraagd aan de Federale overheid voor de jobbonus, en de jobbonus plus. De fiscale vrijstelling werd federaal plenair goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 november 2022.</p> <p>Aan Federaal Minister Lalieux wordt gevraagd om de jobbonus vrij te stellen als een bestaansmiddel bij het toekennen van het leefloon.</p>

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Definitieve goedkeuring decreet jobbonus	2022 Q2	Gerealiseerd	
Definitieve goedkeuring decreet jobbonus+	2022 Q3	Gerealiseerd	
Definitieve goedkeuring BVR jobbonus	2022 Q2	Gerealiseerd	
Definitieve goedkeuring BVR jobbonus+	2022 Q3	Gerealiseerd	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALLEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
Eerste betaling loontrekkenden	2022 Q4	Gerealiseerd		
Eerste betaling ondernemers	2023 Q1	Op schema		
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aantal uitbetaalde jobbonussen Opgelet: Het finaal aantal is momenteel nog niet gekend. Er moeten nog een aantal dossiers berekend worden. Er werden momenteel reeds 743.492 dossiers bezorgd aan VLABEL waarvan VLABEL er op 3 januari 2023 reeds 434.684 dossiers heeft uitbetaald.	733.280 voor het referentiejaar 2021	2022 Q4	434.684	59,3 %
Aantal uitbetaalde jobbonus+ (timing afhankelijk van afbakening doelgroep in decreet/BVR)	Timing en streefwaarde nog afhankelijk van de concrete afbakening van de doelgroep in decreet/BVR (verwacht bereik op jaarbasis: 12.000 personen)	2023 Q1		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	329.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	197.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 197.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING
Voorontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus principieel goedgekeurd op de VR van 19 november 2021:

AGENDERING VLAAMSE REGERING

- Nota Vlaamse Regering: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6196B673364ED9000800028E>
- Ontwerp van decreet: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6196B67F364ED90008000290>
- Memorie van toelichting: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6196B68F364ED90008000292>

Voorontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus voor de tweede keer principieel goedgekeurd op de VR van 23 december 2022:

- Nota Vlaamse Regering: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61C479DE364ED900080006B8>
- Ontwerp van decreet : <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61C479DE364ED900080006B7>
- Memorie van toelichting: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61C479DE364ED900080006B6>
- Advies SERV: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61C479DE364ED900080006B5>
- Advies VTC: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61C479DE364ED900080006B5>

Voorontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus definitief goedgekeurd op de VR van 11 maart 2022

- Nota Vlaamse Regering: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62270E8D6BB7B593CFC182A3>
- Ontwerp van decreet: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62270E8D6BB7B593CFC182A4>
- Memorie van toelichting: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62270E8D6BB7B593CFC182A2>
- Advies Raad van State: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62270E8D6BB7B593CFC182A1>

Bekrachtiging ontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus op de Vlaamse Regering van 20 mei 2022: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6286053E479218B0ED55BCEC>

Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus principieel goedgekeurd op de VR van 1 april 2022: [BVR](#) + [nota Vlaamse Regering](#)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus definitief goedgekeurd op de VR van 1 juli 2022

- Nota Vlaamse Regering: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62BAAC628E6C4430A8896BA7>
- Besluit Vlaamse Regering <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62BAAC628E6C4430A8896BA8>
- Adviezen:
 - <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62BAAC628E6C4430A8896BA6>
 - <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62BAAC628E6C4430A8896BA5>
 - <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62BAAC628E6C4430A8896BA9>

AGENDERING VLAAMSE REGERING

-

Bekrachtiging en afkondiging van het decreet tot wijziging van artikel 5 en 6 van het decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus op de Vlaamse Regering van 18 oktober 2022

<https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/63516B4D1EA6B745D23CC222>

[Mededeling aan de Vlaamse Regering betreffende conceptnota Jobbonus+ en transitiepremie voor startende zelfstandigen goedgekeurd op de VR van 19 november 2021](#)

Voorontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen principieel goedgekeurd op 20 mei 2022 <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62A6CFC594D257C3524663B4>

Voorontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen definitief goedgekeurd op 13 juni 2022

- Nota Vlaamse Regering: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62A6CFC694D257C3524663B8>
- Memorie <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62A6CFC594D257C3524663B6>
- Ontwerp van Decreet <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62A6CFC594D257C3524663B5>
- Adviezen
 - <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62A6CFC594D257C3524663B3>
 - <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62A6CFC594D257C3524663B7>
 - <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62A6CFC594D257C3524663B4>

Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen principieel goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 15 juli 2022

- Nota Vlaamse Regering <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62D021558E6C4430A8898BDD>
- Besluit Vlaamse Regering <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62D021768E6C4430A8898BDF>

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen definitief goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 10 november 2022

- Nota Vlaamse Regering: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/636A114234B8770AF8FDE078>
- Besluit Vlaamse Regering: <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/636A114234B8770AF8FDE077>

Adviezen : <https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/636A114234B8770AF8FDE079>

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV128 - Digitale vaardigheden](#)

VV178 - EXTRA ZUURSTOF VOOR INDIVIDUEEL CREATIEF TALENT - MEESTERSCHAP

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Departement Cultuur, Jeugd en Media
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	Subsidieaanvragers Circusdecreet, Kunstendecreet, Reglement doorgeven vakmanschap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	04. Investeren in mensen en talenten

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Via het Kunstendecreet, het Circusdecreet en het reglement 'beurzen voor het doorgeven van vakmanschap' geeft de Vlaamse overheid extra zuurstof aan individueel creatief talent en meesterschap, onder de vorm van beurzen en projectsubsidies, waarbij via bijkomende middelen ook extra beleidsimpulsen worden gegeven. Deze subsidies geven een brede waaier aan creatievelingen groeikansen en ademruimte om hun talent verder te ontwikkelen, van kunstenaars tot ambachtslieden en zij die bij hen in de leer willen gaan.</p> <p>In het Kunstendecreet gaat het om (professionele) kunstenaars, die een beurs (kortlopend of meerjarig) kunnen aanvragen, of een projectsubsidie (met een maximumlooptijd van drie jaar). Een beurs dient als financiële ondersteuning voor kunstenaars die nieuwe ideeën willen ontwikkelen of andere wegen willen verkennen. Een projectsubsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van artistieke initiatieven die beperkt zijn in tijd en doelstelling.</p> <p>De ontwikkelingsbeurzen binnen het Circusdecreet maken uitzonderlijke inspanningen of een professioneel traject voor circusartiesten mogelijk, voor maximum een jaar. Het proces, het onderzoek en het artistieke experiment primeren op een concrete productie. Het groeipotentieel en concrete verwachtingspatroon van de kunstenaar zijn cruciaal. Het begrip circusartiest krijgt een brede invulling waarmee ook technische, pedagogische en dramaturgische opleidingen aan bod kunnen komen.</p> <p>De beurzen voor het doorgeven van vakmanschap situeren zich binnen het beleid rond 'immaterieel cultureel erfgoed'. Vakmanschap met wortels in traditie kan worden doorgegeven in zogenaamde 'meester-leerling-trajecten'; een meester en één of meerdere leerling (en) gaan samen een traject aan van maximum twee jaar, waarbij kennis en vaardigheden worden doorgegeven, in diverse domeinen (bv ambachten, muziek-en podiumkunsten, agrarische technieken, culinair erfgoed, etc).</p> <p>Naast andere subsidies, die eerder gericht zijn op de ondersteuning van organisaties, investeert de Vlaamse overheid met deze instrumenten rechtstreeks in het menselijk kapitaal binnen de cultuursector, met een focus op de ontwikkeling van mensen. Door creatievelingen te stimuleren, ontstaat later ook weer nieuw werk, waar het brede publiek op haar beurt weer volop kan van genieten.</p> <p>De voorziene budgetten voor deze subsidielijnen kunnen worden geraadpleegd via de BBT Cultuur.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	
Output	Aantal toegekende subsidies en beurzen is afhankelijk van aantal aanvragen en beschikbaar budget
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> -kansen geven aan individuele kunstenaars om de eigen praktijk te ontwikkelen/parcours uit te stippelen -kansen geven aan vaklieden/ambachtslieden om vakmanschap door te geven en te verwerven, opdat dit immaterieel erfgoed niet verloren gaat, en om het in nieuwe toepassingen te gebruiken -goed opgeleide circusdocenten voor de markt hebben

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	<p>Wat betreft beurzen en projectsubsidies op het Kunstendecreet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de eerste aanvraagronde beurzen opkomend en bewezen talent (indiendatum op 15 mei 2022) werden 246 ontvankelijke aanvragen ingediend. Er werden 47 beurzen opkomend talent en 24 beurzen bewezen talent toegekend, voor een totaalbedrag van 868.500 euro. 15 september 2022 was de uiterste indiendatum voor de aanvraag van een beurs opkomend of bewezen talent voor initiatieven die van start gaan in de eerste jaarhelft van 2023. Er werden 238 ontvankelijke aanvragen ingediend: 137 aanvragen voor een beurs opkomend talent en 101 voor een beurs bewezen talent. De minister zal uiterlijk op 15 januari 2023 een beslissing nemen over deze aanvraagronde. - In 2022 werd tot op heden een beslissing genomen over 48 aanvragen voor een residentiebeurs (voor residentieplekken zonder overeenkomst). 25 van deze aanvragen werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 72.817,29 euro. 3 aanvragen zijn nog in behandeling. Daarnaast waren er ook 53 kandidaturen voor een residentie bij een residentieplek waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media een overeenkomst heeft, waarvan er 10 werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 37.500 euro. 18 nieuwe kandidaturen zijn nog in behandeling. - In 2022 deden 173 kunstenaars een aanvraag voor een projectsubsidie voor een totaalbedrag van 5.709.268,66 euro, waarvan 90 in de aanvraagronde van 15 mei 2022 (3.069.671,22 euro) en 83 in de ronde van 15 september (2.639.597,44 euro). In de aanvraagronde van 15 mei werd er een projectsubsidie toegekend aan 14 kunstenaars voor een totaalbedrag van 185.947,47 euro. De minister neemt uiterlijk op 15 januari 2023 een beslissing nemen over de aanvraagronde van 15 september. <p>Wat betreft het Circusdecreet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de ronde van 15/06/2022 waren er geen aanvragen voor ontwikkelingsgerichte beurzen. - Voor de ronde van 15/10/2022 waren er 4 aanvragen die alle vier gehonoreerd werden voor een totaalbedrag van 22.628 euro. <p>Wat betreft de beurzen voor het doorgeven van vakmanschap: Voor de ronde 2022 werden op 15/9 58 aanvragen ingediend. 22 aanvragen werden gehonoreerd, voor een totaalbedrag van 615.470 euro</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG			
MIJLPALEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Lancering oproepen beurzen Circusdecreet 2021 (15/10, 15/2/15/6)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering oproep beurzen vakmanschap 2021	2021 Q4	Gerealiseerd	
Lancering oproepen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet 2021 (15/3 en 15/9)	2021 Q4	Gerealiseerd	
Oproepen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet 2022 (indiendata 15/5 en 15/9)	2022 Q4	Gerealiseerd	
Oproepen beurzen Circusdecreet 2022 (15/10, 15/2, 15/6)	2022 Q4	Gerealiseerd	
Oproep beurzen vakmanschap 2022	2022 Q4	Gerealiseerd	
Oproepen beurzen circusdecreet 2023 (15/10, 15/2, 15/6)	2023 Q4	Op schema	
Toekenningen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet (twee oproepen per jaar, 15/3 en 15/9, zowel voor beurzen als projecten)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Toekenningen beurzen circusdecreet (3 aanvraagrondes per jaar: 15/10, 15/2 en 15/6)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Toekenningen beurzen doorgeven vakmanschap (jaarlijks een indienronde 15/9)	2023 Q4	Nog niet gestart	
Oproep beurzen vakmanschap 2023	2023 Q4	Op schema	
Oproepen beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet 2023 (indiendata 15/3 en 15/9)	2023 Q4	Op schema	

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	7.881.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Mededeling aan de VR 28/10/2021 - Beleids- en begrotingstoelichting begrotingsopmaak 2022](#)

VV179 - INSPANNINGEN OM INVESTERINGEN AAN TE TREKKEN VERHOGEN

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jan Jambon
Trekkende entiteit VO	Flanders Investment & Trade
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project	Projectpagina
Betrokken entiteit(en) VO	Flanders Investment & Trade
Belanghebbenden	De belanghebbenden zijn buitenlandse investeerders met investeringsplannen die potentieel in Vlaanderen kunnen landen.

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
Tevens versterken we onze inspanningen om investeringen aan te trekken, o. a. door Vlaanderen te promoten bij investeerders als innovatieve kennisregio met behulp van gespecialiseerde consultants in 15 toplanden en virtuele site visits met behulp van verbeterde technologie; de Brexit is ook een opportuniteit om bepaalde logistieke activiteiten aan te trekken (Vlaanderen als "gateway to Europe")

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	
Output	<p>De maatregelen uit deze actie zijn een aanvulling op VV108. VV108 wordt gefinancierd via de Brexit Adjustment Reserve waarbij (op aangeven van de Commissie van de EU) steeds een directe link met het VK aangetoond moet worden.</p> <p>De maatregelen uit de actie VV179 hebben in het kader van de relance een zelfde doel als deze onder VV108 maar zijn wereldwijde acties die zich niet beperken tot het VK.</p> <p>De output van VV179 is identiek aan deze van VV108, nl:</p> <p>In een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders willen we snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.</p>
Outcome	Behoud en groei van het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	2022 was wat het aantrekken van buitenlandse investeerders naar Vlaanderen betreft er eentje met een Janusgezicht: enerzijds waren er in de eerste maanden van het jaar nog de naweeën van corona

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	<p>die er voor zorgden dat het aantal acties, het prospectie activiteiten en site visits nog steeds in verlaagde modus verliepen.</p> <p>Anderzijds merken we dat eenmaal de eerste post-corona activiteiten weer op gang kwamen, dat de dossiers die een tijdje immobiel wereldwijd op verschillende bureaus gelegen hebben opnieuw geactiveerd werden, en dat -niettegenstaande al snel nieuwe crisis situaties de instabiliteit in de wereld vergrootte (steeds een negatief element voor nieuwe internationale investeringen)- er toch een nieuwe dynamiek ontstond in het investeringslandschap.</p> <p>Het blijft voorzichtig afwachten wat de geo-politieke wijzigingen met zich mee zullen brengen maar we kunnen 2022 wat inward investment betreft zonder meer omschrijven als de eerste tekenen van een 'relance'.</p>
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
<p>De maatregelen uit deze actie zijn een aanvulling op VV108.</p> <p>VV108 wordt gefinancierd via de Brexit Adjustment Reserve waarbij (op aangeven van de Commissie van de EU) steeds een directe link met het VK aangetoond moet worden.</p> <p>De maatregelen uit de actie VV179 hebben in het kader van de relance een zelfde doel als deze onder VV108 maar zijn wereldwijde acties die zich niet beperken tot het VK.</p> <p>De output van VV179 is identiek aan deze van VV108, nl: In een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders willen we snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.</p>		2023 Q4		

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	0 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR

PROJECTFINANCIERING

Oorsprong middelen

- Europese middelen
 - Europees Herstelfonds: 0 EUR
 - Brexit-fonds: 0 EUR
 - React EU: 0 EUR
- Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR
- Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV108 - Subsidies aan bedrijven \(financiële steun voor bedrijven, kostenverlaging voor deelname aan beurzen, ondersteuning voor Brexit\) + inzet van consultants om Vlaanderen in het buitenland te promoten](#)

VV180 - WACHTLIJSTEN GEHANDICAPTENZORG

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Hilde Crevits
Trekkende entiteit VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Betrokken entiteit(en) VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Belanghebbenden	personen met een handicap

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	35. Extra relanceprojecten
Speerpunt Relanceplan	05. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>Fase 2 van de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid voor het wegwerken van de wachtlijsten: Door de vooruitschuif van het uitbreidingsbeleid wordt een perspectief geboden aan personen met een handicap om sneller een budget te verkrijgen zodat ze de nodige zorg kunnen inkopen. Fase 1 betrof de terbeschikkingstelling van PVB's aan personen in prioriteitengroep, die een aanvraag hadden ingediend uiterlijk op 31/12/2020. In fase 2 wordt voor de personen die een aanvraag hebben ingediend vanaf 1/1/2021 en die in prioriteitengroep 1 worden ingeschaald, als doelstelling voorgehouden om een PVB ter beschikking te stellen binnen de 18 maanden. Tevens wordt een project opgezet met deelbudgetten voor personen in prioriteitengroep 2.</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	130.000.000 EUR
Output	<p>In fase 1 van de vooruitschuif werd de bestaande wachtlijst weggewerkt voor personen in prioriteitengroep 1. (zie VV121).</p> <p>In fase 2 wordt verder ingezet op deze weg en wordt de termijn waarbinnen een PVB wordt ter beschikking gesteld na het indienen van een aanvraag beperkt gehouden, met een richtlijn van maximaal 18 maanden. Tegelijk werd een project opgezet om aan de personen in prioriteitengroep 2 een deelbudget ter beschikking te stellen.</p>
Outcome	<p>Personen met handicap met een ondersteuningsvraag in prioriteitengroep 1 zullen binnen een beperkte tijdspanne een terbeschikkingstelling van een PVB ontvangen. waarmee ze zorg kunnen inkopen. (zie ook VV121)</p> <p>De versnelling van de terbeschikkingstelling van een PVB is in 2021 en 2022 gebeurd aan 4.184 personen, waarvan 3.086 personen uit prioriteitengroep 1 en 1.098 personen uit prioriteitengroep 2.</p>

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	In uitvoering na agendering VR
Beschrijving voortgang	Na de eerste fase voor de wachtenden in prioriteitengroep 1 met een aanvraag vóór 31/12/2020 (zie ook VV121), werd in de tweede fase gestart met de terbeschikkingstelling van PVB aan de personen die vanaf 1/1/2021 een aanvraag indienden en ingeschaald werden in prioriteitengroep 1.

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
	Aan hen wordt een terbeschikkingstelling vooropgesteld binnen de 18 maanden. Dat loopt op dit ogenblik. Voor zover de aanvraagprocedure effectief is afgewerkt, ontvangen alle personen in prioriteitengroep 1 effectief een PVB binnen de 18 maanden.
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILEERDE PROJECTVOORTGANG

MIJLPALLEN			
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING
Fase 2 toekenning bijkomende budgetten aan personen met een handicap	2022 Q4	Op schema	Aan een eerste groep van personen met een handicap die een aanvraag hadden ingediend voor een PVB uiterlijk op 31/12/2020 werd aan PVB ter beschikking gesteld. In 2022 wordt aan de personen die een aanvraag hebben ingediend in de eerste jaarhelft van 2021 een PVB ter beschikking gesteld. Tegelijk wordt aan de personen die in de tweede jaarhelft van 2021 een aanvraag hebben ingediend en in prioriteitengroep 1 wordt ingedeeld, een PVB ter beschikking gesteld zodra de procedure is afgewerkt.

OUTPUT

INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Aan 3.086 erkende personen met een handicap in prioriteitengroep 1 hebben werd een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld. Het gaat in fase 1 om de personen die een aanvraag hadden ingediend uiterlijk op 31/12/2020. In de volgende fase werd aan personen in prioriteitengroep 1 een PVB ter beschikking gesteld binnen 18 maanden na indiening van de aanvraag. Tevens werd aan 1.098 personen in prioriteitengroep 2 een deelbudget PVB ter beschikking gesteld.	2.700	2022 Q4	4.184	90 %

PROJECTFINANCIERING

Beleidsruimte (begroot)	130.000.000 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	130.000.000 EUR
Uitvoering VAK	0 EUR
Uitvoering VEK	0 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 0 EUR

PROJECTFINANCIERING

- Reguliere Vlaamse middelen: 130.000.000 EUR

AGENDERING VLAAMSE REGERING

[Nota aan de Vlaamse Regering van 16 juli 2021. Uitrol uitbreidingsbeleid 2021 met het oog op perspectief bieden aan de personen met een handicap met ondersteuningsnoden](#)

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN

[VV121 - Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1](#)

36. Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij

VV181 - ONDERSTEUNING OEKRAÏNE LANDBOUW EN VISSERIJ

BETROKKENEN	
Bevoegde minister(s)	Jo Brouns
Trekkende entiteit VO	Departement Landbouw en Visserij
Betrokken entiteit(en) VO	
Belanghebbenden	

PROJECTSITUERING	
Cluster Relanceplan	36. Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij
Speerpunt Relanceplan	06. De coronacrisis beheren en Brexit

PROJECTOMSCHRIJVING
<p>a) Ondersteuning van de visserijsector als gevolg van de situatie in Oekraïne</p> <p>b) De Oekraïnesituatie veroorzaakt handelsverstoringen die het marktevenwicht op de Europese interne markt bedreigen, in het bijzonder op het vlak van agrovoedingsproducten. Om de gevolgen van deze verstoringen te mitigeren en de voedselzekerheid te bevorderen wordt bijzondere aanpassingssteun toegekend aan landbouwers in Vlaanderen.</p> <p>Voor de financiering van deze steun wordt het budget van enkele VV-projecten herschikt: VV028: 496.000 euro VV033: 1.504.000 euro VV101: 4.000.000 euro</p>

INPUT, OUTPUT, OUTCOME	
Input	6.000.000 EUR
Output	
Outcome	

ALGEMENE PROJECTVOORTGANG	
Projectstatus	Gerealiseerd
Beschrijving voortgang	
Noodzakelijke politieke actie	

GEDETAILLEERDE PROJECTVOORTGANG				
MIJLPALEN				
MIJLPAAL	TIMING	STATUS	STATUS BESCHRIJVING	
goedkeuring regelgeving door de Vlaamse Regering van bijzondere aanpassingssteun voor land- en tuinbouw	2022 Q3	Gerealiseerd	BVR goedgekeurd op 15 juli 2022	
goedkeuring regelgeving door Vlaamse Regering van de ondersteuning van de visserijsector nav situatie in Oekraïne	2022 Q2	Gerealiseerd	goedkeuring van het BVR op 15/7/2022	
toekenning steun aan de land- en tuinbouwsector	2022 Q3	Gerealiseerd	De dossiers werden afgehandeld en uitbetaald .	
toekenning steun aan de visserijsector	2022 Q4	Gerealiseerd	De dossiers werden afgehandeld en uitbetaald.	
OUTPUT				
INDICATOR	STREEFWAARDE	TIMING	REALISATIE	REALISATIEGRAAD
Het aantal landbouwers dat gebruik maakt van de bijzondere aanpassingssteun	4500	2022 Q3	4.611	100 %
Het aantal vissersvaartuigen dat gebruik maakt van deze subsidie	55	2022 Q4	55	100 %

PROJECTFINANCIERING	
Beleidsruimte (begroot)	0 EUR
Beleidsruimte (begroot) update	6.000.000 EUR
Uitvoering VAK	6.000.000 EUR
Uitvoering VEK	6.000.000 EUR
Oorsprong middelen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese middelen <ul style="list-style-type: none"> ○ Europees Herstelfonds: 0 EUR ○ Brexit-fonds: 0 EUR ○ React EU: 0 EUR • Vlaamse relancemiddelen: 6.000.000 EUR • Reguliere Vlaamse middelen: 0 EUR

KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN
VV028 - Droogteresistente teelten VV033 - Sensibilisering, opleiding en advisering VV101 - Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen



DEPARTEMENT
**KANSELARIJ &
BUITENLANDSE ZAKEN**

Havenlaan 88 bus 100
1000 Brussel
www.vlaanderen.be
